DEPENDENCIA A NIVEL CENTRAL:	VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACION PRODUCTIVA				
TERRITORIAL:	DIRECCION DE ASISITENCIA TECNICA				
COMITÉ:	APORBACIÓN PRORROGA CONTRATO 7402022 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
FECHA DE REUNIÓN:	13	12	2022	**HORA:**	8:00 AM

ACTA No. 002

OBJETIVO:	Aprobación de la solicitud de la PRORROGA EN TIEMPO al contrato No. 7402022, con el objeto de "'*PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS N°5832021, SUSCRITO CON EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Y EL N°6892021, SUSCRITO CON FINAGRO- GRUPO I*''. DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.		
PARTICIPANTES:	MARÍA ESNEDA	GARCÍA NÚÑEZ	ALCALDÍA RESTREPO VALLE
	LUCY	QUINONES HURTADO	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
	OSCAR	RENTERIA MAGLIONI	GOBERNACION DEL VALLE
	CESAR AUGUSTO	RODRÍGUEZ LULIGO	JAMUNDI
	YINETH ALEXANDRA	PALACIOS ERAZO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA
	DIEGO EFRAIN	OSPINA VALENCIA	ALCALDÍA SAN PEDRO
	GERMAN ALONSO	DIAZ FRANCO	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
	WALTER	CAMPO	ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
	JOSE LUIS	NARVAEZ MELENDEZ	FUNDACIÓN LOS ANDES
	RAMON ANDRES	RAMIREZ	ALCALDÍA MUNICIPAL TORO
	LUIS FERNANDO	GIRALDO GARCE	UMATA
	JOSE RUBEN	VIAFARA BERMUDEZ	MUNICIPIO DE JAMUNDI
	CAROLINA	POVEDA MARIN	ALCALDÍA DE RESTREPO VALLE
	JUAN DAVID	GÓMEZ GUTIÉRREZ	ALCALDÍA MUNICIPAL
	SANDRA	MONTOYA	ALCALDIA
	NINA VLADISLAV	RODRIGUEZ VALERO	ADR
	ANDREY	VILLAMARÍN MARTÍNEZ	ADR
	LUISA FERNANDA	RUIZ MESA	ALCALDIA DE EL AGUILA VALLE

ASISTENTES:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Saludo de bienvenida, personal de la Agencia de Desarrollo rural- ADR UTT 9 y La EPSEA FUNDACION LOS ANDES.
3. Informe de avances de actividades EPSEA FUNDACION LOS ANDES.
4. Solicitud de prórroga en tiempo.
5. Plan operativo y cronograma de las actividades para el año 2023.
6. Compromisos y varios.
7. Cierre del Comité

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quorum. Una vez iniciada la reunión, el señor WILMAN ANDREY VILLAMARÍN apoyo de la supervisión realiza llamado a lista, constatando que al momento del inicio de la reunión responden al llamado 8 de los 14 municipios, corroborando que hay quorum y que se puede llevar a cabo el comité. Se anexa listado de asistentes al final del acta.

2. Presentación y bienvenida de la Reunión Extraordinaria del Comité Departamental del Valle del Cauca:

Se realiza la bienvenida a cada uno de los asistentes de la reunión por parte de la Agencia de Desarrollo Rural a la cabeza de la Supervisora del Contrato 7402022 la Dra. Nina Rodríguez, posteriormente toma la palabra el Dr. Oscar Rentería desde la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca confirmando que hay quorum para adelantar el comité del contrato 7402022 del Departamento del Valle del Cauca. Acto seguido se concede la palabra a la señora DAMAR ACOSTA coordinadora general la Fundación Los Andes, inicialmente agradece la participación del comité a los representantes de cada municipio asistentes y demás instituciones, entrando en materia, de manera general se describen los avances de la ejecución del servicio de extensión agropecuaria, las circunstancias encontradas en el proceso de verificación y validación de la base de productores, los contratiempos generados por ola invernal, como caso particular, el Municipio de Dagua, inseguridad en los municipios del Norte del Valle; en este sentido es necesarios solicitar una prorroga en tiempo para la ejecución del contrato en mención, el Coordinador del Valle del Cauca, Ing. Diego Fernando Delgado, realiza una presentación detallada del informe de avances.

3. Presentación de las actividades realizadas por la Fundación Los Andes:

El Ing. Diego Fernando Delgado es el encargado por La Fundación Los Andes, para desarrollar la actividad de presentación de actividades realizadas a la fecha para el Proyecto para la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria del Departamento del Valle del Cauca priorizado a 745 usuarios de 14 municipios.

PDEA VALLE DEL CAUCA-LOS ANDES 2022									
VALLE DEL CAUCA		LINEA AGRICOLA						LINEA PECUARIA	TOTAL
SUBREGION	MUNICIPIO	AGUACATE	CITRICOS	FRIJOL ARBOL	MORA	PLATANO	TOMATE DE MESA	BOVINO (CARNE-LECHE)	
NORTE	ANSERMANUEVO					19	3		22
	CAICEDONIA		18			40			58
	EL AGUILA	1		1	2	21	1		26
	LA VICTORIA						2	29	31
	ROLDANILLO	2	5				4		11
	TORO		7						7
CENTRO	SANPEDRO							10	10
	RESTREPO							10	10
	CALIMA DARIEN					**43**			43
	TRUJILLO	4		1	4	43	1		53
	TULUA	2	4	2	25	21	16	39	109
SUR	DAUGA	6	15	3		39			63
	PALMIRA	45	35	38		57			175
	JAMUNDI	9	70	1		38	9		127
TOTAL		**69**	**154**	**46**	**31**	**321**	**36**	**88**	**745**

Sobre la asignación inicial se describe, que se atendió el 100% de la cantidad de productores asignados por municipio, realizando el proceso de caracterización en campo, sobre este tema se resalta el cambio de la línea productiva de 23 usuarios en el Municipio de Dagua, quienes pasaron de la línea productiva de tomate a plátano. En el municipio de Jamundí, se cambiaron de línea productiva a 14 productores, quienes pasaron a la línea de cítricos e inicialmente se presentaban bajo las líneas de: Aguacate, 6 usuarios; plátano, 3 usuarios y 5 usuarios de tomate de mesa.

Se expone a los asistentes la complejidad de la consolidación de la base de datos de productores, teniendo en cuenta, que en el departamento se cambiaron un total del 77% del listado inicial contenido en el anexo técnico del PDEA departamental;

circunstancia que derivo en reprocesos y en muchos casos la verificación se tuvo que realizar de forma presencial y en visita a finca, no siendo posible contactar por vía telefónica como se generó la directriz inicial, se realizaron llamadas telefónicas, pero en las zonas, no existe buena cobertura, pues las bases entregadas no estaban actualizadas. A continuación, se presenta el cuadro detallado de los cambios realizados de productores por municipio.

Los Cambios de usuarios han sido los siguientes:

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	USUARIOS ASIGNADOS ANEXOS TECNICOS	No. DE PRODUCTORES REEMPLAZADOS	% DE REEMPLAZOS
VALLE DEL CAUCA	**745**	**575**	**77%**
El Águila	26	10	38%
Ansermanuevo	22	18	81%
La Victoria	31	19	61%
Toro	7	5	71%
Roldanillo	11	10	90%
Caicedonia	58	31	53%
Trujillo	53	26	49%
Tuluá	109	100	91%
San Pedro	10	9	90%
Restrepo	10	4	40%
Calima Darién	43	24	55%
Dagua	63	61	96%
Palmira	175	175	100%
Jamundí	127	96	75%

Se concluye, que, a la fecha, se encuentran realizadas un total de 745 visitas correspondiente al 100% de las visitas asignadas.

Se ha contado con el acompañamiento desde la Gobernación del Valle del Cauca, y la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, así mismo con el apoyo y atención de los municipios, quienes han mostrado disposición para llevar a cabo las actividades priorizados dentro de los PDEA.

Del número total de usuarios de la base inicial asignada en los 14 municipios del Departamento, 575 usuarios fueron cambiados, es decir el 77% del total de usuarios asignados.

4. Solicitud de prórroga en extensión de tiempo por parte de La Fundación Los Andes:

Después de la intervención del Coordinador del Departamento Valle del Cauca el Ingeniero Diego Fernando Delgado, donde se expone las diferentes dificultades encontradas a lo largo del contrato, la señora Damar Acosta Coordinadora General de La Fundación Los Andes, solicita a consideración del Comité Departamental del Valle del Cauca, la prórroga de tiempo del contrato 7402022 para el Departamento hasta el 30 de mayo del 2023, con el fin de ejecutar las actividades de contrato en mención.

Los municipios contestan de manera unánime que están de acuerdo con la solicitud y aprueban la prorroga en tiempo hasta mayo de 2023, aclarando que, de terminar antes las actividades, por parte de Fundación Los Andes, se puede liquidar el contrato sin contratiempos.

Después realiza la intervención la supervisora del contrato 7402022 - ADR, la Dra. Nina Rodríguez, donde solicita que se debe ajustar los tiempos solicitados, para ellos se solicita ajustar el Plan Operativo Departamental y del cronograma inicial, con la nueva directriz hasta mayo de 2023.

Una vez socializada esta acta con la Agencia de Desarrollo Rural -ADR y de acuerdo los lineamientos jurídicos y de la supervisión del contrato, no es posible que dicho contrato se prorrogue hasta el 30 de mayo de 2023, como fue aprobado en el Comité Técnico, llevado a cabo el día 13 de diciembre de 2022, por lo anterior y siguiendo las directrices dadas, el contrato 7402022, celebrado entre la FUNDACION LOS ANDES Y LA ADR, solo se prorrogará por ahora hasta el 31 de marzo de 2023.

5. Presentación del Plan operativo y cronograma:

A continuación, se presenta el Plan operativo ajustado a mayo de 2023 del Departamento del Valle del Cauca, por parte del Coordinador de La Fundación Los Andes, a todos los participantes del comité departamental.

Después de la presentación del Plan Operativo del Departamento del Valle del Cauca, se presentan diferentes observaciones, por parte de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR y los Municipios del Valle del Cauca, donde se llega al consenso y se concertó los ajustes que se deben realizar por parte de la Fundación Los Andes al cronograma y plan operativo, proyectados con fecha a 31 de marzo de 2023.

6. Compromisos y varios.

- La Fundación Los Andes se compromete a realizar los cambios pertinentes al plan operativo y al cronograma de actividades, hasta el 31 de marzo del 2023 de acuerdo a la prórroga solicitada y aprobada.

- Realizar el acta de este comité y presentarla a los municipios participantes.
- Los municipios en donde se ejecuta el servicio de extensión, deben apoyar el proceso ayudando en las diferentes etapas de ejecución del servicio.

Con lo anterior, se concluye la reunión extraordinaria del Comité Departamental del Valle del Cauca.


8. CIERRE DEL COMITÉ.


Siendo las 9:00am del día 13 de diciembre de 2022, se da por terminado el Comité.


Anexos:

- Registro fotográfico Modalidad Virtual Teams
- Listado de asistencia comité

Registro Fotográfico:

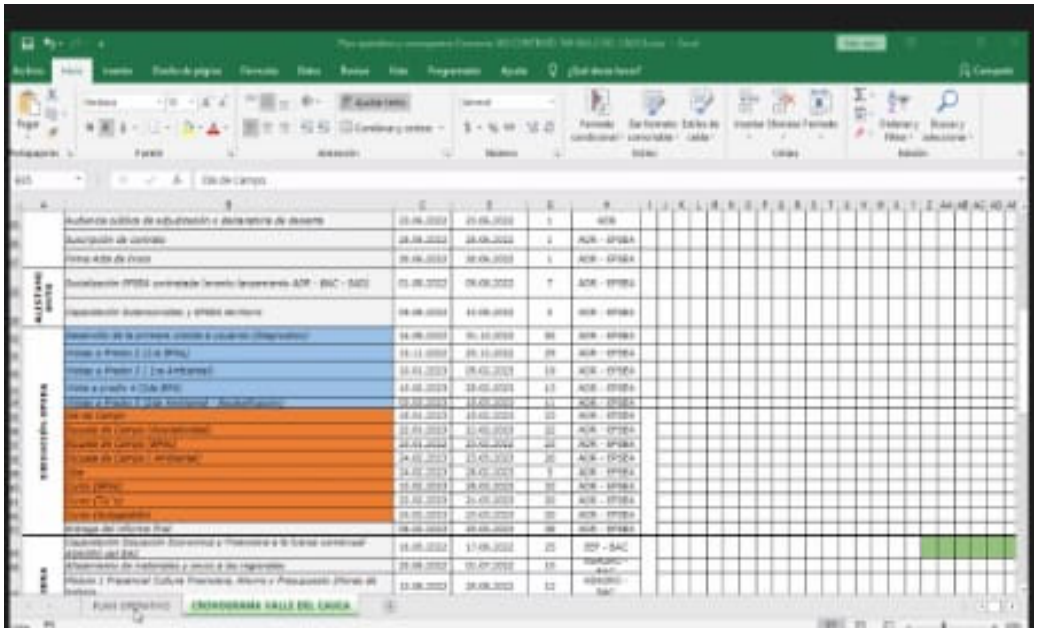

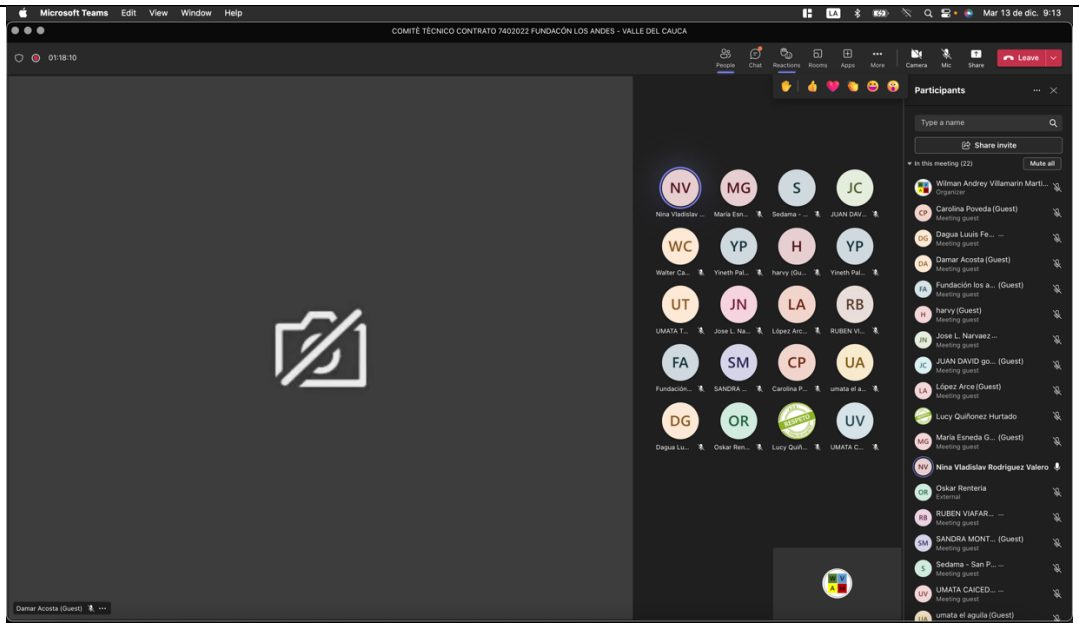

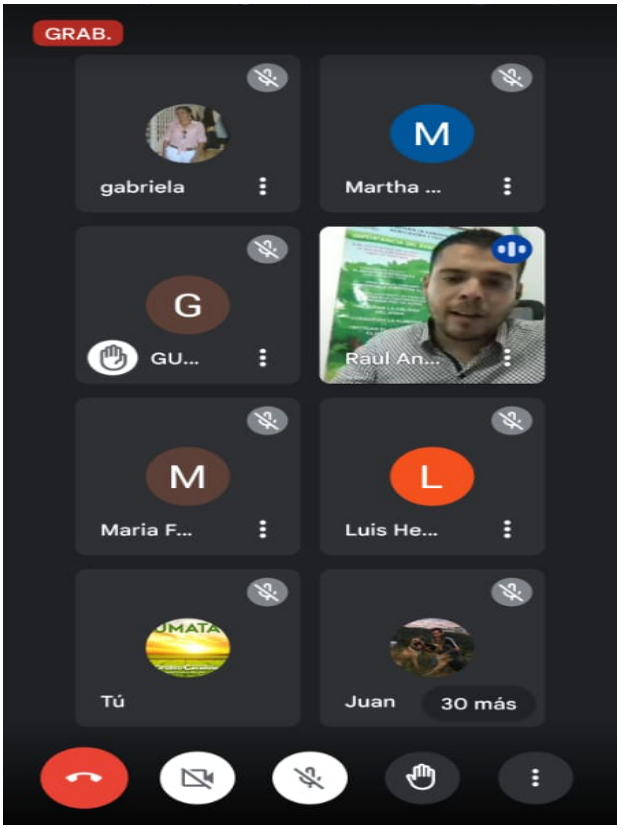

Solicitud al Comité Departamental del Valle del Cauca de prórroga de tiempo para el contrato 7402022 ADR-BAC – Modalidad Virtual Teams 13/12/2022
