ACTA DE REUNIÓN N°: 004	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Arauca	
FECHA INICIO: 12/12/2022	**HORA INICIO: 02:00 pm** **HORA TERMINACIÓN: 3:30 pm**
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: EPSEA Federación de Ganaderos del Cesar – FEGACESAR, Representantes de ADR nivel central.	
OBJETIVO: Realización del comité del proyecto de Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento de Arauca con el fin de solicitar prorroga en tiempo	

AGENDA:

	Tema	Responsable
	Bienvenida al comité por parte de la coordinadora del proyecto Dra. Jennifer López.	EPSEA - FEGACESAR
	Presentación por parte de la supervisión ADR – Equipo de apoyo a la supervisión.	ADR
	Presentación de los representantes de las secretarias de agriculturas o quien los representa en	Alcaldías
	Presentación de la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar- FEGACESAR e informe del avance por municipios.	EPSEA - FEGACESAR
	Socialización del nuevo cronograma	EPSEA - FEGACESAR
	Aprobación por parte de las secretarias de los municipios del nuevo cronograma	Alcaldías
	Compromisos y conclusiones	Alcaldías y FEGACESAR

DESARROLLO:

1. Bienvenida al comité por parte de la coordinadora del proyecto Dra Jennifer López.

Se inicia dando saludos y agradeciendo el apoyo y compromiso por parte de las secretarias donde se ejecuta el proyecto **Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento de Arauca**, explicando que la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar – FEGACESAR, presidirá la reunión en donde se tomaran decisiones relacionadas a los tiempos de ejecución y avances obtenidos.

2. Presentación de los representantes de las secretarias de agriculturas y UMATAS de cada Municipios convocados.

- Mónica María Gallo Santana, Profesional de asuntos agropecuarios de Cravo Norte.

- Omar Villamizar: secretario de agricultura del municipio de Fortul.
- Dumar Gerardo Espinoza: Coordinador de asuntos agropecuarios de Saravena
- Bleidis Tulivila Gaitán: Prof. de apoyo – Secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente de Tame.

3. Presentación por parte de la supervisión ADR – Equipo de apoyo a la supervisión.

En el desarrollo de la reunión se presentaron los delegados de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR nivel central, la Dra. Nina Rodríguez Valero supervisora general del proyecto, quien realizo hincapié en la importancia del quorum con el número mínimo de delegados de las secretarias municipales. Por lo que se procedió a localizar a los secretarios que al momento no se habían conectado al comité.

Con la participación de los representantes de los municipios de Cravo norte, Fortul, Saravena y Tame se da inicio a la reunión.

4. Presentación de la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar- FEGACESAR e informe del avance por municipios.

Posteriormente, se expone por medio de la coordinación del departamento de Arauca, los avances alcanzados a la fecha, indicando respectivamente el porcentaje de ejecución en cada municipio. Posterior a esto se informa la delicada situación que presenta el departamento en temas de orden público, con el fin de avalar por medio de los representantes de los municipios las diferentes situaciones que exponen los extensionistas.

MUNICIPIO	No. Usuarios	No. Visitas aprobadas por coordinadores y calidad	% de visitas aprobadas (cumplen con las condiciones exigidas)
ARAUCA	64	64	100%
ARAUQUITA	173	154	89%
TAME	167	44	26%
FORTUL	197	80	41%
PUERTO RONDON	63	20	32%
CRAVO NORTE	98	98	100%
SARAVENA	107	107	100%
TOTAL	**869**	**567**	65%

5. Socialización del nuevo cronograma

Se socializo por parte de la *EPSEA* el nuevo cronograma del proyecto Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento de Arauca.

A este se le realizaron por parte de la supervisora del proyecto las anotaciones y recomendaciones pertinentes según el anexo técnico del proyecto entregando como resultado un nuevo cronograma para ser evaluado por parte de la supervisión.

6. Aprobación por parte de las secretarias de los municipios del nuevo cronograma.


Se les pregunto a los asistentes al comité en representación de las secretarias de agricultura municipales si autorizan y están de acuerdo con los tiempos solicitados para la prórroga por parte de la EPSEA ejecutora del proyecto a lo que estos respondieron de manera positiva.


Por lo cual La Federación de Ganaderos del Cesar FEGACESAR, como EPSEA contratista en nombre de la coordinadora general la Dra. Jennifer López solicitan a la supervisora del proyecto Dr. Nina Rodríguez en el loable ejercicio de sus funciones acceda otorgar la prórroga en tiempo hasta el 31 de marzo de 2023.


7. Compromisos conclusiones

En el próximo comité de deberán presentar por parte de la EPSEA los avances por municipios. Por parte de los municipios solicitan nueva socialización del proyecto a los representantes de cada una de ellas que están asumiendo el nuevo cargo. Organizar capacitación con la Dr. Nina Rodríguez para el diligenciamiento de los planes de fortalecimiento

Evidencias Fotográficas.

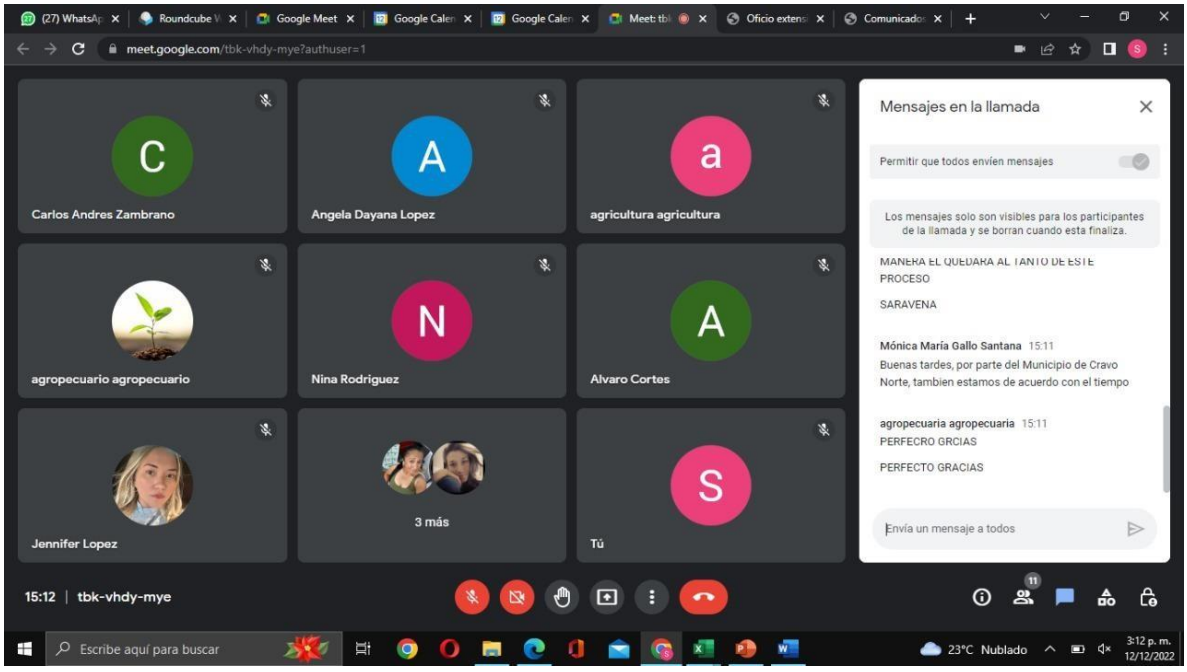

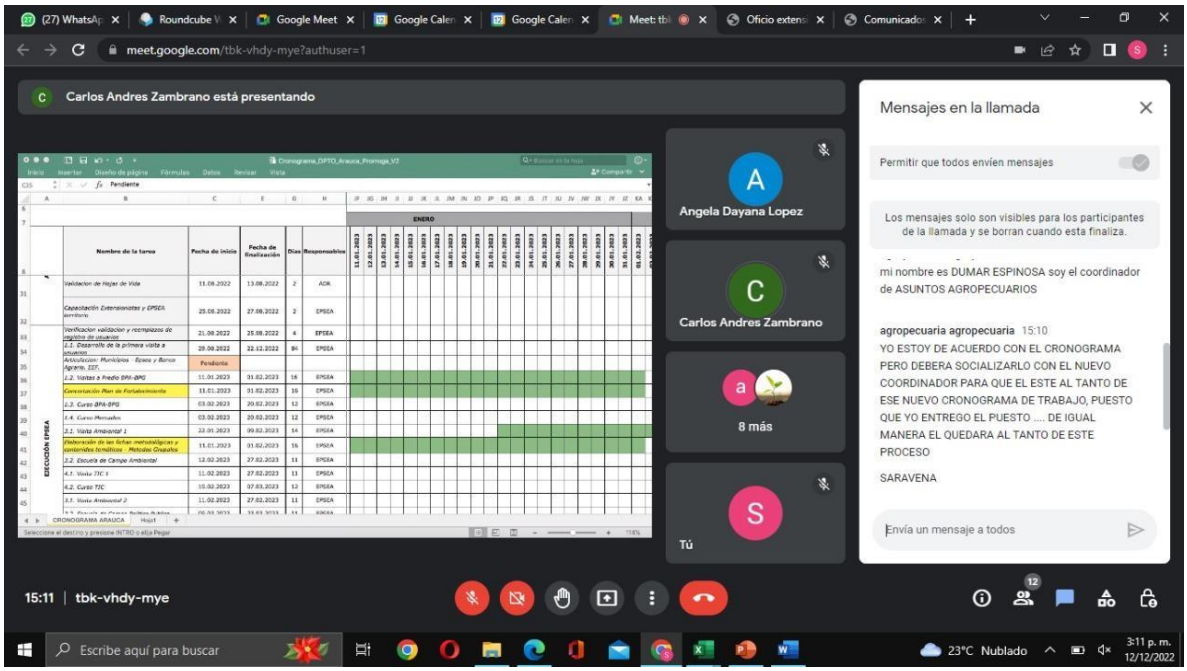
meet.google.com/tbk-vhdy-mye?authuser=1
Carlos Andres Zambrano está presentando
Mensajes en la llamada
Permitir que todos envíen mensajes
Los mensajes solo son visibles para los participantes de la llamada y se borran cuando esta finaliza.
mi nombre es DUMAR ESPINOSA soy el coordinador de ASUNTOS AGROPECUARIOS
agropecuaria agropecuaria 15:10
YO ESTOY DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA PERO DEBERA SOCIALIZARLO CON EL NUEVO COORDINADOR PARA QUE EL ESTE AL TANTO DE ESE NUEVO CRONOGRAMA DE TRABAJO, PUESTO QUE YO ENTREGO EL PUESTO .... DE IGUAL MANERA EL QUEDARA AL TANTO DE ESTE PROCESO
SARAVENA
Envía un mensaje a todos
Angela Dayana Lopez
Carlos Andres Zambrano
8 más
Tú
15:11 | tbk-vhdy-mye
Escribe aquí para buscar
23°C Nublado
3:11 p. m.
12/12/2022

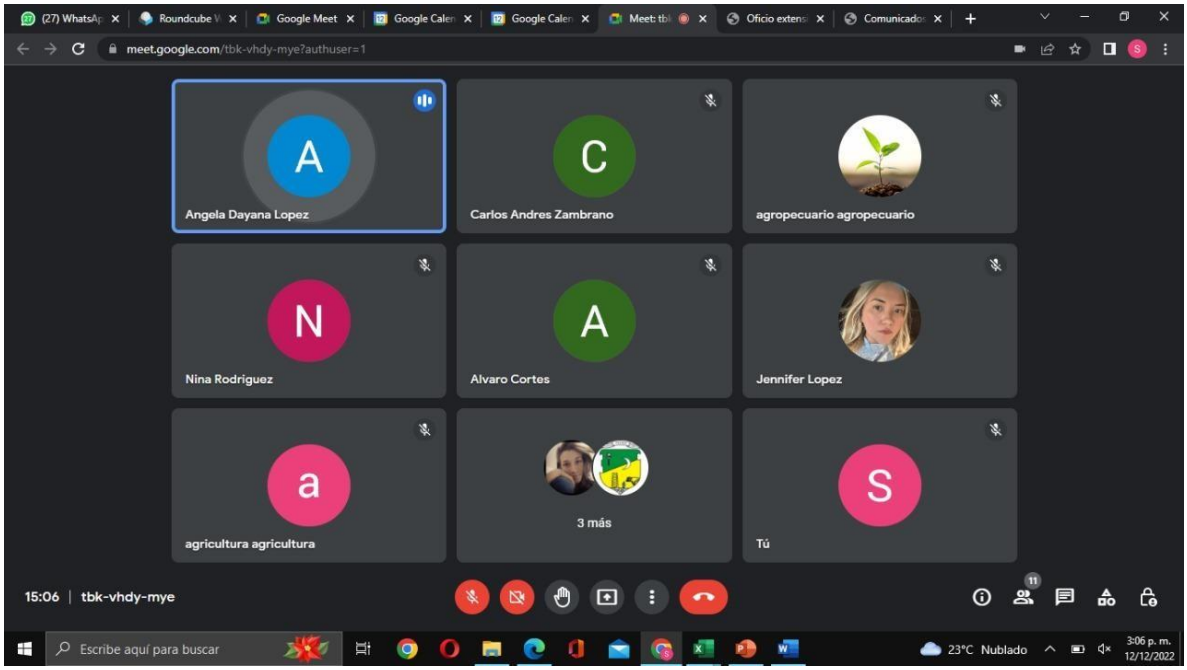
meet.google.com/tbk-vhdy-mye?authuser=1
Angela Dayana Lopez
Carlos Andres Zambrano
agropecuario agropecuario
Nina Rodriguez
Alvaro Cortes
Jennifer Lopez
agricultura agricultura
3 más
Tú
15:06 | tbk-vhdy-mye
Escribe aquí para buscar
23°C Nublado
3:06 p. m.
12/12/2022

ACTA DE REUNIÓN N°: 004	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Cesar / Valledupar	
FECHA INICIO: 12/12/2022	**HORA INICIO: 09:00 am** **HORA TERMINACIÓN: 11:30 am**
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: secretarias de agricultura pertenecientes al proyecto del departamento del Cesar, la EPSEA Federación de Ganaderos del Cesar – FEGACESAR, Representantes de ADR nivel central.	
OBJETIVO: realización del comité del proyecto de Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento del Cesar para la solicitud de la prorroga en tiempo	

AGENDA:

ítem	Tema	Responsable
1	Bienvenida al comité por parte de la coordinadora del proyecto Dr Jennifer Lopez.	EPSEA - FEGACESAR
2	Presentación por parte de la supervisión ADR – Equipo de apoyo a la supervisión.	ADR
3	Presentación de los representantes de las secretarias de agriculturas y UMATAS de cada Municipios convocado.	Alcaldías
4	Presentación de la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar-FEGACESAR e informe del avance por municipios.	EPSEA - FEGACESAR
5	Informe por parte de la coordinadora del proyecto Dr Jennifer Lopez de novedades del proyecto.	EPSEA - FEGACESAR
6	Socialización del nuevo cronograma	EPSEA - FEGACESAR
7	Aprobación por parte de las secretarias de los municipios del nuevo cronograma	Alcaldías
8	Compromisos conclusiones	Alcaldías y FEGACESAR

DESARROLLO:

1. **Bienvenida al comité por parte de la coordinadora del proyecto Dr Jennifer Lopez.**

Se inicia dando saludos y agradeciendo el apoyo y compromiso por parte de las secretarias donde se ejecuta el proyecto **Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento del Cesar**, explicando que la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar – FEGACESAR, presidirá la reunión en donde se tomaran decisiones

Adicionalmente, explica que para la prestación del servicio de extensión agropecuario se cuenta con un gran aliado, como lo es el Banco agrario de Colombia, quien va a entrar en apoyarnos con los términos de educación financiera, en donde, se están atendiendo 1075 usuarios en los 19 municipios del departamento del Cesar

2. **Presentación por parte de la supervisión ADR – Equipo de apoyo a la supervisión.**

En el desarrollo de la reunión se presentaron los delegados de nivel central Dr. Manuel Fernando Mazorra Agudelo Agencia de Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural y la Dra. Nina Rodríguez Valero Secretaria Municipal Bogotá Central ADR, quien realizo hincapié en la importancia del quorum con el número mínimo de delegados de las secretarias municipales. Por lo que se procedió a localizar a los secretarios que al momento no se habían conectado al comité.

3. **Presentación de los representantes de las secretarias de agriculturas y UMATAS de cada Municipios convocado.**

- Maria Beliza Calderon Guerra alcaldía San Diego- Sec Agricultura
- Ricardo Armenta Secretario de agricultura la paz.
- Guillermo Calle- secretaria de agricultura Municipio de Becerril Cesar.
- Wilson Orlando Prada Quintanilla secretaria municipal San Martín, Cesar alcaldía San Martín Cesar.
- Zareth Molina- Secretaria de Agricultura Municipio de Astrea.
- Mauricio Garcés Pabón secretaria municipal San Alberto cesar apoyo agropecuario
- Orlando Daza Vega secretaria municipal la Jagua de Ibirico secretaria agricultura alcaldía la Jagua de Ibirico.
- Yuleimy Padilla Secretaria Municipal Becerril alcaldía Municipal
- Jose Mario Añez Maestre secretaria municipal Manaure Balcón del Cesar UMATA
- Roberto Carlos Guzmán Ledesma secretaria Municipal El Copey Planeación municipal

4. **Presentación de la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar- FEGACESAR e informe del avance por municipios.**

Después de la presentación de los convocados a la reunión se entregó por parte del coordinador del proyecto del avance de las visitas en los diferentes municipios del departamento del Cesar.

MUNICIPIO	No. Usuarios	No. Visitas aprobadas por coordinadoresy calidad	% de visitas aprobadas (cumplen con las condiciones exigidas)
ASTREA	64	50	78.27%
BECERRIL	86	86	82.55%
BOSCONIA	75	75	100%
CHIMICHAGUA	2	2	100%
CHIRIGUANA	64	64	100%
CODAZZI	96	53	55.20%
CURUMANI	8	8	100%
EL PASO	82	40	48.78%
LA JAGUA DE IBIRICO	62	44	70.96%

LA PAZ	62	60	96.77
MANAURE	11	11	100%
SAN DIEGO	62	62	88.70%
SAN ALBERTO	50	20	40%
SAN MARTIN	94	94	100%
LA GLORIA	86	20	46.51%
TAMALAMEQUE	93	20	21.50%
TOTAL	**1075**	**709**	

5. **Informe por parte de la coordinadora del proyecto Dra Jennifer Lopez de novedades del proyecto.**

La coordinadora del proyecto Dra. Jennifer Lopez informo a los miembros de la ADR nivel central y los secretarios de agricultura municipales los motivos por los cuales algunos municipios no han realizado el cien porciento de las visitas numero uno iniciando porque por la temporada de lluvias que genero calamidad publica en el departamento retraso el acceso a los usuarios en varios municipios destacando el cado del municipio de Bosconia y becerril ambos noticia nacional por las graves afectaciones en la infraestructura vial y de servicios.

En el caso de los municipios de la gloria y Tamalameque ubicados en estribaciones de la Ciénega de zapatosa y el rio magdalena presentaron inundaciones en amplias zonas dedicadas a la actividad ganadera.

Por otra parte, se informó de las demoras en las validaciones de los usuarios y los reprocesos generados por las dificultades en la base de datos con usuarios fallecidos que cambiaron de actividad productiva.

6. **Socialización del nuevo cronograma**

Se socializo por parte de la *EPSEA* el nuevo cronograma del proyecto Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento del Cesar.

A este se le realizaron por parte de la supervisora del proyecto las anotaciones y recomendaciones pertinentes según el anexo técnico del proyecto entregando como resultado

Conograma…..

7. **Aprobación por parte de las secretarias de los municipios del nuevo cronograma.**

Se les pregunto a los intervinientes en el comité por parte de las secretarias de agricultura municipales si autorizaban la realización por parte de la supervisión del proyecto de la ampliación y autorización del nuevo cronograma de ejecución del proyecto a lo que estos respondieron.

Secretario	**Respuesta**
MARIA BELIZA CALDERON GUERRA	Acepta el nuevo cronograma
RICARDO ARMENTA	Acepta el nuevo cronograma
WILSON ORLANDO PRADA QUINTANILLA	Acepta el nuevo cronograma
Nina Rodríguez Valero	Acepta el nuevo cronograma


Zareth Molina	Acepta el nuevo cronograma
Guillermo Calle	Acepta el nuevo cronograma
Mauricio Garcés Pabón	Acepta el nuevo cronograma
ORLANDO DAZA VEGA	Acepta el nuevo cronograma
Juleiny padila	Acepta el nuevo cronograma
JOSE MARIO AÑEZ MAESTRE	Acepta el nuevo cronograma
Roberto Carlos Guzmán Ledesma	Acepta el nuevo cronograma


Por lo cual La Federación de Ganaderos del Cesar FEGACESAR, como EPSEA contratista en nombre de la coordinadora general la Dr. Jennifer López solicitan a la supervisora del proyecto Dr. Nina Rodríguez en el loable ejercicio de sus funciones acceda otorgar la prórroga en tiempo hasta el 31 de marzo de 2023.


8. Compromisos conclusiones

- En el próximo comité de deberán presentar por parte de la EPSEA los avances por municipios
- La EPSEA se compromete a enviar a las secretarias municipales el cronograma de visitas a realizar por parte de los extensionistas semanal
- Organizar capacitación con la Dr. Nina Rodríguez para el diligenciamiento de los planes de fortalecimiento

Evidencias Fotográficas.

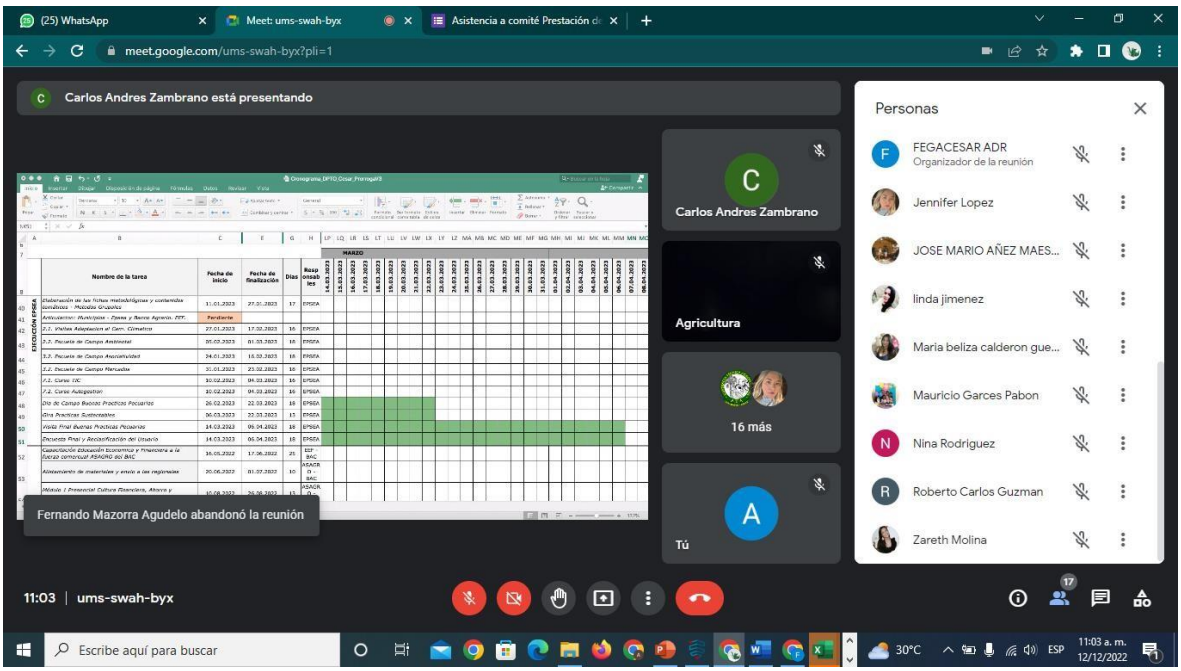

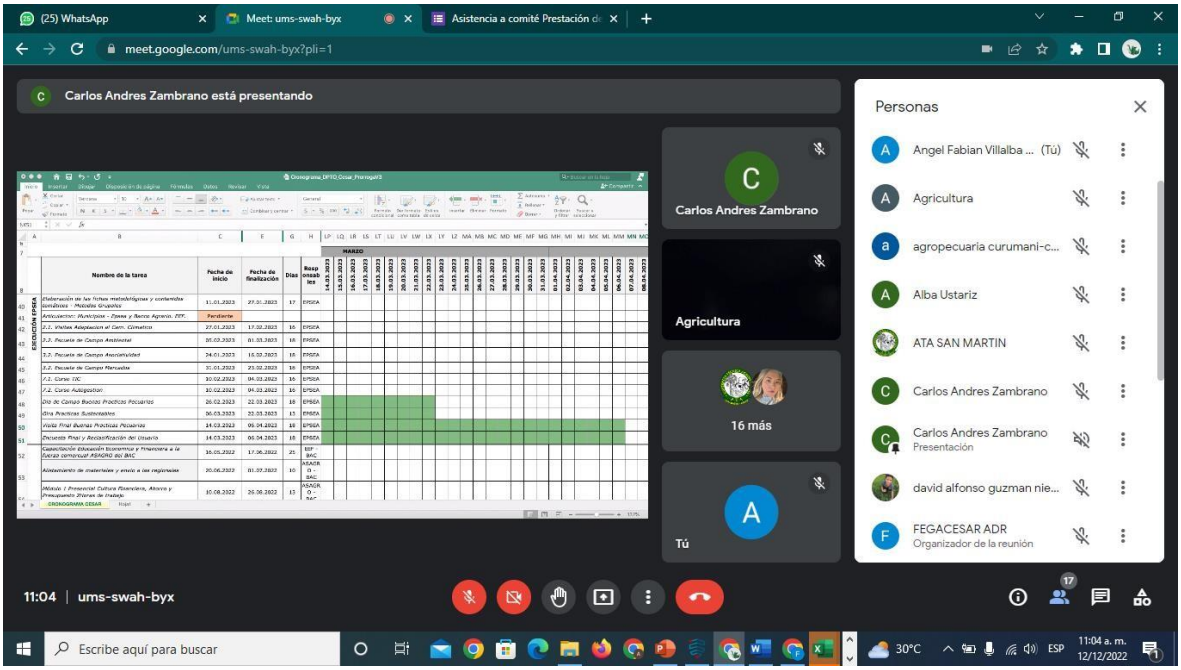
(25) WhatsApp
Meet: ums-swah-byx
Asistencia a comité Prestación d
meet.google.com/ums-swah-byx?pli=1
Carlos Andres Zambrano está presentando
Personas
Angel Fabian Villalba ... (Tú)
Agricultura
agropecuaria curumani-c...
Alba Ustariz
ATA SAN MARTIN
Carlos Andres Zambrano
Carlos Andres Zambrano
Presentación
david alfonso guzman nie...
FEGACESAR ADR
Organizador de la reunión
Carlos Andres Zambrano
Agricultura
16 más
Tú
11:04 | ums-swah-byx
Escribe aquí para buscar
30°C
ESP
11:04 a. m.
12/12/2022

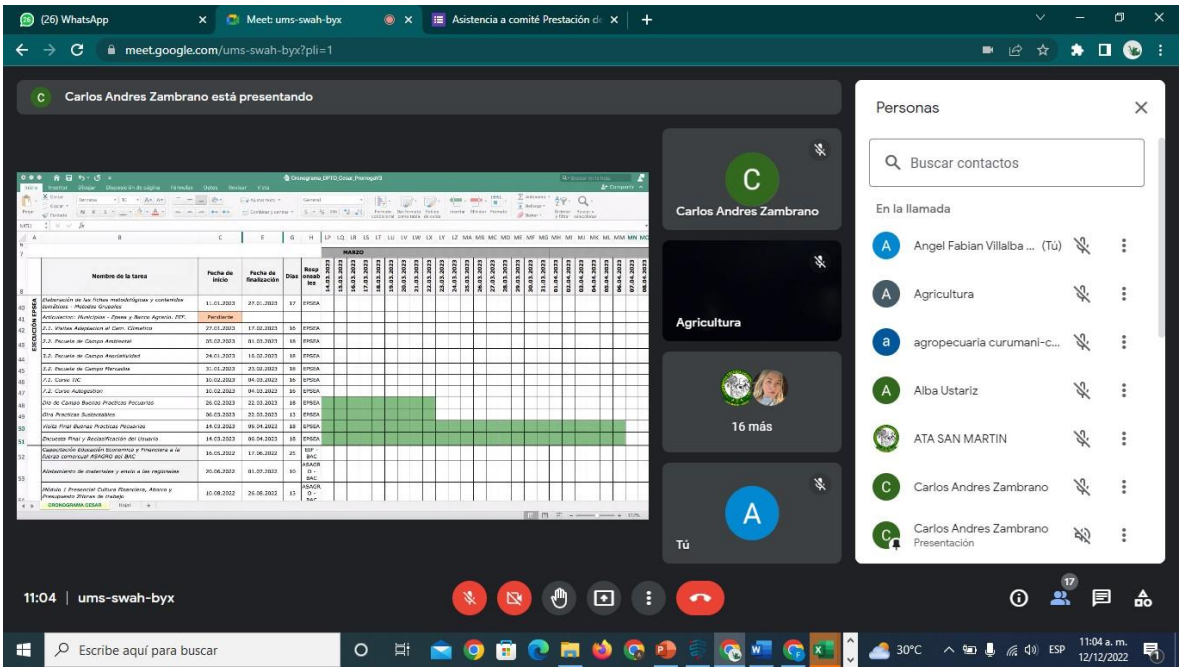
(26) WhatsApp
Meet: ums-swah-byx
Asistencia a comité Prestación d
meet.google.com/ums-swah-byx?pli=1
Carlos Andres Zambrano está presentando
Personas
Buscar contactos
En la llamada
Angel Fabian Villalba ... (Tú)
Agricultura
agropecuaria curumani-c...
Alba Ustariz
ATA SAN MARTIN
Carlos Andres Zambrano
Carlos Andres Zambrano
Presentación
Carlos Andres Zambrano
Agricultura
16 más
Tú
11:04 | ums-swah-byx
Escribe aquí para buscar
30°C
ESP
11:04 a. m.
12/12/2022

Listado de Asistencia.

Secretario	Alcaldia
MARIA BELIZA CALDERON GUERRA	Umata San Diego
RICARDO ARMENTA	Secretaria Municipio de la paz
WILSON ORLANDO PRADA QUINTANILLA	Secretaria de Agricultura
Nina Rodríguez Valero	ADR
Zareth Molina	Secretaria Astrea
Guillermo Calle	Alcaldia de becerril
Mauricio Garcés Pabón	Secretaria De Agricultura
ORLANDO DAZA VEGA	
Juleiny padila	
JOSE MARIO AÑEZ MAESTRE	UMATA
Roberto Carlos Guzmán Ledesma	Alcaldia del Copey
Laura Garcia	Fegacesar

ACTA DE REUNIÓN N°: 004	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Meta / Villavicencio	
FECHA INICIO: 12/12/2022	**HORA INICIO: 09:00 am** **HORA TERMINACIÓN: 11:30 am**
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: secretarias de agricultura pertenecientes al proyecto del departamento del Meta, la EPSEA Federación de Ganaderos del Cesar – FEGACESAR, Representantes de ADR nivel central.	
OBJETIVO: realización del comité del proyecto de Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento del Meta para la solicitud de la prorroga en tiempo	

AGENDA:

ítem	Tema	Responsable
1	Bienvenida al comité por parte de la coordinadora del proyecto Dra. Jennifer López.	EPSEA - FEGACESAR
2	Presentación por parte de la supervisión ADR – Equipo de apoyo a la supervisión.	ADR
3	Presentación de los representantes de las secretarias de agriculturas y UMATAS de cada Municipios convocado.	Alcaldías
4	Presentación de la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar-FEGACESAR e informe del avance por municipios.	EPSEA - FEGACESAR
5	Informe por parte de la coordinadora del proyecto Dr Jennifer López de novedades del proyecto.	EPSEA - FEGACESAR
6	Socialización del nuevo cronograma	EPSEA - FEGACESAR
7	Aprobación por parte de las secretarias de los municipios del nuevo cronograma	Alcaldías
8	Compromisos conclusiones	Alcaldías y FEGACESAR

DESARROLLO:

1. **Bienvenida al comité por parte de la coordinadora del proyecto Dra. Jennifer López.**

Se inicia dando saludos y agradeciendo el apoyo y compromiso por parte de las secretarias donde se ejecuta el proyecto **Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento del Meta**, explicando que la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar – FEGACESAR, presidirá la reunión en donde se tomaran decisiones

Adicionalmente, explica que para la prestación del servicio de extensión agropecuario se cuenta con un gran aliado, como lo es el Banco agrario de Colombia, quien va a entrar en apoyarnos con los términos de educación financiera, en donde, se están atendiendo 836 usuarios en los 07 municipios del departamento del Meta.

2. **Presentación por parte de la supervisión ADR – Equipo de apoyo a la supervisión.**

En el desarrollo de la reunión se presentaron los delegados de nivel central Dr. Manuel Fernando Mazorra Agudelo Agencia de Desarrollo Rural Agencia de Desarrollo Rural y la Dra. Nina Rodríguez Valero Secretaria Municipal Bogotá Central ADR, quien realizo hincapié en la importancia del quorum con el número mínimo de delegados de las secretarias municipales. Por lo que se procedió a localizar a los secretarios que al momento no se habían conectado al comité.

3. **Presentación de los representantes de las secretarias de agriculturas y UMATAS de cada Municipios convocado.**

Secretaria Mcpal	Representante	Línea
Calvario	José Wilber Sosza Ramírez	Agrícola
Puerto Rico	Cesar Orlando Barreto	Agrícola
El Castillo	No asistió	Agrícola
El Dorado	No asistió	Agrícola
San Juanito	No asistió	Agrícola
Mesetas	Andrés Felipe Vargas Cuellar	Agrícola
La macarena	Angie Ramírez Sánchez	Pecuaria

Secretaria Dptal	Carmelita Rodríguez	Asesor Dptal

Agencia de Desarrollo Rural	Sebastián Rodríguez	Dir. asistencia Técnica
	Nina Rodríguez	Supervisora

4. **Presentación de la EPSEA, Federación de Ganaderos del Cesar- FEGACESAR e informe del avance por municipios.**

Después de la presentación de los convocados a la reunión se entregó por parte del coordinador del proyecto del avance de las visitas en los diferentes municipios del departamento del Meta.

Municipio	Número de usuarios	Número de visitas aprobadas por coordinador y supervisor de calidad	% de visitas aprobadas (cumplen con las condiciones exigidas)
Calvario	78	39	50%
Puerto Rico	201	80	39%
El castillo	67	34	50%
El dorado	114	114	100%
San Juanito	159	80	50%

Mesetas	152	101	66%
La Macarena	65	65	100%
	836	**513**	**61%**

Total usuarios	836
visitas realizas y aprobadas	513
% avance del proyecto	61%

5. **Informe por parte de la coordinadora del proyecto Dra Jennifer Lopez de novedades del proyecto.**

La coordinadora del proyecto Dra. Jennifer Lopez informo a los miembros de la ADR nivel central y los secretarios de agricultura municipales los motivos por los cuales algunos municipios no han realizado el cien porciento de las visitas numero uno iniciando porque por la temporada de lluvias que genero calamidad publica en el departamento retraso el acceso a los usuarios en varios municipios destacando.

Por otra parte, se informó de las demoras en las validaciones de los usuarios y los reprocesos generados por las dificultades en la base de datos con usuarios fallecidos, usuarios que se encuentran en otro departamento, usuarios que no tienen actualizada información personal, entre otros.

6. **Socialización del nuevo cronograma**

Se socializo por parte de la *EPSEA* el nuevo cronograma del proyecto Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria para las líneas priorizadas en el PDEA del departamento del Meta.

A este se le realizaron por parte de la supervisora del proyecto las anotaciones y recomendaciones pertinentes según el anexo técnico del proyecto entregando como resultado

Cronograma…..

7. **Aprobación por parte de las secretarias de los municipios del nuevo cronograma.**

Se les pregunto a los intervinientes en el comité por parte de las secretarias de agricultura municipales si autorizaban la realización por parte de la supervisión del proyecto de la ampliación y autorización del nuevo cronograma de ejecución del proyecto a lo que estos respondieron.

Municipio	Representante
Calvario	Acepta prorroga con nuevo Cronograma
Puerto Rico	Acepta prorroga con nuevo Cronograma
El castillo	No asistió
El dorado	No asistió


San Juanito	No asistió
Mesetas	Acepta prorroga con nuevo Cronograma
La Macarena	Acepta prorroga con nuevo Cronograma


Por lo cual La Federación de Ganaderos del Cesar FEGACESAR, como EPSEA contratista en nombre de la coordinadora general la Dr. Jennifer López solicitan a la supervisora del proyecto Dr. Nina Rodríguez en el loable ejercicio de sus funciones acceda otorgar la prórroga en tiempo hasta el 31 de marzo de 2023.

8. Compromisos conclusiones

- En el próximo comité de deberán presentar por parte de la EPSEA los avances por municipios.
- La EPSEA se compromete a enviar a las secretarias municipales el cronograma de visitas a realizar por parte de los extensionistas semanal
- Organizar capacitación con la Dr. Nina Rodríguez para el diligenciamiento de los planes de fortalecimiento.
- Compartir malla de usuarios actualizada a los diferentes representantes incluyendo a la secretaria Departamental.

Evidencias Fotográficas.

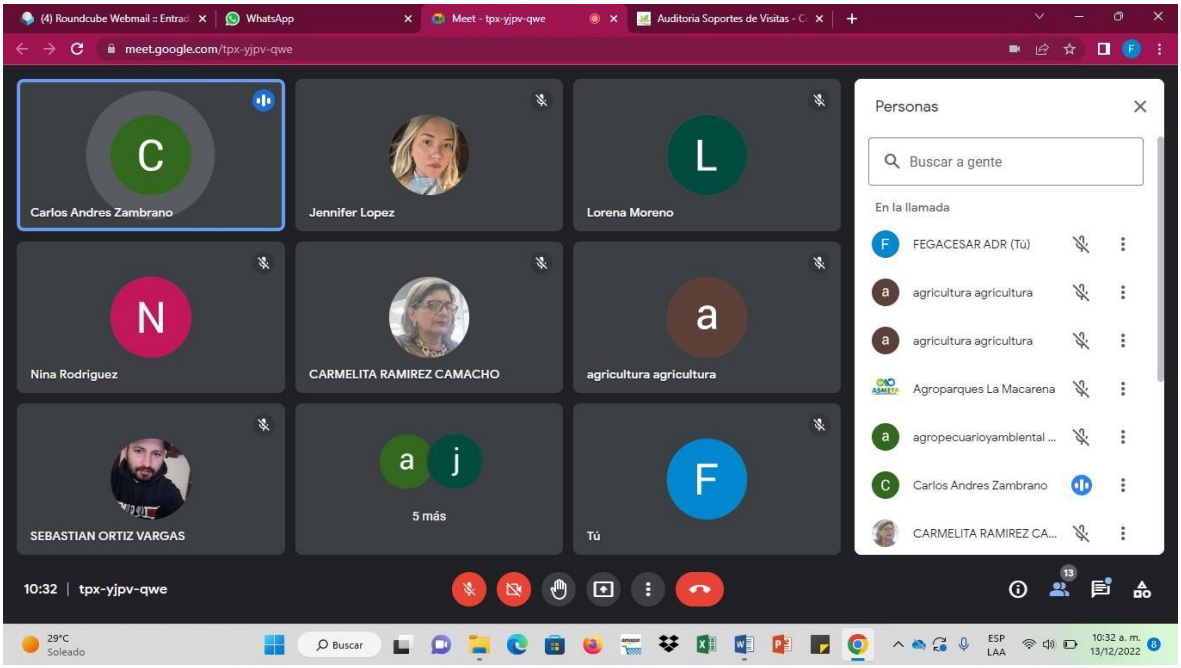

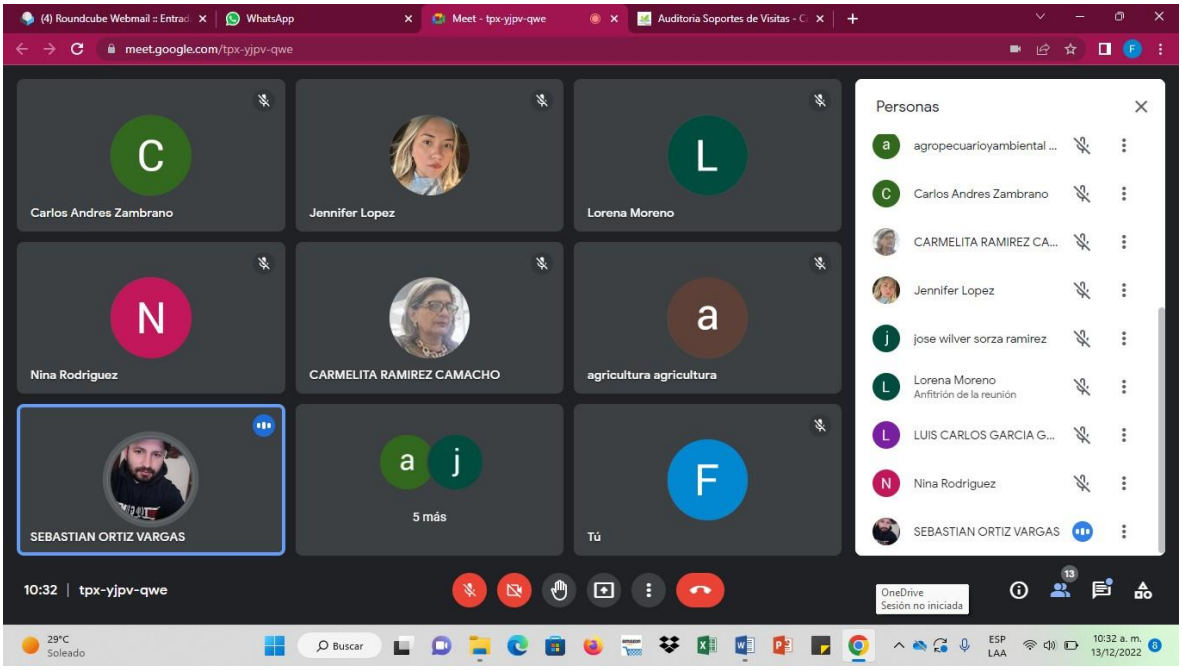

Listado de Asistencia.

Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre Asistente	Numero Identificación:	Municipio	Telefono de Contacto	Correo Electronico	Cargo	Entidad
12/13/22 9:04:17	12/13/22 9:05:43	Faber Edison Arango Cardona	86064655	Villavicencio	3007498383	faber.arango@gmail.com	CPS	Secretaría de Agricultura - Gobernación del Meta
12/13/22 9:14:07	12/13/22 9:15:55	Jose Wilver Sorza Ramiez	17326237	El Calvario	3107541019	sedecosomec@gmail.com	Secretario de Desarrollo Económico y Social	Alcaldía
12/13/22	12/13/22	Cesar Orlando	86073601	Puerto Rico	3204720216	agricultura@puertorico-meta.gov.co	Secretario de Agricultu	Alcaldía de Puerto

9:04:17	10:03:40	Barreto Ladino					ra, Desarrollo Rural y Medio Ambiente	Rico - Meta.
12/13/22 10:04:08	12/13/22 10:06:37	ANGHIE RAMIREZ SANCHEZ	1121833569	LA MACARENA	3222127236	macarena@asmeta.gov.co	ENLACE MUNICIPAL ASMETA	ALCALDIA / ASMETA
12/13/22 10:07:43	12/13/22 10:09:22	Carmelita Ramírez Camacho	40368316	Sec agricultura del Meta	3123595417	Cramirezc@meta.goc	Prof especializadp	Sec agricultura del Meta
12/13/22 10:07:40	12/13/22 10:32:13	Sebastian Ortiz Vargas	1026571047	Bogota	3103462775	sebastian.ortiz@adr.gov.co	Contratista	Agencia de Desarrollo Rural
		Carlos Andres Zambrano	77095774	Valledupar	3192598379	sistemas@fegacesar.co	coordinador de Sistemas	FEGACESAR
