	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2022 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1427 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ARM CONSULTING S.A.S.
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

CONTRATO DE OBRA No.

de

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

El municipio adjudicó el proceso y se encuentra en trámite de elaboracion del Contrato de Obra para su legalización

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2022
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 299.966.918 **50% EN SMMLV:** 149,98
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 299.966.918
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita el Interventor ARM CONSULTING S.A.S. solicita lo siguiente: Prórroga hasta el 30 de abril de 2023 del Contrato N° 1427 de 2022, para así lograr acompañar técnica, administrativa, financiera y ambientalmente las obras derivadas del Convenio Interadministrativo No. 1292 de 2022 suscrito entre el Municipio del El Playón Santander y el INVIAS. A la fecha, el municipio ya adjudico el proceso y se encuentra en trámite de elaboracion del Contrato de Obra para su legalización. Por lo cual, se requiere realizar prórroga del Contrato 1427 de 2022.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Acometer las actividades de interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras de Mejoramiento de vias rurales proyectadas a ejecutarse en el municipio de El Playón en el departamento de Santander.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) 2022 (año) $ 0
Último mes facturado: Noviembre de 2022 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 299.966.918 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En consideración a la solicitud realizada por la interventoría y debido a que el plazo del Contrato 1427 de 2022 tiene como fin el próximo 31 de diciembre de 2022, se hace necesario realizar prórroga hasta el 30 de abril de 2023 con el fin de garantizar el acompañamiento de la interventoría para las actividades de mejoramiento de vias rurales proyectadas a ejecutarse en el municipio de El Playón.

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría ARM CONSULTING S.A.S
Matrícula Profesional No.: 25202-193762CND

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
Director Territorial Santander
INVIAS
Matrícula No. 68202-090549STD

JUAN MANUEL Perdomo H.

Vo.Bo.Firma

Nombre: JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ
Gestor Tecnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: RODRIGO ANDRES FRANCO ANGARITA
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON

Firma

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe Unidad Ejecutora Encargada
Matrícula No. 0820254602 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial.

C.185/2/001/22

Villavicencio (Meta), 12 de diciembre de 2022

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn. Juan Manuel Perdomo Hernández
Gestor Técnico

Referencia: SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONTRATO **No. 1427 de 2022**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicito amablemente a la entidad la solicitud de la prórroga No 01 al contrato 1427 de 2022, de Interventoría, debido a que la licitación de obra a la cual se le realizará la interventoría se encuentra en proceso de adjudicación y legalización. Por tal motivo y dado que el proyecto está estimado para su finalización el 31 de diciembre de 2022, resulta necesario prorrogar el contrato contrato hasta el 30 de Abril de 2023.

Muchas gracias de antemano por su atención y colaboración

Nota: Se adjuntan los soportes correspondientes a lo mencionado en el oficio. Dejando claridad en el hecho de la adjudicación reciente del contratista de obra.

Cordialmente,

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
C.C. 1.121.844.182 de Villavicencio
Representante Legal ARM Consulting S.A.S.

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No DT-SAN 98616

Fecha
06/12/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1757538

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES PATRICIA INES MORALES PADRON
De	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
De Dependencia	DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	ADICIONES Y PRORROGAS CONTRATOS DE INTERVENTORIA

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Respetada Ingeniera,

Teniendo en cuenta que los plazos de los contratos de interventoría están a punto de vencer, las interventorías realizaron solicitud de prórroga y adición para hacer acompañamiento a las obras contratos descritos en la tabla No 1.

No	CONTRATO	CONTRATISTA	PRORROGA HASTA	ADICIÓN
1	1689-2021	CONSORCIO GRUPO METRO	10/02/2023	$ 70.000.000
2	1691-2021	GENERAL SERVICIOS	31/01/2023	$ 40.000.000
3	1651-2022	GAVINCO	31/01/2023	$ 60.000.000
4	1534-2020	IDF-JPS	12/02/2023	$ 40.000.000
5	1427-2022	ARM CONSULTING S.A.S	30/06/2023	N.A
6	2199-2021	SAN JUAN 161	31/01/2023	$ 50.000.000

Por todo lo anterior, desde la supervisión a las interventorías se recomienda aprobar prorrogas y adiciones a los contratos de interventoría, con el fin de garantizar el seguimiento, vigilancia y control de los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los municipios en el marco del proyecto “Colombia Rural” hasta su total ejecución. nos permitiremos remitir la documentación y anexos pertinente a los correos electrónicos jmperdomo@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co y ovillarreal@invias.gov en calidad de Gestores y Coordinador de los

convenios.

Atentamente,

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Director Territorial Santander

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
06/12/2022 12:06:47 pm	EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Historia del documento

El playón, noviembre 29 de 2022

SPI-500-258-11-2022
Al contestar por favor cite este número

Ingeniero.
EDGAR JESUS ROJAS RAMÍREZ
Director Territorial de INVIAS en Santander
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Bucaramanga, Santander
erojas@invias.gov.co
E. S. M.

Ref. Solicitud de ampliación del plazo de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1292 DE 2022

Dando cumplimento a las obligaciones contraídas por parte del municipio con relación al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1292 DE 2022 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL– NACIONAL., para la ejecución del proyecto fue publicado el proceso de licitación **LP-EP-002-2022**, el cual se encuentra en proceso de adjudicación, su objeto es el: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

Me dirijo a Usted con el único propósito de solicitar la ampliación al plazo actual del convenio, puesto que el término restante es insuficiente para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el convenio, razón por la cual se considera necesario ampliar el plazo del convenio hasta el próximo 30 de ABRIL de 2023 y con ello garantizar la ejecución, recibo a satisfacción y liquidación de la obra.

El motivo de la presente solicitud radica en las siguientes razones:

1. El proceso **LP-EP-002-2022,** actual mente se encuentra en estado de adjudicación.
2. Se necesitaría un tiempo aproximadamente de hasta el 30 de ABRIL de 2023, para terminar las obras derivadas del convenio interadministrativo.
3. Adicionalmente el convenio en mencion tiene un plazo actual hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por los anteriores motivos, solicito respetuosamente se amplíe el plazo de ejecución y cumplimiento dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1292 DE 2022, hasta el 30 de ABRIL del 2023, y de esta manera prever diferentes circunstancias que inciden en el término de ejecución de las obras dentro del proceso **LP-EP-002-2022** y del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1292 DE 2022.

Sin otro particular,

WILMER ALEXANDER BARRIOS COTE
Alcalde Municipal de El Playón

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	12/12/20222 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1407 DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CO-OMBRA RURAL

INTERVENTOR: ANA CONSULTORES SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

RESOLUCIÓN No.: DE

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: (Indicar día/mes/año)

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses o según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/12/20 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 299.986.918,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 299.986.918,00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (En meses incluye las suspensiones sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS				AÑO 2022		AÑO 2023																TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO						H-M	VALOR
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		1,5	$ 9.000.000				$ -	0,30	$ 1.800.000	0,50	$ 3.000.000	0,50	$ 3.000.000	0,50	$ 3.000.000	0,50	$ 3.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2,30	$ 13.800.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.400.000,00		6	$ 32.400.000				$ -		$ -	0,50	$ 2.700.000	1,00	$ 5.400.000	1,00	$ 5.400.000	1,00	$ 5.400.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,50	$ 18.900.000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3.300.000,00		1,5	$ 4.950.000				$ -		$ -	0,50	$ 1.650.000	1,00	$ 3.300.000	1,00	$ 3.300.000	1,00	$ 3.300.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,50	$ 11.550.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conformar esta bolsa de especilistas de amarillo)				$ 9.922.472																								
	1	Especialista en Estructuras	$ 6.490.000,00	$ -						$ -		$ -	0,25	$ 1.622.500	0,25	$ 1.622.500		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 3.245.000
	1	Especialista en pavimentos y/o vias	$ 6.490.000,00	$ -						$ -		$ -	0,25	$ 1.622.500	0,25	$ 1.622.500		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 3.245.000
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.490.000,00	$ -						$ -		$ -	0,25	$ 1.622.500	0,25	$ 1.622.500		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 3.245.000
	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.490.000,00	$ -						$ -		$ -	0,25	$ 1.622.500	0,25	$ 1.622.500		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 3.245.000
	1	Profesional Ambiental	$ 3.800.000,00	$ -	1,0	$ 3.800.000				$ -		$ -		$ -	0,40	$ 1.520.000	0,40	$ 1.520.000	0,40	$ 1.520.000		$ -		$ -		$ -		$ -	1,20	$ 4.560.000
	1	Profesional Social	$ 3.800.000,00	$ -	1,0	$ 3.800.000				$ -		$ -	0,40	$ 1.520.000	0,40	$ 1.520.000	0,40	$ 1.520.000	0,40	$ 1.520.000		$ -		$ -		$ -		$ -	1,60	$ 6.080.000
		PERSONAL TECNICO																												
	1	Inspector	$ 2.100.000,00	$ -	3,00	$ 6.300.000				$ -		$ -	0,50	$ 1.050.000	1,00	$ 2.100.000	1,00	$ 2.100.000	0,50	$ 1.050.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 6.300.000
	1	Inspector SST	$ 2.100.000,00	$ -	3,00	$ 6.300.000				$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.100.000	1,00	$ 2.100.000	0,50	$ 1.050.000		$ -		$ -		$ -		$ -	2,50	$ 5.250.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	Secretaria	$ 1.100.000,00	$ -	3,00	$ 3.300.000				$ -		$ -	0,50	$ 550.000	1,00	$ 1.100.000	1,00	$ 1.100.000	1,00	$ 1.100.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,50	$ 3.850.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 70.772.472,00				$ -		$ 1.800.000		$ 16.960.000		$ 26.530.000		$ 20.040.000		$ 17.940.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 83.270.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 188.263.034,00				$ -		$ 4.248.000,00		$ 40.025.600,00		$ 62.610.800,00		$ 47.294.400,00		$ 42.338.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 196.517.200,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2022 DICIEMBRE		AÑO 2023 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO								TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
	1	Especialistas y Director	$ 175.000,00	DIA	6,00	$ 1.050.000				$-		$ -	4,00	$ 700.000	4,00	$ 700.000	4,00	$ 700.000	4,00	$ 700.000		$ -		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 2.800.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
	1	Camioneta o Campero igual o superior a 2000 c.c (1) (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 6.000.000,00	Mes	3	$ 18.000.000				$-		$ -	0,50	$ 3.000.000	1,00	$ 6.000.000	1,00	$ 6.000.000	1,00	$ 6.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,50	$ 21.000.000
	1	Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 950.000,00	Mes	6	$ 5.700.000						$ -		$ -	1,00	$ 950.000	1,00	$ 950.000	1,00	$ 950.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 2.850.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.300.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 18.900.000				$-		$ -		$ -	0,50	$ 3.150.000	0,50	$ 3.150.000	0,50	$ 3.150.000		$ -		$ -		$ -		$ -	1,50	$ 9.450.000
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 1.800.000				$-		$ -		$ -	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000	1,00	$ 600.000		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 1.800.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 3.900.000				$-		$ -	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000	1,00	$ 1.300.000		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 5.200.000
		OTROS COSTOS																												
	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.730.000,00	Según comprobante por mes	6	$ 10.380.000				$-		$ -	1,00	$ 1.730.000	1,00	$ 1.730.000	1,00	$ 1.730.000	1,00	$ 1.730.000		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 6.920.000
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 1.950.000				$-		$ -	1,00	$ 650.000	1,00	$ 650.000	1,00	$ 650.000	1,00	$ 650.000		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 2.600.000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 605.001,00	Según comprobante por mes	3	$ 1.815.003				$-		$ -	1,00	$ 605.001	1,00	$ 605.001	1,00	$ 605.001	1,00	$ 605.001		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 2.420.004
	1	Veeduria Técnica Comunitaria	$ 105.001,00	Según comprobante por mes	3	$ 315.003				$ -		$ -	1,00	$ 105.001	1,00	$ 105.001	1,00	$ 105.001	1,00	$ 105.001		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 420.004

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

		Ajuste al peso y/o valor remanente																													
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ 63.810.006			$ -	$ -	$ 8.060.002,00	$ 15.790.002,00	$ 15.790.002,00	$ 15.790.002,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.460.008,00										
*	Valor total básico (C) = (A) + (B)					$ 63.810.006			$ -	$ 4.248.000,00	$ 48.115.602,00	$ 78.400.802,00	$ 63.084.402,00	$ 58.128.402,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251.977.208,00										
*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)																				$ 60.831,00										
*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					$ 252.073.040			$ -	$ 4.248.000,00	$ 48.115.602,00	$ 78.400.802,00	$ 63.084.402,00	$ 58.128.402,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.073.039,00										
*	IVA (F) = (E) * (% IVA)					$ 47.893.878			$ -	$ 807.120,00	$ 9.141.964,38	$ 14.896.152,38	$ 11.986.036,38	$ 11.044.396,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.893.877,56										
*	Costo Total = (E) + (F)					$ 299.966.918,00			$ -	$ 5.055.120,00	$ 57.257.566,00	$ 93.296.954,00	$ 75.070.438,00	$ 69.172.798,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 299.966.916,56										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS										

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS**
Representante Legal
Matrícula No.: 25202-193762 CND

Firma:
Nombre: **EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 68202-090569 STD
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES	VERSIÓN			
	GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES					

CONTRATO No. 1427 DE 2022

INTERVENTOR: ARM CONSULTING S.A.S. CON NIT 822.007.239-7

OBJETO DEL CONTRATO: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26 de octubre de 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre de 2022

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $299.966.918

VALOR ADICIONAL: N/A	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1193222 de fecha 16 de noviembre de 2022 por valor de $299.966.918

DOCUMENTO QUE AMPARA

- Contrato principal número 1427 de fecha 26 de octubre de 2022

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

1. Póliza Única de Cumplimiento No: CSC-100026060		**Anexo: No. 0**		**FECHA: 26/10/2022**	**Aseguradora:**	**SEGUROS MUNDIAL**
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DESDE:	26/10/2022	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$29.996.691,80
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	DESDE:	26/10/2022	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$149.983.459
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	DESDE:	26/10/2022	HASTA:	31/12/2025	VALOR:	$59.993.383,60
d). Calidad del Servicio	DESDE:	Vigencia de 5 años contados a partir del acta de recibo definitivo de la interventoría			VALOR:	$89.990.075,40

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/22 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1427 DE 2022 **INTERVENTOR:** ARM CONSULTING SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

FECHA DE INICIO: 12/12/22

PLAZO INICIAL: 31/12/22

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 299.966.918,00

VALOR ACUMULADO: $ 299.966.918,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 29.996.691,80	26	10	2022	1/07/23		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 149.983.459,00	26	10	2022	1/07/23		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 59.993.383,60	31	12	2022	31	12	2025
Calidad del servicio	30%	$ 89.990.075,40	31	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CSC-100026060

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 23/11/22

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	14/12/22
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MAURICIO ROMERO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-187578 CND

Firma

Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-090549 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1427 de 2022

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	**x**	
SICO:	**x**	
SEPRO:	**x**	
CIFRA:		**x**
GESPROY:		**x**

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 21 días del mes de diciembre del año 2022.

Firmado digitalmente por PATRICIA INÉS MORALES PADRON

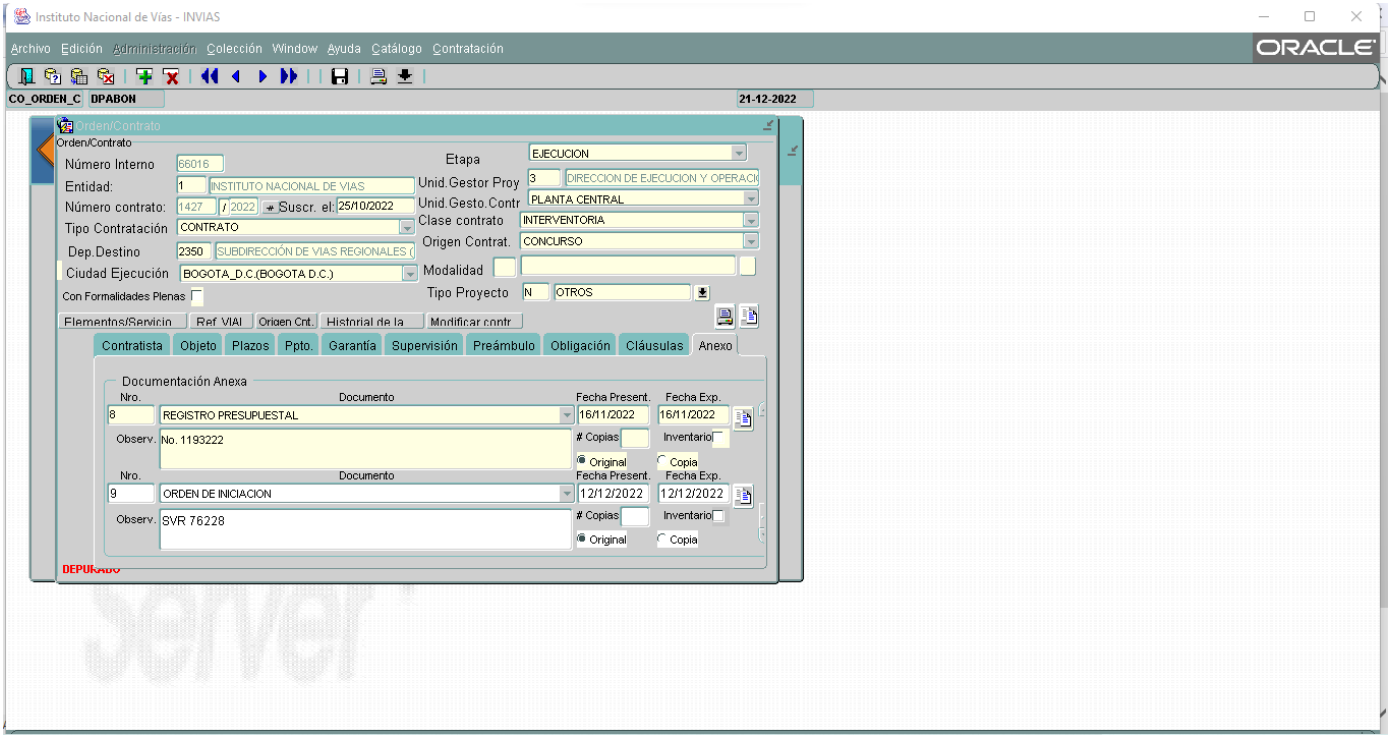
Nombre: Patricia Inés Morales Padrón
Ordenador del Pago
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Oscar Javier Villarreal Neira
Coordinador del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

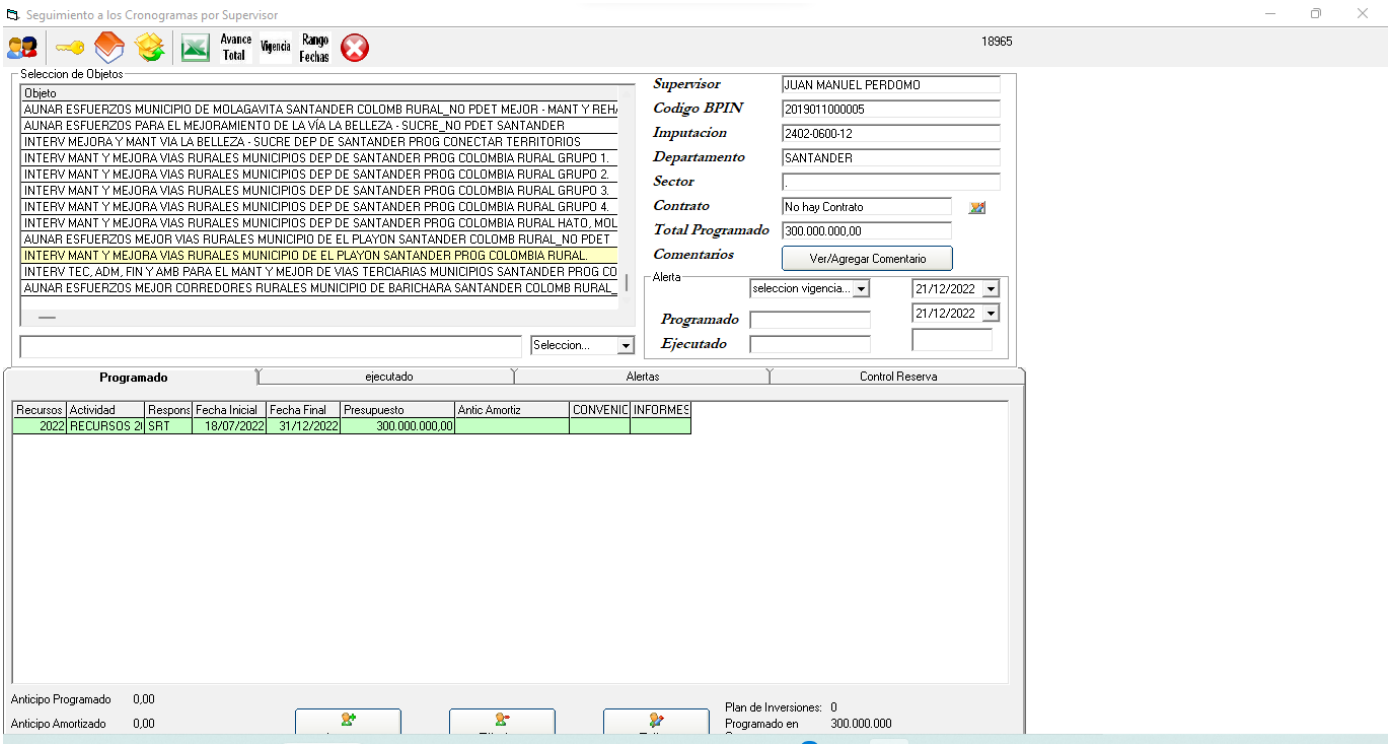
Juan Manuel Perdomo H.

Nombre: Juan Manuel Perdomo Hernandez
Gestor del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales

SICO


Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación
ORACLE
CO_ORDEN_C DPABON
21-12-2022
Orden/Contrato
Número Interno 66016
Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número contrato: 1427 / 2022 Suscr. el: 25/10/2022
Tipo Contratación CONTRATO
Dep.Destino 2350 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Ciudad Ejecución BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)
Con Formalidades Plenas
Etapa EJECUCION
Unid.Gestor Proy 3 DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACI
Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL
Clase contrato INTERVENTORIA
Origen Contrat. CONCURSO
Modalidad
Tipo Proyecto N OTROS
Elementos/Servicio Ref. VIAL Origen Cnt. Historial de la Modificar contr
Contratista Objeto Plazos Ppto. Garantía Supervisión Preámbulo Obligación Cláusulas Anexo
Documentación Anexa
Nro. Documento Fecha Present. Fecha Exp.
8 REGISTRO PRESUPUESTAL 16/11/2022 16/11/2022
Observ. No. 1193222
Copias Inventario
Original Copia
9 ORDEN DE INICIACION 12/12/2022 12/12/2022
Observ. SVR 76228
DEPURADO

SEPRO


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
18965
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
Seleccion de Objetos
Objeto
AUNAR ESFUERZOS MUNICIPIO DE MOLAGAVITA SANTANDER COLOMB RURAL_NO PDET MEJOR - MANT Y REH
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE_NO PDET SANTANDER
INTERV MEJORA Y MANT VIA LA BELLEZA - SUCRE DEP DE SANTANDER PROG CONECTAR TERRITORIOS
INTERV MANT Y MEJORA VIAS RURALES MUNICIPIOS DEP DE SANTANDER PROG COLOMBIA RURAL GRUPO 1.
INTERV MANT Y MEJORA VIAS RURALES MUNICIPIOS DEP DE SANTANDER PROG COLOMBIA RURAL GRUPO 2.
INTERV MANT Y MEJORA VIAS RURALES MUNICIPIOS DEP DE SANTANDER PROG COLOMBIA RURAL GRUPO 3.
INTERV MANT Y MEJORA VIAS RURALES MUNICIPIOS DEP DE SANTANDER PROG COLOMBIA RURAL GRUPO 4.
INTERV MANT Y MEJORA VIAS RURALES MUNICIPIOS DEP DE SANTANDER PROG COLOMBIA RURAL HATO, MOL
AUNAR ESFUERZOS MEJOR VIAS RURALES MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER COLOMB RURAL_NO PDET
INTERV MANT Y MEJORA VIAS RURALES MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER PROG COLOMBIA RURAL.
INTERV TEC, ADM, FIN Y AMB PARA EL MANT Y MEJOR DE VIAS TERCIARIAS MUNICIPIOS SANTANDER PROG CO
AUNAR ESFUERZOS MEJOR CORREDORES RURALES MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER COLOMB RURAL_
Seleccion...
Supervisor JUAN MANUEL PERDOMO
Codigo BPIN 2019011000005
Imputacion 2402-0600-12
Departamento SANTANDER
Sector .
Contrato No hay Contrato
Total Programado 300.000.000,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
21/12/2022
21/12/2022
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos Actividad Respons Fecha Inicial Fecha Final Presupuesto Antic Amortiz CONVENIC INFORMES
2022 RECURSOS 2(SRT 18/07/2022 31/12/2022 300.000.000,00
Anticipo Programado 0,00
Anticipo Amortizado 0,00
Plan de Inversiones: 0
Programado en 300.000.000

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4145855
Número del Contrato	1427-2022
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.
Tipo	Interventoría
Fecha de inicio del contrato:	9 días de tiempo transcurrido *(12/12/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	10 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(1/01/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

ARM CONSULTING SAS

COLOMBIA, Villavicencio

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARM CONSULTING SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	351223466

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Johathan Andres Gaviria Contreras* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 9:23:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 12:25:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_4145855_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4145855_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Número del proceso	CMA-DEO-SVR-23-2022 (Presentación de oferta)
Título del proceso	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Presentació
Descripción	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
Duración del contrato	68 (Días)

Unidad de contratación Subdirección de Vías Regionales
Título de la oferta ARM CONSULTING_SVR-23-2022
Tipo Interventoría
Cuantía del contrato 299.966.918 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: Sí — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
Sector: Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No — Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir
El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No
Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No
Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No
◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10
Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No
Fecha límite para entrega de garantías: 28/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin

CO1.WRT.10175890	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	329.963.609,8 COP	Seguros Mundial SA	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
CO1.WRT.10140337	Seriedad de la oferta		30.000.000 COP	-	22/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección: Calle 25 G No. 73B-90
Código postal: 110931

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubic
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.	COI El P

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.4145855

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado
300.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
1	81101500	INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA	1,00	UN	300.000.000,00	299.966.918,00	300.000.000,0

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CTO 1427 DE 2022 - CMA-DEO-SVR-23-2022 ok.pdf	CTO 1427 DE 2022 - CMA-DEO-SVR-23-2022 ok.pdf
Antecedentes unidos.pdf	Antecedentes unidos.pdf
6. Convenio 1292 DE 2022 (1).pdf	6. Convenio 1292 DE 2022 (1).pdf
Documentos unidos contratista.pdf	Documentos unidos contratista.pdf
historial unidos.pdf	historial unidos.pdf
divergencias 22 de octubre del 2022.pdf	divergencias 22 de octubre del 2022.pdf
OFERTA CORREGIDA ARITMETICAMENTE ARM 023.pdf	OFERTA CORREGIDA ARITMETICAMENTE ARM 023.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edwin Javier Galvis Acevedo	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	91108270
Supervisor		**Tipo de documento**		**Número de documento**	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Edwin Javier Galvis Acevedo	26/10/2022 12:25:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Javier Galvis

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	299.966.918
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	299.966.918

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutor
☐	210722	CDP	Generado	300.000.000 COP	299.966.918 COP	24-02-00

Saldo de CDP 300.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 299.966.918 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/10/2022 9:40 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ORDEN DE INICIO SVR 76228.pdf	ORDEN DE INICIO SVR 76228.pdf	Entidad Estatal	D
RP 1193222 DEL CON 1427-2022 SVR FIRMADO.pdf	RP 1193222 DEL CON 1427-2022 SVR FIRMADO.pdf	Entidad Estatal	D

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
