**ACTA No 01 COMITÉ DE COORDINACIÓN**

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 014 DE 2022 (Numeración SGC) / 300 DE 2022 (Numeración ANH)**

**FECHA:** 25/08/2022
**LUGAR:** Virtual TEAMS

**ORDEN DEL DÍA**:

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES
2. OBJETIVO
3. DESARROLLÓ COMPONENTE TECNICO
    a. Presentación de las Zonas proyectadas del Convenio
    b. Cronograma del convenio desde el componente técnico.
    c. Compromisos
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINACIERO Y CONTRACTUAL
5. COMPONENTES EXTERNOS Y RIESGOS ASOCIDOS AL CONVENIO

## 1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES:

El Supervisor del Convenio por parte de la ANH inicia la reunión, agradece la asistencia y expone el orden del día.

| Funcionarios | Cargo en el Convenio | Entidad |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Rey G | Supervisor del Convenio | Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH |
| José Miguel De Armas Pedraza | Gerente Gestión del Conocimiento / Asesor Presidencia | Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH |
| Liliana María Zuleta Tobón | Vicepresidenta Técnica | Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH |
| José Gilberto Bermúdez | Supervisor del Convenio | Servicio Geológico Colombiano |
| José William Garzón Solís | Gerente del proyecto | Contratistas En Territorio - Convenio |
| Jairo Osorio | Asesor Nacional | Contratistas En Territorio - Convenio |
| Edwin Marín Cardona | Coordinador Técnico del proyecto | Contratistas En Territorio - Convenio |
| Deisy Milena Peña | Coordinadora Financiera del proyecto | Contratistas En Territorio - Convenio |
| Leonardo Herrera | Coordinador Financiero del proyecto | Contratistas En Territorio - Convenio |
| Rene Sotelo Granados | Coordinador Jurídico del proyecto | Contratistas En Territorio - Convenio |
| Luis Eduardo Peña Nuñez | Coordinador Administrativo del proyecto | Contratistas En Territorio - Convenio |

## 2. OBJETIVO

El objetivo de la reunión es derivado del cumplimiento del Comité de Coordinación del Convenio y de de las funciones asignadas como supervisores y ejecutores del Convenio Interadministrativo 014/300 de 2022 suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano, en adelante SGC y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en adelante ANH, en el cual se detallan los avances de las actividades realizadas, las eventualidades y las posibles alternativas de solución si a ellas hubiere lugar, entre el 01 al 31 de agosto del 2022

## 2. DESARROLLÓ COMPONENTE TECNICO

a. Presentación de las Zonas proyectadas del Convenio

- El Gerente del Convenio hace una corta introducción sobre la finalidad del proyecto en la cual la ejecución del convenio se plantea la adquisición de información magnetotelúrica sobre dos secciones localizadas en el área de influencia de los municipios de Moñitos, San Pelayo, Cereté, Ciénaga de Oro, Canalete, Montería, Planeta Rica y Buenavista en el Departamento de Córdoba y Arboletes en el Departamento de Antioquia como se evidencia en la imagen 01

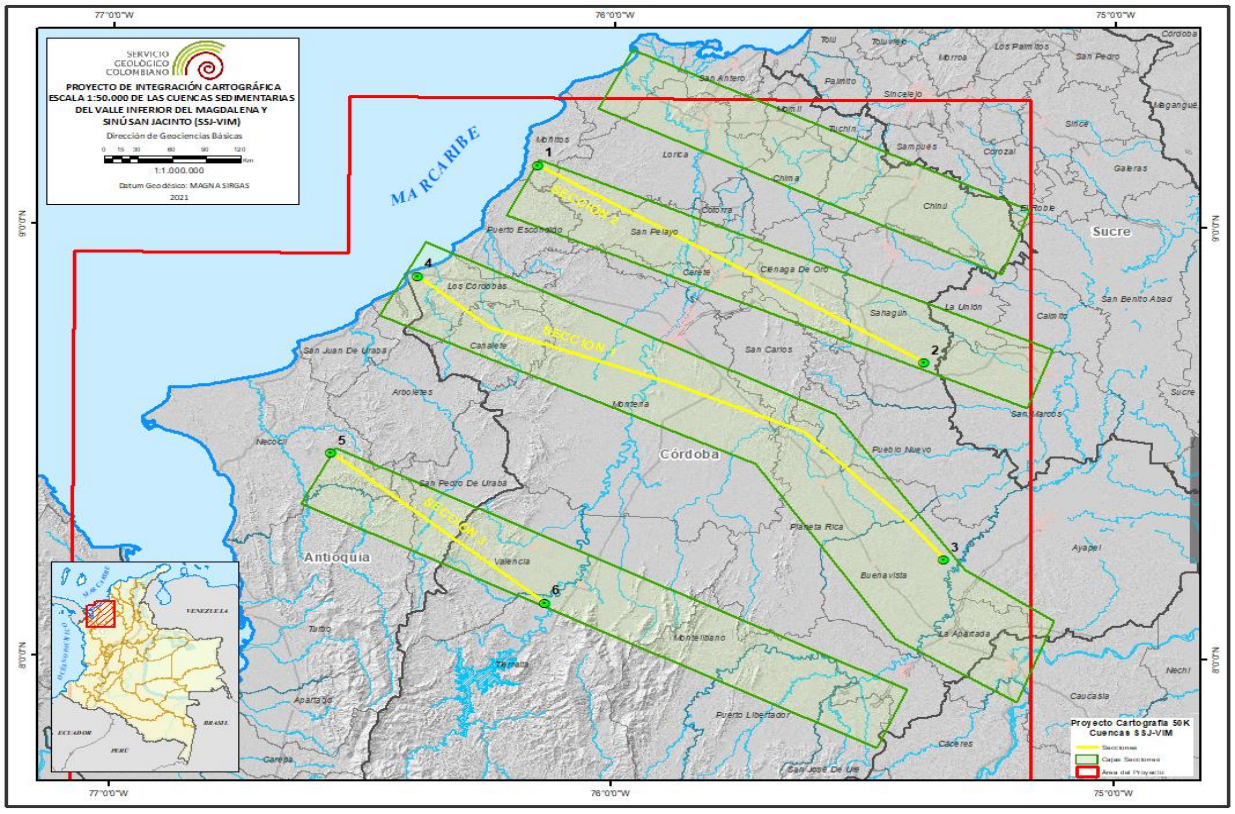


Imagen No. 1. Secciones MT para adquirir en las Cuencas VIM y SSJ. Fuente Propia.

- El Coordinador Técnico del convenio refiere a los asistentes que el área proyectada para la ejecución del convenio es la Zona Norte de VIM y SSJ y se presenta en la Imagen No 02.

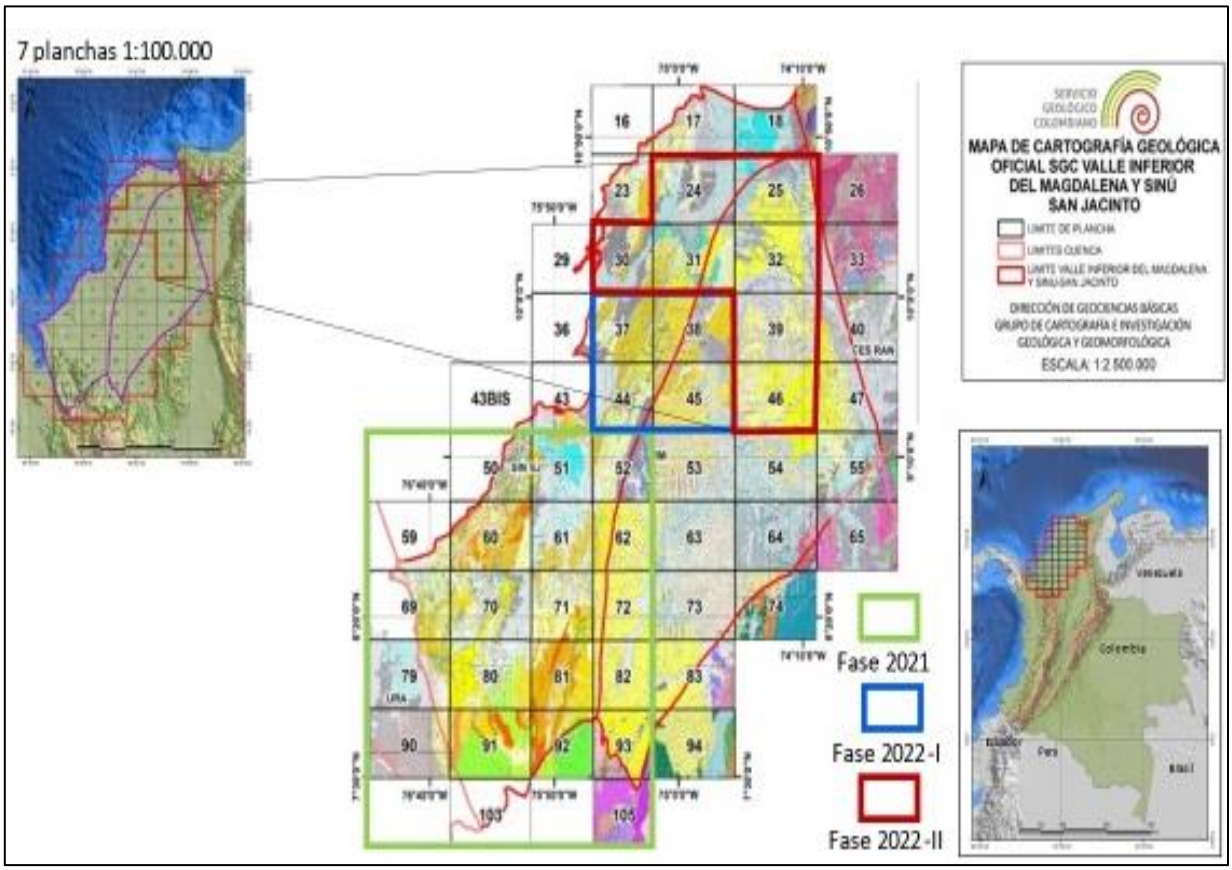



Imagen No. 02 - Ubicación Fase II - Área de estudio SSJ VIM - Fuente Propia

- El Coordinador Técnico del convenio enuncia los productos fijados en el convenio que se relacionan a continuación y los cuales serán objeto de seguimiento por parte del supervisor del contrato, basados en la información reportada por los profesionales contratados para el desarrollo de las actividades.

- P1- MAPA DE INTEGRACIÓN CARTOGRÁFICA EN ESCALA 50K DE LA ZONA NORTE DE LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA Y NORTE DEL SINÚ SAN JACINTO. (EQUIVALENTE A SIETE (7) PLANCHAS 100.000).

- P2- DOCUMENTO DE CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA Y CARTA BIOESTRATIGRÁFICA DE INFORMACIÓN DE SUPERFICIE Y POZOS ESTRATIGRÁFICOS.

- P3 DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA Y PLAN DE MANEJO SOCIAL – PMS, DE UNA (1) PERFORACIÓN TIPO *SLIM HOLE* PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS ESTRATIGRÁFICOS EN LA ZONA DEFINIDA POR LA ANH, Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA ANH SOBRE LA PERFORACIÓN DE POZOS ESTRATIGRÁFICOS.

- P4 DISEÑO, LOCALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE UNA (1) SECCIÓN DE INFORMACIÓN MAGNETOTELÚRICA (200 PUNTOS) PARA EL PROCESAMIENTO E INTEGRACIÓN EN UN MODELO GEOFÍSICO DEL SUBSUELO A LA INFORMACIÓN GEOFÍSICA EXISTENTE (SÍSMICA DE REFLEXIÓN, GRAVIMETRÍA Y MAGNETOMETRÍA) EN LA ZONA NORTE DE LA CUENCA VIM-SSJ.

**b. Cronogramas Convenio**

**Coordinador Técnico del convenio**

Las actividades para realizar son expuestas a los asistentes el cronograma, tal como se visualiza en la taba No. 01, con las actividades proyectadas y para lo cual se realizará el seguimiento mensual.

| CRONOGRAMA GENERAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CARTOGRÁFICA CUENCAS SSJ-VIM FASE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| **CONTRATACIÓN DE PERSONAL - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES** | 90% | 5% | 5% | | |
| **Avance** | | | | | |

Fuente Propia – Proyeccion de Actividades

**TABLA No. 01 P1 INTEGRACION CARTOGRAFICA**

| ACTIVIDADES | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Montaje y administración de la Plataforma Geomática | 10% | 25% | 25% | 15% | 25% |
| | | | | | | |
| A2 | Elaboración base cartográfica | 30% | 60% | 10% | | |
| | | | | | | |
| A3 | Diseño de flujos y cargas de trabajo | 100% | | | | |
| | | | | | | |
| A4 | Diagnóstico y recopilación de información cartográfica | 60% | 15% | 15% | 10% | |
| | | | | | | |
| A5 | Campañas de levantamiento de campo | | 35% | 35% | 30% | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A6 | Envío de muestras a laboratorios | | 35% | 35% | 30% | |
| | | | | | | |
| A7 | Integración de información | | 15% | 25% | 25% | 35% |
| | | | | | | |
| A8 | Elaboración de interpretación morfotectónica | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | |
| A9 | Elaboración de secciones estructurales | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | |
| A10 | Elaboración de material gráfico y productos. | | 15% | 25% | 25% | 35% |
| | | | | | | |

**TABLA No. 02** P2 CORRELACION ESTRATIGRAFICA

| ACTIVIDADES | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | Despliegue núcleos en Litoteca | 5% | 25% | 30% | 30% | 10% |
| | | | | | | |
| A12 | Elaboración de Columnas y facies detalladas de pozo | | 15% | 25% | 30% | 30% |
| | | | | | | |
| A13 | Elaboración de cartas faciales | | 15% | 25% | 35% | 25% |
| | | | | | | |
| A14 | Elaboración de cartas de Electro facies | | 15% | 25% | 35% | 25% |
| | | | | | | |
| A15 | Revisión y análisis de información procedente de proyectos ANH previos. | 60% | 15% | 15% | 10% | |
| | | | | | | |
| A16 | Elaboración catálogo de unidades lito estratigráficas | | 15% | 20% | 25% | 40% |
| | | | | | | |
| A17 | Elaboración carta Bioestratigrafía predictiva | | 15% | 20% | 25% | 40% |
| | | | | | | |
| A18 | Elaboración carta lito estratigráfica predictiva | | 15% | 20% | 25% | 40% |
| | | | | | | |
| A19 | Elaboración de material gráfico y productos. | | | 30% | 30% | 40% |
| | | | | | | |

**TABLA No. 03** P3 PREFACTIBILIDAD POZO ESTRATIGRÁFICO *SLIM HOLE*

| ACTIVIDADES | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | Diseño de términos de referencia para perforación *slim hole* | | 20% | 30% | 40% | 10% |
| | | | | | | |
| A21 | Diseño y prognosis de pozo *slim hole* | 5% | 5% | 20% | 40% | 30% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| A22 | Elaboración de PMA | 5% | 25% | 25% | 25% | 20% |
| | | | | | | |
| A23 | Elaboración de PMS | | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | | | |
| A24 | Elaboración de documentos de prepliegos para la perforación de pozo *slim hole* | | | 30% | 30% | 40% |
| | | | | | | |
| A25 | Documento de prefactibilidad social, ambiental y geológica | | | 30% | 30% | 40% |
| | | | | | | |
| A26 | Consulta Previa en lugar de prognosis | | | 35% | 50% | 15% |
| | | | | | | |

**TABLA No. 04** P4 METODO MAGNETOTELÚRICA

| ACTIVIDADES | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A27 | Diseño de términos de referencia para levantamiento de información MT | 100% | | | | |
| | | | | | | |
| A28 | Documentos Prefactibilidad Ambiental y social | 70% | 30% | | | |
| | | | | | | |
| A29 | Levantamiento de información y procesamiento | | 20% | 35% | 35% | 10% |
| | | | | | | |
| A30 | Entrega de informes finales | | | 15% | 40% | 45% |

### a. Compromisos

Próxima reunión para la exposición de las actividades y el cronograma.

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINACIERO Y CONTRACTUAL

| APORTES DEL CONVENIO Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES |
|---|
| Ejecución del convenio<br><br>Para la ejecución del convenio los aportes de la ANH a nivel porcentual ascienden al 87% y el 13% corresponden a los aportes en especie realizados por el SGC, tal como se visualiza en la imagen No. 3 |

## APORTES DEL CONVENIO Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES

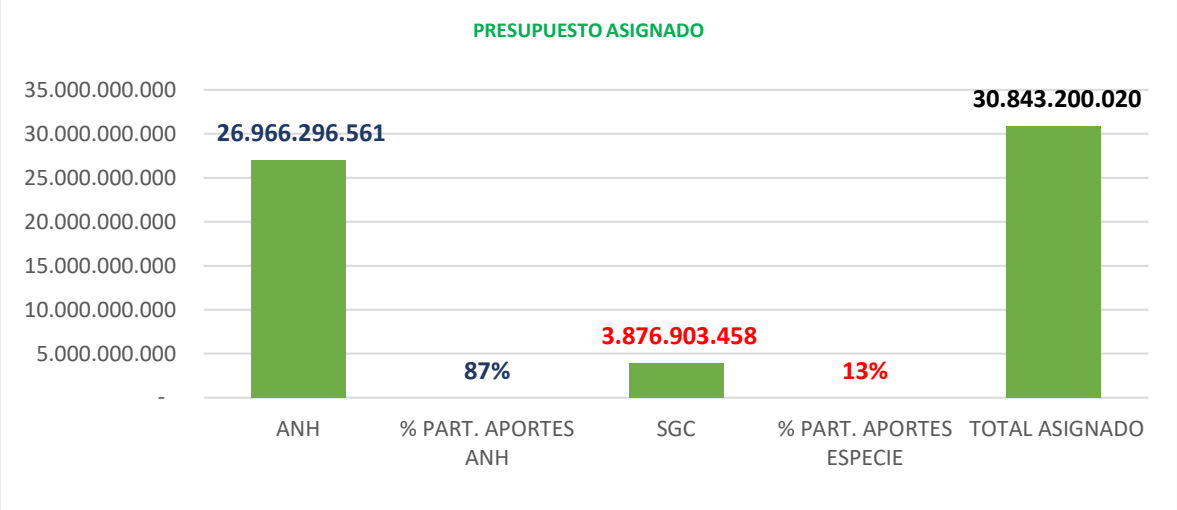



Imagen No. 3 Distribución del presupuesto. Fuente Propia.

Ejecución Contractual

Las actividades pre - contractuales se han gestionado conforme a los procesos internos del Servicio Geológico Colombiano y los lineamientos fijados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial-EN Territorio bajo la propuesta técnico-económica presentada y aprobada por la ANH en el marco del convenio.

Plan de contratación de personal.

La contratación inició bajo la suscripción del Contrato Interadministrativo de Gestión de Proyectos No. 015 /2022 (numeración SGC) - 222004 (numeración ETN) de 2022, celebrado entre el Servicio Geológico Colombiano - SGC y la Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial- EN TERRITORIO, el cual tiene por objeto *(…) "APOYAR AL SGC CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTE EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH - PLAZO: 31-DIC-2022 SPV: SEC. GRAL (…)"*

## 5. COMPONENTES EXTERNOS Y RIESGOS ASOCIADOS AL CONVENIO

- En este periodo, se dio inicio a toda la planeación para el desarrollo del convenio y cuyos entregables están proyectados mes de diciembre del 2022, con el fin de efectuar los ajustes necesarios previa al cierre de la vigencia actual.
- La contratación del personal, respecto a la planeación inicial que se estimó en un 95% al cierre del periodo se alcanzó la meta del 91%, es decir que para el mes de septiembre se estima alcanzar el 100% de la contratación.
- Desde la Supervisión, se dio inicio al seguimiento de las actividades a partir del 3 de agosto, fecha en la cual se comunicó la designación de la supervisión del presente convenio.

En constancia de lo anterior firman:

**CARLOS ALBERTO REY G**
Supervisor C. I. No. 014/300 de 2022
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

**JOSE GILBERTO BERMUDEZ CORDERO**
Supervisor C. I. No. 014/300 de 2022
Servicio Geológico Colombiano.
