ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

ADICIÓN		PRÓRROGA		ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	X
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4181.010.26.1.313-2022
CONTRATISTA	DIEZ PLUS INGENIERIA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT. No. 900.771.072-2
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, EN EL EDIFICIO COLTABACO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26004117 "CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DE USO INSTITUCIONAL DE SANTIAGO DE CALI", CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADOS
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($844.500.160)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/09/2022
FECHA DE INICIO	01/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2023
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($844.500.160)
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	30/11/2023
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Teniendo como consideración la aclaración al contrato de obra No 4181.010.26.1.313-2022, suscrito con DIEZ PLUS INGENIERIA, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, EN EL EDIFICIO COLTABACO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26004117 "CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DE USO INSTITUCIONAL DE SANTIAGO DE CALI", CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADOS.

Habida cuenta de lo anterior, el ingeniero EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA, Representante Legal de la empresa interventora DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S., el día siente (07) de diciembre de 2022, mediante el oficio DPI-UAGEBS-313-025-2022, Justifica avance obra Edificio COLTABACO al 31 diciembre, en el cual indica que:

"nos permitimos informar a ustedes los motivos por los cuales la ejecución presupuestal del contrato para la presente vigencia no puede llegar al valor previsto del 33% a pesar de la voluntad de las partes, ya que se han presentado algunas variantes que han afectado directamente la ejecución de obra y por ende el normal desarrollo del proyecto.

A continuación, se enuncia el desarrollo de cronológico del proyecto y las circuncisa presentadas:
Agosto 19 de 2022: Acta de adjudicación según resolución No 4181.010.21.1.26 de 2022.

Después de la adjudicación del contrato se inicia con la consecución y contratación del personal requerido de obra según pliego de licitaciones, posteriormente se procede con el inicio de planeación de obra, concerniente en la revisión de presupuesto, planos, diseños y especificaciones entregados en la licitación.

Septiembre 19 de 2022: Acta de Inicio de Obra.

Se hace acta de inicio de obra junto con la entrega física del edificio COLTABACO por parte de la UAEGBS a interventoría, y esta a su vez al contratista Consorcio Reforzamiento EDICOL. Posterior a la entrega se procede a instalar y acondicionar las oficinas provisionales de obra, también se inicia con el replanteo y localización de las actividades a realizar, se continua con la revisión y planeación de obra, dentro de la revisión y la localización se detectaron ítems no previstos, también se identificaron mayores y menores cantidades de obra, que afectaron el desarrollo de la obra, ya que no se podían ejecutar hasta tanto no estuviera la aprobación y el otrosí correspondiente.

Noviembre 18 de 2022: Firma de Otro sí No 1 donde se incluyen los siguientes ítems no previstos:

INP-001	CERRAMIENTO EN LAMINA CAL 16 - IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ALTURA H=2,44 m INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, VINILO FULL COLOR Y DISEÑO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

INP-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECCIÓN BALDOSA TRIPLEX 3,2MM
INP-004	Desmonte y demolición de cielo falso en mortero + malla
INP-005	DESMONTE O DEMOLICION GUARDAESCOBAS CEMENTO EXISTENTE PARA RESTAURACIÓN Y REISNTALACIÓN
INP-006	Diseño gráfico para vinilo adhesivo cerramiento
INP-007	DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS DE 4 A 6 CIRCUITOS (INCLUYE DESMONTE DE BREAKER)
INP-008	Desmonte de bandeja eléctrica (incluye desmonte de soportería y tornillería)
INP-009	DESMONTE DE CLOSET EN MADERA Y METALICOS (INCLUYE DESMONTE DE FIJACION)
INP-010	DEMOLICION DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO DE CONFINAMIENTO EN MUROS (INCLUYE DESMONTE DE ACERO DE REFUERZO)

En esté otrosí también se incluyeron las siguientes mayores y menores cantidades:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados).	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANTIDADES	CANT. FINAL
MAYOR (+)			**MENOR (-)**		
1			**PRELIMINARES**		
1,3	Cerramiento en lámina - Imagen institucional del proyecto. Altura h=2.10 m.	m2	172,50	-172,50	0,00
SUBTOTAL CAPITULO 2			**DESMONTES**		
2,7	Desmonte de carpintería metálica existente (puertas, rejas, ventanas).	m2	5,76	50,99	56,75
2,9	Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro y disposición final.	und	86,00	17,00	103,00


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

2,10´	Desmonte de redes eléctricas (incluye aparatos, luminarias y cableados).	und	157,00	868,00	1.025,00
2,13	Desmonte de cerramientos en madera existente.	m2	784,78	-17,01	767,77
2,14	Desmonte de divisiones de madera con vidrio.	ml	9,32	11,28	20,60
2,15	Desmonte de marco y puerta de madera.	und	138,00	49,00	187,00
2,17	Desmonte de cielo raso en madera ranurada.	m2	108,03	21,43	129,46
SUBTOTAL CAPITULO 3			**DEMOLICIONES**		
3,2	Demolición de muros en ladrillo e>0.15 m.	m2	8,39	87,88	96,27
SUBTOTAL CAPITULO 8			**PISOS Y ENCHAPES**		
8,1	Esmaltado de pisos en concreto	m2	478,40	-478,40	0,00
9			**HERRAJES Y MOBILIARIO**		
9,1	Mueble de recepción en madera	und	4,00	-4,00	0,00
9,2	Tableros especiales en vidrio	glb	1,00	-1,00	0,00
9,3	Mueble de pared tipo archivo	m2	365,85	-365,85	0,00
9,4	Muebles de estudio y de consulta	und	44,00	-23,00	21,00
9,5	Suministro e instalación de divisiones móviles plegables	glb	1,00	-1,00	0,00


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

SUBTOTAL CAPITULO 24			**PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**		
24.2.6	Actas de vecindad (inicio y cierre)	und	150,00	56,00	206,00
SUBTOTAL CAPITULO					

Adicionalmente en terreno no se encontraron las vigas de cimentación que según diseños deberían ser existentes:

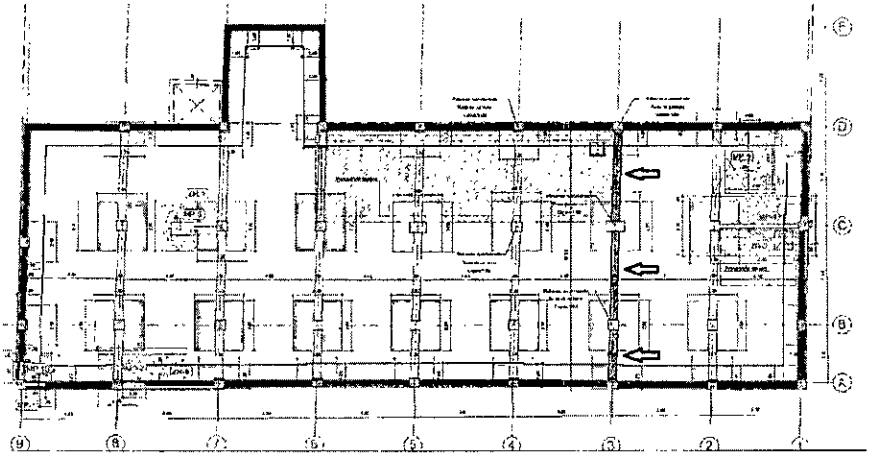


Además, se identificó que algunas zapatas no se encontraban a -7.70 del nivel cero del proyecto, si no a casi dos metros más superficiales de los que se habían considerado en los diseños, esto afecto el diseño del tanque de la RCI, haciendo que se rediseñaran tanto el tanque, como las vigas de cimentación, esto afectando

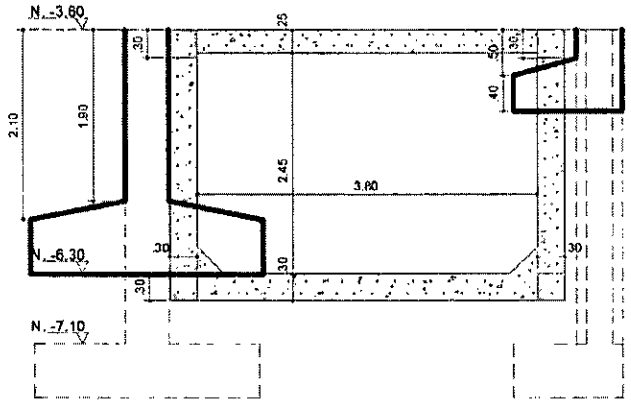

Por último, en los meses trascurridos se han presentado días con lluvias, los cuales se relacionan a continuación:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

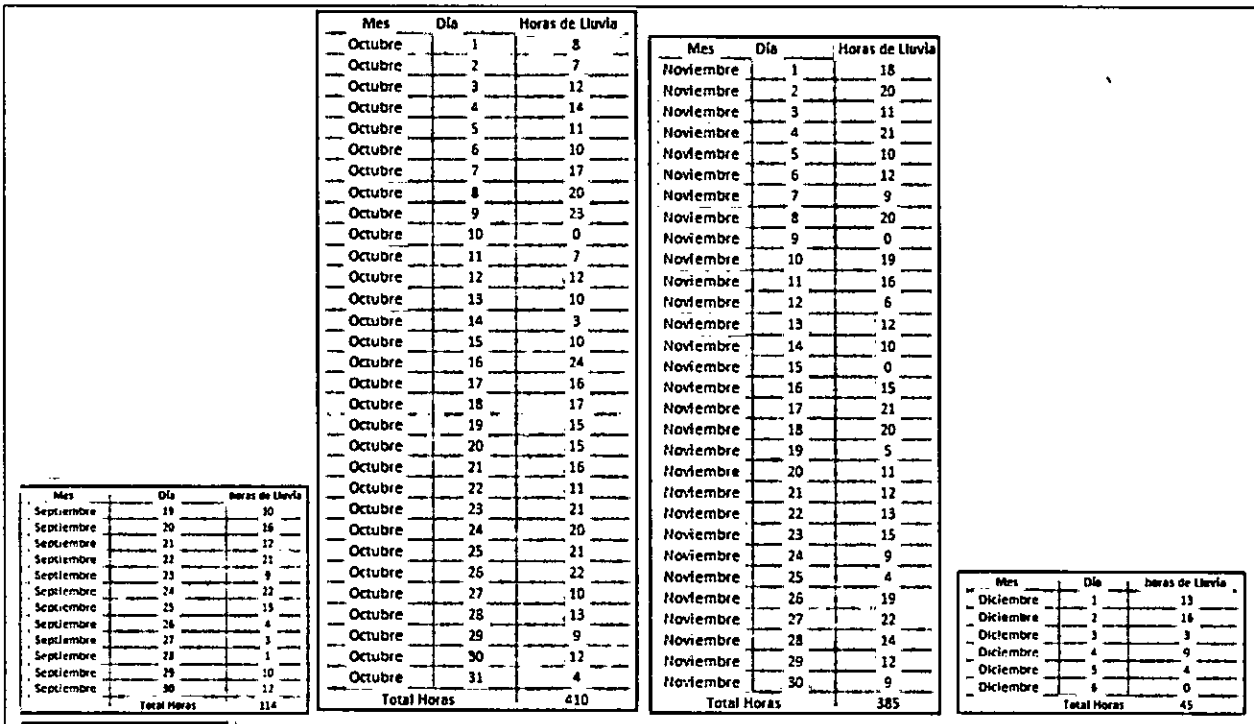

Mes	Día	Horas de Lluvia
Octubre	1	8
Octubre	2	7
Octubre	3	12
Octubre	4	14
Octubre	5	11
Octubre	6	10
Octubre	7	17
Octubre	8	20
Octubre	9	23
Octubre	10	0
Octubre	11	7
Octubre	12	12
Octubre	13	10
Octubre	14	3
Octubre	15	10
Octubre	16	24
Octubre	17	16
Octubre	18	17
Octubre	19	15
Octubre	20	15
Octubre	21	16
Octubre	22	11
Octubre	23	21
Octubre	24	20
Octubre	25	21
Octubre	26	22
Octubre	27	10
Octubre	28	13
Octubre	29	9
Octubre	30	12
Octubre	31	4
Total Horas		410

Mes	Día	Horas de Lluvia
Noviembre	1	18
Noviembre	2	20
Noviembre	3	11
Noviembre	4	21
Noviembre	5	10
Noviembre	6	12
Noviembre	7	9
Noviembre	8	20
Noviembre	9	0
Noviembre	10	19
Noviembre	11	16
Noviembre	12	6
Noviembre	13	12
Noviembre	14	10
Noviembre	15	0
Noviembre	16	15
Noviembre	17	21
Noviembre	18	20
Noviembre	19	5
Noviembre	20	11
Noviembre	21	12
Noviembre	22	13
Noviembre	23	15
Noviembre	24	9
Noviembre	25	4
Noviembre	26	19
Noviembre	27	22
Noviembre	28	14
Noviembre	29	12
Noviembre	30	9
Total Horas		385

Mes	Día	Horas de Lluvia
Septiembre	19	10
Septiembre	20	16
Septiembre	21	12
Septiembre	22	21
Septiembre	23	9
Septiembre	24	22
Septiembre	25	15
Septiembre	26	4
Septiembre	27	3
Septiembre	28	1
Septiembre	29	10
Septiembre	30	12
Total Horas		114

Mes	Día	Horas de Lluvia
Diciembre	1	13
Diciembre	2	16
Diciembre	3	3
Diciembre	4	9
Diciembre	5	4
Diciembre	6	0
Total Horas		45

Total horas	954
Total días	39,75

Si las horas de lluvias generadas desde el inicio de la obra las convertimos en días, nos da cerca de 40 días, que afecta en el rendimiento de ejecución de obra.

Todas estas variantes dan como resultado una ejecución presupuestal máxima del 11% durante la presente vigencia"

Por todas estas razones, teniendo en cuenta que la ejecución de la interventoría se realiza de forma paralela a la de obra, y con la debida justificación de reserva de los recursos de obra que no podrán ser ejecutados en la vigencia 2022, la supervisión a la interventoría considera pertinente realizar la reserva de los recursos correspondientes al 22% del presupuesto del contrato de interventoría para que puedan ser ejecutados en la vigencia 2023.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
NOMBRE COMPLETO: DORA STELLA CEBALLOS BOLIVAR
Supervisor – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios - UAEGBS
CIUDAD Y FECHA: 13 de diciembre de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

DPI-UAGEBS-313-025-2022

Santiago de Cali, 7 de diciembre de 2022

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
-UAGEBS-
Att. Miguel Francisco Prado
Director Técnico
Cali - Valle – Colombia

Referencia: *CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4181.010.26.1.313-2022 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA OBRA CIVIL PARA LA REHABILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, EN EL EDIFICIO COLTABACO, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26004117 "CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DE USO INSTITUCIONAL DE SANTIAGO DE CALI", CON EL FIN DE MEJORAR LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA DE ACUERDO CON LOS DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA- EMRU MEDIANTE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4181.010.26.1.270-2021"*

Asunto: Justificación avance obra Edificio COLTABACO al 31 diciembre de 2022

Respetado Doctor Prado;

Por medio de la presente, nos permitimos informar a ustedes los motivos por los cuales la ejecución presupuestal del contrato para la presente vigencia no puede llegar al valor previsto del 33% a pesar de la voluntad de las partes, ya que se han presentado algunas variantes que han afectado directamente la ejecución de obra y por ende el normal desarrollo del proyecto.
A continuación, se enuncia el desarrollo de cronológico del proyecto y las circuncisa presentadas:

Agosto 19 de 2022: Acta de adjudicación según resolución No 4181.010.21.1.26 de 2022.

diezplusingenieria@gmail.com
Calle 4 # 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)
(57) 304 578 2489

Después de la adjudicación del contrato se inicia con la consecución y contratación del personal requerido de obra según pliego de licitaciones, posteriormente se procede con el inicio de planeación de obra, concerniente en la revisión de presupuesto, planos, diseños y especificaciones entregados en la licitación.

Septiembre 19 de 2022: Acta de Inicio de Obra.

Se hace acta de inicio de obra junto con la entrega física del edificio COLTABACO por parte de la UAEGBS a interventoría, y esta a su vez al contratista Consorcio Reforzamiento EDICOL. Posterior a la entrega se procede a instalar y acondicionar las oficinas provisionales de obra, también se inicia con el replanteo y localización de las actividades a realizar, se continua con la revisión y planeación de obra, dentro de la revisión y la localización se detectaron ítems no previstos, también se identificaron mayores y menores cantidades de obra, que afectaron el desarrollo de la obra, ya que no se podían ejecutar hasta tanto no estuviera la aprobación y el otrosí correspondiente.

Noviembre 18 de 2022: Firma de Otro sí No 1 donde se incluyen los siguientes ítems no previstos:


INP-001	CERRAMIENTO EN LAMINA CAL 16 - IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ALTURA H=2,44 m INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, VINILO FULL COLOR Y DISEÑO
INP-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECCIÓN BALDOSA TRIPLEX 3,2MM
INP-004	Desmonte y demolición de cielo falso en mortero + malla
INP-005	DESMONTE O DEMOLICION GUARDAESCOBAS CEMENTO EXISTENTE PARA RESTAURACIÓN Y REISNTALACIÓN
INP-006	Diseño gráfico para vinilo adhesivo cerramiento
INP-007	DESMONTE DE TABLEROS ELECTRICOS DE 4 A 6 CIRCUITOS (INCLUYE DESMONTE DE BREAKER)
INP-008	Desmonte de bandeja eléctrica (incluye desmonte de soportería y tornillería)
INP-009	DESMONTE DE CLOSET EN MADERA Y METALICOS (INCLUYE DESMONTE DE FIJACION)
INP-010	DEMOLICION DE VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO DE CONFINAMIENTO EN MUROS (INCLUYE DESMONTE DE ACERO DE REFUERZO)

En esté otrosí también se incluyeron las siguientes mayores y menores cantidades:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados).	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANTIDADES		CANT. FINAL
				MAYOR (+)	MENOR (-)	
1	PRELIMINARES					


1,3	Cerramiento en lámina - Imagen institucional del proyecto. Altura h=2.10 m.	m2	172,50		-172,50	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					
2	**DESMONTES**					
2,7	Desmonte de carpintería metálica existente (puertas, rejas, ventanas).	m2	5,76	50,99		56,75
2,9	Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro y disposición final.	und	86,00	17,00		103,00
2,10´	Desmonte de redes eléctricas (incluye aparatos, luminarias y cableados).	und	157,00	868,00		1.025,00
2,13	Desmonte de cerramientos en madera existente.	m2	784,78		-17,01	767,77
2,14	Desmonte de divisiones de madera con vidrio.	ml	9,32	11,28		20,60
2,15	Desmonte de marco y puerta de madera.	und	138,00	49,00		187,00
2,17	Desmonte de cielo raso en madera ranurada.	m2	108,03	21,43		129,46
	SUBTOTAL CAPITULO					
3	**DEMOLICIONES**					
3,2	Demolición de muros en ladrillo e>0.15 m.	m2	8,39	87,88		96,27
	SUBTOTAL CAPITULO					
8	**PISOS Y ENCHAPES**					
8,1	Esmaltado de pisos en concreto	m2	478,40		-478,40	0,00
9	**HERRAJES Y MOBILIARIO**					
9,1	Mueble de recepción en madera	und	4,00		-4,00	0,00
9,2	Tableros especiales en vidrio	glb	1,00		-1,00	0,00
9,3	Mueble de pared tipo archivo	m2	365,85		-365,85	0,00
9,4	Muebles de estudio y de consulta	und	44,00		-23,00	21,00
9,5	Suministro e instalación de divisiones móviles plegables	glb	1,00		-1,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO					
24	**PLAN DE GESTIÓN SOCIAL**					
24.2.6	Actas de vecindad (inicio y cierre)	und	150,00	56,00		206,00
	SUBTOTAL CAPITULO					

Adicionalmente en terreno no se encontraron las vigas de cimentación que según diseños deberían ser existentes:

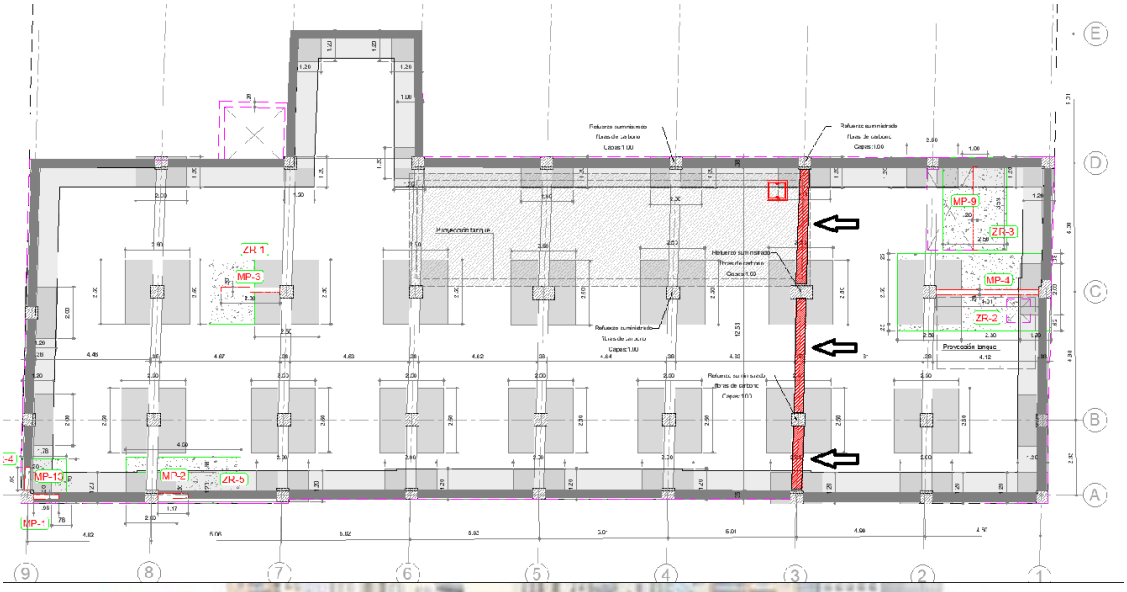

Además, se identificó que algunas zapatas no se encontraban a -7.70 del nivel cero del proyecto, si no a casi dos metros más superficiales de los que se habían considerado en los diseños, esto afecto el diseño del tanque de la RCI, haciendo que se rediseñaran tanto el tanque, como las vigas de cimentación, esto afectando

significativamente el cronograma de obra

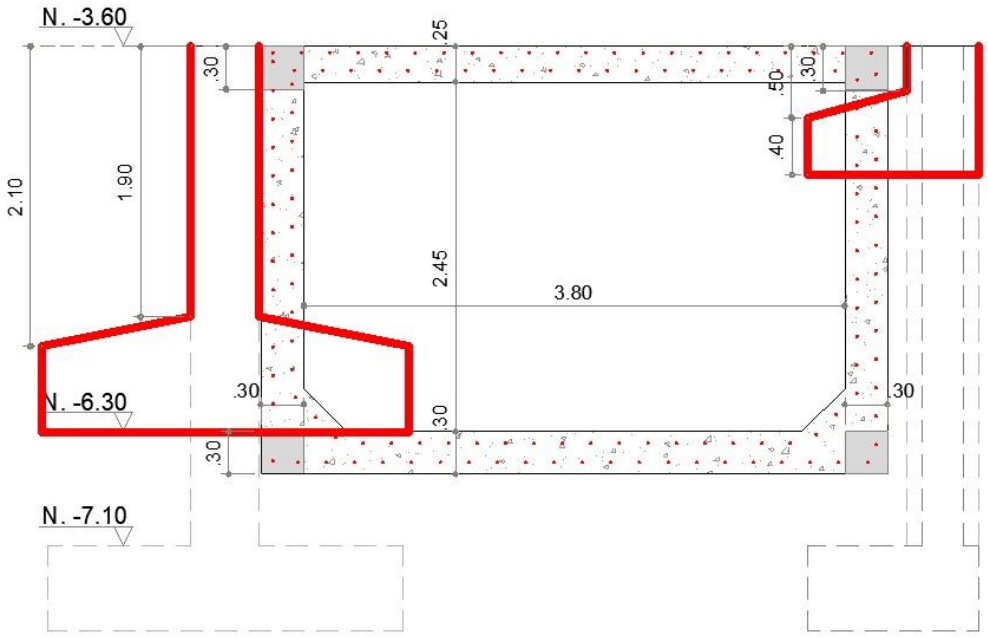


Por último, en los meses trascurridos se han presentado días con lluvias, los cuales se relacionan a continuación:

Mes	Día	horas de Lluvia
Septiembre	19	10
Septiembre	20	16
Septiembre	21	12
Septiembre	22	21
Septiembre	23	9
Septiembre	24	22
Septiembre	25	15
Septiembre	26	4
Septiembre	27	3
Septiembre	28	1
Septiembre	29	10
Septiembre	30	12
	Total Horas	114

DIEZ PLUS

SIEMPRE MÁS CALIDAD

Mes	Día	Horas de Lluvia
Octubre	1	8
Octubre	2	7
Octubre	3	12
Octubre	4	14
Octubre	5	11
Octubre	6	10
Octubre	7	17
Octubre	8	20
Octubre	9	23
Octubre	10	0
Octubre	11	7
Octubre	12	12
Octubre	13	10
Octubre	14	3
Octubre	15	10
Octubre	16	24
Octubre	17	16
Octubre	18	17
Octubre	19	15
Octubre	20	15
Octubre	21	16
Octubre	22	11
Octubre	23	21
Octubre	24	20
Octubre	25	21
Octubre	26	22
Octubre	27	10
Octubre	28	13
Octubre	29	9
Octubre	30	12
Octubre	31	4
Total Horas		410

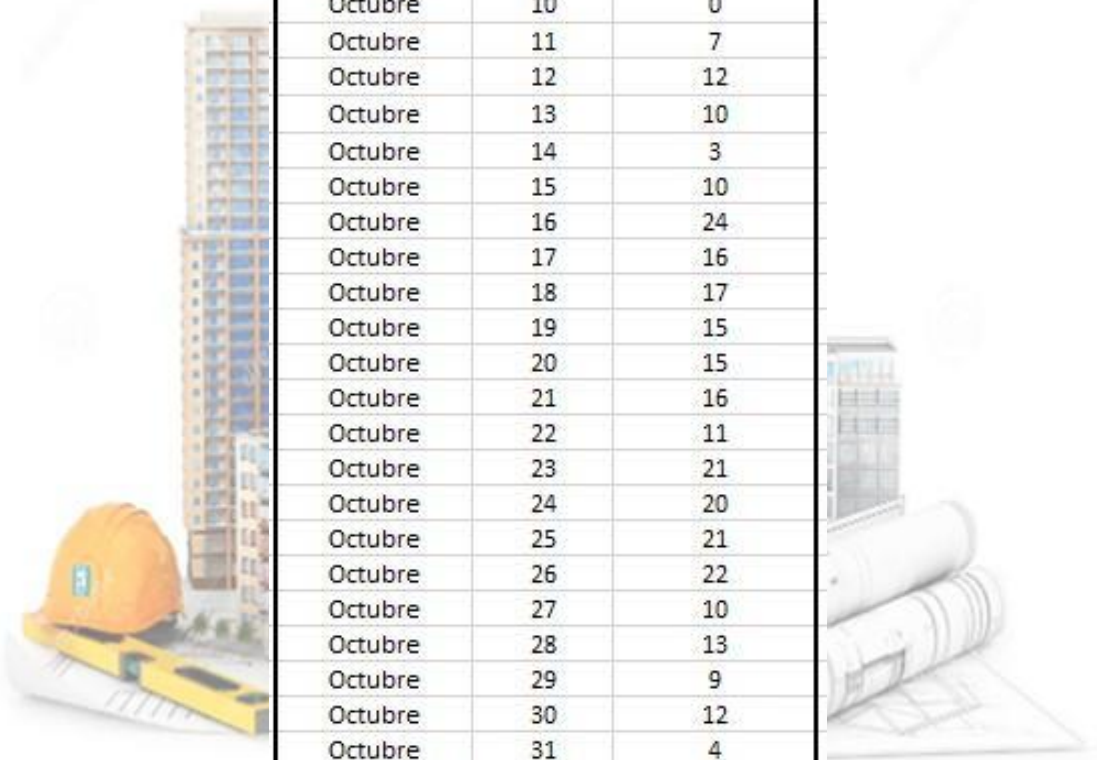

diezplusingenieria@gmail.com

Calle 4 # 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)

(57) 304 578 2489

DIEZ PLUS

SIEMPRE MÁS CALIDAD

Mes	Día	Horas de Lluvia
Noviembre	1	18
Noviembre	2	20
Noviembre	3	11
Noviembre	4	21
Noviembre	5	10
Noviembre	6	12
Noviembre	7	9
Noviembre	8	20
Noviembre	9	0
Noviembre	10	19
Noviembre	11	16
Noviembre	12	6
Noviembre	13	12
Noviembre	14	10
Noviembre	15	0
Noviembre	16	15
Noviembre	17	21
Noviembre	18	20
Noviembre	19	5
Noviembre	20	11
Noviembre	21	12
Noviembre	22	13
Noviembre	23	15
Noviembre	24	9
Noviembre	25	4
Noviembre	26	19
Noviembre	27	22
Noviembre	28	14
Noviembre	29	12
Noviembre	30	9
Total Horas		**385**



diezplusingenieria@gmail.com

Calle 4# 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)

(57) 304 578 2489

DIEZ PLUS

SIEMPRE MÁS CALIDAD

Mes	Día	horas de Lluvia
Diciembre	1	13
Diciembre	2	16
Diciembre	3	3
Diciembre	4	9
Diciembre	5	4
Diciembre	6	0
	Total Horas	45

Total horas	954
Total días	39,75

Si las horas de lluvias generadas desde el inicio de la obra las convertimos en días, nos da cerca de 40 días, que afecta en el rendimiento de ejecución de obra.

Todas estas variantes dan como resultado una ejecución presupuestal máxima del 11% durante la presente vigencia

Atentamente,

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
Director de Interventoría
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Se anexan los documentos mencionados completando un total de seis (6) folios.
Con copia: Consorcio reforzamiento Edicol.

diezplusingenieria@gmail.com

Calle 4 # 43-84 Of 105, B/ El Lido, Cali (V)

(57) 304 578 2489
