FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUSE - CAMAN

5ECHA INFORME: Día: 28 Mes 06 Año 2019

CONTRATO N° 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019.

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 45,760.000,00

FORMA DE PAGO: PAC JULIO DEL 2019

FECHA FIRMA: Día 15 Mes 03 Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS. - CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 26 Mes 03 Año 2019 **APROBACION POLIZA**

CONTRATO MODIFICATORIO: MODIFICATORIO 1: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 20 de abril de 2019, por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JUNIO**
FECHA DE FIRMA: 18-03-2019

MODIFICATORIO 2: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 23 de Mayo de 2019; por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JULIO**
FECHA DE FIRMA: 17-04-2019

MEDIANTE ACTA 004 DEL 06-JUNIO-2019: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 20 de Junio de 2019; por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JULIO**

MEDIANTE ACTA 005 DEL 20-JUNIO-2019: Se amplía el Plazo de ejecución hasta el 27 de Junio de 2019; por solicitud del Contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. **PAC JULIO**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15-03-2019 hasta el 27-06-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 97%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:)$ 16.240.000.oo PAGO FACTURA 334 POR LA ENTREGA DE 7 ESTANTES.

Porcentaje de pagos realizados: 35.49%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 64.51 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Si X___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

EL CONTRATISTA DEBIA HACER ENTREGA DE 90 LOCKERS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019, INCUMPLIENDO CON LA ENTREGA DE DICHOS ELEMENTOS, SE INFORMO AL SECOM MEDIANTE OFICIO N° 20197250097763, DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA SE DEBIA PRESENTAR EL DIA 20/06/2019 PARA CONTINUAR CON LA AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO PERO NO SE PRESENTO

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No. X Si ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No. X Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

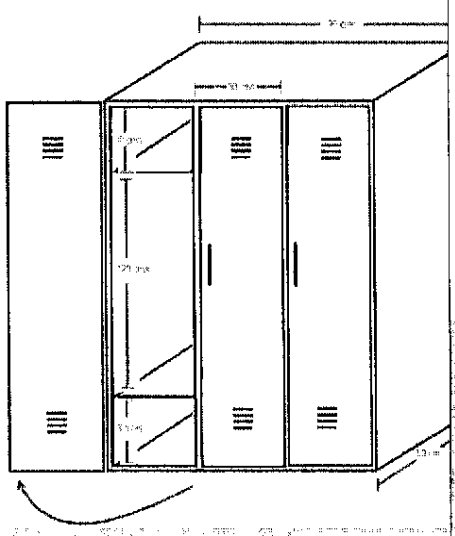
No. X Si ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. A LA FECHA SOLO SE HAN RECIBIDO 88 MUEBLES METALICOS – LOCKERS

ITEM 1	LOCKERS PARA GYM CAMAN
Cantidad	LOCKERS PARA GYM CAMAN

	Especificaciones Técnicas: LOCKER DE 3 CUERPO 3 PUERTAS Medidas aproximadas: 1,80m de alto x 0,90m de frente x 0,50m de fondo. Construido en su totalidad en lámina importada cold rolled cl.22, provista de zapatera y tubo para colgar ropa en la parte superior, puerta de ala con manija agarradera estampada, porta rotulo, porta candado en platina y celosías de aireamiento. Làmina tratada con desengrasantes fosfatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones. Terminado en pintura electrostática Color gris metal .
NOTA: los casilleros- lookers para GYM debe venir ensamblado y se deben verificar las medidas en con el supervisor del contrato.	
Usos:	Casilleros- lockers para GYM que serán utilizados por el personal orgánico perteneciente al CAMAN el cual será usado en diferentes horarios y en las zonas húmedas para poder así brindar un apoyo para que el personal guarden de manera segura su cosas en el momento de utilizar el GYM.
Observaciones:	Se debe entregar garantía por un año por defectos de fabricación.

2. EL CONTRATISTA ENVIA FICHA OTAN DE LOS ARMERILLOS Y LOS LOCKERS, ANEXA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS
- ENTREGAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO LOS DOCUMENTOS PARA QUE SE REALICE EL PAGO PARA PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO

FIRMA:

C.C. No. 1.151.954.250

DEPENDENCIA: GRUSE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
