FORMATO

**INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA**

**PROCESO**

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 21/01/2023 (dd-mm-aa) **AL** 27/01/2023 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

## 1. DATOS GENERALES

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

**CONTRATISTA DE OBRA:** BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

**INTERVENTOR:** INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 3.600.000.000,00 |
| Valor Adicional 1 | $ 1.602.000.000,00 |
| Valor Adicional 2 | N.A |
| Valor Actualizado | $ 5.202.000.000,00 |
| Plazo Inicial | 4 Meses |
| Plazo Prórroga 1 | 2 Meses y 15 dias |
| Plazo Prórroga 2 | N.A. |
| Plazo Actualizado | 6 Meses 15 dias |
| Fecha de Iniciación | 1/09/2022 |
| Fecha de Terminación Inicial | 31/12/2022 |
| Fecha de Terminación según Prórroga 1 | 15/03/2023 |
| Fecha de Terminación según Prórroga 2 | N.A. |
| Fecha de Terminación Actual | 15/03/2023 |


| CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Valor Inicial | $ 432.000.000,00 |
| Valor Adicional 1 | $ 192.240.000,00 |
| Valor Adicional 2 | N.A |
| Valor Actualizado | $ 624.240.000,00 |
| Plazo Inicial | 5 Meses |
| Plazo Prorroga 1 | 2 Meses y 15 dias |
| Plazo Prórroga 2 | N.A. |
| Plazo Actualizado | 7 Meses 15 dias |
| Fecha de Iniciación | 1/09/2022 |
| Fecha de Terminación Inicial | 31/01/2023 |
| Fecha de Terminación según Prórroga 1 | 15/04/2023 |
| Fecha de Terminación según Prórroga 2 | N.A. |
| Fecha de Terminación Actual | 15/04/2023 |

**SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CAMILA CORTES DAZA

## 2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


### 2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

**AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)**
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

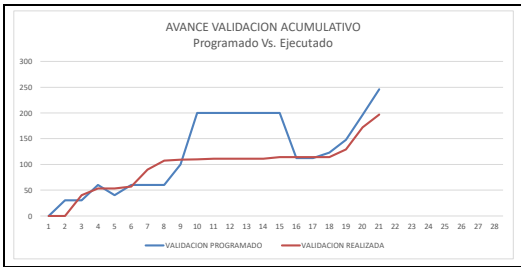





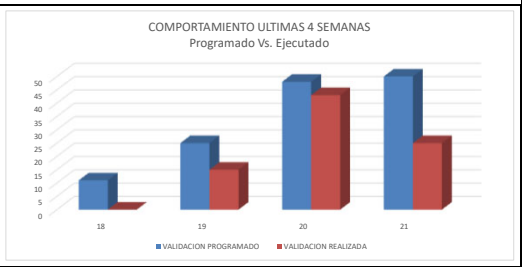


| Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programado | % | Ejecutado | % | Adelanto | Retraso |
| Cantidad Validaciones | 246 | 85,1% | 197 | 68,2% | 0,00% | -16,96% |

| Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado) | | | |
|---|---|---|---|
| Programado | Ejecutado | Adelanto | Retraso |
| 50 | 25 | 0,00% | 8,65% |


| Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM 18 | Prog. 11 | Ejec. 0 | SEM 19 | Prog. 25 | Ejec. 15 | SEM 20 | Prog. 48 | Ejec. 43 | SEM 21 | Prog. 50 | Ejec. 25 |

**OBSERVACIONES:** (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Se evidencia que segun la reprogramacion presentada por el Contratista de obra a la fecha se tiene un atraso del 16,96% en la etapa de validacion ya que segun dicha programacion a la fecha se debian haber validado 246 viviendas en el territorio de Bella Flor y Usme que refiere a un 85,1% de las cuales se tienen 197 con un 68,2% de avance general.
2. Con respecto a la grafica No. 2 la cual indica el porcentaje de validación durante la semana, esta presenta un atraso del 8,65% debido a que en este periodo se debian haber validado 50 viviendas de las cuales se validaron 25.
3. Según la programación actual se evidencia que a la fecha el contratista de obra presenta un atraso general frente a la etapa de validaciones del -16,96% del total de las viviendas adjudicadas al contrato 994 de 2022.


### 2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

**AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)**
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

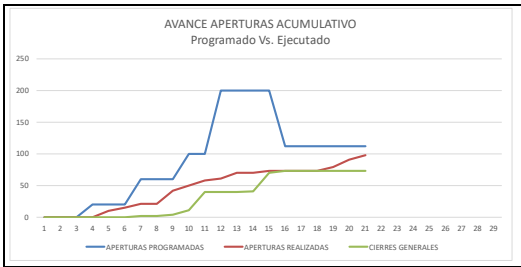





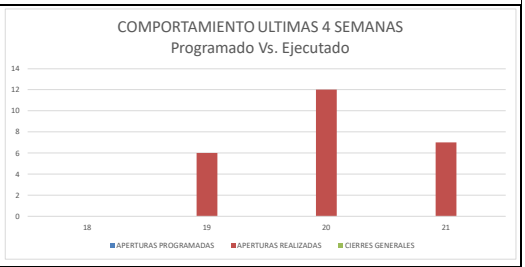


| Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programado | % | Ejecutado | % | Adelanto | Retraso |
| Cantidad de Aperturas | 112 | 38,8% | 98 | 33,9% | 0,0% | -4,84% |

| Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado) | | | |
|---|---|---|---|
| Programado | Ejecutado | Adelanto | Retraso |
| 0 | 7 | 2,42% | 0,00% |

| Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM 18 | Prog. 0 | Ejec. 0 | SEM 19 | Prog. 0 | Ejec. 6 | SEM 20 | Prog. 0 | Ejec. 12 | SEM 21 | Prog. 0 | Ejec. 7 |

**OBSERVACIONES:** (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. El Contratista de obra durante la ultima semana no presenta aperturas según la programacion. Sin embargo se realizo la apertura de 98 viviendas. Cabe aclarar que a la fecha tenia que haber realizado la apertura de 112 MV, de las cuales ha realizado 98 aperturas de MV, esto teniendo en cuenta la reprogramacion presentada por ellos, por lo tanto esto presenta un atraso del 4,84% frente a la etapa de ejecucion.
2. Según la reprogramación de obra que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener 112 viviendas aperturadas de las cuales se aperturaron 98 viviendas, teniendo 73 mv entregados a satisfaccion y 25 viviendas en ejecucion. Debido al poco avance en la ejecucion del contrato que se esta presentando por el Contratista de obra se solicita dar inicio a viviendas para mitigar los atrasos que se estan presentando a la fecha y de esta manera evitar futuros incumplimientos.


### 2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

**AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)**
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

| | | |
|---|---|---|
| Building SAS / INPLAYCO S.A.S. | FORMATO<br>**INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA**<br>**PROCESO**<br>EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD<br>SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT<br>SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ |

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 21/01/2023 (dd-mm-aa) **AL** 27/01/2023 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

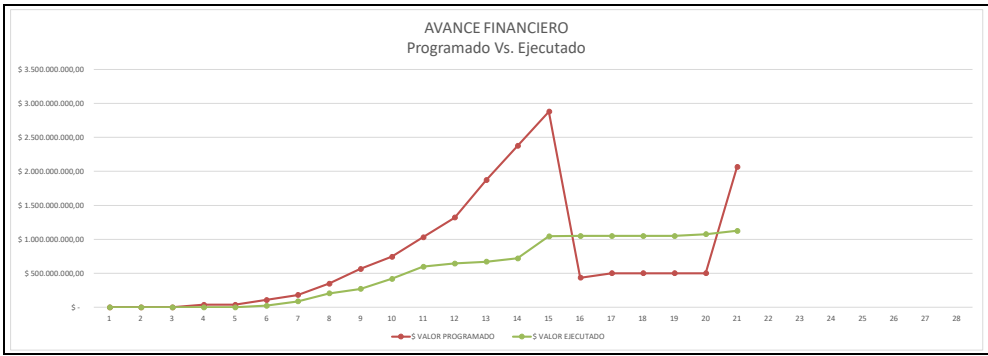


**VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA**

**INVERSION SEMANAL**

| PROGRAMADA | VS. | EJECUTADA |
|---|---|---|
| **$ 504.000.000** | | $ 48.270.601,20 |
| % AVANCE PROGRAMADO | VS. | % AVANCE EJECUTADO |
| **9,69%** | | 0,93% |

**INVERSION ACUMULADA**

| PROGRAMADA | VS. | EJECUTADA |
|---|---|---|
| **$ 2.064.000.000,33** | | **$ 1.124.373.890,69** |
| % AVANCE PROGRAMADO | VS. | % AVANCE EJECUTADO |
| **39,68%** | | **21,61%** |

ATRAZO O ADELANTO GENERAL EN PESOS ($): **$ 939.626.109,64**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **26,10%**

**OBSERVACIONES:** (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

1. Según la reprogramación vigente la fecha y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, en el momento se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $ 939.626.109,64 lo que hace referencia a un 26,10% de atraso frente al valor total del contrato.
2. Se debe tener en cuenta que el contratista de obra presento una programacion y flujo de caja ajustado según a la modificacion del contrato, por tal motivo se da la claridad de la disminucion de la inversion acumulada.

## 3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

| | ID_MV | DESCRIPCION DEL ASUNTO | TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO | MVBF_0669 | En seguimiento el 24/01/2023 la beneficiria MARIA CLAUDINA MARTINEZ manifiesta inconformidad con respecto a la asistencia del personal de obra, ya que no aisten con regularidad y las obras no avanzan. | Esta situacion es informada al contratista para que de solución los antes posible y asigne maestros de forma pernente. | ABIERTA |
| | MVBF_645 | Bella Flor MARIA SIXTA HURTADO El contratista de obra programa apertura de vivienda con la beneficiaria el 24/01/2023, pero la beneficiaria solicita que no se realice apertura de su obra, dado que va a realizar pañete en vigas que no se encuentran contempladas dentro del presupuesto, ante esto se establece compromiso de apertura para el 3 de febrero. | Se realizara seguimiento por parte de la interventoria para incio de obras | ABIERTA |
| | MVBF_236 | El equipo social del contratista de obra programa validación con la beneficiaria el 24/01/2023, pero al momento de explicarle el proceso de validación y en qué consiste el programa de mejoramiento de vivienda, la beneficiaria refiere que desea que le solucionen un problema de humedad que tiene al costado derecho de la vivienda, ya que colinda con un lote. La parte técnica explica las actividades que se podrían realizar, pero la beneficiaria insiste en el problema que tiene de humedad. Por tal motivo refiere que acudirá directamente a la secretaría de hábitat. La parte social le informa el punto de atención, solicitando la importancia de definir si desea continuar con el proceso o no. | Se llevara caso a comite de Obra. | ABIERTA |
| | MV_02931 | Usme ETELVINA CAMACHO VELASCO dirección de domicilio CL 112 SUR 8A 56 Este. El día jueves 26 de enero de 2023 se realiza visita de validación técnica y social evidenciando que la beneficiaria tiene todas las áreas de la vivienda en condiciones adecuadas para ser habitadas. El espacio que faltaría por intervenir es la zona de patio de ropas, el cambio de 6 tejas en la misma zona y la instalación de 6 puertas en habitaciones del primer piso. Se remite este caso a comité, quedando a la espera de la respuesta o proceder para el equipo técnico - social de contratista e interventoría que se encuentran en territorio. | Se socializara en comité de obra la situción como caso espacial para revisar el conducto a seguir. | ABIERTA |
| SEMANA X | | | | |
| | | | | |
| SEMANA X | | | | |
| | | | | |

## 4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

| | ID_MV | MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN | No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA |
|---|---|---|---|
| SEMANA 2 | MVBF_801 | BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT. | 1-2022-39168 - 22 /09/ 2022 |
| | MVBF_1100 | BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT. | 1-2022-38912 - 22/09/2022 |
| SEMANA 21 | MVBF_1049 | Se presenta renuncia por parte de la beneficiaria, por situación personal. | xxx- 26/01/2023 |
| | | | |
| SEMANA | | | |
| | | | |

## 5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

| | ID_MV | BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR) | TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias | FECHA DE CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 21 | | No se presentaron PQR durante el periodo | | |
| | | | | |
| SEMANA | | | | |
| SEMANA | | | | |
| | | | | |

FORMATO

**INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA**

**PROCESO**

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 21/01/2023 (dd-mm-aa) **AL** 27/01/2023 (dd-mm-aa)

**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

## 6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

**OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:**

**1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:** 26 de enero 2023: Se acerca el señor Bernabé Cordero autorizado del MVBF_066 Gumersindo Soler Silva, para brindar número de contacto 3115842496 para programar proceso de validación. Se pasa la información a la profesional social correspondiente.

**2. ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACIONES:** Durante el periodo se realizaron 26 validaciones a las siguientes viviendas:
MV_03098 - MV_03062- MV_03101- MVBF_0758 - MVBF_0549 - MVBF_0791 - MVBF_0789 - MVBF_1496 - MVBF_0225 - MVBF_770- MVBF_0736 - MVBF_241 - MVBF_312 - MV_03103 - MV_02940 - MVBF_0694 - MV_03095 - MV_02928 - MVBF_1424 - MVBF_1464 - MVBF_1465- MVBF_022 - MVBF_027 - MVBF_0592 - MVBF_605 - MVBF_0570

**3. ACOMPAÑAMIENTO APERTURAS DE OBRA:** Durante el periodo se realizaron siete (7)aperturas.
MVBF_1228 - MVBF_631- MVBF_650- MVBF_0669 - MVBF_683- MVBF_660- MVBF_805

**3. ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGAS:** Durante el periodo no se rtealizaron entregas de viviendas.

**4. SEGUIMIENTOS RELEVANTES:** Durante el perdido se realizaron dieseis (16) seguimientos.
MVBF_0780 - MVBF_1324 - MVBF_983- MVBF_1330 - MVBF_1201- MVBF_1121- MVBF_0854- MVBF_1228 - MVBF_1220- MVBF_683- MVBF_650 - MVBF_0669- MVBF_660 - MVBF_1013 : Las viviendas relacionadas anteriormente se realizóseguimiento por partre del equipo técnico y social donde se evidencia ejecucion deactividades en obra. Sin novedades.
**MVBF_1000:**Durante el seguimiento el beneficiario refiere tener inquietudes frente al pañete aplicado en la zona del patio, ya que este presenta fisuras. El contratista indica que esto se corregirá. Así mismo, se establecen compromisos para el desarrollo de la obra, dado que se han presentado inconvenientes entre el personal de obra y el beneficiario.
**MVBF_631** Durante la visita de seguimiento la beneficiaria refiere encontrarse a gusto con las actividades realizadas a la fecha, no obstante, indaga sobre la cantidad de estuco que se va a utilizar, el residente técnico le indica que aproximadamente se aplican tres manos de estuco en todos los espacios a intervenir (sala comedor, hall y habitaciones.)

## 7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

| DISPOSICIÓN RCD M3 | | ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización) | No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA |
|---|---|---|---|
| SEMANA 21 | 0 M3 | N/A | N/A |
| MES | Enero | | |
| SECTOR | BF | | |
| CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES | 0 | CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO | 48 |

| DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3 | | CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA | | |
|---|---|---|---|---|
| SEMANA 21 | 0 M3 | Se evidencia la recolección de empaques de cemento y pegante cerámico en la bodega<br>No se ha realizado disposición de RESPEL.<br>Se solicitó nombre y licencia del gestor para disposición final. | | |
| MES | Enero | | | |
| SECTOR | BF | | | |
| CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES | 0 M3 | CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO | 0 M3 | |

•Se refuerza al personal administrativo y operativo con las charlas referente a: principios básicos para evitar la contaminación del suelo, medidas para evitar el aporte de residuos contaminantes al alcantarillado de las viviendas, precauciones de trabajo en escaleras y la importancia del uso de los EPP y ropa de trabajo
•Retiro de personal operativo, es por ello que se inicia proceso de solicitud de paz y salvos.
•Se hace acompañamiento SST-MA, al seguimiento realizado por SDH, evidenciando el uso de dotación y EPP y botas de seguridad.
•Se realiza acompañamiento durante las caracterizaciones sociales, observando riesgos que puedan afectar el componente SST o ambiental en la ejecución de las actividades.
•Fue realizada la inducción al personal operativo que va a ingresar, así mismo la notificación de riesgo y se divulgan a cada uno las observaciones que se presenten en los exámenes médicos cuando se requiera, se diligencian perfiles sociodemográficos con los datos de este personal.
•Durante la semana se realizaron instalaciones de cubiertas y trabajo a diferente nivel sin superar o alcanzar los 2 metros., y se realizaron las inspecciones y diligenciamiento de formato de cubierta.
•Los materiales retirados de cubierta que han sido solicitados por los beneficiarios se entregan, diligenciando un acta.
•Se mantiene el acopio en la bodega de los RESPEL entre ellos: bolsas de cemento, bolsas de pegante, tarros de pintura y tarros de anticorrosivos para completar la cantidad solicitada por el Proveedor contactado para su disposición final.
•Se hace acompañamiento SST-MA, se ha recalcado el cuidado especial que se debe tener por el riesgo publico inminente en el sector.
•Se realiza señalización en la nueva bodega.
•La interventoría recibe charla referente al tema de salud "protección de la piel" debido a las altas temperaturas actuales.

## 8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

| CONTRATISTA DE OBRA | | | | | | INTERVENTORIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 5 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 5 | ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS | 0 | CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 1 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS | 0 |
| CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS) | | | 42 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 11 | | | | | | |
| PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA | 19 | PERSONAL OBRERO | 19 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA | | | | | 14 |
| PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA | 4 | PERSONAL OBRERO | 4 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0 | | | | | | |

## 9. ANEXOS

**ANEXO 1:** CONSOLIDADO TECNICO
**ANEXO 2:** REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL

**Nota:** Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los **UNO** (Día en letras) **1** (Día en números) días del mes del **FEBRERO** (Mes en letras) de **2023** (Año de firma del informe)

Firma

**Nombre (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.**
**Cargo: Director de Interventoría**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# ANEXO 1

## Consolidado Técnico

| Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL | Fecha | 1-feb-22 |
|---|---|---|

**BUILDING SAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato de Obra** | **994 - 2022** | **Fecha de Inicio** | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **Objeto** | **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"** | **Fecha de Terminacion Inicial** | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| | | **Plazo Inicial** | CUATRO (4) MESES |
| | | **Plazo Prorroga 1** | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| | | **Plazo Actualizado** | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| | | **Fechade Terminacion Actual** | 15 DE MARZO DE 2023 |
| | | **Valor del contrato actualizado** | **CINCO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($5.202.000.000) M/Cte** |

**Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato de interventoría** | **1009 - 2022** | **Fecha de Inicio** | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| **Objeto** | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."** | **Fecha de Terminacion Inicial** | 31 DE ENERO DE 2023 |
| | | **Plazo Inicial** | CINCO (5) MESES |
| | | **Plazo Prorroga 1** | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| | | **Plazo Actualizado** | SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| | | **Fechade Terminacion Actual** | 15 DE ABRIL DE 2023 |
| | | **Valor del contrato actualizado** | **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($624.240.000) M/Cte** |

| **Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT** | | | | | | | **Fase 2: Ejecución de obras** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Territorio o barrio a intervenir** | **Ciudad Bolívar** | **Barrios** | **Predios** | **Total Predios** | **Validacion** | | **Ejecución** | | | | | |
| | | | | | Validada | V/Por Validar | En Ejecución | Terminadas | Renuncias | Por | % de Avance | Acta de Entrega a Satisfacción |
| **Arq. o Ing. Responsable** | **Arq Leonardo Solano** | ALFONSO LOPEZ | 89 | 289 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0,00% | 0 |
| | | BELLA FLOR | 17 | | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 98,53% | 16 |
| | **Arq Luisa Franco** | | 61 | | 59 | 2 | 8 | 22 | 0 | 31 | 37,70% | 22 |
| | **Ing Martha Neira** | | 60 | | 58 | 1 | 10 | 20 | 1 | 29 | 37,92% | 20 |
| | **Arq. Edwin Baez** | | 62 | | 44 | 17 | 8 | 15 | 1 | 38 | 25,35% | 15 |
| **Subtotal** | | | **289** | **289** | **197** | **90** | **26** | **73** | **2** | **188** | **39,90%** | **73** |

| **AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL** | | | | | | | | | | **% ACUMULADO** | **ENERO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proyecto Ciudad Bolívar** | | | | **FASE I** | | **Tiempo Programación** | | | | | SEMANA DEL 23 AL 29 |
| **No. Etiq.** | **ID_DMV** | **Dirección** | **Nombres y apellidos** | Valor Inicial | Valor Liquidado | Fecha Validacion | Fecha inicio | Fecha Terminación | Estado de Ejecución | | **SEMANA 21** |
| **BARRIO BELLA FLOR** | | | | | | | | | | | |
| **GRUPO No. 1** | | | | | | | | | | | |
| 4 | MVBF_1195 | KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ | DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA | $14.400.400,00 | | 20-sep-22 | 12/1/2023 | | EJECUCION | 75,00% | 40,00% |
| 5 | MVBF_1196 | KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ | INES SOFIA REYES CASTRO | $14.369.650,00 | $14.395.216,00 | 19-sep-22 | 12/10/2022 | 8/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 6 | MVBF_1197 | KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1 | LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES | $13.769.930,00 | $14.370.476,00 | 19-sep-22 | 7/10/2022 | 16/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 7 | MVBF_1200 | KR 27 BIS A 73D 75 SUR | SANDRA PAOLA BEJARANO REYES | $14.396.371,00 | $14.400.000,00 | 19-sep-22 | 2/11/2022 | 20/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 10 | MVBF_1166 | CL 73D BIS A SUR 27 28 | MERCEDES VASQUEZ BONILLA | $14.399.376,00 | $14.399.379,00 | 20-sep-22 | 5/10/2022 | 16/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 11 | MVBF_1167 | CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ | NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO | $14.358.554,00 | $14.400.000,00 | 19-sep-22 | 21/10/2022 | 16/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 12 | MVBF_1149 | CL 73D SUR 27 75 | GUSTAVO MONROY FONSECA | $14.258.458,00 | $14.399.470,00 | 20-sep-22 | 5/10/2022 | 8/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 13 | MVBF_1155 | CL 73D BIS A SUR 27A 50 | ANA FELIZ DIAZ PATIÑO | $14.381.322,00 | $14.400.000,00 | 20-sep-22 | 5/10/2022 | 16/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MVBF_1191 | KR 27B 74A 06 SUR | CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA | $14.397.146,00 | $14.400.000,00 | 20-sep-22 | 21/10/2022 | 12/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 43 | MVBF_1302 | CL 73A SUR 26F 33 MJ | ANGIE YURLEY RUIZ VEGA | $14.381.643,00 | $14.400.000,00 | 19/10/2022 | 4/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 44 | MVBF_1303 | CL 73A SUR 26F 45 MJ | ANAYIBE CASTRO | $14.398.840,00 | $14.400.000,00 | 19/10/2022 | 4/11/2022 | 7/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 47 | MVBF_1264 | CL 73B SUR 26F15 MJ | JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA | $14.373.000,00 | $14.400.000,00 | 27/10/2022 | 7/12/2022 | 14/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 48 | MVBF_1270 | CL 73B SUR 26F 03 | ANA AURORA BECERRA VARGAS | $14.372.322,00 | $14.400.000,00 | 27/10/2022 | 6/12/2022 | 14/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 50 | MVBF_1295 | KR 26F 73B 16 SUR | VIRGELINA RODRIGUEZ | $14.398.427,00 | $14.400.000,00 | 31/10/2022 | 21/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 51 | MVBF_1280 | CL 73C SUR 26F 02 | MARINA NAVAS ROJAS | $14.399.498,00 | $14.400.000,00 | 27/10/2022 | 29/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 101 | MVBF_1187 | KR 27B 74 14 SUR MJ | MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO | $13.396.482,00 | $14.352.138,00 | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 102 | MVBF_1427 | CL 74 SUR 27B 06 | MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ | $14.400.000,00 | $14.398.350,00 | 13/10/2022 | 21/10/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| **GRUPO No. 2** | | | | | | | | | | | |
| 8 | MVBF_1198 | CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ | CARMEN ELVIRA REYES CARO | $14.400.000,00 | | 19-sep-22 | 12/01/2023 | | EJECUCION | 10,00% | 10,00% |
| 9 | MVBF_1201 | CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ | MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ | $14.400.000,00 | | 20-sep-22 | 18/01/2023 | | EJECUCION | 10,00% | 10,00% |
| 15 | MVBF_1148 | CL 73 D SUR 27 45 | LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS | $14.398.521,00 | $14.398.521,00 | 28/9/2022 | 29/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 16 | MVBF_1130 | CL 73D SUR 27 50 | JUAN DE JESUS SEDANO AYALA | $14.394.664,00 | $14.396.664,00 | 26/9/2022 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 17 | MVBF_1128 | CL 73D SUR 27 62 | ISMELDA PEREZ GARCIA | $14.392.074,00 | $14.395.263,00 | 26/9/2022 | 13/10/2022 | 2/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 18 | MVBF_1141 | CL 73 D SUR 27 91 | BLANCA FLOR RINCON | $14.397.445,00 | $14.398.134,00 | 28/9/2022 | 20/10/2022 | 25/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 19 | MVBF_1121 | CL 73 C BIS SUR 27 77 | MARIA ELBA ARIAS BONILLA | $14.396.808,00 | | 26/9/2022 | 18/01/2023 | | EJECUCION | 0,00% | 0,00% |
| 20 | MVBF_1110 | CL 73 D SUR 27 86 | FLOR TRIANA AVILA | $14.399.088,00 | $14.397.014,00 | 26/9/2022 | 18/10/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 21 | MVBF_1108 | CL 73C BIS SUR 27A 23 | MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA | $14.390.758,00 | $14.399.950,00 | 26/9/2022 | 13/10/2022 | 11/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 22 | MVBF_1124 | CL 73C BIS SUR 27A 11 | HECTOR HERNANDO VELOSA | $14.000.000,00 | $14.399.644,00 | 26/9/2022 | 5/10/2022 | 21/10/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 23 | MVBF_1111 | CL 73C BIS SUR 27 61 MJ | PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS | $14.000.000,00 | $14.026.240,00 | 28/9/2022 | 7/10/2022 | 21/10/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 24 | MVBF_1118 | CL 73 C BIS SUR 27 55 | LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES | $14.394.090,00 | $14.399.367,00 | 26/9/2022 | 16/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 25 | MVBF_1117 | CL 73C BIS SUR 27 49 | RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA | $14.398.893,00 | $14.398.893,00 | 26/9/2022 | 11/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 26 | MVBF_1073 | KR 27 A 73 46 SUR | LEOPOLDO LEON MORALES | $14.397.782,00 | $14.397.074,00 | 28/9/2022 | 7/10/2022 | 11/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 27 | MVBF_1072 | KR 27A 73 38 SUR MJ | MARIA AURORA PEREZ AVELLA | $14.000.000,00 | $14.268.863,00 | 25/9/2022 | 7/10/2022 | 2/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 56 | MVBF_948 | KR 26G BIS 72 G 11 SUR | ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS | $14.390.362,00 | $14.392.796,00 | 19/9/2022 | 31/10/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 57 | MVBF_950 | KR 27 72G 24 SUR | LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ | $14.398.603,00 | $14.398.603,00 | 19/9/2022 | 11/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 58 | MVBF_964 | KR 27 72G 17 SUR | ANA SILVIA AGUILAR BARRERA | $14.392.970,00 | $14.398.864,00 | 19/9/2022 | 31/10/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | MVBF_0966 | KR 27 72G 09 SUR | MELEIDY TORIFIO VALENCIA | $14.393.909,00 | $14.398.643,00 | 19/9/2022 | 31/10/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 60 | MVBF_0952 | KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ | MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ | $14.395.403,00 | $14.392.809,00 | 18/10/2022 | 1/11/2022 | 10/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 61 | MVBF_0984 | KR 27 BIS 72G 11 SUR | INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO | $14.396.904,00 | $14.396.936,00 | 18/10/2022 | 1/11/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 62 | MVBF_983 | KR 27 BIS 72G 15 SUR | HERIBERTO VARGAS CAPERA | $14.000.000,00 | | 18/10/2022 | 12/01/2023 | | EJECUCION | **0,00%** | 0,00% |
| 63 | MVBF_0990 | CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1 | GILBERTO INFANTE MARINO | $14.394.679,00 | $14.394.679,00 | 20/10/2022 | 11/11/2022 | 12/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 64 | MVBF_0987 | KR 27 BIS B 72G 16 SUR | QUERUBIN TIRADO MEDINA | $14.400.000,00 | $14.400.000,00 | 19/10/2022 | 10/12/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 65 | MVBF_0985 | KR 27 BIS B 72G 08 SUR | JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA | | | 19/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 66 | MVBF_0731 | KR 27A 72D 02 SUR | MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO | | | 19/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 67 | MVBF_0719 | KR 27A BIS 72D 08 SUR | URIEL CASALLAS MURCIA | $14.397.247,00 | $14.383.897,00 | 19/10/2022 | 16/11/2022 | 12/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 68 | MVBF_0727 | KR 27A 72C 34 SUR MJ | SALOMON URREA BAQUERO | $14.398.620,00 | $14.398.620,00 | 19/10/2022 | 10/12/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 69 | MVBF_0741 | KR 27A 72C 22 SUR | MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO | | | 28/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 70 | MVBF_0694 | CR 27A BIS 72D 05 SUR | ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 103 | MVBF_1424 | CL 74 SUR 27B 36 | CARLOS RODRIGUEZ | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 104 | MVBF_1462 | CL 74A SUR 27B 25 | ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON | | | 13/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 105 | MVBF_1464 | CL 74A SUR 27B 55 | MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ | | | | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 106 | MVBF_1465 | CL 74A SUR 27B 61 | SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 107 | MVBF_1455 | CL 74B SUR 27B 24 | FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS | | | 13/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 116 | MVBF_0789 | KR 27 72C 12 SUR | OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA | | | 23/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 117 | MVBF_791 | CR27 H 72C 34 SUR | MARIA LIGIA ROJAS | | | 23/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 118 | MVBF_0780 | KR 27 72C 40 SUR | ELIZABETH GIRALDO DELGADO | $14.399.430,00 | | 19/9/2022 | 17/1/2023 | | EJECUCION | 10,00% | 10,00% |
| 119 | MVBF_0793 | KR 27 72C 70 SUR | ARISTOBULO TRIANA GARZON | | | 21/9/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 120 | MVBF_0758 | KR 27 72C 45 SUR | ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA | | | 23/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 121 | MVBF_0760 | KR 27 72C 33 SUR | FERMIN MADRIGAL TIQUE | | | 20/9/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 122 | MVBF_0749 | KR 27 72C 27 SUR | ESTHER MARINA YARA TIQUE | | | 20/9/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 123 | MVBF_0761 | KR 27 72C 21 SUR | GILDARDO MORALES VELEZ | | | 20/9/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 124 | MVBF_0767 | KR 27 BIS 72C 22 SUR | ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ | $14.400.000,00 | | 21/9/2022 | 17/1/2023 | | EJECUCION | 25,00% | 25,00% |
| 125 | MVBF_0730 | KR 27 BIS 72C 15 SUR | MARIA ELVIA ARERO COTRINA | | | 20/9/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 126 | MVBF_0737 | KR 27 BIS 72C 27 SUR | EVANGELINA MADRIGAL TAPIA | $14.400.000,00 | | 20/9/2022 | 17/1/2023 | | EJECUCION | 20,00% | 20,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | MVBF_0736 | KR 27 BIS 72C 33 SUR | LUIS ALFONSO PIAY | | | 25/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 128 | MVBF_745 | KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1 | OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA | $14.400.000,00 | | 20/9/2022 | 17/1/2023 | | EJECUCION | 25,00% | 15,00% |
| 129 | MVBF_0753 | KR 27 BIS 72C 44 SUR | LUZ DARY ALONSO PACHON | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 130 | MVBF_770 | KR 27 BIS 72C 50 SUR | HERMINIA FORERO BUSTOS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 171 | MVBF_113 | KR 26G 75 A SUR 22 | SANDRA PATRICIA SANABRIA | | | 18/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 172 | MVBF_094 | KR 26G 75A 08 SUR | ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 173 | MVBF_107 | KR 26F 75A 31 SUR | CELINA CARAVALI GONZALEZ | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 174 | MVBF_106 | KR 26F 75A 35 SUR | CARMEN SEMANATE | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 177 | MVBF_223 | TV 26C BIS A 75B 45 SUR | OMAR FERNEY NIÑO | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 178 | MVBF_232 | TV 26C BIS A 75B 93 SUR | HERMENCIA CHITIVA | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 179 | MVBF_0294 | TV 26C BIS 75C 16 SUR | MIGUELINA GOMEZ HOYOS | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 185 | MVBF_027 | CL 76 SUR 26H 04 | LEONOR CHISCO SARAY | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 186 | MVBF_022 | KR 26H 75B 19 SUR MJ | MARTHA HELENA PARDO | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 187 | MVBF_117 | KR 26G 75A 38 SUR | MARIA EUGENIA GONZALEZ | | | 18/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 188 | MVBF_096 | KR 26 G No. 75 A 26 SUR | MARISOL LATORRE DEVIA | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| **GRUPO No. 3** | | | | | | | | | | | |
| 1 | MVBF_1220 | CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ | MARIA NOHEMY MATTA LOZANO | $14.398.932,00 | | 21-sep-22 | 20/1/2023 | | EJECUCION | 20,00% | 20,00% |
| 2 | MVBF_1228 | KR 27 73C 32 SUR | SANDRA YANETH REY VANEGAS | $13.947.172,00 | | 21-sep-22 | 24/1/2023 | | EJECUCION | 15,00% | 15,00% |
| 3 | MVBF_1213 | CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ | NORMA CONSTANZA MELO | $14.399.302,00 | $14.400.000,00 | 21-sep-22 | 10/12/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 29 | MVBF_1049 | CL 73 SUR 27 43 MJ | YAMILE DARLEY LONDOÑO | | | | | | RENUNCIA | 0,00% | 0,00% |
| 30 | MVBF_1083 | KR 27 73B 15 SUR | ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO | $14.374.413,00 | $14.227.821,00 | 20-sep-22 | 13/10/2022 | 8/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 35 | MVBF_1096 | KR 27 BIS A 73 22 SUR | LUCILA TRUJILLO | $13.862.187,32 | $14.399.456,00 | 20-sep-22 | 31/10/2022 | 12/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 37 | MVBF_1061 | KR 27 BIS A 73 31 SUR | FLORENTINO JUEZ BARRETO | $14.400.000,00 | $14.391.266,00 | 19-sep-22 | 10/10/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 38 | MVBF_1052 | KR 27A 73 26 SUR | OFELIA MEDINA ARCILA | $14.152.874,42 | $14.382.156,00 | 19-sep-22 | 1/11/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 40 | MVBF_1068 | KR 27A 73 06 SUR | LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ | $14.003.597,43 | $14.392.594,00 | 20-sep-22 | 1/11/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 41 | MVBF_1330 | CL 73B SUR 26C 90 | MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ | $14.400.000,00 | | 21/10/2022 | 11/1/2023 | | EJECUCION | 70,00% | 20,00% |
| 42 | MVBF_1324 | CL 73 B SUR 26 C 74 | PURIFICACION CORTES | $14.381.900,00 | | 19/10/2022 | 11/1/2023 | | EJECUCION | 90,00% | 25,00% |
| 45 | MVBF_1314 | CL 73B SUR 26F 38 | MARIELA SANDOVAL VERA | | | 19/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | MVBF_1315 | CL 73B SUR 26F 32 | MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ | $14.398.673,00 | | 19/10/2022 | 18/1/2023 | | EJECUCION | 0,00% | 0,00% |
| 49 | MVBF_1306 | CL 73B SUR 26F 02 MJ | LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO | | | 27/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 52 | MVBF_1276 | CL 73C SUR 26F 38 | ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 53 | MVBF_1240 | CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1 | HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN | | | 13/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 54 | MVBF_1255 | CL 73C BIS A SUR 26C 90 | DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 55 | MVBF_1234 | CL 73C SUR 26F 03 MJ | WILLIANS GONZALEZ PEDROZA | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 86 | MVBF_0924 | CL 73 SUR 26F 40 | ROSALBA ROJAS ROJAS | $14.374.629,00 | $14.374.629,00 | 19/10/2022 | 10/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 87 | MVBF_1343 | CL 73 SUR 26F 09 | AMANDA BERNAL ORTIZ | $14.372.084,00 | $14.350.983,00 | 19/10/2022 | 10/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 88 | MVBF_1338 | CL 73 SUR 26F 03 MJ | IRIS SOTO | $14.397.837,00 | $14.397.384,00 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 89 | MVBF_0925 | CL 73 SUR 26F 16 | MARIA EVA PULIDO CELIS | | | 19/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 90 | MVBF_894 | KR 26F 72H 60 SUR | LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA | | | 19/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 91 | MVBF_1358 | CL 73A SUR 26D 16 | JOSE GERMAN GARAVITO YATE | $14.358.302,00 | $14.377.649,00 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 92 | MVBF_1362 | CL 73A SUR 26D 08 | ALICIA CARREÑO | $14.394.740,00 | $14.394.740,00 | 1/11/2022 | 29/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 93 | MVBF_1363 | CL 73A SUR 26D 04 | MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE | | | 21/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 94 | MVBF_1321 | CL 73A SUR 26D 07 | TEOFILDE FORERO AGUILAR | $14.308.128,00 | $14.350.402,00 | 21/10/2022 | 15/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 95 | MVBF_1329 | CL 73A SUR 26D 19 | JULIO CESAR BUILES MURIEL | $14.309.042,00 | | 21/10/2022 | 16/1/2023 | | EJECUCION | 0,00% | 0,00% |
| 96 | MVBF_1354 | CL 73A SUR 26F 02 | JISEL SARIME LOZANO CERQUERA | $14.389.630,00 | $14.363.094,00 | 21/10/2022 | 1/11/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 97 | MVBF_1337 | CL 73A SUR 26F 08 MJ | LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ | $14.307.907,00 | $14.370.157,00 | 21/10/2022 | 31/10/2022 | 27/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 98 | MVBF_1339 | CL 73A SUR 26F 20 MJ | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ | $14.376.459,00 | $14.376.459,00 | 21/10/2022 | 15/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 99 | MVBF_1307 | CL 73 A SUR 26F 15 | EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ | | | 26/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 100 | MVBF_1311 | CL 73A SUR 26F 27 | JULIA MARTINEZ SEGURA | $14.171.779,00 | $14.365.252,00 | 26/10/2022 | 15/11/2022 | 12/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 146 | MVBF_808 | CL 72C SUR 26C 59 | JOSE FERMIN ROCHA | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 147 | MVBF_805 | CL 72 C SUR No. 26 C 69 | MANUEL MONCADA FANDIÑO | $14.302.827,00 | | 12/1/2023 | 25/1/2023 | | EJECUCION | 20,00% | 20,00% |
| 148 | MVBF_820 | KR 26F 72D 14 SUR | LUIS CARLOS LOMBANA | | | 12/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 149 | MVBF_835 | CL 72D BIS A SUR 26D 21 | NURY ESPERANZA MELO | $14.194.616,00 | $14.355.025,00 | 28/10/2022 | 29/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 150 | MVBF_0837 | KR 26 D 72D 45 SUR | SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ | | | 13/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 151 | MVBF_0841 | CL 72 D BIS A SUR 26C 79 | ELIZABETH OSPINA CAICEDO | $14.360.668,00 | $14.363.094,00 | 28/10/2022 | 15/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 152 | MVBF_0840 | CL 72 F SUR 26C 74 MJ | MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ | $14.396.907,00 | $14.387.990,00 | 28/10/2022 | 15/11/2022 | 23/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | MVBF_850 | CL 72F SUR 26C 69 | GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 154 | MVBF_853 | CL 72F SUR 26D 23 | CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ | $14.316.470,00 | $14.391.855,00 | 28/10/2022 | 23/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 155 | MVBF_854 | CL 72F SUR 26F 05 | ANA LEONORA RUIZ MENDEZ | $14.363.897,00 | | 28/10/2022 | 11/1/2023 | | EJECUCION | 60,00% | 40,00% |
| 156 | MVBF_0972 | KR 27 BIS 72G 38 SUR | PABLO ENRIQUE CALDERON | | | 13/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 157 | MVBF_0953 | KR 27 BIS 72G 34 SUR | LUIS MORENO VIUCHE | | | 12/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 158 | MVBF_0938 | KR 27 72G 68 SUR | BLANCA MARINA MARTINEZ | | | 12/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 159 | MVBF_1347 | KR 27 73 02 SUR | MARIA NANCY CANACUE ROMERO | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 160 | MVBF_0946 | CL 73 SUR 26G 08 | DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 189 | MVBF_149 | CL 75A BIS SUR 26F 53 | LASTENIA PALACIOS MURILLO | | | 27/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 190 | MVBF_145 | CL 75A BIS SUR 26F 47 | BERENICE RINCON TELLEZ | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 191 | MVBF_0183 | CL 75A BIS SUR 26F 60 | DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 192 | MVBF_241 | KR 27 75 24 SUR | MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO | | | 26/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 193 | MVBF_235 | CL 75A SUR 26F 60 MJ | JOSE SAUL MONROY MARTINEZ | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 194 | MVBF_172 | CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ | LAURENTINO BURGOS RINCON | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 195 | MVBF_236 | CL 75 SUR 26F 29 | LILIANA RENDON LOZANO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 196 | MVBF_287 | CL 74B BIS A SUR 26F 38 | CARMEN ROSA GONZALEZ | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 197 | MVBF_0286 | CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ | RAQUEL MENDEZ PEÑA | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 198 | MVBF_312 | DG 74 B BIS A SUR 26 C 41 | VIRGINIA CORTES PARDO | | | 26/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 175 | MVBF_1496 | TV 26C BIS A 75A 03 SUR | BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES | | | 25/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 176 | MVBF_0225 | TV 26C BIS B 75A 10 SUR | CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ | | | 25/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| **GRUPO No. 4** | | | | | | | | | | | |
| 28 | MVBF_0975 | KR 27 BIS B 72G 28 SUR | LUIS HERNANDO SALCEDO | $14.350.659,00 | $14.381.817,00 | 21-sep-22 | 10/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 31 | MVBF_1084 | KR 27 73B 09 SUR | FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA | $13.883.096,82 | $14.389.392,00 | 21-sep-22 | 13/10/2022 | 9/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 32 | MVBF_1078 | KR 27 BIS A 73 64 SUR | MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA | | | 20-sep-22 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 33 | MVBF_1080 | KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ | MARIA DEL ROSARIO BAEZ | $14.329.132,00 | $14.397.966,00 | 21-sep-22 | 10/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 34 | MVBF_1081 | KR 27 BIS A 73 28 SUR | MELQUISEDEC ORTIZ | $14.388.713,09 | $14.388.713,09 | 19-sep-22 | 1/11/2022 | 21/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 36 | MVBF_1050 | KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1 | FRANQUELINA BALLESTEROS | $14.396.471,00 | $14.396.471,00 | 19-sep-22 | 29/11/2022 | 21/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 39 | MVBF_1048 | KR 27A 73 18 SUR MJ | MARIA GLADYS TRIANA | $14.128.717,42 | $14.028.825,00 | 21-sep-22 | 7/10/2022 | 8/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | MVBF_0979 | KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ | LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ | $14.397.127,18 | $14.377.332,00 | 20/10/2022 | 2/11/2022 | 15/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 72 | MVBF_1098 | KR 27 BIS A 73 52 SUR | JULIO CESAR LEMUS ZULETA | $14.365.960,30 | $14.398.854,00 | 18/10/2022 | 2/11/2022 | 17/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 73 | MVBF_1045 | KR 27A BIS 73 10 SUR | MARIELA CARDONA CARDONA | $14.000.000,00 | $14.397.361,00 | 20/10/2022 | 2/11/2022 | 18/11/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 74 | MVBF_1000 | KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1 | JORGE ELIECER HUERTAS GIL | $14.000.000,00 | | 18/10/2022 | 11/1/2023 | | EJECUCION | 15,00% | 10,00% |
| 75 | MVBF_1007 | CL 73 SUR 27A 21 | NUBIA HERRERA QUINTERO | | | 18/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 76 | MVBF_1001 | KR 27A BIS 73 23 SUR MJ | MARIA ELIA MENESES GOMEZ | $14.346.022,00 | $14.398.500,00 | 18/10/2022 | 26/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 77 | MVBF_1014 | KR 27A BIS 73 27 SUR | LUIS HERNANDO RODRIGUEZ | | | | | | RENUNCIA | 0,00% | 0,00% |
| 78 | MVBF_1013 | KR 27B 73A 16 SUR | EMILIANO PEREZ AVELLA | $14.000.000,00 | | 14/12/2022 | 16/1/2023 | | EJECUCION | 10,00% | 10,00% |
| 79 | MVBF_0679 | TV 27H 72D 14 SUR | POSIDIO HUERTA HUERTAS | | | 10/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 80 | MVBF_675 | KR 27 B 72D 23 SUR | CELIMO PADILLA VEGA | | | 14/12/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 81 | MVBF_0677 | KR 27B 72D 05 SUR | ANA GLADYS PACHON CHURQUE | $14.000.000,00 | | 14/12/2022 | 16/1/2023 | | EJECUCION | 0,00% | 0,00% |
| 82 | MVBF_0715 | KR 27B 72C 20 SUR | JORGE ENRIQUE QUINONES | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 83 | MVBF_676 | KR 27B 72 D 11 SUR | AMPARO ARIAS OGONZALEZ | | | 14/12/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 84 | MVBF_0669 | KR 27B 72D 29 SUR | MARIA CLAUDIA MRTINEZ | $14.363.595,00 | | 12/1/2023 | 24/1/2023 | | EJECUCION | 2,00% | 2,00% |
| 85 | MVBF_1076 | KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ | ESPERANZA CASTILLO ALTURO | $14.394.860,00 | $14.394.860,00 | 27/10/2022 | 29/11/2022 | 13/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 108 | MVBF_0558 | CL 73C SUR 27B 26 | MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 109 | MVBF_552 | CLL 73C SUR 27B 62 | ORFANIDES LOSADA PERDOMO | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 110 | MVBF_549 | CL 73 C SUR 27 B 78 | MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ | | | 23/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 111 | MVBF_0540 | CL 73B SUR 27C 29 | LUZ STELLA FRANCO DIAZ | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 112 | MVBF_567 | CL 73B SUR 27C 24 | FLORENTINO PICO BASTILLA | | | 20/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 113 | MVBF_605 | DG 73A BIS SUR 27C 28 | MISAEL MACANA | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 114 | MVBF_0592 | DG 73A BIS SUR 27C 34 | MARIA HELENA BAQUERO MACANA | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 115 | MVBF_0570 | TV 27H 73A 36 SUR | JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA | | | 27/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 131 | MVBF_536 | CL 73B SUR 27B 21 | CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO | $14.397.978,00 | $14.397.978,00 | 20/10/2022 | 29/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 132 | MVBF_530 | CL 73B 27B 33 MJ | OMAR MEDINA ORTEGA | | | 27/10/2022 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 133 | MVBF_0531 | CL 73B SUR 27C 05 | INES DIAZ | $14.245.243,00 | $14.398.250,00 | 28/10/2022 | 16/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 134 | MVBF_589 | CL 73B SUR 27B 34 | LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO | $14.000.000,00 | $14.398.607,00 | 27/10/2022 | 2/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |
| 135 | MVBF_588 | CL 73B SUR 27B 40 | JANETH MEDINA DIAZ | $14.000.000,00 | $14.398.700,00 | 27/10/2022 | 2/11/2022 | 15/12/2022 | ENTREGADA | **100,00%** | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | MVBF_0595 | DG 73A SUR 27C 57 MJ | ANA DELIA GONZALEZ MATEUS | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 137 | MVBF_631 | TV 27H 73 34 SUR | LEIDY SABOGAL RAMIREZ | $14.000.000,00 | | 12/1/2023 | 24/01/2023 | | EJECUCION | 0,00% | 0,00% |
| 138 | MVBF_0657 | DG 73 BIS SUR 27B 36 | SERGIO TORO | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 139 | MVBF_660 | DG 73 SUR 27B 13 MJ | CUSTODIA LUGO QUESADA | $14.000.000,00 | | 12/1/2023 | 24/01/2023 | | EJECUCION | 15,00% | 15,00% |
| 140 | MVBF_645 | DG 73 SUR 27B 11 | MARIA SIXTA HURTADO | | | 12/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 141 | MVBF_0622 | DG 73 BIS SUR 27B 03 | MARIBEL HURTADO | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 142 | MVBF_650 | DG 73 SUR 27B 59 | JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO | $14.355.020,00 | | 10/1/2023 | 24/01/2023 | | EJECUCION | 15,00% | 15,00% |
| 143 | MVBF_0649 | DG 73 SUR 27B 53 | OLGA MARIA ALONSO MORENO | | | 10/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 144 | MVBF_683 | DG 73 SUR 27B 54 | JOSE ALFONSO MORA AREVALO | $14.376.746,00 | | 10/1/2023 | 24/01/2023 | | EJECUCION | 15,00% | 15,00% |
| 145 | MVBF_585 | CL 73A SUR 27B 17 | ANDREA HERRERA RANGEL | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| 161 | MVBF_0157 | CL 75 SUR 27 33 | ANA MILENA ABAUNZA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 162 | MVBF_158 | CL 75 SUR 27 39 | ISABELINA PATIÑO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 163 | MVBF_154 | CL 75 SUR 27 A 05 | CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 164 | MVBF_0155 | CL 75A SUR 27 22 | SONIA MILENA GIRALDO HERRERA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 165 | MVBF_075 | CL 75A SUR 27 27 | JAIDI RIAÑOS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 166 | MVBF_085 | CL 75A SUR 27 63 | LUCIA HERRERA QUINTERO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 180 | MVBF_0072 | CL 74A BIS A SUR 27 22 | JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 181 | MVBF_071 | CL 75A BIS A SUR 27 28 | JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 182 | MVBF_058 | CL 75A BIS A SUR 27 64 | BEATRIZ BRYITH CANGREJO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 183 | MVBF_047 | CL 75B SUR 27 52 | ANIBAL MORENO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 184 | MVBF_046 | CL 75B SUR 27 58 | MAGDALENA LEMUS CHAPARRO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 167 | MVBF_054 | CL 75A BIS SUR 27 15 | MAYERLY SANCHEZ MENDOZA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 168 | MVBF_066 | CL 75A BIS SUR 27 39 | GUMERSINDO SOLER SILVA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 169 | MVBF_089 | CL 75A BIS SUR 27 46 | MARIA CONSUELO PEREZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 170 | MVBF_087 | CL 75A BIS SUR 27 58 | MARIA RUTH CORTES LOSADA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 199 | MVBF_0482 | CL 73D BIS SUR 27F 14 | MARIA DAISSY BEJARANO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| 200 | MVBF_495 | CL 73D BIS SUR 27M 52 | MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |

| BARRIO ALFONSO LOPEZ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO No. 1 | | | | | | | | | | | |
| | MV_03049 | CL 111A SUR 8 61 ESTE | MARTHA JANETH DIAZ GUEVARA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03061 | CL 112 SUR 8 75 ESTE | JOSE LISANDRO COLO OYOLA | | | 20/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03062 | KR 8A ESTE 112 15 SUR | ALVARO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ | | | 23/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02928 | CL 112 SUR 8A 68 ESTE | JOSE JACINTO CANTE | | | 27/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02931 | CL 112 SUR 8A 56 ESTE | ETELVINA CAMACHO VELASCO | | | 26/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02940 | CL 112 SUR 8A 26 ESTE | GLORIA AIDE HIDALGO ALONSO | | | 26/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02942 | CL 112 SUR 8A 10 ESTE | MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02952 | CL 111A SUR 8A 29 ESTE | MARTHA MORENO TORRES | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02953 | CL 111A SUR 8A 35 ESTE | HERMINDA CIPACON CIPACON | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02962 | CL 111A SUR 8A 69 ESTE | HEBER TUMAL TUMAL | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02963 | CL 111A SUR 8A 81 ESTE | NUBIA OLIVA LUJAN MONTAÑO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02967 | CL 111 SUR 8A 89 ESTE | JOSE JOAQUIN CAMARGO MORALES | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02968 | CL 111A SUR 8A 93 ESTE | MARIA MERCEDES ARIAS DE GARCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02969 | CL 111A SUR 8A 97 ESTE | FLORMABEL DIAZ GONZALEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02977 | CL 112 SUR 8C 86 ESTE | BENJAMIN TIQUE LONDOÑO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03014 | CL 112 SUR 9 48 ESTE | DELFA SUAREZ RUEDA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03015 | CL 112 SUR 9 44 ESTE | JUDY ESPERANZA MARTINEZ CARDENAS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03016 | CL 112 SUR 9 40 ESTE | NOHEMY GALLEGO ARIAS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03017 | CL 112 SUR 9 30 ESTE | YOLANDA RODRIGUEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03019 | CL 112 SUR 9 22 ESTE | MARCO ANTONIO ROBAYO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03086 | CL 112A SUR 8A 08 ESTE | OSWALDO ALONSO ACEVEDO SALAMANCA | | | 20/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03095 | CL 112 SUR 8A 33 ESTE | NIKOLL MARCELA IBARRA ESPINOSA | | | 27/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03098 | CL 112 SUR 8A 43 ESTE | ANA YANETH PEÑA VERANO | | | 23/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03101 | CL 112 SUR 8A 55 ESTE | EDGAR RINCON CASTAÑEDA | | | 23/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03103 | CL 112 SUR 8A 67 ESTE | MARGOTH SANCHEZ MENDOSA | | | 26/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MV_03120 | CL 112A SUR 8C 68 ESTE | MARIA NELY PAMO ANDRADE | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03129 | CL 112A SUR 8C 14 ESTE | JESUS MARIA PULIDO BERNAL | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03130 | CL 112 SUR 8C 13 ESTE | JAIRO ALBERTO SIERRA CELY | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03171 | CL 113 SUR 8A 66 ESTE | JOSE RICARDO TRIANA | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03213 | CL 113 SUR 8C 04 ESTE | JAIRO JONNY SILVA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03216 | CL 112A SUR 8C 17 ESTE | JOSE LUIS RODRIGUEZ CANO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03288 | CL 113 SUR 8A 57 ESTE | MARTHA INES MADRIGAL MALAMBO | | | 16/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03290 | CL 113 SUR 8A 67 ESTE | MARIA VISITACIÓN TARAZONA VARGAS | | | 16/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03374 | CL 114 SUR 8C 33 ESTE | VICTOR MANUEL ALDANA LESMES | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03401 | CL 114A SUR 8B 41 ESTE | ANA CECILIA ALEJO SECHAGUA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02761 | CL 111A SUR 10B 09 ESTE | LUIS CARLOS JEJEN JEJEN | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02995 | CL 111A SUR 8C 31 ESTE | DIANA MARLENE SANCHEZ VIRVIESCAS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03000 | CL 111A SUR 8C 61 ESTE | NUBIA YISETH MARTINEZ ZABALA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03005 | CL 111A SUR 8C 85 ESTE | URIEL CLAROS CHAVARRO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03018 | CL 112 SUR 9 26 ESTE | JESUS ANTONIO LEGUIZAMON MUNEVAR | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03024 | CL 111A SUR 9 09 ESTE | LISBETH MARIA CARDENAS GARCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03042 | CL 111A SUR 10 17 ESTE | SMITH RUEDA SANCHEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03139 | KR 9 ESTE 112 09 SUR | LUIS JOSE GRAJALES VALENCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03188 | CL 112A SUR 8A 25 ESTE | CHERLY OSORIO MORA | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03201 | CL 112A SUR 8A 87 ESTE | ANGELINA ORTIZ CARVAJAL | | | 19/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03218 | CL 112A SUR 8C 35 ESTE | BEATRIZ ELLIS ESCORCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03241 | CL 112A SUR 8D 21 ESTE | LERVIS DARIS GOMEZ ORTEGA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03243 | CL 112A SUR 9 07 ESTE | BLANCA AURORA NIÑO CASALLAS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03247 | CL 112A SUR 9 33 ESTE | MESIAS ROMERO GARCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03248 | CL 112A SUR 9 39 ESTE | JOSE ISIDRO BENAVIDES JIMENEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03262 | CL 114 SUR 8B 36 ESTE | CLAUDIA LILIANA TOVAR SASA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03268 | CL 114 SUR 8 38 ESTE | MARTHA CECILIA BARRETO QUINA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MV_03271 | CL 114 SUR 8 18 ESTE | SANDRA YASMIN CASTILLO BELTRAN | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MVAL_03020 | CL 112 SUR 9 16 ESTE | YULI CAROLINA MARTINEZ AMADO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02749 | CL 111 SUR 10B 25 ESTE | FERLEIN MATEUS HERNANDEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03031 | CL 111A SUR 9 51 ESTE | GLORIA PATRICIA GALLEGO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03067 | CL 112A SUR 8A 88 ESTE | MARTHA ARANDA | | | 19/01/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03116 | CL 112A SUR 8D 14 ESTE | NELSON RODRIGUEZ ROJAS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MVAL_03123 | CL 112A SUR 8C 50ESTE | FANY LEONOR LOPEZ RIVERA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03189 | CL 112A SUR 8A 27 ESTE | NIDIA YOLIMA ZAPATA RODRIGUEZ | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03190 | CL 112A SUR 8A 35 ESTE | LIGIA BERNAL DE LEYTON | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03211 | CL 113 SUR 8C 08 ESTE | GRACIELA CRUZ DIAZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03229 | CL 113 SUR 8D 58 ESTE | LUIS ANTONIO GARCIA MORENO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03231 | CL 113 SUR 8D 40 ESTE | ISMAEL GAONA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03239 | CL 112A SUR 8D 15 ESTE | LUCILA OCHOA DE VEGA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03258 | CL 114A SUR 8B 66 ESTE | GIOVANNY ANDRES MEDINA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03270 | CL 114 SUR 8 26 ESTE | BETTY PAYAN ACEVEDO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03300 | CL 114 SUR 8 44 ESTE | FABIOLA ALVARADO SANCHEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03339 | CL 113 SUR 8D 97 ESTE | SIXTO ABILIO PERALTA RINCON | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03352 | CL 114 SUR 8B 09 ESTE | CARMEN MERCEDES TORRES RICO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03359 | CL 114 SUR 8B 57 ESTE | JAZMIN ALONSO MENDEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_02748 | KR 10B BIS ESTE 111 06 SUR | ANGELMIRA FUENTES FUENTES | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03215 | CL 112A SUR 8C 11 ESTE | ANA BETULIA MESA LOPEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03344 | CL 114A SUR 8B 30 ESTE | ARCANGEL DE JESUS ROJAS LONDOÑO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03150 | CL 112A SUR 9 04 ESTE | MARTHA RUBIO DELGADO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03317 | CL 114 SUR 9 38 ESTE | JOSE DIAZ CRUZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03041 | CL 111A SUR 10 11 ESTE | ELENA ULCUNCHE VARGAS | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03187 | CL 112A SUR 8A 21 ESTE | VIRGINA GARCIA MORENO | | | 17/1/2023 | | | VALIDADA | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03232 | CL 113 SUR 8D 22 ESTE | MONICA LILIANA GUERRERO RUBIO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MV_03314 | CL 114 SUR 9 78 ESTE | CARMEN ELISA DAVILA MARTINEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03320 | CL 114 SUR 8D 20 ESTE | MYRIAM NOVA GONZALEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03321 | KR 8D ESTE 113 20 SUR | JHULHTZAI GUEVARA OÑATE | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03397 | CL 114A SUR 8B 59 ESTE | LUZ STELLA AYA LOPEZ | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03399 | CL 114A SUR 8B 47 ESTE | JORGE ELIECER TABARES GARCIA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MVAL_03125 | CL 112A SUR 8C 44 ESTE | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ TORRES | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MVAL_03328 | CL 113 SUR 8D 25 ESTE | LUZ NELLY CARDONA JURADO | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MVAL_03403 | CL 114A SUR 8B 21 ESTE | FELISA ALEJO ARDILA | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |
| | MV_03040 | CL 111A SUR 10 07 ESTE MJ | YAMIL TOVAR INFANTE | | | | | | SIN VALIDAR | 0,00% | 0,00% |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# ANEXO 2


## Registro fotográfico componente social

| REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES - BELLA FLOR | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Actividad: Apertura<br>MVBF_1228<br>Fecha: 24/01/2023 | Actividad: Apertura<br>MVBF_805<br>Fecha: 25/01/2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_1496<br>Fecha: 25/01/2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_ 0225<br>Fecha: 25/01/2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MVBF_241 .<br>Fecha: 26/01/2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_312<br>Fecha: 26/01/2023 | Actividad: PAC<br>Fecha: 25/01/2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1228<br>Fecha: 26/01/2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0854<br>Fecha: 25/01/2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1324<br>Fecha: 26/01/2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1330<br>Fecha: 26/01/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1195<br>Fecha: 25/01/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MVBF_0758<br>Fecha: 23-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_791<br>Fecha: 23-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_0789<br>Fecha: 23-01-2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0737<br>Fecha: 23-01-2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0780<br>Fecha: 23-01-2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_983<br>Fecha: 24-01-2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1201<br>Fecha: 24-01-2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1121<br>Fecha: 24-01-2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MVBF_1424<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_1464<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_027<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_022<br>Fecha: 27-01-2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MVBF_1424<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_1464<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_027<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validación<br>MVBF_022<br>Fecha: 27-01-2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MVBF_1465<br>Fecha: 27-01-2023 | Actividad: Validaciones<br>MVBF_549<br>Fecha: 23/01/2023 | Actividad: Validaciones<br>MVBF_0592<br>Fecha: 27/01/2023 | Actividad: Validaciones<br>MVBF_605<br>Fecha: 27/01/2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Validaciones<br>MVBF_0570<br>Fecha: 27/01/2023 | Actividad: Apertura de vivienda<br>MVBF_631<br>Fecha: 24/01/2023 | Actividad: Apertura de vivienda<br>MVBF_650<br>Fecha: 24/01/2023 | Actividad: Apertura de vivienda<br>MVBF_0669<br>Fecha: 24/01/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Apertura de vivienda<br>MVBF_683<br>Fecha: 24/01/2023 | Apertura de vivienda<br>MVBF_660<br>Fecha: 24/01/2023 | Apertura de vivienda<br>MVBF_0677<br>Fecha: 24/01/2023 | Actividad: Seguimientos<br>MVBF_1013<br>Fecha: 27/01/2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Seguimientos<br>MVBF_1000<br>Fecha: 27/01/2023 | Actividad: Seguimientos<br>MVBF_660<br>Fecha: 27/01/2023 | Actividad: Seguimientos<br>MVBF_631<br>Fecha: 27/01/2023 | Actividad: Seguimientos<br>MVBF_683<br>Fecha: 27/01/2023 |
|  |  |  | |
| Actividad: Seguimientos<br>MVBF_0669<br>Fecha: 27/01/2023 | ATENCION PAC: 21/01/2023 | Actividad: Seguimientos<br>MVBF_650<br>Fecha: 27/01/2023 | |

| REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES - USME | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MV_03062<br>Fecha: 23/01/2023 | Actividad: Validación<br>MV_03101<br>Fecha: 23/01/2023 | Actividad: Validación<br>MV_03098<br>Fecha: 23/01/2023 | Actividad: Instalación de pendón Punto de Atención a la Comunidad PAC USME<br>Fecha: 24/01/2023 |
|  |  |  |  |
| Actividad: Validación<br>MV_03095<br>Fecha: 27/01/2023 | Actividad: Validación<br>MV_03103<br>Fecha: 26/01/2023 | Actividad: Validación<br>MV_02940<br>Fecha: 26/01/2023 | Actividad: Caso Especial<br>MV_02931<br>Fecha: 26/01/2023 |
|  | | | |
| Actividad: Validación<br>MV_02928<br>Fecha: 27/01/2023 | | | |
