	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 7/02/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1561 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1599 de 2021 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 9,33 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22-oct-21 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
CESION CONTRATO	10/12/2021	Cesion del Contrato 1561 de 2021 por parte de CASTRO TCHERASSI S.A. al CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE integrado por las sociedades INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 40% - CASTRO TCHERASSI S.A. 60%

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ADICION NUMERO DOS (2) Y PRORROGA (1) DE 2022	29/07/2022	31/07/2022	31/12/2022
PRORROGA NUMERO DOS (2) DE 2022	22/12/2022	31/12/2022	10/03/2023
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10-mar-23 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 62.471.836.050,00

50% EN SMMLV: 34.380,87 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
ADICION No.1 DE 2021	27/12/2021	$ 17.669.530.259,00	19.448,57
ADICION NUMERO DOS (2) Y PRORROGA (1) DE 2022	29/07/2022	$ 14.490.000.000,00	14.490,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 94.631.366.309,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. DL000167 de fecha 31 de Enero de 2023 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato hasta el 31 de octubre de 2023.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EL ALCANCE A REALIZAR CON LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE PRORROGA PRINCIPALMENTE ES LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DEL PUENTE LA AGUADA 2, LA INTERVENCION DEL PUENTE DOS RIOS Y LAS ACTIVIDADES DE PARCHEO Y RETIRO DE EVENTUALES DERRUMBES DEL CORREDOR PASTO - MOJARRAS - POPAYAN Y VARIANTE DE POPAYAN.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual Adicion No.2 y Prorroga 1 Fecha: 29 de Julio de 2022	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
SUBTOTAL VALOR OBRAS (A)	$ 54.876.286.550,00	$ 85.282.056.310,00	**$ 0,00**	**$ 85.282.056.310,00**
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (B)	$ 393.723.142,00	$ 393.723.142,00	**$ 0,00**	**$ 393.723.142,00**

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (C)	$ 4.284.266.534,00	$ 5.408.166.952,00	**$ 0,00**	**$ 5.408.166.952,00**
VALOR BASICO DEL CONTRATO (D=A+B+C)	$ 59.554.276.226,00	$ 91.083.946.404,00	**$ 0,00**	**$ 91.083.946.404,00**
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD) (E)	$ 435.204.326,00	$ 665.613.454,00	**$ 0,00**	**$ 665.613.454,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	$ 59.989.480.552,00	$ 91.749.559.858,00	**$ 0,00**	**$ 91.749.559.858,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 820.000.000,00	$ 1.155.673.070,00	**$ 0,00**	**$ 1.155.673.070,00**
IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 155.800.000,00	$ 219.577.883,00	**$ 0,00**	**$ 219.577.883,00**
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIA	$ 975.800.000,00	$ 1.375.250.953,00	**$ 0,00**	**$ 1.375.250.953,00**
COSTOS DIRECTOS PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD = (1)	$ 332.396.355,00	$ 332.396.355,00	**$ 0,00**	**$ 332.396.355,00**
COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (2,5%*(1)) = (2)	$ 8.309.909,00	$ 8.309.909,00	**$ 0,00**	**$ 8.309.909,00**
IVA COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (19% * (2)) = (3)	$ 1.578.883,00	$ 1.578.883,00	**$ 0,00**	**$ 1.578.883,00**
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD SECTOR II (1) + (2) + (3) = (C)	$ 342.285.147,00	$ 342.285.147,00	**$ 0,00**	**$ 342.285.147,00**
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN) (D)	$ 600.841.620,00	$ 600.841.620,00	**$ 0,00**	**$ 600.841.620,00**
GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN) (E)	$ 563.428.731,00	$ 563.428.731,00	**$ 0,00**	**$ 563.428.731,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 62.471.836.050,00	$ 94.631.366.309,00	**$ 0,00**	**$ 94.631.366.309,00**
Valor Total	**$ 62.471.836.050,00**	**$ 94.631.366.309,00**	**$ 0,00**	**$ 94.631.366.309,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) DE 2022 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 93,32 % (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 94,37 %
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 80.476.884.830,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 80.546.045.290,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 83.989.993.590,56
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 30.000.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 25.664.000.277,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 4.335.999.723,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) DE 2022 (año) $ 83.989.993.590,56

Último mes facturado: Diciembre de 2022 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 10.641.372.718,44
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO APLICA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

1. A partir de Enero de 2023 las actividades de ejecución del contrato se encuentran principalmente enfocadas en la atención en la construcción del puente La Aguada en el K41+500 de la Ruta 2502 del corredor Pasto – Mojarras, las intervenciones relacionadas con el mantenimiento del puente Dos Ríos, sector Galindez en la vía Mojarras – Popayán, que mediante la atención de la estructura metálica se permite garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios del corredor y por lo tanto mitigar el riesgo de cierre del tránsito por afectaciones por el deterioro de la estructura y en el desarrollo de actividades de parcheo de pavimento y la remoción de eventuiales derrumbes que puedan ocurrir.
2. Como es de conocimiento general, en la madrugada del lunes 9 de enero de 2023 y debido a la fuerte acumulación de lluvias tanto de los primeros días de enero, como del año 2022, en el sector contemplado entre el PR75+300 a PR75+600 tramo Rosas - Párraga sobre la vía Panamericana, ocurrió un movimiento en masa tipo complejo, deslizamiento de gran magnitud, generando la afectación del corredor, impidiendo la transitabilidad del sector y dejando incomunicado el Departamento de Nariño hacia el norte del país.

3. Por lo anterior el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS procedió a emitir la Resolución No. 111 de 16 de enero de 2023 “Por la cual se declara la Urgencia Manifiesta para la atención de la emergencia vial registrada entre los PR75+0300 y el PR75+0600 de la vía 2503 Mojarras - Popayán, Departamento del Cauca”, con lo cual actualmente se adelantan las actividades de adecuación de una variante en la zona afectada con la cual se tiene previsto el restablecimiento de la conexión de forma normal en un plazo no inferior a 4 meses.

4. Como consecuencia del cierre total en la transito por el sector, se han presentado problemas relacionados con el abastecimiento de insumos, movimiento de equipos y afectaciones considerables a la logística destinada para el desarrollo de las actividades enunciadas en el numeral 1 de la presente comunicación, toda vez que la atención de los puentes se encuentra hacia el sur del departamento del Cauca y norte del departamento de Nariño, y la fuente de materiales principal del proyecto (Galindez), ubicada en el municipio de Mercaderes se encuentra incomunicada con el resto del corredor.

5. Por lo anterior y teniendo en cuenta los tiempos esperados para la habilitación normal del tránsito sobre el corredor Mojarras – Popayán, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el dia 31 de octubre de 2023.

JURÍDICA:

FECHA: 7/02/2023 (Día / Mes / Año)

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

Es necesario tener en cuenta que la presente solicitud no implica realizar adiciones presupuestales al presente contrato. Los recursos actuales asignados son suficientes para el desarrollo de las actividades aquí descritas.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Las condiciones presupuestales del contrato no varian con la presente solicitud por lo que el valor del presente contrato no se modifica:

DESCRIPCION	VALOR INICIAL	ADICION 1	ADICION 2	VALOR ACTUAL
VIGENCIA 2021	$ 29.929.062.146,00	$ 17.669.530.259,00	$ 0,00	$ 47.598.592.405,00
VIGENCIA 2022	$ 32.542.773.904,00	$ 0,00	$ 14.932.300.000,00	$ 47.475.073.904,00
TOTAL	**$ 62.471.836.050,00**	**$ 17.669.530.259,00**	**$ 14.932.300.000,00**	**$ 95.073.666.309,00**

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No se requiere adiciones presupuestales para la ejecucion de la prorroga presentada.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

El tramites de esta prórroga, no implica generar modificadores a las actividades y compromisos sociales, predial y ambientales del proyecto, por consiguiente, durante el tiempo de esta prorroga se seguirán acometiendo todo lo referente a este tema, para dar cumplimiento al PMT, PAGA, capacitaciones ambientales, acercamiento con la comunidad aledaña al proyecto y controles.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

NO APLICA.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos: 1- Comunicaciones del Contratista DL000167 de Enero 31 de 2023, 2- DP-1457-Ctto.1561-21. 3- Comunicación de aprobación por parte de Interventoria No. ICE-POP-028-23, 4 Reprogramacion al Programa de Inversiones. 5- Programa de Obra actualizado

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o Apoderado
Contratista - CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
Matrícula Profesional No.:25202-19017 CND

Vo.Bo.Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre: GERMÁN ENRIQUE OLIER OLIVER
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial

Firma: Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Titular Gerencia: GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO DONADO HERNANDEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría - INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 08202-41266 ATL

Vo.Bo.Firma

Nombre: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No. 68202-83207 STD

Firma: Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Jefe Unidad Ejecutora

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA
PROGRAMA DE INVERSIONES: ☐
REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 10
FECHA: 31-ene-23

CONTRATO DE OBRA No :	1561 de 2021	PLAZO INICIAL:	9,33 MESES
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	22-oct-21
		FECHA DE SUSPENSION:	N/A
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE (CASTRO TCHERASSI S.A. 60% - INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 40%)	VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$62.471.836.050,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	1599 de 2021	INTERVENTOR:	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$94.631.366.309,00

PLAZO ACUMULADO:	24,43 MESES		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-oct-23		
FECHA DE REANUDACION:	N/A		
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$ 32.159.530.259,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA N° / MES	1 22 al 31 de Octubre de 2021	2 Noviembre de 2021	3 Diciembre de 2021	4 Enero de 2022	5 Febrero de 2022	6 Marzo de 2022	7 Abril de 2022	8 Mayo de 2022	9 Junio de 2022	10 Julio de 2022	11 Agosto de 2022	12 Septiembre de 2022	13 Octubre de 2022	14 Noviembre de 2022	15 Diciembre de 2022
EXPLANACIONES	($ 2.322.416,03)	(4,23%)	64,45%	%P		0,00%	6,81%	27,18%	7,15%	7,15%	7,15%	12,87%	12,87%	12,87%	9,39%	9,39%	3,25%	3,25%	3,25%	8,67%
	$ 1.629.203,02	2,97%	$ 1.496.894,22	$P		$0,00	$110.879,51	$442.742,53	$116.511,19	$116.511,19	$116.511,19	$209.720,14	$209.720,14	$209.720,14	$152.929,63	$152.929,63	$52.929,63	$52.929,63	$52.929,63	$141.185,00
				$E		$0,00	$8.365,50	$32.277,96	$24.088,82	$674,25	$26.769,87	$77.197,50	$348.553,70	$66.335,99	$50.015,99	$31.152,97	$344.948,61	$248.970,68	$171.936,06	$82.[illegible]
				%E		0,00%	0,51%	1,98%	1,48%	0,04%	1,64%	4,74%	21,39%	4,07%	3,07%	1,91%	21,17%	15,28%	10.[illegible]	4,03%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 1.448.475,40)	(2,64%)	16,06%	%P		0,00%	0,00%	40,50%	23,78%	23,78%	23,78%	47,79%	47,79%	55,69%	0,90%	42,49%	-32,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 288.559,05	0,53%	$ 232.643,22	$P		$0,00	$0,00	$116.876,11	$68.619,92	$68.619,92	$68.619,92	$137.899,86	$137.899,86	$160.706,86	$2.604,35	$122.605,34	-$95.203,35	$0,00	$0,00	$0,00
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$27.108,90	$45.365,74	$160.168,50	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,39%	15,72%	55,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 42.548.146,46)	(77,53%)	170,02%	%P		0,00%	4,23%	14,74%	3,82%	3,82%	3,82%	7,74%	7,74%	9,08%	5,18%	2,85%	4,63%	5,20%	7,03%	2,22%
	$ 72.724.764,38	132,52%	$ 72.340.615,68	$P		$0,00	$3.075.135,57	$10.720.717,48	$2.779.976,02	$2.779.976,02	$2.779.976,02	$5.628.653,66	$5.628.653,66	$6.604.389,2[illegible]	$3.772.696,71	$2.072.696,71	$3.370.504,41	$3.785.301,0[illegible]	$5.115.301,06	$1.615.301,06
				$E		$0,00	$3.359.913,04	$12.068.231,49	$3.024.301,55	$3.173.537,65	$5.568.356,40	$7.374.635,61	$7.961.993,3[illegible]	$7.635.633,[illegible]	$5.420.395,75	$5.031.983,67	$4.070.652,31	$2.315.211,2[illegible]	$3.045.825,32	$2.28[illegible]945,14
				%E		0,00%	4,62%	16,59%	4,16%	4,36%	7,66%	10,14%	10,95%	8,50%	7,45%	6,92%	5,60%	3,18%	4,19%	3,15%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 6.621.348,69)	(12,07%)	47,77%	%P		0,00%	0,00%	5,12%	4,48%	4,48%	4,48%	8,06%	8,06%	29,25%	27,05%	21,05%	21,05%	23,06%	5,03%	3,03%
	$ 4.992.938,70	9,10%	3.162.821,92	$P		$0,00	$0,00	$255.757,16	$223.676,66	$223.676,66	$223.676,66	$402.617,99	$402.617,99	$1.[illegible]60.497,9[illegible]	$1.051.148,04	$1.051.148,04	$1.051.148,04	$1.051.148,04	$251.148,04	$151.148,04
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$24.874,20	$37.863,79	$106.435,69	$189.819,87	$203.558,02	$324.978,27	$429.102,2[illegible]	$537.728,80	$540.441,37	$768.[illegible]19,71
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,76%	2,13%	3,80%	4,08%	6,51%	8,59%	10,77%	10,82%	15,38%
SEÑALIZACION	($ 1.706.714,28)	(3,11%)	181,58%	%P		0,00%	0,00%	6,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,83%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	12,61%	2,13%
	$ 3.442.609,37	6,27%	$ 3.099.062,39	$P		$0,00	$0,00	$220.361,45	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$682.685,71	$133.944,52	$133.944,52	$133.944,[illegible]2	$133.944,52	$433.944,52	$93.944,52
				$E		$0,00	$0,00	$474.166,57	$155.564,53	$[illegible]8.7[illegible],9[illegible]	$0,00	$216.040,50	$0,00	$866.114,63	$503.878,93	$249.154,99	$136.233,[illegible]8	$320.975,20	$55.063,16	$82.[illegible]50,40
				%E		0,00%	0,00%	13,77%	4,52%	1,12%	0,00%	6,29%	0,00%	25,16%	14,64%	7,24%	3,96%	9,32%	1,60%	2,40%
TRANSPORTES	($ 229.185,69)	(0,42%)	93,38%	%P		0,00%	5,97%	18,57%	4,78%	4,78%	4,78%	9,00%	9,00%	9,63%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%
	$ 234.446,07	0,43%	$ 214.007,85	$P		$0,00	$13.984,93	$43.[illegible]5,28	$11.216,21	$11.216,21	$11.216,21	$21.108,34	$21.108,34	$22.565,75	$12.204,07	$12.204,07	$12.204,07	$12.204,07	$12.204,07	$12.[illegible]4,07
				$E		$0,00	$1.911,67	$11.897,18	$6.812,65	$0,00	$2.741,88	$0,00	$20.666,37	$71.814,92	$3.489,49	$3.968,94	$65.644,9[illegible]	$1.208,06	$2.846,63	$1.0[illegible]4,88
				%E		0,00%	0,09%	5,07%	2,91%	0,00%	1,17%	0,00%	8,81%	30,63%	1,49%	1,69%	36,53%	0,52%	1,21%	0,43%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 54.876.286,55)	(100,00%)	146,78%																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 83.312.520,60	151,82%	$ 80.546.045,29																	

ACTA DE MOD. No.1 - ADICIÓN 1 | ACTA DE MOD. No.2 | ACTA DE MOD. No.3 | ACTA DE MOD. No.4- ADICIÓN Y PRORROGA | ACTA DE MOD. No.5 | ACTA DE MOD. No.6 | ACTA DE MODIFICACION No.7 - REPROGRAMACION POR PRORROGA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	5,83%	21,50%	5,83%	5,83%	5,83%	11,66%	11,66%	16,66%	9,34%	6,46%	8,25%	9,36%	10,69%	3,67%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	3.200.000,00	11.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	9.140.565,71	5.125.527,32	3.545.528,31	4.525.527,32	5.135.527,32	5.865.527,32	2.013.882,69
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	5,83%	27,33%	33,17%	39,00%	44,83%	56,49%	68,15%	84,81%	94,16%	114,69%	122,93%	132,29%	142,98%	146,65%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	3.200.000,00	15.000.000,00	18.200.000,00	21.400.000,00	24.600.000,00	31.000.000,00	37.400.000,00	46.540.565,71	51.666.093,03	62.936.420,18	67.461.947,50	72.597.474,82	78.463.002,14	80.476.884,83
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	6,14%	22,94%	5,85%	5,85%	10,25%	14,04%	15,43%	16,17%	11,56%	10,28%	9,23%	6,24%	6,95%	5,84%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	3.370.190,41	12.586.573,19	3.210.767,55	3.212.931,90	5.622.742,35	7.706.337,40	8.464.757,98	8.875.084,32	6.341.506,77	5.641.238,84	5.066.581,80	3.424.094,01	3.816.112,53	3.207.126,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	6,14%	29,08%	34,93%	40,78%	51,03%	65,07%	80,50%	96,67%	108,23%	118,51%	127,74%	133,98%	140,93%	146,78%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	3.370.190,41	15.956.763,60	19.167.531,15	22.380.463,05	28.003.205,40	35.709.542,80	44.174.300,78	53.049.385,10	59.390.891,87	65.032.130,71	70.098.712,50	73.522.806,52	77.338.919,05	80.546.045,29

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		
PROGRAMA INICIAL		
PROGRAMA ADICION 1		

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 393.723,14 / $ 393.723,14	$ 0,00	0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 4.284.266,53 / $ 5.408.166,95	$ 2.023.251,49	37,41%
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD ORBA)	$ 435.204,33 / $ 665.613,45	$ 579.954,32	87,13%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 820.000,00 / $ 1.155.673,07	$ 0,00	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 155.800,00 / $ 219.577,88	$ 0,00	0,00%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 563.428,73 / $ 563.428,73	$ 0,00	0,00%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 600.841,62 / $ 600.841,62	$ 0,00	0,00%
PROVISIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 342.285,15 / $ 342.285,15	$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 7.595.549,50	$ 2.603.205,81	27,84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 9.349.310,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 62.471.836,05	$ 83.149.251,11	89,73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 92.661.830,60		

SE REALIZA LA PRESENTE REPROGRAMACION DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE PRORROGA 3 MEDIANTE LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023

OBSERVACIONES

Aprueba:
CARLOS FERNANDO MÉNDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF: 08202-41266 ATL

Revisó:
Ing. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
TITULAR GERENCIA: GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
MAT PROF: 25202-212088 CND

Aprueba:
Ing. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
JEFE UNIDAD EJECUTORA (E)
SUBDIRECCION TÉCNICA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
MAT. PROF. 25202-212088 CND

Revisó: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Ing. JOSE ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 19202-40631 CAU

Revisó: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Ing. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLÓN
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
MAT PROF: 19202-40638 CAU

Revisó:
Ing. ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
MAT PROF: 68202-83207 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [ ]
REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 10

FECHA 31-ene-23

CONTRATO DE OBRA No : 1561 de 2021
OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO
CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
(CASTRO TCHERASSI S.A. 60% - INGENIERIA DE VIAS S.A.S. 40%)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1599 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 9,33 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22-oct-21
FECHA DE SUSPENSION: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $62.471.836.050,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $94.631.366.309,00

PLAZO ACUMULADO: 24,43 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-oct-23
FECHA DE REANUDACION: N/A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $ 32.159.530.259,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Junio de 2023	Julio de 2023	Agosto de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023
EXPLANACIONES	($ 2.322.416,03)	(4,23%)	64,45%	%P		3,44%	3,55%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%
				$P		$55.987,10	$57.852,00	$53.510,10	$53.510,10	$53.510,10	$53.510,10	$53.510,10	$53.510,10	$53.510,10	$53.510,10
	$ 1.629.203,02	2,97%	$ 1.496.894,22	%E											
				$E											
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 1.448.475,40)	(2,64%)	16,06%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
				$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.128,00	$7.130,00	$7.130,00	$7.125,84
	$ 288.559,05	0,53%	$ 232.643,22	%E											
				$E											
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 42.548.146,46)	(77,53%)	170,02%	%P		0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,98%
				$P		$89.847,00	$0,00	$0,00	$0,00	$75.130,00	$75.130,00	$75.130,00	$75.130,00	$75.130,00	$713.165,11
	$ 72.724.764,38	132,52%	$ 72.340.615,68	%E											
				$E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 6.621.348,69)	(12,07%)	47,77%	%P		0,55%	0,95%	1,00%	1,04%	1,10%	1,15%	1,21%	1,27%	1,33%	5,91%
				$P		$27.289,30	$47.639,30	$50.123,00	$52.136,00	$54.742,80	$57.479,94	$60.353,94	$63.371,63	$66.540,22	$294.970,80
	$ 4.992.938,70	9,10%	3.162.821,92	%E											
				$E											
SEÑALIZACION	($ 1.706.714,28)	(3,11%)	181,58%	%P		0,23%	1,51%	0,14%	0,17%	0,91%	0,88%	0,88%	1,02%	0,29%	1,47%
				$P		$7.830,00	$51.831,00	$4.767,00	$5.863,00	$31.255,00	$30.250,00	$30.150,00	$35.125,00	$10.122,00	$50.608,61
	$ 3.442.609,37	6,27%	$ 3.099.062,39	%E											
				$E											
TRANSPORTES	($ 229.185,69)	(0,42%)	93,38%	%P		17,89%	1,07%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
				$P		$41.950,00	$2.500,00	$1.205,00	$1.205,00	$1.205,00	$1.205,00	$1.205,00	$1.205,00	$1.205,00	$1.206,36
	$ 234.446,07	0,43%	$ 214.007,85	%E											
				$E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**($ 54.876.286,55)**	(100,00%)	146,78%			ACTA DE MODIFICACION No.8	REPROGRAMACION POR PRORROGA 3								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 83.312.520,60**	151,82%	$ 80.546.045,29												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%					0,41%	0,29%	0,20%	0,21%	0,39%	0,40%	0,41%	0,43%	0,39%	2,04%
	VALOR (Miles de Pesos)					222.903,40	159.822,30	109.605,10	112.714,10	215.842,90	217.575,04	227.477,04	235.471,74	213.637,32	1.120.586,83
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%					147,06%	147,35%	147,55%	147,75%	148,15%	148,54%	148,96%	149,39%	149,78%	151,82%
	VALOR (Miles de Pesos)					80.699.788,23	80.859.610,53	80.969.215,63	81.081.929,73	81.297.772,64	81.515.347,68	81.742.824,72	81.978.296,45	82.191.933,77	83.312.520,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		
PROGRAMA INICIAL		
PROGRAMA ADICION 1		

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 393.723,14	$ 0,00	0,00%
	$ 393.723,14		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ 4.284.266,53	$ 2.023.251,49	37,41%
	$ 5.408.166,95		
VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD ORBA)	$ 435.204,33	$ 579.954,32	87,13%
	$ 665.613,45		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 820.000,00	$ 0,00	0,00%
	$ 1.155.673,07		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 155.800,00	$ 0,00	0,00%
	$ 219.577,88		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ 563.428,73	$ 0,00	0,00%
	$ 563.428,73		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 600.841,62	$ 0,00	0,00%
	$ 600.841,62		
PROVISIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)	$ 342.285,15	$ 0,00	0,00%
	$ 342.285,15		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 7.595.549,50	$ 2.603.205,81	27,84%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 9.349.310,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 62.471.836,05	$ 83.149.251,11	89,73%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 92.661.830,60		

SE REALIZA LA PRESENTE REPROGRAMACION DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE PRORROGA 3 MEDIANTE LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023

OBSERVACIONES

Apruebas:
CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT PROF. 25202-19017 CND

Apruebas:
CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MAT. PROF: 08202-41266 ATL

Revisó:
Ing. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
TITULAR GERENCIA: GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
MAT PROF: 25202-212088 CND

Apruebas:
VoBo ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
JEFE UNIDAD EJECUTORA (E)
SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
MAT. PROF. 25202-212088 CND

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó:
Ing. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 19202-40631 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó:
Ing. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
MAT PROF: 19202-40638 CAU

Revisó:
Ing. ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
MAT PROF:68202-83207 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Remolino, Nariño, febrero 07 de 2022 ICE-POP-034-22

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Ingeniero José Adrián Valencia Castrillón.
Supervisor Contrato de Interventoría
jvalencia@invias.gov.co
Popayán, Cauca

Ref. Contrato N. 1599 -2021 Interventoría Técnica Legal, Administrativa y Financiera Para el Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Mojarras-Popayán Ruta 2503 y Variante de Popayán – Ruta 25CCB Y Pasto – Mojarras, Ruta 2502, Sector Cano-Mojarras Departamento de Cauca y Nariño.

Asunto: CONTRATO 1561-21. Solicitud del Contratista de Obra para ampliar el plazo del contrato 1561-21 hasta el 31 de octubre de 2023.

Respetado ingeniero,

Mediante comunicación No. DL000167 del 02 de febrero de 2023, el CONTRATISTA DE OBRA solicita ampliar el plazo del contrato hasta el 31 de octubre de 2023, sin adición de recursos.

Revisada la solicitud del asunto y una vez que el Contratista de Obra allegó la totalidad de documentos exigidos para el trámite, esta interventoría considera procedente conceder la ampliación y por tanto la aprueba y la envía a la Supervisión del contrato para su revisión y, de considerarla viable, presentarla ante el Comité de Contratación del INVIAS.

La interventoría imparte su aprobación fundamentada en los siguientes hechos:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- El día veintitrés (23) de diciembre de 2022, se aprobó la ampliación del contrato de obra N°. 1561 de 2021, inicialmente celebrado con el contratista CASTRO TCHERASSI S.A, contrato que fue cedido el nueve (09) de diciembre de 2021 al CONSORCIO TRONCAL DE OCCICENTE y cuyo objeto es:

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS – POPAYÁN, RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN – RUTA 25CCB Y PASTO – MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO - MOJARRAS DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO", el cual tiene como fecha de terminación el 10 de marzo de 2023. En su momento no se amplió por un período mayor, dadas las limitaciones de recursos para la interventoría, de tal forma que haciendo ajustes en el plan de cargas del contrato 1599-21, se amplió hasta donde se estimó que con los recursos sobrantes de la interventoría a diciembre 31 de 2022, se podría llegar hasta el 10 de marzo de 2023.

- La ampliación del contrato de obra 1561-21 se aprobó fundamentalmente, para la construcción de un puente definitivo en el sitio denominado como La Aguada, PR41+500 de la RN2502, en donde una avalancha ocurrida el 13 de mayo destruyó totalmente el puente allí existente, lo que obligó a trasladar desde Bogotá e instalar un puente metálico provisional, de un solo carril de circulación, instalación que concluyó exitosamente a finales del mes de junio 2022.

- El proceso de elaboración, revisión y aprobación de los diseños correspondientes para el nuevo puente proyectado ya está concluido.

- La respectiva aprobación de todos y cada uno de los Nuevos Precios (NPs) ya está concluida.

- El plazo estimado para la construcción de dicho puente es de aproximadamente seis (06) meses, teniendo en cuenta que debe ser construido en dos etapas, completamente independientes, esto para permitir el tránsito vehicular a un carril controlado 24 horas, que opera actualmente.

- Acorde con la situación particular descrita anteriormente y considerando que las actividades de explanación fueron concluidos en el mes de diciembre de 2022, el Contratista de Obra solicita ampliar su contrato hasta el 31 de octubre de 2023, habida cuenta que como efecto de la emergencia ocurrida el pasado 9 de enero en el PR75+300 RN2503, sector Rosas, el restablecimiento del suministro normal de concreto hidráulico mezclado en planta, así como el cable, el acero y las grúas de 50 toneladas requeridas para el izaje de las vigas, puede tomar como mínimo 4 meses, -tiempo estimado para habilitar la vía Popayán-

Pasto para vehículos tipo tracto camión que transportan cemento a granel, acero de 12 m de longitud y grúas telescópicas de alto tonelaje-.

- Adicionalmente, el Contratista de Obra deberá terminar los trabajos que no se alcancen a realizar a marzo 10 de 2023 en las reparaciones del puente Metálico Dos Ríos, PR8+700 RN2503, trabajos que a la fecha no han dado inicio pues las labores de campo sobre la auscultación del estado actual del puente fueron concluidas el pasado 15 de diciembre y se encuentra en proceso de entrega el correspondiente informe técnico y diseños para revisión y aprobación, así como de la aprobación de los correspondientes Nuevos Precios unitarios (NP) requeridos para su ejecución, proceso que se estima esté concluido el 30 de marzo de 2023.

- Igualmente, el Contratista de Obra se obliga a mantener durante el período marzo-octubre 2023, equipo menor para atender actividades de parcheo localizadas en todo el corredor vial Pasto-Popayán y garantizar la seguridad de los usuarios, así como equipo necesario para atender eventuales emergencias generadas por derrumbes.

JUSTIFICACIÓN JURIDICA

- De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

- La presente solicitud no implica realizar adiciones presupuestales al presente contrato, pues los recursos actuales asignados son suficientes para el desarrollo de las actividades descritas en la justificación técnica.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

- El trámite de esta modificación y ampliación del plazo del contrato no implica modificar las actividades y compromisos ambientales del proyecto, por

consiguiente, se seguirán acometiendo todo lo referente a este tema, dando cumplimiento a la legislación ambiental.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

- El trámite de modificación y ampliación de plazo no implica modificar las actividades y compromisos sociales del proyecto, por consiguiente, se seguirán acometiendo todo lo referente a este aspecto.

Para efecto de la revisión se adjuntan los siguientes documentos:

- Comunicación DL000167 de febrero 2, de solicitud de ampliación de plazo.
- Comunicación ICE-POP-028-23, de aprobación a la solicitud de ampliación de plazo solicitada, expedida por parte de la interventoría.
- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1, de Solicitud de Prórroga Contrato de Obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1, de Reprogramación al Programa de Inversiones.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, de Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.
- Programa de Obra actualizado

Cordialmente,



_____

CARLOS ALBERTO DONADO HENRÍQUEZ
Representante Legal
Ingenieros Civiles Especialistas Ltda.

c.c. Archivo
Anexo: Lo enunciado

Remolino, Nariño, febrero 02 de 2023 ICE-POP-028-23

Señores:
CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
Ing. Jaime Ignacio Gómez Guerra
Director de obra
El Bordo, Cauca.


Ref. Contrato N. 1599 -2021 Interventoría Técnica Legal, Administrativa y Financiera Para el Mantenimiento y Rehabilitación de la Vía Mojarras-Popayán Ruta 2503 y Variante de Popayán – Ruta 25CCB Y Pasto – Mojarras, Ruta 2502, Sector Cano-Mojarras Departamento de Cauca y Nariño.

Asunto: Contrato No. 1561. **Su comunicación DL-000167 de febrero 02 de 2023, solicitud ampliación del plazo del contrato hasta el 31 de octubre de 2023.**

Respetado ingeniero:

Revisada la información adjunta al comunicado del asunto y verificado que los Programas de Obra y de Reprogramación de Inversiones para el período de prórroga están incluidos, la interventoría imparte su aprobación a esta solicitud y, en consecuencia continuará el trámite ante el Supervisor del Contrato.

Cordialmente,



Ing. JAIRO SALÉH PÁEZ
Director de Interventoría
Ingenieros Civiles Especialistas S.A.S.

c.c.
Archivo

CONSORCIO TRONCAL OCCIDENTE

Bogotá D.C., Febrero 2 de 2023
DL000167

Señores
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.
Ing. Carlos Alberto Donado Hernández
Representante Legal
Barranquilla, Atlántico

Referencia: **Contrato 1561 de 2021**. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.

Asunto: Solicitud de Prórroga 3.

Respetado Ingeniero:

Por medio del presente permito presentar la siguiente solicitud prórroga del presente contrato hasta el 31 de octubre de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que corresponden a eventos y situaciones ajenas a la voluntad y capacidad del contratista para la ejecución del contrato:

SOPORTE TECNICO

1. A partir de Enero de 2023 las actividades de ejecución del contrato se encuentran principalmente enfocadas en la atención en la construcción del puente La Aguada en el K41+500 de la Ruta 2502 del corredor Pasto – Mojarras, las intervenciones relacionadas con el mantenimiento del puente Dos Ríos, sector Galindez en la vía Mojarras – Popayán, que mediante la atención de la estructura metálica se permite garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios del corredor y por lo tanto mitigar el riesgo de cierre del tránsito por afectaciones por el deterioro de la estructura y en el desarrollo de actividades de mantenimiento de pavimento en especial en intervenciones a realizar en la ruta 2503 Mojarras – Popayán. en los sectores comprendidos entre el K38 al K42, K58 al K61 y del K63 al K66.

2. Como es de conocimiento general, en la madrugada del lunes 9 de enero de 2023 y debido a la fuerte acumulación de lluvias tanto de los primeros días de enero, como del año 2022, en el sector contemplado entre el PR75+300 a PR75+600 tramo Rosas - Párraga sobre la vía Panamericana, ocurrió un movimiento en masa tipo complejo, deslizamiento de gran magnitud, generando la afectación del corredor, impidiendo la transitabilidad del sector y dejando incomunicado el Departamento de Nariño hacia el norte del país.

3. Por lo anterior el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS procedió a emitir la Resolución No. 111 de 16 de enero de 2023 *"Por la cual se declara la Urgencia Manifiesta para la atención de la emergencia vial registrada entre los PR75+0300 y el PR75+0600 de la vía 2503 Mojarras - Popayán, Departamento del Cauca",* con lo cual actualmente se adelantan las actividades de adecuación de una variante en la zona afectada con la cual se tiene previsto el restablecimiento de la conexión de forma normal en un plazo no inferior a 4 meses.

4. Como consecuencia del cierre total en la transito por el sector, se han presentado problemas relacionados con el abastecimiento de insumos, movimiento de equipos y afectaciones considerables a la logística destinada para el desarrollo de las actividades enunciadas en el numeral 1 de la presente comunicación, toda vez que la atención de los puentes se encuentra hacia el sur del departamento del Cauca y norte del departamento de Nariño, y la fuente de materiales principal del proyecto (Galindez), ubicada en el municipio de Mercaderes se encuentra incomunicada con el resto del corredor.

5. Por lo anterior y teniendo en cuenta los tiempos esperados para la habilitación normal del tránsito sobre el corredor Mojarras – Popayán, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución hasta el dia 31 de octubre de 2022.

SOPORTE JURIDICO

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.

Es necesario tener en cuenta que la presente solicitud, no implica realizar adiciones presupuestales al presente contrato, los recursos actuales asignados son suficientes para el desarrollo de las actividades aquí descritas.

SOPORTE AMBIENTAL

El trámite de esta modificación y ampliación del plazo del contrato, no implica modificar las actividades y compromisos ambientales del proyecto, por consiguiente, se seguirán acometiendo todo lo referente a este tema, dando cumplimiento a la legislación ambiental.

SOPORTE SOCIAL

El trámite de modificación y ampliación de plazo, no implica modificar las actividades y compromisos ambientales del proyecto, por consiguiente, se seguirán acometiendo todo lo referente a este aspecto.

CONSORCIO TRONCAL OCCIDENTE

Para el presente trámite, adjunto a la presente comunicación se remiten los siguientes documentos:

1. Formato de Solicitud de Modificación y Prórroga. MEPI-MN1-IN-12-FR-1
2. Reprogramación de Inversiones. MEPI-MN1-IN-6-FR-2

Atentamente,

CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

NIT: 901.548.239-4
Calle 36 Nº 18-23 OF-201 Bogotá D.C.
Tel: (601) 320 4820
E-mail: gerencia@ingenieriadevias.com.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 (Día) 2 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1561 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.

FECHA DE INICIO: 22/10/2021

PLAZO INICIAL: 9,33 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 62.471.836.050,00

VALOR ACUMULADO: $ 94.631.366.309,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 975.800.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.375.250.953,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1599 de 2021 **INTERVENTOR:** INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.247.183.605,00	20	9	2021	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 30.000.000.209,32	20	9	2021	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 12.494.367.210,00	20	9	2021	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 292.740.000,00	31	7	2022	31	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 18.741.550.815,00	31	7	2022	31	7	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100044543

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 24/12/2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 3.123.591.802,50	20	9	2021	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. BQ-100011561 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 24/12/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 7 (Día) 2 (Mes) 2023 (Año)

SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9.463.136.630,90	20	9	2021	10	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 30.000.000.000,00	20	9	2021	10	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 18.926.276.261,80	20	9	2021	10	3	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 412.575.285,90	31	12	2022	10	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 27.976.834.696,00	31	12	2022	10	3	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. BQ-100044543

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/02/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 4.731.568.315,45	20	9	2021	10	3	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. BQ-100011561 **OTRAS PÓLIZAS No.** N/A

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 2/02/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

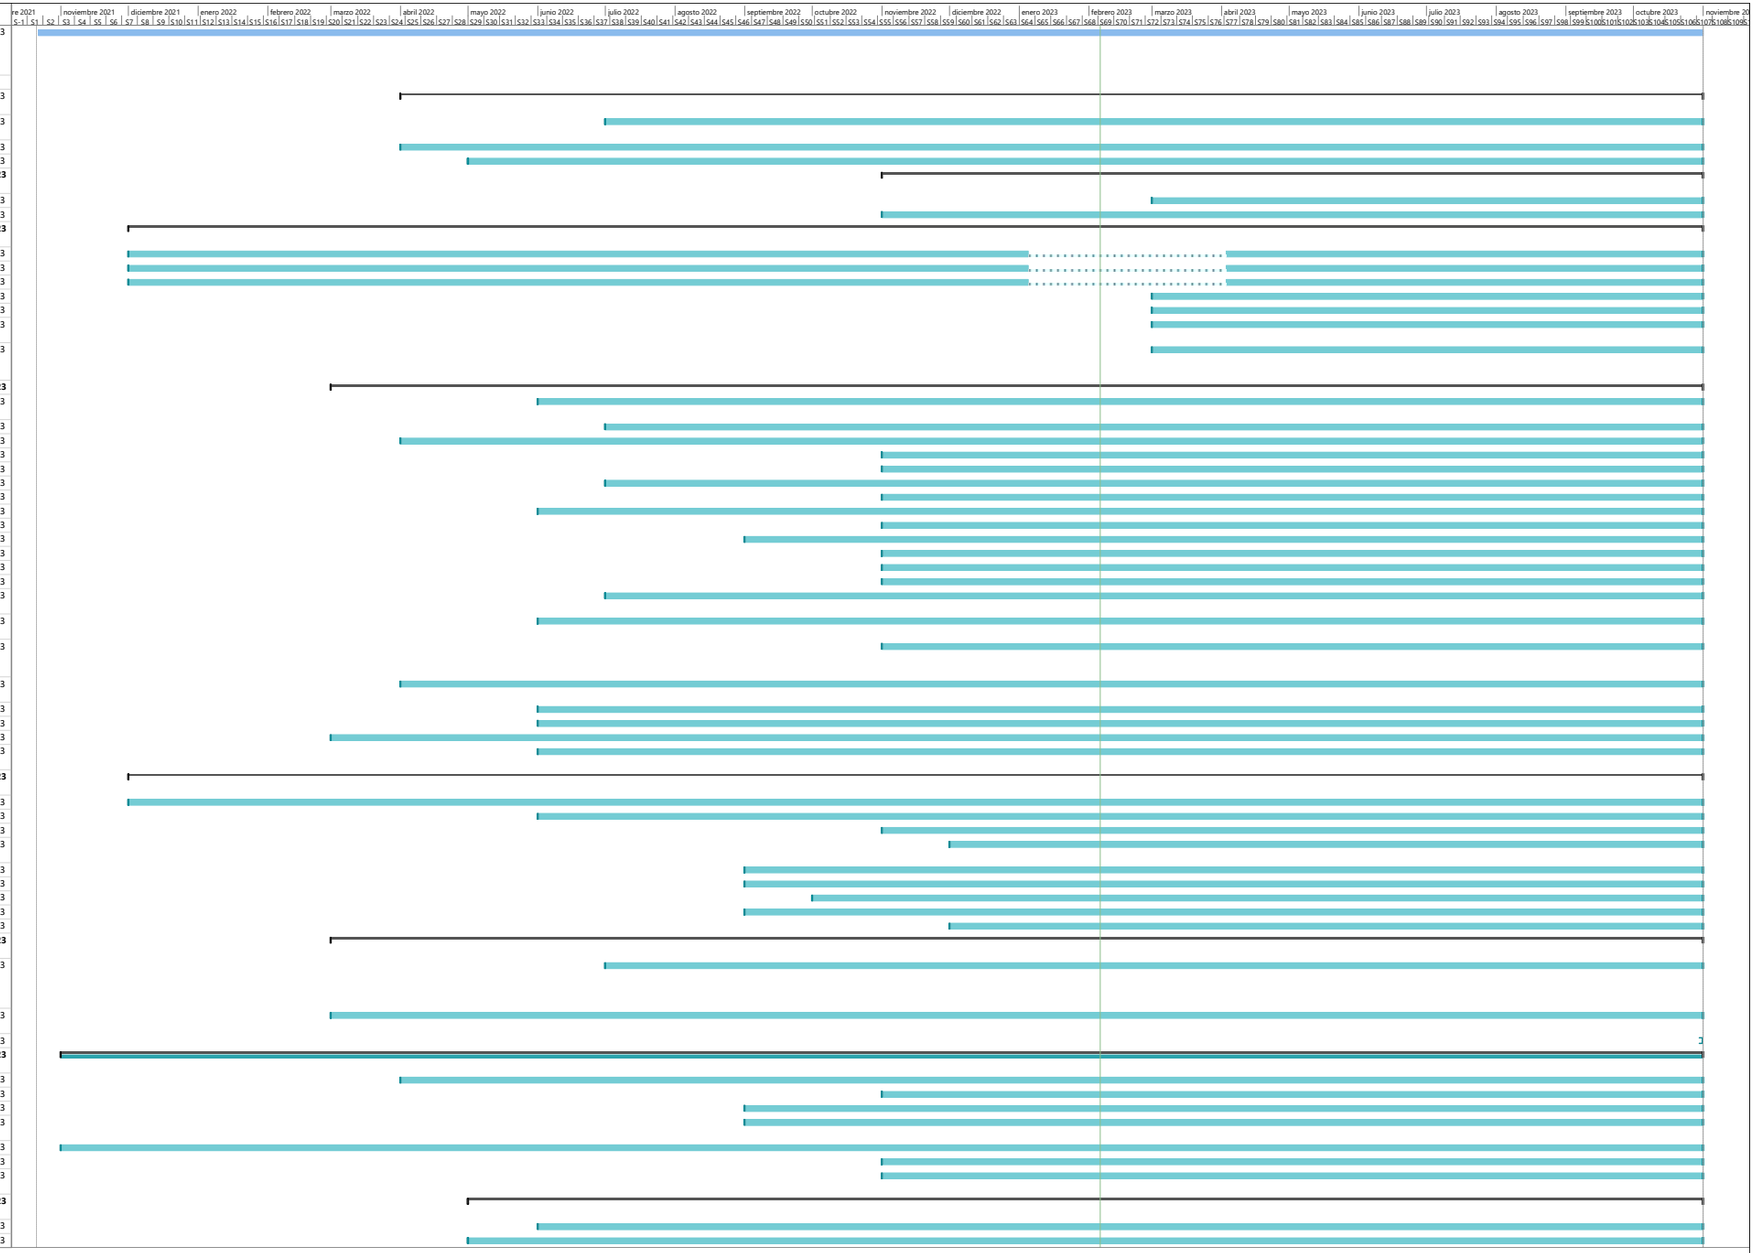
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAIRO SALÉH PÁEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25000-14661 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO**	105.8 sem.	vie 22/10/21	mar 31/10/23
2		**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**			
3		**I - EXPLANACIONES**	414 días	**vie 1/04/22**	mar 31/10/23
4		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	69.8 sem.	**vie 1/07/22**	mar 31/10/23
5		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	82.8 sem.	vie 1/04/22	mar 31/10/23
6		REMOCIÓN DE DERRUMBES	78.8 sem.	dom 1/05/22	mar 31/10/23
7		**II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS**	**262 días**	**mar 1/11/22**	**mar 31/10/23**
8		SUB-BASE GRANULAR CLASE A	35.2 sem.	mié 1/03/23	mar 31/10/23
9		BASE GRANULAR CLASE A	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
10		**III - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**	**501 días**	**mié 1/12/21**	**mar 31/10/23**
11		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	87.8 sem.	mié 1/12/21	mar 31/10/23
12		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	87.8 sem.	mié 1/12/21	mar 31/10/23
13		Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 (PARA 2503)	87.8 sem.	mié 1/12/21	mar 31/10/23
14		Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 (PARA 25CCB)	35.2 sem.	mié 1/03/23	mar 31/10/23
15		Mezcla en Caliente para Bacheo MSC-25 (PARA 2503)	35.2 sem.	mié 1/03/23	mar 31/10/23
16		Fresado de Pavimento Asfaltico MOJARRAS POPAYÁN - VARIANTE POPAYÁN	35.2 sem.	mié 1/03/23	mar 31/10/23
17		Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	35.2 sem.	mié 1/03/23	mar 31/10/23
18		**IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**437 días?**	**mar 1/03/22**	**mar 31/10/23**
19		Excavaciones Varias en material común en seco MOJARRAS POPAYÁN - VARIANTE POPAYÁN	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
20		Excavaciones Varias en Material Comun en Seco a mano	69.8 sem.	vie 1/07/22	mar 31/10/23
21		Rellenos Para Estructuras con Recebo.	82.8 sem.	vie 1/04/22	mar 31/10/23
22		Relleno con material filtrante.	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
23		Concreto Resistencia 28MPa	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
24		Concreto Resistencia 21MPa	69.8 sem.	vie 1/07/22	mar 31/10/23
25		Concreto Resistencia 14MPa	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
26		Concreto Resistencia 14MPa (Ciclopeo)	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
27		Baranda Metálica (60Kg/m)	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
28		Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
29		Fabricación de Estructura Metálica.	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
30		Transporte de Estructura Metálica.	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
31		Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	262 días	mar 1/11/22	mar 31/10/23
32		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	69.8 sem.	vie 1/07/22	mar 31/10/23
33		Tubería de Plastico Tipo PVC Norma NTC5055 de Diametro 4''	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
34		Disipadores de Energía y Sedimentadores en Concreto Reforzado con resistencia mínima a la compresión de 21 Mpa.	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
35		Cuneta de Concreto Vaciada In Situ 21 Mpa, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	82.8 sem.	vie 1/04/22	mar 31/10/23
36		Geotextil no tejido	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
37		Material Granular Drenante	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
38		Dren Horizontal de Longitud Mayor a diez (10) metros.	87.4 sem.	mar 1/03/22	mar 31/10/23
39		Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
40		**V - SEÑALIZACIÓN**	**501 días**	**mié 1/12/21**	**mar 31/10/23**
41		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	100.2 sem.	mié 1/12/21	mar 31/10/23
42		Marca Vial con Pintura en Frío.	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
43		Tacha reflectiva	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
44		Señal Vertical de Transito tipo SP, SR Y SI con lamina retroreflectiva TIPO 9 o superior (75 x 75) cm	48 sem.	jue 1/12/22	mar 31/10/23
45		Defensa Metálica.	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
46		Sección Final.	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
47		Sección de tope	56.8 sem.	sáb 1/10/22	mar 31/10/23
48		Elemento Especial Tipo Amortiguadores	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
49		Captafaros	48 sem.	jue 1/12/22	mar 31/10/23
50		**VI - TRANSPORTES**	**437 días**	**mar 1/03/22**	**mar 31/10/23**
51		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	69.8 sem.	vie 1/07/22	mar 31/10/23
52		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	87.4 sem.	mar 1/03/22	mar 31/10/23
53		**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**			mar 31/10/23
54		**I - EXPLANACIONES**	**523 días**	**lun 1/11/21**	**mar 31/10/23**
55		Demolición de Estructuras - NARIÑO	82.8 sem.	vie 1/04/22	mar 31/10/23
56		Demolición de rocas - NARIÑO	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
57		Excavación en roca de la explanación y canales - NARIÑO	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
58		Excavacion en material común de la Explanación y Canales - NARIÑO	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
59		Remoción de Derrumbes - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
60		Descargue muros Pantallas - NARIÑO	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
61		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares - NARIÑO	52.4 sem.	mar 1/11/22	mar 31/10/23
62		**II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS**	**393 días**	**dom 1/05/22**	**mar 31/10/23**
63		Subbase Granular clase A - NARIÑO	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
64		Base granular clase A - NARIÑO	78.8 sem.	dom 1/05/22	mar 31/10/23



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
65		**III - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**	**523 días**	**lun 1/11/21**	**mar 31/10/23**
66		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - NARIÑO	92 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
67		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 - NARIÑO	92.2 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
68		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 - NARIÑO	92.2 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
69		Fresado de pavimento asfaltico - NARIÑO	30.6 sem.	lun 3/04/23	mar 31/10/23
70		Geotextil para repavimentación	30.6 sem.	lun 3/04/23	mar 31/10/23
71		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. - NARIÑO	30.6 sem.	lun 3/04/23	mar 31/10/23
72		**IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**523 días**	**lun 1/11/21**	**mar 31/10/23**
73		Excavaciones varias en roca en seco - NARIÑO	56.8 sem.	sáb 1/10/22	mar 31/10/23
74		Excavaciones varias en material comun en seco - NARIÑO	69.8 sem.	vie 1/07/22	mar 31/10/23
75		Rellenos para Estructuras con suelo - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
76		Rellenos Para Estructuras con Recebo. - NARIÑO	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
77		Concreto clase 21MPa - NARIÑO	82.8 sem.	vie 1/04/22	mar 31/10/23
78		Concreto clase 14 MPa - NARIÑO	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
79		Acero de refuerzo Fy=420 MPa - NARIÑO	82.8 sem.	vie 1/04/22	mar 31/10/23
80		Cuneta de Concreto Vaciada In Situ 21 MPA; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo - NARIÑO	65.6 sem.	lun 1/08/22	mar 31/10/23
81		Geotextil Tipo no tejido - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
82		Material granular drenante - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
83		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
84		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) - NARIÑO	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
85		Remplazo de Gaviones con gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) (no incluye piedra gavión) - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
86		**V - SEÑALIZACIÓN**	**523 días**	**lun 1/11/21**	**mar 31/10/23**
87		Líneas de demarcación con pintura en frio - NARIÑO	100.2 sem.	mié 1/12/21	mar 31/10/23
88		Marca Vial con pintura en frio - NARIÑO	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
89		Tacha reflectiva Bidireccional - NARIÑO	74.2 sem.	mié 1/06/22	mar 31/10/23
90		Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior (75 x 75) cm - NARIÑO	48 sem.	jue 1/12/22	mar 31/10/23
91		Señal Vertical de Tránsito tipo 2 con lamina retrorreflectiva tipo IX o superior (1,20 x 0,40 m) - NARIÑO	48 sem.	jue 1/12/22	mar 31/10/23
92		Defensa metalica - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
93		Sección final - NARIÑO	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
94		**VI - TRANSPORTES**	**523 días**	**lun 1/11/21**	**mar 31/10/23**
95		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	61 sem.	jue 1/09/22	mar 31/10/23
96		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	104.6 sem.	lun 1/11/21	mar 31/10/23
97		**VII - OTROS**	**284 días**	**sáb 1/10/22**	**mar 31/10/23**
98		Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, bajo agua	56.8 sem.	sáb 1/10/22	mar 31/10/23
99		Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	284 días	sáb 1/10/22	mar 31/10/23
100		Implementacion de Plan de manejo de trafico, para un puente con 2 accesos, incluye personal 24 horas y señalzacion	384 días	sáb 14/05/22	mar 31/10/23
101		Retiro y Cambio de Apoyo Movil	305 días	jue 1/09/22	mar 31/10/23
102		Gateo de Apoyos Moviles	305 días	jue 1/09/22	mar 31/10/23
103		Limpieza de estructuras metalicas con chorro de arena (sandblasting)	305 días	jue 1/09/22	mar 31/10/23
104		Fabricación de base Metálica para Puente La Aguada II, PR 41+500 - RN 2502	284 días?	sáb 1/10/22	mar 31/10/23
105		Transporte de Estructura Metálica para Puente La Aguada II, PR 41+500 - RN 2502	263 días	sáb 1/10/22	sáb 30/09/23
106		CONCRETO DE 5000PSI (35MPA) PARA VIGAS	197 días?	sáb 1/10/22	vie 30/06/23
107		Concreto Resistencia 28 MPa para Tablero Puente	197 días?	sáb 1/10/22	vie 30/06/23
108		Acero de Preesfuerzo	197 días?	sáb 1/10/22	vie 30/06/23
109		APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO (42X42X5)	241 días?	sáb 1/10/22	jue 31/08/23
110		APOYO ELASTOMÉRICO (30X30X3)	241 días?	sáb 1/10/22	jue 31/08/23
111		Pilote de Concreto tipo Caisson Vaciado In Situ, de diámetro 1,2 r	152 días?	sáb 1/10/22	dom 30/04/23
112		Izaje de viga	263 días?	sáb 1/10/22	sáb 30/09/23



CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

Proyecto: PROGRAMA DE OBRA
Fecha: lun 6/02/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SGCP 7332

Fecha
06/02/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1775542

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De	CRISTIAN TORO RIOS
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO

Información del Documento

■ **Referencia**	Respuesta del Memorando Individual No. SGI-GGPV 108036 30/12/2022

Anexos

■ **Anexo**	**2023.240.Acta Aprobacion Poliza Contrato 1561-2021 PR 2.pdf** **SECOP APRON ANEX 11 GUC.pdf** **SECOP APRON ANEX 11 RCE.pdf**

■Contenido

Respetado Ingeniero Ruiz,

En atención al memorando referido en el asunto, se informa que se aprobó la Póliza Única de Cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampara la Prórroga No.02 del 22 de diciembre de 2022.

Para mayor claridad de lo aprobado en la PLATAFORMA DE SECOP II en el numeral 7 ejecución del contrato, se encuentra el formato de acta de aprobación, el cual es un complemento con fines puramente informativos.

Cordialmente,

CRISTIAN TORO RÍOS
Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos

Proyectó: Daniela Jaramillo Cardona- Abogada SGCP
Revisó: Paola Rincón- Coordinadora SGCP
Anexo: Documentos Digitales (2)

Documento Origen

Documento Origen No. SGI-GGPV 108036

Historia del documento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	CONTRATO DE OBRA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL				

CONTRATO No. 1561 DE 2021

CONTRATISTA:	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE NIT 901.548.239-4
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	20/09/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/07/2022
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	10/03/2023
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 94.631.366.309,00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Prórroga No.02 del 22 de diciembre de 2022.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	BQ-100044543	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	11 del 29/12/2022	**ASEGURADORA:**	**Compañía Mundial de Seguros S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	20/09/2021	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	9.463.136.630,90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	20/09/2021	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	30.000.000.000,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	20/09/2021	**Hasta:**	10/03/2026	**Valor:**	$	18.926.273.261,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.				**Valor:**	$	27.976.834.696,00
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.				**Valor:**	$	412.575.285,90

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BQ-100011561	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	11 del 29/12/2022	**ASEGURADORA**	**Compañía Mundial de Seguros S.A.**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)	**Desde:** 20/09/2021	**Hasta:**	10/03/2023	**Valor:**	$	4.731.568.315
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE**	SI	**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES**		SI	
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SI	**VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	SI		**AMPARO PATRONAL**	SI

OBSERVACIONES:

REVISIONES Y APROBACIONES

Vo.Bo.:	Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Daniela Jaramillo Cardona	Abogado SGCPA
Revisó.: Paola Rincón	Coordinadora SGCPA
Aprobó: Cristian Toro Rios	Subdirector GCPA

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	JOfEd7NyffJwdyt7ndgRUA==	**Número de póliza**	100044543
Número de anexo	11	**Ramo**	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	29/12/2022	**Inicio de vigencia Global**	20/09/2021
Fin de vigencia Global	10/03/2028	**Tomador**	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
		Asegurado	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor asegurado	86.778.819.874,60		
Movimiento	PRORROGA		

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1561 DE 2021, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO; LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION Y CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REFERENTE.TOMADOR: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE INTEGRADO POR: CASTRO TCHERASSI SA 60%, Nit: 890.100.248-8INGENIERÍA DE VÍAS 40%., Nit 800.186.228-2,SE ACLARA QUE LA VIGENCIA INICIAL DE LA POLIZA ES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ACTA DE INICIO 22 DE OCTUBRE DEL 2021 - LA VIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.- LA VIGENCIA DE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.-EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIOIN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA.-EL AMPARO DE CALIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS EJECUTADAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.DISTRIBUCION DEL COASEGURO TIPO DE COASEGURO % PARTICIPACIONNACIONAL DE SEGUROS CEDIDO 50ZURICH COLOMBIA SEGUROS CEDIDO 25 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022 DE FECHA 23/12/2022 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE MARZO DEL 2023 POR ENDE SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS TAL COMO SE MUESTAR EN LA SECCION DE AMPAROS. TOMADOR: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE INTEGRADO POR: CASTRO TCHERASSI SA 60%, Nit: 890.100.248-8INGENIERÍA DE VÍAS 40%., Nit 800.186.228-2,LOS DEMAS TERMINOS Y CONOCIMIENTOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/09/2023	$ 9.463.136.630,90	$ 5.522.323,57
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/03/2026	$ 18.926.273.261,80	$ 10.733.530,32
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 10/03/2023	24:00 Horas del 10/03/2028	$ 27.976.834.696,00	$ 0,00
CALIDAD	00:00 Horas del 10/03/2023	24:00 Horas del 10/03/2028	$ 412.575.285,90	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/09/2023	$ 30.000.000.000,00	$ 17.506.849,32

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	tg+scYt/BZz7dPg2qSWC3A==	**Número de póliza**	100011561
Número de anexo	11	**Ramo**	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	29/12/2022	**Inicio de vigencia Global**	20/09/2021
Fin de vigencia Global	10/03/2023	**Tomador**	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
		Asegurado	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
Valor asegurado	4.731.568.315,45		
Movimiento	PRORROGA		

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.1561 DE 2021, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502,DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION REFERENTE.ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUALCONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS: OPERA EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE RC DE LOS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS MISMOS ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIARESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SE EXCLUYEN LAS ENFERMEDADES PROFESIONALESVEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: SOLO TENDRÁ ALCANCE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS Y POR HECHOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES QUE SE DETERMINAN EN EL CONTRATO. OPERARÁ EN EXCESO DE SU COBERTURA DE AUTOMÓVILES, CONTRATADA POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. SE EXCLUYE DE ESTA COBERTURA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS JUNTO CON LAS DEMÁS EXCLUSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CLAUSULADO GENERAL DE MUNDIAL DE SEGUROS S.A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.ESTA COBERTURA OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE POLIZA DE AUTOMOVIL (CONTRATADA O NO), CON LIMITES MINIMOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EVENTO $50.000.000/$50.000.000/$100.000.000.GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.LIMITE $5.000.000 EVENTO/PERSONA Y LIMITE $30.000.000 EVENTO/VIGENCIA .DISTRIBUCION DEL COASEGURO COMPAÑIA TIPO DE COASEGURO % PARTICIPACIONLA NACIONAL COMPAÑIA CEDIDO 50ZURICH COLOMBIA SEGUROS CEDIDO 25TOMADOR: CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE CONFORMADO POR CASTRO TCHERASSI SA 60%, Nit: 890.100.248-8INGENIERÍA DE VÍAS 40%., Nit 800.186.228-2,SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (DAÑO MORAL) PROVENIENTES DE UN DAÑO FISICO CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MAXIMO DEL 100% DEL LIMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PLO SE DEJA SIN EFECTO LA NOTA EN LA CARATULA DE LA POLIZA RELATIVA AL CUBRIMIENTO DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL 20% GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022 DE FECHA 23/12/2022 SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE MARZO DEL 2023 POR ENDE SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS TAL COMO SE MUESTAR EN LA SECCION DE AMPAROS.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/03/2023	$ 4.731.568.315,45	$ 2.683.382,58
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/03/2023	$ 1.419.470.494,64	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/03/2023	$ 1.419.470.494,64	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/03/2023	$ 1.419.470.494,64	$ 0,00
GASTOS MEDICOS	00:00 Horas del 31/12/2022	24:00 Horas del 10/03/2023	$ 45.443.874,73	$ 0,00

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogado Revisor	Aprobado	Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	Paola Andrea Rincon Sanchez	19 horas de tiempo transcurrido *(2/02/2023 4:25:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	Aprobado	CRISTIAN TORO RIOS	cristian toro rios	18 horas de tiempo transcurrido *(2/02/2023 4:36:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.10685246

Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO - PRORROGA 2 - 1561

Estado Aprobada

Justificación

- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Cumplimiento - Otros
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía (●) Contrato de seguro

○ Patrimonio autónomo

○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Número de póliza BQ-100044543

Tomador CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.000.000.000,00 COP	10/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	9.463.136.630,90 COP	10/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	18.926.273.261,80 COP	10/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	27.976.834.696,00 COP	10/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Otros	412.575.285,90 COP	10/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	CUMPLIMIENTO PRORROGA 2 - 1561.pdf	CUMPLIMIENTO PRORROGA 2 - 1561.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA* 30/12/2022 10:52 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogado Revisor	Aprobado	Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	Paola Andrea Rincon Sanchez	19 horas de tiempo transcurrido *(2/02/2023 4:25:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos	Aprobado	CRISTIAN TORO RIOS	cristian toro rios	18 horas de tiempo transcurrido *(2/02/2023 4:36:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.10685530

Referencia de la garantía RCE-PRORROGA 2 - 1561

Estado Aprobada

Justificación

- [ ] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [ ] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Tipo de garantía	☐ Cumplimiento - Pago de salarios ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra ☐ Cumplimiento - Otros ☑ Responsabilidad civil extra contractual ◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
Número de póliza	BQ-100011561
Tomador	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	4.731.568.315,45 COP	10/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	RCE - PRORROGA 2 - 1561.pdf	RCE - PRORROGA 2 - 1561.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA* 30/12/2022 10:55 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1561 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 14 días de febrero de 2023.

Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Nombre: ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Ordenador del Pago
Grupo Gerencia Grandes Proyectos de Gestión Vial
Subdirección: SGI
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO
Gestor del Proyecto Resolución 4099 del 2 de noviembre 2022
Grupo Gerencia Grandes Proyectos de Gestión Vial
Subdirección: SGI
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1561** **Fecha:** **20 de septiembre de 2021**

Contratista: CASTRO TCHERASSI S.A.

Objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

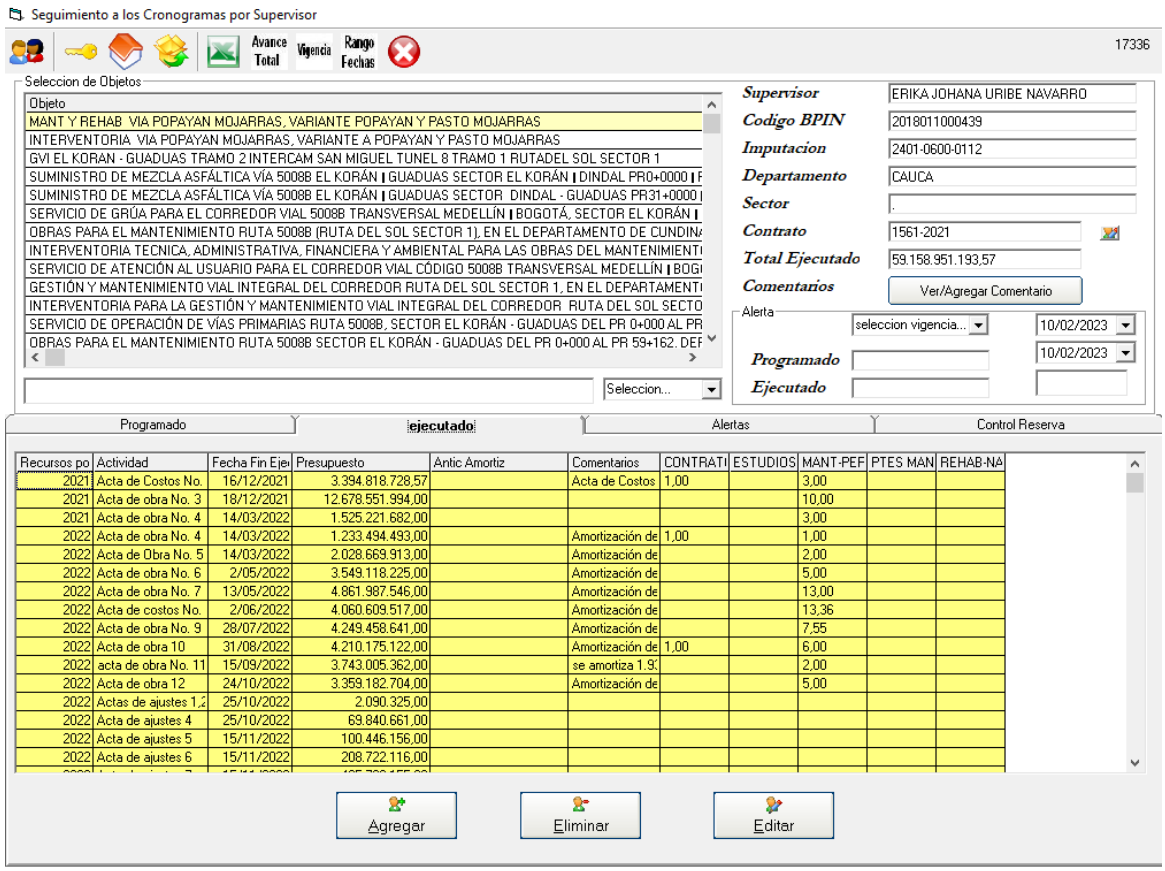
Secuencia	Documento	Observaciones
1	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No.149321
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 149321
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PANTALLAZO DE PROCESO EN SECOP II - LP-DO-SRN-016-2021 - LINK CONTRATO EN SECOP II: https://acortar.link/1561-2021
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AVISO DE CONVOCATORIA DEL PROCESO LP-DO-SRN-016-2021
5	RESOLUCION APERTURA	No. 2154 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LP-DO-SRN-016-2021
6	RESOLUCION APERTURA	DE SANEAMIENTO No. 2239 POR LA CUAL SE SANEA UN VICIO DE PROCEDIMIENTO PRESENTADO EN LA LP-DO-SRN-016-2021
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 1
8	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR
9	PLIEGO DE CONDICIONES	DOCUMENTO BASE DEFINITIVO DE LA LP-DO-SRN-016-2021
10	PLIEGO DE CONDICIONES	ANEXO TECNICO
11	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE AMBIENTAL
12	INFORME EVALUACION PROPUESTAS	ACTA DE AUDIENCIA DE LA LP-DO-SRN-016-2021
13	RESOLUCION DE ADJUDICACION	No. 2635 POR LA CUAL SE ADJUDICA EN AUDIENCIA PUBLICA LA LP-DO-SRN-016-2021
14	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR
15	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CARTA DE PRESENTACION OFERENTE GANADOR
16	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	CONTRATISTA Y REP LEGAL
17	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	

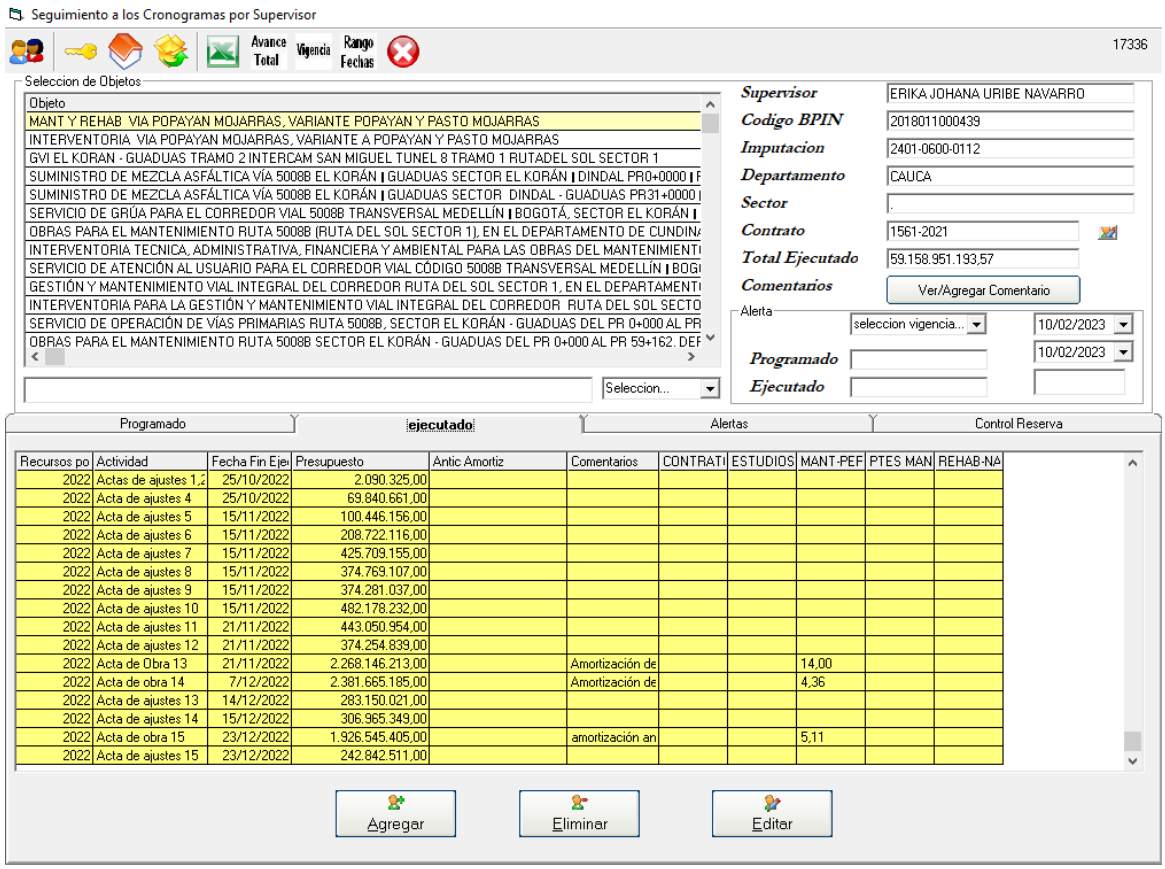
18	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	REP. LEGAL
19	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
20	CERTIFICACION BANCARIA	DAVIVIENDA
21	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA Y RNMC
22	MEMORANDO	No. SRN 67898 - REDISTRIBUCION RECURSOS CDP
23	CONTRATO PRINCIPAL	No. 1561-2021 INCLUYE MEMORANDO No. DC 69854 (21.09.2021) Y PANTALLAZO SECOP II
24	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 784121
25	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100011561 ANEXO 2 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
26	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100044543 ANEXO 4 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
27	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL - INCLUYE MEMORANDO No. SPSC 78837 (22.10.2021) Y PANTALLAZOS SECOP II
28	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	COMPROMISO VIGENCIA FUTURA No. 12521
29	OFICIO	DO 46331 - DESIGNACION GESTOR TECNICO DE PROYECTO A PEDRO JOSE BARON AVILA
30	RESOLUCION	No. 3071 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN FUNCIONARIO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1599 de 2021 A JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
31	ORDEN DE INICIACION	SGI 59547
32	OFICIO	GG-153OPB-21 SOLICITUD CESION CONTRATO - INCLUYE ACTA DE JUNTA DIRECTIVA REUNION PREVIA (04.10.2021)
33	MEMORANDO	DE SOPORTES DE LOS CONSIDERANDOS DE LA CESION DEL CONTRATO.
34	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CORRESPONDENCIA INCLUYE AUTO (23.SEP.2020) SE DECRETO LA TERMINACION DE DEMANDA
35	MEMORANDO	No. DEO 80712 APROBACION DE CONCEPTO TECNICO Y JURIDICO A CESION DEL CONTRATO
36	INFORME EVALUACION PROPUESTAS	DE CESION DEL CONTRATO
37	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CONTRATO PRIVADO DE CESION
38	CONTRATO ADICIONAL	CESION:AUTORIZAR LA CESION POR LA QUE EL CEDENTE (CASTRO TCHERASSI SA) CEDE EL 40% DE SU PARTICIPACION A FAVOR DEL CESIONADO (INGENIERIA DE VIAS SAS). ASI COMO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
39	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100011561 ANEXO 4 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
40	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100044543 ANEXO 5 Y 6 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
41	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 96560 (20.12.2021) Y PANTALLAZO SECOP II

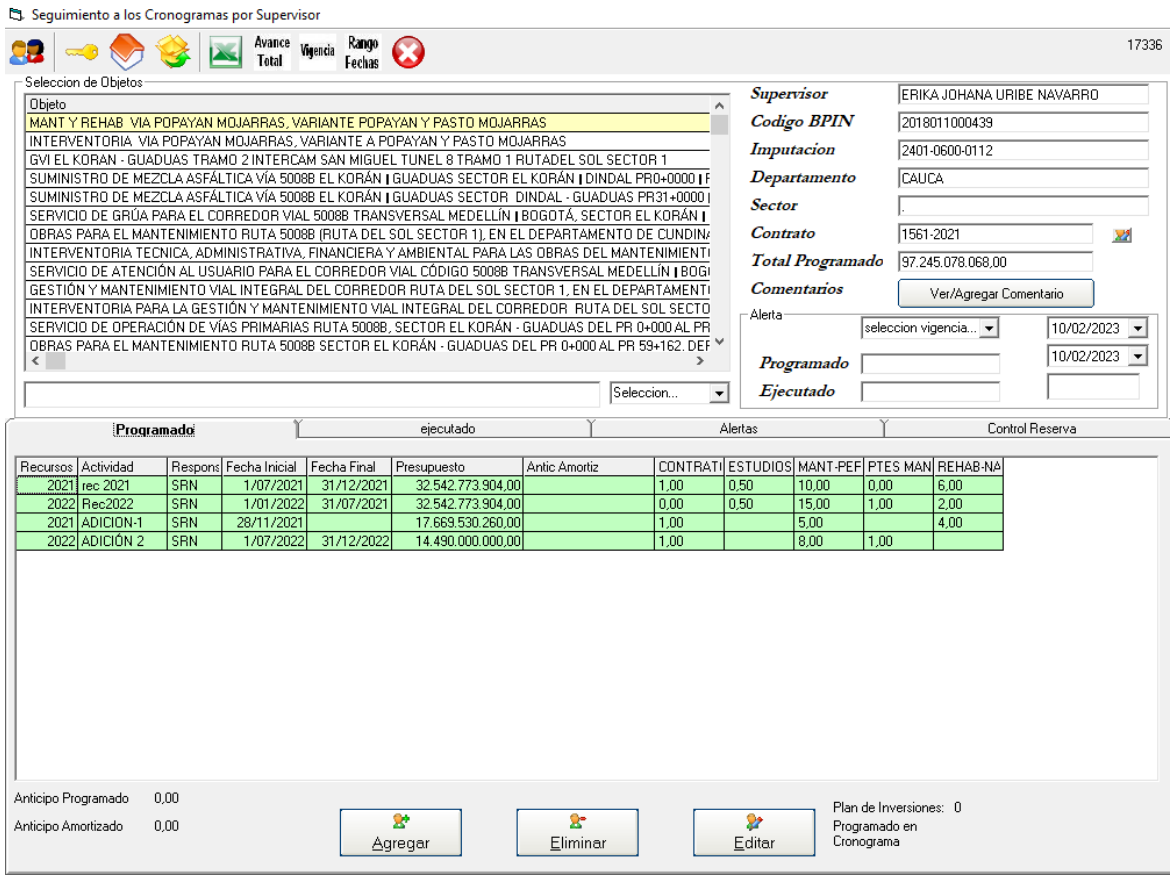
42	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100011561 ANEXO 6 AMPARANDO LA CESION DEL CONTRATO
43	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100044543 ANEXO 8 AMPARANDO LA CESION DEL CONTRATO
44	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA CESION DEL CONTRATO - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 98504 (24.12.2021) Y PANTALLAZO SECOP II
45	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1059921 - DE LA CESION
46	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 1
47	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	DE CONTRATACION - ACTA No. 10, APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO
48	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No.246821
49	REGISTRO PRESUPUESTAL	No.1057621
50	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	ACTUALIZADO - CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
51	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	ACTALIZADOS
52	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	REP. LEGAL
53	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
54	CONTRATO ADICIONAL	ADICION No. 1: ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $17.669.530.260 M/CTE INCLUIDO IVA. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
55	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 80222
56	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100011561 ANEXOS 7 Y 9 AMPARANDO ADICION No. 1
57	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100044543 ANEXO 9 AMPARANDO ADICION No. 1
58	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO ADICION No. 1 - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 39088 (25.05.2022) Y PANTALLAZO SECOP II
59	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1
60	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 38, APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO
61	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 199922
62	REGISTRO PRESUPUESTAL	No.855322
63	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
64	CONTRATO ADICIONAL	ADICION No. 2 - PRORROGA No. 1: POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DESDE EL 31 JUL 2022 HASTA EL 31 DIC 2022. - ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $14.490.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
65	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100011561 ANEXO 10 AMPARANDO LA ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1

66	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100044543 ANEXO 10 AMPARANDO LA ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1
67	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 76816 (26/09/2022) Y PANTALLAZO SECOP II
68	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 2
69	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 71. APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO
70	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
71	CONTRATO ADICIONAL	PRÓRROGA No. 02: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 31 DIC 2022 HASTA EL 10 MAR 2023. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
72	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100011561 ANEXO 11 AMPARANDO LA PRORROGA No. 2
73	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA No. BQ-100044543 ANEXO 11 AMPARANDO LA PRORROGA No. 2
74	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA PRORROGA No. 2 INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 7332 (06.02.2023) Y PANTALLAZO SECOP II

TOTAL ANEXOS 74


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
17336
Seleccion de Objetos
Objeto
MANT Y REHAB VIA POPAYAN MOJARRAS, VARIANTE POPAYAN Y PASTO MOJARRAS
INTERVENTORIA VIA POPAYAN MOJARRAS, VARIANTE A POPAYAN Y PASTO MOJARRAS
GVI EL KORAN - GUADUAS TRAMO 2 INTERCAM SAN MIGUEL TUNEL 8 TRAMO 1 RUTADEL SOL SECTOR 1
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5008B EL KORÁN | GUADUAS SECTOR EL KORÁN | DINDAL PR0+0000 | F
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5008B EL KORÁN | GUADUAS SECTOR DINDAL - GUADUAS PR31+0000 |
SERVICIO DE GRÚA PARA EL CORREDOR VIAL 5008B TRANSVERSAL MEDELLÍN | BOGOTÁ, SECTOR EL KORÁN |
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 5008B (RUTA DEL SOL SECTOR 1), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DEL MANTENIMIENT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA EL CORREDOR VIAL CÓDIGO 5008B TRANSVERSAL MEDELLÍN | BOG
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTOR 1, EN EL DEPARTAMENT
INTERVENTORIA PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTO
SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS RUTA 5008B, SECTOR EL KORÁN - GUADUAS DEL PR 0+000 AL PR
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 5008B SECTOR EL KORÁN - GUADUAS DEL PR 0+000 AL PR 59+162. DEF
Seleccion...
Supervisor
ERIKA JOHANA URIBE NAVARRO
Codigo BPIN
2018011000439
Imputacion
2401-0600-0112
Departamento
CAUCA
Sector
Contrato
1561-2021
Total Ejecutado
59.158.951.193,57
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
10/02/2023
Programado
10/02/2023
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
ESTUDIOS
MANT-PEF
PTES MAN
REHAB-NA
2021 Acta de Costos No. 16/12/2021 3.394.818.728,57 Acta de Costos 1,00 3,00
2021 Acta de obra No. 3 18/12/2021 12.678.551.994,00 10,00
2021 Acta de obra No. 4 14/03/2022 1.525.221.682,00 3,00
2022 Acta de obra No. 4 14/03/2022 1.233.494.493,00 Amortización de 1,00 1,00
2022 Acta de Obra No. 5 14/03/2022 2.028.669.913,00 Amortización de 2,00
2022 Acta de obra No. 6 2/05/2022 3.549.118.225,00 Amortización de 5,00
2022 Acta de obra No. 7 13/05/2022 4.861.987.546,00 Amortización de 13,00
2022 Acta de costos No. 2/06/2022 4.060.609.517,00 Amortización de 13,36
2022 Acta de obra No. 9 28/07/2022 4.249.458.641,00 Amortización de 7,55
2022 Acta de obra 10 31/08/2022 4.210.175.122,00 Amortización de 1,00 6,00
2022 acta de obra No. 11 15/09/2022 3.743.005.362,00 se amortiza 1.9 2,00
2022 Acta de obra 12 24/10/2022 3.359.182.704,00 Amortización de 5,00
2022 Actas de ajustes 1,2 25/10/2022 2.090.325,00
2022 Acta de ajustes 4 25/10/2022 69.840.661,00
2022 Acta de ajustes 5 15/11/2022 100.446.156,00
2022 Acta de ajustes 6 15/11/2022 208.722.116,00
Agregar
Eliminar
Editar


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
17336
Seleccion de Objetos
Objeto
MANT Y REHAB VIA POPAYAN MOJARRAS, VARIANTE POPAYAN Y PASTO MOJARRAS
INTERVENTORIA VIA POPAYAN MOJARRAS, VARIANTE A POPAYAN Y PASTO MOJARRAS
GVI EL KORAN - GUADUAS TRAMO 2 INTERCAM SAN MIGUEL TUNEL 8 TRAMO 1 RUTADEL SOL SECTOR 1
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5008B EL KORÁN | GUADUAS SECTOR EL KORÁN | DINDAL PR0+0000 | F
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5008B EL KORÁN | GUADUAS SECTOR DINDAL - GUADUAS PR31+0000 |
SERVICIO DE GRÚA PARA EL CORREDOR VIAL 5008B TRANSVERSAL MEDELLÍN | BOGOTÁ, SECTOR EL KORÁN |
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 5008B (RUTA DEL SOL SECTOR 1), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DEL MANTENIMIENT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA EL CORREDOR VIAL CÓDIGO 5008B TRANSVERSAL MEDELLÍN | BOG
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTOR 1, EN EL DEPARTAMENT
INTERVENTORIA PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTO
SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS RUTA 5008B, SECTOR EL KORÁN - GUADUAS DEL PR 0+000 AL PR
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 5008B SECTOR EL KORÁN - GUADUAS DEL PR 0+000 AL PR 59+162. DEF
Seleccion...
Supervisor
ERIKA JOHANA URIBE NAVARRO
Codigo BPIN
2018011000439
Imputacion
2401-0600-0112
Departamento
CAUCA
Sector
.
Contrato
1561-2021
Total Ejecutado
59.158.951.193,57
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
10/02/2023
Programado
10/02/2023
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
ESTUDIOS
MANT-PEF
PTES MAN
REHAB-NA
2022 Actas de ajustes 1,2 25/10/2022 2.090.325,00
2022 Acta de ajustes 4 25/10/2022 69.840.661,00
2022 Acta de ajustes 5 15/11/2022 100.446.156,00
2022 Acta de ajustes 6 15/11/2022 208.722.116,00
2022 Acta de ajustes 7 15/11/2022 425.709.155,00
2022 Acta de ajustes 8 15/11/2022 374.769.107,00
2022 Acta de ajustes 9 15/11/2022 374.281.037,00
2022 Acta de ajustes 10 15/11/2022 482.178.232,00
2022 Acta de ajustes 11 21/11/2022 443.050.954,00
2022 Acta de ajustes 12 21/11/2022 374.254.839,00
2022 Acta de Obra 13 21/11/2022 2.268.146.213,00 Amortización de 14,00
2022 Acta de obra 14 7/12/2022 2.381.665.185,00 Amortización de 4,36
2022 Acta de ajustes 13 14/12/2022 283.150.021,00
2022 Acta de ajustes 14 15/12/2022 306.965.349,00
2022 Acta de obra 15 23/12/2022 1.926.545.405,00 amortización an 5,11
2022 Acta de ajustes 15 23/12/2022 242.842.511,00
Agregar
Eliminar
Editar


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
17336
Seleccion de Objetos
Objeto
MANT Y REHAB VIA POPAYAN MOJARRAS, VARIANTE POPAYAN Y PASTO MOJARRAS
INTERVENTORIA VIA POPAYAN MOJARRAS, VARIANTE A POPAYAN Y PASTO MOJARRAS
GVI EL KORAN - GUADUAS TRAMO 2 INTERCAM SAN MIGUEL TUNEL 8 TRAMO 1 RUTADEL SOL SECTOR 1
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5008B EL KORÁN | GUADUAS SECTOR EL KORÁN | DINDAL PR0+0000 | F
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5008B EL KORÁN | GUADUAS SECTOR DINDAL - GUADUAS PR31+0000 |
SERVICIO DE GRÚA PARA EL CORREDOR VIAL 5008B TRANSVERSAL MEDELLÍN | BOGOTÁ, SECTOR EL KORÁN |
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 5008B (RUTA DEL SOL SECTOR 1), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DEL MANTENIMIENT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA EL CORREDOR VIAL CÓDIGO 5008B TRANSVERSAL MEDELLÍN | BOG
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTOR 1, EN EL DEPARTAMENT
INTERVENTORIA PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL CORREDOR RUTA DEL SOL SECTO
SERVICIO DE OPERACIÓN DE VÍAS PRIMARIAS RUTA 5008B, SECTOR EL KORÁN - GUADUAS DEL PR 0+000 AL PR
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 5008B SECTOR EL KORÁN - GUADUAS DEL PR 0+000 AL PR 59+162. DEF
Seleccion...
Supervisor
ERIKA JOHANA URIBE NAVARRO
Codigo BPIN
2018011000439
Imputacion
2401-0600-0112
Departamento
CAUCA
Sector
.
Contrato
1561-2021
Total Programado
97.245.078.068,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
10/02/2023
Programado
10/02/2023
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
CONTRATI
ESTUDIOS
MANT-PEF
PTES MAN
REHAB-NA
2021 rec 2021 SRN 1/07/2021 31/12/2021 32.542.773.904,00 1,00 0,50 10,00 0,00 6,00
2022 Rec2022 SRN 1/01/2022 31/07/2021 32.542.773.904,00 0,00 0,50 15,00 1,00 2,00
2021 ADICION-1 SRN 28/11/2021 17.669.530.260,00 1,00 5,00 4,00
2022 ADICIÓN 2 SRN 1/07/2022 31/12/2022 14.490.000.000,00 1,00 8,00 1,00
Anticipo Programado 0,00
Anticipo Amortizado 0,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en Cronograma

CIFRA

Inicio | Contratos | Reportes/Busquedas | Datos personales | Salir

Estado: Procesando

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	1561	Año	2021
Proyecto	PASTO - MOJARRAS	Programa	OTROS
Dirección Territorial	Dirección Territorial Cauca	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
Supervisor del Contrato de Interventoría	JOSÉ ADRIAN - VALENCIA CASTRILLÓN	Gestor Técnico de Proyecto	ERIKA JOHANNA - URIBE NAVARRO
Objeto Contrato Obra	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.		

1 2 3 4 5 6 7 8

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
72	72	2023-03-03	2023-03-09	2023-03-09				PROCESO		
71	71	2023-02-24	2023-03-02	2023-03-02				PROCESO		
70	70	2023-02-17	2023-02-23	2023-02-23				PROCESO		
69	69	2023-02-10	2023-02-16	2023-02-16				PROCESO		
68	68	2023-02-03	2023-02-09	2023-02-09	2023-02-14 10:42	2023-02-14 10:59	2023-02-14 11:28	TERMINADO		
67	67	2023-01-27	2023-02-02	2023-02-02	2023-02-06 16:09	2023-02-14 10:14	2023-02-14 10:47	TERMINADO		
66	66	2023-01-20	2023-01-26	2023-01-26	2023-02-06 15:56	2023-02-14 10:11	2023-02-14 10:42	TERMINADO		
65	65	2023-01-13	2023-01-19	2023-01-19	2023-02-06 15:23	2023-02-14 10:03	2023-02-14 10:39	TERMINADO		
64	64	2023-01-06	2023-01-12	2023-01-12	2023-02-06 11:46	2023-02-14 09:36	2023-02-14 10:27	TERMINADO		
63	63	2022-12-30	2023-01-05	2023-01-05	2023-02-06 11:26	2023-02-14 09:26	2023-02-14 10:22	TERMINADO		

1 2 3 4 5 6 7 8

Regresar

Usuario: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO -CIFRA V:2.24

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2845401
Número del Contrato	1561-2021
Versión del contrato	5
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	22/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	24 días para terminar *(10/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	69 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	24 días para terminar *(11/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	11/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

( ) Cuentas bancarias distintas por proveedor (●) Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jaime Ignacio Castro Vergara* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2021 5:26:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2021 7:00:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2845401_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2845401_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Número del proceso	LP-DO-SRN-016-2021 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO (Fase de Sel
Descripción	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO
Duración del contrato	317 (Días)
Unidad de contratación	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
Título de la oferta	INVIAS 016-2021 Obra

Tipo

Cuantía del contrato 94.631.366.309 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Sector: Infraestructura de transporte

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 24/09/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 24/09/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 24/09/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

◉ % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Otro: Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños

◉ % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ % del valor de la oferta 5

Fecha límite para entrega de garantías: 21/09/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17/08/2022 5:31:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.10685246	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	86.778.819.874,6 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	10/03/2028 *((UTC-05:0*
CO1.WRT.10685530	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.731.568.315,45 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	24 días para terminar
CO1.WRT.9714207	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.731.568.315,45 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/12/2022 *((UTC-05:0*
CO1.WRT.8196901	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	3.123.591.805,5 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	31/12/2022 *((UTC-05:0*
CO1.WRT.9713944	Cumplimiento - Otros ⚠	Contrato de seguro	86.778.819.874,6 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/12/2027 *((UTC-05:0*

1 2 3 4 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Código postal: 118942

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicació
1	LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN	COLOMBI

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2845401

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unit
1	72141003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN RUTA 25CCB Y PASTO MOJARRAS RUTA 2502 SECTOR CANO MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO	1,00	UN	65.085.547.808,00	80.141.366.30
1	72141003	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA MOJARRAS POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN RUTA 25CCB Y PASTO MOJARRAS RUTA 2502 SECTOR CANO MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO	1,00	UN	14.490.000.000,00	14.490.000.00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
MINUTA PRORROGA No 02.pdf	MINUTA PRORROGA No 02.pdf
ANTECEDENTES ADIC 2 PR 1 CONTRATO 1561-2021.pdf	ANTECEDENTES ADIC 2 PR 1 CONTRATO 1561-2021.pdf
MINUTA AD 2 PR 1 CONTRATO 1561-2021.pdf	MINUTA AD 2 PR 1 CONTRATO 1561-2021.pdf
Adición No. 1 - 1561-2021.pdf	Adición No. 1 - 1561-2021.pdf
Antecedentes adición No. 1 - 1561-2021.rar	Antecedentes adición No. 1 - 1561-2021.rar
Enlace para consulta de antecedentes cesión contrato 1561-2021.pdf	Enlace para consulta de antecedentes cesión contrato 1561-2021.pdf
Cesión contrato 1561-2021.pdf	Cesión contrato 1561-2021.pdf
LP-DO-SRN-016-2021.rar	LP-DO-SRN-016-2021.rar
Contrato No. 1561-2021 - LP-DO-SRN-016-2021.pdf	Contrato No. 1561-2021 - LP-DO-SRN-016-2021.pdf

○ Sí ◉ No

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes?

Información presupuestal

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	94.631.366.309
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	94.631.366.309

Código BPIN: 2018011000439 Año de vigencia: 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ◉ Sí ○ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer
☐	149321	CDP	Generado	32.542.773.904 COP	29.929.062.146 COP
☐	27821	VigenciaOrdinary	Generado	72.514.262.910 COP	32.542.773.904 COP
☐	199922	CDP	No validado	14.490.000.000 COP	14.490.000.000 COP

Saldo de CDP: 47.032.773.904 COP

Saldo de vigencias futuras: 72.514.262.910 COP

Saldo total a comprometer:

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 16/09/2021 2:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar
☐	784121	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.929.062.146 COP	29.929.062.146 COP	-

Saldo de compromisos CDP: 29.929.062.146 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
2022-1884. Acta V.final_1561 de 2021 OK.pdf	2022-1884. Acta V.final_1561 de 2021 OK.pdf
2022-755.2. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO 1561 DE 2021 A1.pdf	2022-755.2. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO 1561 DE 2021 A1.pdf
2023.240.Acta Aprobacion Poliza Contrato 1561-2021 PR 2.pdf	2023.240.Acta Aprobacion Poliza Contrato 1561-2021 PR 2.pdf
Antecedentes póliza cesión 1561-2021.rar	Antecedentes póliza cesión 1561-2021.rar
APROBACION 1561 ORDEN DE INIICO.pdf	APROBACION 1561 ORDEN DE INIICO.pdf
Aprobación póliza cesión 1561-2021.pdf	Aprobación póliza cesión 1561-2021.pdf
REG 784121 CON 1561-2021 SRN firma.pdf	REG 784121 CON 1561-2021 SRN firma.pdf
SGI 59547.pdf	SGI 59547.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.7287322	Ceder el contrato	9/12/2021 4:16 PM *(UTC -5 horas)*	10/12/2021 10:32 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.7428336	Modificar el contrato	27/12/2021 1:46 PM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 4:42 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.8865955	Modificar el contrato	29/07/2022 12:30 PM *(UTC -5 horas)*	29/07/2022 5:24 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.10137079	Modificar el contrato	22/12/2022 12:03 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2022 9:56 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Cerrar | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGI-GGPV 9678

Fecha
13/02/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1777662

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	GERENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS JUBBENY PAOLA MORENO ROJAS
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	NANCY CAROLINA CORTES YAZO

Información del Documento

■ **Referencia**	Solicitud Expedición CDP para adición No. 2 Contrato 1599 de 2021

Anexos

■ **Anexo**	**JUSTIFICACION.docx** **PRESUPUESTO CRONOGRAMA CUADRO DE METAS.xlsx** **SEPRO.pdf** **SOLICITUD CDP.pdf**

■Contenido

Respetada Doctora Paola,

Atentamente, se solicita su amable gestión con el fin de que se estudie la viabilidad para la expedición del siguiente CDP, cuya información se relaciona a continuación:

Contrato de interventoría No. 1599 de 2021

Objeto: INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO-MOJARRAS, RUTA 2502, SECTOR CANO-MOJARRAS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.

Valor solicitado: $ 1.100.000.000,00

Se adjunta la documentación que soporta dicho requerimiento

Cordialmente,

ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS (E)

Proyectó: Ing. Erika Johanna Uribe Navarro

Aprobó: Dra. Carolina Cohen Urzola

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia del documento
