31 octubre 2022

Personal: maestro oficial y ayudantes

Equipos: Herramienta menor y vibrocompactador canguro.

Actividad: Se continuo con el suministro, extendida y compactacion de afirmado en el tanque principal, especificamente en los espacios laterales del tanque, es decir, entre el talud y la formaleta.

Estado del tiempo: lluvias moderadas a fuertes.

02 Noviembre 2022

Personal: Maestro oficial y ayudantes

Equipos: Herramienta menor y vibrocompactador canguro.

Actividad: Se continuó con el suministro, extendida y compactación de afirmado en el tanque principal, especificamente en los espacios laterales de este.

Estado del tiempo: lluvias moderadas a fuertes

Scanned by TapScanner

03 Noviembre 2022

Personal: Maestro oficial y ayudantes

Equipos: Herramienta menor y vibrocompactador canguro

Actividad: se continuo con el suministro y extendida y compactacion de afirmado en el tanque principal especificamente en los espacios laterales de este.

Estado del tiempo: lluvias moderadas a fuertes.

04 Noviembre 2022

Personal: Maestro oficial y ayudantes

Equipos: Herramienta menor.

Actividad: transporte y acopio de acero de refuerzo para el tanque principal, es necesario dejar el material 300 metros abajo de la obra debido al estado actual de la via. No hay acceso para vehículo pesado.

Estado del tiempo: lluvias fuertes

Scanned by TapScanner

06 Noviembre 2022

Personal: Maestro oficial y ayudantes

Equipos: Herramienta menor

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal. Solo se pudo avanzar media jornada de trabajo por precipitaciones altas.

Estado del tiempo: lluvias fuertes

07 Noviembre 2022

Personal: Maestro oficial y ayudantes

Equipos: Herramienta menor y vibrocompactador canguro.

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal.

Estado del tiempo: lluvias fuertes

Scanned by TapScanner

08 Noviembre 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudantes

Equipo: Herramienta menor y vibro-compactador canguro.

Actividad: traslado de acero de refuerzo al sitio de la obra, solo se pudo avanzar 3 horas de trabajo. se presentaron lluvias fuertes casi toda la jornada de trabajo, se suspende labores.

Estado del tiempo: lluvias fuertes.

09 Noviembre 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudantes.

Equipo: Herramienta menor y vibrocompactador canguro.

Actividad: traslado de acero de refuerzo al sitio de la obra, se presentaron precipitaciones fuertes.

Estado del tiempo: lluvias fuertes

Scanned by TapScanner

10 Noviembe 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudante

Equipo: Herramienta menor y vibro-compactador canguro

Actividad: traslado de acero de refuerzo al sitio de la obra, se presentaron precipitaciones fuertes. se solicita a la interventoria y supervisión la suspensión del contrato, debido al invierno presente en la zona y al estado actual de la via.

Estado del tiempo: lluvias fuertes

11 Noviembe 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudante.

Equipo: Herramienta menor y vibrocompactador canguro.


Actividad: se solicita permiso de acceso al tanque N°2 para revisar el estado actual y determinar si es posible dar inicio a este otro frente de trabajo, se evidencia la necesidad de hacer adecuación de la superficie de la tapa del tanque ya que presenta vegetación (musgo). Se expone y solicita a la interventoria y a la supervisión la aprobación de la construcción de un filtro perimetral, caja de inspección e instalación de tuberia sanitaria para la evaluación del agua que desciende de la planta de tratamiento de agua potable y

Norma

Scanned by TapScanner

afecta directamente el sitio donde se proyecta construir el tanque principal, se evidencia empozamiento de agua.

Estado del tiempo: lluvias fuertes



13 Noviembre 2022

Personal: maestro, oficial y ayudante


Equipo: Herramienta menor, y vibro-compactador Canguro.

Actividad: No fue posible dar inicio al otro frente de trabajo. y en el tanque principal solo se esta acopiando material de refuerzo,

Norma

nuevamente es necesario suspender labores debido a las altas precipitaciones y tormenta electrica que se presento.

Estado del tiempo: lluvias fuertes



14 Noviembre 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudante


Equipo: Herramienta menor y vibro-compactador canguro.

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal. solo se pudo trabajar 2 horas por lluvias

Norma

Scanned by TapScanner

Estado del tiempo: lluvias fuertes




15 Noviembre 2023

Personal: Maestro, oficial y ayudantes.

Equipos: Herramienta menor y vibro-compactador canguro.

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal, la actividad se esta realizando manualmente, ya que no es posible entrar el material en vehiculo debido al estado de la via.

Estado del tiempo: lluvias moderadas a fuertes.




16 Noviembre 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudantes

Equipos y herramienta: Herramienta menor

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal. Se tuvo que suspender 2 veces la jornada laboral debido a las fuertes precipitaciones.

Estado del tiempo: lluvias fuertes.



17 Noviembre 2022


Personal: Maestro, oficial y ayudantes

Equipos y herramienta: Herramienta menor

Scanned by TapScanner

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal. Jornada sin mucho rendimiento debido a las fuertes lluvias en la zona.

Estado del tiempo: lluvias fuertes




18 Noviembre 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudantes

Equipos y herramienta: Herramienta menor

Actividad: Acopio de acero para tanque principal.

Estado del tiempo: lluvias moderadas a fuertes




19 Noviembe 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudantes

Equipos y herramienta: Herramienta menor

Actividad: Acopio de acero de refuerzo para el tanque principal.

Estado del tiempo: lluvias moderadas a fuertes



21 Noviembre 2022

Personal: Maestro, oficial y ayudantes


Equipos y herramientas: Herramienta menor

Actividad: Acopio de acero de refuerzo

Scanned by TapScanner


para el tanque principal. se pudo trabajar dos horas.

Estado del tiempo: lluvias fuertes.



22 Noviembe 2022

Se suspende el contrato debido a las dificiles condiciones de acceso al tanque principal proyectado en área de la planta de tratamiento del accedudo vereda la Capilla, y de igual forma por la actual temporada de lluvias que dificultan y atrasan el normal desarrollo de la obra.



07 Febrero 2023

Personal: maestro, oficial y ayudantes

Equipos y herramientas: herramienta menor y vibrocompactador canguro.

Actividad: Se dió reinicio a la obra con la limpieza en el sitio y un replanteo en el área donde se va a construir el tanque de almacenamiento. Se realizo nuevamente induccion al maestro y oficial sobre el proceso constructivo del tanque se efectuó una perfilada con material afirmado compactado, ya que parte del afirmado fue levantado por causa del invierno; debido al estado actual se evidencia la necesidad de evacuar las aguas que discurren de la PTAP y llegan al sitio donde se proyecta construir el tanque, previamente ya se haba comunicado sobre la necesidad de

Norma

Scanned by TapScanner

construir obras complementarias como es un filtro, tubería de conducción de aguas y una caja de inspección.

Estado del tiempo: seco



08 Febrero 2023

Personal: Maestro, oficial, y ayudantes


Equipos y herramientas: Herramienta menor.

Actividad: se espera la aprobación por parte de interventoría y del municipio para dar inicio a la construcción del filtro perimetral

que se requiere, en obra se acopió hierro para la placa de piso y se adecuó las áreas a intervenir en el tanque principal.

Recuperación tanque N°2: se inicio con la limpieza y preparación de la superficie de la tapa del tanque, se utilizó gratas y espatulas. se dio inicio a la elaboración de la escalera en acero inoxidable para acceso al tanque N°2

Estado del tiempo: clima seco



09 febrero 2023

Personal: maestro oficial y ayudantes

Scanned by TapScanner

Equipos y herramientas: Herramienta menor incluye pulidora.

Actividad: se continuo con el traslado del hierro al tanque principal y se acopio el material para la fundida del solado de limpieza del tanque principal.

Recuperacion del tanque N°3: se continuo con la limpieza y preparacion de la superficie de la tapa del tanque, se utilizo gratas, espatulas cepillos y pulidoras. El concreto del tanque (tapa) esta en regular estado y presenta zonas desgastadas bastante relevantes lo que implica la nivelación del pañete que se va a colocar

Estado del tiempo: clima seco

10 febero 2023

Personal: Maestro, oficial, ayudante,


Equipos y herramientas: herramienta menor y vibrocompactador canguro.

Actividad: En obra ya se tiene el acopio del hierro para la placa de piso y se termino de compactar el afirmado que se esta instalando tanto en la parte occidental como onental de fuera del área donde se construira el tanque y que es necesario por la estabilidad de los taludes laterales al tanque.

Recuperacion del tanque N°3: se continuo con la limpieza y preparación de la superficie de la tapa del tanque. se descarga parte del material para construir el pañete de la tapa.

Scanned by TapScanner

Estado del tiempo: lluvias moderadas




11 febrero 2023

Personal: Maestro oficial y ayudantes.

Equipos y herramientas: Herramienta menor incluye pulidora.

Actividad: Se continuo con la Recuperacion del tanque N°2 con la limpieza y preparacion de la superficie de la tapa del tanque N°3 usando gratas, espatulas y pulidora.

Estado del tiempo: lluvias moderadas.




13 febrero 2023

Personal: Maestro oficial y ayudantes

Equipos y herramientas: Herramienta menor incluye pulidora

Actividad: se continua con la Recuperacion del tanque N°3 con la limpieza y preparacion de la superficie de la tapa del tanque se utilizó gratas, espatulas, cepillos y pulidora.

Estado del tiempo: lluvias moderadas.



14 febrero 2023


Personal: Maestro oficial y ayudantes


Scanned by TapScanner

Equipos y herramientas: Herramienta menor incluye polidora.

Actividad: se continuo la limpieza y preparacion de la superficie de la tapa del tanque, se utilizo gratas, espatulas, cepillos y polidora de igual forma se descarga la totalidad de materiales para realizar el pañete de la tapa del tanque Nº 2.

Estado del tiempo: lluvias moderadas

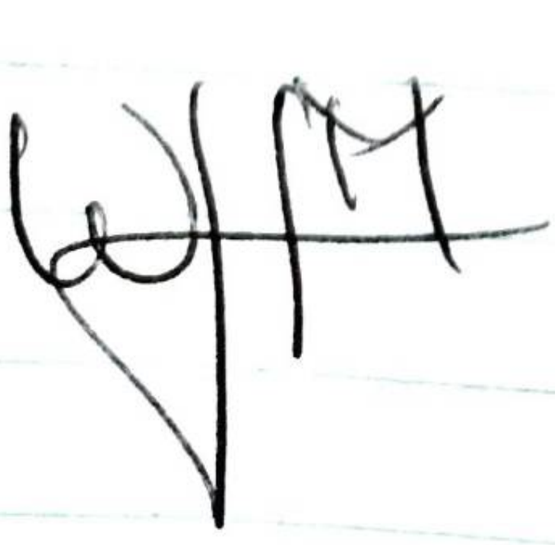

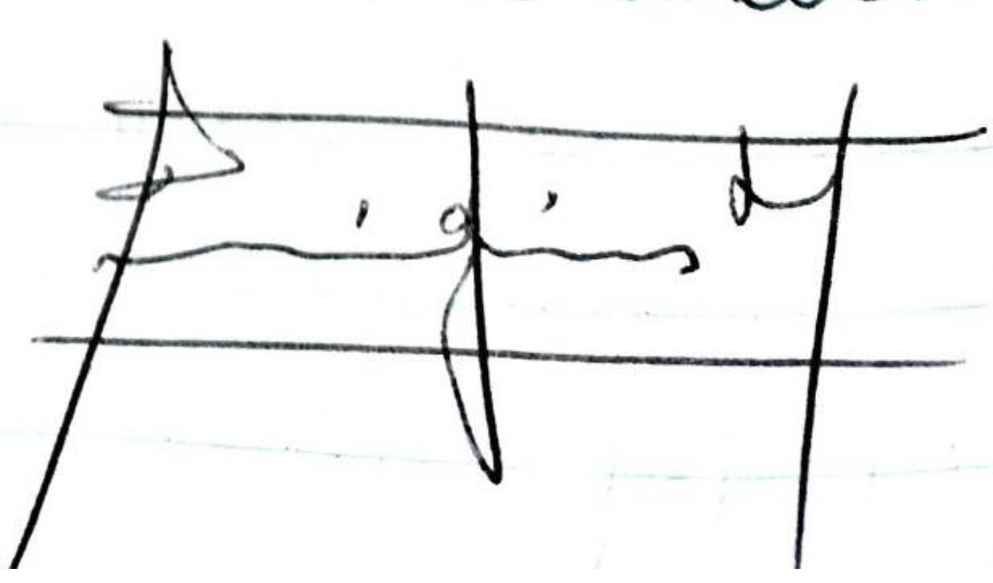

Scanned by TapScanner
