PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PRORROGA AL CONTRATO 7402022 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION LOS ANDES Y LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR Y EL CONVENIO NO. 5832021, SUSCRITO CON EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

GRUPO I
DEPARTAMENTOS DE NARIÑO - VALLE DEL CAUCA – RISARALDA Y PUTUMAYO.

INFORME DE AVANCES
A 28 DE FEBRERO DE 2023

San Juan de Pasto, 6 de marzo de 2023

Contenido

1. GENERALIDADES 8
2. MÉTODOS DE EXTENSIÓN IMPLEMENTADOS PROYECTO 8
3. PLAN OPERATIVO 14
3.1. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 14
3.2 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 17
3.3 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 18
3.4 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 19
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 21
4.1 NARIÑO 21
4.1.1 ZONA COSTA 21
4.1.1.1 Municipio de Tumaco. 21
4.1.1.2 Municipio Del Charco 22
4.11.3 Municipio De La Tola 23
4.11.4 Municipio de Santa Bárbara 24
4.1.1.5 Municipio De Olaya Herrera 25
4.11.6 Municipio De Magui Payan 26
4.1.1.7 Municipio de Mosquera. 27
4.1.2 NARIÑO ZONA CENTRO 28
4.1.2.1 Municipio de Albán 28
4.1.2.3 Municipio de Ospina 29
4.1.2.4 Municipio del Peñol 30
4.1.2.5 Municipio de Funes 32
4.1.2.6 Municipio de Córdoba 33
4.1.2.7 Municipio Del Tambo 34
4.1.2.8 Municipio de Imues 35
4.1.2.9 Municipio de Pasto 36
4.1.2.10 Municipio De La Cruz 37
4.1.2.11 Municipio De La Florida 38
4.2 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 39
4.2.1. Municipio Del Sibundoy 39
4.2.2 Municipio Mocoa 41
4.2.3 Municipio Villa Garzón 43
4.3. DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 44
4.3.1 Municipio de Ansermanuevo 44
4.3.2. Municipio De Caicedonia 45
4.3.3. Municipio de Calima El Darien 45
4.3.4 Municipio de Dagua 46

4.3.5 Municipio De El Aguila 47
4.3.6 Municipio de Jamundí 47
4.3.7 Municipio de la Victoria 48
4.3.8 Municipio de Palmira 49
4.3.9 Municipio de Restrepo....49
4.3.10 Municipio de Roldanillo 50
4.3.11 Municipio de San Pedro....51
4.3.12 Municipio de Toro 51
4.3.13 Municipio de Trujillo....52
4.3.14 Municipio De Tuluá....53
4.4. DEPARTAMENTO DE RISRALDA 53
4.4.1 Municipio de Apia. 53
4.4.2 Municipio De Balboa....54
4.4.3 Municipio De Belén de Umbría 54
4.4.4 Municipio De Guática....55
4.4.5 Municipio De La Celia 55
4.4.6 Municipio De Marsella 56
4.4.7 Municipio de Mistrató. 56
4.4.8 Municipio de Pereira 57
4.4.9 Municipio de Pueblo Rico 58
4.4.10 Municipio de Quinchía 58
4.4.11 Municipio de Santa Rosa De Cabal....59
4.4.12 Municipio de Santuario....60
5. CRONOGRAMAS....60
5.1 DEPARTAMENTO DE NARIÑO 60
5.2 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 60
5.3 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 61
5.4 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 62
6. REUNIONES CON EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO....62
7. PRINCIPALES RETOS. 63
7.1 Departamento de Nariño 63
7.2 Departamento de Putumayo 64
7.3 Departamento del Valle del Cauca 64
7.4 Departamento de Risaralda 64
8. CONCLUSIONES 65
8.1 Departamento de Nariño 65
8.2 Departamento de Putumayo 65
8.3 Departamento del Valle del Cauca 66
8.4 Departamento de Risaralda 67
9. REGISTRO FOTOGRAFICO....67

9.1. Departamento de Nariño 67
9.2. Departamento de Putumayo 72
9.3. Departamento del Valle del Cauca 74
9.4. Departamento de Risaralda 80
.....81
10. ANEXO: LINK DE TESTIMONIOS DE PRODUCTORES RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA EN EL VALLE DEL CAUCA. 85

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Métodos de extensión Departamento de Nariño 8
Cuadro 2. Métodos de extensión Departamento de Putumayo.....10
Cuadro 3. Métodos de extensión Departamento de Valle del Cauca.....10
Cuadro 4. Métodos de extensión Departamento de Risaralda.....12
Cuadro 5. Plan operativo Departamento de Nariño.....14
Cuadro 6. Plan operativo Departamento del Putumayo 17
Cuadro 7. Plan operativo Departamento del Valle del Cauca 18
Cuadro 8. Plan operativo Departamento de Risaralda 19
Cuadro 9. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Tumaco 22
Cuadro 10. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Charco 23
Cuadro 11. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Tola.....24
Cuadro 12. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé ...25
Cuadro 13. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Olaya Herrera.....26
Cuadro 14. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Magui Payán 27
Cuadro 15. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Mosquera 27
Cuadro 16. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de San José de Albán 28
Cuadro 17. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Ospina 30
Cuadro 18. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Peñol.....31
Cuadro 19. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Funes.....32
Cuadro 20. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Córdoba.....33
Cuadro 21. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Tambo.....34
Cuadro 22. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Imués 35
Cuadro 23. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Imués 36
Cuadro 24. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Cruz 37
Cuadro 25. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Florida.....38
Cuadro 26. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Departamento del Putumayo 39
Cuadro 27Métodos de extensión individuales y grupales realizados Departamento del Valle del Cauca 44
Cuadro 28. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Caicedonia 45
Cuadro 29. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Calima Darién 46
Cuadro 30. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Dagua.....46
Cuadro 31. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Aguila.....47
Cuadro 32. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Jamundí.....48
Cuadro 33. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Victoria 48
Cuadro 34. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Palmira.....49
Cuadro 35. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Restrepo 50
Cuadro 36. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Roldanillo 50

Cuadro 37. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de San Pedro 51
Cuadro 38. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Toro 52
Cuadro 39. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Trujillo 52
Cuadro 40. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Tuluá.....53
Cuadro 41. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Departamento de Risaralda 53
Cuadro 42. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Balboa.....54
Cuadro 43. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Umbría 55
Cuadro 44. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Guatica.....55
Cuadro 45. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Celia.....55
Cuadro 46. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Marsella 56
Cuadro 47. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Mistrató.....57
Cuadro 48. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Pereira.....57
Cuadro 49. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Pueblo Rico.....58
Cuadro 50. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Quinchía.....59
Cuadro 51. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Santa Rosa de Cabal 59
Cuadro 52. Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Santuario 60
Cuadro 53. Cronograma para el Departamento del Putumayo.....61
Cuadro 54. Cronograma para el Departamento del Valle del Cauca.....62
Cuadro 55. Cronograma para el Departamento de Risaralda 62
Cuadro 56. Reuniones de equipo de seguimiento.....63

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Método de extensión individual para el Municipio de San Lorenzo 29
Figura 2. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Peñol.....31
Figura 3. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Funes.....32
Figura 4. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Córdoba.....33
Figura 5. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Tambo.....34
Figura 6. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Imués.....35
Figura 7. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Pasto.....36
Figura 8. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Cruz.....37
Figura 9. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Florida.....38
Figura 10. Métodos de extensión individuales Municipio de Sibundoy.....40
Figura 11. Métodos de extensión grupales realizados Municipio de Sibundoy.....41
Figura 12. Métodos de extensión individuales realizados Municipio de Mocoa 42
Figura 13. Métodos de extensión grupales realizados Municipio de Mocoa 42
Figura 14. Métodos de extensión individuales realizados Municipio de Villa Garzón.....43
Figura 15. Métodos de extensión grupales realizados Municipio de Villa Garzón.....44

1. GENERALIDADES

La Fundación los Andes presta el servicio de extensión agropecuaria en 4 departamentos del territorio nacional: Nariño, Risaralda, Valle del Cauca y Putumayo. En este informe se presenta un avance de las actividades realizadas hasta el 28 de febrero de 2023, dentro de la PRORROGA al contrato número 7402022 celebrado entre la Agencia De Desarrollo Rural - ADR y LA FUNDACION LOS ANDES, por lo anterior se detalla las actividades realizadas en cada departamento.

2. MÉTODOS DE EXTENSIÓN IMPLEMENTADOS PROYECTO

2.1. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Cuadro 1. Métodos de extensión Departamento de Nariño

MÉTODO DE EXTENSIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS	NÚMERO DE MÉTODOS REALIZADOS
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	1282 usuarios con caracterización y clasificación de usuarios e identificación de la actividad productiva principal (Visita Nº1).	1282 - 100%
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	Visita Nº 2 a 1247 usuarios enfocadas en el componente; Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	1247- 97.3%
Visita individual a predio	Gestionar el uso sostenible de los recursos naturales	Visita Nº. 3 a 661 usuarios enfocadas en el componente; Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	661 – 51.5%

Método de extensión grupal (Curso)	Facilitar el acceso y aprovechamiento de la información de apoyo, tecnologías y productos tecnológicos	1047 usuarios quienes participaron en el curso de habilidades y competencias en el uso de las TIC	55 – 81.6%
Método de extensión grupal (Curso)	Desarrollar las capacidades integrales humanas	1142 Usuarios quienes participaron en el curso de Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	34 – 89%
Método de extensión grupal (ECA)	Desarrollar las capacidades sociales, integrales y fortalecimiento de la asociatividad.	995 Usuarios quienes participaron en la ECA “Procesos de emprendimiento y asociatividad”	29 – 77.6%
Método de extensión grupal (ECA)	Gestionar el uso sostenible de los recursos naturales	710 Usuarios quienes participaron en la ECA “Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables”	20 – 55.4%
Método de extensión grupal (ECA)	Desarrollar las capacidades integrales humanas	370 Usuarios quienes participaron en la ECA “Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias”	11 – 28.9%

2.2. DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Cuadro 2. Métodos de extensión Departamento de Putumayo

MÉTODO DE EXTENSIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS	NÚMERO DE MÉTODOS REALIZADOS
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	743 usuarios caracterizados y clasificados e identificada la actividad productiva principal. (Visita No. 1)	743 – 100%
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	743 usuarios con visita enfocada en el componente, uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias (Visita No. 2)	743 – 100%
Visita individual a predio	Gestionar el uso sostenible de los recursos naturales	743 usuarios con visita enfocada en el componente, uso prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables (Visita No. 3)	743 – 100%
ECA	Facilitar el acceso y el aprovechamiento de la información de apoyo, tecnologías y productos tecnológicos	743 usuarios con conocimiento y aplicación en uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones	743 – 100
Curso	Desarrollar las capacidades integrales humanas	743 usuarios con curso de uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	743 – 100
Curso	Gestionar el uso sostenible de los recursos naturales	734 usuarios con curso en prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad	743 – 100

2.3. DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Cuadro 3. Métodos de extensión Departamento de Valle del Cauca

MÉTODO DE EXTENSIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS	NÚMERO DE MÉTODOS REALIZADOS
Visita individual a predio # 1 Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	Desarrollar las capacidades integrales humanas	745 usuarios con Caracterización y clasificación de usuarios e identificación de la actividad productiva principal.	745 – 100%
Visita individual a predio # 2 Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	Desarrollar las capacidades integrales humanas	579 usuarios enfocados en el componente; Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.	579 – 78%

Visita individual a predio # 3 Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	364 usuarios enfocados en el componente; Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables.	364 – 49%
ECA BPA / BPG Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	Desarrollar las capacidades integrales humanas	745 usuarios capacitados mediante Escuela de Campo Agroecológica	745 – 100%
CURSO BPA / BPG Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	Desarrollar las capacidades integrales humanas	745 usuarios capacitados mediante Curso	745 – 100%
ECA De Procesos De Emprendimiento Y Asociatividad	Desarrollar las capacidades sociales integrales y fortalecimiento de la asociatividad	745 usuarios capacitados mediante Escuela de Campo Agroecológica	745 – 100%
GIRA De Prácticas Ambientales Sostenibles Y/O Sustentables	Gestionar El Uso Sostenible De Los Recursos Naturales	200 usuarios capacitados mediante Gira Agropecuaria	200 – 100%
CURSO Para El Fomento De La Autogestión De Las Comunidades	Desarrollar Habilidades Para La Participación	745 usuarios capacitados mediante Curso	745 – 100%

2.4. DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Cuadro 4. Métodos de extensión Departamento de Risaralda

MÉTODO DE EXTENSIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS	NÚMERO DE MÉTODOS REALIZADOS
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	(Visita Nº1). 482 usuarios con caracterización y clasificación de usuarios e identificación de la actividad productiva principal	482 - 100%
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	Visita Nº 2 (1ra BPAs) a 326 usuarios enfocadas en el componente; Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias	**326 - 67.7%**
Visita individual a predio	Desarrollar las capacidades integrales humanas	Visita Nº 3 (1ra Ambiental) a 297 usuarios enfocadas en el componente ;Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	**297- 61.6%**
Método de extensión grupal (Curso)	Facilitar el acceso y aprovechamiento de la información de apoyo, tecnologías y productos tecnológicos	195 Usuarios quienes participaron en el curso de habilidades y competencias en el uso de las TIC	**195 – 40.0%**
ECA (BPA-BPG)-Banco Agrario de Colombia	Desarrollar las capacidades integrales humanas	-212 Usuarios quienes participaron Procesos de emprendimiento y asociatividad	**212 – 43.9%**

ECA (Asociatividad)	Desarrollar las capacidades sociales integrales y fortalecimiento de la asociatividad	- 225 Usuarios quienes participaron Procesos de emprendimiento y asociatividad	**225 - 46.6%**
		-182 Usuarios Participación en alianzas comerciales	**182 - 37.7%**
ECA (Ambiental)	Gestionar el uso sostenible de los recursos naturales	-212 usuarios particiaparon en Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	**212 – 43.9%**
Curso (Autogestión) - Banco Agrario de Colombia	Desarrollar habilidades para la participación	-182 usuarios participaron en la actividad Fomento de la autogestión de las comunidades	**182 - 37.7%**
Dia de campo (BPA-BPG)	Desarrollar las capacidades integrales humanas	-177 Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	**177- 36.7%**

3. PLAN OPERATIVO

3.1. DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Cuadro 5. Plan operativo Departamento de Nariño

PLAN OPERATIVO							
Objetivo general:	**Fortalecer la productividad y competitividad de las líneas productivas priorizadas del sector agropecuario en el Departamento de Nariño.**						
OBJETIVOS ESPECIFICOS	**PRODUCTOS**	**COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**ACTIVIDAD**	**INDCADOR**	**META**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUMPLIMIENTO**
SOCIALIZAR EL PDEA	Socialización y capacitación al equipo técnico	Alcances y plan operativo	JORNADA DE CAPACITACIÓN	Número de jormadas realizadas	2	Jornadas	100%
	Socialización a las autoridades municipales	Articulacion institucional	JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN	Número de actas de socialización	18	Actas	100%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS	Servicio de extensión en los encadenamientos productivos	Identificación de la actividad productiva principal	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	1282	Visitas	100%
		Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	1282	Visitas	97.3%
			VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios	1282	Visitas	

				visitados			
			DEMOSTRACION DE METODO	Número de eventos realizados	42	Eventos	
			ECA	Número de eventos realizados	42	Ecas	26.2%
			CURSO	Número de cursos realizados	51	Curso	66.6%
		Acceso a crédito y bancarización	CURSO	Número de cursos realizados		Curso	
			CURSO	Número de cursos realizados		Curso	
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDA	Servicio de extensión en el fomento y fortalecimiento organizacional y asociativo	Procesos de emprendimiento y asociatividad	ECA	Número de eventos realizados	42	Ecas	69%
		Participación en alianzas comerciales	ECA	Número de eventos realizados	42	Ecas	

FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO, TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS.	Servicio de extensión en el aprovechamiento y uso de las herramientas TIC	Habilidades y competencias en el uso de TIC	CURSO	Número de cursos realizados	62	Curso	89%
GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Servicio de extensión en el manejo eficiente de los recursos naturales	Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	1282	Visitas	51.5%
		Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	1282	Visitas	
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	ECA	Número de eventos realizados	42	Ecas	47.6%
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	GIRA	Número de usuarios participantes de la gira	265	Participantes	
DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN	Servicio de extensión para la participación en espacios de política pública sectorial	Fomento de la autogestión de las comunidades	CURSO	Número de cursos realizados	51	Curso	

3.2 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Cuadro 6. Plan operativo Departamento del Putumayo

OBJETIVO GENERAL:	**FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**					
OBJETIVOS ESPECIFICOS	**PRODUCTOS**	**COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**ACTIVIDAD**	**Indicador**	**Meta**	**Avance %**
CIALIZAR EL PDEA	Socialización y capacitación al equipo técnico	Alcances y plan operativo	JORNADA DE CAPACITACIÓN	Número de jornadas realizadas	1	100%
	Socialización a las autoridades municipales	Articulación institucional	JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN	Número de actas de socialización	3	100%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS	Servicio de extensión en los encadenamientos productivos	Identificación de la actividad productiva principal	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	743	100%
		Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	743	100%
			VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	743	100%
			CURSO	Número de cursos realizados	30	100%
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	GIRA	Número de usuarios participantes de la gira	196	0%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD	Servicio de extensión en el fomento y fortalecimiento organizacional y asociativo	Procesos de emprendimiento y asociatividad	CURSO	Número de eventos realizados	37	0%
FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO, TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS.	Servicio de extensión en el aprovechamiento y uso de las herramientas TIC	Habilidades y competencias en el uso de TIC	ESCUELA DE CAMPO	Número de cursos realizados	24	100%
GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS	Servicio de extensión en el manejo eficiente de los recursos naturales	Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	743	0%

OBJETIVO GENERAL:	FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
OBJETIVOS ESPECIFICOS	**PRODUCTOS**	**COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**ACTIVIDAD**	**Indicador**	**Meta**	**Avance %**
RECURSOS NATURALES		Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	743	0%
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	CURSO	Número de eventos realizados	37	100%
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	DEMOSTRACION DE METODO	Número de eventos realizados	24	0%
DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN	Servicio de extensión para la participación en espacios de política pública sectorial	Fomento de la autogestión de las comunidades	CURSO	Número de cursos realizados	37	0%

3.3 DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Cuadro 7. Plan operativo Departamento del Valle del Cauca

Objetivo general:	FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					
OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS	COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	Indicador	Meta	% CUMPLIMIENTO
SOCIALIZAR EL PDEA	Socialización y capacitación al equipo técnico	Alcances y plan operativo	JORNADA DE CAPACITACIÓN	Número de jornadas realizadas	1	100%
	Socialización a las autoridades municipales	Articulación institucional	JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN	Número de actas de socialización	14	100%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS	Servicio de extensión en los encadenamientos productivos	Identificación de la actividad productiva principal	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	745	100%
		Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	745	78%
			VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	745	0%
			DIA DE CAMPO	Número de eventos realizados	24	0%
			ECA	Número de eventos realizados	24	100%
			CURSO	Número de cursos realizados	30	100%
		Acceso a crédito y bancarización	CURSO	Número de cursos realizados	62	---
			CURSO	Número de cursos realizados	62	---
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y	Servicio de extensión en el fomento y fortalecimiento organizacional y asociativo	Procesos de emprendimiento y asociatividad	ECA	Número de eventos realizados	24	100%

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD						
FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO, TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS.	Servicio de extensión en el aprovechamiento y uso de las herramientas TIC´s	Habilidades y competencias en el uso de TIC	CURSO	Número de cursos realizados	30	0%
GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Servicio de extensión en el manejo eficiente de los recursos naturales	Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	745	49%
		Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	745	0%
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	ECA	Número de eventos realizados	24	0%
		Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	GIRA	Número de usuarios participantes de la gira	200	100%
DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN	Servicio de extensión para la participación en espacios de política pública sectorial	Fomento de la autogestión de las comunidades	CURSO	Número de cursos realizados	30	100%

3.4 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Cuadro 8. Plan operativo Departamento de Risaralda

Objetivo general:	**Fortalecer la productividad y competitividad de las líneas productivas priorizadas del sector agropecuario en el Departamento de Risaralda.**					
OBJETIVOS ESPECIFICOS	**PRODUCTOS**	**COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**	**ACTIVIDAD**	**indicador**	**Meta**	**Avance %**

SOCIALIZAR EL PDEA	Socialización y capacitación al equipo técnico	Alcances y plan operativo	JORNADA DE CAPACITACIÓN	Número de jornadas realizadas	1	100%
	Socialización a las autoridades municipales	Articulación institucional	JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN	Número de actas de socialización	18	100%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS	Servicio de extensión en los encadenamientos productivos	Identificación de la actividad productiva principal	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	482	100%
		Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	482	67.6%
			VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	482	0
			DIA DE CAMPO	Número de eventos realizados	16	31.2%
			ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES	Número de eventos realizados	16	37.5%
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD	Servicio de extensión en el fomento y fortalecimiento organizacional y asociativo	Procesos de emprendimiento y asociatividad	ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES	Número de eventos realizados	16	43.7%
		Participación en alianzas comerciales	ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICU LTORES	Número de eventos realizados	16	31.2%
FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO,	Servicio de extensión en el aprovechamiento y uso de las herramientas Tics	Habilidades y competencias en el uso de TIC	CURSO	Número de cursos realizados	20	0

TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS.			VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	482	37.5%
GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	Servicio de extensión en el manejo eficiente de los recursos naturales	Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	482	53.3%
			ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICU LTORES	Número de eventos realizados	16	37.5%
			GIRA	Número de usuarios participantes de la gira	73	0
		Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático	VISITA INDIVIDUAL	Número de usuarios visitados	482	0
			ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICU LTORES	Número de eventos realizados	16	37.5%
DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN	Servicio de extensión para la participación en espacios de política pública sectorial	Fomento de la autogestión de las comunidades	CURSO	Número de cursos realizados	20	31.2%

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1 NARIÑO

4.1.1 ZONA COSTA

4.1.1.1 Municipio de Tumaco.

En el municipio de Tumaco se atiende 90 usuarios en la línea productiva de coco, en los cuadros anexos se observa los métodos de extensión individuales y grupales que se han realizado a la fecha:

Cuadro 9. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Tumaco

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	90	90	100%
VISITA 2	90	90	100%
VISITA 3	90	72	80%
VISITA 4	0	0	0
VISITA 5	0	0	0

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	90	3	1	33%	
CURSO BPA/BPG	90	3	3	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	90	3	1	33%	
ECA BPA/BPG	90	3	3	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	90	3	0	0	
ECA AMBIENTAL	90	3	0	0	
CURSO AUTOGESTION	90	3	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	90	3	0	0	
GIRA	90				

4.1.1.2 Municipio Del Charco

En el Municipio Del Charco se asignaron 70 usuarios de la línea productiva de coco, a la fecha se han realizado la totalidad de la visita Nº 1 y 2, parte de la visita Nº 3, en un 31%, también se ha avanzado en los eventos grupales, como se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro 10. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Charco

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	22	31%
VISITA 4	0	0	0
VISITA 5	0	0	0

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA AMBIENTAL	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.11.3 Municipio De La Tola

En el Municipio de la Tola, se tienen 70 usuarios en la línea productiva de coco, hasta la fecha se ha logrado avanzar con la totalidad de la primera y segunda visita, en la visita 3 se tiene un avance del 35%, es decir 25 usuarios atendidos.

Cuadro 11. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Tola

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	25	35%
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0

Avance de los métodos grupales:

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA AMBIENTAL	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.11.4 Municipio de Santa Bárbara

En este municipio se atienden 70 usuarios, para la prestación del servicio de extensión agropecuaria en la línea productiva de coco, a la fecha se ha realizado el 100% de la primera y segunda visita a predio y se tiene un avance del 35%, en la visita tres, 25 usuarios atendidos, como se muestra en los cuadros siguientes:

Cuadro 12. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	25	35.%
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0

En referencia a los eventos grupales, se encuentra lo siguiente:

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	1	50%	
CURSO BPA/BPG	70	2	1	50%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	1	50%	
ECA BPA/BPG	70	2	1	50%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA AMBIENTAL	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.1.1.5 Municipio De Olaya Herrera

Hay 70 usuarios que tienen línea productiva de coco, se cumplió con la actividad de las 2 primeras visitas a predio, y a la fecha se ha realizado 36 visitas lo que corresponde al 51%.

Cuadro 13. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Olaya Herrera

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	26	37%
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0

Métodos de extensión grupal:

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	1	50%	
CURSO BPA/BPG	70	2	1	50%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	1	50%	
ECA BPA/BPG	70	2	1	50%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	70	0	
ECA AMBIENTAL	70	2	70	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	70	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	70	0	
GIRA					

4.11.6 Municipio De Magui Payan

En el Municipio de Magui Payan se visitan a 70 usuarios de la línea productiva de plátano, a la fecha se ha cumplido con el 100% de la visita 1 y se lleva un avance del 50% en cuanto a la visita 2.

Cuadro 14. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Magui Payán

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	35	50%
VISITA 3	70	0	0
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0

4.1.1.7 Municipio de Mosquera.

En el Municipio De Mosquera se asignaron 70 usuarios de la línea productiva de coco, a la fecha se han realizado la totalidad de la visita Nº 1 y 2 , que corresponde al 100%; en la visita Nª 3, se ha avanzado en un 46%, es decir que se han realizado 32 visitas. En los siguientes cuadros se relacionan los avances de las actividades individuales y grupales:

Cuadro 15. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Mosquera

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	32	46%
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	70	0	
ECA AMBIENTAL	70	2	70	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	70	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	70	0	
GIRA	70	2	70	0	

4.1.2 NARIÑO ZONA CENTRO

4.1.2.1 Municipio de Albán

En este municipio se asignaron 70 usuarios, quienes son atendidos por 2 extensionistas, a la fecha se ha realizado la totalidad de la visita Nº 1, vista Nº 2 y se tiene un avance del 60% en cuanto a la visita Nº 3, es decir se han atendido 42 usuarios.

Cuadro 16. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de San José de Albán

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	42	60%
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0


En cuanto a los métodos de extensión grupal, el avance se lo puede observar en el siguiente cuadro:

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.1.2.2 Municipio de San Lorenzo

En el Municipio de San Lorenzo se encuentran 52 usuarios, a quienes se les presta el servicio de extensión agropecuaria con la presencia de 2 extensionistas, cumpliendo hasta la fecha con la totalidad de las visitas 1, 2 y 3.

Figura 1. Método de extensión individual para el Municipio de San Lorenzo

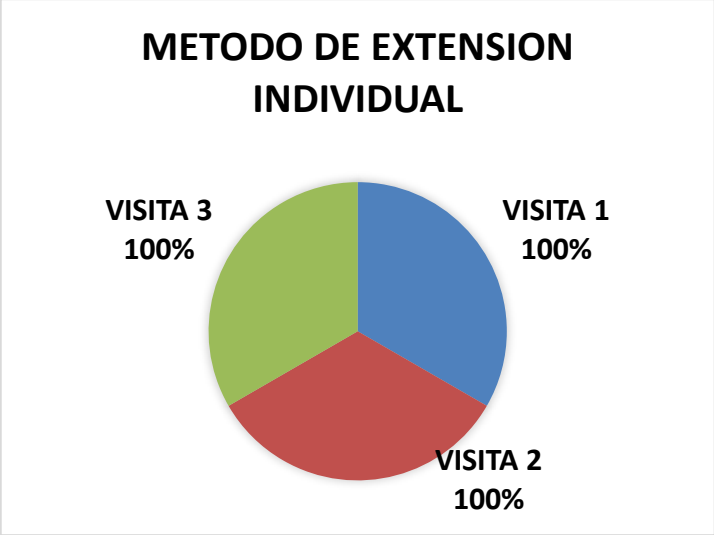

Para los métodos de extensión grupal, en el Municipio de San Lorenzo se ha avanzado con:

- Curso: Habilidades y competencias en el uso de las TIC, con la participación de la totalidad de usuarios.
- Curso: Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias (MIPE), participación del 100% de los usuarios.

4.1.2.3 Municipio de Ospina

Para este municipio fueron asignados 70 usuarios, todas las actividades son realizadas por 2 extensionistas pecuarios, hasta la fecha se ha avanzado con la totalidad de la visita Nº 1 y la visita Nª 2, para la visita Nº 3 se han atendido 28 usuarios, lo que equivale al 40%.

Cuadro 17. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Ospina

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	70	70	100%
VISITA 2	70	70	100%
VISITA 3	70	28	40%
VISITA 4	70	0	0
VISITA 5	70	0	0


Avance métodos de extensión grupal:

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.1.2.4 Municipio del Peñol

En el Municipio del Peñol participan de este proceso 70 usuarios, de línea productiva café, quienes son atendidos por 2 extensionistas, los avances de los métodos de extensión se detallan en las sientes graficas:

Figura 2. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Peñol

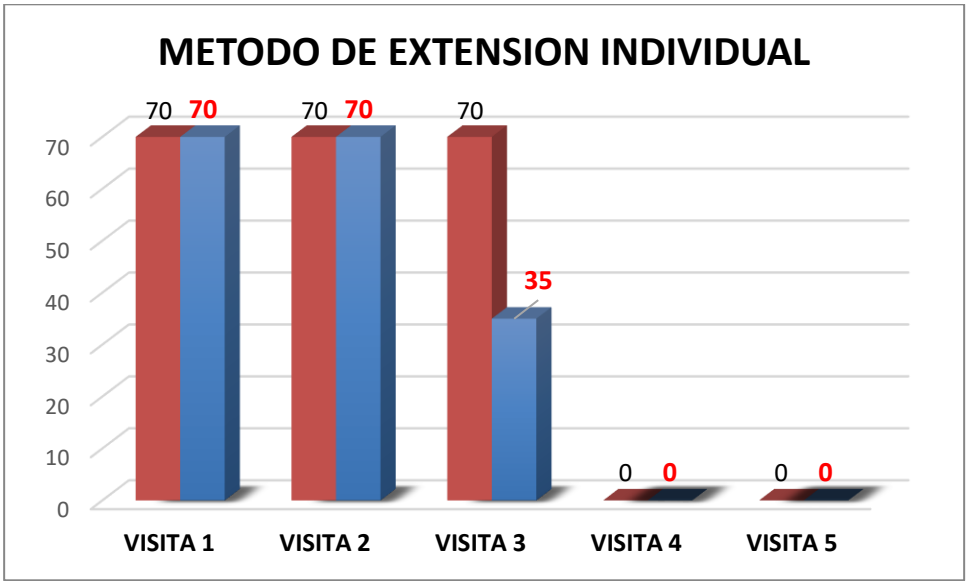

Métodos de extensión grupal:


Cuadro 18. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Peñol

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.1.2.5 Municipio de Funes

70 usuarios se atienden para la prestación del servicio, quienes han sido visitados en su totalidad, tanto para la visita 1 y la visita 2 por los 2 extensionistas contratados, en cuanto a la visita 3 se han realizado hasta la fecha 58 visitas, representando el 83%.

Figura 3. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Funes

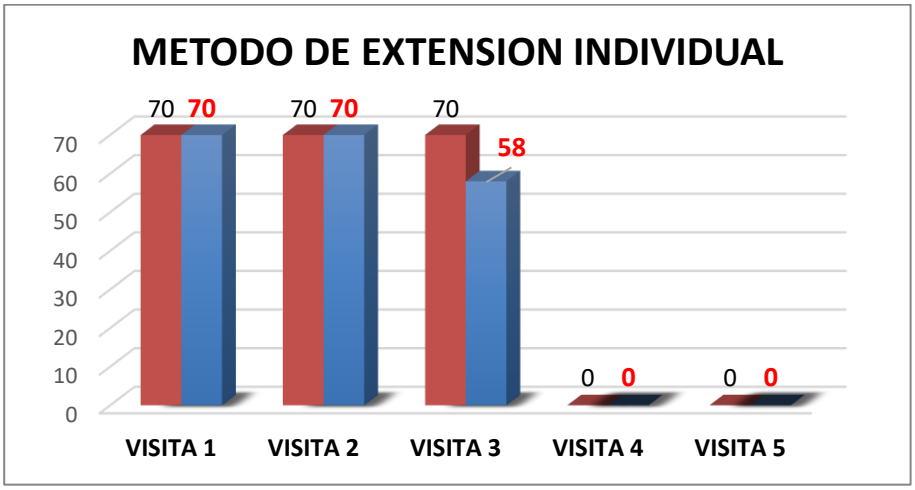


Cuadro 19. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Funes

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	1	50%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	1	50%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA					

4.1.2.6 Municipio de Córdoba

En este municipio hay 70 usuarios, quienes participan activamente del programa de extensión agropecuaria, La línea productiva es hortofrutícola, todas las actividades son realizadas por 2 extensionistas, en la gráfica siguiente se muestra el avance de los métodos individuales de extensión:

Figura 4. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Córdoba

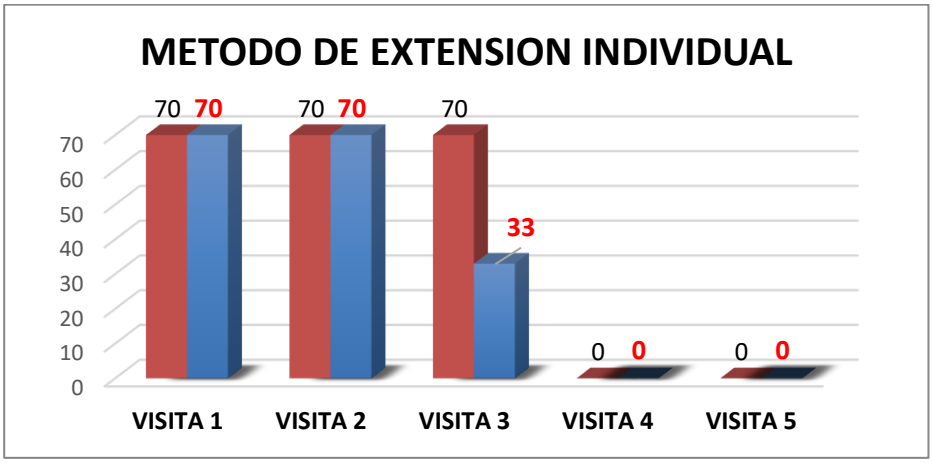

Los avances de los métodos de extensión grupal, se relacionan en el siguiente cuadro:


Cuadro 20. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Córdoba

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA	70				

4.1.2.7 Municipio Del Tambo

En el Municipio de El Tambo se asignaron 70 usuarios y se han visitado la totalidad de ellos, tanto para la visita 1, la visita 2 y la visita 3.

Figura 5. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Tambo

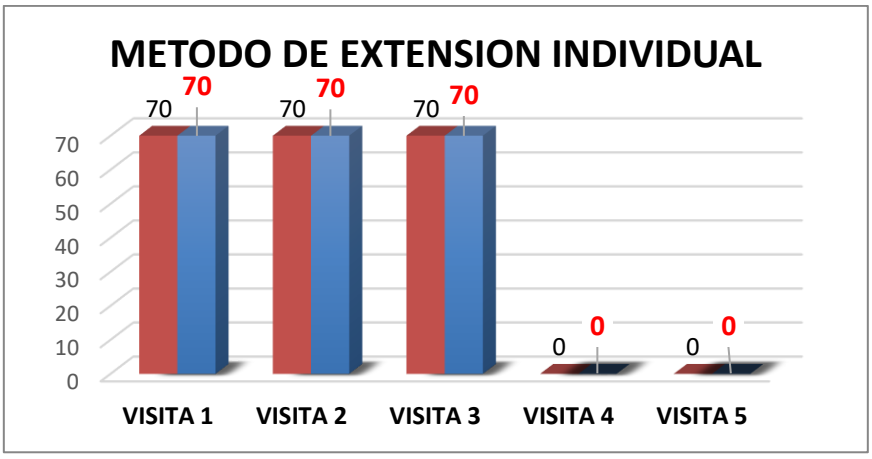

En cuanto a los métodos grupales en este municipio se han realizado las siguientes actividades:


Cuadro 21. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Tambo

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA	70				

4.1.2.8 Municipio de Imues

En este municipio se presta el servicio de extensión agropecuaria a 70 usuarios, a la fecha se ha realizado la visita 1 y la visita 2, de la visita 3 se tiene un avance del 28.5%, siendo visitados 20 usuarios.

Figura 6. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Imués

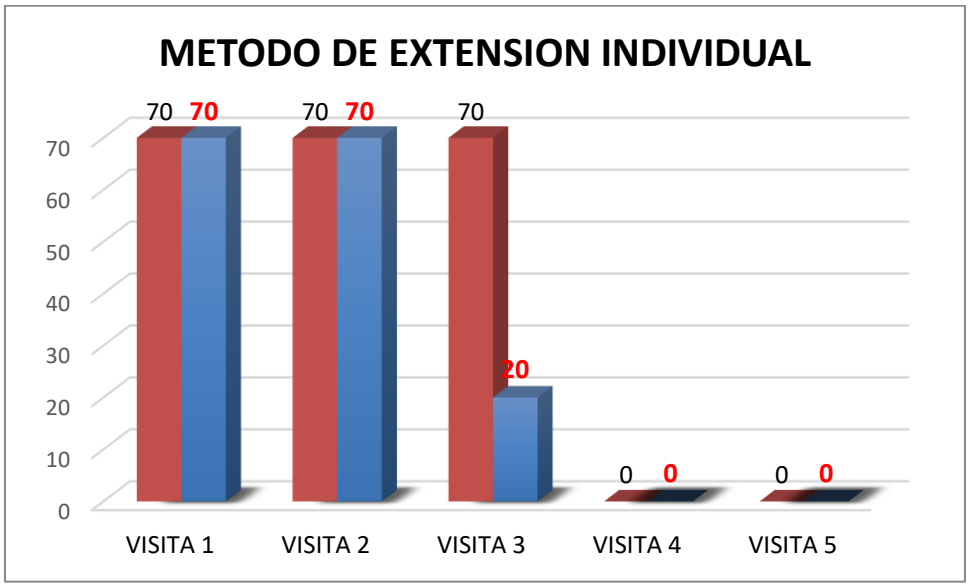

Avance métodos de extensión grupal para el Municipio de Imues:


Cuadro 22. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Imués

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA	70				

4.1.2.9 Municipio de Pasto

En el municipio ya se realizó la totalidad de las visitas 1 Y 2 a los 90 usuarios asignados, así como también se tiene un avance del 37.7% en la visita 3, siendo atendidos a la fecha 34 usuarios.

Figura 7. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Pasto

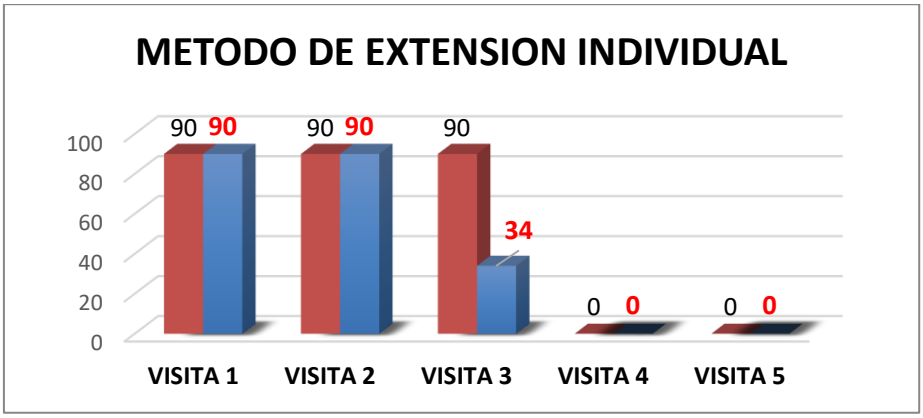

El avance de los métodos de extensión grupal se registra en el cuadro siguiente:


Cuadro 23. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Imués

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	90	3	3	100%	
CURSO BPA/BPG	90	3	3	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	90	3	3	100%	
ECA AMBIENTAL	90	3	2	66.6%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	90	3	0	0	
ECA BPA/BPG	90	3	0	0	
CURSO AUTOGESTION	90	3	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	90	3	0	0	
GIRA	90				

4.1.2.10 Municipio De La Cruz

En el municipio se asignaron 70 usuarios, quienes ya fueron visitados en su totalidad por los 2 extensionistas encargados de prestar el servicio de extensión agropecuaria, realizando la visita 1 y 2, para la visita 3 han sido atendidos 55 usuarios, lo que corresponde al 78.5%

Figura 8. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Cruz

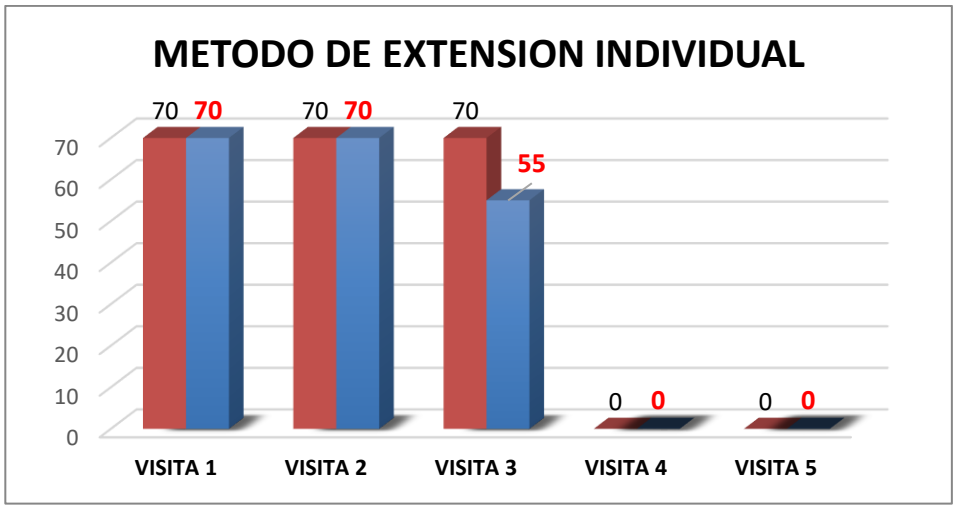

En el siguiente cuadro podemos observar los avances de los métodos de extensión grupal:


Cuadro 24. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Cruz

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA	70				

4.1.2.11 Municipio De La Florida

En el municipio de la Florida se visita a 70 usuarios de la línea productiva de caña, a la fecha se ha realizado el 100% de las visitas Nº 1 y 2, de la visita Nº 3 se han realizado a la fecha 32 visitas, es decir el 45.7% del total de usuarios.

Figura 9. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Florida

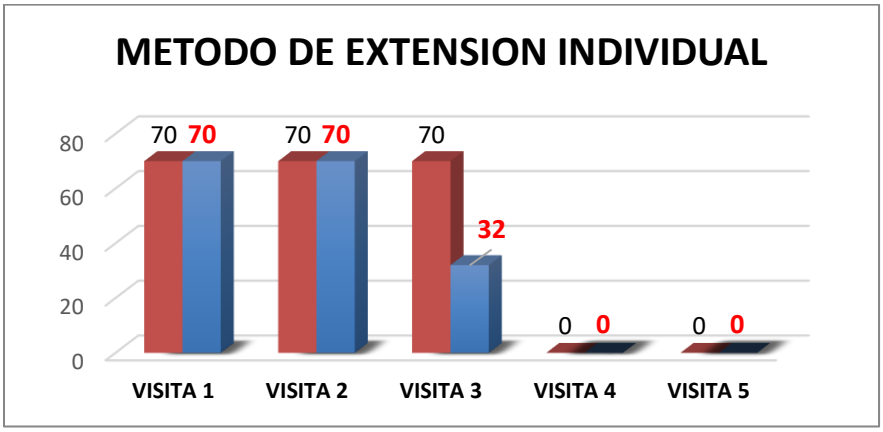

A continuación, se relaciona los avances de los métodos grupales en el municipio de la Florida:

Cuadro 25. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Florida

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	70	2	2	100%	
CURSO BPA/BPG	70	2	2	100%	
ECA ASOCIATIVIDAD	70	2	2	100%	
ECA AMBIENTAL	70	2	2	100%	
ECA ALIANZAS COMERCIALES	70	2	0	0	
ECA BPA/BPG	70	2	0	0	
CURSO AUTOGESTION	70	2	0	0	
DEMOSTRACION DE METODO BPA/BPG	70	2	0	0	
GIRA	70				

4.2 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

En el Departamento del Putumayo, se asignaron 743 usuarios para la ejecución del contrato, a continuación, se resume las actividades individuales y grupales realizadas en articulación con el Banco Agrario, hasta el 28 de febrero de 2023 y se relacionan en las siguientes tablas

Cuadro 26. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Departamento del Putumayo

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	743	743	100%
VISITA 2	743	743	100%
VISITA 3	743	743	100%
VISITA 4	743	0	0%
VISITA 5	743	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA TIC	743	24	24	100%
CURSO BPA/BPG	743	37	37	100%
CURSO ASOCIATIVIDAD	743	37	0	0%
CURSO AMBIENTAL	743	37	37	100%
CURSO AUTOGESTION	743	37	0	0%
DEMOSTRACION DE METODO AMBIENTAL	743	24	0	0%
GIRA	196	1	0	0%


:

4.2.1. Municipio Del Sibundoy

En el Municipio Sibundoy se asignaron 443 usuarios en las líneas productivas de frijol, aguacate, ganadería y cuyes. A la fecha se han realizado la visita 1, visita 2 y visita 3 para un total de 1329 visitas, para el 100% de cobertura, identificando la línea productiva principal, y

diligenciando la encuesta de caracterización y clasificación, usuarios con visita enfocada en el componente, uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias y usuarios con visita enfocada en el componente, uso prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables como se presenta a continuación:


Figura 10. Métodos de extensión individuales Municipio de Sibundoy

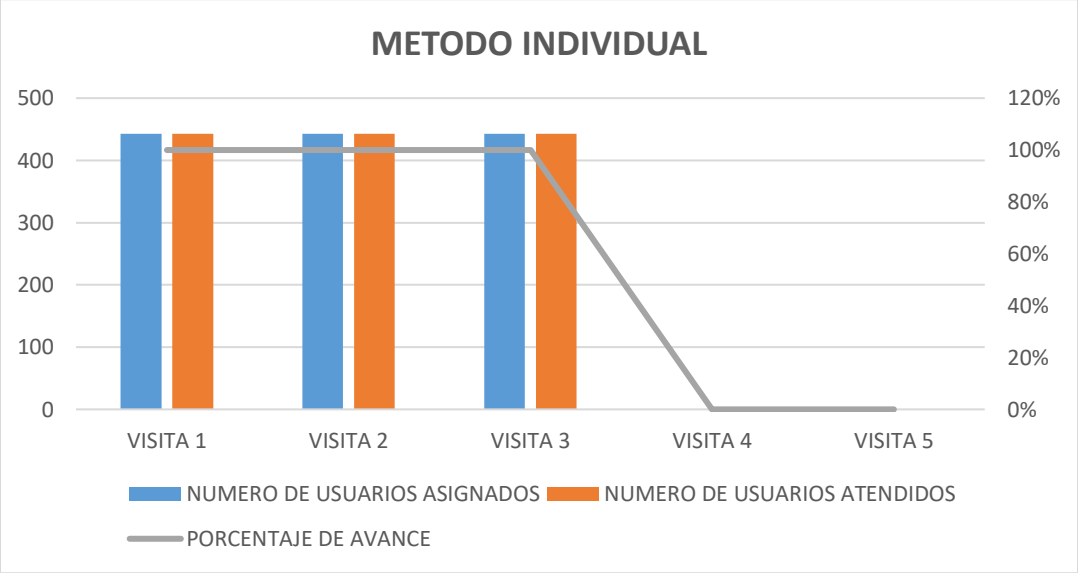

En cuanto a los métodos grupales en este municipio se han realizado las siguientes actividades y se muestran en la gráfica así:

- 14 ECA en conocimiento y aplicación en uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones.
- 22 cursos en uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias.
- 22 cursos en Prácticas de Manejo y Conservación del Medio Ambiente y de la Biodiversidad.


Figura 11. Métodos de extensión grupales realizados Municipio de Sibundoy

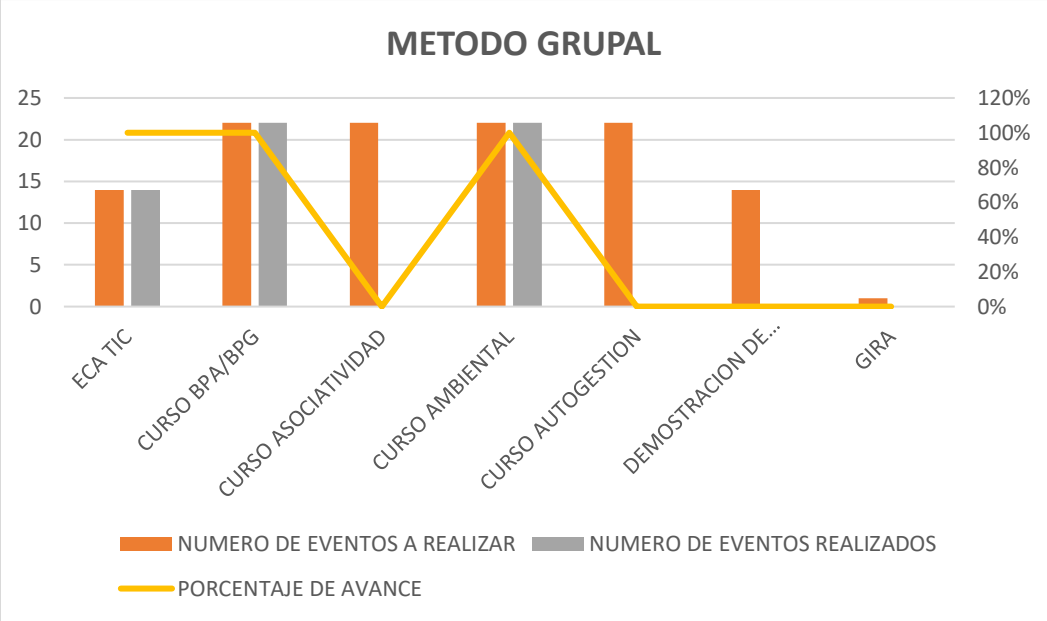

4.2.2 Municipio Mocoa

En el Municipio Mocoa se asignaron 100 usuarios en las líneas productivas de avicultura, piscicultura y plátano. A la fecha se han realizado la visita 1, visita 2 y visita 3 para un total de 300 visitas, para el 100% de cobertura, identificando la línea productiva principal, y diligenciando la encuesta de caracterización y clasificación, usuarios con visita enfocada en el componente, uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias y usuarios con visita enfocada en el componente, uso prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables como se presenta a continuación:


Figura 12. Métodos de extensión individuales realizados Municipio de Mocoa

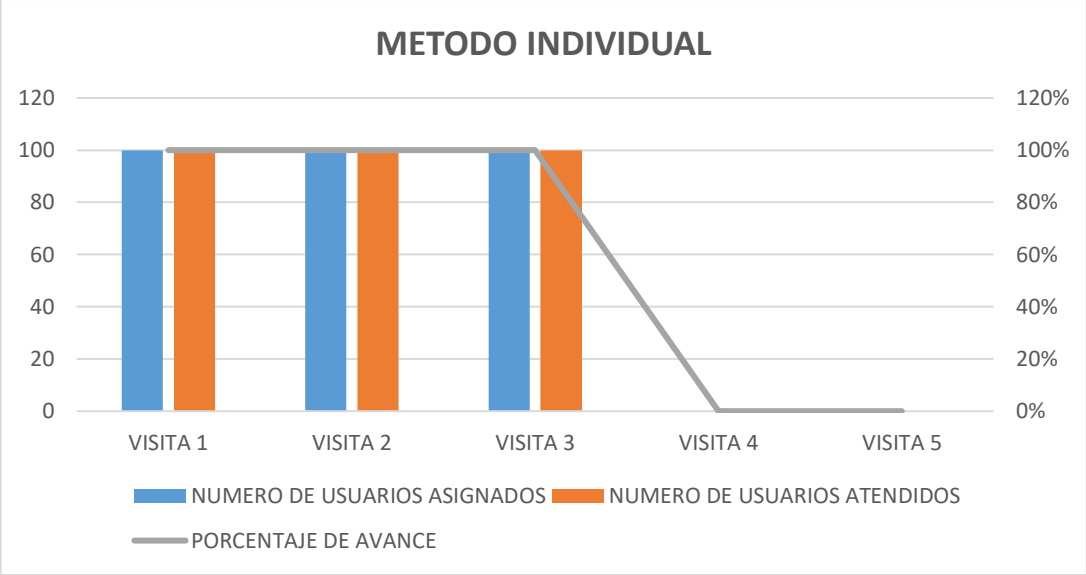

En cuanto a los métodos grupales en este municipio se han realizado las siguientes actividades que se detallan y se muestran en la grafica

- 3 ECA en conocimiento y aplicación en uso de las TIC, como herramienta para la tomade decisiones.
- 5 cursos en uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias
- 5 cursos en Prácticas de Manejo y Conservación del Medio Ambiente y de la Biodiversidad


Figura 13. Métodos de extensión grupales realizados Municipio de Mocoa

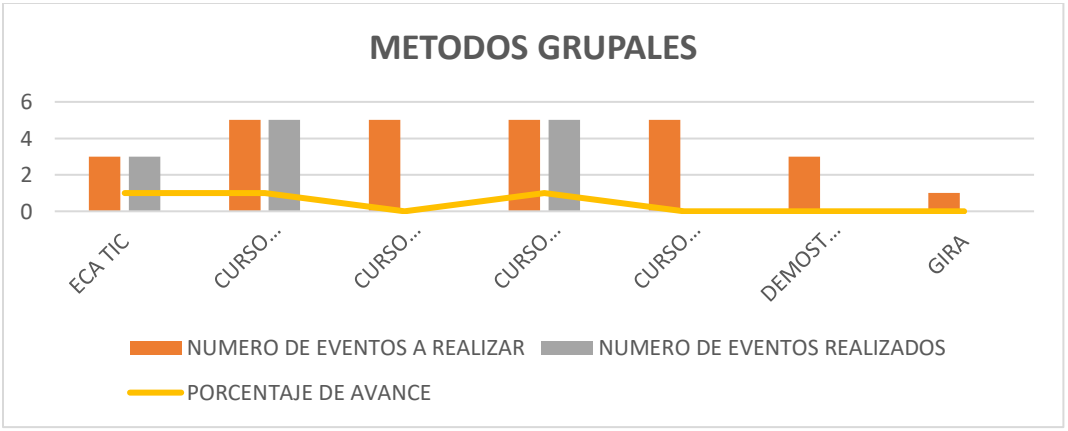

4.2.3 Municipio Villa Garzón

En el Municipio Villa Garzón se asignaron 200 usuarios en las líneas productivas de, piscicultura, yuca, piña, ganadería y plátano. A la fecha se han realizado la visita 1, visita 2 y visita 3 para un total de 600 visitas, para el 100% de cobertura, identificando la línea productiva principal, y diligenciando la encuesta de caracterización y clasificación, usuarios con visita enfocada en el componente, uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias y usuarios con visita enfocada en el componente, uso prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables como se presenta a continuación:


Figura 14. Métodos de extensión individuales realizados Municipio de Villa Garzón

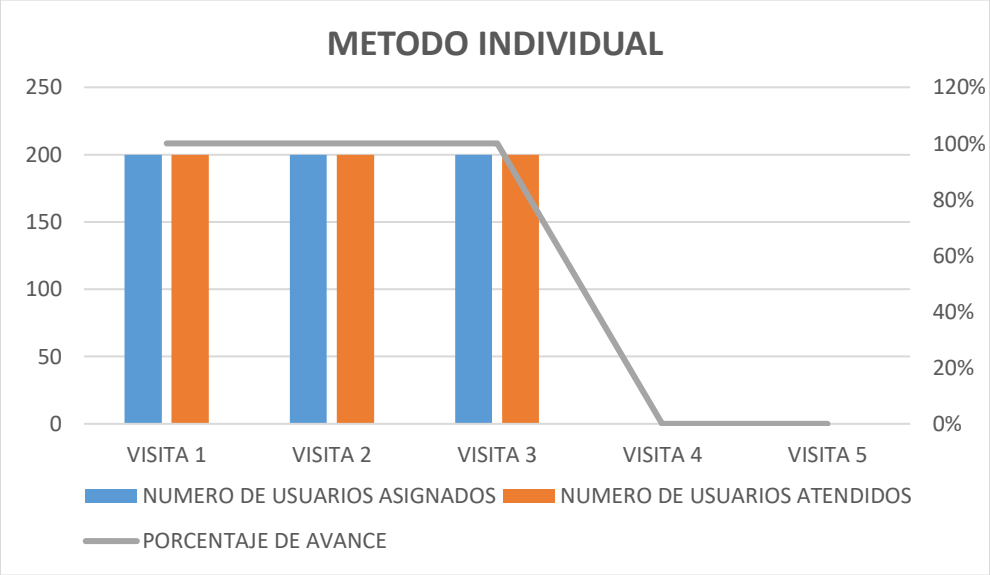

En cuanto a los métodos grupales en este municipio se han realizado las siguientes actividades, las mismas que muestran la grafica

- 6 ECAS en conocimiento y aplicación en uso de las TIC, como herramienta para la tomade decisiones.
- 10 cursos en uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias,
- 10 cursos en Prácticas de Manejo y Conservación del Medio Ambiente y de la Biodiversidad

Figura 15. Métodos de extensión grupales realizados Municipio de Villa Garzón

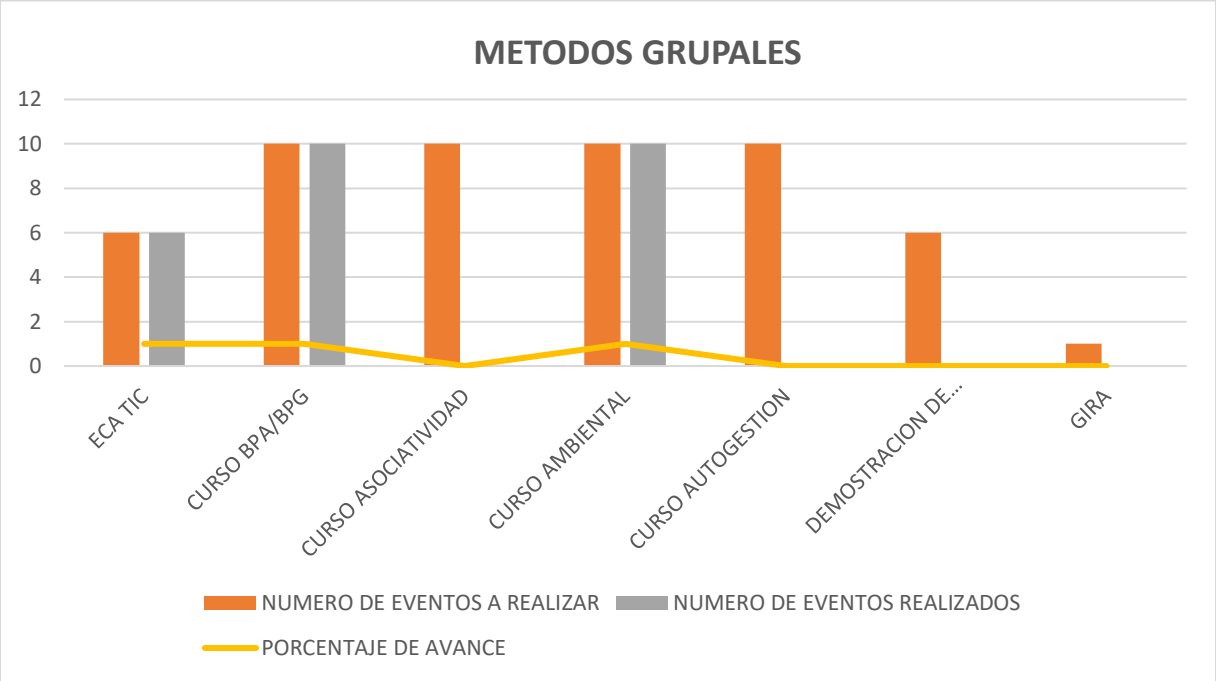

4.3. DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

4.3.1 Municipio de Ansermanuevo

En el municipio de Ansermanuevo se asignaron 22 usuarios en las líneas productiva de: Plátano y tomate de mesa; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 27Métodos de extensión individuales y grupales realizados Departamento del Valle del Cauca

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	22	22	100%
VISITA 2	22	15	75%
VISITA 3	22	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE

ECA BPA / BPG	22	22	1	100%
CURSO BPA / BPG	22	22	1	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	22	22	1	100%
CURSO AUTOGESTION	22	22	1	100%
GIRA	6	6	1	100%

4.3.2. Municipio De Caicedonia

En el Municipio de Caicedonia se asignaron 58 usuarios en las líneas productiva de: plátano y cítricos; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 28. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Caicedonia

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	58	58	100%
VISITA 2	58	15	26%
VISITA 3	58	15	26%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	58	58	1	100%
CURSO BPA / BPG	58	0	0	0%
ECA ASOCIATIVIDAD	58	0	0	0%
CURSO AUTOGESTION	58	58	1	100%
GIRA	15	15	1	100%

4.3.3. Municipio de Calima El Darien

En el municipio de Calima El Darién se asignaron 43 usuarios en las líneas productiva de: Plátano; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 29. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Calima Darién

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	43	43	100%
VISITA 2	43	43	100%
VISITA 3	43	43	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	43	43	2	100%
CURSO BPA / BPG	43	43	2	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	43	43	2	100%
CURSO AUTOGESTION	43	43	2	100%
GIRA	11	11	1	100%

4.3.4 Municipio de Dagua

En el municipio de Dagua se asignaron 63 usuarios en las líneas productiva de: Plátano, cítricos, aguacate y frijol de ladera; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 30. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Dagua

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	63	63	100%
VISITA 2	63	63	100%
VISITA 3	63	63	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	63	63	2	100%
CURSO BPA / BPG	63	63	2	100%

ECA ASOCIATIVIDAD	63	63	2	100%
CURSO AUTOGESTION	63	63	2	100%
GIRA	16	16	1	100%

4.3.5 Municipio De El Aguila

En el municipio de Él Águila se asignaron 26 usuarios en las líneas productiva de: Plátano, aguacate, mora, tomate de mesa y frijol de ladera; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 31. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Aguila

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	26	26	100%
VISITA 2	26	20	77%
VISITA 3	26	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	26	26	1	100%
CURSO BPA / BPG	26	26	1	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	26	26	1	100%
CURSO AUTOGESTION	26	26	1	100%
GIRA	7	7	1	100%

4.3.6 Municipio de Jamundí

En el municipio de Jamundí se asignaron 127 usuarios en las líneas productiva de: Plátano, aguacate, cítricos y frijol de ladera; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 32. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Jamundí

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	127	127	100%
VISITA 2	127	80	63%
VISITA 3	127	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	127	127	3	100%
CURSO BPA / BPG	127	127	3	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	127	127	3	100%
CURSO AUTOGESTION	127	127	3	100%
GIRA	35	35	1	100%

4.3.7 Municipio de la Victoria

En el municipio de La Victoria se asignaron 31 usuarios en las líneas productiva de: Ganadería y tomate de mesa; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 33. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Victoria

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	31	31	100%
VISITA 2	31	31	100%
VISITA 3	31	31	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	31	31	1	100%
CURSO BPA / BPG	31	31	1	100%

ECA ASOCIATIVIDAD	31	31	1	100%
CURSO AUTOGESTION	31	31	1	100%
GIRA	8	8	1	100%

4.3.8 Municipio de Palmira

En el municipio de Palmira se asignaron 175 usuarios en las líneas productiva de: Plátano, aguacate, cítricos y frijol de ladera y tomate de mesa; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 34. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Palmira

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	175	175	100%
VISITA 2	175	148	85%
VISITA 3	175	88	50%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	175	175	3	100%
CURSO BPA / BPG	175	175	3	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	175	175	3	100%
CURSO AUTOGESTION	175	175	3	100%
GIRA	48	48	1	100%

4.3.9 Municipio de Restrepo

En el municipio de Restrepo se asignaron 10 usuarios en la línea productiva de: Ganadería; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 35. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Restrepo

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	10	10	100%
VISITA 2	10	10	100%
VISITA 3	10	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	10	10	1	100%
CURSO BPA / BPG	10	10	1	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	10	10	1	100%
CURSO AUTOGESTION	10	10	1	100%
GIRA	3	3	1	100%

4.3.10 Municipio de Roldanillo

En el municipio de Roldanillo se asignaron 11 usuarios en las líneas productivas de: Aguacate, cítricos y tomate de mesa; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 36. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Roldanillo

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	11	11	100%
VISITA 2	11	11	100%
VISITA 3	11	11	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	11	11	1	100%
CURSO BPA / BPG	11	11	1	100%

ECA ASOCIATIVIDAD	11	11	1	100%
CURSO AUTOGESTION	11	11	1	100%
GIRA	3	3	1	100%

4.3.11 Municipio de San Pedro

En el municipio de San Pedro se asignaron 10 usuarios en la línea productiva de: Ganadería en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 37. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de San Pedro

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	10	10	100%
VISITA 2	10	10	100%
VISITA 3	10	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	10	10	1	100%
CURSO BPA / BPG	10	10	1	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	10	10	1	100%
CURSO AUTOGESTION	10	10	1	100%
GIRA	3	3	1	100%

4.3.12 Municipio de Toro

En el Municipio de Toro se asignaron 7 usuarios en la línea productiva de cítricos; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 38. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de El Toro

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	7	7	100%
VISITA 2	7	7	100%
VISITA 3	7	7	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	7	7	1	100%
CURSO BPA / BPG	7	7	1	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	7	7	1	100%
CURSO AUTOGESTION	7	7	1	100%
GIRA	2	2	1	100%

4.3.13 Municipio de Trujillo

En el municipio de Trujillo se asignaron 53 usuarios en las líneas productivas de: Aguacate, frijol de ladera, mora, tomate de mesa y plátano; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 39. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Trujillo

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	53	53	100%
VISITA 2	53	53	100%
VISITA 3	53	53	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	53	53	2	100%
CURSO BPA / BPG	53	53	2	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	53	53	2	100%
CURSO AUTOGESTION	53	53	2	100%
GIRA	14	14	1	100%

4.3.14 Municipio De Tuluá

En el municipio de Tuluá se asignaron 109 usuarios en las líneas productivas de: Plátano, aguacate, cítricos, mora, tomate de mesa, ganadería y frijol de ladera; en las siguientes tablas se observa los métodos de extensión realizados hasta la fecha:

Cuadro 40. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Tuluá

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	109	109	100%
VISITA 2	109	70	64%
VISITA 3	109	50	46%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS CAPACITADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
ECA BPA / BPG	109	109	3	100%
CURSO BPA / BPG	109	109	3	100%
ECA ASOCIATIVIDAD	109	109	3	100%
CURSO AUTOGESTION	109	109	3	100%
GIRA	29	29	1	100%

4.4. DEPARTAMENTO DE RISRALDA

4.4.1 Municipio de Apia.

En el municipio de Apía se atienden 40 usuarios en las líneas productivas de: plátano, aguacate, café y ganadería

Cuadro 41. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Departamento de Risaralda

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	40	40	100%
VISITA 2	40	35	100%
VISITA 3	40	20	57%
VISITA 4	40	0	0%

VISITA 5	40	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	40	1	1	100%	ASISTENTES 30 USUARIOS
ECA ASOCIATIVIDAD	40	1	1	100%	ASISTENTES 32 USUARIOS
ECA AMBIENTAL	40	1	1	100%	ASISTENTES 32 USUARIOS
ECA ALIANZAS COMERCIALES	40	1	1	100%	ASISTENTES 35 USUARIOS
ECA BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 31 USUARIOS
CURSO AUTOGESTION	40	1	1	100%	ASISTENTES 30 USUARIOS
DIA DE CAMPO BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 32 USUARIOS
GIRA	0	0	0	0	0%

4.4.2 Municipio De Balboa

En el Municipio de Balboa se presta el servicio de 7 usuarios de la línea productiva de plátano y aguacate.

Cuadro 42. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Balboa

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	7	7	100%
VISITA 2	7	7	100%
VISITA 3	7	7	100%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0%

4.4.3 Municipio De Belén de Umbría

Se atienden con la prestación del servicio de extensión agropecuaria a 6 usuarios en las líneas productivas de aguacate y lulo.

Cuadro 43. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Umbría

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	6	6	100%
VISITA 2	6	6	100%
VISITA 3	6	6	100%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0%

4.4.4 Municipio De Guática

Se asignaron 6 usuarios en las líneas productivas de plátano y caña

Cuadro 44. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Guatica

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	6	6	100%
VISITA 2	6	6	100%
VISITA 3	6	6	100%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0%

4.4.5 Municipio De La Celia

En el Municipio de la Celia se atiende 52 usuarios de las líneas productivas de plátano y caña.

Cuadro 45. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de La Celia

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	52	52	100%
VISITA 2	52	45	86%
VISITA 3	52	20	48%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0 %

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	52	1	1	100%	ASISTENTES 45 USUARIOS
ECA ASOCIATIVIDAD	52	1	1	100%	ASISTENTES 45 USUARIOS
ECA AMBIENTAL	52	1	1	100%	ASISTENTES 46 USUARIOS
ECA ALIANZAS COMERCIALES	52	1	1	100%	ASISTENTES 46 USUARIOS

4.4.6 Municipio De Marsella

En el Municipio de Marsella, la EPSEA atiende a 40 usuarios de las líneas productivas de plátano y aguacate.

Cuadro 46. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Marsella

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	40	40	100%
VISITA 2	40	40	100%
VISITA 3	32	32	80%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
ECA ASOCIATIVIDAD	40	1	1	100%	ASISTENTES 33 USUARIOS
ECA AMBIENTAL	40	1	1	100%	ASISTENTES 30 USUARIOS
ECA BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 33 USUARIOS

4.4.7 Municipio de Mistrató.

En este municipio se tiene 41 usuarios de las líneas productivas de plátano, caña y ganadería.

Cuadro 47. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Mistrató

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	41	41	100%
VISITA 2	41	35	86%
VISITA 3	0	0	0
VISITA 4	0	0	0
VISITA 5	0	0	0

En el municipio de Mistrató no se han realizado aun actividades grupales debido a la ola invernal que se presentó en meses pasados destruyeron algunos puentes que comunican las veredas, lo que dificulta la movilidad de las personas involucradas dentro del proceso y de la prestación del servicio extensión mas banca.

4.4.8 Municipio de Pereira

El Municipio de Pereira cuenta con un total de 107 usuarios en el programa de extensión agropecuaria, 59 en Línea Agrícola y 48 en línea pecuaria, en este municipio se encuentra lo siguiente:

Cuadro 48. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Pereira

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	107	107	100%
VISITA 2	107	46	43%
VISITA 3	107	25	23%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	107	2	1	50%	ASISTENTES 45 USUARIOS
ECA ASOCIATIVIDAD	107	2	1	50%	ASISTENTES 45 USUARIOS

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	40	1	1	100%	ASISTENTES 32 USUARIOS
ECA ASOCIATIVIDAD	40	1	1	100%	ASISTENTES 35 USUARIOS
ECA AMBIENTAL	40	1	1	100%	ASISTENTES 28 USUARIOS
ECA ALIANZAS COMERCIALES	40	1	1	100%	ASISTENTES 33 USUARIOS
ECA BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 36 USUARIOS
CURSO AUTOGESTION	40	1	1	100%	ASISTENTES 30 USUARIOS
DIA DE CAMPO BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 35 USUARIOS
ECA AMBIENTAL	107	2	1	50%	ASISTENTES 46 USUARIOS
ECA BPA/BPG	107	2	1	50%	ASISTENTES 46 USUARIOS

4.4.9 Municipio de Pueblo Rico

En el Municipio de Pueblo Rico se asignaron 40 usuarios de las líneas de plátano, caña y ganadería, después de la validación y clasificación de usuarios observamos que:

Cuadro 49. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Pueblo Rico

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	40	40	100%
VISITA 2	40	30	75%

4.4.10 Municipio de Quinchía

En este municipio se presta el servicio a as 40 usuarios, en las líneas productivas de plátano, aguacate, caña y mora. Los resultados son los siguientes:

Cuadro 50. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Quinchía

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	40	40	100%
VISITA 2	40	40	100%
VISITA 3	40	40	100%
VISITA 4	0	0	0%
VISITA 5	0	0	0%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CURSO TIC	40	1	1	100%	ASISTENTES 37 USUARIOS
ECA ASOCIATIVIDAD	40	1	1	100%	ASISTENTES 35 USUARIOS
ECA AMBIENTAL	40	1	1	100%	ASISTENTES 34 USUARIOS
ECA ALIANZAS COMERCIALES	40	1	1	100%	ASISTENTES 36 USUARIOS
ECA BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 36 USUARIOS
CURSO AUTOGESTION	40	1	1	100%	ASISTENTES 35 USUARIOS
DIA DE CAMPO BPA/BPG	40	1	1	100%	ASISTENTES 35 USUARIOS

4.4.11 Municipio de Santa Rosa De Cabal

Se atienden un total de 58 usuarios para la prestación del servicio de extensión agropecuaria.

Cuadro 51. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Santa Rosa de Cabal

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	58	58	100%
VISITA 2	58	30	100%

4.4.12 Municipio de Santuario

En este municipio se atienden 45 usuarios, 22 usuarios en las líneas productivas de plátano y aguacate y 23 pecuarios

Cuadro 52. Métodos de extensión individuales y grupales realizados Municipio de Santuario

METODO INDIVIDUAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE
VISITA 1	45	45	100%
VISITA 2	45	45	100%

METODO GRUPAL	NUMERO DE USUARIOS ASIGNADOS	NUMERO DE EVENTOS A REALIZAR	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
ECA ASOCIATIVIDAD	45	1	1	100%	Asistentes 42
ECA AMBIENTAL	45	1	1	100%	Asistentes 38
ECA BPA/BPG	45	1	1	100%	Asistentes 38

5. CRONOGRAMAS

Para visualizar al detalle los cronogramas de los cuatro departamentos, se adjunta a este informe los archivos en Excel completos.

5.1 DEPARTAMENTO DE NARIÑO

5.2 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cuadro 53. Cronograma para el Departamento del Putumayo

ALISTAMIENTO	*Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD)*	01.08.2022	09.08.2022	7	ADR - EPSEA
	Capacitación Extensionistas y EPSEA territorio	09.08.2022	10.08.2022	2	ADR - EPSEA
EJECUCIÓN EPSEA	*Desarrollo de la primera visista a usuarios (Diagnostico)*	10.09.2022	30.10.2022	35	ADR - EPSEA
	Planeacion servicio publico de extension agropecuaria	01.11.2022	15.11.2022	11	ADR - EPSEA
	Elaboracion de planes de fortalecimiento	16.11.2022	13.12.2022	20	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 2 (1ra BPAs)	16.01.2023	20.02.2023	26	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 3 (1ra Ambiental)	21.02.2023	14.03.2023	16	ADR - EPSEA
	Visita a predio 4 (2da BPA)	15.03.2023	30.03.2023	12	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 5 (2da Ambiental - Reclasificación)	01.04.2023	18.04.2023	12	ADR - EPSEA
	Curso (BPA-BPG)-Banco Agrario de Colombia	09.02.2023	25.02.2023	12	ADR - EPSEA
	ECA (Ambiental)	15.02.2023	25.02.2023	8	ADR - EPSEA
	Demostracion de metodo (BPA-BPG)- Banco Agrario de Colombia	01.03.2023	20.03.2023	14	ADR - EPSEA
	ECA (BPA-BPG)	01.04.2023	15.04.2023	10	ADR - EPSEA
	curso (TIC) - Banco Agrario de Colombia	14.12.2022	30.12.2022	13	ADR - EPSEA
	ECA (Asociatividad)	09.02.2023	28.02.2023	14	ADR - EPSEA
	ECA (Alianzas comerciales)	01.03.2023	20.03.2023	14	ADR - EPSEA
	Curso (Autogestión) - Banco Agrario de Colombia	01.04.2023	15.04.2023	10	ADR - EPSEA
	Gira (Ambiental)	27.03.2023	30.03.2023	4	ADR - EPSEA
	Gestion documental - Entrega del informe final	15.04.2023	15.05.2023	21	ADR - EPSEA

ALISTAMIENTO	*Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD)*	01.08.2022	09.08.2022	7	ADR - EPSEA
	Capacitación Extensionistas y EPSEA territorio	10.08.2022	12.08.2022	3	ADR - EPSEA
EJECUCIÓN EPSEA	*Desarrollo de la primera viisista a usuarios (Diagnostico)*	10.09.2022	30.10.2022	35	ADR - EPSEA
	Planeacion Programa Extension Agropecuaria	01.11.2022	30.11.2022	22	ADR - EPSEA
	Formulacion Planes de Fortalecimiento	01.12.2022	30.12.2022	22	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 2 (1ra BPAs)	01.02.2023	15.02.2023	11	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 3 (1ra Ambiental)	16.02.2023	01.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Visita a predio 4 (2da BPA)	02.03.2023	15.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 5 (2da Ambiental - Reclasificación)	20.03.2023	15.04.2023	20	ADR - EPSEA
	Demostracion de metodo	10.03.2023	19.03.2023	6	ADR - EPSEA
	Curso (Asociatividad) - Banco Agrario de Colombia	10.03.2023	19.03.2023	6	ADR - EPSEA
	Curso (BPAs) - Banco Agrario de Colombia	16.02.2023	25.02.2023	7	ADR - EPSEA
	Curso (Ambiental) - Banco Agrario de Colombia	16.02.2023	25.02.2023	7	ADR - EPSEA
	Gira	26.04.2023	28.04.2023	3	ADR - EPSEA
	ECA (Tic´s)	16.02.2023	25.02.2023	7	ADR - EPSEA
	Curso (Autogestión) - Banco Agrario de Colombia	10.03.2023	19.03.2023	6	ADR - EPSEA
	Entrega del informe final	15.04.2023	15.05.2023	21	ADR - EPSEA

5.3 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Cuadro 54. Cronograma para el Departamento del Valle del Cauca

ALISTAMIENTO	*Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD)*	01.08.2022	09.08.2022	7	ADR - EPSEA
	Capacitación Extensionistas y EPSEA territorio	09.08.2022	10.08.2022	2	ADR - EPSEA
EJECUCIÓN EPSEA	*Desarrollo de la primera visista a usuarios (Diagnostico)*	10.09.2022	30.10.2022	35	ADR - EPSEA
	Planeacion servicio publico de extension agropecuaria	01.11.2022	15.11.2022	11	ADR - EPSEA
	Elaboracion planes de fortalecimiento	16.11.2022	13.12.2022	20	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 2 (1ra BPAs)	13.02.2023	25.02.2023	10	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 3 (1ra Ambiental)	27.02.2023	11.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Visita a predio 4 (2da BPA)	13.03.2023	25.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 5 (Tic's)	27.03.2023	08.04.2023	10	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 6 (2da Ambiental - Reclasificación)	10.04.2023	22.04.2023	10	ADR - EPSEA
	ECA (BPA-BPG)-Banco Agrario de Colombia	14.02.2023	28.02.2023	11	ADR - EPSEA
	ECA (Asociatividad)	01.03.2023	14.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Dia de campo (BPA-BPG)	14.03.2023	28.03.2023	11	ADR - EPSEA
	ECA (Ambiental)	30.03.2023	15.04.2023	12	ADR - EPSEA
	Curso (BPA-BPG)-Banco Agrario de Colombia	15.02.2023	02.03.2023	12	ADR - EPSEA
	curso (TIC) - Banco Agrario de Colombia	04.03.2023	18.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Curso (Autogestión) - Banco Agrario de Colombia	20.03.2023	31.03.2023	10	ADR - EPSEA
	Gira (Ambiental)	14.04.2023	14.04.2023	1	ADR - EPSEA
	Gestion documental - Entrega del informe final	20.04.2023	15.05.2023	18	ADR - EPSEA

5.4 DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Cuadro 55. Cronograma para el Departamento de Risaralda

ALISTAMIENTO	*Socialización EPSEA contratada (evento lanzamiento ADR - BAC - SAD)*	01.08.2022	09.08.2022	7	ADR - EPSEA
	Capacitación Extensionistas y EPSEA territorio	09.08.2022	10.08.2022	2	ADR - EPSEA
EJECUCIÓN EPSEA	*Desarrollo de la primera viisista a usuarios (Diagnostico)*	16.08.2022	15.11.2022	66	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 2 (1ra BPAs)	02.01.2023	15.03.2023	53	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 3 (1ra Ambiental)	16.01.2023	30.03.2023	54	ADR - EPSEA
	Visita a predio 4 (2da BPA)	01.04.2023	15.04.2023	10	ADR - EPSEA
	Visitas a Predio 5 (2da Ambiental - Reclasificación)	16.04.2023	30.04.2023	10	ADR - EPSEA
	Día de Campo	01.03.2023	30.03.2023	22	ADR - EPSEA
	Escuela de Campo (Asociatividad)	01.02.2023	28.02.2023	20	ADR - EPSEA
	Escuela de Campo (BPAs)	01.02.2023	28.02.2023	20	ADR - EPSEA
	Escuela de Campo (Ambiental)	01.03.2023	30.03.2023	22	ADR - EPSEA
	Gira	27.02.2023	28.02.2023	2	ADR - EPSEA
	Curso (BPAs)	01.02.2023	28.02.2023	20	ADR - EPSEA
	Curso (Tic´s)	01.03.2023	30.03.2023	22	ADR - EPSEA
	Curso (Autogestión)	01.02.2023	28.02.2023	20	ADR - EPSEA
	Entrega del informe final	15.04.2023	15.05.2023	21	ADR - EPSEA

6. REUNIONES CON EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO

La Fundación los Andes, mantiene comunicación contante con el personal de apoyo a la supervisión en cada departamento; quienes han prestado toda su colaboración de forma efectiva y en el momento oportuno para el desarrollo de las actividades contractuales, así como también con los funcionarios del Banco Agrario de Colombia de los cuatro (4)

Departamentos Valle del Cauca, Putumayo, Nariño y Risaralda., tanto del nivel central, como con las regionales, para la debida articulación de las actividades grupales.

En general para los cuatro departamentos, las reuniones realizaron como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 56. Reuniones de equipo de seguimiento

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES
06 de febrero de 2023	REUNION ARTICULACION BAC	ADR- BAC – FUNDACION LOS ANDES
09 de febrero de 2023	REUNION ARTICULACION BAC	ADR- BAC – FUNDACION LOS ANDES
17 de febrero de 2023	DIRECTRICES CONTRATO 7402022	ADR – FUNDACION LOS ANDES

Sin embargo, en el Departamento de Risaralda se observa lo siguiente:

FECHA	TEMAS	PARTICIPANTES
Feb 01	REUNION ARTICULACION BAC	ADR- BAC – FUNDACION LOS ANDES
FEB 9	REUNION COMITÉ TECNICO	ADR- BAC – FUNDACION LOS ANDES- MUNICIPIOS
FEB 11	REUNION EXTENSIONISTAS DIRECTRICES CONTRATO 7402022	FUNDACION LOS ANDES
FEB 24	REUNION COMITÉ TECNICO	ADR- BAC – FUNDACION LOS ANDES- MUNICIPIOS
Feb 28	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ADR	ADR– FUNDACION LOS ANDES

7. PRINCIPALES RETOS.

7.1 Departamento de Nariño

- En la Zona costa del Departamento de Nariño, en el mes de febrero realizan los carnavales de fuego, razón por lo que las actividades programadas se ven afectadas, debido a que los usuarios hacen parte de estos juegos y no cuentan con la disponibilidad para recibir las visitas o acudir y acompañar en los métodos grupales.

- En los 7 Municipios de la Zona Costa Nariñense, se han presentado inconvenientes de orden público, lo que afecta el buen desarrollo de las actividades contractuales.

- El arreglo de vías que se lleva a cabo en algunos de los municipios de la Zona Centro del Departamento de Nariño - Centro y las constantes lluvias presentadas durante este mes, han causado algunos retrasos en las actividades que se vienen desarrollando.

7.2 Departamento de Putumayo

- Para el Municipio de Sibundoy, en el mes de febrero se realiza el carnaval del Perdón de la Comunidad Indígena Camentsa, en donde la comunidad participa activamente, sin embargo, se han llevado a cabo las actividades programadas.
- Garantizar la participación de los usuarios en las actividades individuales y grupales pendientes para cumplimiento de cronograma y plan operativo planteado para el departamento de Putumayo,

7.3 Departamento del Valle del Cauca

- Las convocatorias para realizar las actividades grupales, requieren de programación con bastante antelación, porque en esta época los productores tienen muchas labores de campo en ejecución, labores como cosecha, alistamiento de terrenos, podas, entre otros, pero se logra el cometido de participación incentivando a través de diferentes estrategias.

- Lograr la adopción de las BPA sobre todo en términos ambientales y de disminución de pesticidas, aparentemente es el camino más rápido y económico de control de arvenses y plagas.

7.4 Departamento de Risaralda

La EPSEA Fundación los Andes, articula con cada uno de los actores involucrados para el desarrollo de la prestación del servicio público de extensión agropecuaria, en este entendido, la Gobernación de Risaralda, las alcaldías municipales y personal de los gobiernos locales han estado dispuestos para prestar la colaboración necesaria; sin embargo, se han presentado algunas dificultades ajenas a la voluntad y trabajo en equipo como:

- Consolidación equipo técnico.
- Realizar las visitas en el tiempo determinado, teniendo en cuenta las distancias geográficas y la contracción de nuevos extensionistas, quienes no conocen los predios a visitar.
- Situaciones de la ola invernal, para el municipio de Mistrató en este departamento

8. CONCLUSIONES

8.1 Departamento de Nariño

- Se han realizaron 1282 visitas de caracterización, clasificación e identificación de la línea productiva principal, para un 100% de usuarios atendidos.

- En cuanto a la segunda visita, en el Departamento de Nariño se han visitado 1247 usuarios, lo que corresponde al 97.3% del total de usuarios atendidos, visita enfocada el aspecto 1, para el componente del uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

- A la fecha, se han realizado 661 visitas 3, enfocadas en el aspecto 4, para el componente; Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables lo que representa un 51.5% de usuarios atendidos.

- Del total del método de extensión grupal, para los cinco aspectos contemplados en el manual operativo. A la fecha se han realizado 149 actividades grupales, en lo referente a los aspectos 1 (Desarrollar las capacidades integrales humanas), 2 (Desarrollar las capacidades sociales, integrales y fortalecimiento de la asociatividad), 3 (Facilitar el acceso y aprovechamiento de la información de apoyo, tecnologías y productos tecnológicos TIC) y 4 (Gestionar el uso sostenible de los recursos naturales), es decir un avance del 40%.

- A la fecha se mantienen la cantidad de extensionistas por municipio, quienes han cumplido con sus actividades en las fechas pactadas.

8.2 Departamento de Putumayo

- Del total del método de extensión individual, (visitas a predio), a realizar en el Departamento de Putumayo, para los dos aspectos: Fortalecer las capacidades humanas y técnicas y para el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales, contemplados en el PDEA del Departamento, se han realizado 3 visitas de a predio para cada usuario es decir 2.229 visitas; las visita 4 y 5 pendientes se realizarán en el mes de marzo y abril es decir 1.486 visitas, para un total de 3715 visitas
- Del total del método de extensión grupal (7 métodos), para los cinco aspectos contemplados en el manual operativo. A la fecha se han realizado 3 métodos grupales - 24 ECA en conocimiento y aplicación en uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones, 37 curso en uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, 37 cursos en prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la

biodiversidad, contando con la participación en todas las jornadas realizadas. Se encuentra pendiente la realización de 4 métodos grupales que son: una gira técnica, 24 eventos de demostración de método ambiental y 37 cursos en asociatividad y autogestión respectivamente.

- 743 usuarios registrados, con los secretarios y profesionales de las alcaldías de Mocoa, Villagarzón y Sibundoy y el equipo de extensionistas de la EPSEA
- En el Departamento de Putumayo, a la fecha se mantienen la cantidad de extensionistas por municipio, quienes han cumplido con sus actividades en las fechas pactadas.
- En los 3 municipios los usuarios tienen buena recepción del servicio de extensión agropecuaria, de las visitas y participación en las actividades grupales que se desarrollaran, con lo que se quiere mejorar su actividad productiva durante el tiempo de intervención.

8.3 Departamento del Valle del Cauca

- En el Departamento del Valle del Cauca se han realizado un total 745 visitas de caracterización, y clasificación de usuarios en sus diferentes aspectos y componentes e identificación de la línea productiva principal.

- A la fecha se han elaborado 745 planes de fortalecimiento, correspondientes al 100% de los usuarios visitados y se realizan los ajustes necesarios de acuerdo a las recomendaciones.

- Se han realizado 745 visitas No 1 del componente: Uso de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias

- Se han realizado 579 visitas No 2 del componente: Uso de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

- Se han realizado 364 visitas No 3 del componente: prácticas ambientales y sostenibles.

- Del total del método de extensión individual, (visitas a predio), a realizar en el Departamento del Valle del Cauca, para los dos aspectos: Fortalecer las capacidades humanas y técnicas y para el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos naturales, contemplados en el PDEA del Departamento, se harán en total 3725 visitas; es decir cinco visitas a predio a cada usuario. A la fecha se han realizado 1688 visitas, equivalente al 45% de avance de ejecución en cuanto a este método.

- Del total de los ocho (8) métodos de extensión grupal, para los cinco aspectos contemplados en el manual operativo. A la fecha se han realizado cinco (5): ECA BPA/BPG, CURSO BPA/BPG, ECA ASOCIATIVIDAD, CURSO AUTOGESTION, GIRA, al 100%. Las actividades grupales de ECA AMBIENTAL, CURSO DE TIC Y DIA DE

CAMPO BPA/BPG aún no se ejecutan y su avance es de 0%; respecto a las actividades grupales, en general se ha realizado un avance del 62,5%.

8.4 Departamento de Risaralda

- En el Departamento del Risaralda, se han realizado 38 actividades grupales según plasmado en el cronograma de actividades y se han dictados temas de acuerdo a los resultados obtenidos en los planes de fortalecimiento, donde se han desarrollado habilidades técnicas específicamente en la aplicación de las BPA y BPG, así mismo el Banco Agrario de Colombia y en articulación con la EPSEA, se han dictado los módulos correspondientes, y han facilitado las herramientas para el acceso a créditos y bancarización.

- En el tema desarrollo de capacidades sociales integrales y el fortalecimiento a la asociatividad; se han realizado 7 actividades grupales en los municipios de Quinchia, Apia, Pueblo Rico, La Celia, Pereira (2), Marsella. Donde se han fortalecido y fomentado los procesos de emprendimiento y asociatividad.

- Se han dictado 5 cursos, en los temas de acceso a la información y uso de las TIC, donde se capacitó el uso y la importancia de las TIC en el proceso de producción agropecuaria, como herramienta fundamental en la toma de decisiones

- Se han realizado 5 cursos de la autogestión en comunidades, fortaleciendo así las capacidades de fomento, para que se logre una mayor participación de las comunidades en la autogestión de sus necesidades y por tanto se logren soluciones acordes a sus dificultades.

- Del total del método de extensión grupal, para los cinco aspectos contemplados en el manual operativo. A la fecha no se han realizado, en los municipios de Pereira componente (agrícola), santa Rosa (pecuario), Mistrato (pecuario y agrícola por el tema de ola invernal) es decir que no se presentan avances en cuanto a las actividades grupales se refiere.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

9.1. Departamento de Nariño

ECA - Asociatividad; Municipio de la Cruz, vereda La Vega la planta





Curso – Buenas prácticas agrícolas, Municipio del Charco, articulación BAC





ECA – Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables, Municipio del Tambo, vereda Chuza









ECA – Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables, Municipio de Albán, vereda San Bosco









Curso – Buenas prácticas agrícolas, Municipio de Santa Bárbara, vereda Madrid





ECA – Buenas prácticas agrícolas, Municipio de Tumaco, vereda Mejicano





Curso - TIC; Municipio San Lorenzo, Corregimiento El Carmen, articulación BAC











Usuaria: María Inés Bolaños Chávez
Municipio: La Cruz



Usuario: Afranio Muñoz
Municipio: La Cruz



Usuario: Segundo Manuel Gaviria
Municipio: San Lorenzo



Usuario: Edgar Meneses
Municipio: San Lorenzo



Usuario: Carlos Andrés Buesaquillo
Municipio: Pasto



Usuario: Alex Orlando Paz
Municipio: Pasto



Usuario: Hugo Arcesio Ortiz
Municipio: Imués



Usuaria: Hilda del Socorro Pérez
Municipio: Imués



Usuario: Gustavo Centeno Pineda
Municipio: Tumaco



Usuario: José Limber Aguiño
Municipio: Tumaco

9.2. Departamento de Putumayo



Visita a predio No. 2 – Municipio de Sibundoy – febrero 2023



Visita a predio No. 2 - Municipio de Sibundoy – febrero 2023

	
Visita a predio No. 3 - Municipio de Villagarzon – febrero 2023	Visita a predio No. 3 - Municipio de Mocoa – febrero 2023

	
Actividades Grupales – Municipio de Mocoa – febrero 2023	Actividades Grupales - Municipio de Sibundoy – febrero 2023
	
Actividades Grupales - Municipio de Sibundoy – febrero 2023	Actividades Grupales - Municipio de Villagarzon – febrero 2023

9.3. Departamento del Valle del Cauca



Foto1. Escuela de campo en Buenas Prácticas Agrícolas en el Municipio de Dagua
Fecha: 14/02/2023



Foto 2. Elaboración y beneficios de realizar una zona de barbecho en el Municipio de Dagua
Fecha 14/02/2023



Foto 3. Escuela de campo de asociatividad en el Municipio de Trujillo.
Fecha: 10/02/2023



Foto 4. Dinámica enfocada a los beneficios de trabajar en equipo, camino hacia la asociatividad en el Municipio de Trujillo
10/02/2023



Foto 5. Curso de Autogestión a las comunidades en el Municipio de Palmira
Fecha: 25/02/2023



Foto 6. Entrega de conocimiento a usuarios conforme a las diferentes entidades para realizar autogestión dentro de la comunidad en el Municipio de Palmira
Fecha: 25/02/2023



Foto 7. Cierre de la Gira de usuarios de la prestación del servicio de extensión agropecuaria en articulación con AGROSAVIA y la Gobernación del Valle del Cauca en el Municipio de Palmira con 12 Municipios del Norte y Centro del Valle del Cauca.
Fecha: 27/02/2023



Foto 8. Inicio de la Gira de usuarios de la prestación del servicio de extensión agropecuaria en articulación con AGROSAVIA y la Gobernación del Valle en el Municipio de Palmira con 2 Municipios del Sur del Valle del Cauca.
Fecha: 28/02/2023



Foto 9. Testimonio de experiencia de la prestación del servicio de extensión agropecuaria en el marco de la gira de productores en las instalaciones de AGROSAVIA en el Municipio de Palmira.
Fecha: 28/02/2023



Foto 10. Bienvenida a la gira de productores por parte de la Dra. Maritza Quiñonez, Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca en AGROSAVIA en el Municipio de Palmira.
Fecha: 28/02/2023



Foto 11. Estación de cítricos y manejo del HLB en la gira de productores en el marco de la gira de productores en las instalaciones de AGROSAVIA en el Municipio de Palmira.
Fecha: 28/02/2023



Foto 12. Cierre de la Gira de usuarios de la prestación del servicio de extensión agropecuaria en articulación con AGROSAVIA y la Gobernación del Valle en el Municipio de Palmira con 2 municipios del Sur del Valle del Cauca.
Fecha: 28/02/2023

9.4. Departamento de Risaralda



Foto 1. Curso de Educación Financiera, dictado por el director del Banco Agrario de Colombia. Municipio de Apia.
Fecha 23 de febrero 2023



Foto2: curso. Habilidades y competencias en el uso de TIC.
Profesional Aníbal Patiño.
Fecha 23 de febrero de 2023



Foto 3: Curso, educación financiera. Se observa a la directora del Banco Agrario de Colombia.
Municipio de la Celia.
fecha 25 de febrero de 2023



Foto 4: ECA EN BPA. Municipio De La Celia, dictado por profesional Ing. Agrónomo Eider Toro G. Fecha 25 de febrero de 2023



Foto 5: Atención de los usuarios, quienes participan en la ECA EN BPA Extensionista Alejandro Cano. Municipio de Marsella. Fecha 25 de febrero de 2023

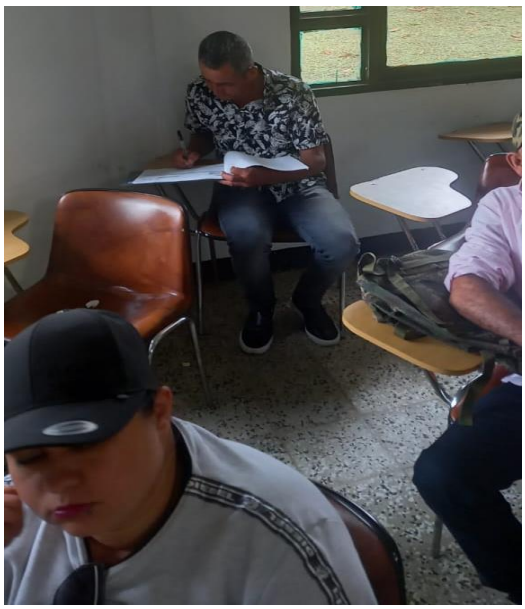


Foto 6: usuario diligenciando listado de asistencia, quien participa en la ECA BPA. Municipio de Marsella. Fecha 25 de febrero de 2023



Foto 7: usuario diligenciando el listado de asistencia, quien hace parte del Programa de Extensión Agropecuaria y participa en el curso TIC, Municipio de Pueblo Rico. Fecha 26 de febrero de 2023



Foto 8: usuario Jorge López diligenciando listado de asistencia, quien participa en el curso TIC.
Municipio de Quinchia,
Fecha 22 de febrero de 2023



Foto 9: Se evidencia desarrollo del curso TIC. y curso de Bancarización por funcionaria del Banco Agrario.
Municipio de Quinchia,
Fecha 22 de febrero de 2023



Foto 10: Se evidencia desarrollo de la ECA Ambiental. Municipio de Santuario. Fecha 18 de febrero de 2023

10. ANEXO: LINK DE TESTIMONIOS DE PRODUCTORES RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA EN EL VALLE DEL CAUCA.

https://drive.google.com/drive/folders/1J6ztMdfVxz9NXi5Yu2L9He1uecdrnbMY?usp=share_link

OSCAR ANTONIO MONCAYO OTERO
Representante Legal

DAMAR ACOSTA RISUEÑO
Coordinadora General.
