INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. # 4

CONTRATACIÓN SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA: DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO - COLOMBIA. Contrato No. CO1.PCCNTR.3697486





TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 1
INTRODUCCIÓN 2
1. DATOS GENERALES 4
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 4
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 5
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 5
5. ACTIVIDADES DEL MES 5
5.1. Seguimiento al plan de compras 8
5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 8
5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 9
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 10
5.5 Informes semanales 12
5.6 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor 12
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 15
6.1. Plan de Calidad 15
6.1.1. Control de inspección y verificaciones: 15
6.2. Plan de gestión de riesgos: 16
6.3. Plan ambiental: 16
5.7 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor 16
7. CONTROL DE PERSONAL 17
8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 18
9. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 18
10. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 19
11. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 20
12. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 21
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 21
14. CONCLUSIONES 22
15. RECOMENDACIONES 23

INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta en cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular, la establecida en la Clausula Cuarta del contrato número CO1.PCCNTR.3697486 de 2022 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional e INTERPROYECT MY S.A.S.", Especificas del contratista – Numeral 8 que establece*: "Presentar informes periódicos mensuales de interventoría, donde se reporten cada uno de los contratos y/o las órdenes de compra provenientes de la ejecución del Convenio 0002 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Putumayo y GEOPARK Colombia S.A.S. detallando el avance para cada una de las obligaciones con las observaciones y recomendaciones necesarias para la ejecución correcta de estos contratos u órdenes o cuando el Ministerio de Educación Nacional los requiera"*

En cumplimiento de dichas obligaciones INTERPROYECT MY SAS ha realizado el seguimiento a las actividades desarrolladas de control, seguimiento y a las actividades (financieras, contables, administrativas, jurídicas y técnicas) tendientes a la correcta ejecución de las órdenes de compra, contratos, ordenes de servicio o todo aquel proceso que celebre el contribuyente GEOPARK COLOMBIA S.A.S., a fin de lograr la producción, distribución, entrega e instalación de los elementos de dotación y menaje que hacen parte del proyecto objeto de la Interventoría, en el marco de la ejecución del Convenio 002 de 2021 suscrito entre GEOPARK COLOMBIA S.A.S., el Departamento de Putumayo y el Ministerio de Educación Nacional desde la fabricación, distribución, entrega y hasta las verificaciones de campo; todo de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y sus actualizaciones, así como las dispuestas en el documento técnico del proyecto viabilizado.

A continuación, se presenta, el informe de las actividades y sucesos relevantes y determinantes en el desarrollo de la interventoría en el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022. Durante ese período, la Interventoría ejerció el seguimiento a las actividades contratadas por GEOPARK al proveedor Petro Ambiental. En cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Interventoría hizo verificaciones y recomendaciones al contratista in situ de: las Bodegas, el Centro de fabricación, el de adquisición para las entregas con el fin de asegurar las condiciones de calidad de los elementos de dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo. Con base en las obligaciones generales y específicas del objeto contractual los requerimientos exigidos se efectuaron con base en el manual de dotaciones escolares del MEN, el Anexo técnico de la Interventoría, la Matriz de necesidades por Instituciones Educativas y los requerimientos por Institución de la Gobernación del Putumayo y anexo técnico del Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019.

Objeto del Contrato sobre el cual se ejerce la Interventoría

Ejecutar el suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo - Colombia, de acuerdo con los alcances definidos en el código BPIN: 20200214000023; que se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, el Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto

1147 de 2020 y el Manual Operativo versión 2.0 (en adelante el "SERVICIO" o los "SERVICIOS" y/o el "SUMINISTRO" o los "SUMINISTROS") que le sean requeridos por GEOPARK.

En dicho contrato, el contratista es el responsable del suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán en las áreas urbana y rural del Departamento de Putumayo -Colombia. Lo anterior conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP. El proyecto está especificado con base en el diagnóstico de las Instituciones Educativas, las especificaciones técnicas y los parámetros establecidos en la Guía Orientadora para la compra de la dotación de modalidades de educación que se encuentra establecido en el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional; el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente, y los documentos que hacen parte del presente proceso y del proyecto aprobado bajo el código BPIN: 20200214000023. Igualmente, el Contratista coordina las entregas en el sitio de la Dotación con la Entidad Nacional Competente y las instituciones y Centros Educativos. El objeto incluye los planteamientos sobre cómo se ejecutará el objeto del proyecto y las acciones definidas para dar cumplimiento a lo allí establecido y lo planteado en el Convenio. La dotación debe asegurar, seguir y cumplir los lineamientos y parámetros definidos por la Entidad Nacional Competente y lo establecido en el banco de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP y las obligaciones establecidas en el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo. También deberá entregar la dotación en su totalidad a cada una de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, de acuerdo con la programación del plan de entregas aprobado por el Comité Técnico, verificadas las cantidades entregadas en sitio y sin inconsistencias por parte de la Interventoría asignada por el Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, el Contratista cumplirá con las responsabilidades designadas para la dotación de menaje que hacen parte del proyecto definidas en la normatividad vigente de Obras por Impuestos, las establecidas en el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo de Obras por Impuestos versión 2.0 emitido por la ART. o aquel que lo sustituya, complemente, actualice o modifique.

Objeto del Contrato de Interventoría

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de Dotación de Menaje para los Restaurantes Escolares de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo".

El contrato de Interventoría incluye el control, seguimiento y las actividades (financieras, contables, administrativas, jurídicas y técnicas) tendientes a la correcta ejecución de las órdenes de compra, contratos, ordenes de servicio o todo aquel proceso que celebre el contribuyente GEOPARK COLOMBIA S.A.S., a fin de lograr la producción, distribución, entrega e instalación de los elementos de dotación y menaje que hacen parte del proyecto "Dotación de MENAJE para los Restaurantes Escolares de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo", que se enmarca en la ejecución del Convenio 002 de 2021 suscrito entre GEOPARK COLOMBIA S.A.S., el Departamento de Putumayo y el Ministerio de Educación Nacional.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	31 de 0ctubre de 2022	**INFORME No.**	**4**

PERIODO No.	Octubre	**DEL**: 1 de octubre		**AL**: 31 de octubre	**2022**

OBJETO DEL CONTRATO:	*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	Suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo - Colombia, de acuerdo con los alcances definidos en el código BPIN: 20200214000023; que se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, el Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo versión 2.0 (en adelante el "SERVICIO" o los "SERVICIOS" y/o el "SUMINISTRO" o los "SUMINISTROS") que le sean requeridos por GEOPARK.
CONTRATO No.:	6000007311
CONTRATISTA:	PETROAMBIENTAL COLOMBIA LTDA
PLAZO INICIAL:	ocho (8) meses
FECHA DE INICIO:	(14) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de marzo de 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	9 meses
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 meses
VALOR INICIAL:	TRES MIL SETENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP) ($3.070.000.000).

CONTRATO DE:	Suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo - Colombia, de acuerdo con los alcances definidos en el código BPIN: 20200214000023; que se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, el Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo versión 2.0 (en adelante el "SERVICIO" o los "SERVICIOS" y/o el "SUMINISTRO" o los "SUMINISTROS") que le sean requeridos por GEOPARK.
VALOR ADICIONES:	0
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	TRES MIL SETENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP) ($3.070.000.000).

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.3697486 DE 2022 S
CONTRATISTA:	INTERPROYECT MY S.A.S.
PLAZO INICIAL:	8 meses más dos de liquidación
FECHA DE INICIO:	1 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de marzo de 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	8 meses más dos de liquidación
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 meses
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($996.508.197) M/CTE
VALOR ADICIONES:	0
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($618,342,772.49) MCTE incluido IVA

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

5. ACTIVIDADES DEL MES

Durante el período 1 al 31 de octubre el contratista proveedor realizó las siguientes actividades:

Continuaron ejecutándose los procesos de adquisición y fabricación de los elementos a entregar en la fase II, evaluando los riesgos cambiando para la ejecución de las entregas a realizar en el mes de noviembre en el marco del Proyecto, tal y como se aprobó en el Comité Técnico del 28 de octubre. Durante este mes, el contratista asistió al comité técnico y a los comités de seguimiento contratista – interventoría realizados quincenalmente, a los que fue invitado y convocado para realizar el seguimiento y presentar los informes que le fueron solicitados.

También presentó los avances de las entregas finales del mes de septiembre alcanzando el cumplimiento pleno de la primera fase programada en los procesos de distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las 168 Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo, Colombia. Esta primera fase equivale al 54% de entregas en los establecimientos educativos y del 59% de los elementos de dotación con destino a los restaurantes escolares. Para una eficaz labor de control, el Contratista suministró la información que requirió la Interventoría sobre los procesos de alistamiento y entregas de la finalización de la fase I y también sobre la fabricación, adquisición y ejecución de las entregas programadas para la fase II. Así mismo, mantuvo un diálogo constante con las diferentes partes vinculadas en el Convenio y ejecución del Proyecto, como lo demuestran las Actas de los comités técnicos del convenio y de seguimiento contratista – interventoría, disponibles en:

CARPETA INFORME 4 SUB – CARPETA – SUB – CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO
CARPETA INFORME 4– SUBCARPETA ACTAS COMITÉS DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

En los procesos de fabricación, adquisición y entrega de los elementos de menaje y equipos con destino a los restaurantes escolares, la Interventoría verifico in situ que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución del contrato. Igualmente, también implementó las acciones necesarias para asegurar la calidad y el cumplimiento de los parámetros de la entrega, logística y transporte de los elementos de la dotación de menaje para los restaurantes escolares, labor que se efectuará con la verificación de la Interventoría para 77 sedes restantes para la segunda fase, sobre el total de las 168 Instituciones y Centros beneficiaros establecidos en el Contrato. Igualmente, en los procesos de fabricación, adquisición y entrega de los elementos y equipo para los restaurantes escolares de las 77 sedes de las instituciones educativas donde se verificaron los procesos y características de los elementos a entregar en la segunda fase. Durante las visitas a la fábrica en donde se elaboran las cocinas a gas y los estantes metálicos se registraron las siguientes observaciones de carácter técnico:

- **Mesa plegable de cafetería:** se realiza la observación de la resistencia y el sistema plegable de las mesas, se presenta una mesa mejorada en su estructura que brinda mayor

capacidad de resistencia y sistema de pliegue, para lo cual se hacen pruebas de resistencia y peso.

- **Estufa de gas de tres quemadores:** se realiza observación referente al acabado en acero que presenta sus bordes, los cuales son señalados por parte del Ingeniero Juan Carlos Salazar Ingeniero Técnico de Planta a cargo de interventoría, el fabricante procede a realizar nuevamente soldadura y perfecciona los acabados a la muestra presentada, los cuales una vez valorados se aceptan para proceder a la producción.

- **Sistema de seguridad para suministro de gas:** se realizan las observaciones de las fallas encontradas y se determina que por seguridad en su funcionamiento la estufa debe salir de la fábrica con todos los accesorios instalados, soldados y con sellante Industrial recomendado para este tipo de sistema.

- **Estante de depósito:** se realizará la corrección a los ángulos de seguridad que actualmente tienen para su instalación buscando minimizar el riesgo de esquinas cortantes.

Los anteriores hallazgos quedaron como compromisos para ser verificados tanto en los despachos como en su llegada a las bodegas de Curillo y Puerto Guzmán, para ser embalados y hacer efectivas las entregas.

El detalle de las observaciones y los compromisos se encuentran disponibles en la siguiente Acta, cuyas actividades se realizaron en octubre, pero se firmó el 2 de noviembre, disponible en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA ACTAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

A la fecha de este Informe, se encuentran vigentes las pólizas de seguro que amparan la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio del que se deriva el contrato de proveeduría y las garantías propias de los elementos de dotación a entregar. Las pólizas fueron aprobadas con base en las especificaciones de los beneficiarios y asegurados los cuales son las Instituciones educativas y el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, está vigente la póliza de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio del que se deriva el contrato de la dotación. Estos documentos están disponibles en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CONTRATO ÓRDENES DE COMPRA – CARPETA PÓLIZAS PETROAMBIENTAL – GEOPARK

Durante el período del presente Informe no hubo actualizaciones o modificaciones al contrato derivadas de Convenio 0002 de 2021 en cuanto al plazo de ejecución, valores asignados u otros.

De manera conjunta con la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y la Entidad Nacional Competente, en el Comité Técnico del Convenio se aprobó el cronograma de la fase II. Ver el Acta No. 19 sobre el Informe sobre el Cronograma aprobado para la segunda fase se encuentra disponible en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO

La siguiente ilustración No. 1 muestra el comportamiento de las actividades cumplidas frente a la planeación por el contratista para el período del presente Informe. Como se puede apreciar las actividades del mes de octubre se concentraron en el alistamiento de la segunda fase, completando así un 77% del avance en la ejecución del contrato.

Ilustración 1 Avance de Actividades Contratista Proveedor

	PERIODO			
ACTIVIDADES	1 - 30 JULIO 20%	1 - 31 AGOSTO 30%	1 - 30 SEPTIEMBRE 54%	1 - 31 OCTUBRE 77%
PLANEACIÓN				
ADQUISICIÓN Y FABRICACIÓN				
ACOPIO ALISTAMIENTO ENTREGAS		PRIMERA FASE		SEGUNDA FASE
ENTREGAS 1a Fase Curillo - Puerto Guzmán		PRIMERA FASE	FINAL PRIMERA FASE	
ENTREGAS 2a Fase Curillo - Puerto Guzmán				
LIQUIDACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				

5.1. Seguimiento al plan de compras

NA: Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Sin embargo, la Interventoría ha revisado el documento denominado Plan de Calidad Dotación de Menaje suministrado por el contratista, en el cual a partir de la página 13 se encuentra la descripción completa del proceso que el contratista implementa para la adquisición de los elementos objeto del contrato. Este documento se encuentra disponible en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA PLAN DE COMPRAS

5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

El cronograma se ha cumplido a cabalidad y sin ningún retraso, tanto en lo planeado como en la fabricación, adquisición, alistamiento en bodegas y logística de transporte verificando in situ en las bodegas de Curillo y Puerto Guzmán que todo el alistamiento y de los elementos a

despachar cumplan con las especificaciones del contrato y de las observaciones de la Interventoría en la fábrica.

Ilustración 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y EN PROCESO

	CRONOGRAMA GENERAL					
	SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA: DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO					
ACTIVIDAD	CRONOGRAMA					
	OCTUBRE					
	1	2	3	4		
Formalización Contractual con los Proveedores.	x					
Fabricación, Verificación y Logística de Producción y Abastecimiento.		x	x	x		
Logística y Transporte de los Insumos/Menaje y demás elementos, desde la ubicación de los proveedores hacia los dos puntos de acopio localizados en Puerto Guzmán (Putumayo) y Curillo (Caquetá).	x	x	x	x		

Como lo muestran las ilustraciones anteriores 1 y 2, el cumplimiento de la fase de logística y alistamiento permitirán implementar la fase II, de acuerdo con el Cronograma aprobado por el Comité técnico el pasado 28 de octubre.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Como se indicó en los Informes Nos. 2 y 3 el avance financiero del contrato no se está haciendo por mes sino por las fases del cronograma. A la fecha del presente Informe se ha cumplido en su totalidad la primera fase de entregas y la segunda fase de entregas está aprobada por el Comité Técnico para iniciar el próximo 21 de noviembre, de tal manera que los valores del avance financiero del Contrato del Proveedor se mantienen sin modificación a la fecha de este Informe.

Ilustración 3 PROGRAMACIÓN FASES DE ENTREGAS

PROGRAMACIÓN ENTREGAS POR FASES
EJECUCION 1ERA FASE (14/07/2022 al 30/09/2022)
EJECUCIÓN 2DA FASE (08/11/2022 al 25/11/2022)

Ilustración 4 Avance Financiero Contratista Proveedor

GEOPARK

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PROVEEDOR

PTA

PROYECTO: DOTACION DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			*AVANCE FINANCIERO*		
VALOR UNITARIO SIN IVA COP	VALOR TOTAL SIN IVA COP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL SIN IVA COP	$ 2,685,000,000		19,926	1,586,293,752	59%
VALOR TOTAL IVA	$ 510,150,000			301,395,813	59%
LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 385,000,000			227,150,000	59%
VALOR TOTAL SIN IVA más LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 3,070,000,000			1,813,443,752	
VALOR EJECUTADO PRIMERA FASE DE ENTREGAS	$				2,114,839,565

Como lo muestra la ilustración No. 4 el contratista proveedor a la fecha presenta una ejecución invariable equivalente al 59% de las entregas en el 54% de las instituciones, manteniendo la ejecución del avance financiero dentro del presupuesto aprobado.

A la fecha de este Informe No. 4, la Interventoría emitió aprobación al Contratista proveedor para los pagos del presupuesto ejecutado. Al concepto se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CONCEPTOS CUARTO INFORME

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

A la fecha de este Informe la Interventoría presenta la siguiente ejecución una vez transcurridos cuatro (4) meses de ejecución y el 54% de las visitas previstas realizadas, lo cual se soportó con las Actas de las visitas de verificación, adjuntas con el Informe No. 3:

Ilustración 5 Avance y Ejecución Financiera Contrato de Interventoría

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	PAGO COSTOS FIJOS (SERVICIOS PERSONALES)	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL
PERIODO Informe 1	JULIO 1 AL 31		$32.22852440	$32.22852440		
PERIODO Informe 2	AGOSTO 1 AL 31		$32.22852440	$32.22852440		
PERIODO Informe 3	SEPTIEMBRE 1 AL 30		$32.22852440	$0.00		
PERIODO Informe 4	OCTUBRE 1 AL 31		$32.22852440	$0.00		
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$257.82825600	$128.91409760	$64.45704880	$64.45704880	$128.91415840
	PAGOS COSTOS VARIALES (VISITAS TÉCNICAS)	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL
Primer pago Parcial 25%	Visitas 42 sedes, del 25 al 31 de agosto de acuerdo al cronograma		$82.96679958	$0.00	$82.96679958	
Segundo pago Parcial 25%	Visitas 42 sedes, del 1 al 30 de septiembre de acuerdo al cronograma		$82.96679958	$0.00	$82.96679958	
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$331.86700008	$165.93359916	$165.93359916	$165.933400920	
TOTAL CONTRATO	PRESUPUESTO TOTAL	$618.34277249	$165.93359916	$165.93359916	$0.00	$452.40917333
TOTAL PAGOS 1 Y 2	COSTOS FIJOS MAS COSTOS VARIABLES		$ 165.93359916	$0.00	$64.45704880	$553.88572369

El cuadro anterior Ilustración No. 5 muestra la relación con los valores ejecutados y los saldos por pagar a la Interventoría frente al valor total del Contrato. La facturación correspondiente al presente Informe No. 4 se basa en los resultados alcanzados en sus obligaciones cumplidas con base en los valores ejecutados establecidos en el contrato.

El cuadro anterior describe los pagos a autorizar por parte del Ministerio de Educación, con base en lo estipulado en las cláusulas: SÉPTIMA FORMA DE PAGO Costos Fijos del Contrato y Costos Variables de las Visitas Técnicas de entregas. Los valores del cuadro en los rubros de costos fijos corresponden a los Informes presentados por las labores realizadas en el primero, segundo, tercero y cuarto mes del Contrato CO1.PCCNTR.3697486 DE 2022 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional e INTERPROYECT MY S.A.S.

El cuadro muestra la relación con los valores ejecutados y los saldos por pagar a la Interventoría frente al valor total del Contrato. La facturación correspondiente al presente Informe se basa en los resultados alcanzados en sus obligaciones con base en los valores ejecutados. Como se puede observar, a la fecha de este Informe la Interventoría ha ejecutado por concepto de costos fijos los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y sólo ha recibido el pago de los meses de julio y agosto por este concepto, quedando pendiente el pago de los meses de septiembre y octubre en cuanto a costos fijos se refiere. En relación con los costos variables de las visitas, las visitas que aparecen pagadas corresponden al trabajo realizado en la última semana de agosto y el mes de septiembre. Las restantes 77 visitas de la fase II se ejecutarán a partir del 23 de noviembre cuando inicie la segunda fase de entregas, de acuerdo con el

cronograma aprobado por el comité técnico y se completará un total de 168 visitas programadas y contratadas. Los conceptos emitidos por el Ministerio para los pagos recibidos por las visitas realizadas se encuentran disponibles en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB – CARPETA CONCEPTOS CUARTO INFORME – SUBCARPETA APROBACIÓN INFORMES Y PAGOS INTERVENTORÍA

5.5 Informes semanales

No se han presentado Informes semanales de entregas para el periodo del Informe No. 4

5.6 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría y dado que no se han presentado novedades durante el periodo del presente Informe No. 4 a continuación se presenta la ilustración 6 en donde se reportan en detalle cada uno de los contratos y/o las órdenes de compra provenientes de la ejecución del Contrato con el proveedor al tenor del Convenio 0002 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Putumayo y GEOPARK Colombia S.A.S. La tabla muestra con claridad, los ítems contratados, las cantidades y los valores ejecutados, las cantidades y valores por ejecutar. De acuerdo con la fase de ejecución programada, a la fecha de este Informe se presentó la primera factura para pago por parte del Contratista Proveedor, sobre la cual se emitió concepto aprobatorio, disponible en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB – CARPETA CONCEPTOS CUARTO INFORME

Para el periodo del presente Informe, no hay observaciones y recomendaciones ya que el contrato del proveedor se viene ejecutando durante el mes de octubre en el componente de alistamiento y organización logística para la ejecución de la Fase II de las entregas, de acuerdo con el Cronograma aprobado por el Comité técnico del 28 de octubre.

Ilustración 6 Ejecución Adquisiciones Proveedor

ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS Y MENAJE SEGUN RES. 29452 DE 2017	UNIDAD	Cantidas contratada	VALOR TOTAL SIN IVA COP	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
1	Balanza Gramera De mesa, máximo de 10 gramos de sensibilidad. Mecánica o digital.	Und.	92	$ 32,882,916	49	17,513,727	43	$ 15,369,189
2	Balde plástico (12 litros)	Und.	152	$ 1,961,104	85	1,096,670	67	$ 864,434
3	Bandeja plástica (Extragrande)	Und.	195	$ 1,576,380	94	759,896	101	$ 816,484
4	Caldero (50X30)	Und.	144	$ 41,927,760	78	22,710,870	66	$ 19,216,890
5	Canastilla plástica (60x40x13)	Und.	202	$ 5,177,058	96	2,460,384	106	$ 2,716,674
6	Cepillo de mano cerdas duras	Und.	168	$ 815,136	97	470,644	71	$ 344,492
7	Cepillo largo cerdas duras	Und.	167	$ 2,331,153	96	1,340,064	71	$ 991,089
8	Cernidor aluminio (Normal)	Und.	161	$ 4,290,489	80	2,131,920	81	$ 2,158,569
9	Colador plástico (grande)	Und.	160	$ 4,630,080	77	2,228,226	83	$ 2,401,854
10	Congelador 1 puerta 15 pies - Capacidad 70 Kilos	Und.	3	$ 4,742,481	2	3,161,654	1	$ 1,580,827
11	Congelador 1 puerta 5pies-Capacidad 30 Kilos	Und.	33	$ 45,436,545	15	20,652,975	18	$ 24,783,570
12	Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco	Und.	221	$ 1,748,110	117	925,470	104	$ 822,640
13	Cuchara sopera	Und.	3674	$ 9,736,100	1673	4,433,450	2001	$ 5,302,650
14	Cuchillo cocina para cortar carne	Und.	180	$ 13,146,840	104	7,595,952	76	$ 5,550,888
15	Cuchillo cocina para cortar verdura	Und.	183	$ 6,106,710	108	3,603,960	75	$ 2,502,750
16	Cuchillo cocina para pelar papa	Und.	142	$ 2,018,246	76	1,080,188	66	$ 938,058
17	Escoba plástica grande	Und.	230	$ 3,891,600	129	2,182,680	101	$ 1,708,920
18	Esponja abrasiva	Und.	264	$ 1,228,392	132	614,196	132	$ 614,196
19	Esponja plástica para el lavado de ollas.	Und.	265	$ 1,438,685	133	722,057	132	$ 716,628
20	Estante de depósito	Und.	132	$ 32,757,120	64	15,882,240	68	$ 16,874,880
21	Estufa de gas lineal - tres quemadores	Und.	140	$ 321,337,940	76	174,440,596	64	$ 146,897,344
22	Estufa enana- Un quemador	Und.	4	$ 4,171,361	1	1,042,840	3	$ 3,128,521
23	Jarra plástica (1 o 2 litros)	Und.	255	$ 1,991,295	121	944,889	134	$ 1,046,406
24	Legumbrera	Und.	120	$ 9,495,000	57	4,510,125	63	$ 4,984,875
25	Licuadora Industrial	Und.	6	$ 7,430,700	4	4,953,800	2	$ 2,476,900
26	Licuadora no industrial	Und.	57	$ 36,445,116	21	13,427,148	36	$ 23,017,968
27	Manguera de gas*	Und.	106	$ 2,311,648	49	1,068,592	57	$ 1,243,056
28	Mesa de cafetería plegable	Und.	347	$ 158,768,115	228	104,320,260	119	$ 54,447,855
29	Nevera de 336 litros o 12 pies	Und.	51	$ 96,037,080	19	35,778,520	32	$ 60,258,560
30	Nevera de 512 litros o 19 pies	Und.	7	$ 23,682,078	2	6,766,308	5	$ 16,915,770
31	Olla (aluminio recortado) (# 32 o 24 litros)	Und.	260	$ 21,293,480	139	11,383,822	121	$ 9,909,658
32	Olla (aluminio recortado) (# 36 o 36 litros)	Und.	189	$ 19,347,174	92	9,417,672	97	$ 9,929,502
33	Olla (aluminio recortado) (# 40 o 50 litros)	Und.	70	$ 17,519,250	30	7,508,250	40	$ 10,011,000
34	Olla a presión (10 litros)	Und.	166	$ 32,440,716	88	17,197,488	78	$ 15,243,228
35	Olleta (3 litros)	Und.	225	$ 4,124,250	97	1,778,010	128	$ 2,346,240
36	Paila (46 cms)	Und.	189	$ 12,880,350	112	7,632,800	77	$ 5,247,550
37	Pinzas (Grande)	Und.	138	$ 3,142,536	78	1,776,216	60	$ 1,366,320
38	Pipeta de gas de acuerdo a la capacidad del servicio*	Und.	132	$ 72,419,028	0	-	132	$ 72,419,028
39	Plato (para seco)	Und.	4306	$ 23,420,334	2305	12,536,895	2001	$ 10,883,439
40	Plato (para sopa)	Und.	4306	$ 35,184,326	2305	18,834,155	2001	$ 16,350,171
41	Pocillo	Und.	3505	$ 33,963,450	1935	18,750,150	1570	$ 15,213,300

ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS Y MENAJE SEGUN RES. 29452 DE 2017	UNIDAD	Cantidas contratada	VALOR TOTAL SIN IVA COP	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
42	Punto ecológico Tres (03) canecas	Und.	126	$ 47,013,624	84	31,342,416	42	$ 15,671,208
43	Rallador de acero inoxidable (Corriente)	Und.	146	$ 4,015,438	77	2,117,731	69	$ 1,897,707
44	Regulador de gas*	Und.	120	$ 3,998,160	63	2,099,034	57	$ 1,899,126
45	Sillas de cafetería	Und.	2555	$ 202,330,450	1603	126,941,570	952	$ 75,388,880
46	Tabla acrílica para picar (Grande)	Und.	120	$ 7,233,360	84	5,063,352	36	$ 2,170,008
47	Tabla acrílica para picar (Mediana)	Und.	91	$ 4,688,411	58	2,988,218	33	$ 1,700,193
48	Tenedor mesa	Und.	2396	$ 6,550,664	1366	3,734,644	1030	$ 2,816,020
49	Tina plástica grande	Und.	110	$ 4,032,600	54	1,979,640	56	$ 2,052,960
50	Tina plástica o mediana	Und.	167	$ 3,532,050	103	2,178,450	64	$ 1,353,600
51	Vaso	Und.	4141	$ 13,814,376	2295	7,656,120	1846	$ 6,158,256
52	Asador antiadherente	Und.	115	$ 13,490,880	71	8,329,152	44	$ 5,161,728
53	Balde grande de plástico con tapa	Und.	186	$ 5,452,404	122	3,576,308	64	$ 1,876,096
54	Batidor de chocolate	Und.	*140*	$ 2,220,820	62	983,506	78	$ 1,237,314
55	Botiquin	Und.	120	$ 17,495,280	67	9,768,198	53	$ 7,727,082
56	Cucharero	Und.	162	$ 5,002,398	105	3,242,295	57	$ 1,760,103
57	Cuchillos para comedor	Und.	1984	$ 5,162,368	1049	2,729,498	935	$ 2,432,870
58	Docena de limpiones	Und.	165	$ 4,373,820	94	2,491,752	71	$ 1,882,068
59	Ensaladera	Und.	128	$ 6,114,688	75	3,582,825	53	$ 2,531,863
60	Escurridor en acero inoxidable	Und.	92	$ 23,782,000	57	14,734,500	35	$ 9,047,500
61	Escurridor para freir	Und.	116	$ 3,009,504	71	1,842,024	45	$ 1,167,480
62	Espumadera de aluminio fundido (Pequeña)	Und.	101	$ 2,401,275	58	1,378,950	43	$ 1,022,325
63	Exprimidor manual	Und.	100	$ 3,751,100	56	2,100,616	44	$ 1,650,484
64	Extintores	Und.	105	$ 34,890,450	63	20,934,270	42	$ 13,956,180
65	Filtro purificador para agua- Comunitario	Und.	94	$ 276,721,430	52	153,079,940	42	$ 123,641,490
66	Juego de ollas	Und.	136	$ 23,268,784	88	15,056,272	48	$ 8,212,512
67	Juego de tarros para remesa	Und.	193	$ 12,381,915	108	6,928,740	85	$ 5,453,175
68	Mesa de trabajo - procesamiento	Und.	89	$ 159,179,882	56	100,158,128	33	$ 59,021,754
69	Molino (manual)	Und.	100	$ 12,335,200	60	7,401,120	40	$ 4,934,080
70	Olla arrocera grande	Und.	80	$ 81,216,000	59	59,896,800	21	$ 21,319,200
71	Platero plástico con tapa	Und.	153	$ 7,280,964	100	4,758,800	53	$ 2,522,164
72	Pomas de cinco galones	Und.	120	$ 1,491,840	77	957,264	43	$ 534,576
73	Recipiente de plastico de 1000lts	Und.	47	$ 28,633,951	19	11,575,427	28	$ 17,058,524
74	Recogedor de basura de plástico	Und.	177	$ 2,271,087	101	1,295,931	76	$ 975,156
75	Sarten antiadherent grande	Und.	119	$ 8,305,605	82	5,723,190	37	$ 2,582,415
76	Sarten antiadherente mediano	Und.	123	$ 7,630,920	72	4,466,880	51	$ 3,164,040
77	Soporte para estufa	Und.	19	$ 1,137,682	15	898,170	4	$ 239,512
78	Soporte para nevera	Und.	51	$ 3,053,778	36	2,155,608	15	$ 898,170
79	Tanque 500 litros para almacenar agua	Und.	84	$ 38,532,480	59	27,064,480	25	$ 11,468,000
80	Termo	Und.	91	$ 7,417,592	50	4,075,600	41	$ 3,341,992
81	Procesador de alimentos	Und.	22	$ 4,627,150	6	1,261,950	16	$ 3,365,200
82	Cafetera Greca Institucional	Und.	9	$ 1,461,888	4	649,728	5	$ 812,160
83	Filtro purificador para agua- Familiar	Und.	74	$ 23,761,696	40	12,844,160	34	$ 10,917,536
84	Nevera solar de 220 litros	Und.	49	$ 404,685,904	41	338,614,736	8	$ 66,071,168

Como se observa, la ilustración No. 6 presenta la relación de adquisiciones contratadas, ejecutadas y lo que queda por ejecutar en relación con las entregas, tanto en cantidades de elementos como en valor, con lo cual se evidencia que el contratista proveedor se mantiene dentro del presupuesto aprobado.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

6.1. Plan de Calidad

Con base en el Plan de Calidad propuesto por el Proveedor, la Interventoría observa que ha venido cumpliendo con este Plan a la luz de las especificaciones técnicas del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y sus actualizaciones, los requerimientos de la entidad certificada, la matriz de necesidades por institución, lo dispuesto en el anexo técnico de la Interventoría y el Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019. A partir de la página 13 del documento Plan de Calidad de Dotación de Menaje, se presentan los procesos que ha seguido el Contratista para cumplir con las compras, las cuales se presentan en la ilustración 6, en donde se verifica el resultado de la aplicación por parte del Contratista de los procedimientos del plan de compras (página 13 y ss) la anterior ilustración 6 permite observar el número de unidades contratadas, los valores de adquisición, las cantidades ejecutadas a la fecha junto con los valores también a ejecutar, como se muestra también en la ilustración 4 , del avance financiero del contratista proveedor.

El documento Plan de Calidad de Dotación de Menaje, en donde a partir de la página 13 están los procesos de compras se puede acceder en el siguiente en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB – CARPETA PLAN DE COMPRAS

6.1.1. Control de inspección y verificaciones:

El equipo de Interventoría realizó inspecciones, verificaciones y pruebas técnicas a uno por uno de los elementos a entregar verificando sus características, la existencia de manuales, garantías y embalajes adecuados. Los elementos se revisaron acopiados en las 6 bodegas por paquete de destinación desde donde se realizarán los despachos desde los centros de acopio previstos en las poblaciones de Curillo y Puerto Guzmán en cumplimiento de la fase II a partir del 21 de noviembre. Los paquetes para despachos y entregas a las Instituciones Educativas fueron verificados en la medida que llegan desde Bogotá y Neiva de los centros de fabricación y adquisición con presencia del Equipo de campo de la Interventoría. Esta verificación se registró en cada una de las Bodegas, sitios de adquisición contratadas por el Proveedor y en las sedes de las Instituciones Educativas beneficiarias del proyecto. De estas verificaciones también dan cuenta las Actas de los comités de seguimiento contratista – interventoría correspondientes al mes de octubre, disponibles en:

CARPETA INFORME 4– SUBCARPETA ACTAS COMITÉS DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

También ver:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA ACTAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SUBCARPETA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA VERIFICACIÓN CENTROS DE ACOPIO

6.2. Plan de gestión de riesgos:

NA. Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Sin embargo, la Interventoría verificó que los riesgos potenciales asociados cuando inicien las entregas el próximo 21 de noviembre.

6.3. Plan ambiental:

NA. Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Sin embargo, la Interventoría verifica que el contratista y sus subcontratistas, en los bienes fabricados y adquiridos para entrega e instalación en la fase II, vienen dando cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre seguridad industrial, salud ocupacional, protección ambiental, prevención y control de incendios.

5.7 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría a la fecha de este Informe no se han suscrito los contratos y/o las órdenes de compra adicionales ya que todo el proceso de fabricación y adquisiciones se contrató por parte del contratista proveedor desde la primera fase, lo cual se registró en los Informes 2 y 3. Para este período no hay novedades en los ítems contratados, las cantidades y los valores a ejecutar. A la fecha no hay observaciones y recomendaciones ya que el proveedor finalizó las entregas de la primera fase y procedió a iniciar la planeación y alistamiento de la fase II

A los documentos se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB – CARPETA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA

A la fecha no hay observaciones y recomendaciones para esta fase de planeación y alistamiento de la fase II la cual se viene cumpliendo de forma normal.

Obligaciones Técnicas:

a. **Planeación para la ejecución del proyecto:** Durante el período del presente Informe se han desarrollado actividades que estaban planeadas desde el mes de julio.
b. **Ejecución del proyecto:** se vienen desarrollando las actividades de alistamiento y logística para la fase II de las entregas.
c. **Obligaciones Administrativas:** Se han venido sorteando eficazmente los riesgos de orden público y de desplazamiento por las condiciones climáticas, asociados a la llegada a las Bodegas centros de acopio de Curillo y Puerto Guzmán de las elementos fabricados y adquiridos en Bogotá y la ciudad de Neiva para los despachos y entregas.
d. Asistió a las reuniones del Comité técnico del mes de octubre. (VER ACTA Comité Técnico No. 19)
e. A la fecha de este Informe se completó la Fase I de entregas y se está en el proceso de alistamiento y disposición logística para la fase II de las entregas.
f. Durante el período de este Informe, el Contratista mantuvo contacto permanente vía la Gerencia del proyecto y de la Interventoría y directamente en los comités de seguimiento contratista – Interventoría. (ver Actas Comités de seguimiento 7 y 8)
g. Las pólizas se encuentran vigentes.
h. No se han presentado observaciones para el cambio de las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir y entregar.
i. El contratista proveedor viene atendiendo en tiempo real las observaciones que el Ingeniero técnico de planta y los técnicos de campo realizan frente a lo que va llegando y se va embalando para las entregas. Como son muy pocas las observaciones, son de forma y fácilmente subsanables en tiempo real no se justifica el levantamiento de actas ya que el contratista cuenta con la capacidad de subsanar de forma inmediata.

7. CONTROL DE PERSONAL

Contrato Objeto de Interventoría

Personal	Profesionales	Dedicación	Procedencia
Gerente Contrato	Mayor ® Carlos García	Tiempo Completo	Huila
Coordinador HSE Contrato	Ing Carol Bermeo	Tiempo Completo	Huila
Apoyo Contrato	Pedag. Inf. Nathalia Moncayo	Tiempo Completo	Putumayo
Apoyo Contrato	Angel Javier Villota Quintero	Tiempo Completo	Putumayo
Apoyo Contrato	Jhon Eduard Castro Nupan	Tiempo Completo	Putumayo
Apoyo Contrato	Gloria Eunice Bravo Chamorro	Tiempo Completo	Putumayo

La Interventoría corroboró que el Contratista proveedor durante el mes de octubre mantuvo el equipo necesario y suficiente para atender todas las labores que se derivan de la operación del Contrato.

Contrato de Interventoría

Personal	Profesionales	Dedicación	Procedencia
Director	Delfín Soto Chaves	Tiempo Completo	Bogotá
Coordinador de Campo	Andrés Zapata	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de Planta	Ing. Juan Carlos Salazar	Tiempo Completo	Bogotá
Técnico de campo 1	Vanessa Mora	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 2	Cristian Camilo Mejía	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 3	Sebastián Rangel	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 4	Sandra Mavisoy	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 5	Sebastián Dorado	Tiempo Completo	Putumayo
Profesional Jurídico	José David Martínez	Cuarto de tiempo	Bogotá
Profesional administrativo	Andrea Cruz	Cuarto de tiempo	Bogotá
Auxiliar Administrativo	Carmen Julia Martínez	Tiempo Completo	Bogotá
Apoyo Oficina	Fabián Márquez	Tiempo completo	Bogotá

Durante el período del presente Informe, la Interventoría continúa con el personal de campo desde el inicio del contrato.

8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Contrato Objeto de Interventoría

La Interventoría ha verificado el cumplimiento de esta obligación contractual mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal, a la cual se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Contrato de Interventoría.


La Interventoría ha cumplido con esta obligación contractual mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal, a la cual se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

9. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

A la fecha del presente Informe, no se han presentado novedades en el balance, en la siguiente ilustración se muestra el balance presupuestal del contrato del proveedor, tanto en lo que el Contratista ha gastado y facturado frente al valor total presupuestado. A la fecha de este Informe no ha habido ajustes, adiciones o modificaciones de ítems o cambios de precios.

Ilustración 7 BALANCE PRESUPUESTAL

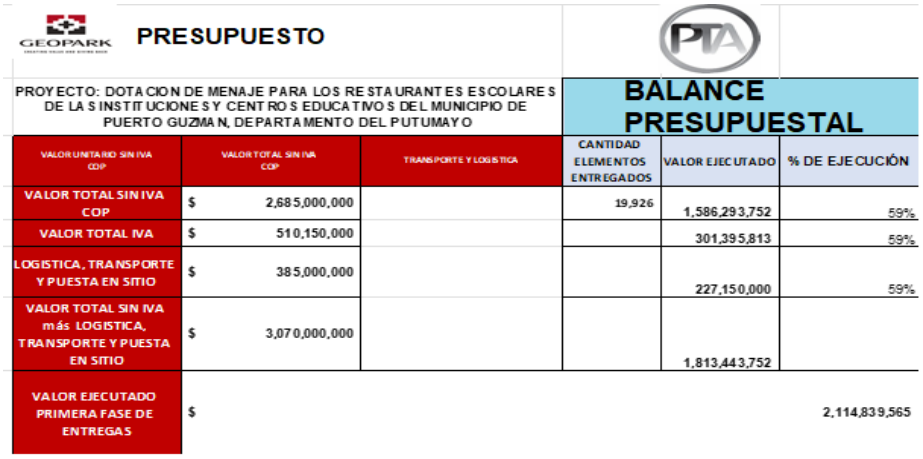

GEOPARK **PRESUPUESTO**

PTA

PROYECTO: DOTACION DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR UNITARIO SIN IVA COP	VALOR TOTAL SIN IVA COP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL SIN IVA COP	$ 2,685,000,000		19,926	1,586,293,752	59%
VALOR TOTAL IVA	$ 510,150,000			301,395,813	59%
LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 385,000,000			227,150,000	59%
VALOR TOTAL SIN IVA más LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 3,070,000,000			1,813,443,752	
VALOR EJECUTADO PRIMERA FASE DE ENTREGAS	$				2,114,839,565

10. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

A la fecha del presente Informe las pólizas aprobadas, tanto del contrato del proveedor como de la Interventoría se encuentran vigentes y disponibles en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA - CARPETA PÓLIZAS PETROAMBIENTAL GEOPARK – PÓLIZAS INTERVENTORÍA

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101382445	Seguros del Estado	Cumplimiento y Calidad	12/032022-09/08/2023	$44.248.000	11/08/2022	15/08/2022
21-45-101382269	Seguros del Estado	Salarios y bienes	14/082022-09/03/2026	$1.228.000.000	24/08/2022	28/09/2022
21-40-101194645	Seguros del Estado	Responsabilidad civil extracontractual	14/08/2022-14/06/2023	$614.000.000	24/ 08/2022	28/09/2022

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
14-44-101152274	Seguros del Estado	Seriedad de la Oferta	25/04/2022	$ 99,650,820.00	20/04/2022	25/05/2022
14-44-101155918	Seguros del Estado	Cumplimiento salarios y calidad	15/06/2022 - 15 04 2026	$340,088,524.87	29/06/2022	2/07/2022

11. COMITÉS TÉCNICOS DEL CONVENIO

La siguiente relación muestra que los Comités Técnico del Convenio los cuales se han cumplido cada 30 días desde el inicio del contrato. En el mes del presente Informe se realizó 1 Comité el 28 de octubre de aprobación del cronograma de entregas de la fase II.

Las temáticas permiten observar que el Comité técnico ha estado enterado permanentemente de la ejecución del Contrato y sobre todo de las entregas y verificaciones de la Interventoría. Las actuaciones se han surtido oportunamente de acuerdo con los requerimientos del Contratista, la Interventoría, Contribuyente, Gerencia del Proyecto y la entidad certificada, Gobernación del Putumayo. A la fecha se encuentran cumplidos todos los compromisos que han surgido en los Comités, cuyas actas se pueden acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO

Ilustración 8 RELACIÓN COMITÉS DE SEGUIMIENTO

RELACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO				
PERIODO	**TEMA**	**ASISTENTES**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**
28/10/2022	1- Verificación del Quorum 2 2- Revisión de compromisos Comité No. 18 del 16 de septiembre de 2022 3 3- Revisión del cronograma de entregas 4 4- Valla publicitaria del Proyecto 5 5- Solicitud de la I.E. IEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX. 6 6- Proposiciones y varios 7 7- Registro y lectura de proposiciones	1. GeoPark 2.Gerente de proyecto 3. Secretaría de educación departamental. 4. Ministerio de educación 5. Interventoría	Instalar la valla publicitaria de acuerdo con los lineamientos del MEN noviembre 2022 GeoPark Emitir la póliza del Otrosí del Convenio junto con el recibo de pago noviembre 2022 GeoPark Dar respuesta al rector de la sede educativa IEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX. noviembre 2022 GeoPark Reunión para revisar las obligaciones que tiene la Entidad Nacional Competente y la Entidad Territorial Certificada en el marco del presente Convenio	1. GeoPark 2.Gerente de proyecto 3. Secretaría de educación departamental. MEN – Secretaría de Educación Departamental de Putumayo

12. COMITÉS DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

Adicional al comité técnico del Convenio la Interventoría, al tenor de las obligaciones administrativas, numeral 18, ha realizado comités de seguimiento contratista Interventoría cada 15 días, con el fin de reportar y verificar los avances del contrato y sus procesos, realizar observaciones, requerimientos, compromisos y recomendaciones, que han contribuido al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra o de los contratos. Durante el período del presente Informe, se verificaron las revisiones en planta y en bodega. También Se verificó que el alistamiento y la logística de los centros de acopio estuviera de acuerdo con las características de los elementos a enviar a cada institución educativa y que los medios de transporte fueran los adecuados dentro de las restricciones que ofrece la zona. Se revisaron los paquetes a entregar institución por institución educativa y se autorizaron los despachos a partir del 21 de noviembre conforme al cronograma aprobado por el Comité técnico. La

Interventoría y el Contratista acordaron que el acompañamiento se realizará de manera simultánea con las entregas para cumplir con todo el cronograma aprobado y que directamente con los Rectores de cada sede educativa se verificaran los elementos entregados y se suscribieran las Actas de entrega y recibo sobre el terreno.

A las actas se puede acceder en:

Ver CARPETA INFORME 4 SUB – CARPETA ACTAS COMITÉS DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

13. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

HOJA DE CONTROL
CORRESPONDENCIA OCTUBRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**NÚMERO DE CONTRATO:6000007311 AÑO DEL CONTRATO:2022**
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE	

ITEM	COD	TIPO DOCUMENTAL	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO	SOPORTE	FORMATO	TAMAÑO MB	FOLIOS INICIAL	FOLIO FINAL	CANTIDAD DE FOLIOS	OBSERVACIONES
15		RESPUESTA SOLICITUD COMUNIDAD INDÍGENA	10/12/2022		digital	PDF	318 KB	1	3	3	
16		AUTORIZACION 1 PAGOS AL CONTRATISTA	10/13/2021		digital	PDF	239 KB	1	2	2	

Los Oficios de la correspondencia se pueden acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CORRESPONDENCIA INFORME 4

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En la siguiente subcarpeta del Informe 4 se coloca a disposición el registro fotográfico de las verificaciones en la fábrica y en las bodegas realizadas correspondientes al período de este contrato:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA VERIFICACIÓN CENTROS DE ACOPIO

15. CONCLUSIONES

Durante el período comprendido del presente Informe, la Interventoría en sus campos de acción Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Social, Ambiental y Jurídico, ha continuado realizando una gestión por procesos, buscando asegurar la calidad de los resultados desde el inicio de las actividades. Se ha actuado de forma preventiva y correctiva en tiempo real, prospectando de acuerdo con la planeación de las actividades y en ejecución las acciones más efectivas para el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados en el componente de alistamiento y organización logística para las entregas y verificaciones previstas en la fase II de entrega a las sedes educativas de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del municipio de puerto guzmán, Departamento de Putumayo.

Los controles han sido precisos en términos de la metodología de verificaciones uno a uno en la fábrica. Centros de adquisición en las bodegas, centros de acopio de Curillo y Puerto Guzmán para las entregas e instalaciones programadas. Las observaciones se han realizado in situ de forma oportuna y dando prioridad a las situaciones y eventos que se han requerido con la flexibilidad necesaria, el conocimiento y la aprobación de todos los actores involucrados, bajo criterios de seguridad, razonabilidad técnica, jurídica, económica y administrativa. La organización del contratista proveedor y las garantías ofrecidas por parte de las entidades con las que adquirió los elementos a entregar han permitido surjan muy pocas inconformidades y que estas sean fácilmente subsanables de forma inmediata evitando reprocesos y ganado tiempo valioso para cumplir con el cronograma previsto.

Aunque a la fecha de este informe continúan presentándose problemas del clima invernal y de seguridad en la zona, el proceso de alistamiento y organización logística continúa sin alteraciones para cumplir con la segunda fase del Cronograma aprobado por el Comité Técnico. y por lo tanto no ha surgido la necesidad de ninguna suspensión, aplazamiento o modificaciones al contrato objeto de Interventoría

En resumen, sin excepción, todas las obligaciones sobre el contrato del proveedor y del contrato de Interventoría durante el período comprendido del presente Informe, la Interventoría las ha efectuado en sus campos de acción Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Social, Ambiental y Jurídico.

Igualmente, la gestión de la interventoría se continúa realizando bajo el enfoque del trabajo en equipo apoyando al Ministerio en las labores de control de gestión sobre el contribuyente y el contratista y manteniendo una comunicación oportuna y permanente para atender las contingencias cuando las circunstancias lo han requerido. Como se observa en la siguiente ilustración durante el mes de octubre el cronograma del Plan de Trabajo de la Interventoría se ha cumplido a cabalidad sin contingencias o retrasos.

Ilustración 9 CRONOGRAMA AVANCE PLAN DE TRABAJO INTERVENTORÍA

Cronograma de actividades CM-MEN-01-2022						
Actividades	Septiembre	Octubre				
		2-6	9-13	17-20	23-27	30-31
Verificación Técnica en Centros de Acopio de Elementos y Equipos para Entrega						
Verificación en Campo Embalaje y Logística Despachos y Entregas						
PAGOS E INFORMES						
Informes para Pagos Costos Fijos	11.3%					11.3%
Informe mensual por obligaciones.						

Es satisfactorio manifestar que, sin excepción, todas las actuaciones al tenor de las obligaciones de la Interventoría, su estado y procesos adelantados que aplican a la fecha de este Informe, se encuentran descritas en la matriz de obligaciones de la Interventoría, con sus periodos de avance y observaciones, obligación por obligación está disponible en el ONE DRIVE, junto con toda la documentación de soporte y evidencia acopiada en:

VER CARPETA INFORME 4 ARCHIVO EXCEL: MATRÍZ OBLIGACIONES INTERVENTORÍA INFORME 4

16. RECOMENDACIONES

Una vez concluidas las entregas y visitas de la primera fase, la Interventoría reitera que es necesario estar alertas por las contingencias que se puedan presentar debido a las difíciles condiciones climáticas y los graves problemas de orden público que se vienen presentando en la zona del contrato en el Departamento del Putumayo, lo cual puede generar retrasos en los procesos de alistamiento y organización logística para el acopio en las bodegas de Curillo y Puerto Guzmán.
