1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de informe:	**Parcial: _X_ Final: _**	**Periodo del Informe:**	**diciembre 2022**	**Consecutivo:**	**07**
Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
Objeto del Proyecto	Fortalecer los procesos de producción agropecuaria en 26 municipios del departamento de Nariño afectados por la emergencia declarada por la pandemia del Covid-19.				
BPIN	2020000030074				
OCAD	Regional Pacifico				
Descripción de Aportes	**Acuerdo Aprobatorio**		ACTA		
Fondo de Desarrollo Regional – CAUCA	Acuerdo No. 091 de 2020.				
Valor total proyecto	**$ 6.647.115.150**				
Fuentes al que pertenece el proyecto	Proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías				
Valor de la Interventoría	**$ 118.702.462,25**				
Valor Adición Interventoría No. 1	**$ 50.872.485**				
Valor total Regalías	**$ 6.765.817.640**				
Valor total contrapartidas	**$ 0**				
Entidad Ejecutora / Operador del Proyecto	Gobernación de Nariño				
Fecha de entrega del informe (DD/MM/AAAA)	**6/01/2023**				
Duración Proyecto (Contrato)	**Fecha De Aprobación (OCAD)**	**Fecha De Inicio (Contrato)**	**Fecha De Terminación (Contrato)**	**Estado Actual**	
Siete (7) meses prorrogados tres (3) meses		23 de febrero de 2022	06 de abril de 2023	Suspendido	

1.2. CONTRATO INTERVENTORÍA AS DEL VALLE

Contrato	**17733-2022**	**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:**	CONCURSO DE MÉRITO		**Línk del proceso:**	
OBJETO:	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID - 19 EN 26 MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”					
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
CONTRATISTA	ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE SAS					
NIT	901.177.852-7					
Representante legal	CHRISTIAN ANDRES RUIZ CALVACHE		**Identificación**		1.113.627.700 expedida en Palmira – Valle del Cauca.	
TELEFONO y/o CELULAR	2838382- 3176770374					
FUENTE DE FINANCIACION	SGR	**CDP INICIAL Y VALOR**	2021080004	**RP INICIAL**	2022030002	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Siete (7) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.		**FECHA DEL CONTRATO Dd/mm/aaa**		23/02/2022	
FECHA DE ACTA INICIO	08/06/2022		**FECHA DE VENCIMIENTO**		07/01/2023	

PRORROGAS Y ADICIONES				
ADICION	**FECHA DE INICIO ADICION**	**TIPO DE ADICION**	**FECHA TERMINACION**	**CLAUSULAS Y PARRAFOS MODIFICADOS**
PRORROGA	7/01/2023	Prorrogar el plazo de ejecución	6/04/2023	PRIMERA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN1733-2022, por tres meses, hasta el seis (06) de abril de 2023.
ADICION	7/01/2023	Adicionar al valor del contrato	6/04/2023	SEGUNDA. ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($50,872,485) (incluido iva, si aplica).

FECHA DE TERMINACION	06/04/2023
SUPERVISOR	**JULIAN ANDRES OSPINA**

Valor Total del CONTRATO INTERVENTORIA en Pesos ($)					
Valor Total del CONTRATO	$169.574.947,25	**Aporte SGR-**	$169.574.947,25	**Valor Contrapartidas**	**N/A**

ACTAS DE PAGOS INTERVENTORIA					
ACTAS DE PAGO		**Documento de desembolso**			
	Fecha de Pago	**Valor Pago**	**Amortización del Anticipo**	**Valor girado**	**No. Comprobante de egreso**
1	18/11/2022	$ 73.393.732,41	$ 14.678.746,48	$ 50.172.941,93	2022000397
2					
3					
4					

1.1.1. GARANTIAS

POLIZA				
AMPAROS	**NUMERO**	**ASEGURADORA**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
ANTICIPO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	23/03/2023

MODIFICACION DE LA POLIZA ADICION 1

AMPAROS	NUMERO	ASEGURADORA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-10-2023
ANTICIPO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-10-2023
PRESTACIONES SOCIALES	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-04-2026
CALIDAD DEL SERVICIO	CBC-100034899	SEGUROS MUNDIAL	23/02/2022	06-10-2023

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECURSOS SGR

Producto MGA	Actividad MGA	Valor o Cantidad Total	Valor ejecutado
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid - 19.	3300	$ 3.866.580.831,35
Costos de interventoría	Costos de interventoría	1	$ 50.872.483,83
Total			$ 3.917.453.315,18

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

REPORTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MGA DEL PROYECTO CORRESPONDIENTES AL QUINTO MES DE EJECUCION DEL PERIODO ENTRE EL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Actividad MGA	Unidad	Cantidad / Valor contratado	Diciembre	
			Programado	Ejecutado
Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid - 19.	und	33		
	$	$ 5.796.311.400,00		
Prestar asistencia y transferencia de tecnológica para el acceso de activos productivos a los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid - 19.	und	3300	1100	0
	$	$ 24.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 00,00
Asistencia de productores agropecuarios a través del uso de las TICs, comunicación permanente y/o acompañamiento radial.	und	3300	1100	0
	$	$ 31.200.000,00	$ 10.400.000,00	$ 00,00
COSTOS DE INTERVENTORIA	und	1	0,14	0,14
	$	$ 118.702.462,25	$ 16.957.494,64	$ 16.957.494,64

Diseño, impresión y divulgación de material didáctico y demostrativo (cartillas) enfocada en la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas, manejo agronómico de las diferentes líneas productivas y la adecuada utilización de la mecanización en el sistema productivo.	und	3300	1100	0
	$	$ 17.490.000,00	$ 5.830.000,00	$ 00,00
Implementar adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del Covid - 19.	und	3300	1100	0
	$	$ 373.500.000,00	$ 124.500.000,00	$ 00,00
			Total, ejecutado:	$ 16.957.494,64

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO:	En el mes de diciembre se continúa con el seguimiento a las actividades programadas. El operador en el mes de septiembre hizo la entrega de los treinta y tres tractores (con actas de recibido a satisfacción), registrándose un avance del 66,7% del porcentaje total del contrato GN 2382-2021. Durante el mes de octubre se recibieron a satisfacción 33 SOAT remitidos por la supervisión con fecha de vigencia del 26/10/2022hasta el 25/10/2023. El porcentaje restante por ejecutar del contrato GN 2382-2021, corresponde a entrega de los quipos y herramienta agrícola (33,29%) el cual está pendiente por ejecutar para dar cumplimiento al Objetivo específico 1: Proveer suficiente y adecuada maquinariaagrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del Covid, y la actividad MGA “Mejorar la capacidad de acceso a activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid – 19.En el mes de diciembre la **Unión Temporal Suministros Tractores 2021**, contrato No. **GN 2382-2021** continúa suspendido debido a que se identificó que la sociedad Multifuncional de Colombia SAS, integrante de la **Unión Temporal Suministros Tractores 2021**, se encuentra en inhabilidad sobreviniente.

En cuanto a las actividades programadas teniendo en cuenta los objetivos 1 y 2 del proyecto, es decir incluyendo todas las actividades, aquellas adicionales a la entrega de tractores y de herramienta agrícola, se puede mencionar que el proyecto presenta un atraso de 33,33%, por lo que se solicita al operador de la UT Suministro de Tractores 2021, informe como va a ser la entrega de las herramientas faltantes para completar los bancos de maquinaria y de esta manera empezar con las actividades que estaba programadas para iniciar el mes de octubre de 2022. Porque esta situación preocupa a la interventoría puesto que representa un atraso considerable tanto en la ejecución técnica y financiera según lo planeado, por tanto, se solicita al contratista un plan de contingencia para subsanar la situación. También es importante mencionar que de no ser consistente con los tiempos establecidos en el contrato se prevé que se puede estar generando un incumplimiento a lo contratado y a los tiempos de entregas.

El operador UT Suministro de Tractores 2021, a la fecha no ha presentado informes ni la interventoría a avalado cuenta de cobro.

De igual manera a la fecha, la Gobernación de Nariño no ha adelantado las actividades que den inicio a la ejecución del objetivo específico No. 2: “Capacitar y divulgar metodologías para las adecuadas prácticas agronómicas y de bioseguridad en la implementación de cultivos agrícolas bajo condiciones de la Pandemia del Covid – 19”, ni han sido remitida de manera oficial, para aprobación a esta interventoría, las hojas de vida de los profesionales que llevaran a cabo el desarrollo de este objetivo ni los listados de beneficiarios de este proyecto de acuerdo a la priorización de beneficiarios descrita en el documento técnico, contribuyendo esto al atraso total del proyecto.

El 30 de diciembre de 2022 Departamento Administrativo de Contratación emite el ANEXO MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. GN1733 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE S.A.S donde se determinan las siguientes clausulas modificatorias al contrato: PRIMERA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN1733-2022, por tres meses, hasta el seis (06) de abril de 2023. Parágrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos y tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato. Parágrafo segundo: El plazo de ejecución previsto en el presente convenio, se celebra en concordancia con la autorización emitida por la Asamblea Departamental de Nariño mediante Ordenanza 031 de 2022. SEGUNDA. ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($50,872,485) (incluido iva, si aplica). Parágrafo primero: Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor del contrato ascenderá a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINEINTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA

	Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($169.574.947,25) MDA/CTE. Por tal razón se genera un nuevo cronograma para los tres (3) meses de prorroga con el fin de continuar con la interventoría de las actividades por ejecutar tanto por la UT Suministro de Tractores 2021 como por la Gobernación de Nariño. El día 30 de diciembre se suspende el contrato de interventoría No. GN1733 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE S.A.S		
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO AL MES DEL TOTAL DEL PROYECTO	**100%**	**AVANCE EJECUTADO AL MES DEL TOTAL DEL POYECTO**	**64,28%**
DIFERENCIA DE RETRASO	**35,72%**	**ESTADO**	**SUSPENDIDO**

OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DECLARADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Objetivo específico 1: Proveer suficiente y adecuada maquinaria agrícola y equipos para la producción agrícola en el marco de la pandemia del Covid.

No.	ACTIVIDAD MGA	Subactividad	Unidad de medida	Valor o cantidad total	Avance ejecutado Periodo septiembre		acumulado- unidades totales		% avance prog.	% Avance Ejecutado	avance prog. Acumulado	avance ejecutado acumulado	% Ponderado acumulado		DIFERENCIA – RETRASO
	ENTREGABLE				PROGRAMADA	EJECUTADA	PROGRAMADA	EJECUTADA					% Prog. Ponderado	% Ejec. Ponderado	
	mejorar la capacidad de acceso activos productivos por parte de los pequeños productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia declarado por el Covid- 19	Entrega de maquinaria en los diferentes municipios	Und	33	33	33	33	33	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	60,78%	60,78%	0,00%
1	*Actividad 1.1. Realizar la adquisición de maquinaria y equipos*	Entrega de herramientas o implementos agrícolas en los diferentes municipios	Und	137	137	0	137	0	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%	30,34%	0,00%	30,34%

TOTAL, ACTIVIDAD MGA			**91,12%**	**60,78%**	30,34%

Observaciones:	En el mes de septiembre el operador hace entrega de 33 tractores, diecinueve (19) tractores Deutz Fahr Agrolux 70 y catorce (14) tractores SAME Explorer 95 Especial, tractores que cumplen con los requisitos mínimos, durante este mes de octubre se recibieron a satisfacción 33 SOAT remitidos por la supervisión con fecha de vigencia del 26/10/2022 hasta el 25/10/2023.
DESCRIPCIÓN:	En la ejecución mensual reportada en el mes de septiembre, se registró un avance en dinero de $ 3.866.580.831,4 millones equivalentes a diecinueve (19) tractores Deutz Fahr Agrolux 70 y catorce (14) tractores SAME Explorer 95 Especial, Sin embrago queda por ejecutar del total de contrato de suministro $1.929.730.568,7 que corresponde a 137 implementos (Bloque 1: 14 rastra de cince,14Surcadoras, 14 remolques y para el Bloque 2: 19 Cosechadoras cabezal para pastos, 19 Remolques y 19 Surcadoras, 19 renovador, 19 rastra de cincel. Durante el mes de octubre se recibieron a satisfacción 33 SOAT, sin presentar ejecución presupuestal durante este periodo para el proyecto.
CONCLUSIÓN:	Si bien es cierto que los 33 tractores fueron recibidos en el mes de septiembre, es de importancia mencionar que la adición en tiempo que requiere este contrato de suministro, dando la posibilidad al operador terminar de entregar los implementos agrícolas que hacen falta y que no fueron entregados en el tiempo estipulado por situaciones mundiales ajenas a su voluntad y que todos conocemos, situaciones que se mencionaron ampliamente por la interventoría en el oficio DR- MA 006 Y DR-MA010, Como siempre la interventoría ha trabajado para que el contrato del operador sea ejecutado de la forma correcta. Sin menos cabo de la anterior es necesario exponer que hay actividades anexas que requieren tiempo y que no solo están en la celeridad con la que pueda actuar el operador, sino en el trabajo de varias entidades como puede ser la nacionalización, la legalización ,el ingreso del almacén, el traslado de dichos tractores con sus respectivos implementos para de esta forma se cumpla con el 100% del contrato y se completen los bancos de maquinarias y estos puedan quedar en las alcaldías correspondientes una vez se adelanten los comodatos y demás requisitos que se requieren para llevar a término el contrato. Dentro de la ejecución del contrato **GN 2382-2021**, se han presentado circunstancias, desde el mes de septiembre, que condujeron a la suspensión de este, debiéndose recomponer el plazo de ejecución. De igual forma, se identificó que la sociedad Multifuncional de Colombia SAS, integrante de la **Unión Temporal Suministros Tractores 2021**, se encuentra en inhabilidad sobreviniente. Debido a lo anterior, esta Interventoría manifestó que “La disposición del artículo 9 de la Ley 80 de 1993 hace referencia a causales de inhabilidad o incompatibilidad cuyo supuesto de hecho tiene ocurrencia con posterioridad, de la adjudicación o de la celebración de contrato, **por esta razón no afecta la validez del contrato sino el derecho del contratista a la suscripción o a la continuidad en la ejecución del respectivo contrato estatal**. El efecto jurídico que contempla la ley es la obligatoriedad de ceder el contrato”. (Ver Oficio No. DR-MA-020 del 02 de noviembre de 2022).

2. OTRAS ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA

- La interventoría realizó la revisión de los documentos de las solicitudes del contratista dando los conceptos pertinentes para continuar con el proceso, como la solicitud de suspensión por el periodo de un (1) mes, porque la actividad de la entrega de tractores se vio afectada por circunstancias de índole mundial que afectan directamente al proyecto y no se pudieron proveer, en donde la interventoría con su equipo técnico y jurídico evaluó las pruebas presentadas por el operador para dar se concepto referente al tema.
- Se realizaron reuniones con la supervisión y el contratista proveedor de maquinaria y demás actividades propias de seguimiento y acompañamiento.
- El 07 de octubre de 2022, la **Gobernación de Nariño** y la **Unión Temporal Suministros Tractores 2021** suscribieron el acta de **suspensión No. 01 del contrato No. GN 2382-2021**, basados en una serie de riegos no previsibles referidos a causas externas generadas en la crisis del sector de la producción de maquinaria agrícola, tales como, la afectación de las industrias siderúrgicas por la alta demanda y poca oferta de hierro y acero, los cuales son la materia prima de los insumos a entregar. Se acordó en dicha acta reiniciar la ejecución del contrato en mención el 06 de noviembre de 2022.
- El 02 de noviembre, mediante oficio No. DR- MA-020, esta interventoría solicitó extender **el periodo de suspensión del contrato No. GN 2382-2021, por el término de un mes**, para que en dicho periodo se aclarara la situación jurídica y el estatus de uno de los asociados de la **Unión Temporal Suministros Tractores 2021**, a quien se le identificó una inhabilidad sobreviniente.
- El 15 de noviembre, mediante oficio No. DR-MA-023, Con el ánimo de agilizar la ejecución del proyecto en mención e iniciar con la verificación y revisión de los requisitos que exige el proyecto, en cuanto al personal que se encargará de ejecutar la Actividad 2.1: Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación permanente y/o acompañamiento radial, la interventoría a cargo de Alimentos Saludables del Valle SAS se permite **solicitar las hojas de vida** correspondientes a los siguientes perfiles:

  - UN (1) PROFESIONAL ÁREA AGROPECUARIA. CARGO: COORDINADOR DE SUBCOORDINADORES
  - UN (1) PROFESIONAL ÁREA AGROPECUARIA. CARGO: COORDINADOR DE TÉCNICOS
  - ONCE (11) PROFESIONAL ÁREA AGROPECUARIA. CARGO: SUBCOORDINADOR DE CAMPO
  - TEINTA Y TRES (33) TÉCNICOS AGROPECUARIOS. CARGO: TÉCNICOS AGROPECUARIOS
  - UN (1) COMUNICADOR SOCIAL. CARGO: COMUNICADOR SOCIAL

  De manera preliminar la Supervisión del proyecto remitió 47 hojas de vida correspondientes al personal que se encargará de ejecutar la Actividad 2.1: Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación permanente y/o acompañamiento radial, para revisión. Una vez realizada dicha revisión se realizaron observaciones en 33 de estas, basados en los perfiles descritos en el documento técnico. Se envió reporte al supervisor del proyecto de dicha revisión.

- El 22 de noviembre, mediante oficio No. DR-MA-024, Soportados en la documentación aportada, la Interventoría recomienda a la Entidad permitir la cesión de la posición contractual de la sociedad **Multifuncional de Colombia SAS,** integrante de la **Unión Temporal Suministros Tractores 2021**, a la sociedad **Maquinaria y Construcciones de Colombia SAS – Construmaq de Colombia SAS**, con NIT 900.798.908-1, para que continúe la ejecución del contrato No. **GN 2382-2021**.En este sentido, la Entidad debe instar tanto a la sociedad **Maquinaria y Construcciones de Colombia SAS – Construmaq de Colombia SAS**, con NIT 900.798.908-1, como a las otras dos sociedades que continúan con la ejecución del contrato No. **GN 2382-2021**, Red Comercial de la Costa SAS (NIT 900.411.323-2), y Tractocentro Colombia SAS (NIT 900.386.806-0).

- El 28 de noviembre, mediante oficio No. DR-MA-025, se envió la solicitud al supervisor de contrato de **prórroga del plazo de ejecución y modificación de la forma de pago del contrato de interventoría No. 1733-2022,** solicitando respetuosamente a la Entidad se sirvan modificar la cláusula de forma de pago del contrato del Interventor, desligándola de la ejecución del contrato del Operador, en razón a que los contratos, a pesar de correr por iguales causes, son independientes y no se reputa accesoriedad entre ellos, aceptando con ello pagos mensuales según el porcentaje de avance de la propia interventoría.

- El 1 de diciembre, mediante oficio No. DR-MA-026, **se solicita la modificación de la formación profesional del coordinador mecánico.**

- El 12 de diciembre, mediante oficio No. DR-MA-029, **se da respuesta a la solicitud hecha por la doctora GRACE CAROLINA PUMALPA MENESES** Profesional Universitaria Departamento Administrativo de Contratación, donde solita complementar la información sobre la inhabilidad sobreviniente de uno de los miembros de la Unión Temporal Suministros Tractores 2021

- El 30 de diciembre de 2022 Departamento Administrativo de Contratación emite el ANEXO MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. GN1733 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE S.A.S donde se determinan las siguientes clausulas modificatorias al contrato: PRIMERA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN1733-2022, por tres meses, hasta el seis (06) de abril de 2023. Parágrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos y tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato. Parágrafo segundo: El plazo de ejecución previsto en el presente convenio, se celebra en concordancia con la autorización emitida por la Asamblea Departamental de Nariño mediante Ordenanza 031 de 2022. SEGUNDA. ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($50,872,485) (incluido iva, si aplica). Parágrafo primero: Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor del contrato ascenderá a la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINEINTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($169.574.947,25) MDA/CTE.

- Por tal razón se genera una reprogramación de actividades para los tres (3) meses de prorroga con el fin de continuar con la interventoría de las actividades por ejecutar tanto por la UT Suministro de Tractores 2021 como por la Gobernación de Nariño.

- El día 30 de diciembre se suspende el contrato de interventoría No. GN1733 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ALIMENTOS SALUDABLES

DEL VALLE S.A.S

- Se realiza en seguimiento técnico, jurídico, contable a las actividades realizadas por el operador, informando oportunamente a la supervisión para lograr la ejecución de contrato de operación de la mejor manera posible.

- Se informa mensualmente las actividades realizadas, tanto del operador como de la interventoría a la supervisión, tal y como lo establece el contrato.

3. RELACIÓN CONTRATOS Y PERSONAL DEL PROYECTO

3.1. Contratos vigentes Personal Interventoría

Cargo	Perfil	Nombre
Coordinador Agrícola	Ingeniero Agrónomo con Maestría y Doctorado en ciencias agrarias	Yuri Mercedes Mena Pérez
Interventor jurídico	Abogado con especialidad en derecho administrativo y contratación estatal	Giovanny González
Interventor contable	Contador con especialidad en gerencia tributaria	Julio Terán
Coordinador Mecánico	Ingeniero Mecánico	James Guerrero

4. LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Seguridad Social


5. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL
FISICO	61,9 %
FINANCIERO	61,9%

RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE OPERACIÓN			
PRESUPUESTO	$ 6.242.501.400,00		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Junio	$ 0	0,0%	
Julio	$ 0	0,0%	
Agosto	$ 0	0,0%	
Septiembre	$ 3.866.580.831,4	61,9%	
Octubre	$ 0	0,0%	
Noviembre	$ 0	0,0%	
Diciembre	$ 0	0,0%	
Total	$ 3.866.580.831,4	61,9%	
Mes 1			
Mes 2			
Mes 3			

RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA			
PRESUPUESTO	$ 118.702.462,3		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Junio	$12.435.496,04	10,48%	
Julio	$21.479.493,18	18,10%	
Agosto	$16.957.494,61	14,29%	
Septiembre	$16.957.494,61	14,29%	
Octubre	$16.957.494,61	14,29%	
Noviembre	$16.957.494,61	14,29%	
Diciembre	$16.957.494,64	14,28%	
Total	$ 118.702.462,3	100%	
ADICION	$50,872,485		OBSERVACIONES
PERIODO	VALOR	%	
Mes 1			
Mes 2			
Mes 3			

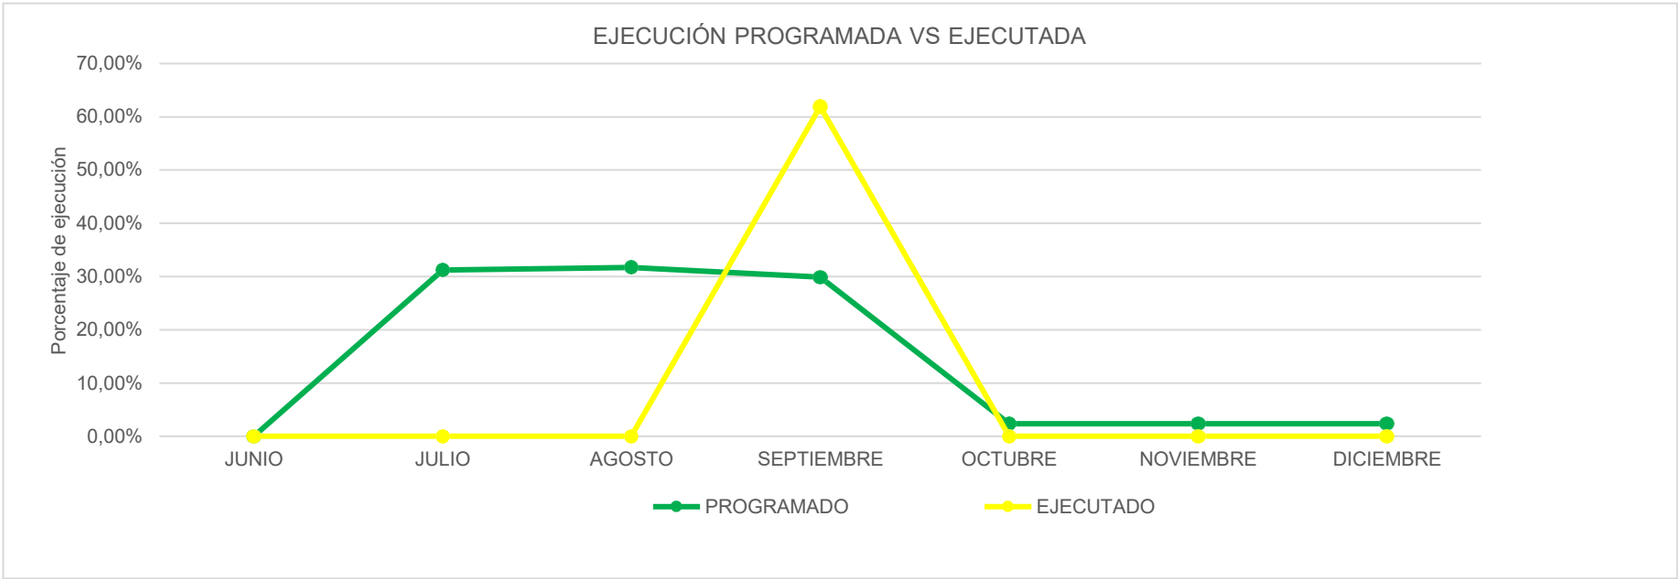

	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL, AL CORTE
PROGRAMADO	0,00%	31,24%	31,71%	29,91%	2,38%	2,38%	2,38%	100,00%
EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	61,90%	0,00%	0,00%	0,00%	61,90%

GASTOS DE INTERVENTORÍA: DICIEMBRE

PERSONAL					
CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	CANTIDAD (Personas) (2)	TIEMPO (Meses) (3)	PARTICIPACION TOTAL(% Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1x2x3x4)=(5)
Coordinador Agrícola	3.000.000,00	1,00	4,00	1,00	12.000.000,00
Coordinador Mecánico	2.800.000,00	1,00	4,00	0,50	5.600.000,00
Profesional Jurídico	2.319.450,00	1,00	4,00	0,48	4.453.344,00
Profesional Contable	2.319.450,00	1,00	4,00	0,48	4.453.344,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5)=(6)	**26.506.688,00**
FACTOR MULTIPLICADOR F.M. (7)	**2,1504**
COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORIA = (6)*(7)=(A)	**56.999.981,88**
IVA = (19%)*(A)=(B)	**10.829.996,56**
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA = (A)+(B)=©	**67.829.978,44**

6. CONCLUSIONES:

- A la fecha tenemos la entrega de la maquinaria, y reporta un avance un avance importante al proyecto, un avance 60.6 % del total, sin embargo, está pendiente para la entrega las herramientas agrícolas, que son un porcentaje considerables del proyecto y con lo cual se solicita un plan de contingencia por parte del operador U.T suministro de tractores 2021.

- Se recibieron a satisfacción, en el mes de octubre 33 SOAT remitidos por la supervisión con fecha de vigencia del 26/10/2022 hasta el 25/10/2023.

- El operador UT Suministro de Tractores 2021, a la fecha no ha presentado informes ni cuenta de cobro. El contrato del operador GN 2382-2021, ha presentado circunstancias, desde el mes de septiembre, que condujeron a la suspensión de este, debiéndose recomponer el plazo de ejecución. Contrato que a la fecha se encuentra suspendido.

- Se solicita a la supervisión presentar de manera oficial las hojas de vida de los perfiles, en cuanto al personal que se encargará de ejecutar la Actividad 2.1: Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación permanente y/o acompañamiento radial. Para esto se requiere los siguientes perfiles:

    - UN (1) PROFESIONAL ÁREA AGROPECUARIA. CARGO: COORDINADOR DE SUBCOORDINADORES
    - UN (1) PROFESIONAL ÁREA AGROPECUARIA. CARGO: COORDINADOR DE TÉCNICOS
    - ONCE (11) PROFESIONAL ÁREA AGROPECUARIA. CARGO: SUBCOORDINADOR DE CAMPO
    - TEINTA Y TRES (33) TÉCNICOS AGROPECUARIOS. CARGO: TÉCNICOS AGROPECUARIOS
    - UN (1) COMUNICADOR SOCIAL. CARGO: COMUNICADOR SOCIAL

- Se realizó contacto con las Umatas vía correo electrónico observando interés en el proyecto, desde el inicio del contrato, por tanto, se pone en consideración de la supervisión programar una reunión conlas con las personas encargadas dentro de las alcaldías, para presentar el proyecto.

- Se solicita a la supervisión remitir el listado definitivo de los 3.300 beneficiarios del proyecto, discriminado por municipio, teniendo en cuenta los criterios de selección y/o priorización de beneficiarios descritos en el documento técnico.

- Se solicita a la supervisión remitir cronograma de actividades para el desarrollo de la Actividad 2.1: Asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios a través del uso de las tecnologías de información y comunicación permanente y/o acompañamiento radial, que garanticen su ejecución.

- Se acepta en el SECOP II, el dia 30/12/2022 el MODIFICATORIO No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. GN1733 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE S.A.S, donde se modifica:

    - Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN1733-2022, por tres meses, hasta el seis (06) de abril de 2023.
    - Adicionar al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($50,872,485) (incluido iva, si aplica).
    - Por tal razón se genera una reprogramación de actividades para los tres (3) meses de prorroga con el fin de continuar con la interventoría de las actividades por ejecutar tanto por la UT Suministro de Tractores 2021 como por la Gobernación de Nariño.

- El día 30 de diciembre se suspende el contrato de interventoría No. GN1733 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE S.A.S.
- Teniendo en cuenta que la interventoría realizo sus funciones hasta finales de diciembre de 2022, **se solicita el pago parcial** de esta interventoría toda vez que las actividades se realizaron a cabalidad.
- Se pone en consideración las actividades y subactividades planteadas en el presente informe como estrategia de seguimiento del proyecto, quedando atento a cualquier observación o comentario.
- Quedo a disposición para ampliar o aclarar este informe en el momento en que lo consideren necesario.

Atentamente,



CHRISTIAN ANDRES RUIZ CALVACHE
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 3176770374
