(17) Gastos de administración

El siguiente es un detalle de los gastos de administración por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

	2021	2020
Beneficios a empleados	308.698.320	305.877.459
Honorarios	175.662.403	64.050.500
Impuestos	20.955.000	16.094.600
Arrendamientos	5.362.087	2.790.000
Contribuciones y Afiliaciones	118.555.776	115.162.958
Seguros	115.705.733	17.567.013
Servicios	57.194.172	19.660.382
Gastos Legales	822.120	1.865.100
Mantenimiento y reparaciones	13.837.606	29.963.608
Adecuación e instalación	9.484	483.000
Gastos de Viaje	1.569.100	2.665.000
Depreciaciones	0	121.711.224
Amortizaciones	0	0
Otros (diversos)		
	474.571.097	295.179.286
	$ 1.292.942.898	$ 990.404.647

(18) Gastos de Personal (Beneficios a Empleados)

El siguiente es un detalle de los otros ingresos (egresos), neto por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

	2021	2020
Sueldos y salarios	$ 308.698.320	305.877.459
Beneficios a corto plazo a los empleados	0	0
Contribuciones previsionales obligatorias	0	0
Contribuciones a planes de aportaciones definidos	0	0
Beneficios a empleados por terminación	0	0
Otros gastos de personal	0	0
	$ 308.698.320	305.877.459

(19) Costo financiero, neto

El siguiente es un detalle del costo financiero, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

	2021	2020
Ingresos financieros:		
Ingresos por Intereses por préstamos y partidas por cobrar	80.362.726	306.740
Diferencia en cambio	0	0
	80.362.726	306.740
Gastos financieros:		
Gastos por préstamos bancarios	149.390.630	125.424.973
Otros Gastos	288.099.689	443.750.127
	437.490.319	569.175.100
Neto ingresos y gastos financieros	**$ -357.127.593**	**-568.868.360**

(20) Gasto por impuestos de renta

Impuesto de renta

La Compañía está sujeta en Colombia al impuesto de renta y complementarios, a una tasa nominal impositiva del 33% en 2019, 33% en 2020 Y 32% en el 2021 y subsiguientes.

Las provisiones para el impuesto a las ganancias que se detallan en esta nota, fueron determinadas por períodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, por el sistema de renta presuntiva y renta líquida, en su orden.

Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 32% a título de impuesto de renta y complementarios.

Las declaraciones de renta de los años gravables 2021 y 2020 se encuentran abiertas para revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias.

El siguiente es un detalle de componentes del gasto por impuesto a las ganancias por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

		2021	2020
Corriente			
Renta	$	157.313.661	188.763.965
Cree		0	0
Ajustes por periodos anteriores		-	-
		157.313.661	188.763.965
Gasto (ingreso) por impuesto diferido		0	0
Gasto por impuesto de operaciones continuas		**$ 157.313.661**	**188.763.965**

i) Las declaraciones de renta de los años 2021 y 2020 están sujetas a revisión por las autoridades fiscales; no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.

ii) El porcentaje para determinar la renta presuntiva equivale al 3,5% del patrimonio líquido del año anterior.

(21) Aprobación de estados financieros

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. AC 5, de fecha 15 de Marzo de 2022, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos.

(22) Hechos ocurridos después del período que se informa

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.

JOHN EDISON JORDAN TEJADA
Gerente

EDINSON SUAZA HENDEZ
Contador Público
TP 174246-T

JAIME GARRIDO PAREDES
Revisor Fiscal
TP 116914-T

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA

Señores
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INCIVIL S.A.S

El suscrito representante legal, contador y Revisor Fiscal de INCIVIL S.A.S certificamos que los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

I. Los estados financieros y los demás documentos que de conformidad con el artículo 289 y 290 del Código de Comercio que se presentarán a la Junta de Socios, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de INCIVIL S.A.S.

II. Las afirmaciones contenidas en los estados financieros de INCIVIL S.A.S. han sido verificadas previamente, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la sociedad.

III. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha.

IV. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los periodos terminados en 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, han sido reconocidos en los estados financieros.

V. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.

VI. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

VII. Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Neiva, 13 de marzo de 2022

JOHN EDISON JORDAN TEJADA
Gerente

EDINSON SUAZA HENDEZ
Contador Público
TP 174246-T

JAIME GARRIDO PAREDES
Revisor Fiscal
TP 116914-T

Informe del Revisor Fiscal

Señores
INCIVIL S.A.S
Asamblea General de Accionistas

Informe sobre los estados financieros consolidados

He auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía INCIVIL S.A.S, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021, el estado del resultado, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables

realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía INCIVIL S.A.S a 31 de diciembre de 2020 y 2021, así como el estado de resultados, estado cambios en el patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante los años 2020 y 2021, la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- normas legales que afectan la actividad de la entidad;
- estatutos de la entidad;
- actas de asamblea y de junta directiva
- Otra documentación relevante.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.

JAIME GARRIDO PAREDES
Revisor Fiscal
T.P. N° 116914-T

Marzo 13 de 2022
Neiva Huila



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1973

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-ABR-1991 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR


A-1500100-57082264-M-0007692237-20000812 09355 00195B 02 090265696

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7692237

GARRIDO PAREDES
APELLIDOS

JAIME
NOMBRES

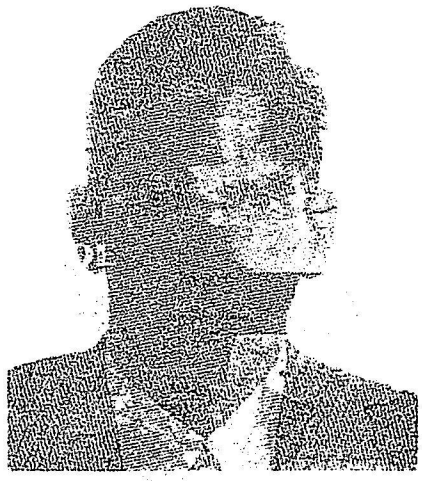

FIRMA




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

JAIME
C.C.
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ [illegible] DIAZ [illegible]

126746

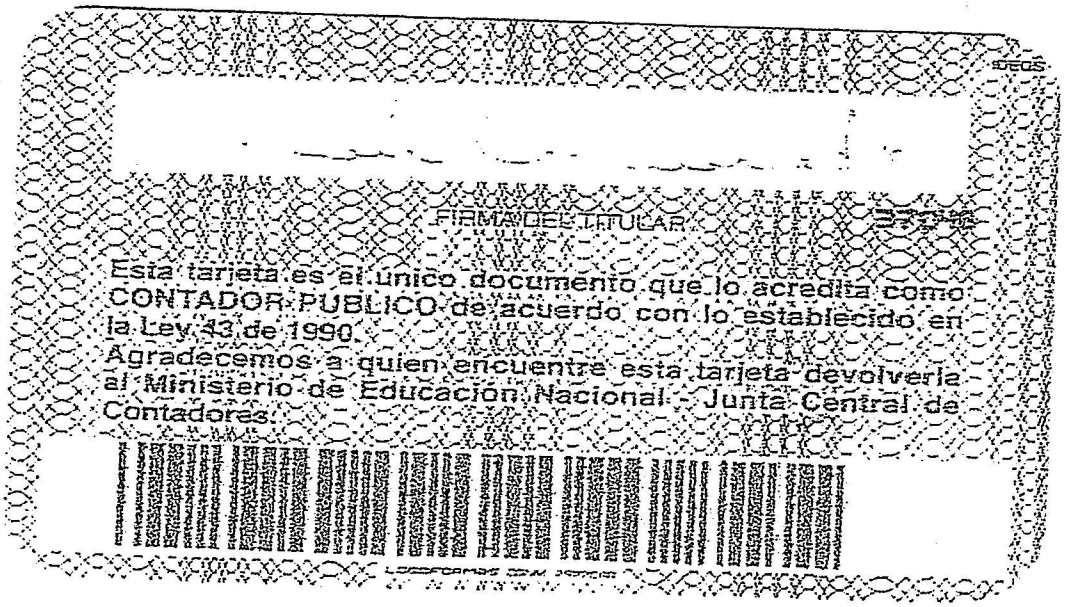

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1991

ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO


02-MAR-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1900100-00157649-M-1075251099-20090527 0011822466A 1 30971852

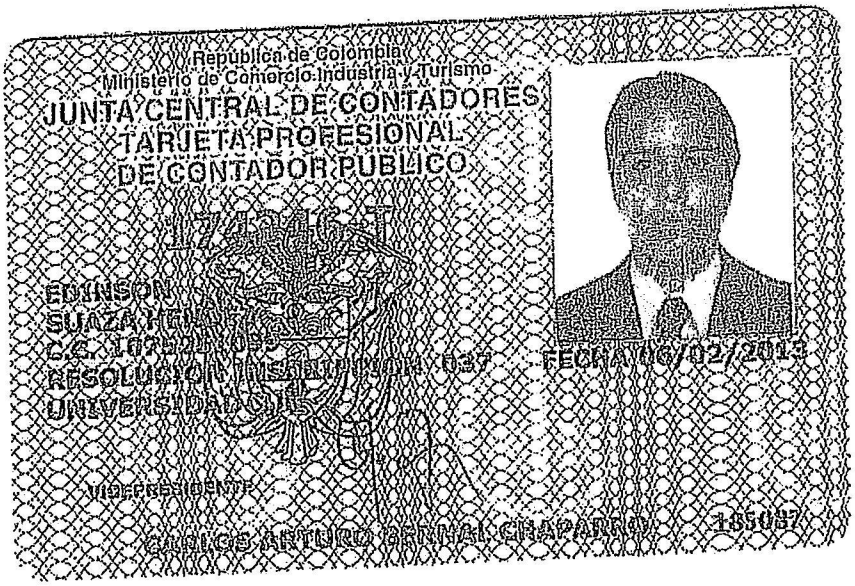
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
EDINSON
SUAZA HE
C.C. 10
RESOLUCION
UNIVERSIDAD
037
FECHA 06/02/2013
VICEPRESIDENTE
CARLOS ARTURO ARDILA CHAPARRO
185087

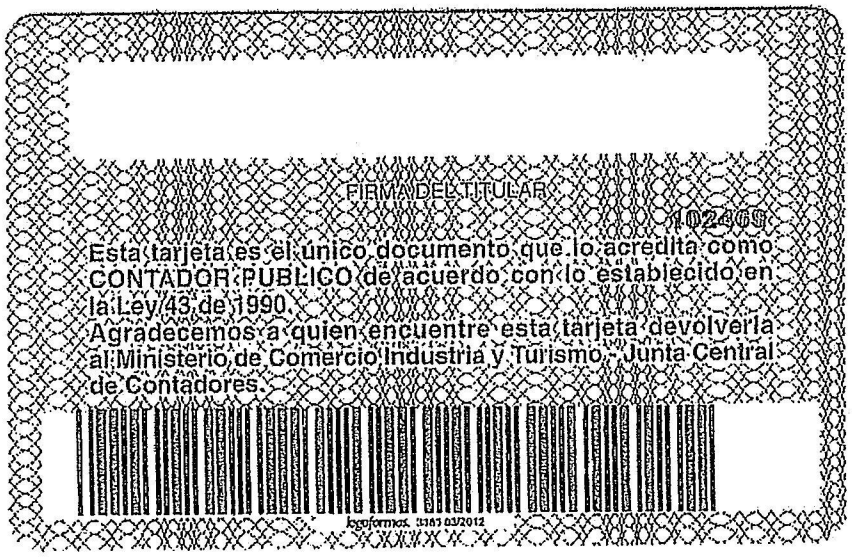
FIRMA DEL TITULAR
102469
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.
logoformax 03181 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

800570CCD7448602Ø

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON SUAZA HENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075251099 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 174246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

00000178

INCIVIL S.A.S
Obras Civiles e Interventorias

EXPERIENCIA DEL PROPOPENTE

6088643475 Carrera 4 No. 4 – 41, Neiva administrativo@incivilsas.com

DOCUMENTO CONSORCIAL

Señores
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
Neiva

REFERENCIA: PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. AHLPOB02-019

Los suscritos, JESUS MARIA RUIZ PEREZ, actuando en nombre y representación legal de la empresa INGEASER S.A.S, y JOHN EDISON JORDAN TEJADA actuando en nombre y representación legal de la empresa INCIVIL S.A.S respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de licitación pública No. AHLPOB02-019 cuyo objeto es **CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA, FASE I,** y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será: la duración del contrato y dos (02) años más

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACIÓN (%)
INGEASER S.A.S	30%
INCIVIL S.A.S	70%

- La suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.
- El Consorcio se denomina **CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA**
- La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
- El representante del Consorcio es OSCAR ANDRES GONZALEZ LOSADA, identificado con C. C. No. 7.715.800 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente, JESUS MARIA RUIZ PEREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.059.584 de Medellín.

- La sede del Consorcio es: Calle 26 a No. 8ª - 30
- Dirección de correo: Calle 26 a No. 8ª - 30
- Correo electrónico: oscaragonzalez@hotmail.com
- Teléfono: 8755008
- Ciudad: Neiva

En constancia, se firma en Neiva, a los 13 días del mes de junio de 2019.

INGEASER S.A.S
Nit. 813.001.340-3
Rpl. JESUS MARIA RUIZ PEREZ
C.C 70.059.584 de Medellin
INTEGRANTE

INCIVIL S.A.S
Nit. 813.010.363-0
Rpl. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
C.C. 79.628.185 de Bogota
INTEGRANTE

OSCAR ANDRES GONZALEZ LOSADA
C. C. No. 7.715.800 de Neiva
RPL. CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA

No DE CONTRATO		ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA	
No.	101 de 2019	No.	035

En la ciudad de Neiva a los 21 dias del mes de Mayo de 2021, los suscritos, **Cristian Camilo Bravo Medina** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.203.732 de Garzón, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesion No 033 del 17 de Enero de 2020, de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y **Oscar Andres Gonzalez Losada**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.715.800 de Neiva, en calidad de Representante Legal de la empresa Consorcio Acueducto La Plata, identificado con NIT 901 305 496 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el contrato de obra No 101 de 2019 suscrito el dia 26 de Julio de 2019 de conformidad con lo establecido en la cláusula VIGESIMA SEPTIMA del contrato .

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: Construcción plan maestro de acueducto del municipio de La Plata departamento del Huila. Fase I					
Fecha del Contrato 26 de julio de 2019	Plazo Inicial de Ejecución:	150 Dias	Fecha de Inicio:	25/11/2019	Plazo Adicional: 90 Dias
Plazo Final de Ejecución: 240 Dias	Fecha de Terminación:	3/11/2020	No. de suspensiones:	2	Tiempo suspendido: 104 Dias

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2019 así:

No de RP CONTRATO: 818	Fecha: 26 de Julio de 2019	Valor: 1.872.264.544,00

3. ESTADO DE LAS POLIZAS Nombre de la Aseguradora: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

Póliza No	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	12/08/2019	26/07/2019	24/06/2020	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	16-ago-19
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	12/08/2019	26/07/2019	24/06/2020			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.989,00	12/08/2019	26/07/2019	23/12/2022			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	12/08/2019	23/12/2019	23/12/2024			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 248.434.800,00	12/08/2019	26/07/2019	23/12/2019			
Anexo 1 - Acta de Inicio	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobacion
				Desde	Hasta			
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	29/11/2019	25/11/2019	24/10/2020	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	29-nov-19
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	29/11/2019	25/11/2019	24/10/2020			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.989,00	29/11/2019	25/11/2019	24/04/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	29/11/2019	22/04/2020	22/04/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 248.434.800,00	29/11/2019	25/11/2019	25/04/2020			
Anexo 2 - Reinicio 01	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	26/06/2020	25/11/2019	15/01/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	1-jul-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	26/06/2020	25/11/2019	15/01/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.989,00	26/06/2020	25/11/2019	15/07/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	26/06/2020	15/07/2020	15/07/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 248.434.800,00	30/06/2020	25/11/2019	15/07/2020			
Anexo 3 - Actualización RC	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 263.340.900,00	30/06/2020	25/11/2019	15/07/2020	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	1-jul-20
Anexo 3-4 - OtroSi 01	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	14/07/2020	25/11/2019	15/01/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	29-jul-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	14/07/2020	25/11/2019	15/01/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.989,00	14/07/2020	25/11/2019	15/07/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	14/07/2020	15/07/2020	15/07/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 263.340.900,00	14/07/2020	25/11/2019	15/07/2020			

No DE CONTRATO No. 101 de 2019

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA No. 035

Anexo 4-5 - Acta aclaratoria y modificatoria	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	29/07/2020	25/11/2019	14/03/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	29-jul-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	29/07/2020	25/11/2019	14/03/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.989,00	29/07/2020	25/11/2019	14/09/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	29/07/2020	13/09/2020	14/09/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 263.340.900,00	29/07/2020	25/11/2019	14/09/2020			

Anexo 5-6 - Suspensión 02	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	23/09/2020	25/11/2019	14/03/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	24-sep-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	23/09/2020	25/11/2019	14/03/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.988,8	23/09/2020	25/11/2019	14/09/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	23/09/2020	13/09/2020	14/09/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 263.340.900,00	23/09/2020	25/11/2019	14/09/2020			

Anexo 6-7 - Reinicio 02	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	23/09/2020	25/11/2019	3/04/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	24-sep-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	23/09/2020	25/11/2019	3/04/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.988,8	23/09/2020	25/11/2019	4/10/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	23/09/2020	3/10/2020	4/10/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 263.340.900,00	24/09/2020	25/11/2019	4/10/2020			

Anexo 7-8 - OtroSi 02	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	30/09/2020	25/11/2019	3/05/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	1-oct-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	30/09/2020	25/11/2019	3/05/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.988,8	30/09/2020	25/11/2019	3/11/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	30/09/2020	2/11/2020	3/11/2025			
9542	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 263.340.900,00	1/10/2020	25/11/2019	3/11/2020			

Anexo 8 - Recibo Final	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
26436	Cumplimiento de contrato	$ 561.679.483,20	12/12/2020	25/11/2019	3/05/2021	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	AGUAS DEL HUILA	12-dic-20
26436	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 280.839.742,00	12/12/2020	25/11/2019	3/05/2021			
26436	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 374.452.988,8	12/12/2020	25/11/2019	3/11/2023			
26436	Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 561.679.483,20	12/12/2020	3/11/2020	3/11/2025			

(Se debe relacionar la totalidad de las polizas y modificaciones aprobadas en el desarrollo del contrato.)

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de Suscripción	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
Otro Si 01	8/07/2020	Acta de mayores y menores cantidades	$ 0	$ 1.872.264.944,00	150 Dias
Acta Aclaratoria y modificatoria	8/07/2020	Modificacion al tiempo	$ 0	$ 1.872.264.944,00	210 Dias
Otro Si 02	30/09/2020	Acta de mayores y menores cantidades y Modificación al tiempo	$ 0	$ 1.872.264.944,00	240 Dias

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

No DE CONTRATO	ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
No. 101 de 2019	No. 035

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	25/11/2019
ACTA DE SUSPENSION	1	24/03/2020
ACTA DE REINICIO	1	16/06/2020
ACTA DE MODIFICACION	1	18/06/2020
ACTA PARCIAL	1	29/07/2020
ACTA DE SUSPENSION	2	1/09/2020
ACTA DE REINICIO	2	21/09/2020
ACTA DE MODIFICACION	2	22/09/2020
ACTA PARCIAL	2	16/10/2020
ACTA PARCIAL	3	30/10/2020
ACTA DE RECIBO FINAL	1	3/11/2020

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	29/07/2020	$ 705.427.823,00	$ 105.814.173	$ 599.613.649,55
ACTA DE RECIBO PARCIAL 02	16/10/2020	$ 713.669.372,00	$ 107.050.406	$ 606.618.966,00
ACTA DE RECIBO PARCIAL 03	30/10/2020	$ 263.620.362,00	$ 67.975.163	$ 195.645.199,00
ACTA DE RECIBO FINAL	3/11/2020	$ 182.221.463,00		$ 182.221.463,00
ANTICIPO				$ 280.839.742,00
	Totales	$ 1 864 939.020,00	$ 280 839 742	$ 1 864 939 020

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 1.872.264 944,00	$ 0,00	$ 1 872 264.944,00	$ 1.864.939.020,00	$ 7.325 924,00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002 el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS	e- Pensiones	g- Paz y salvos del personal
b- ICBF	d- ARP	f- Caja de Compensación	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

N/A

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato 101 de 2019 se firma en la ciudad de Neiva a los 21 días del mes de Mayo de 2021, por los que en ella intervinieron

Contratista Nombre.CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA R L OSCAR ANDRES GONZALEZ LOSADA Firma:	**Interventor** Nombre: CONSORCIO INTERHUILA 2019 R.L.S VICTOR MANUEL OSPINO PEREZ Firma:
Gerente Nombre: CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA Firma:	**Subgerente Técnico y Operativo** Nombre: ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ Firma:

ACUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 5.2

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I		ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020
	ID	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 10-05-2020
	VALOR:	1.072.264.944	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020
	ANTICIPO:	260.630.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario
	FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario
			FECHA: 03-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 2		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES															
1.01	Localización y replanteo para Estructuras de Acueducto, incluye equipo de topografía	m2	428,00	$ 3.278,00	$ 1.403.598	554,0	$ 1.815.403	=	-	$ -	0,0	$ -	554,0	1.815.403	554,0	$ 1.815.403
1.02	Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de Topografía	m	748,00	$ 2.709,00	$ 2.026.583	321,0	$ 869.625	=	-	$ -	0,0	$ -	321,0	869.625	321,0	$ 869.625
1.03	Descapote y limpieza manual, e=0,15m	m2	1058,00	$ 2.797,00	$ 3.005.582	1478,6	$ 4.131.415	=	-	$ -	0,0	$ -	1478,6	4.131.415	1.478,6	$ 4.131.415
	SUBTOTAL				$ 6.454.451		$ 6.935.443,6			$ -		$ -		6.815.459		$ 6.815.459
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
2.01	Excavación manual en material común	m3	46,00	$ 16.532,00	$ 310.587	49,0	$ 810.567	-	0,2	$ 2.767	0,0	$ -	48,851	807.730	48,9	$ 807.730
2.02	Excavación a todo costo manual de complemento. Incluye el retiro de obra, materiales y escoria.	m3	225,00	$ 36.134,00	$ 8.130.150	53,4	$ 1.929.555	=	-	$ -	0,0	$ -	53,4	1.929.555	53,4	$ 1.929.555
2.03	Excavación mecánica en material común en seco	m3	1579,00	$ 10.649,00	$ 17.745.351	3355,0	$ 35.452.195	=	-	$ -	0,0	$ 0,0	3355,0	35.452.195	3.355,0	$ 35.452.195
2.04	Excavación mecánica en material común bajo agua	m3	2701,00	$ 11.715,00	$ 31.650.315	3145,7	$ 36.861.313	+	42,8	$ 513.248	42,8	$ 513.248,4	3145,70	36.861.313	3.188,5	$ 37.374.561
2.05	Retiro tipo I: Suministro e instalación de cinta para tubería PVC incluye materiales, equipo y mano de obra para las zonas instalación Zona centro	m3	54,00	$ 92.549,00	$ 4.997.484	71,7	$ 6.639.053	-	14,5	$ 1.344.641	0,0	$ -	57,21	5.294.409	57,2	$ 5.294.409
2.06	Retiro Tipo III con material seleccionado de la misma excavación, incluyendo cargue y acarreo a todo costo, equipo, herramientas y mano de obra dentro las zonas)	m3	2258,03	$ 12.979,00	$ 27.899.602	2163,5	$ 27.424.525	+	5,0	$ 63.350	5,0	$ 63.350,0	2163,5	27.424.525	2.168,5	$ 27.487.906
2.07	Retiro tipo III con recebo compactado en capas de 20 cm. Peso volumétrico 95% a cada capa, incluye: recebo, equipo, herramientas, transporte y mano de obra ZONA CENTRO	m3	447,00	$ 79.753,00	$ 35.639.310	1245,4	$ 99.319.062	-	40,1	$ 3.193.500	600,0	$ 48.475.940,9	601,4	47.649.622	1.202,40	$ 96.425.462
2.08	Suministro e instalación con Material Subbase granular (P menor 5%, según norma INVIAS 35, compactación mecánica en capas máxima de 10 cm, Dm ≥95% según PM, ZONA CENTRO	m3	2,00	$ 121.505,00	$ 243.010	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
2.09	Suministro e instalación Material Base Granular (P menores 3%según norma invias 35, compactación mecánica en capas máxima de 10 cm, Dm ≥95% según PM, ZONA CENTRO)	m3	1,00	$ 130.787,00	$ 130.787	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
2.10	Suministro e instalación Afirmado arenoso para vía ZONA CENTRO	m3	1,00	$ 84.520,00	$ 84.520	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
2.11	Explanación, alineación y nivelación del terreno corregido con material de la misma excavación	m3	500,00	$ 7.691,00	$ 3.845.500	326,5	$ 2.509.861	=	-	$ -	0,0	$ -	326,50	2.509.861	326,5	$ 2.509.861
2.12	Recepción, cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación en volquetas hasta botadero autorizado. (Distancia promedio estimada es 10,5 km)	m3-Km	272443,00	$ 1.304,00	$ 355.291.760	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-2.13	Recepción, cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación en volquetas hasta botadero autorizado	m3-Km	0,00	$ 1.304,00		147434,6	$ 192.254.517	+	11.512,4	$ 15.003.710	15.424,9	$ 21.417.155,8	142232,63	185.271.069	155.345,5	$ 207.723.225
	SUBTOTAL				$ 426.777.385		$ 483.718.511			$ 11.513.119		$ 70.469.835,7		344.910.184		$ 415.379.926
3	CONEXIÓN DEL SISTEMA CON PTAP															
3.01	Suministro e instalación de Tee HD 16"x 16",400 mm x 400 mm, extremo junta mecánica	un	1,00	$ 4.035.555,00	$ 4.035.555	0,0	$ -	+	1,0	$ 4.035.555	1,0	$ 4.035.555,0	0,0	0,00	1,0	$ 4.035.555
3.02	Suministro e instalación de Codo 90° HD 16",400 mm, extremo junta mecánica	un	2,00	$ 3.125.578,00	$ 6.251.156	1,0	$ 3.125.578	+	1,0	$ 3.125.578	1,0	$ 3.125.578,0	1,0	3.125.578,00	2,0	$ 6.251.156

4475

0000185

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I		ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020
	P	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 16-05-2020
	VALOR:	1.872.264.944	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020
	ANTICIPO:	280.839.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario
	FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario

FECHA: 03-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
						SEGÚN MODIFICATORIO 2					PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	VR/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.03	Suministro e instalacion de Reduccion HD 16" x 10" (400 mm x 250 mm), extremo junta hidraulica	un	2,00	$ 2.224.552,00	$ 4.449.104	2,0	$ 4.449.104	-	2,0	$ 4.449.104	0,0	$ -	0,00	0,00	0,0	$ -
NP-3,04	Suministro e instalación Codos 90° 2" HD - extremo junta hidraulica	un	0,00	$ 791.257,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-3,05	Suministro e instalación TEE 8"X8"X6 HD - extremo junta hidraulica	un	0,00	$ 3.751.835,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-3,06	Suministro e instalación CODO 45° 16" HD (semicodo) extremo junta hidraulica	un	0,00	$ 2.880.189,00		2,0	$ 5.760.378	-	2,0	$ 5.760.378	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-3,07	Suministro e instalación unión mixtas 6" R1-R2	un		$ 266.611,00		2,0	$ 533.222	=	-	$ -	2,0	$ 533.222,0	0,0	0,00	2,0	$ 533.222
NP-3,08	Suministro e instalación Codo 90° Gravedad Corte 6" RDE 21	un		$ 1.038.272,00		2,0	$ 2.076.544	-	2,0	$ 2.076.544	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-3,09	Suministro e instalación TEE 8X8X2 HD - extremo junta hidraulica	un		$ 543.977,00		1,0	$ 543.977	-	1,0	$ 543.977	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-3,10	Suministro e instalación unión mixtas 8" R1-R1	un		$ 256.511,00		1,0	$ 256.511	+	2,0	$ 513.022	3,0	$ 769.533,0	0,0	0,00	3,0	$ 769.533
NP-3,11	Suministro e instalación Reducción 16"x8" HD - extremo junta hidraulica	un		$ 1.427.627,00		1,0	$ 1.427.627	+	1,0	$ 1.427.627	2,0	$ 2.855.254,0	0,0	0,00	2,0	$ 2.855.254
NP-3,12	Suministro e instalación unión mixtas 16" R1-R1	un		$ 533.211,00		7,0	$ 5.532.477	-	1,0	$ 933.211	6,0	$ 5.599.266,0	0,0	0,00	6,0	$ 5.599.266
	SUBTOTAL				$ 14.217.955		$ 24.738.315			$ 4.519.192		$ 16.979.545,0		2.126.578,00		$ 28.896.126
4	CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES													0,00		
4.01	Suministro e instalacion de Geotextil NT 2100	m2	14,00	$ 6.955,00	$ 97.370	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -		0,00	0,0	$ -
4.02	Concreto para solados de 2000 PSI solido corte (140 KG/CM2). ZONA CENTRO	m3	0,72	$ 465.352,00	$ 335.651	0,720	$ 335.651	-	0,002	$ 953	0,0	$ -	0,715	335.123	0,72	$ 335.123
4.03	Concreto de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (251 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	7,85	$ 755.653,00	$ 5.930.511	13,2	$ 10.402.045	-	0,4	$ 331.545	12,8	$ 10.070.500,2	0,0	0,00	12,8	$ 10.070.500
4.04	Concreto de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (251 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	3,00	$ 755.653,00	$ 2.266.959	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.05	Concreto de 4000 PSI impermeabilizado a todo costo (251 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	2,00	$ 755.653,00	$ 1.511.306	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.06	Concreto de 3000 PSI a todo costo con Formaleta y impermeabilizado. ZONA CENTRO	m3	1,20	$ 724.359,00	$ 542.230	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.07	Suministro e instalación de Muro Retención 1.4. ZONA CENTRO (Pre enfasa)	m3	0,10	$ 420.109,00	$ 42.011	0,1	$ 42.011	-	0,1	$ 42.511	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.08	Acero de 60000 PSI incluye corte con Kp , cortado y figurado, incluye desperdicio del 3%	KG	981,00	$ 5.127,00	$ 5.028.537	1078,0	$ 5.528.535	-	12,6	$ 65.435	0,0	$ -	105,23	5.451.421	1.055,23	$ 5.451.421
4.09	Suministro e instalacion Cerramiento Malla Eslabonada Cal 12 y ambre cada cada	m	49,00	$ 27.395,00	$ 1.765.908	35,0	$ 958.877	-	0,7	$ 20.377	7,2	$ 270.1354	17,5	658.501,03	25,1	$ 938.639
4.10	Suministro e instalación ventanas rejapuerta con cerramiento lamina acero E mm 0,25 a 0,60 m	un	4,00	$ 72.894,00	$ 291.576	4,0	$ 291.576	=	-	$ -	4,0	$ 291.576,0	0,0	0,00	4,0	$ 291.576
4.11	Suministro e instalación conjunto compuerta tipo guillotina, DN 16 (HD-Hierro), incluye: Compuerta, volante de mando, estemplos, uniones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	un	4,00	$ 10.004.453,00	$ 40.017.812	4,0	$ 40.017.812	=	-	$ -	1,0	$ 10.004.453,0	3,0	30.013.359,00	4,0	$ 40.017.812
4.12	Suministro e instalación conjunto compuerta tipo KANA FAN DN 16 (HD-Hierro), incluye: Compuerta, volante de mando, estemplos, uniones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	un	2,00	$ 14.628.764,00	$ 29.257.528	1,0	$ 14.628.764	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	14.628.764,00	1,0	$ 14.628.764
4.13	Suministro e instalación codo 45° HD 16" de conducción y recubierto con PVC	un	1,00	$ 2.024.575,00	$ 2.024.575	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -

981000018

ACUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 3.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I		ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020
	p	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 16-06-2020
	VALOR:	1.672.264.944	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020
	ANTICIPO:	200.839.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario
	FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario
			FECHA: 03.11.2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				OBRA EJECUTADA					
						SEGÚN MODIFICATORIO No 2						PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	VUNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.14	Suministro e instalación de Niple cementado HD 16" Lot. 5 m extremos lisos	un	1,00	$ 1.810.831,00	$ 1.810.831	1,0	$ 1.810.831	=	-	$ -		0,0	$ -	1,0	1.810.831,00	1,0	$ 1.810.831
4.15	Suministro e instalación de Niple cementado HD 10" Lot. 5 m extremos lisos	un	5,00	$ 1.036.341,00	$ 5.181.705	2,0	$ 2.072.682	=	-	$ -		0,0	$ -	2,0	2.072.682,00	2,0	$ 2.072.682
4.16	Suministro e instalación de Codo 90° HD 10" extremos para hidrantes	un	4,00	$ 1.184.887,00	$ 4.739.548	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.17	Suministro e instalación de Niple cementado HD 10" Lot. 5 m extremos biselados	un	2,00	$ 1.221.429,00	$ 2.442.858	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.18	Suministro e instalación de Brida acoplamiento (Brida local 10" (250 mm), para colectores	un	2,00	$ 220.895,00	$ 441.790	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.19	Suministro e instalación de Brida cementable HD 10" (250 mm)	un	4,00	$ 600.508,00	$ 2.402.032	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.20	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 3 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0,30 mts espesor de 3mm, incluye pernos de anclaje	un	2,00	$ 576.900,00	$ 1.153.800	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.21	Suministro e instalación de Tapa en lámina antideslizante espesor de 0,50 x 0,50 m incluye marco de angulo 2" x 1/8"	un	6,00	$ 386.873,00	$ 2.315.238	6,0	$ 2.315.238	=	-	$ -		0,0	$ -	6,0	2.315.238,00	6,0	$ 2.315.238
4.22	Suministro e instalación de barandas con soporte a la estructura en tubo galvanizado de 1 1/2", Calibre 14.	m	5,00	$ 191.109,00	$ 955.545	5,0	$ 955.545	-	5,0	$ 955.545		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
4.23	Suministro e instalación de registros de medidor	un	5,00	$ 27.440,00	$ 137.200	5,0	$ 137.200	=	-	$ -		5,0	$ 137.200,0	0,0	0,00	5,0	$ 137.200
NP-4.24	Suministro e instalación de Niple cementado HD 12" Lot. 5 m extremos lisos	un		$ 1.317.011,00		4,0	$ 5.268.044	=	-	$ -		0,0	$ -	4,0	5.268.044,00	4,0	$ 5.268.044
NP-4.25	Suministro e instalación conjunto completo tipo AWWA P.N. DN 10 (HD-Hierro, incluye: Carretes, codillos de mordaza, empaques, tornillos y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	un		$ 12.508.871,00		2,0	$ 25.017.742	=	-	$ -		0,0	$ -	2,0	25.017.742,00	2,0	$ 25.017.742
CP-7.12	Suministro e instalación de tapa valvula HD 12" para Hidrantes	un		$ 542.278,00		1,0	$ 542.278	=	-	$ -		0,0	$ -	1,0	542.278,00	1,0	$ 542.278
CP-7.09	Suministro e instalación de Codo 90° HD 12" extremos para hidrantes	un		$ 1.407.949,00		4,0	$ 5.631.796	=	-	$ -		0,0	$ -	4,0	5.631.796,00	4,0	$ 5.631.796
NP-4.26	Suministro e instalación unión mixtures 12" (61-51)	un		$ 5.610.011		4,0	$ 2.449.044	-	4,0	$ 2.449.044		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-4.27	Suministro e instalación desunión de maniobra 12" PVC RDE 21	un		$ 1.038.777		1,0	$ 1.038.777	=	-	$ -		0,0	$ -	1,0	1.038.777,00	1,0	$ 1.038.777
NP-4.28	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 5 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0,30 m de espesor de 3mm, incluye pernos de anclaje	un		$ 1.194.044		5,0	$ 7.164.264	-	1,0	$ 1.194.044		5,0	$ 5.970.220,0	0,0	0,00	5,0	$ 5.970.220
	SUBTOTAL				$ 111.584.263		$ 176.024.953			$ 5.655.784			$ 26.744.897,6		95.025.581		$ 121.769.249
5	ADECUACION Y CONSTRUCCION CAJARA DE ENTRADA Y SALIDA A TANQUE 2																
5.01	Concreto para sobre de 3000 PSI clase corte (140 KG/CM2) ZONA CENTRO	m3	0,47	$ 456.392,00	$ 207.265	0,9	$ 410.753	+	0,0	$ 559		0,0	$ -	0,54	491.743	0,5	$ 491.743
5.02	Concreto de 4000 PSI impermeabilizado a dos caras (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	4,00	$ 785.653,00	$ 3.142.612	23,0	$ 18.077.575	-	0,0	7557		0,0	$ -	23,0	18.070.019,00	23,0	$ 18.070.019
5.03	Concreto de 4000 PSI impermeabilizado a dos caras (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	1,00	$ 785.653,00	$ 785.653	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.04	Concreto de 4000 PSI impermeabilizado a dos caras (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	1,00	$ 785.653,00	$ 785.653	0,0	$ -	=	-	$ -		0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.05	Acero de 60000 PSI incluye acero con Kg, corrado y figurado incluye desperdicio del 3%	Kg	400,00	$ 5.157,00	$ 2.480.880	2362,3	$ 12.111.512	=	-	$ -		0,0	$ -	2362,3	12.111.512	2362,3	$ 12.111.512

0 0 0 0 0 1 8 7

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I			ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020	
	P	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 16-06-2020	
	VALOR:	1.072.264.844	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020	
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020	
	ANTICIPO:	268.839.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020	
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario	
	FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario	
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario	FECHA: 02-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 2		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VUNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.06	Suministro e instalación de Válvula compuerta clase mínimo recubrimiento HD 12" (250 mm) extremos bridados	un	2,00	$ 3.537.016,00	$ 7.074.032	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.07	Suministro e instalación de Tee HD 10X10 extremos bridados	un	1,00	$ 2.251.030,00	$ 2.251.030	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.08	Suministro e instalación de Niple HD 10"Lx0,25 m extremos bridados	un	4,00	$ 1.034.211,00	$ 4.136.844	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.09	Suministro e instalación de Codo 90° HD 10" extremos bridados	un	2,00	$ 1.653.030,00	$ 3.306.060	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.10	Suministro e instalación de Niple pasamuro HD 10" Lx0,25 m extremos bridados	un	2,00	$ 936.942,00	$ 1.873.884	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.11	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 3 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0,35 m de espesor de 3mm, incluye pernos de anclaje	un	2,00	$ 676.860,00	$ 1.353.720	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
5.12	Suministro e instalación de Tapa en lámina antideslizante para cámara de 0,80 x 0,80 m incluye marco en ángulo 2" x 1/8"	un	3,00	$ 385.972,00	$ 1.157.916	4,0	$ 1.543.432	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	1.543.432,00	4,0	$ 1.543.432
5.13	Demolición de muro en concreto e=0,25 m, incluye cargue	m2	5,00	$ 23.525,00	$ 117.625	6,0	$ 141.025	-	2,0	$ 71.257	0,0	$ -	2,0	48.592	2,0	$ 48.593
NP-5.14	Suministro e instalación Codo de 90 diametro 12" en PVC	un		$ 1.220.354,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.15	Suministro e instalación Niple diámetro 12" PVC ELXEL L=0,25 m	un		$ 155.511,00		2,0	$ 311.022	-	2,0	$ 311.022	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.16	Suministro e instalación Unión 24"12"	un		$ 732.354,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.17	Suministro e instalación de Niple pasamuro HD 12" Lx1,2 m extremos bridados	un		$ 2.328.102,00		1,0	$ 2.328.102	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	2.328.102	1,0	$ 2.328.102
NP-5.18	Suministro e instalación valvula de compuerta EB 12" HD	un		$ 5.433.453,00		1,0	$ 5.433.453	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	5.433.453	1,0	$ 5.433.453
NP-5.19	Suministro e instalación Niple Pasamuro EBXEL HD 12" Lx1,25 m	un		$ 2.445.292,00		1,0	$ 2.445.292	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	2.445.292	1,0	$ 2.445.292
CS.23	Suministro e instalación de Unión de desmontaje pasamuro HD 10" (250 mm)	un		$ 1.651.265,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.20	Suministro e instalación Niple 10" HD Lx0,25 EBXEB	un		$ 1.075.155,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.21	Suministro e instalación Niple 10" HD Lx0,5 EBXEB	un		$ 1.376.651,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.22	Suministro e instalación Valvula de compuerta 10" HD EB	un		$ 3.418.231,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.23	Suministro e instalación Unión de desmontaje 10" HD	un		$ 4.481.232,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.24	Suministro e instalación Niple pasamuro EBXEL HD 10" Lx1,2 m	un		$ 3.288.047,00		1,0	$ 3.288.047	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	3.288.047	1,0	$ 3.288.047
NP-5.25	Suministro e instalación Brida pasamuro 10" HD	un		$ 506.353,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.26	Suministro e instalación Niple PEAD 16" Lx0,35 m	un		$ 147.121,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.27	Suministro e instalación TEE 16" PEAD	un		$ 1.514.550,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-4.28	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 3 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0,35 m de espesor de 3mm, incluye pernos de anclaje	un		$ 1.164.044,00		2,0	$ 2.328.088	=	-	$ -	2,0	$ 2.328.088,0	0,0	0,00	2,0	$ 2.328.088
CS.09	Suministro e instalación de Codo 90° HD 16" extremos para mecánicos	un		$ 1.870.349,00		2,0	$ 2.540.698	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	2.540.698	2,0	$ 2.540.698
NP-4.29	Suministro e instalación unión mecánica 16" RM-RI	un		$ 810.211,00		7,0	$ 4.270.077	-	3,0	$ 1.830.033	0,0	$ -	4,0	2.440.044	4,0	$ 2.440.044

00000188

ACUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 2

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I		ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020
	D	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 10-06-2020
	VALOR:	1.072.264.934	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020
	ANTICIPO:	280.836.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) dias calendario
	FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) dias calendario
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) dias calendario

FECHA: 03-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
						SEGÚN MODIFICATORIO No 2					PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VUNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP-5.28	Suministro e instalación TEE HD 12" EB-EL	un		$ 2.065.655,00		1,0	$ 2.065.655	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	2.065.655	1,0	$ 2.065.655
NP-5.29	Suministro e instalación de Niple HD 12"L15 EB-EB	un		$ 3.731.642,00		1,0	$ 3.731.642	-	1,0	-$ 3.731.642	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-5.30	Suministro e instalación Niple HD 16" Le0,40 m EB-EL	un		$ 1.706.831,00		1,0	$ 1.706.831	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	1.706.831	1,0	$ 1.706.831
	SUBTOTAL				$ 22.555.075		$ 63.214.572			-$ 5.950.951		$ 2.326.826,0		54.875.537		$ 57.263.620
6	TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO															
6.01	Mejoramiento de 20 cm con recebo para orientación	m2	164,00	$ 15.555,00	$ 1.683.884	60,0	$ 1.279.520	=	-	$ -	0,0	$ -	60,0	1.279.920,00	60,0	$ 1.279.920
6.02	Suministro e instalación de Geotextil NT1100	m2	405,00	$ 5.555,00	$ 2.322.750	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.03	Nivelación con mezcla pobre, e=0.05m	m2	405,00	$ 5.032,00	$ 2.042.592	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.04	Concreto para zapas de 3000 PSI a todo costo (140 KG/CM2). ZONA CENTRO	m3	20,00	$ 426.392,00	$ 8.527.840	21,3	$ 9.081.511	-	1,0	-$ 426.392	0,0	$ -	20,0	8.555.149	22,3	$ 8.555.149
6.05	Concreto de 4000 PSI Impermeabilizado a todo costo (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	141,00	$ 785.552,00	$ 110.777.832	134,0	$ 105.277.552	=	-	$ -	0,0	$ -	134,0	105.277.552,00	134,0	$ 105.277.552
6.06	Concreto de 4000 PSI Impermeabilizado a todo costo (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	142,00	$ 785.553,00	$ 111.552.726	142,0	$ 111.552.726	=	-	$ -	0,0	$ -	142,0	111.552.726,00	142,0	$ 111.552.726
6.07	Concreto de 4000 PSI Impermeabilizado a todo costo (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	2,00	$ 785.553,00	$ 1.571.106	3,0	$ 2.356.659	=	-	$ -	0,0	$ -	3,0	2.356.659,00	3,0	$ 2.356.659
6.08	Concreto de 4000 PSI Impermeabilizado a todo costo (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	7,00	$ 785.553,00	$ 5.499.871	7,0	$ 5.499.871	=	-	$ -	0,0	$ -	7,0	5.499.871,00	7,0	$ 5.499.871
6.09	Concreto de 4000 PSI Impermeabilizado a todo costo (281 KG/CM2). Con formaleta. ZONA CENTRO	m3	72,00	$ 785.553,00	$ 56.557.016	114,3	$ 89.809.139	=	-	$ -	0,0	$ -	114,3	89.809.139	114,3	$ 89.809.139
6.10	Suministro e instalación de Monoro Relación 1:4. ZONA CENTRO (Para caPuesta)	m3	1,00	$ 420.109,00	$ 420.109	1,0	$ 420.109	=	-	$ -	1,0	$ 420.109,0	0,0	0,00	1,0	$ 420.109
6.11	Acero de 60000 PSI incluye acero por Kg cortado y figurado, incluye desperdicio del 3%	KG	49274,00	$ 5.127,00	$ 231.855.798	49240,0	$ 252.453.480	-	0,5	-$ 2564	164,0	$ 738.288,0	49095,5	251.712.629	49259,5	$ 252.450.917
6.12	Suministro e instalación Cota PVC Sal 0-22 o similar todo costo	m	119,00	$ 37.356,00	$ 4.453.164	123,0	$ 4.599.708	-	4,0	-$ 149.584	0,0	$ -	119,0	4.450.124,00	119,0	$ 4.450.124
6.13	Suministro e instalación de Unión universal universal HD 12" (315 mm a 33 mm) RI	un	1,00	$ 579.741,00	$ 579.741	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.14	Suministro e instalación de Tee HD12x6" (315x200 mm) extremos bridados	un	1,00	$ 2.556.113,00	$ 2.556.113	1,0	$ 2.556.113	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	2.556.113,00	1,0	$ 2.556.113
6.15	Suministro e instalación de Válvula compuerta clásica vástago no ascendente HD 12" (320 mm) extremos bridado	un	2,00	$ 4.735.911,00	$ 9.471.822	2,0	$ 9.471.822	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	9.471.822,00	2,0	$ 9.471.822
6.16	Suministro e instalación de Unión de desmontaje automático HD 12" (320 mm)	un	2,00	$ 2.245.934,00	$ 4.491.868	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.17	Suministro e instalación de Niple HD 12" Le0,70 m extremos bridados	un	2,00	$ 1.266.511,00	$ 2.533.022	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.18	Suministro e instalación de Niple extremos HD 12" Le0,70 m, extremos bridados	un	2,00	$ 2.313.744,00	$ 4.627.488	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.19	Suministro e instalación de Niple extremos HD 12" Le1,00 m extremos bridados	un	2,00	$ 822.111,00	$ 1.644.222	4,0	$ 3.288.444	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	3.288.444,00	4,0	$ 3.288.444
6.20	Suministro e instalación de Válvula compuerta clásica vástago no ascendente HD 12" (450 mm) extremos bridado	un	4,00	$ 3.537.015,00	$ 14.148.060	4,0	$ 14.148.060	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	14.148.060,00	4,0	$ 14.148.060

0000189

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I			ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020	
	D	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 10-06-2020	
	VALOR:	1.072.264.944	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020	
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020	
	ANTICIPO:	280.839.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020	
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario	
	FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario	
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario	FECHA: 03-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
						SEGÚN MODIFICATORI No 2					PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UND	CANT	VRUNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.21	Suministro e instalación de Nole HD 10" Le0.40 m extremos bridados	un	6,00	$ 1.034.211,50	$ 6.205.269	2,0	$ 2.068.422	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	2.068.422,00	2,0	$ 2.068.422
6.22	Suministro e instalación de Codo 90° HD 10" extremos bridados	un	4,00	$ 1.553.438,50	$ 6.213.762	4,0	$ 6.213.762	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	6.213.762,00	4,0	$ 6.213.762
6.23	Suministro e instalación de Unidad de desmontaje (extremante HD 10" (250 mm)	un	7,00	$ 1.591.296,00	$ 11.139.072	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.24	Suministro e instalación de Tee HD 10x10 extremos bridados	un	3,00	$ 2.281.030,00	$ 6.843.090	3,0	$ 6.843.090	=	-	$ -	0,0	$ -	3,0	6.843.090,00	3,0	$ 6.843.090
6.25	Suministro e instalación de Brida acrafaterne (Brida loca) 10" (250 mm), para colombiano	un	4,00	$ 184.248,00	$ 736.992	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.26	Suministro e instalación de Brida orientable HD 10" (250 mm)	un	4,00	$ 616.333,00	$ 2.465.332	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.27	Suministro e instalación de Nole HD 10" Le0.50 m extremos bridados	un	4,00	$ 1.538.958,00	$ 6.155.832	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.28	Suministro e instalación de Nole HD 10" Le2.40 m extremos bridados	un	3,00	$ 3.777.058,00	$ 11.331.174	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.29	Suministro e instalación de Macromedidor mecanico 10" tipo Woltmann	un	1,00	$ 5.459.813,00	$ 5.459.813	1,0	$ 5.459.813	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	5.459.813,00	1,0	$ 5.459.813
6.30	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 3 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0.35 m de acceso de 3mm incluye pernos de anclaje	un	5,00	$ 576.900,00	$ 2.884.500	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.31	Suministro e instalación de Tees en lámina a'layer para cámara de 0.80 x 0.80 m incluye pernos en ángulo 2" x 1/8"	un	5,00	$ 385.673,00	$ 1.928.365	5,0	$ 1.928.365	=	-	$ -	0,0	$ -	5,0	1.928.365,00	5,0	$ 1.928.365
6.32	Suministro e instalación de replas de medición	un	2,00	$ 27.440,00	$ 54.880	2,0	$ 54.880	=	-	$ -	2,0	$ 54.880,0	0,0	0,00	2,0	$ 54.880
6.33	Suministro e instalación de regla 4" en acero inoxi	un	3,00	$ 21.746,00	$ 65.238	3,0	$ 65.238	-	3,0	-$ 65.238	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
6.34	Anden peimetral en concreto 21 Mpa e=0.07 m y 1.0 m de ancho	m	100,00	$ 54.450,00	$ 5.445.000	100,0	$ 5.445.000	-	10,0	-$ 544.500	0,0	$ -	90,0	4.900.500,00	90,0	$ 4.900.500
6.35	Cuneta en concreto de 14 MPa sección in Sitio e=0.01 m y 0.4 m de ancho, incluye la conformación de la superficie de asiento	m	100,00	$ 16.505,00	$ 1.650.500	100,0	$ 1.650.500	-	10,0	-$ 165050	0,0	$ -	90,0	1.525.045,00	90,0	$ 1.525.045
6.36	Protección de talud final con geotextil en fique	m2	60,00	$ 9.955,50	$ 597.330	300,0	$ 2.950.700	=	-	$ -	300,0	$ 2.950.700,0	0,0	0,00	300,0	$ 2.950.700
NP-6.01	Suministro e instalación nole asa nivo EBXEL HD 12" L=1.2 m	un		$ 3.288.047,00		1,0	$ 3.288.047	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	3.288.047,00	1,0	$ 3.288.047
NP-6.37	Suministro e instalación codo se 90 diametro 12" en HD EBXEB	un		$ 2.391.004,00		3,0	$ 7.173.012	=	-	$ -	0,0	$ -	3,0	7.173.012,00	3,0	$ 7.173.012
NP-6.38	Suministro e instalación Nole 12" L=0.42 m EBxEB en HD	un		$ 1.577.551,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-6.39	Suministro e instalación nole asa nivo cabo Z EBXEB HD 12" L=1.77 m	un		$ 3.139.758,00		2,0	$ 6.279.516	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	6.279.516,00	2,0	$ 6.279.516
NP-6.40	Suministro e instalación nole EBXEB HD 12" L=2.35m	un		$ 3.350.158,00		1,0	$ 3.350.158	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	3.350.158,00	1,0	$ 3.350.158
NP-6.41	Suministro e instalación Unión por espiga universal 10"	un		$ 457.147,00		9,0	$ 4.114.323	-	1,0	-$ 457.147	0,0	$ -	6,0	3.657.176,00	6,0	$ 3.657.176
NP-6.42	Suministro e instalación nole asa nivo HD 10" EBXEL L=0.75 m	un		$ 1.016.031,00		2,0	$ 2.032.062	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	2.032.062,00	2,0	$ 2.032.062
NP-6.43	Suministro e instalación Nole HD 0.78 m EBXEL 10"	un		$ 1.135.221,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-6.44	Suministro e instalación de Nole HD 10" L=1.52 m EBXEL	un		$ 1.244.382,00		4,0	$ 4.977.528	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	4.977.528,00	4,0	$ 4.977.528
NP-6.45	Suministro e instalación Nole HD 10"L=0.40 m EBXEL	un		$ 876.810,00		2,0	$ 1.753.620	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	1.753.620,00	2,0	$ 1.753.620
NP-6.46	Suministro e instalación Nole HD 10"L=0.55 m EBXEL	un		$ 936.253,00		3,0	$ 2.808.420	=	-	$ -	0,0	$ -	3,0	2.808.420,00	3,0	$ 2.808.420
NP-6.47	Suministro e instalación Nole HD 10"L=1.00 m EBXEL	un		$ 1.376.601,00		1,0	$ 1.376.601	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	1.376.601,00	1,0	$ 1.376.601

0 0 0 8 0 1 6 0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.					OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I																	ACTA DE RECIBO FINAL	
					CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA								FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020									
					P	101 DE 2019								FECHA DE REINICIACION 01: 16-06-2020									
					VALOR:	1.872.264.944								FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020									
					VALOR ADICIONAL:	0								FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020									
					ANTICIPO:	280.039.742								FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020									
					FECHA DE INICIACION:	25/11/2019								PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) dias calendario									
					FECHA DE APROBACION DE	01/10/2020								PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) dias calendario									
					I VPC:									PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) dias calendario								FECHA: 03-11-2020	
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA												
						SEGÚN MODIFICATORIO No 2					PRESENTE ACTA			ANTERIORES				ACUMULADA				
		UND	CANT	VR/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR		CANT	VALOR			CANT	VALOR			
NP-5,48	Suministro e instalacion Nple HD 10"Ls=0,62 m EBXEL	un		$ 1.032.257,00		2,0	$ 2.065.714	=	-	$ -	0,0	$ -		2,0	2.065.714,00			2,0	$ 2.065.714				
NP-5,49	Suministro e instalación Nple HD 10"Ls=3,31 m EBXEL	un		$ 3.760.401,00		1,0	$ 3.760.401	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	3.760.401,00			1,0	$ 3.760.401				
NP-5,50	Suministro e instalación Nple HD 10"Ls=1,35 m EBXEL	un		$ 1.737.171,00		1,0	$ 1.737.171	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	1.737.171,00			1,0	$ 1.737.171				
NP-5,51	Suministro e instalación Nple HD 10"Ls=0,72 m EBXEB	un		$ 1.499.791,00		4,0	$ 5.917.164	=	-	$ -	0,0	$ -		4,0	5.997.164,00			4,0	$ 5.997.164				
NP-5,52	Suministro e instalación Nple HD 10"Ls=1,7 m EBXEL	un		$ 1.517.455,00		1,0	$ 1.517.455	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	1.517.455,00			1,0	$ 1.517.455				
NP-5,53	Suministro e instalación Nple HD 10"Ls=4,0 m EBXEL	un		$ 4.080.875,00		1,0	$ 4.080.875	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	4.080.875,00			1,0	$ 4.080.875				
NP-5,54	Suministro e instalación reducción HD 12"X6" EBXEB	un		$ 1.050.897,00		1,0	$ 1.050.897	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	1.050.897,00			1,0	$ 1.050.897				
NP-5,55	Suministro e instalación reducción HD 6"X4" EBXEB	un		$ 478.703,00		1,0	$ 478.703	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	478.703,00			1,0	$ 478.703				
NP-5,56	Suministro e instalación Nple HD 6"Ls=0,3 m EBXEB	un		$ 755.420,00		1,0	$ 755.420	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	755.420,00			1,0	$ 755.420				
NP-5,57	Suministro e instalación Nple 3 m EBXEL 4" HD	un		$ 1.116.550,00		1,0	$ 1.116.550	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	1.116.550,00			1,0	$ 1.116.550				
NP-5,58	Suministro e instalación Material granular Grueso	m3		$ 134.557,00		43,6	$ 5.866.685	=	-	$ -	0,0	$ -		43,6	5.866.685			43,6	$ 5.866.685				
NP-5,59	Suministro e instalación Tubería perforada 4" para dren.	ml		$ 35.899,00		72,7	$ 2.621.414	=	-	$ -	0,0	$ -		72,7	2.621.414			72,7	$ 2.621.414				
NP-5,60	Suministro e instalación de Geotextil NT 2500	m2		$ 7.914,00		254,5	$ 2.014.113	=	-	$ -	0,0	$ -		254,5	2.014.113,00			254,5	$ 2.014.113				
NP-4,25	Suministro e instalación unión mixtures 12" R1-R1	un		$ 510.011,00		1,0	$ 510.011	=	-	$ -	0,0	$ -		1,0	510.011,00			1,0	$ 510.011				
NP-4,23	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 6 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0,35 m de espesor de 3mm, incluye cortes de anclaje	un		$ 1.154.044,00		1,0	$ 1.154.044	=	-	$ -	1,0	$ 1.154.044,0		0,0	0,00			1,0	$ 1.154.044				
NP-5,61	Suministro e instalación de escalera de acceso en tubo de acero inoxidable 1 1/2" con 11 pasos en tubo de acero inoxidable 1" cada 0,35 m de espesor de 3mm, incluye cortes de anclaje	un		$ 1.863.963,61		4,0	$ 7.453.852	=	-	$ -	4,0	$ 7.452.852,0		0,0	0,00			4,0	$ 7.453.852				
NP-5,62	Suministro e instalación niple paso muro 3" HD EBXEL L=0,5 m	un		$ 281.207,00		8,0	$ 2.250.216	=	-	$ -	0,0	$ -		8,0	2.250.216,00			8,0	$ 2.250.216				
NP-5,63	Suministro e instalación codo 3" 90° HD EBXEB	un		$ 305.927,00		16,0	$ 4.974.432	=	-	$ -	0,0	$ -		16,0	4.974.432,00			16,0	$ 4.974.432				
NP-5,64	Suministro e instalación de Tapa en lámina aligerada 3/16" para cámara caja de válvula, incluye marco en angulo 2 1/2"x2 1/2"x1/16"	m2		$ 601.567,00		6,9	$ 4.251.572	-	2,3	$ 1.400.524	4,6	$ 2.651.048,2		0,0	0,00			4,6	$ 2.651.048				
	SUBTOTAL				$ 635.424.985		$ 734.332.965			$ 3.756.479		$ 14.917.351,2			718.264.126				$ 733.076.437				
7	OBRAS EN TUBERIAS LINEA DE AGUA POTABLE																						
7.01	Instalación de tubería PEAD 250 mm (10") PE100 PN10	m	97,00	$ 9.325,00	$ 972.145	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -		0,0	0,00			0,0	$ -				
7.02	Instalación de tubería PEAD 450 mm (18") PE100 PN10	m	97,00	$ 35.119,00	$ 3.661.783	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -		0,0	0,00			0,0	$ -				
7.03	Instalación de tubería PVC Incluye: Ancho del fondo de la caja, bajada y empalme del tubo, tuberías, tapones, instalación accesorios y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. PVC de 4" Unión Mecánica	m	4,00	$ 2.483,00	$ 9.932	0,0	$ 14.898	=	-	$ -	0,0	$ -		0,0	14.898,00			0,0	$ 14.898				
7.04	Instalación de tubería PVC Incluye: Ancho del fondo de la caja, bajada y empalme del tubo, tuberías, tapones, instalación accesorios y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. PVC de 12" Unión Mecánica	m	134,00	$ 6.954,00	$ 931.836	95,0	$ 654.903	-	1,9	$ 12.703	0,0	$ -		93,1	622.203			93,1	$ 622.200				

00000191

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I			ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020	
	D:	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 16-06-2020	
	VALOR:	1.072.264.944	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020	
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020	
	ANTICIPO:	280 830 742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020	
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario	
	FECHA DE APROBACION DE FVPC:	01/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario	
			PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario	FECHA: 03-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
		UND	CANT	VUNIT	VALOR	SEGÚN MODIFICATORIO No 2					PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
						CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.05	Instalación de tubería PVC incluye: Arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, empaque, instalación de accesorios y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. PVC de 16" Union Mecanica	m	12,00	$ 7.937,03	$ 95.244	12,0	$ 95.244	-	5,0	$ 53555	0,0	$ -	4,0	31.545,00	4,0	$ 31.545
7.06	Suministro e instalación de Codo 45° HD 16" extremo junta Hidraulica	un	2,00	$ 2.544.257,00	$ 5.088.515	0,0	$ -	+	2,0	$ 5.088.515	2,0	$ 5.088.515,0	0,0	0,00	2,0	$ 5.088.515
7.07	Suministro e instalación de Codo 90° PEAD 10" PN10 T.E.	un	2,00	$ 714.201,20	$ 1.428.402	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.08	Suministro e instalación de Codo 90° PEAD 10" PN10 T.E	un	1,00	$ 1.783.735,00	$ 1.783.735	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.09	Suministro e instalación de Codo 90° HD 12" (305 mm), extremo junta Hidraulica	un	10,00	$ 1.470.245,60	$ 14.702.456	2,0	$ 2.940.559	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	2.940.559,00	2,0	$ 2.940.559
7.10	Suministro e instalación de Codo 90° HD 16" (400 mm), extremo junta Hidraulica	un	1,00	$ 3.126.578,00	$ 3.126.578	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.11	Suministro e instalación de Nave cassarino HD 12" L=6.5m extremos bridados + tee	un	2,00	$ 1.028.572,50	$ 2.057.145	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.12	Suministro e instalación de tapon extremo HD 12" junta hidraulica	un	1,00	$ 542.372,00	$ 542.372	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.13	Suministro e instalación de Tee PEAD 16x16x16 T.E	un	1,00	$ 2.550.466,00	$ 2.550.466	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.14	Suministro e instalación de Tee PEAD 16x10x16	un	1,00	$ 5.015.914,30	$ 5.015.914	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.15	Suministro e instalación de Valvula de mariposa (Cheque) HD 16"	un	2,00	$ 8.457.305,00	$ 16.914.610	1,0	$ 8.457.305	-	1,0	$ 8.457.305	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
7.16	Suministro e instalación de Valvula de mariposa (Cheque) HD 16"	un	1,00	$ 22.552.823,00	$ 22.552.823	1,0	$ 22.552.823	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	22.552.823,00	1,0	$ 22.552.823
NP-7.17	Suministro e instalación Tapon 4" ext	un		$ 53.227,00		1,0	$ 53.227	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	53.227,00	1,0	$ 53.227
NP-7.18	Suministro e instalación de Codo 45° HD 16" extremo junta Hidraulica	un		$ 3.328.547,50		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
NP-7.19	Instalación de tubería PVC incluye: Arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, lubricante, empaque, instalación de accesorios y demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la obra. PVC de 10" Union Mecanica	m		$ 6.522,00		100,0	$ 652.200	-	22,0	$ 143.508	0,0	$ 92.154,0	78,0	459.513,00	78,0	$ 508.754
04.16	Suministro e instalación codo 90° HD 10", extremo junta mecanica	un		$ 1.194.897,00		2,0	$ 2.389.794	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	2.389.794,00	2,0	$ 2.389.794
03.01	Suministro e instalación de Tee HD 16" x 16" (400 mm x 400 mm), extremo junta hidraulica	un		$ 4.085.650,00		2,0	$ 8.171.300	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	8.171.300,00	2,0	$ 8.171.300
NP-7.20	Suministro e instalación Reducción 16"x10" HD, extremo junta hidraulica	un		$ 1.513.477,00		2,0	$ 3.026.954	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	3.026.954,00	2,0	$ 3.026.954
NP-7.21	Suministro e instalación de Valvula compuerta cierre rapido + accesorios HD 10" (250 mm) extremo liso	un		$ 3.260.271,00		1,0	$ 3.260.271	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	3.260.271,00	1,0	$ 3.260.271
NP-7.22	Suministro e instalacion TEE HD 10", extremo junta hidraulica	un		$ 1.549.827,00		1,0	$ 1.549.827	=	-	$ -	0,0	$ -	1,0	1.549.827,00	1,0	$ 1.549.827
NP-4.23	Suministro e instalacion valvula mariposa 10" RH-H	un		$ 910.231,00		0,0	$ 3.550.056	=	-	$ -	0,0	$ -	6,0	3.550.056,00	6,0	$ 3.550.056
NP-7.23	Suministro e instalacion valvula mariposa 10" RH-H	un		$ 382.551,00		10,0	$ 3.825.510	=	-	$ -	0,0	$ -	10,0	3.825.510,00	10,0	$ 3.825.510
NP-3.12	Suministro e instalacion valvula mariposa 16" RH-H	un		$ 939.211,50		6,0	$ 5.635.269	+	3,0	$ 2.759.631	3,0	$ 2.759.631,0	6,0	5.635.269,00	9,0	$ 8.394.900
NP-7.24	Suministro e instalacion codo 45° 10" HD EL	un		$ 1.470.245,60		4,0	$ 5.881.366	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	5.881.366,00	4,0	$ 5.881.366
NP-7.25	Suministro e instalacion codo 45° 10" HD EL	un		$ 1.194.897,00		2,0	$ 2.389.794	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	2.389.794,00	2,0	$ 2.389.794
	SUBTOTAL				$ 81.412.755		$ 75.730.227			$ 749.255		$ 7.940.333,6		87.555.705		$ 74.941.015

0000192

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.					OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I													ACTA DE RECIBO FINAL	
					CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA								FECHA DE SUSPENSIÓN 01: 24-03-2020					
					ID	131 DE 2019								FECHA DE REINICIACIÓN 01: 16-06-2020					
					VALOR:	1.672.264.044								FECHA DE SUSPENSIÓN 02: 01-09-2020					
					VALOR ADICIONAL:	0								FECHA DE REINICIACIÓN 02: 21-09-2020					
					ANTICIPO:	280.639.742								FECHA DE TERMINACIÓN: 03-11-2020					
					FECHA DE INICIACIÓN:	25/11/2019								PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario					
					FECHA DE APROBACIÓN DE PVPC:	01/10/2020								PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario					
														PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario				FECHA: 03-11-2020	
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 2		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA								
											PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA				
		UND	CANT	VUNIT	VALOR	CANT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
8	OBRAS EN TUBERIAS LINEA DE LAVADO Y REBOSE																		
8.01	Instalación de Tubería corrugada PEAD 10" DE con hidrosello de caucho	m	434,00	$ 8.452,00	$ 3.681.168	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
8.02	Suministro e instalación de Codo 90° PEAD 10" PVC T.E.	un	2,00	$ 714.201,00	$ 1.428.402	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
8.03	Suministro e instalación de Tee PEAD 10" T.E	un	2,00	$ 906.324,00	$ 1.812.648	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
8.04	Pozo D= 1,20 m con placa de fondo, sección circular vaso	un	6,00	$ 1.223.933,00	$ 7.343.598		$ -	=	1,0	$ 1.223.933	1,0	$ 1.223.933,0	0,0	0,00	1,0	$ 1.223.933			
8.05	Suministro e instalación de cabezal de descarga en PEAD corrugado 10"	un	1,00	$ 572.004,00	$ 572.004	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
NP-8.06	Suministro e instalación Semicodo (45°) 10" PEAD extremos para hidrosellos	un		$ 740.792,00		0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
NP-8.07	Instalación de tubería y accesorios de PVC, incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 10"	ml		$ 8.462,00		138,0	$ 1.170.516	=	-	$ -	0,0	$ -	138,0	1.170.516,00	138,0	$ 1.170.516			
NP-8.08	Suministro e instalación codo PVC sanitario 10"	un		$ 314.035,00		4,0	$ 1.256.140	=	-	$ -	0,0	$ -	4,0	1.256.140,00	4,0	$ 1.256.140			
NP-8.09	Suministro e instalación TEE PVC sanitaria 10"	un		$ 500.885,00		3,0	$ 1.502.655	=	-	$ -	0,0	$ -	3,0	1.502.655,00	3,0	$ 1.502.655			
NP-8.10	Suministro e instalación semicodo (45°) 10" PVC sanitario	un		$ 298.885,00		2,0	$ 597.770	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	597.770,00	2,0	$ 597.770			
NP-8.11	Construcción de pozo de inspección punto recto, en concreto impermeabilizado de 3000 PSI re mezclado a los 28 días, espesor de 0,20 m incluye: formaleta, cerramiento, madera, vaciado, desencofrado, cañuela pulida en concreto sucia, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Sin cono de reducción, cilindro interno de 1,20 m y espesor 0,20 m., cono interno instalación de una base y tres tubos HF pared doble D400 según norma EN124, marco de obra, cuadro, desmonte, cerco, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diámetro total 1,50 m. mayor. Base y tres tubos. Pozo de inspección de mayor 4,00 metros de altura.	un		$ 4.197.735,00		2,0	$ 8.395.470	=	-	$ -	0,0	$ -	2,0	8.395.470,00	2,0	$ 8.395.470			
	SUBTOTAL				$ 14.537.540		$ 12.922.557			$ 1.223.933		$ 1.223.933,0		12.922.557,00		$ 14.146.490			
9	ENTIBADOS																		
9.01	Entibado discontinuo en madera tipo ED1, para control en profundidad entre 1,50 y 2,50 metros (incluye suministro e instalación para 2 usos)	m2	509,00	$ 12.313,00	$ 6.267.317	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
9.02	Entibado continuo en madera tipo EC1, para control en zanja con profundidad entre 2,50 y 3,50 metros (incluye suministro e instalación para 3 usos)	m2	8,0	$ 19.016,00	$ 152.128	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
9.03	Entibado continuo con barra metálica tipo EC2, para control en zanja con profundidad entre 3,50 y 5,00 metros (incluye suministro e instalación)	m2	135,00	$ 41.897,00	$ 5.656.095	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
9.04	Suministro e instalación de cabezal de descarga	m	25,00	$ 32.434,00	$ 810.850	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
	SUBTOTAL				$ 14.551.537		$ -			$ -		$ -		0,00		$ -			
10	VARIOS Y OTROS						$ -												
10.01	Desmonte y retiro con de pavimento tipo asfalto de macro y concreto rígido	m	2,00	$ 29.457,00	$ 58.914	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
10.02	Mano de tubería convencional 12 cm para sumideros	m2	8,00	$ 67.429,00	$ 539.432	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -			
	SUBTOTAL				$ 598.402		$ -			$ -		$ -		0,00		$ -			
	SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 1.195.509.743		$ 1.439.222.525			$ 8.819.541		$ 140.547.976,0		$ 1.282.580.611		$ 1.443.400.127			
11.00	SUMINISTROS TUBERIAS LINEA DE AGUA POTABLE Y REBOSE																		

0 0 0 0 0 1 9 3

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – DEPARTAMENTO DEL HUILA FASE I		ACTA DE RECIBO FINAL
	CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA	FECHA DE SUSPENSION 01: 24-03-2020
	p	101 DE 2019	FECHA DE REINICIACION 01: 16-09-2020
	VALOR:	1.872.264.944	FECHA DE SUSPENSION 02: 01-09-2020
	VALOR ADICIONAL:	0	FECHA DE REINICIACION 02: 21-09-2020
	ANTICIPO:	280.839.742	FECHA DE TERMINACION: 03-11-2020
	FECHA DE INICIACION:	25/11/2019	PLAZO INICIAL: Ciento cincuenta (150) días calendario
	FECHA DE APROBACION DE	04/10/2020	PLAZO ADICIONAL: Noventa (90) días calendario
	FVPC:		PLAZO TOTAL: Doscientos cuarenta (240) días calendario
			FECHA: 03-11-2020

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
		UNID	CANT	VAUNIT	VALOR	SEGÚN MODIFICATORIO No 2		+/-			PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
						CANT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.01	Suministro de tubería PEAD 250 mm (10") PE100 PN10	m	57,00	$ 145.554,00	$ 12.859.295	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
11.02	Suministro de tubería corrugada PEAD 10" DE con hidrosello de caucho	m	424,00	$ 90.813,00	$ 38.561.540	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
11.03	Suministro de tubería PEAD 450 mm (18") PE100 PN10	m	77,00	$ 511.068,00	$ 39.352.836	0,0	$ -	=	-	$ -	0,0	$ -	0,0	0,00	0,0	$ -
11.04	Suministro de tubería PVC de 16" UNIDE 21 200 PSI	m	12,00	$ 402.668,00	$ 4.832.016	12,0	$ 4.832.016	=	-	$ -	8,0	$ 3.268.344,0	4,0	1.634.672,00	12,0	$ 4.904.016
11.05	Suministro de tubería PVC de 12" UNIDE 21 200 PSI	m	134,00	$ 251.074,00	$ 33.640.916	95,0	$ 23.852.030	-	1,5	$ 477.041	0,0	$ -	93,10	23.374.988,43	93,1	$ 23.374.988
11.06	Suministro de tubería PVC 4" UNIDE 21 200 PSI	m	6,20	$ 30.479,00	$ 188.975	6,0	$ 184.614	=	-	$ -	0,0	$ -	6,0	184.614,00	6,0	$ 184.614
NP-11.07	Suministro de tubería PVC DE 12" UNIDE 21 200 PSI	m		$ 252.180,00		70,0	$ 15.412.500	=	3,0	$ 1.761.440	0,0	$ 1.761.440,0	70,0	15.412.500,00	73,0	$ 17.174.040
NP-11.08	Suministro de tubería corrugada PVC 10" DE con hidrosello de caucho	m		$ 69.017,00		140,0	$ 9.662.380	-	2,9	$ 135.034	0,0	$ -	138,0	9.524.345,00	138,0	$ 9.524.345
	SUBTOTAL SUMINISTROS				$ 112.762.742		$ 54.915.948			$ 1.145.365		$ 5.030.784,0		50.131.521,43		$ 55.187.305
	TOTAL COSTO DIRECTO (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)				$ 1.511.343.485		$ 1.504.293.868			$ 5.723.176		$ 145.578.760,0		1.352.991.937		$ 1.498.570.692

VALOR TOTAL OBRA CIVIL =	$ 1.398.580.743	$ 1.450.377.920	-$ 1.619.541	$ 148.547.976	1.302.568.411	$ 1.443.495.387
VALOR TOTAL SUMINISTROS =	$ 112.762.742	$ 54.915.948,68	-$ 1.145.365	$ 5.030.784	50.131.521	$ 55.187.305
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.511.343.485	$ 1.504.293.868	-$ 5.723.176	$ 145.578.760	1.352.991.937	$ 1.498.570.692
ADMINISTRACION OBRA CIVIL (17%)	$ 237.750.726	$ 246.547.248	-$ 1.167.072	$ 23.093.156	221.485.270,00	$ 245.578.426
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (3%)	$ 41.057.422	$ 42.606.338	-$ 206.086	$ 4.016.439	38.096.012,00	$ 42.302.052
UTILIDAD OBRA CIVIL (5%)	$ 68.929.037	$ 72.513.896	-$ 343.477	$ 7.027.398	65.143.021,00	$ 72.170.419
AIU OBRA CIVIL (25,00%)	$ 349.645.185	$ 362.569.482	-$ 1.717.305,3	$ 35.136.994	325.715.103,00	$ 360.852.097
ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS (10%)	$ 11.276.274	$ 5.491.594	$ 114.537	$ 503.078	4.910.522,00	$ 5.516.231
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 360.921.459	$ 367.971.076	-$ 1.602.768	$ 35.642.703	329.725.625,00	$ 366.368.328
TOTAL COSTOS DE LA OBRA	$ 1.872.264.944	$ 1.872.264.944	-$ 7.325.924,0	$ 182.221.463	1.682.717.557	$ 1.864.939.020
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO				$ -	280.839.742,00	
TOTAL A PAGAR				$ 182.221.463		

SON:CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.CTE.

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA
Rep. Legal Ing. OSCAR ANDRÉS GONZÁLEZ LOSADA
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERHUILA 2019
Rep. Legal Sup. VICTOR MANUEL OSPINO PEREZ
INTERVENTOR

0001194

CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Neiva, 12 de junio de 2015

Señores
AGUAS DL HUILA S.A. E.S.P

Referencia: SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA No. AHCDOB12-015

Los suscritos, **JOHN EDISON JORDAN TEJADA** actuando en nombre propio y la empresa **INCIVIL S.A.S** en representación legal de JOHN EDISON JORDAN TEJADA, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es **CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL PESCADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será de: El plazo estimado del contrato y un (01) años más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	PARTICIPACION (%) (1)
JOHN EDISON JORDAN TEJADA	50%
INCIVIL SAS	50%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El consorcio se denomina **CONSORCIO EL PESCADO**
4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria.
5. El representante del Consorcio es **JOHN EDISON JORDAN TEJADA** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.628.185 de Bogotá, actuara para todos los efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o Poder, el representante legal queda autorizado y facultado de manera amplia y suficiente para suscribir todos los documentos relacionados con el contrato incluyendo todas las pólizas, garantías, actas, certificaciones, aclaraciones, liquidación y demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así como para representar al Consorcio judicial o extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública o privada de conformidad con lo preceptuado por la Ley 80 de 1993 y normas concordantes. Actuará como suplente **JOHN WILLIAN PEREZ PEÑA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.264.518 de Neiva
6. La sede del Consorcio es:
   Dirección de correo: CARRERA 4 No. 4-41
   Correo electrónico:johnjordan_08@hotmail.com
   Teléfono: 3187077741
   Ciudad: Neiva

96

00000195

En constancia, se firma en Neiva, a los 12 días del mes de junio de 2015.

JOHN EDISON JORDAN TEJADA
C.C. No. 79.628.185 de Bogotá
Integrante
CONSORCIO EL PESCADO

INCIVIL S.A.S
NIT. 813.010.363-0
RL. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
Integrante
CONSORCIO EL PESCADO

JOHN EDISON JORDAN TEJADA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EL PESCADO

JOHN WILLIAN PEREZ PEÑA
SUPLENTE
CONSORCIO EL PESCADO

00000196
