Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORME DE INTERVENTORÍA N°1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SI-CMA-007-2022.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

PERIODO DEL INFORME: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023.

BUSERCO S.A.S.

INFORME N°1 DE INTERVENTORÍA

➢INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA N°:	SI-LP-016-2022.
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
CONTRATISTA:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
VALOR:	$4.802.706.494,00 M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	01 DE MARZO DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE AGOSTO DE 2023.
PERIODO DEL INFORME:	01/03/2023 AL 31/03/2023.

➢INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERVENTORÍA N°:	SI-CMA-007-2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA.
VALOR TOTAL:	$331.498.300,00 M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	01 DE MARZO DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE AGOSTO DE 2023.
PERIODO DEL INFORME:	01/03/2023 AL 31/03/2023.

PERIODO DEL INFORME: 01/03/2023 AL 31/03/2023

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. INFORMACIÓN GENERAL 6
2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
2.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 8
3. CONTRATO DE OBRA 14
3.1 RELACIÓN CONTRATO DE OBRA N° SI-LP-016-2021 14
4. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS 18
4.2 ACTA DE INICIO 18
5. RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRAS 18
5.1. AVANCE CRONOLÓGICO DEL CONTRATO 20
6. ASPECTO DE ORDEN ADMINISTRATIVO 20
6.1 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 20
6.2 CONTROL DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA 21
7. CONTROL SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO DE OBRA 21
ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA 21
8. CRONOGRAMA DE OBRA 22
9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 22
9.1 NO CONFORMIDADES IMPUESTAS Y CERRADAS EN EL PERIODO 30
9.2 CONCLUSIONES 30
10. CORRESPONDENCIA 30
11. ASPECTOS DE ORDEN FINANCIERO 31
11.1.1. INFORMACIÓN PERSUPUESTAL 31
11.1.2. ACTAS PARCIALES DE COBRO DEL CONTRATISTA DE OBRA 31
12. CONTROL DE CALIDAD 31
ENTREGA, REPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN 31
ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO: 31
13. INTERVENTORÍA AMBIENTAL 32
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MANTERIALES DE CONSTRUCCIÓN 32
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS, RUIDO Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO 32
PQR DE LA COMUNIDAD 32
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen ejecutivo contrato de obra 6
Tabla 2. Resumen ejecutivo contrato de interventoría 6
Tabla 3. Relación contrato de obra 14
Tabla 4. Actividades de control técnico 17
Tabla 5 Actas de obra e interventoría 18
Tabla 6. Avance de obra 18
Tabla 7 Relación de personal propuesto Obra. 20
Tabla 8 Relación de personal propuesto Interventoría 20
tabla 9 Control de maquinaria contratista. 21
Tabla 10. Actividades ejecutadas a la fecha 21
Tabla 11. Actividades realizadas de carácter administrativo por interventoría. 28
Tabla 12. Correspondencia enviada 30
Tabla 13. Correspondencia recibida 30
Tabla 14 Flujo de inversión 31

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Avance físico general de obra. 19
Gráfico 2. Avance financiero de obra. 19

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del proyecto. 7

LISTADO DE ANEXOS

1. Programación.
   1.1 Programación de obra.
2. Actas de comité.
3. Control de ensayos de calidad.
4. Informes semanales.
5. Informe ejecutivo del proyecto.
6. Registro fotográfico.
7. Seguridad Social.
   8.1 Seguridad Social Obra.
   8.2 Seguridad Social Interventoría.
8. Informe Especialistas.
   9.1 Informe Área SST.
   9.2 Informe Técnico.
   9.3 Informe Área Hidráulica.
   9.4 Informe Área Geotecnia.
9. Contratos.
   9.1 Contrato de obra.
   9.2 Contrato de interventoría.
10. Especificaciones técnicas de construcción.
11. Informe PGIO.
12. Correspondencia enviada y recibida.
13. Garantías y aprobaciones.
14. Informe mensual contratista de obra.

1.INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al PRIMER informe de interventoría, comprendido entre el 01 de MARZO de 2023 hasta el 31 de MARZO de 2023, interventoría realizada al Contrato de obra No. SI-LP-016-2021, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Por medio de cual se pretende mejorar la movilidad. Dentro de esa visión, tener vías interconectadas y en buen estado es una prioridad, puesto que mejora notablemente el nivel de servicio a los usuarios y por ende la calidad de vida de los ciudadanos. La malla vial comprende un aspecto fundamental para el crecimiento y desarrollo de un departamento. El buen estado de sus vías le permite interconectar de forma oportuna y segura a sus habitantes con los distintos puntos del departamento.

El informe contiene las actividades desarrolladas por el Contratista DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, con Contrato de obra No. SI-LP-016-2021, con un plazo de SEIS (06) meses y un valor total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($4´802.706.494,00 M/CTE).

La interventoría es realizada por BUSERCO S.A.S, representado legalmente por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, dentro del Contrato No. SI-CMA-007–2022, con un plazo de SEIS (06) meses y un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 331´498.300,00 M/CTE).

2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO OBRA N°:	SI-LP-016-2022.
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
CONTRATISTA:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
VALOR:	$4.802.706.494,00 M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	01 DE MARZO DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE AGOSTO DE 2023.
PERIODO DEL INFORME:	01/03/2023 AL 31/03/2023.

Tabla 1. Resumen ejecutivo contrato de obra

CONTRATO INTERVENTORÍA N°:	SI-CMA-007-2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA.
VALOR TOTAL:	$331.498.300,00 M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	01 DE MARZO DE 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES.
FECHA DE TERMINACION:	31 DE AGOSTO DE 2023.
PERIODO DEL INFORME:	01/03/2023 AL 31/03/2023.

Tabla 2. Resumen ejecutivo contrato de interventoría

2.1.1LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en la zona rural del municipio de Valencia, en el Sector denominado **INCORA – FARO.** Valencia es un municipio de Colombia, situado al norte del país, y al sur del departamento de Córdoba a una distancia de 90 kilómetros de la capital del departamento (Montería), a unos 15 kilómetros del municipio de Tierralta y a 50 kilómetros de la hidroeléctrica Urrá. La cabecera municipal está situada cerca al Río Sinú con 8° 16´ de latitud norte y 76° 09´ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. Tiene 130 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 28° C. El municipio es un importante centro maderero, ganadero y agrícola del departamento.

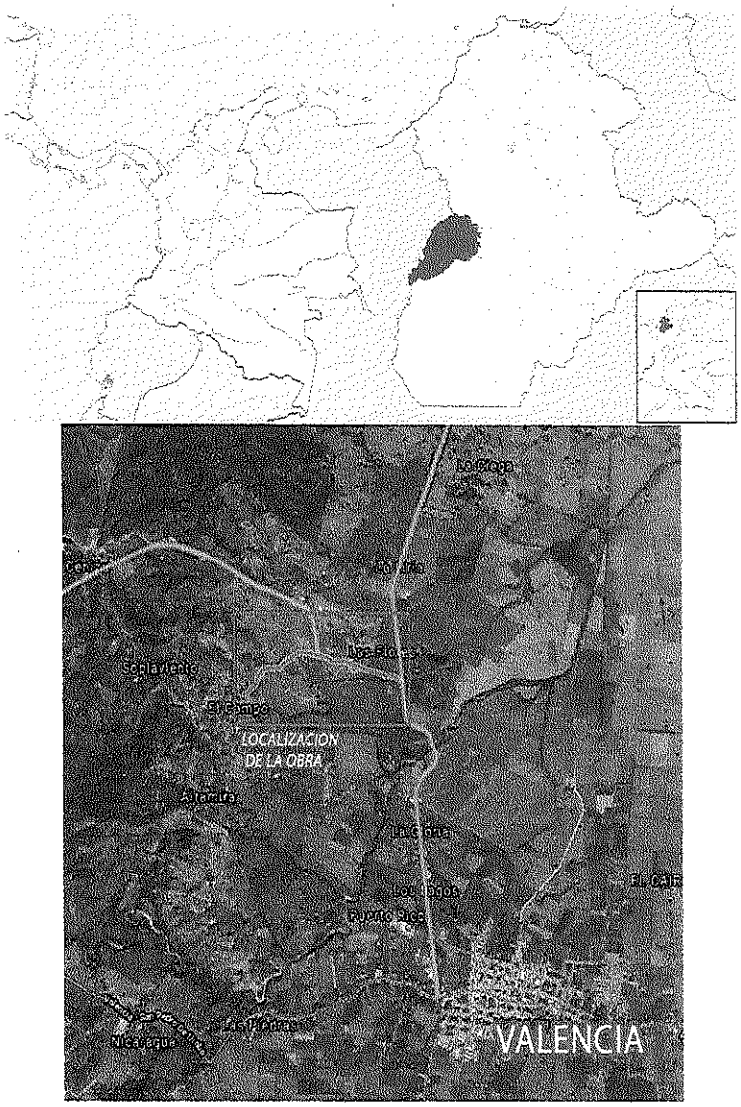


Ilustración 1. Localización general del proyecto.


2.1.2CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO


Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio de Valencia sector Incora, debido a que las vías se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del municipio por falta de presupuesto. De igual forma no se cuenta con la información, ni caracterización de estas vías lo que dificulta la priorización de su intervención. Las condiciones anteriormente mencionadas generan aumento de los tiempos de desplazamiento y producen baja comercialización de productos del municipio, lo que tiene como un efecto negativo el bajo desarrollo socioeconómico de la zona. Así mismo, el aumento de tiempos de desplazamiento afecta el acceso oportuno de la comunidad a servicios médicos, la asistencia de los niños y jóvenes a los centros educativos y ocasiona el aumento de los costos de transporte tanto de carga como de pasajeros.

Así mismo, es importante resaltar la afectación que ha tenido el departamento del Córdoba por el conflicto armado que ha marcado la historia de nuestro país. Dada suposición geográfica este departamento es considerado un corredor vial primordial que conecta varias zonas del país, razón por la cual los grupos armados ilegales han tenido especial interés.

El proyecto de mejoramiento en pavimento se localiza en un tramo crítico ubicado en el sector Incora – Faro, en el Municipio de Valencia, departamento de Córdoba, en el cual se pretende mejorar 2.58 kilómetros de la vía que va desde el K0+000 hasta el K2+580, la cual se encuentra en mal estado, y dificulta el tránsito de vehículos a velocidad constante, lo que genera dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio de Valencia.

La estructura de pavimento proyectada, para la unidad de diseño establecida, corresponde a una losa de concreto hidráulico, de resistencia a la flexión a 28 días, de 4.2 MPa y un espesor libre de 20 centímetros, apoyada sobre una base granular de 0.15 m. La estructura de pavimento es de la siguiente manera: Se plantea un ancho de calzada de pavimento de 6 m, Base de 0,15 m, espesor de pavimento de 0,2 m



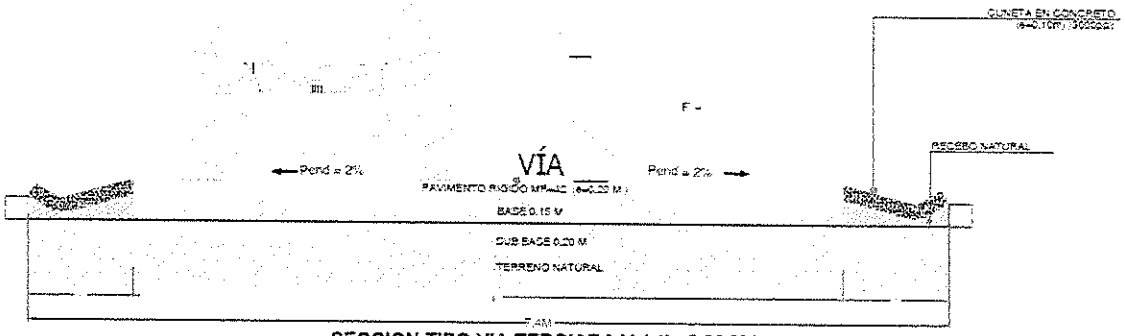

SECCION TIPO VIA TERCIARA V-1 (L=6.00 M)

Ilustración 2. Estructura del pavimento

TRAMO A INTERVENIR

	LONGITUD	COORDENADAS INICIO	COORDENADAS FINAL
INCORA FARO	2.580 M	GEOGRAFICAS N = 8°17'4.99" W = 76°9'35.47"	GEOGRAFICAS N = 8°16'44.76" W = 76°10'41.11"
		MAGNA SIRGAS WGS84 N = 1408509.236 W = 770548.805	MAGNA SIRGAS WGS84 N = 1407897.914 W = 768535.544
		ABSCISA INICIO K0+000	ABSCISA FINAL K2+580

TRAMO A CARACTERIZAR

	LONGITUD	COORDENADAS INICIO	COORDENADAS FIN
INCORA FARO	2.580M	GEOGRAFICAS N = 8°17'4.99" W = 76°9'35.47"	GEOGRAFICAS N = 8°16'44.76" W = 76°10'41.11"
		MAGNA SIRGAS WGS84 N = 1408509.236 W = 770548.805	MAGNA SIRGAS WGS84 N = 1407897.914 W = 768535.544
		ABSCISA INICIO K0+000	ABSCISA FINAL K2+580

2.1.2.1ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

- **CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE:** Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de subbase granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas.

- **EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR:** Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras a las cuales se refiere el presente Artículo, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Interventor. Comprende, además, la construcción de sistemas de apuntalamientos y entibados, encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que fuere necesario para la ejecución de los trabajos de excavación, así como el retiro subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, el transporte y la disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo.

- **ROCERÍA:** Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos.

  El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, previa autorización del Interventor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.

- **TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN:** Este trabajo consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, y el transporte de los materiales provenientes de derrumbes.

  Esta especificación no es aplicable al transporte de líquidos, productos manufacturados, elementos industriales, ni al de agregados pétreos, mezclas asfálticas, materiales para la construcción de los pavimentos rígidos, obras de concreto hidráulico y de drenaje.

- **SUB-BASE GRANULAR CLASE B:** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de sub- base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.

  Para los efectos de estas especificaciones, se denomina sub-base granular a la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la base granular o estabilizada, en todo tipo de pavimento, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización.

- **BASE GRANULAR CLASE B:** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.
  Para los efectos de estas especificaciones, se denomina base granular a la capa granular localizada entre la subbase granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización.

- **PLACA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO:** Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, colocada formando losas como rodadura de la estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas entre losas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o determinados por el Interventor.

- **ACERO DE TRANFERENCIA D=1/2" CORRUGADO:** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor.

- **ACERO DE TRANFERENCIA D=7/8" LISO:** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor.

- **SELLO DE JUNTAS ELASTOMETRICA:** Esta Especificación se refiere al lavado, limpieza, secado y sellado de las Juntas Transversales, Longitudinales y de Expansión para los Pavimentos en Concreto Hidráulico que se han construido y/o repuesto en desarrollo de un Proyecto.

- **CORTE DE JUNTAS:** Esta Especificación Técnica se refiere al Corte mecanizado, oportuno y adecuado, de Juntas Transversales y Longitudinales para Pavimentos, que hayan sido construidos en Concreto Hidráulico, y de acuerdo a las modulaciones definidas por la Interventoría.

- **EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN:** Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras a las cuales se refiere el presente Artículo, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Interventor. Comprende, además, la construcción de sistemas de apuntalamientos y entibados, encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que fuere necesario para la ejecución de los trabajos de excavación, así como el retiro subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, el transporte y la disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del trabajo.

- **CONCRETO CLASE D (3000 PSI) OBRAS DE DRENAJE:** Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico, colocada formando losas como rodadura de la estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecución de juntas entre losas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o determinados por el Interventor.

- **RELLENO PARA ESTRUCTURAS:** Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y alcantarillas, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor.

- **ACERO DE REFUERZO:** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones y recomendaciones dadas por el Interventor.

•**TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES:** Este trabajo consiste, única y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, y el transporte de los materiales provenientes de derrumbes.

Esta especificación no es aplicable al transporte de líquidos, productos manufacturados, elementos industriales, ni al de agregados pétreos, mezclas asfálticas, materiales para la construcción de los pavimentos rígidos, obras de concreto hidráulico y de drenaje.

•**SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO II (1,2*0,4) CON LÁMINA RETROREFLECTIVA:** Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales verticales de tránsito, conforme lo establezcan los planos del proyecto o lo indique el Interventor.

El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar de acuerdo con lo estipulado en el "Manual de Señalización Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004, y demás normas complementarias.

3.CONTRATO DE OBRA

3.1 RELACIÓN CONTRATO DE OBRA N° SI-LP-016-2021

1.**CONTRATO L.P No.:** 2.	**SI-LP-016-2021**	3.**FECHA INICIO:**	01 DE MARZO DE 2023.
4.**CONTRATISTA:**	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS.		
5.**OBJETO:**	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".		
6.**VALOR INICIAL:**	$ 4.802.706.494,00 M/CTE		
7.**VALOR ADICIÓN:**	N/A		
8.**VALOR TOTAL:**	$ 4.802.706.494,00 M/CTE		
9.**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	**INICIAL:** SEIS (06) MESES.	**DESDE**	**HASTA**
		01 DE MARZO DE 2023.	31 DE AGOSTO DE 2023.
10.**INTERVENTORÍA:**	BUSERCO S.A.S	**DESDE**	**HASTA**
		01 DE MARZO DE 2023.	31 DE AGOSTO DE 2023.
11.**ENTIDAD ASEGURADORA:**	**SEGUROS MUNDIAL**	12. **PÓLIZA No. CUMPLIMIENTO:**	**CMT-100004404**
		13.**PÓLIZA No. RESPONSABILIDAD CIVIL:**	**CMT-100001001**
14.**FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CONTRATO:**	18 DE AGOSTO DE 2022.		
15.**FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO:**	02 DE MARZO DE 2023.		
16.**FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVILACTA DE INICIO:**	03 DE MARZO DE 2023.		

17.**ACTAS DE OBRA:**	**TIPO**	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	INICIO	01-03-2023	31-08-2023

Tabla 3. Relación contrato de obra

ID	**Actividades del control técnico.** En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las actividades que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Actividad Para Controlar	**Descripción de la actividad**	**Frecuencia**
1	Visita inicial al sitio de la obra	Se realizó recorrido inicial en el sitio de la obra antes de la intervención.	Al inicio de la obra
2	Visita diaria a la obra.	Se realizan Supervisión y chequeos de las actividades ejecutadas, revisión de materiales, personal en obra, y avances de obra.	Diaria con la ejecución de la obra
3	Solicitudes al contratista fuente de materiales a utilizar y diseños de mezclas.	Se realiza la aprobación de las especificaciones de los materiales.	Durante el inicio y ejecución de la obra.
4	Revisión de cantidades de obras contractuales y de planos del proyecto. (proyecciones de obra)	Revisión periódica de cada una de las actividades del proyecto, de acuerdo con los planos, las cantidades contractuales y las cantidades ejecutadas.	Al inicio del contrato y semanal
5	Elaboración de bitácora de obra	Registro de actividades, control, cambios y compromisos acordados. Debe estar firmada por ambas partes (interventoría y contratista) y cada una de sus hojas foliadas. Bitácora de obra.	Diaria con la ejecución de la obra. La bitácora debe comenzar a llevarse desde el día en que se firma el acta de inicio hasta el día en que se termine la obra.
6	Medidas de las actividades ejecutadas durante el periodo.	Cuantificación de las medidas de las actividades ejecutadas durante el periodo para pagos parciales de obra, memorias de cantidades y control financiero.	Mensual o de acuerdo a la periodicidad de los pagos establecidos en el contrato de trabajo
7	Consultas e inquietudes del contratista.	Atención y respuesta a las inquietudes relacionadas con la ejecución de la obra, referidas a los sistemas constructivos, los diseños y los materiales a utilizar.	En el momento que sea necesario
8	Ensayos de campo y laboratorio	Revisión y aprobación de resultados de ensayos de campo y laboratorio, de acuerdo con las normas y especificaciones	De acuerdo con las especificaciones técnicas o las

ID	**Actividades del control técnico.** En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las actividades que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Actividad Para Controlar	**Descripción de la actividad**	**Frecuencia**
		técnicas dadas por la entidad contratante.	normas de construcción aplicadas
9	Control del equipo que será utilizado en la obra para realizar las actividades, mediciones, inspecciones y/o ensayos.	Verificación del estado y el rendimiento de la maquinaria y del equipo utilizado en la ejecución de la obra, así como el cumplimiento con la cantidad especificada por el contratista en la propuesta y en los análisis de precios unitarios de obra ordinaria.	Semanal con la ejecución de la actividad.
10	Elaboración de informes	Elaboración de informes semanales (registro sencillo de avance de obra, actividades ejecutadas, y registro fotográfico) y mensuales de interventoría para la entidad contratante dando un reporte detallado sobre la ejecución de la obra y los controles técnicos administrativos, financieros, y cumplimiento del plan de manejo ambiental y de calidad según la oferta económica.	Mensual o según exigencias del ente contratante.
11	Registro fotográfico.	Registro fotográfico sobre las actividades y el avance de la obra. Con una foto semanal panorámica donde se visualice el avance semanal Al finalizar la obra se entrega registro fotográfico del seguimiento de la obra en medio magnético.	Diaria con la ejecución de la obra
12	Suspensión temporal de la ejecución de la obra.	Suspensión temporal de la ejecución de la obra, en caso de que un procedimiento constructivo no sea correcto y el contratista haga caso omiso a la interventoría. El residente de interventoría cuenta con autoridad para suspender temporalmente la ejecución de la obra, sin que esto implique adición en el plazo para la terminación. Existen otras circunstancias que pueden	Cuando sea necesario

ID	**Actividades del control técnico.** En el cuadro siguiente se presenta una descripción de las actividades que desarrolla la interventoría, indicando los agentes responsables y la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas.		
	Actividad Para Controlar	**Descripción de la actividad**	**Frecuencia**
		generar suspensión de obra y de plazo, como: calamidades de orden público, demoras justificadas en la consecución de materiales, entre otros.	
13	Comunicación de las inconformidades que se presentan en la obra.	Comunicación escrita oportuna, al contratista, con relación a las inconformidades que se generan cuando las actividades no se desarrollan dentro de los límites permitidos en las especificaciones técnicas.	Cuando sea necesario
14	Comunicación de los correctivos que se deben adelantar.	Comunicación oportuna al contratista, indicando los correctivos pertinentes que deben ejecutarse para lograr los objetivos del contrato	Cuando sea necesario
15	Estudiar y recomendar las modificaciones que se consideren convenientes o necesarias para el logro de los objetivos del contrato y presentarlos, previa aprobación de la entidad contratante.	Comunicación oportuna al contratista, previo visto bueno de la entidad contratante, con relación a las recomendaciones o modificaciones necesarias para cumplir con los objetivos del contrato.	Cuando sea necesario
16	Comités técnicos de obra.	Realización y dirección de los comités técnicos de obra elaboración de las actas respectivas de cada comité aspectos a considerar en cada comité: proyecciones, avance de obra, avance financiero, plazo ejecutado, inquietudes técnicas, obra extra presentada, cambio de obra, dificultades en la ejecución de las actividades, inquietudes del contratista.	Los comités de obra podrán tener una programación semanal, quincenal o mensual, de acuerdo con la complejidad actividades e imprevistos que se presentan.
17	Inspección y recibo de las actividades del contrato.	Aceptación final de las actividades ejecutadas durante el contrato.	Recibo final del contrato

Tabla 4. Actividades de control técnico

4.RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

4.1 ACTA DE SOCIALIZACIÓN

Se reunieron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el contratista de las obras, la interventoría y la comunidad de la población del área aferente del proyecto, con el objeto de conocer los alcances, planos generales, presupuestos y características de la obra, plazos, así como las cantidades de obra dispuestas en el presupuesto que hace parte integral del contrato mencionado.

4.2 ACTA DE INICIO

Se suscribió posteriormente a la legalización, socialización de las obras a ejecutar y perfeccionamiento del contrato, a fin de establecer la fecha de iniciación de las obras contratadas.

NOMBRE DEL ACTA	EXISTE (SI/NO)
ACTA DE SOCIALIZACIÓN	SI
ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	SI
ACTAS DE COMITÉ	SI

Tabla 5 Actas de obra e interventoría

5.RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRAS

PERIODO	% Avance programado acumulado	% Avance ejecutado acumulado	$ Avance financiero programado acumulado	$ Avance financiero ejecutado acumulado
1	0.81%	14.61%	$ 38´901.922,60 M/CTE.	$ 701´675.418,77 M/CTE.

Tabla 6. Avance de obra

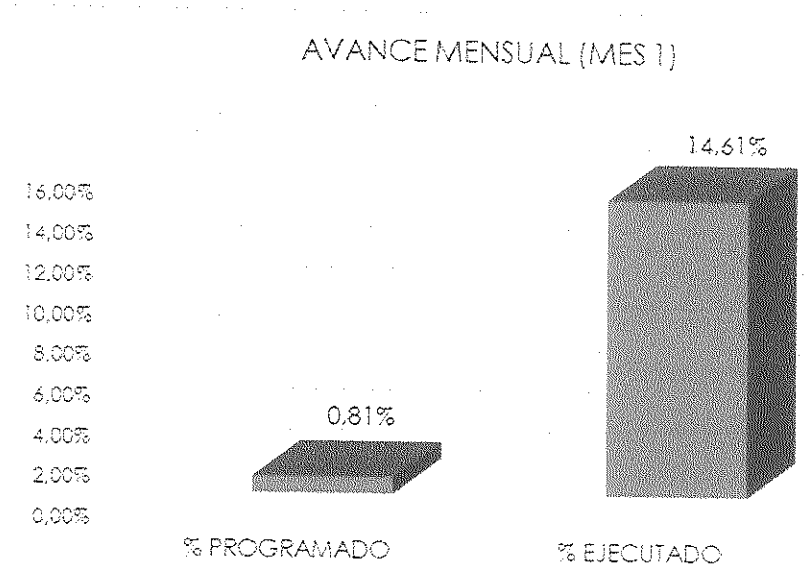


Gráfico 1. Avance físico general de obra.

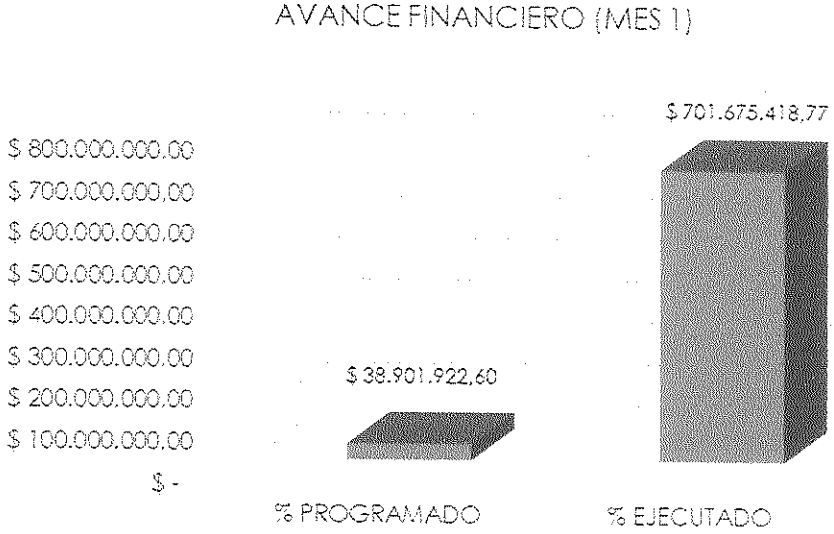


Gráfico 2. Avance financiero de obra.

En la gráfica anterior podemos evidenciar los avances programados y ejecutados durante el período del mes 1, que va del 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2023, el porcentaje de avance acumulado ejecutado hasta la fecha es del 14.61%, en comparación con el porcentaje de avance programado acumulado que es del 0.81%, por lo tanto, se evidencia que el contratista se encuentra por encima un 13.80% de lo programado.

Ver Anexo 12. Informes semanales

5.1.AVANCE CRONOLÓGICO DEL CONTRATO

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS)	31 días
TIEMPO TOTAL DE LA OBRA	184 días
% DE AVANCE EN TIEMPO	16.85%
TIEMPO RESTANTE	153 días

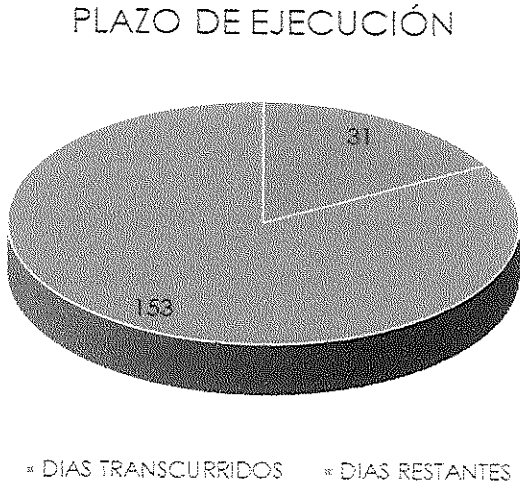


Gráfico 3. Tiempo de ejecución del proyecto

6.ASPECTO DE ORDEN ADMINISTRATIVO

6.1 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1.	DIRECTOR DE OBRA (Juan José Arango Banda)	1
2.	RESIDENTE DE OBRA (Larry Fernán Zapa Bohórquez)	1
3.	ESPECIALISTA HIDRAULICO (Juan Francisco Durango Grisales)	1
4.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (Jorge Eliecer Morales Padilla)	1

Tabla 7 Relación de personal propuesto Obra.

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Sergio Andrés Urrego Alfonso)	1
2.	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (Daniel José Villegas Vega)	1
4.	COORDINADOR SST (Diego Armando Calle Buendía)	1
5.	INGENIERO AMBIENTAL (Domingo Antonio De Arco Hoyos)	1
6.	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (Nelson Fernando Vanegas Ortiz)	1
7.	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA (Nathalia Patricia Hernández Ramos)	1

Tabla 8 Relación de personal propuesto Interventoría.

6.2 CONTROL DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATISTA

No	MAQUINARIA PROPUESTA	CANT.
1	NIVEL AUTOMÁTICO	1
2	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA	1
3	MOTONIVELADORA	1
4	VIBRO COMPACTADOR	1
5	RETROEXCAVADOR	2
6	VOLCO DOBLE	2

tabla 9 Control de maquinaria contratista.

7.CONTROL SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO DE OBRA ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

Las actividades ejecutadas desde la fecha de firma de acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2023 son:

VÍA INCORA-FARO, MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.00	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
	REVISIÓN ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA	
	REVISIÓN DISEÑO GEOMETRICO	
	REVISIÓN ESTUDIO GEOTECNICO	
	REVISIÓN ESTUDIO DE TRÁNSITO	
	REVISIÓN ESTUDIO DE PAVIMENTO	
	REVISIÓN ESTUDIO HIDRAULICO	
	REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL	
2.00	REALIZACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD	
3.00	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	
	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**UNIDAD**
1.00	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2
	MOVIEMIENTO DE TIERRA	
2.00	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3
3.00	ROCERÍA	KM
4.00	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3
	CAPAS GRANULARES	
5.00	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3

Tabla 10. Actividades ejecutadas a la fecha

8.CRONOGRAMA DE OBRA

Con el objetivo de ejecutar todas las actividades embebidas dentro del marco contractual en el plazo establecido para este proyecto, el contratista DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, presenta la siguiente programación ajustada a la fecha de firma del acta de inicio, la cual se puede evidenciar en el Anexo N°1 del presente informe "Programación de obra".

9.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
Entrega de documentación	Verificar el cumplimiento de salarios, pagos, salarios prestaciones sociales indemnizaciones, y demás obligaciones laborales, del personal vinculado en la ejecución de la obra.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría.
	Llevar una relación detallada listado del personal que el contratista tenga en su lugar de trabajo, así como las afiliaciones al sistema de seguridad social en fin de verificar la mano de obra no calificada utilizada de la zona de influencia.		
	Observar el desempeño del personal del contratista exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y profesional		

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	como corresponda en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.		
	Llevar un registro diario de la obra ejecutada del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría.		
	Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempañada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.		
	Establecer y controlar medidas, necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; Podrá emplear vigilantes a inspectores según		

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	corresponda esto costos están incluidos en el valor del contrato.		
	Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la consultoría.		
	Verificar que el contratista instale la valla apropiada por el municipio de montería.		
Entrega de documentación	Informar por escrito de la ocurrencia de las situaciones constitutivas de fuerza de mayor o caso fortuito al supervisor de la consultoría del municipio de montería y recomendar la acción debe proceder inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Consultar con el Departamento de Córdoba las inquietudes de orden legal que se presenten con en relación con la ejecución del contrato.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Realizar reuniones con el contratista por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de consultoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Departamento de Córdoba. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras.		
	Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Departamento de Córdoba relacionadas con los trabajos objeto de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
Entrega de documentación	Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las pre actas suscritas con el contratista.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Revisar y aprobar, con sujeción a la señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.		
	Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Departamento de Córdoba la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría
	Presentar al Departamento de Córdoba, los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría

ACTIVIDADES REALIZADAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del Departamento de Córdoba.		

Tabla 11. Actividades realizadas de carácter administrativo por interventoría.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
Entrega de documentación	Verificación de situación actual entes de acta de inicio.	Al inicio - Durante la ejecución del contrato.	Director y residente de interventoría.
	Exigir al contratista, el cronograma y la ruta crítica en Project, exigir al		

ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO	Descripción de la actividad según contrato de interventoría.	Frecuencia	Responsables
	contratista reprogramaciones cuando exista retraso.		
	Hacer controles y seguimientos.		
	Verificar que lo ejecutado en campo corresponda a los diseños.		
	Llevar la bitácora de obras.		
	Utilizar los informes de interventoría para la presentación de informes parciales de obra.		
	Adelantar acciones para prevenir mitigar retrasos.		
	Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional propuestos.		

Tabla 13. Actividades realizadas de carácter técnico por interventoría.

9.1 NO CONFORMIDADES IMPUESTAS Y CERRADAS EN EL PERIODO

Para el periodo comprendido entre el 01 de MARZO y el 31 de MARZO de 2023, no hubo inconformidad por parte de la interventoría respecto a las actividades ejecutadas y los procesos constructivos realizados por el contratista.

9.2 CONCLUSIONES

Para concluir, el contratista de obra, DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, ejecutó durante el periodo comprendido entre el 01 de MARZO y el 31 de MARZO de 2023, las actividades a satisfacción de la interventoría, periodo en el cual las actividades se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

10.CORRESPONDENCIA

Durante el periodo en mención se manejó la siguiente correspondencia

Ver anexo 16.1 Correspondencia enviada

FECHA	ENVIADO A	ASUNTO
01-03-2023	Daberlis Elías Arrieta Cárdenas	Solicitud de información inicial.
06-03-2023	Secretaría de Infraestructura Departamental	Remisión información inicial contratista de obra.
06-03-2023	Secretaría de Infraestructura Departamental	Remisión información inicial contratista de obra.

Tabla 12. Correspondencia enviada

Ver anexo 16.2 Correspondencia recibida

FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO
01-03-2023	Daberlis Elías Arrieta Cárdenas	Remisión Modelo de Valla Informativa
03-03-2023	Daberlis Elías Arrieta Cárdenas	Respuesta a solicitud información inicial
31-03-2023	Daberlis Elías Arrieta Cárdenas	Entrega informe PGIO y PMT N°1

Tabla 13. Correspondencia recibida

11.ASPECTOS DE ORDEN FINANCIERO

11.1.1.INFORMACIÓN PERSUPUESTAL

El contratista a la fecha presenta un avance financiero acumulado ejecutado de **$ 701´675.418,77 M/CTE.** del valor total del contrato, correspondiente a un 14.61%.

A continuación, se relaciona el flujo de inversión ejecutado vs programado:

AVANCE	Periodo 1 (Mes 1)	
	%	$
Avance financiero programado	0.81%	$ 38´901.922,60 M/CTE.
Avance financiero Ejecutado	14.61%	$ 701´675.418,77 M/CTE.

Tabla 14 Flujo de inversión

11.1.2.ACTAS PARCIALES DE COBRO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Hasta el momento el contratista no ha presentado actas parciales de cobro.

12.CONTROL DE CALIDAD

En el presente informe de seguimiento al plan de calidad, se reporta las actividades de aseguramiento de la calidad, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2023 para el proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, que es ejecutado por DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS y supervisado por la interventoría BUSERCO S.A.S

ENTREGA, REPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Se realiza la entrega de dotación y elementos de protección personal necesarias para la ejecución de las diferentes actividades realizadas durante el periodo en mención.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de MARZO al 31 de MARZO de 2023, cero (0) accidentes laborales.

13.INTERVENTORÍA AMBIENTAL

La construcción de cualquier tipo de obra civil conlleva a un gran impacto ambiental: la manipulación recursos naturales renovables y no renovables; producen altos consumos energéticos antes, durante y después de construidas; aumentan la emisión de dióxido de carbono, y esparcen al medio residuos en los diferentes estados, que en su mayoría no tienen tratamiento alguno, causando deterioro en la calidad del ambiente. Es por esto por lo que en todo proyecto es necesario realizar un control ambiental estricto, a fin de minimizar los impactos anteriormente descritos.

A continuación, se relacionan los impactos generados por la ejecución de un proyecto de construcción:

- Ruidos de maquinaria: excavadoras, camiones, grúas, maquinaria rompedora y cortadora, etc.
- Emisión de partículas: excavación, manipulación de áridos y conglomerantes, corte, polvo por tránsito de maquinaria, descargas de materiales y residuos, etc.
- Emisión de gases: maquinaria, vehículos, disolventes, etc.
- Lodos: procedentes de excavación, lavado de materiales y maquinaria, etc.
- Consumos de energía.
- Generación de residuos de naturaleza variada.
- Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables.
- Afectación de la Fauna y Flora

El contratista, el Ingeniero DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, se ha encargado de la ejecución del sistema de gestión ambiental garantizando el cumplimiento de los componentes ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental presentado por la interventoría.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MANTERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Con el objeto de minimizar la contaminación por partículas, se exige al contratista que el material de mejoramiento y relleno, estén debidamente cubiertos.

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS, RUIDO Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO

El contratista debe proveer la infraestructura y elementos necesarios para el manejo adecuado de lubricantes y combustibles. Realizar obras para el montaje de la maquinaria, de forma que prevenga la contaminación del suelo.

De igual forma, minimizar las emisiones atmosféricas con el adecuado uso de la maquinaria solo cuando sea necesaria la utilización de estas.

PQR DE LA COMUNIDAD

La interventoría ha realizado en el trascurso de la ejecución de la obra un seguimiento en cuanto al acompañamiento y buen trato que se les está brindando a la comunidad.

14.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dentro de las conclusiones y recomendaciones más relevantes dentro del presente informe podemos mencionar las siguientes:

- El contratista, el Ingeniero DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, ha ejecutado actividades por un valor de $ 701´675.418,77 M/CTE, correspondientes a un porcentaje de avance del 14.61%. Según la programación de obra, para el primer periodo comprendido entre el 01 de MARZO y el 31 de MARZO de 2023, el contratista debió ejecutar una inversión de $ 38´901.922,60 M/CTE., con un porcentaje programado del 0.81%. Con base en lo anterior, el contratista de oba se encuentra por encima de lo programado en un 13.80% con respecto a la fecha de corte del presente informe.

- Para el periodo del presente informe, el contratista de obra, el Ingeniero DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, ha cumplido con los requerimientos contractuales establecidos en el contrato de obra N° SI-LP-016-2021, en materia de seguridad y salud en el trabajo, presentando a tiempo el pago de las planillas de seguridad social del personal en obra. Con el fin de minimizar los riesgos dentro de la zona de trabajo, los trabajadores cuentan con los implementos de seguridad necesarios como gafas, botas, guantes, etc.; el número de accidentes registrados en el presente periodo comprendido entre el 01 de MARZO y el 31 de MARZO de 2023 es cero (0).

- El contrato de obra se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas. Por otra parte, el contratista acató las sugerencias realizadas por la interventoría, y se realizaron las actividades del proyecto dentro del plazo pactado.

- El contratista de obra cumplió con relación a la parte técnica en obra, área administrativa y financiera.

- La interventoría recomienda al contratista realizar las acciones necesarias para la adecuada conservación de las obras realizadas, asimismo asegurar la operación, mantenimiento y la sostenibilidad del proyecto y su buen servicio.

- La interventoría hizo control y seguimiento de las condiciones contractuales de obra y el seguimiento de todos aquellos procesos y procedimientos técnicos, ambientales, jurídicos, contables y administrativos suscritos en la realización del contrato de obra.


BUSERCO S.A.S
R.L ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista de Interventoría

ANEXOS

1. PROGRAMACIÓN DE OBRA

1.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**	**185 días**	**mié 1/03/23**	**vie 1/09/23**	**$ 4.802.706.494**
2	Inicio	0 días	mié 1/03/23	mié 1/03/23	$ 0
3	**Fase 1 : Planeación**	**185 días**	**mié 1/03/23**	**vie 1/09/23**	**$ 99.959.036**
4	Plan de Manejo Ambiental	185 días	mié 1/03/23	vie 1/09/23	$ 52.304.500
5	Plan de Manejo de Tránsito	185 días	mié 1/03/23	vie 1/09/23	$ 47.654.536
6	**Fase 2: Construcción**	**185 días**	**mié 1/03/23**	**vie 1/09/23**	**$ 4.700.845.998**
7	**ACTIVIDADES PRELIMINARE**	**45 días**	**jue 16/03/23**	**sáb 29/04/23**	**$ 49.226.400**
8	310.1 Conformación de la Calzada Existente	45 días	jue 16/03/23	sáb 29/04/23	$ 49.226.400
9	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**131 días**	**mié 1/03/23**	**dom 9/07/23**	**$ 338.393.186**
10	210.2.2. Excavaciones varias sin clasificar	100 días	sáb 1/04/23	dom 9/07/23	$ 265.875.192
11	200.2 Roceria	15 días	mié 1/03/23	mié 15/03/23	$ 4.269.770
12	900.1 Transporte de Material Proveniente de la excavación	100 días	sáb 1/04/23	dom 9/07/23	$ 68.248.224
13	**CAPAS GRANULARES**	**100 días**	**dom 30/04/23**	**lun 7/08/23**	**$ 1.147.385.340**
14	311.1 Sub-Base Granular Clase B	75 días	dom 30/04/23	jue 13/07/23	$ 633.763.584
15	330.2 Base Granular Clase B	75 días	jue 25/05/23	lun 7/08/23	$ 513.621.756
16	**PAVIMENTACIÓN RÍGIDO**	**76 días**	**dom 4/06/23**	**vie 18/08/23**	**$ 2.336.786.926**
17	630.4 Placa de pavimento en concreto hidráulico MR=4.2 Mpa (42Kg/cm2)	75 días	dom 4/06/23	jue 17/08/23	$ 2.028.561.120
18	630.7 Acero de transferencia D=1/2"corrugado	75 días	dom 4/06/23	jue 17/08/23	$ 11.830.160

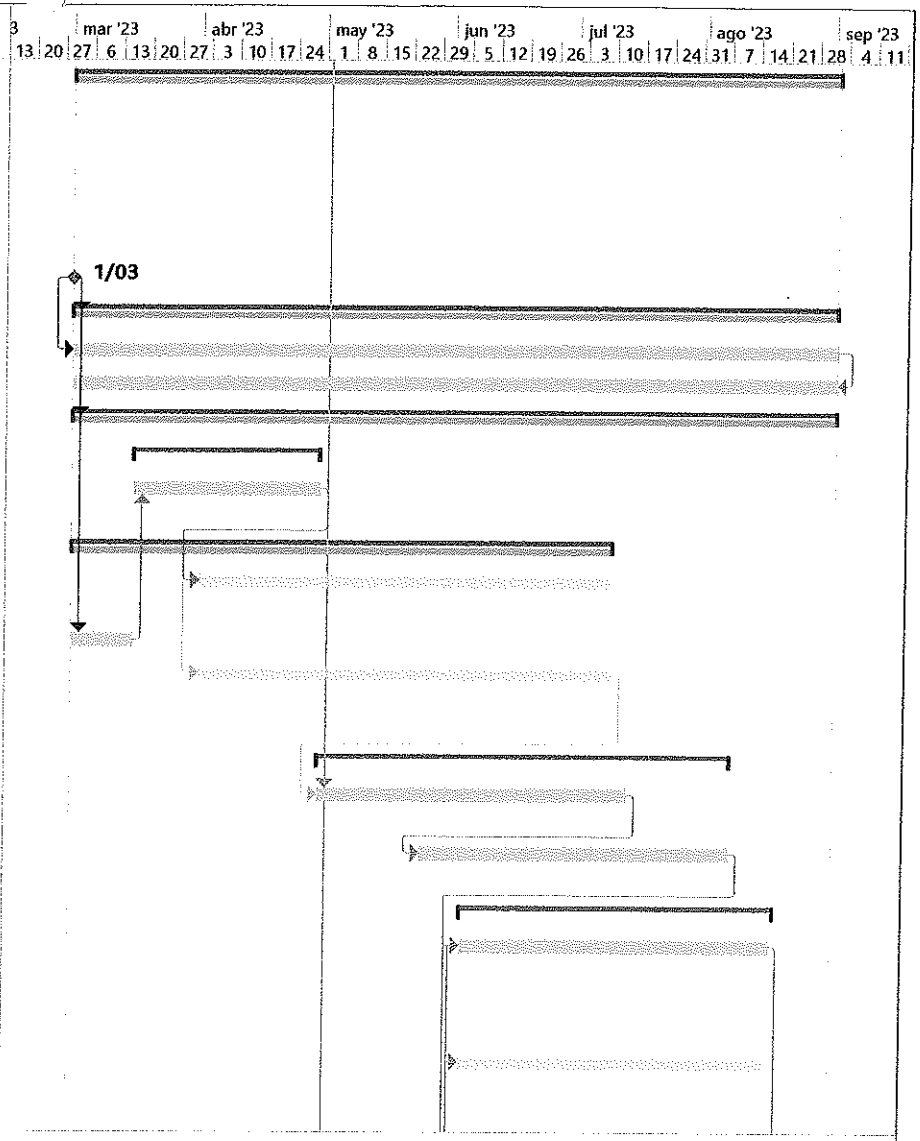

Fecha de Actualización: 31/03/2023.
% Avance Programado: 0.81%.
% Avance Ejecutado: 14.61%.

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha limite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
19	630.4 Acero de transferencia D=7/8"liso	75 días	dom 4/06/23	jue 17/08/23	$ 134.249.440
20	630.4 Sello de Juntas elastometrica	75 días	lun 5/06/23	vie 18/08/23	$ 77.729.810
21	630.4 Corte de Juntas	75 días	lun 5/06/23	vie 18/08/23	$ 84.416.396
22	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE**	**115 días**	**dom 30/04/23**	**mar 22/08/23**	**$ 823.183.970**
23	210.2 Excavación en Material Común	40 días	dom 30/04/23	jue 8/06/23	$ 39.284.824
24	630.6 Concreto Clase D (3000 PSI)	60 días	mié 31/05/23	sáb 29/07/23	$ 424.709.568
25	610.2 Relleno para Estructuras	60 días	sáb 24/06/23	mar 22/08/23	$ 104.663.520
26	661.1 Tubería de Concreto Reforzado21 MPA de 900MM	40 días	lun 15/05/23	vie 23/06/23	$ 71.375.186
27	640.1 Acero de refuerzo	60 días	mié 10/05/23	sáb 8/07/23	$ 173.066.744
28	900.1 Transporte de Material Proveniente de las excavaciones	40 días	lun 1/05/23	vie 9/06/23	$ 10.084.128
29	**SEÑALIZACION DEFINITIVA**	**14 días**	**sáb 19/08/23**	**vie 1/09/23**	**$ 5.870.176**
30	710.2 Señal vertical de transito Tipo II (1,2*0,4) con lámina retroreflectiva	14 días	sáb 19/08/23	vie 1/09/23	$ 5.870.176
31	**Fase 3: Cierre**	**8 días**	**vie 25/08/23**	**vie 1/09/23**	**$ 1.901.460**
32	Caracterización de la Vía	8 días	vie 25/08/23	vie 1/09/23	$ 1.901.460
33	Fin	0 días	vie 1/09/23	vie 1/09/23	$ 0

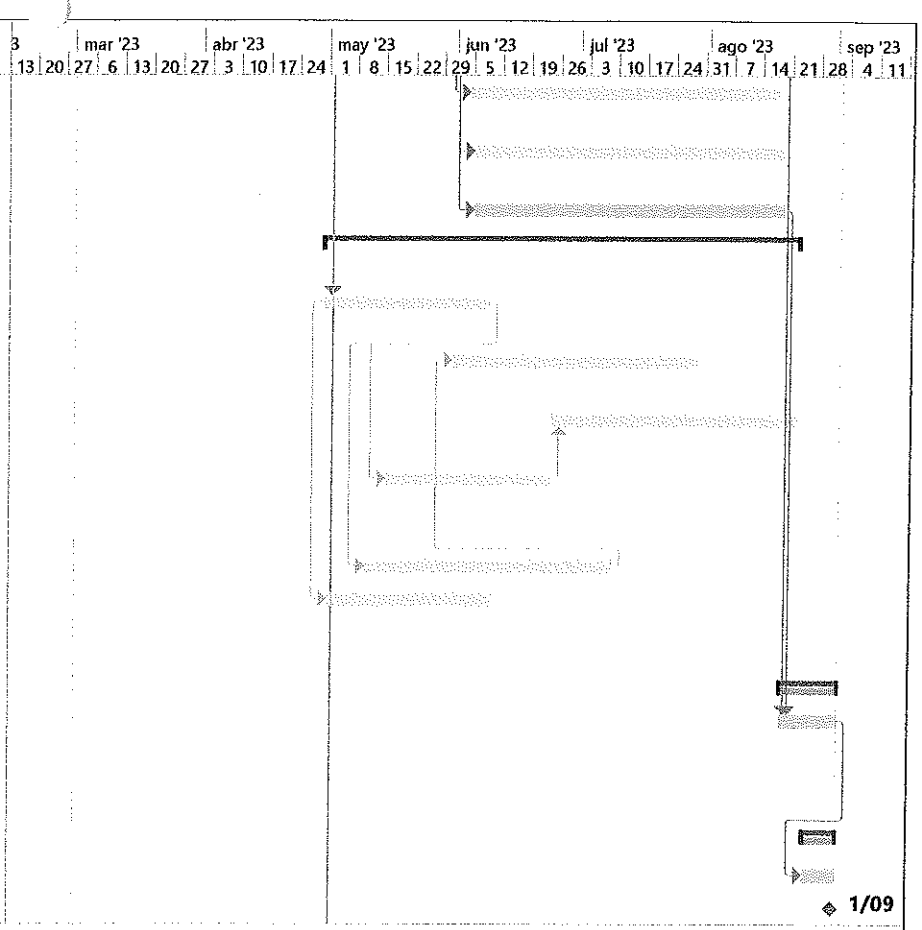

Fecha de Actualización: 31/03/2023.
% Avance Programado: 0.81%.
% Avance Ejecutado: 14.61%.

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

2. ACTAS DE COMITÉ

3. CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD

CODIGO: EL-F-5009	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV-161-13	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VALENCIA CORDOBA, SECTOR INCORA-FARO
FECHA DE ENSAYO:	lunes, 27 de marzo de 2023
ZONA DE ESTUDIO:	SUBBASE GRANULAR

ALCANCE DE LA SOLICITUD

Se realizáron seis (6) densidades para el proyecto ya mencionado.

DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

CANTERA:	LA CEIBA- CENTRACOR S.A.S.

DENSIDAD MAX. PROCTOR:	2.17 (gr/cm3)					HUMEDAD ÓPTIMA:				8.90%
PUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA	K0+000	K0+060	K0+100	K0+160	K0+200	K0+260				
W.frasco+arena inicial (gr)	4976	4947	4900	5389	5353	5323				
W.frasco+arena final (gr)	1411	1462	1675	2188	1960	1950				
W. arena total usada (gr)	3565	3485	3225	3201	3393	3373				
Constante del Cono (gr)	1658	1658	1658	1658	1658	1658				
W. arena en el hueco (gr)	1907	1827	1567	1543	1735	1715				
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402				
Volumen del Hueco (cm^3)	1360	1303	1118	1101	1238	1223				
W. material extraido humedo(gr)	3005	2921	2545	2528	2811	2743				
Humedad (%)	6,8	7,2	6,2	5,4	6,2	5,2				
W. material extraido seco(gr)	2814	2725	2396	2398	2647	2607				
Densidad seca (gr/cm^3)	2,069	2,091	2,144	2,179	2,139	2,132				
Densidad seca (lb/ft^3)	129,1	130,5	133,8	136,0	133,5	133,0				
Densidad max. Proctor(gr/cm^3)	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170				
%Compactación (%)	95,3	96,4	98,8	100,4	98,6	98,2				

OBSERVACIONES:

JEYSON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

La información presentada hace referencia únicamente a las muestras suministradas por el solicitante. INGRACON S.A.S. no asume responsabilidad alguna sobre el uso que se le dé a esta información, ni sobre decisiones tomadas con base en ella.

CODIGO: EL-F-S009	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV-161-13	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VALENCIA CORDOBA, SECTOR INCORA-FARO
FECHA DE ENSAYO:	miércoles, 29 de marzo de 2023
ZONA DE ESTUDIO:	SUBBASE GRANULAR

ALCANCE DE LA SOLICITUD

Se realizaron siete (7) densidades en el proyecto ya mencionado.

DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

CANTERA:	LA CEIBA- CENTRACOR S.A.S.

DENSIDAD MAX. PROCTOR:	2,17 (gr/cm3)				HUMEDAD ÓPTIMA:		8,90%		
PUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA	K0+300	K0+360	K0+410	K0+450	K0+510	K0+550	K0+600			
W.frasco+arena inicial (gr)	6274	6237	6087	6507	6469	6429	6427			
W.frasco+arena final (gr)	2714	2509	2546	3103	3098	3022	3095			
W. arena total usada (gr)	3560	3728	3541	3404	3371	3407	3332			
Constante del Cono (gr)	1648	1648	1648	1648	1648	1648	1648			
W. arena en el hueco (gr)	1912	2080	1893	1756	1723	1759	1684			
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409	1,409			
Volumen del Hueco (cm^3)	1357	1476	1344	1246	1223	1248	1195			
W. material extraido humedo(gr)	2966	3185	2965	2749	2710	2712	2587			
Humedad (%)	4,2	4,4	5,4	3,4	4,0	4,2	4,0			
W. material extraido seco(gr)	2846	3051	2813	2659	2606	2603	2488			
Densidad seca (gr/cm^3)	2,098	2,067	2,094	2,133	2,131	2,085	2,081			
Densidad seca (lb/ft^3)	130,9	129,0	130,7	133,1	133,0	130,1	129,9			
Densidad max. Proctor(gr/cm^3)	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170			
%Compactación (%)	96,7	95,2	96,5	98,3	98,2	96,1	95,9			

OBSERVACIONES:

JEYSON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Información Confidencial

CODIGO: EL-F-S009	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV-161-13	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VALENCIA CORDOBA- SECTOR INCORA-FARO
FECHA DE ENSAYO:	viernes, 31 de marzo de 2023
ZONA DE ESTUDIO:	SUBBASE GRANULAR

ALCANCE DE LA SOLICITUD

Se realizaron once (11) densidades en el proyecto ya mencionado.

DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

CANTERA:	LA CEIBA- CENTRACOR S.A.S.

DENSIDAD MAX. PROCTOR:	2.17 (gr/cm3)					HUMEDAD ÓPTIMA:				8.90%
PUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA	K0+650	K0+700	K0+760	K0+810	K0+850	K0+910	K0+950	K1+000	K1+060	K1+110
W.frasco+arena inicial (gr)	6392	6360	6334	6507	6570	6326	6261	5898	5822	5754
W.frasco+arena final (gr)	3052	3010	2940	3103	3078	2855	2448	2255	2158	2195
W. arena total usada (gr)	3340	3350	3394	3404	3492	3471	3813	3643	3664	3559
Constante del Cono (gr)	1648	1648	1648	1648	1658	1658	1658	1658	1658	1658
W. arena en el hueco (gr)	1692	1702	1746	1756	1834	1813	2155	1985	2006	1901
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,409	1,409	1,409	1,409	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
Volumen del Hueco (cm^3)	1201	1208	1239	1246	1308	1293	1537	1416	1431	1356
W. material extraido humedo(gr)	2648	2650	2694	2749	2896	2966	3472	3238	3159	3032
Humedad (%)	3,2	3,4	3,0	3,4	7,0	7,8	7,6	6,0	5,6	7,0
W. material extraido seco(gr)	2566	2563	2616	2659	2707	2751	3227	3055	2991	2834
Densidad seca (gr/cm^3)	2,137	2,122	2,111	2,133	2,069	2,128	2,099	2,158	2,091	2,090
Densidad seca (lb/ft^3)	133,3	132,4	131,7	133,1	129,1	132,8	131,0	134,6	130,5	130,4
Densidad max. Proctor(gr/cm^3)	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
%Compactación (%)	98,6	97,8	97,3	98,3	95,3	98,0	96,7	99,4	96,3	96,3

OBSERVACIONES:

JEYSON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Importante: La información aquí contenida solo es válida para el material suministrado por el cliente. Cualquier alteración o falsificación de este documento será sancionada de acuerdo con la ley. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización escrita de la empresa.

CODIGO: EL-F-S009	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 02	DENSIDAD EN CAMPO CON CONO Y ARENA INV-161-13	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	VALENCIA CORDOBA- SECTOR INCORA-FARO
FECHA DE ENSAYO:	viernes, 31 de marzo de 2023
ZONA DE ESTUDIO:	SUBBASE GRANULAR

ALCANCE DE LA SOLICITUD

Se realizaron once (11) densidades en el proyecto ya mencionado.

DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

CANTERA:	LA CEIBA- CENTRACOR S.A.S.										
DENSIDAD MAX. PROCTOR:		2.17 (gr/cm3)				HUMEDAD ÓPTIMA:				8.90%	
PUNTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ABSCISA, COTA Y/O ESPESOR DE LA CAPA	K1+150										
W.frasco+arena inicial (gr)	5701										
W.frasco+arena final (gr)	2010										
W. arena total usada (gr)	3691										
Constante del Cono (gr)	1658										
W. arena en el hueco (gr)	2033										
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1.402										
Volumen del Hueco (cm^3)	1450										
W. material extraido humedo(gr)	3257										
Humedad (%)	6.0										
W. material extraido seco(gr)	3073										
Densidad seca (gr/cm^3)	2,139										
Densidad seca (lb/ft^3)	132.2										
Densidad max. Proctor(gr/cm^3)	2.170										
%Compactación (%)	97.6										

OBSERVACIONES:

JEYSON ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los resultados aquí reportados corresponden únicamente a la muestra suministrada al laboratorio. INCOLASCON S.A.S. no se hace responsable por información suministrada por el cliente.

4. INFORMES SEMANALES

BUSERCO

Formato

INFORME DE INTERVENTORIA N°1
REPORTE SEMANAL

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

8/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 1 Del: 01/03/2023 Al: 05/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	BUSERCO S.A.S
Contrato No.	SI-CMA-007-2022
Valor Inicial:	$ 331.498.300,00
Valor Actualizado:	$ 331.498.300,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Semana Número: 1 Del: 01/03/2023 Al: 05/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ


AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,09%	0,09%
Valor de la Obra programada:	$ 4.322.435,84	$ 4.322.435,84

OBRA EJECUTADA	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 0,00	$ 0,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO


	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	-0,09%
Durante el periodo	0,09%	0,00%	
Acumulado actual	0,09%	0,00%	

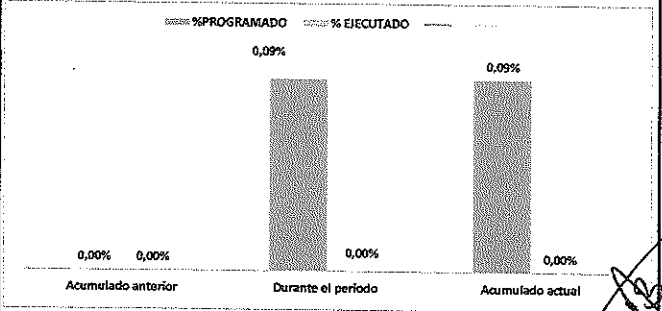


REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

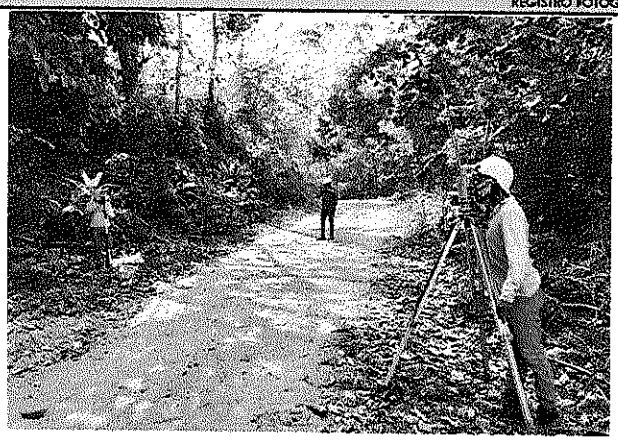

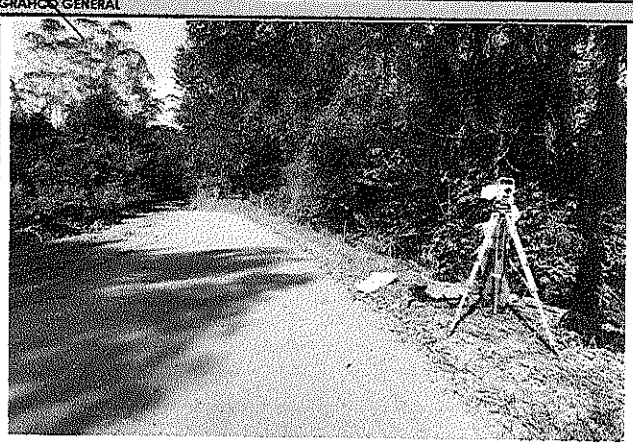

BUSERCO

Formato

INFORME DE INTERVENTORIA N°1
REPORTE SEMANAL

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

8/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023


Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 1 Del: 01/03/2023 Al: 05/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

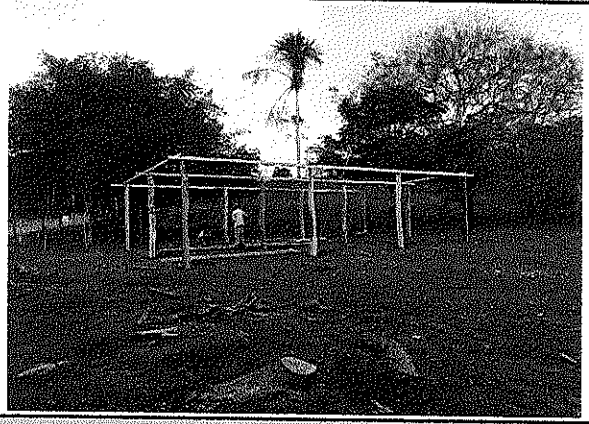

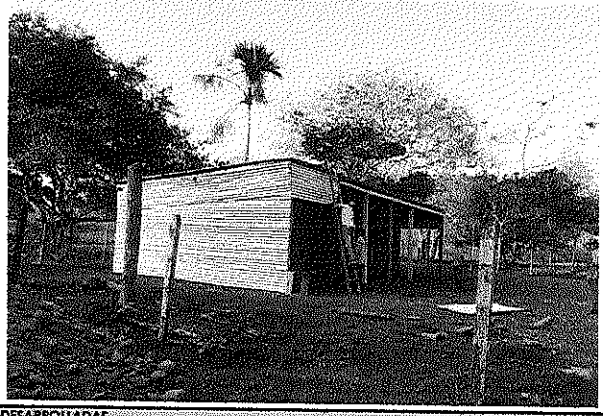

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD
INICIO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA CON FECHA 01 DE MARZO DE 2023.	
SE INICIA CON LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ENTREGABLES INICIALES SUMINISTRADOS POR EL ENTE CONTRATANTE.	
SE REALIZA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	
SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO EN OBRA	

OBSERVACIONES

SE INICIA CON LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA TOPOGRAFÍA, ASÍ MISMO SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

FIRMAS

INTERVENTOR BUSERCO S.A.S

Nombre ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA

SUPERVISOR DELEGADO

Nombre ISRAEL RÍOS PÉREZ

SUPERVISOR DELEGADO

BUSERCO

Formato

INFORME DE INTERVENTORIA N°2
REPORTE SEMANAL

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

15/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 2 Del: 6/03/2023 Al: 12/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	BUSERCO S.A.S
Contrato No.	SI-CMA-007-2022
Valor Inicial:	$ 331.498.300,00
Valor Actualizado:	$ 331.498.300,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Semana Número: 2 Del: 6/03/2023 Al: 12/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,12%	0,21%
Valor de la Obra programada:	$ 5.763.247,79	$ 10.085.683,64

OBRA EJECUTADA


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,85%	2,85%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 136.877.135,08	$ 136.877.135,08

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO


	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,09%	0,00%	2,64%
Durante el periodo	0,12%	2,85%	
Acumulado actual	0,21%	2,85%	

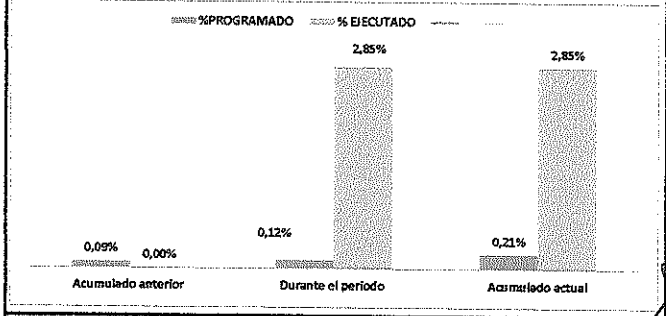

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

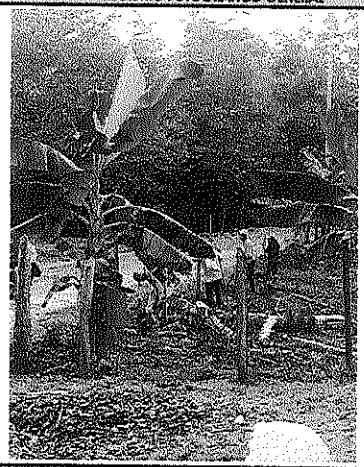

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

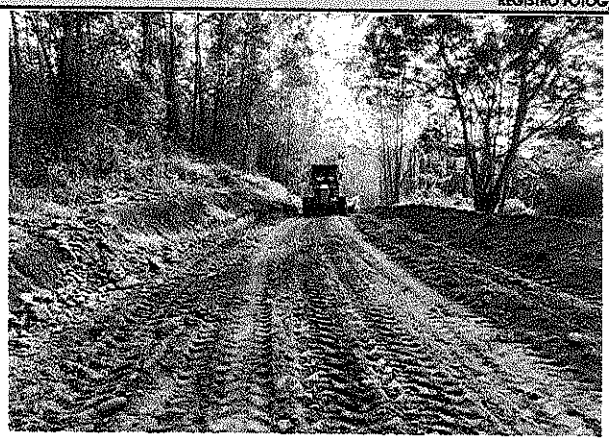



BUSERCO	Formato	Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo
	INFORME DE INTERVENTORIA N°2 **REPORTE SEMANAL**	15/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023


Objeto	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 2 Del: 6/03/2023 Al: 12/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

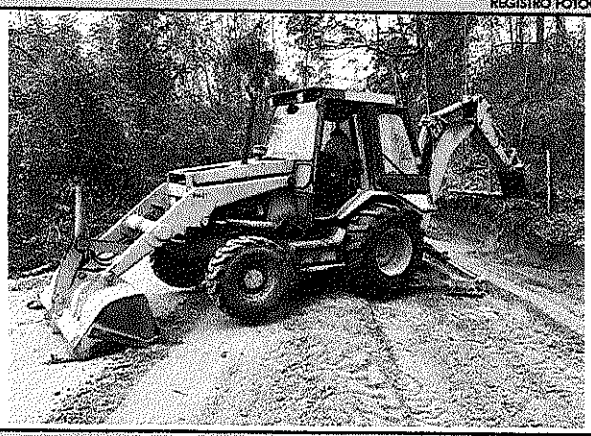

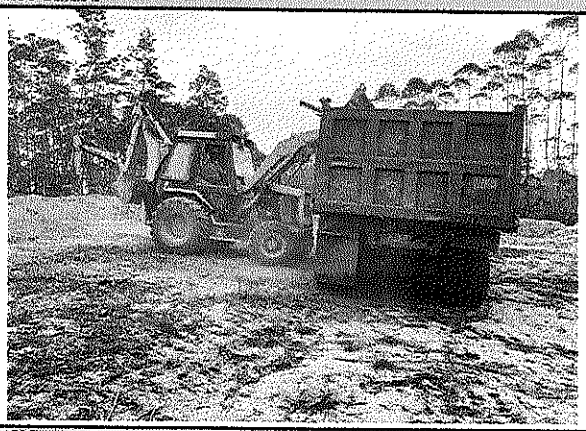

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD
Conformación de la Calzada Existente	M2
Excavaciones varias sin clasificar	M3
Roceria	KM
Transporte de Material Proveniente de la excavación	M3/KM

OBSERVACIONES

FIRMAS

INTERVENTOR BUSERCO S.A.S

Nombre ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA

SUPERVISOR DELEGADO

Nombre ISARAEL RÍOS PÉREZ

SUPERVISOR DELEGADO

BUSERCO S.A.S

Formato

INFORME DE INTERVENTORIA N°3
REPORTE SEMANAL

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

21/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 3 Del: 13/03/2023 Al: 19/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	BUSERCO S.A.S
Contrato No.	SI-CMA-007-2022
Valor Inicial:	$ 331.498.300,00
Valor Actualizado:	$ 331.498.300,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Semana Número: 3 Del: 13/03/2023 Al: 19/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ


AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,19%	0,40%
Valor de la Obra programada:	$ 9.125.142,34	$ 19.210.825,98


OBRA EJECUTADA	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,15%	6,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 151.285.254,56	$ 288.162.389,64

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO


	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,21%	2,85%	5,60%
Durante el periodo	0,19%	3,15%	
Acumulado actual	0,40%	6,00%	

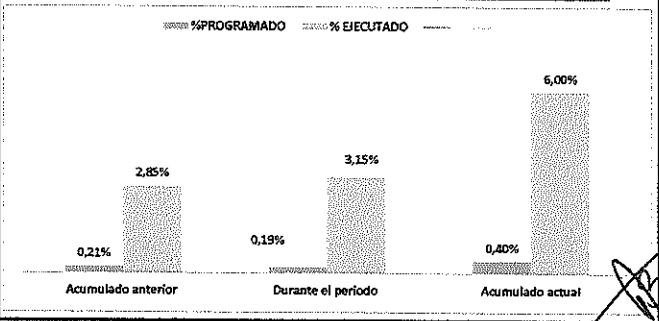


REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

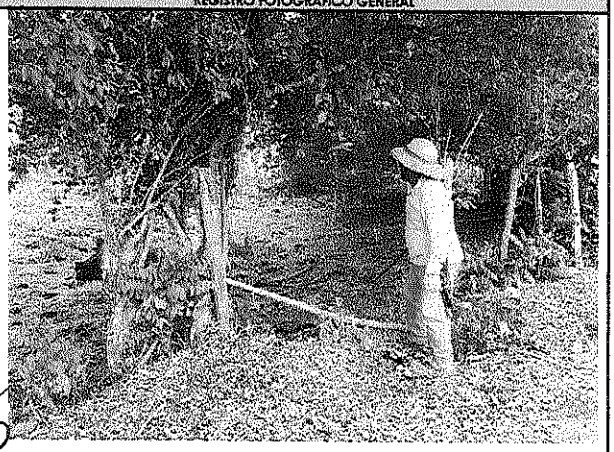

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

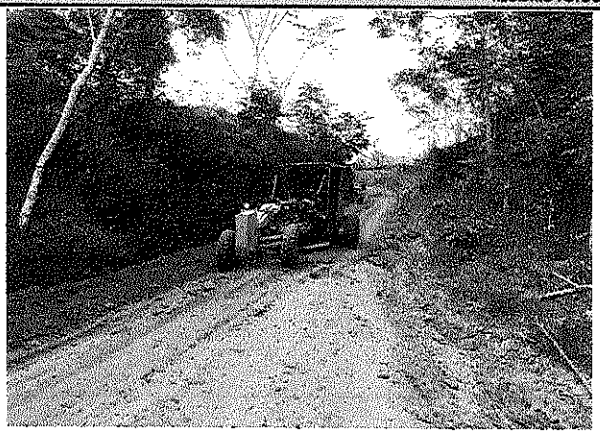

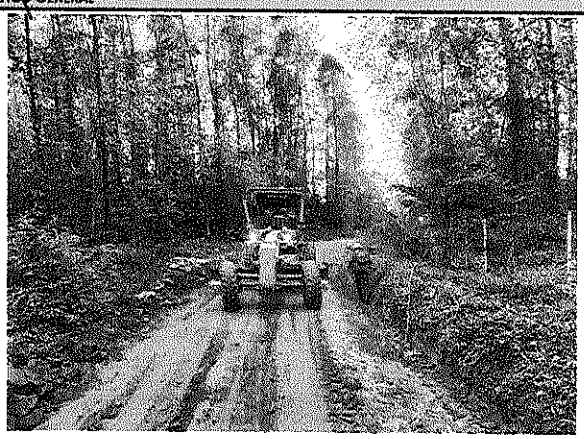

BUSERCO	Formato	Gobernación de Córdoba Ahora lo toca el pueblo
	INFORME DE INTERVENTORIA N°3 **REPORTE SEMANAL**	21/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	**Objeto**	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
Contrato No.	SI-LP-016-2022		
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00		
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00		
Plazo:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023		
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023		

Semana Número: 3 Del: 13/03/2023 Al: 19/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

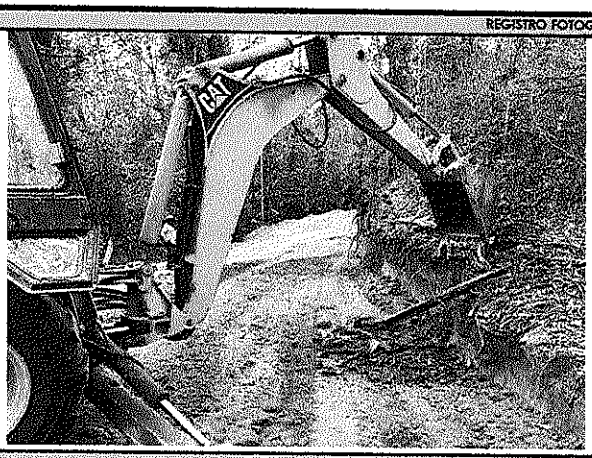



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD
Conformación de la Calzada Existente	M2
Excavaciones varias sin clasificar	M3
Rocería	KM
Transporte de Material Proveniente de la excavación	M3/KM

OBSERVACIONES

FIRMAS

INTERVENTOR BUSERCO S.A.S

Nombre ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA

SUPERVISOR DELEGADO

Nombre **ISARAEL RÍOS PÉREZ**

SUPERVISOR DELEGADO

BUSERCO

Formato

INFORME DE INTERVENTORIA N°4
REPORTE SEMANAL

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

28/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 4 Del: 20/03/2023 Al: 26/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	BUSERCO S.A.S
Contrato No.	SI-CMA-007-2022
Valor Inicial:	$ 331.498.300,00
Valor Actualizado:	$ 331.498.300,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Semana Número: 4 Del: 20/03/2023 Al: 26/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ


AVANCE DE LA OBRA

OBRA PROGRAMADA	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,24%	0,64%
Valor de la Obra programada:	$ 11.526.495,59	$ 30.737.321,56


OBRA EJECUTADA	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,31%	11,31%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 255.023.714,83	$ 543.166.104,47

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO


	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,40%	6,00%	10,67%
Durante el periodo	0,24%	5,31%	
Acumulado actual	0,64%	11,31%	

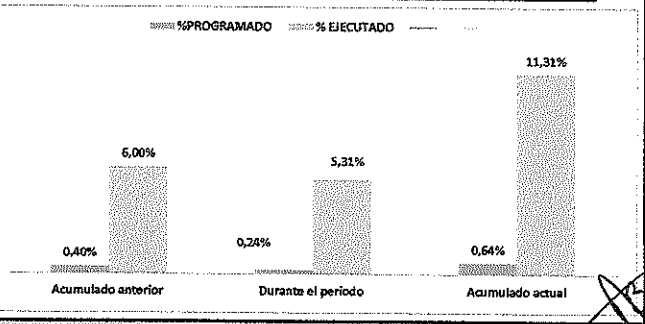


REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

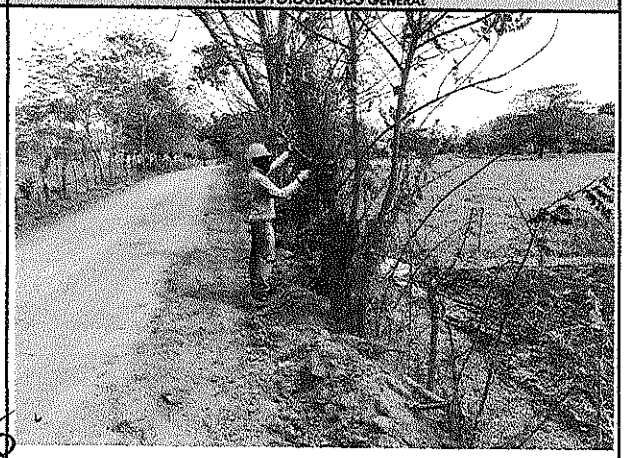

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

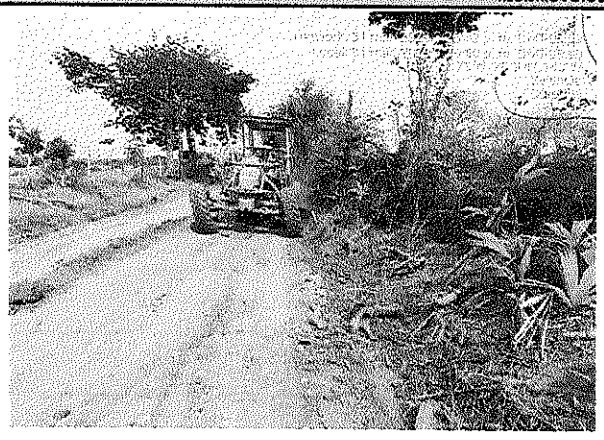

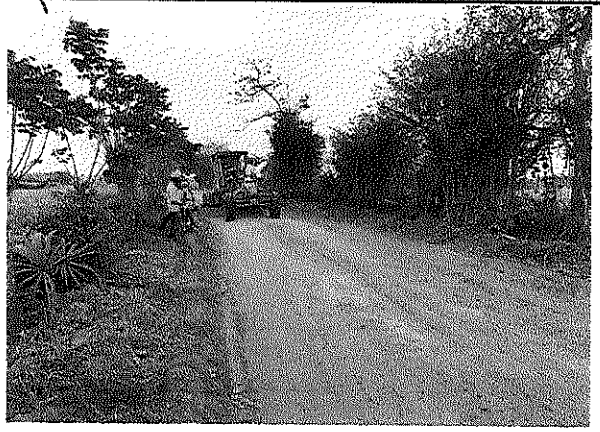

BUSERCO	Formato	Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo
	INFORME DE INTERVENTORIA N°4 **REPORTE SEMANAL**	28/03/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023


Objeto "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 4 Del: 20/03/2023 Al: 26/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



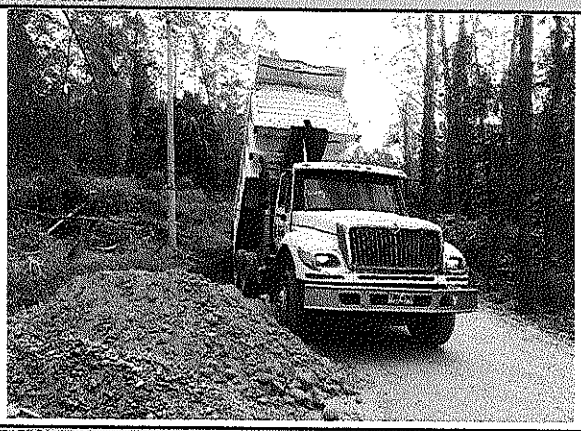

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD
Conformación de la Calzada Existente	M2
Excavaciones varias sin clasificar	M3
Rocería	KM
Transporte de Material Proveniente de la excavación	M3/KM
Sub-Base Granular Clase B	M3

OBSERVACIONES

FIRMAS

INTERVENTOR _____
BUSERCO S.A.S
Nombre ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA

SUPERVISOR DELEGADO _____
Nombre **ISARAEL RÍOS PÉREZ**
SUPERVISOR DELEGADO

BUSERCO

Formato

INFORME DE INTERVENTORIA N°5
REPORTE SEMANAL

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

4/04/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 5 Del: 27/03/2023 Al: 31/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	BUSERCO S.A.S
Contrato No.	SI-CMA-007-2022
Valor Inicial:	$ 331.498.300,00
Valor Actualizado:	$ 331.498.300,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

Semana Número: 5 Del: 27/03/2023 Al: 31/03/2023


Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

AVANCE DE LA OBRA


OBRA PROGRAMADA			OBRA EJECUTADA		
SEMANAL		ACUMULADO	SEMANAL		ACUMULADO
Obra programada (%)	0,17%	0,81%	Obra Física Ejecutada (%)	3,30%	14,61%
Valor de la Obra programada:	$ 8.164.601,04	$ 38.901.922,60	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 158.489.314,30	$ 701.675.418,77

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO


	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,64%	11,31%	13,80%
Durante el periodo	0,17%	3,30%	
Acumulado actual	0,81%	14,61%	

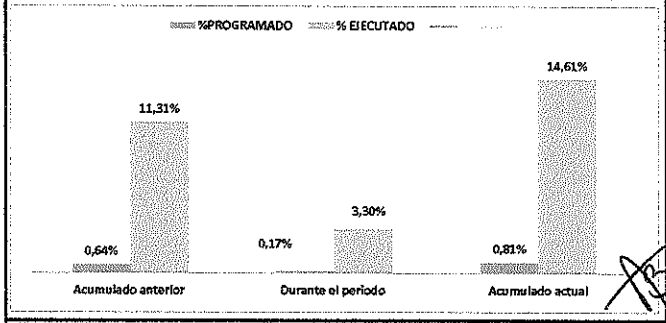


REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

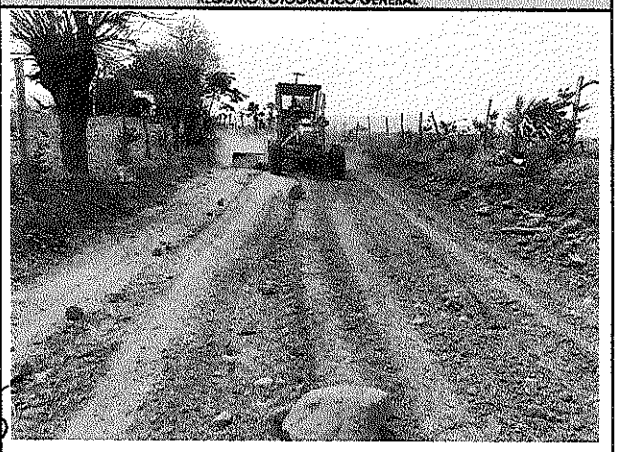

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

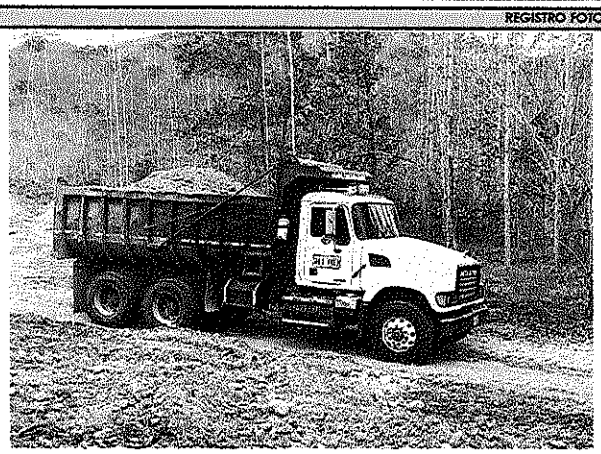

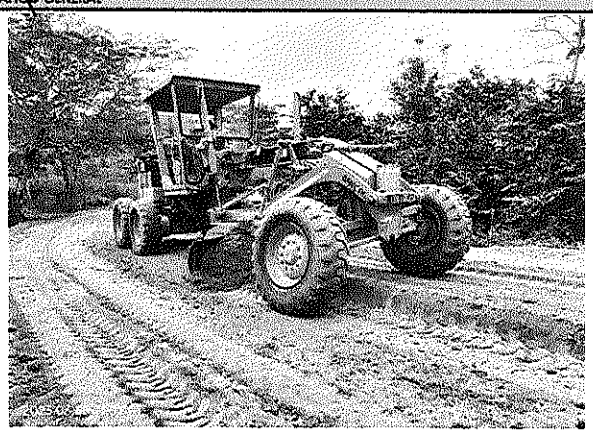

BUSERCO	Formato	Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo
	INFORME DE INTERVENTORIA N°5 **REPORTE SEMANAL**	4/04/2023

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
Contrato No.	SI-LP-016-2022
Valor Inicial:	$ 4.802.706.494,00
Valor Actualizado:	$ 4.802.706.494,00
Plazo:	SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Finalización:	31 DE AGOSTO DE 2023

Objeto	"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Semana Número: 5 Del: 27/03/2023 Al: 31/03/2023

Nombre del Supervisor ING. ISRAEL RÍOS PÉREZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

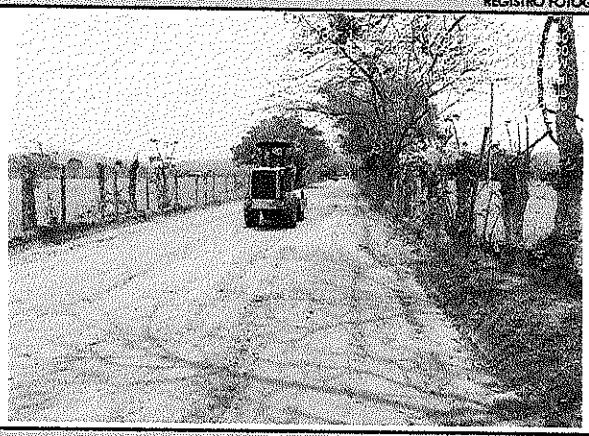



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD
Conformación de la Calzada Existente	M2
Excavaciones varias sin clasificar	M3
Rocería	KM
Transporte de Material Proveniente de la excavación	M3/KM
Sub-Base Granular Clase B	M3

OBSERVACIONES

FIRMAS

INTERVENTOR BUSERCO S.A.S

Nombre ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA

SUPERVISOR DELEGADO

Nombre ISARAEL RÍOS PÉREZ

SUPERVISOR DELEGADO

5. INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO

BUSERCO

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Gobernación de Córdoba

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de marzo de 2023	Y EL	31 de marzo de 2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.				
LOCALIZACIÓN	ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	SI-CMA-007--2022	CONTRATO No.:	SI-LP-016-2021
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATISTA:	DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023
PRÓRROGA N°1		PRÓRROGA N°1	
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
VALOR INICIAL :	$ 331.498.300,00	VALOR INICIAL :	$ 4.802.706.494,00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 331.498.300,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.802.706.494,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	-
VALOR POR PAGAR:	$ 331.498.300,00	VALOR POR PAGAR:	$ 4.802.706.494,00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA POLIZA N° 3491502-2 (SURAMERICANA)

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1/03/2023	29/02/2024	$ 33.149.830,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	1/03/2023	29/08/2026	$ 66.299.660,00
CALIDAD DE SERVICIO	1/03/2023	29/08/2023	$ 33.149.830,00

CONTRATO DE OBRAS POLIZA N° CMT-100004404 (SEGUROS MUNDIAL)

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	1/03/2023	28/02/2024	$ 480.270.649,40
PAGO SALARIOS PRESTACIONES	1/03/2023	31/08/2026	$ 480.270.649,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/08/2023	31/08/2028	$ 480.270.649,40

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONCEPTO	FECHA - ESTADO DE PAGO	CONCEPTO	FECHA - ESTADO DE PAGO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA RECOMIENDA SEGUIR IMPLEMENTANDO PGIO Y MANTENERSE DENTRO DE LOS AVANCES PROGRAMADOS


SERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
BUSERCO S.A.S


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TOPOGRAFÍA






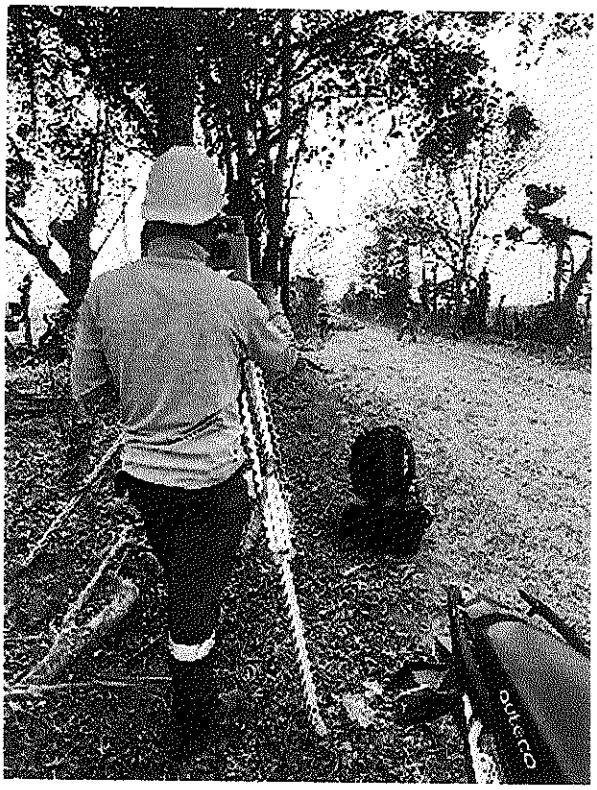

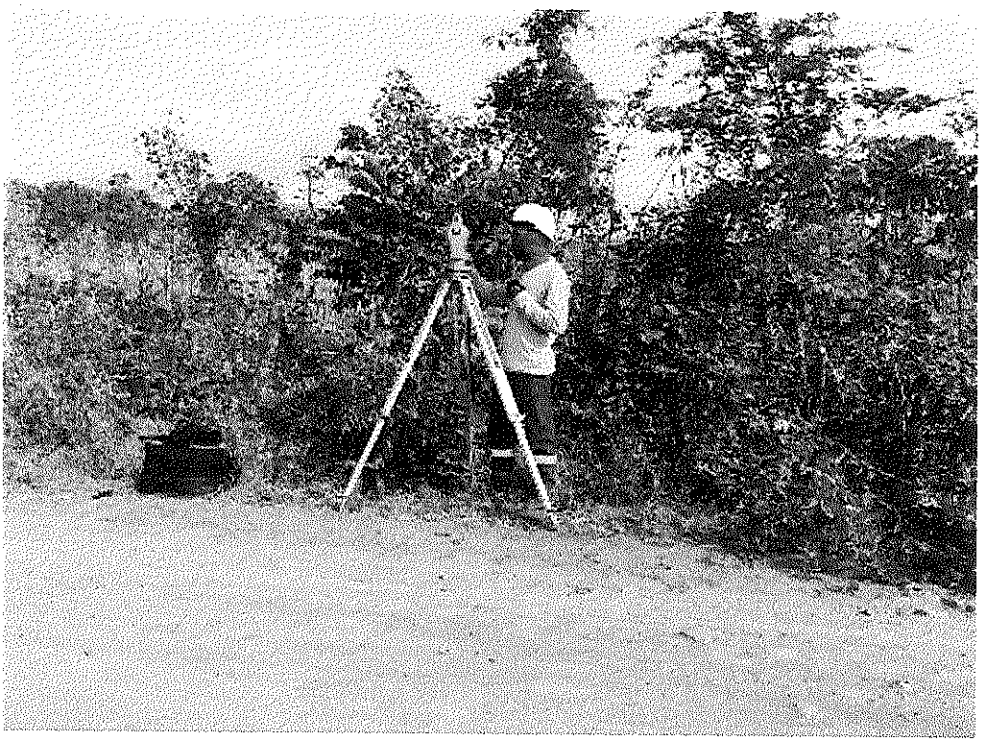



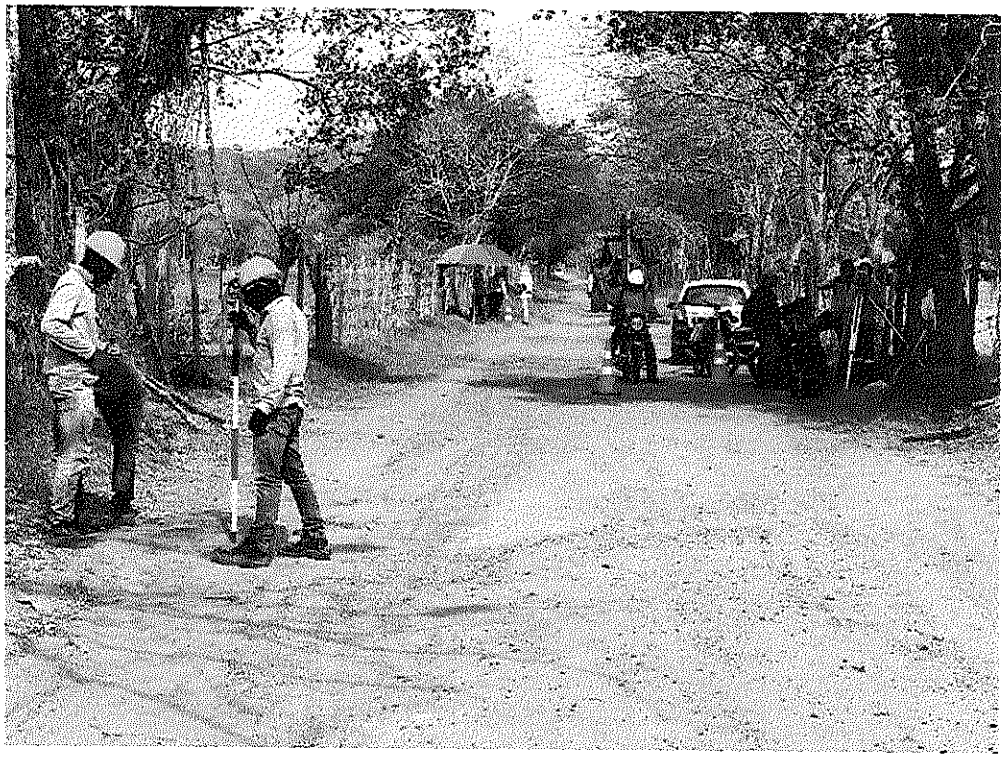

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE












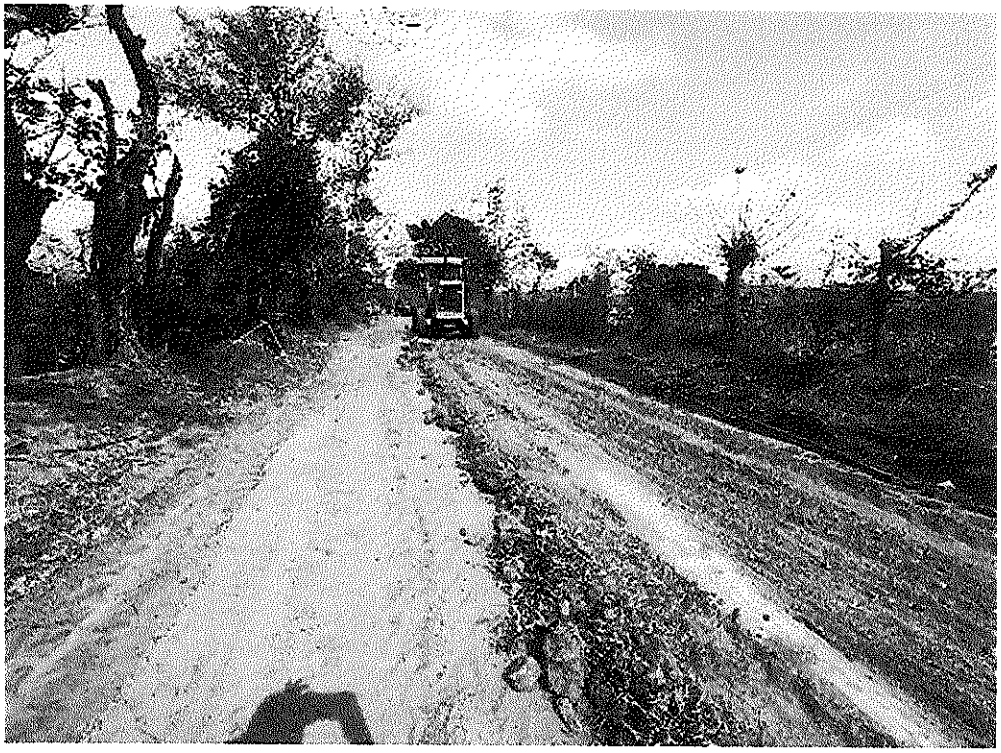



EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR





ROCERÍA

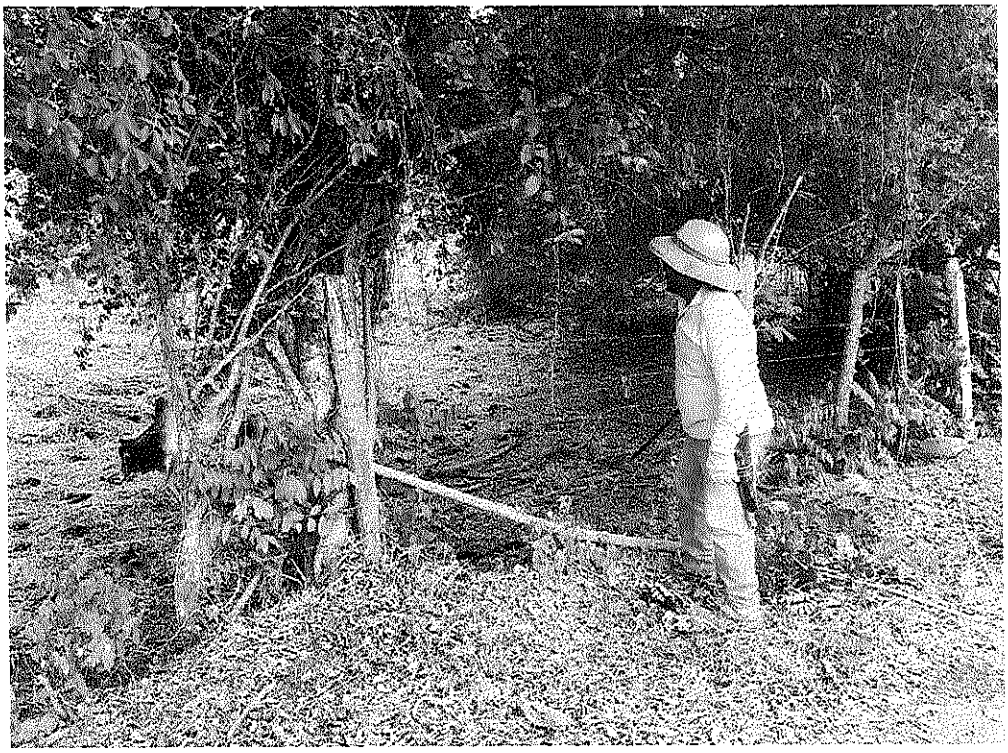


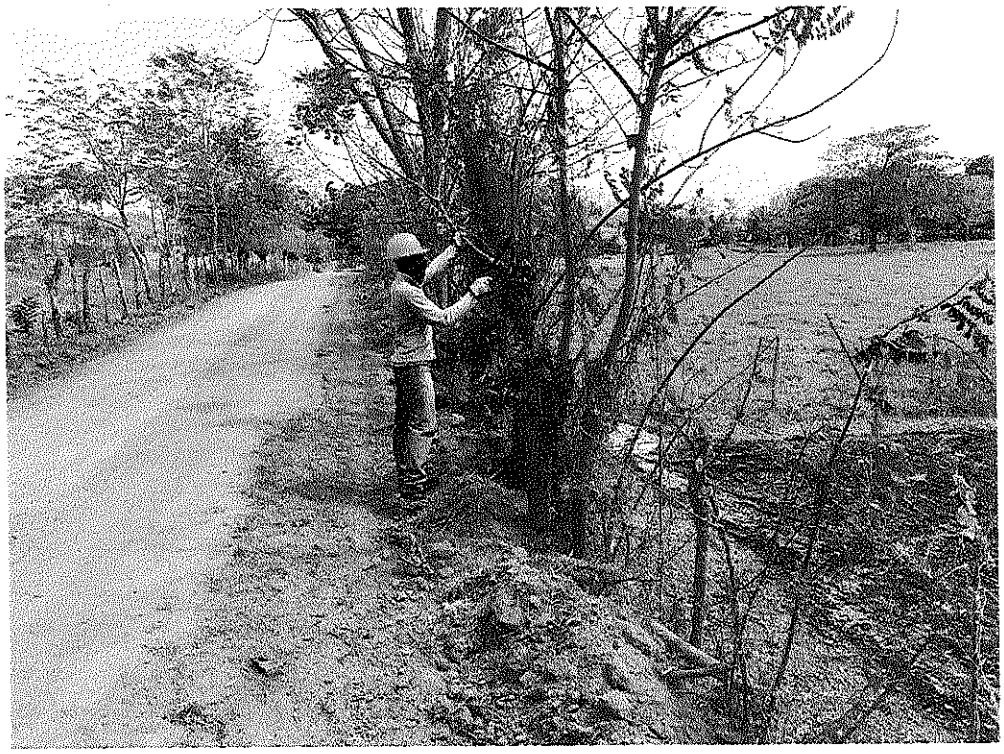

TRANSPORTE DE MATERIAL






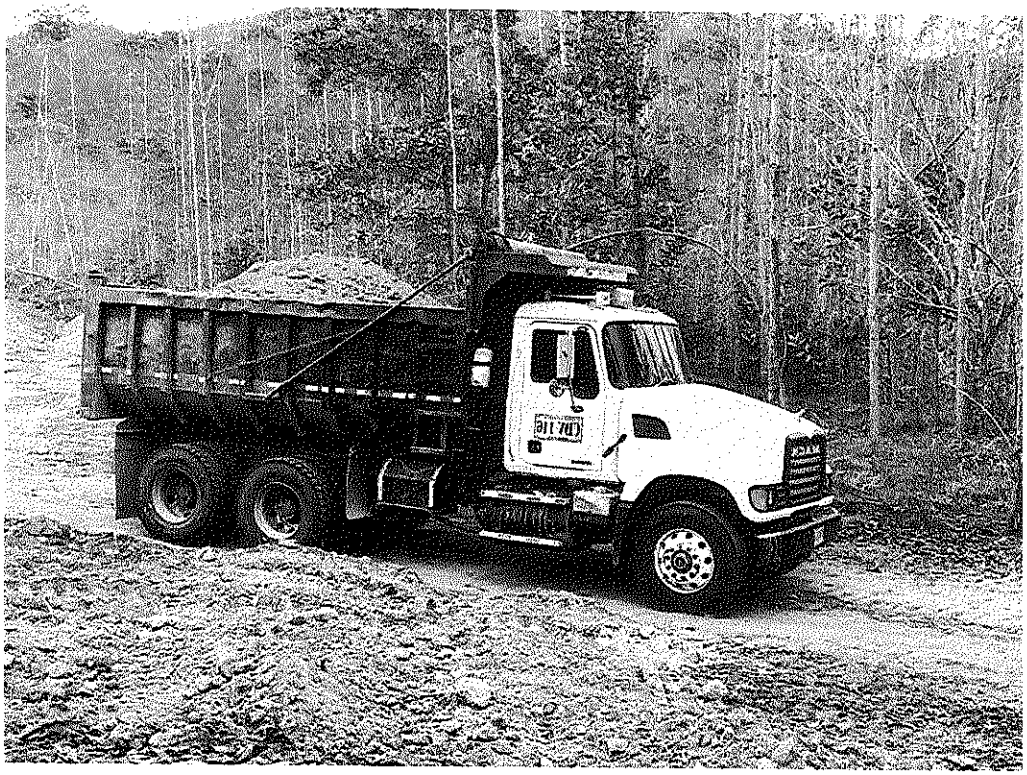





SUB-BASE GRANULAR



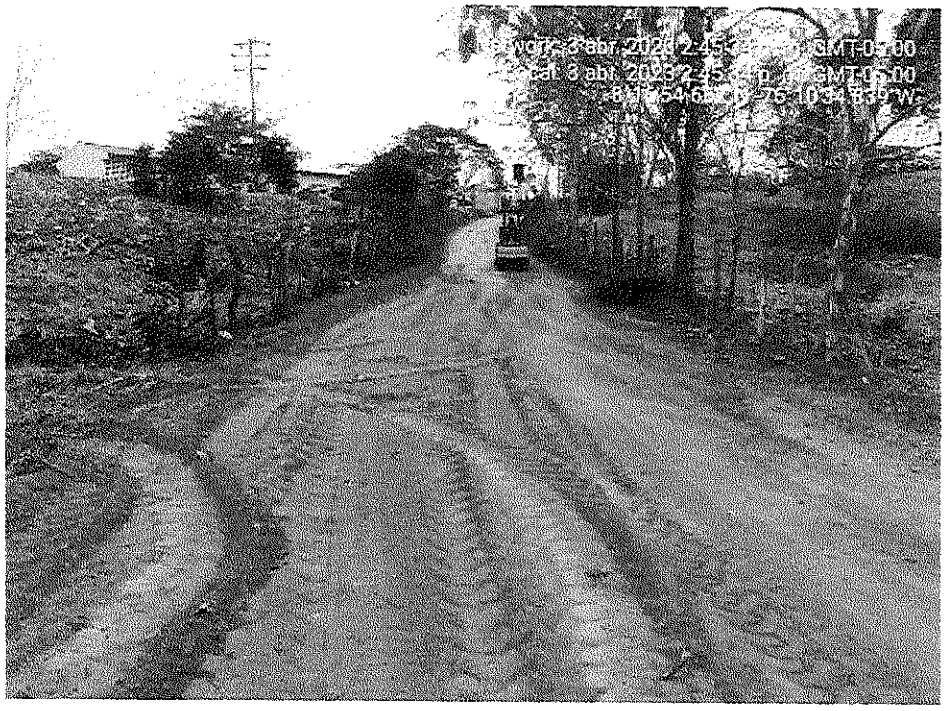

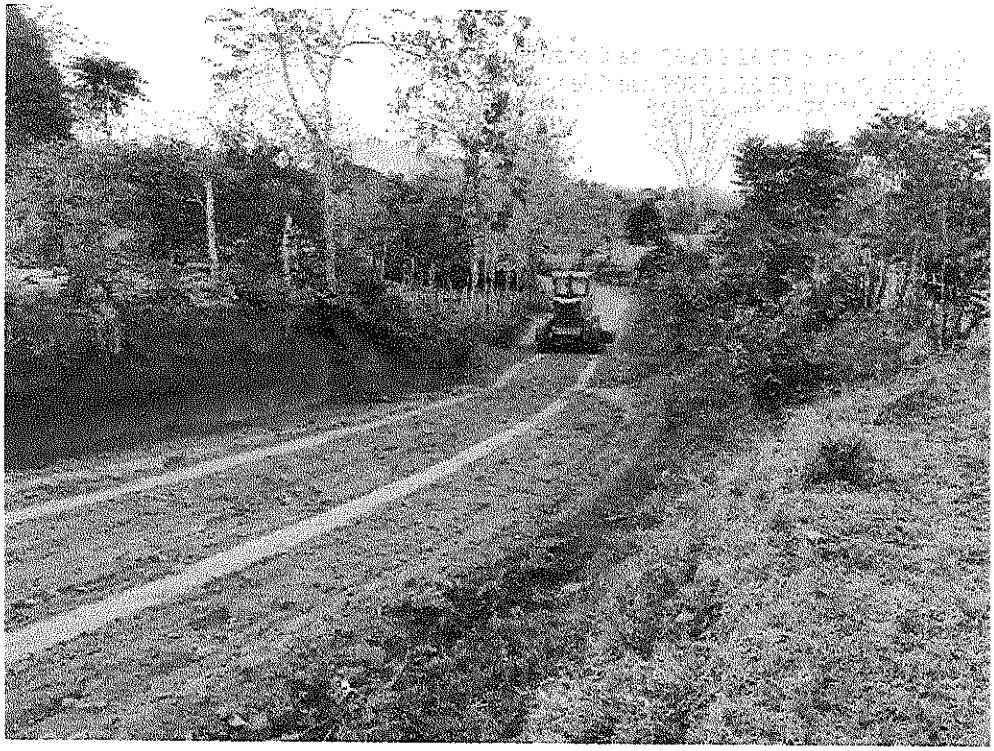



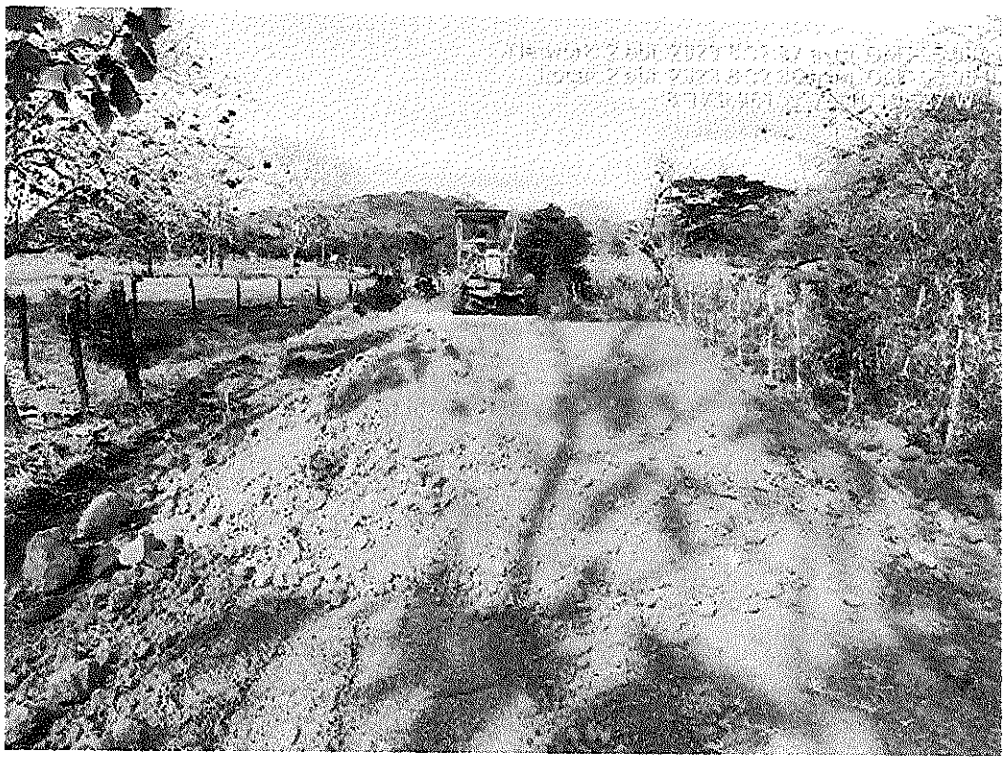


El Campo
Valencia
Córdoba

7. SEGURIDAD SOCIAL

7.1 SEGURIDAD SOCIAL OBRA
