Cartagena de Indias D.T. y Cultural, 16 de mayo de 2023

RAD No C.P.C-1476-2023

Señores
CONSORCIO ICEACSA PLANES
Atn. German Pineda
Representante Legal de Interventoría

Ref. CONTRATO No 1724 de 2020 cuyo objeto es MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 3

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 1724 DE 2020 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Cordial saludo,

En atención a lo dispuesto en el objeto contractual enmarcado en el Contrato de Obra Pública No. 1724 de 2020 y sus documentos complementarios, se solicita lo siguiente:
a). Prorrogar el contrato hasta el 30 de noviembre de 2023.

1. JUSTIFICACION TECNICA.
Para efectos del presente contrato nos permitimos indicar las siguientes consideraciones:

En atención a la ejecución contractual que presenta actualmente el proyecto Plato – Tenerife, ha de indicarse las actividades que requieren ser adelantadas dentro de la presente solicitud de prórroga, por lo cual a continuación se describen los asuntos desde el componente técnico:

- **Tramo PR 4+804 al PR 6+500.**

Se requiere el traslado de aproximadamente 150 metros de tubería de 6" PE100 de gas natural y la reubicación de las válvulas especialmente las ubicadas en el frente del corregimiento de San Luis. Además de 3000 metros de tubería de 6" PE100 de gas natural que van desde el PR 6 al PR9 aproximadamente, tales gestiones se vienen adelantando con la empresa prestadora de servicio público GASES DEL CARIBE, para que finalicen las actividades de su competencia, esto es los traslados de redes.

- **Tramo PR 4+804 al PR 7+640.**

En este tramo se requiere la ejecución del retranqueo de postes y de líneas a nivel 34,5kv y 13,2kv, reubicación de postes y reubicación de líneas de media tensión con el fin de ampliar vía terrestre entre los municipios Tenerife y Plato en el Magdalena.

Así pues, con la entidad competente, empresa prestadora de servicio público AIR-E, actualmente se cuenta con la aprobación de diseños desde el 07 de febrero de 2023, por lo cual iniciaremos la intervención correspondiente para el traslado de 43 postes y sus redes eléctricas a lo largo de los puntos de referencia ya indicados.

Ha de aclararse que, para los tramos antes enunciados, la afectación por la no ejecución de las actividades de las empresas prestadoras de servicios públicos, GASES DEL CARIBE Y AIR-E, corresponden a una longitud de 1.90 km, y se resumen en cantidades de obra de la siguiente forma:

Por Ejecutar (Responsabilidad no atribuible al contratista)		
GPP	**Presupuesto**	**% Contrato**
Explanaciones	$ 925,450,200	3.08%
Bases, subbases y afirmados	$ 1,550,300,100	5.17%
Pavimento asfáltico	$ 2,256,790,000	7.52%
Estructuras y drenajes	$ 120,456,900	0.40%
Señalización y seguridad	$ 189,560,870	0.63%
Obras varias	$ 96,700,500	0.32%
Transportes	$ 990,340,340	3.30%
No previsto	$ 1,814,339,781	6.05%
Total	**$ 7,943,938,691**	**26.47%**

Cabe resaltar que la ejecución de las dos actividades arriba mencionadas son de suma importancia en la ejecución del proyecto y que los tiempos para su ejecución son totalmente necesarios para la finalización y cierre del mismo, agregando que las actividades que deben adelantarse impactan en la ejecución de las actividades propias del contrato a cargo del Consorcio Paz Caribe.

En la eventualidad que la presente solicitud sea viabilizada, durante el tiempo de ejecución restante el Consorcio Paz Caribe optimizará el mismo en aras de continuar las obras que se encuentran pendientes de ejecución y así dar cumplimiento al alcance establecido para el contrato.

2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.

En atención a la presente solicitud de prórroga, y teniendo en cuenta que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, a continuación, se precisa la solicitud a saber:

De acuerdo con los requerimientos presentados en el componente técnico del presente escrito, se hace necesario indicar que técnica y contractualmente es viable proceder con la prórroga del presente contrato, teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación antes mencionada que propician la necesidad de prorrogar este, hasta el 30 de noviembre de 2023; es así como se justifica desde lo jurídico-contractual, que mediante pronunciamiento generado por la Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, en donde se manifestó en relación con las modificaciones contractuales que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal: ***"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato".***

Así mismo, lo prevén por ejemplo el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo: "*1o. Tendrán la*

dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, ***introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan****, terminar unilateralmente el contrato celebrado*". (Negrillas fuera de texto original).

Igualmente, la Corte Constitucional señaló que: "*(…) las prórrogas de los contratos – como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. (…)*" Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: "*(…) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.* ***Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado****. (…)*" (Negrillas fuera de texto original).

Así las cosas, es razonable concluir que la normativa en cita, así como la jurisprudencia contempla la posibilidad de introducir modificaciones a los elementos del contrato como lo es en este caso, **la solicitud de prórroga del contrato 1724 de 2020**, en procura de no afectar de manera grave el servicio publico que se pretender satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad.

3. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.

La presente solicitud no genera adición al contrato, ya que el proyecto cuenta con el presupuesto correspondiente al año 2022, para finalizar la ejecución del contrato.

Valor Inicial del Contrato: $ 36.021.730.588

VIGENCIA 2021: $ 7.659.230.588

VIGENCIA 2022: $ 28.362.500.000

SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA (30 DE MARZO DE 2023): $ 17,287,879,121.95

4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL.

Gestión Social: Se avanza en las actividades descritas en el documento PAGA, así como se continúa dando cumplimiento a los Programas de Obras con participación comunitaria (proyectos productivos) y cultura vial y Programa de información y divulgación.

Gestión Ambiental: Se han adelantado todos los permisos necesarios para el desarrollo de la obra y se viene ejecutando a cabalidad las actividades y compromisos plasmados en el documento PAGA.

Gestión Predial: Finalizar el proceso de gestión predial que se viene adelantando en el proyecto, agregando que con la prórroga solicitada se avanzará en el cierre de la gestión predial.

5. CONCLUSION.

Así las cosas y en atención a los anteriores argumentos el suscrito contratista de obra, solicita comedidamente a la Interventoría evalúe la viabilidad de proceder con la prórroga requerida hasta el 30 de noviembre de 2023, agregando que la finalidad de la misma es garantizar la transitabilidad del corredor vial Plato- Tenerife y en consecuencia se continue con la ejecución de manera adecuada con el fin de que se ejecute del alcance físico actual del proyecto.

Los documentos que soportan esta solicitud son los siguientes:

1. *Solicitud de adición y/o modificación y/o prorroga contrato de obra MEPI-MN1-IN-12-FR-1*

2. *Reprogramación al programa de inversiones MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Valor Contractual.*
3. *Reprogramación en Project de mayo de 2023 a noviembre de 2023.*

Cordialmente,



JOSE A. CASTAÑO CARABALLO
Representante Legal
CONSORCIO PAZ CARIBE

Bogotá D.C, 16 de mayo de 2023

Señores.
Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Atn. **Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda**
Supervisor Contrato
Dirección Territorial Magdalena
Calle 24 No 3-95 Oficina 1304 Edificio Banco de Bogotá
Santa Marta – Magdalena

Referencia: Contrato 1956 de 2020 Interventoría para las Obras de Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Plato – Tenerife en el Departamento del Magdalena en Marco del Programa de Obra Pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones" Modulo 3

Asunto: Concepto de Interventoría sobre solicitud de prórroga no. 4 al contrato de obra No.1724 de 2020.

Respetado Ingeniero:

Hemos recibido la comunicación RAD No C.P.C-1476-2023 en la cual el Consorcio Paz Caribe presenta a esta Interventoría senda solicitud de prórroga hasta el 30 de noviembre de 2023, con las que pretende motivar y justificar su pedido, dado lo anterior y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como interventoría del contrato de obra No.1724 de 2020, a continuación, nos permitimos entregar el resultado de nuestro análisis a la misiva del CPC sobre este particular:

ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN TECNICA

Motiva la solicitud de prorroga el CONSOCIO PAZ CARIBE en su comunicación de RAD No C.P.C-1476-2022, teniendo en cuenta que en dos tramos del proyecto se presentan interferencias con redes de servicios públicos en los que se hace necesario trasladar y tienen que ver una serie de postes que conducen líneas eléctricas de diferentes tensiones (34,5 Kv y 13,2 Kv), y la red con sus correspondientes válvulas con la que se presta el servicio de suministro de gas que están ubicados en eje de la vía e impiden el desarrollo normal del proyecto de acuerdo con el siguiente detalle:

- **PR 4+804 al PR 6+500**

En el primer tramo nombrado, se presentan interferencias con válvulas y redes de tuberías de gas natural, el contratista inició el proceso de gestión mediante notificaciones, correos y peticiones al operador del servicio para realizar los respectivos traslados de dichas redes fuera de los alineamientos y el trazado de la vía proyectada según sus diseños.

Sobre este tema, es importante precisar que Gases del caribe realizó actividades de traslados de redes hasta el pasado mes de diciembre 2022, en sitios no inundables, desde esa fecha en adelante no se reportan trabajos, pese a que el nivel de inundaciones en los sectores en mención en este momento ya no está abnegados.

De lo anterior, se puede colegir que se encuentra pendiente que se finalice el traslado de la red de gas natural; actividad por demás necesaria para poder ejecutar las restantes actividades del proyecto, razón suficiente en sí misma, y que fundamenta la necesidad de prórroga del Contrato de Obra aludido.

Es importante precisar que la finalización de dicho traslado, si bien es cierto corresponde a Gases del Caribe, es importante recomendar que el Contratista deberá realizar una suficiente gestión es decir dar cumplimiento a su debida diligencia, ante Gases del Caribe, para lograr propender que estas actividades se realicen con una mejor oportunidad y así el Contratista pueda ejecutar las obras correspondientes los sectores donde se presentan dichas interferencias.

Para lo cual se hace necesario ademas concertar con la ESP un cronograma de ejecución de estas totalmente articulado y armonizado de tal manera que permita que a medida que se va realizando los traslados de la red, consecuentemente se avance y ejecute la obra civil.

- **PR 6+500 al PR 7+640**

En este sector al igual que en el tramo anterior se presentan redes eléctricas de diferentes tensiones (34,5 Kv y 13,2 Kv), que contienen una serie de postes que actualmente están quedado por el nuevo eje proyectado de la vía, impidiendo la materialización del diseño aprobado.

Sobre este proceso, para el traslado de redes se encuentra que se iniciaron los trámites de apertura de expediente desde el mes de abril de 2022; posteriormente, el CPC inicio las actividades necesarias para adelantar los diseños correspondientes de este traslado, tales como levantamientos topográficos, inventario de infraestructura, entre otros. De tal manera que, la radicación de esta información ante la Entidad se dio el 9 de diciembre de 2022; es decir, aproximadamente 8 meses después de haber abierto el expediente para dicho traslado. Consecuentemente el 4 de enero de 2023 AIR-E emitió el resultado de la revisión de dichos diseños, generando las observaciones resultantes de su revisión, las cuales fueron atendidas por el CPC el 1 de febrero de 2023 y finalmente el día 07 de febrero de 2023 bajo el expediente No.: 3864920, se recibe la Aprobación del diseño por parte de la ESP.

Con el diseño ya aprobado se inició la elaboración del presupuesto de estas obras, lo cual, deriva en un proceso de cuantificación y estimación de cantidades de obra, identificación de actividades que requieren precio unitario no previsto, elaboración y presentación de los precios unitarios no previstos correspondientes de acuerdo con el apego contractual establecido, para las obras complementarias del contrato vigente y el manual de interventoría del Invias. Este proceso por demás requiere un trámite de revisión, emisión de observaciones y concertación por parte de la Interventoría.

En relación con esto, resulta relevante precisar, que el 3 de mayo de 2023 mediante la comunicación C-1956-CI1427-2023 está interventoría radico al Instituto toda la documentación necesaria para la aprobación por parte del INVIAS de esta actividad de “retranqueo”, con lo cual solo mediaría el concepto final de Instituto, para que se pueda iniciar con la ejecución de estas actividades.

En consecuencia de lo anterior, se pude establecer que las actividades preliminares para la ejecución del traslado de redes eléctricas se encuentran prácticamente terminadas, por lo que en los próximos podría perfectamente adelantar el inicio de su ejecución; sin embargo, es claro que el tiempo restante para darse la terminación actual del contrato (31 de mayo de 2023), es abiertamente insuficiente, no solo para adelantar el traslado sino además, para ejecutar las obras civiles que no se han podido ejecutar por dicha causa.

Por tanto, esta Interventoría considera que se requiere un tiempo adicional para la ejecución de estas actividades tanto las de traslado como las de obra civil; por lo que se recomienda al INSTITUTO otorgar la misma, en aras de lograr finalizar el proyecto y de esta manera, entregar a la comunidad una obra funcional que permita suplir sus necesidades en esta materia.

A diferencia del trabajo del traslado de redes y válvulas de gas que son realizados y ejecutados por la misma entidad Gases del Caribe, dueña de las redes, en el traslado de postes de las líneas eléctricas es el contratista Paz Caribe los encargados de realizar la ejecución de los trabajos, por lo que, se puede establecer con seguridad que su plan de trabajo depende integralmente de una adecuada planificación de las actividades, acompañada de una asignación adecuada y suficiente de recursos.

Sobre este particular, la Interventoría en constantes conversaciones con el contratista y su diseñador habían acordado que este traslado se estimaba en una duración de tres (3) meses; Por tanto, si bien es cierto se recomienda la prórroga del proyecto, se debe exigir al Contratista que presente un cronograma de actividades en el que se optimicen los tiempos y la ejecución simultanea de actividades, que permitan la ejecución del proyecto en el menor lapso posible.

En complemento a lo anterior, a juicio de esta Interventoría, reiteramos que lo más recomendable para la Entidad es otorgar un plazo adicional para la ejecución de las obras faltantes de cara a poder entregar a la comunidad un proyecto que sirva con el objetivo de mantener la conectividad del municipio de Tenerife vía terrestre, en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

En consecuencia, la prórroga solicitada por el CPC se considera viable en su otorgamiento teniendo en cuenta la necesidad de:

- Ejecutar el traslado de redes eléctricas y gas natural que presentan interferencia con las obras del proyecto.

- Adelantar las actividades de obra faltantes que se encuentran pendientes por ejecución.

La recomendación dada por esta Interventoría debe entenderse que se realiza con el especial énfasis y propósito de mitigar los impactos que podría tener la finalización del plazo contractual del Contrato de Obra sin haber finalizado la totalidad de las obras contratadas y los efectos negativos que podría acarrear dicha situación tales como:

- Descontento en la comunidad y autoridades civiles por la no finalización de las obras.
- Complicaciones al haber ejecutado recursos en un proyecto que no finalizaría su objeto y no cumpliría con el objetivo para el cual fue contratado.

- Evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, que para el caso del Invias es la de garantizar la transitabilidad de los usuarios en los corredores viales a su cargo.

Esta interventoría, considera que el tiempo solicitado por el contratista es suficiente para atender las obras pendientes por ejecutar, y mencionadas en las actividades a desarrollar inmersas en la presente comunicación; No obstante, se debe hacer un especial énfasis que el contratista debe realizar todas las gestiones y trámites para que se ejecute el traslado de redes de gas por parte de Gases del Caribe, y ejecutar las actividades de traslado de la red eléctrica.

ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La presente recomendación de la interventoría se realiza amparado en el marco legal que indica que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato estatal; y en que el Consejo de Estado, en su reiterada jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó

> *"(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (…)"*

En cuanto al tema es importante precisar:

- Los contratos también pueden ser objeto de prórroga, es decir de una ampliación en su plazo de ejecución.
- ***Las ampliaciones del plazo que ocurran a causa de eventuales incumplimientos del contratista, deberán ser objeto de aplicación de los conminatorios y sanciones a que haya lugar***. Por el contrario, las ampliaciones que se motiven en circunstancias imprevisibles e irresistibles para el Contratista podrán generar el pago de compensaciones, previo análisis.
- La prórroga debe ser justificada, dicha motivación debe expresar las situaciones no previstas inicialmente que ocasionan la prórroga y/o las variables impredecibles e irresistibles.

En suma, si bien es cierto encontramos razonable y necesario otorgar el plazo adicional solicitado

por el Contratista, es importante ademas reiterar a la Entidad continuar adelantando el proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento al programa de inversiones que se adelanta actualmente, lo cual, no va en contravía de la necesidad expresada de buscar por todos los medios legales la finalización del proyecto de cara a evitar mayores traumatismos como resultado de la indefinición de la finalización de las obras en caso de no mediarse la solicitada prorroga objeto de estudio en la presente.

Debe tenerse en cuenta, que mediante el contrato estatal se pretende la consecución de los fines del Estado, en ese orden, los gestores públicos deben priorizar las necesidades para efectos de suscribir los contratos o modificaciones a que haya lugar, y habida cuenta que el Contrato discutido es eminentemente público, este negocio jurídico constituye un típico ejercicio de la función pública y por tanto debe realizarse de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución y la ley. Es así como la contratación Estatal responde a una necesidad específica de la administración, la cual, debe ser satisfecha sin excepción alguna, **ya que su deber legal es hacer prevalecer la finalidad del contrato** y evitar la paralización y afectación grave del servicio que se requiere.

ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Como lo indica el contratista de obra en su comunicación de solicitud en la cual aclara que esta no genera adición al Contrato, ya que el proyecto cuenta con el presupuesto correspondiente a la vigencia del año 2022, por $28.362.500.000 que sumada a la del 2021 por $7.659.230.588, resulta el total del valor Inicial del Contrato: $36.021.730.588, los cuales, son recursos suficientes para finalizar la ejecución del Contrato bajo las condiciones actuales.

ACERCA DE LA JUSTIFICACIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

Gestión Social, se avanza en las actividades descritas en el documento PAGA, y se está dando cumplimiento a los Programas de Obras con participación comunitaria (proyectos productivos) y cultura vial y Programa de información y divulgación

Gestión Predial, se avanza con la gestión predial, la cual deberá finalizarse de tal forma, que no genere impactos a la ejecución de las obras faltantes.

Gestión Ambiental, se han adelantado y obtenido los permisos. Igualmente se viene ejecutando a cabalidad las actividades y compromisos plasmados en el documento PAGA sin embargo, es importante recomendar y exigir al contratista que debe mantener vigentes todos los permisos ambientales en especial las fuentes de material hasta la fecha de la prórroga.

En complemento a nuestro concepto *ut supra,* nos permitimos presentar los siguientes documentos listados en cumplimiento del procedimiento establecido por el manual de interventoría para este tipo de tramites.

1. RAD-CPC-1459-2022 Solicitud Contratista de Obra
2. Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga No 4

contrato de obra
3. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado General del Tiempo (consolidado del proyecto)
4. MEPI-MN1-IN-6-FR-1 Programa Inversión y Reprogramación Prórroga No 04
5. PDF programación Obra Project a noviembre 2023
6. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento Garantías y Seguros del Contrato de Obra

Germán Pineda Ochoa
Representante Legal
Consorcio Iceacsa Planes

Copia:

Ing. Manuel Felipe Yalanda, Gestor Técnico del Proyecto Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 4 - INVIAS
Ing. María José Camargo, Ingeniera de Apoyo a la Supervisión Territorial Magdalena - INVIAS
Ing. Luis Jaime Diaz, Gerente de Grandes Proyectos 4
Consorcio Iceacsa-Planes

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 16/05/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1724 DE 2020 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ CARIBE (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO,GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1956 DE 2020 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA PLANES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 18 meses (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
No1	15/02/2021	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Cláusula Novena: Forma de Pago del Contrato 1724 de 2020, en el sentido de incluir un parágrafo, el cual para todos los efectos quedará así: "PARÁGRAFO SÉPTIMO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra El CONTRATISTA presentó certificación del 01 de febrero de 2021, expedida por el Banco Bancolombia con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No 78600000885, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato".
No2	27/12/2021	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Parágrafo de la Cláusula Séptima del Contrato No. 1724 de 2020... "PARÁGRAFO PRIMERO: Los recursos correspondientes a la vigencia 2021 del Contrato de obra No. 1724 de 2020 por valor de $175.292.352,53, que se liberan del registro presupuestal 239921 del 12 de marzo de 2021, serán incorporados en la actual vigencia al Contrato de interventoría No. 1956 de 2020, contrato que cuenta con aprobación de futuras vigencias excepcionales según oficio No. 5.2.0.1 radicado 2-2020-052478 de fecha 16 de octubre de 2020, Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 94, Recurso Nación, y éste a su vez reintegra dichos recursos al Contrato de obra No. 1724 de 2020 en la vigencia 2022."
No3	30/12/2022	CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el parágrafo de la cláusula primera de la Modificación No. 2 del contrato de obra 1724 de 2020, aclarada mediante Aclaración No. 1, la cual para todos los efectos quedará así: PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2020- 052478 de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público..."

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
No 1	8/06/2022	31/07/2022	30/11/2022
No 2	23/11/2022	30/11/2022	31/12/2022
No 3	26/12/2022	31/12/2022	31/05/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 16/05/2023 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 36,021,730,588.00 **50% EN SMMLV:** $ 20,518.14
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 36,021,730,588.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita RAD-CPC-1476 de fecha 16 de mayo de 2023 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Prórroga del contrato 1724 de 2020, justificación que se soporta en el comunicado de la referencia y en donde se solicita prórrogar el contrato desde el 31 de mayo de 2023 al 30 de noviembre de 2023.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Tramo PR 4+804 al PR 7+640.

Redes de Gas: La empresa proveedora del servicio de gas GASES DEL CARIBE, debe realizar el traslado de 3150m de tuberías de 6" PE100 ubicadas entre el PR 4+804 al PR 9+000, las cuales actualmente se encuentran a borde del terraplén existente. De igual manera debe realizar el traslado o desplazamiento de dos conjuntos de válvulas de operación del sistema ubicadas en el PR 4+804 y el PR PR 6+500, área directa de influencia sobre el corredor en intervención, paso nacional por el corregimiento de San Luis. Una vez se termine estas labores, se procederá a completar terraplén, estructura de pavimento y señalización.

Redes eléctricas: En este tramo se requiere la ejecución del retranqueo de postes ó reubicación del sistema de postes que soportan las líneas de interconexión eléctrica de 34,5kv y 13,2kv, y que requieren ser retirados para completar los tramos de la estructura de la vía que se interviene y garantizar las condiciones de seguridad vial necesarias a futuro, ya que debido a la cercanía actual, son elementos que pueden generar riesgos antijuridicos a la entidad.
Completar la estructura de pavimento según los diseños geométricos y estructurales aprobados, así como la inversión de los recursos.

Las obras civiles pendientes por ejecutar en los tramos mencionados con problemas de continuidad por diferentes obstáculos son las siguientes:
. Instalación de terraplén entre PR 4+800 / PR 6+500
. Instalación de subbase granular a espesor de diseño del PR 4+800 / PR 6+500
. Instalación de base granular del PR 4+800 al PR 7+500.
. Instalación de carpeta asfáltica en espesor de diseño del PR 3+630 / PR 7+500.
. Señalización horizontal y vertical del PR 1+080 al PR 7+500.
. Instalación de defensas metálicas según especificaciones de diseño.
. Construcción de cunetas según especificaciones de diseño.
. Los recursos para estas ejecuciones están disponibles dentro de los rubros presupuestales del contrato.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 2 Fecha: 21/09/2022	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
VALOR BASICO	$ 30,008,939,040	$ 30,008,939,040	$ -	**$ 30,008,939,040**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 1,957,026,957	$ 1,957,026,957	$ -	**$ 1,957,026,957**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 162,747,520	$ 162,747,520	$ -	**$ 162,747,520**
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 32,128,713,517	$ 32,128,713,517	$ -	**$ 32,128,713,517**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD O	$ 234,786,753	$ 234,786,753	$ -	**$ 234,786,753**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 32,363,500,270	$ 32,363,500,270	$ -	**$ 32,363,500,270**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR	$ 358,000,000	$ 358,000,000	$ -	**$ 358,000,000**

FECHA 16/05/2023
(Día / Mes / Año)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 68,020,000	$ 68,020,000	**$ -**	**$ 68,020,000**
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 426,020,000	$ 426,020,000	**$ -**	**$ 426,020,000**
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)	$ 3,007,210,318	$ 3,007,210,318		**$ 3,007,210,318**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 225,000,000	$ 225,000,000		**$ 225,000,000**
Valor Total	**$ 36,021,730,588**	**$ 36,021,730,588**		**$ 36,021,730,588**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Marzo (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 56.99% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 82.05%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 24,622,299,027.14
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 17,103,391,401.41
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 18,733,851,466.05
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 15,004,469,520.00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 7,749,873,893.29 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ 7,254,595,626.72 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Marzo (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 18,747,210,743.55

Último mes facturado: 1/03/2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 17,287,879,121.95 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha al contratista de obra no se le han impuesto sanciones o multas. Actualmente está radicada solicitud en el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, respecto de proceso administrativo sancionatorio por posible incumplimiento del plan de inversiones, solicitud que la Unidad Ejecutora Gerencia de Grandes Proyectos 4, radicó a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos mediante memorando N°SMC-GGP4 29282 de fecha 20 de abril de 2023, con la cual se deja claridad que en caso de ser aprobada la presente solicitud de prórroga, esto no significa que la Entidad Contratante condone los temas objeto de presunto incumplimiento.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA	16/05/2023
	(Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

En atención a la ejecución contractual que presenta actualmente el proyecto Plato – Tenerife, ha de indicarse las actividades que requieren ser adelantadas dentro de la presente solicitud de prórroga, por lo cual a continuación se describen los asuntos desde el componente técnico:

•Tramo PR 4+804 al PR 6+500.

Se requiere el traslado de aproximadamente 150 metros de tubería de 6" PE100 de gas natural y la reubicación de las válvulas especialmente las ubicadas en el frente del corregimiento de San Luis. Además de 3000 metros de tubería de 6" PE100 de gas natural que van desde el PR 6 al PR9 aproximadamente, tales gestiones se vienen adelantando con la empresa prestadora de servicio público GASES DEL CARIBE, para que finalicen las actividades de su competencia, esto es los traslados de redes.

•Tramo PR 4+804 al PR 7+640.

En este tramo se requiere la ejecución del retranqueo de postes y de líneas a nivel 34,5kv y 13,2kv, reubicación de postes y reubicación de líneas de media tensión con el fin de ampliar vía terrestre entre los municipios Tenerife y Plato en el Magdalena.

Así pues, con la entidad competente, empresa prestadora de servicio público AIR-E, actualmente se cuenta con la aprobación de diseños desde el 07 de febrero de 2023, por lo cual el Contratista podría iniciar la intervención correspondiente para el traslado de 43 postes y sus redes eléctricas a lo largo de los puntos de referencia ya indicados.

Ha de aclararse que, para los tramos antes enunciados, la afectación por la no ejecución de las actividades de las empresas prestadoras de servicios públicos, GASES DEL CARIBE Y AIR-E, corresponden a una longitud de 1.90 km, y se resumen en cantidades de obra de la siguiente forma:

Por Ejecutar (Responsabilidad no atribuible al contratista)			
GPP	**Presupuesto**		**% Contrato**
Explanaciones	$	925,450,200	3.08%
Bases, subbases y afirmados	$	1,550,300,100	5.17%
Pavimento asfáltico	$	2,256,790,000	7.52%
Estructuras y drenajes	$	120,456,900	0.40%
Señalización y seguridad	$	189,560,870	0.63%
Obras varias	$	96,700,500	0.32%
Transportes	$	990,340,340	3.30%
No previsto	$	1,814,339,781	6.05%
Total	**$**	**7,943,938,691**	**26.47%**

Cabe resaltar que la ejecución de las dos actividades arriba mencionadas son de suma importancia en la ejecución del proyecto y que los tiempos para su ejecución son necesarios para la finalización y cierre del mismo, agregando que las actividades que deben adelantarse impactan en la ejecución de las actividades propias del contrato a cargo del Consorcio Paz Caribe.

En la eventualidad que la presente solicitud sea viabilizada, durante el tiempo de ejecución restante el Consorcio Paz Caribe optimizará el mismo en aras de continuar las obras que se encuentran pendientes de ejecución y así dar cumplimiento al alcance establecido para el contrato.

JURÍDICA:

En atención a la presente solicitud de prórroga, y teniendo en cuenta que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, a continuación, se precisa la solicitud a saber:

De acuerdo con los requerimientos presentados en el componente técnico del presente escrito, se hace necesario indicar que técnica y contractualmente es viable proceder con la prórroga del presente contrato, teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación antes mencionada que propician la necesidad de prorrogar este, hasta el 30 de noviembre de 2023; es así como se justifica desde lo jurídico-contractual, que mediante pronunciamiento generado por la Corte Constitucional, en sentencia C-949 de 2001, en donde se manifestó en relación con las modificaciones contractuales que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato".

Así mismo, lo prevén por ejemplo el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo: "1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado". (Negrillas fuera de texto original).

Igualmente, la Corte Constitucional señaló que: "(…) las prórrogas de los contratos –como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. (…)" Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: "(…) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (…)" (Negrillas fuera de texto original).

Así las cosas, es razonable concluir que la normativa en cita, así como la jurisprudencia contempla la posibilidad de introducir modificaciones a los elementos del contrato como lo es en este caso, la solicitud de prórroga del contrato 1724 de 2020, en procura de no afectar de manera grave el servicio publico que se pretender satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

La Prorroga no genera adiciones al contrato de obra.

del año 2022, por $ 28.362.500.000 que sumada a la del 2021 por $ 7.659.230.588, resulta el total del valor Inicial del Contrato: $ 36.021.730.588, los cuales son recursos suficientes para finalizar la ejecución del contrato bajo las condiciones actuales.

En la reprogramación de inversiones de la presente solicitud se muestra mes a mes las proyecciones de las facturaciones, desde la interventoría se advierte que para poder cumplir con estas ambiciosas ejecuciones se hace necesario exigir al Consorcio Constructor que debe garantizar que efectivamente implemente la cantidad de frentes suficientes, de tal manera que se desarrollen actividades paralelas y en simultaneo, de igual forma se requiere no tener inconvenientes con el suministro de los diferentes materiales, el pago oportuno de proveedores y personal de obra a fin de garantizar que esto no genere retrasos en las actividades o presentar rendimientos que no favorezcan el desarrollo de la obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

	FECHA	16/05/2023
		(Día / Mes / Año)

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

Los recursos para la realización de las obras están amparados bajo registros presupuestales vigentes y dado que no se tiene solicitud de Adición no se requiere tramitar documento alguno al respecto

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

Gestión Social: Se avanza en las actividades descritas en el documento PAGA, así como se continúa dando cumplimiento a los Programas de Obras con participación comunitaria (proyectos productivos) y cultura vial y Programa de información y divulgación.

Gestión Ambiental: Se han adelantado todos los permisos necesarios para el desarrollo de la obra y se viene ejecutando a cabalidad las actividades y compromisos plasmados en el documento PAGA.

Gestión Predial: Finalizar el proceso de gestión predial que se viene adelantando en el proyecto, agregando que con la prórroga solicitada se avanzará en el cierre de la gestión predial.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

Así las cosas y en atención a los anteriores argumentos el suscrito contratista de obra, solicita comedidamente a la Interventoría evalúe la viabilidad de proceder con la prórroga requerida hasta el 30 de noviembre de 2023, agregando que la finalidad de la misma es garantizar la transitabilidad del corredor vial Plato- Tenerife y en consecuencia se continue con la ejecución de manera adecuada con el fin de que se ejecute del alcance físico actual del proyecto.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: JOSE A. CASTAÑO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 13202-108189BLV

Firma

Nombre: GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-80875 CND

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Vo.Bo.Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Vo.Bo.Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

Nombre: MANUEL FELIPE YALANDA JURADO
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: ANGELICA CAMARGO CASALLAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Firma:

Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Titular Gerencia: Gerencia de Grandes Proyectos 4
Matrícula Profesional No.: 22202-273807COR

Firma

Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe Unidad Ejecutora: Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO REGIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-FOR-INVI-PR-1
VERSIÓN	12
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	16/08/2023 (Día - Mes - Año)

UNIDAD EJECUTORA: ..... **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** .....

PROGRAMA DE INVERSIONES ☒

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.: ..... (Se debe llevar un Orden consecutivo de la numeración)

CONTRATO No: .....

OBJETO: ACTUALIZACIONES PARA LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, INCLUIDAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS QUE CONDUCEN HASTA LA PENETRACIÓN DE LAS TRAVESIAS URBANAS

CONTRATISTA: .....

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: ..... **INTERVENTOR:** .....

PLAZO INICIAL: ..... (En meses, semanas o días calendario incluya)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ..... (Incluya Día/Mes/Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ..... (Incluya Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($): ..... (Incluya Día/Mes/Año)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ($+A+B): ..... (Incluya Día/Mes/Año)

PLAZO ACUMULADO: ..... (En meses, semanas o días calendario incluya suspensiones)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: ..... (Incluya Día/Mes/Año, Ejemplo: 01/01/2023)

FECHA DE REANUDACIÓN: ..... (Incluya Día/Mes/Año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($B): .....

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	Mínimo de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRESIVADA	% Programado a Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Mínimo de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	Mínimo de pesos	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23
	$ 33.333.324.400	16,66%	11,27%	$ 3.755.774.133		$ 3.755.774.133	$ 3.755.774.133	$ 3.755.774.133


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		**MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"1**	**183 días**	**mar 2/05/23**	**jue 30/11/23**	
1		**Hito No. 2 y 3 Vigencia 2023**	**183 días**	**mar 2/05/23**	**jue 30/11/23**	
2		**EXPLANACIONES**	**128 días**	**mar 2/05/23**	**mié 27/09/23**	
3		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	40 días	mar 2/05/23	vie 16/06/23	
4		Demolición de Estructuras	66 días	mar 16/05/23	lun 31/07/23	
5		Remoción de alcantarillas	26 días	mar 2/05/23	mié 31/05/23	
6		Excavación sin clasificar de préstamos	69 días	lun 10/07/23	mié 27/09/23	
7		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	90 días	mar 2/05/23	lun 14/08/23	
8		Terraplenes	90 días	lun 8/05/23	sáb 19/08/23	
9		**BASES, SUBBASES Y AFIRMADO**	**163 días**	**lun 8/05/23**	**lun 13/11/23**	
10		Afirmado	28 días	lun 5/06/23	jue 6/07/23	
11		Subbase Granular clase A	160 días	lun 8/05/23	jue 9/11/23	8CC
12		Base granular clase A	160 días	jue 11/05/23	lun 13/11/23	11CC+3 días
13		**PAVIMENTOS ASFALTICOS**	**163 días**	**jue 25/05/23**	**jue 30/11/23**	
14		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL□1	150 días	jue 25/05/23	mié 15/11/23	12CC+7 días
15		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	153 días	mar 6/06/23	jue 30/11/23	14CC+10 días
16		**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**128 días**	**lun 8/05/23**	**mar 3/10/23**	
17		Excavaciones varias sin clasificar	37 días	mié 10/05/23	mié 21/06/23	5CC+7 días
18		Relleno para estructuras con suelo	65 días	mié 14/06/23	lun 28/08/23	17CC+30 días
19		Concreto clase 21MPA	45 días	mar 30/05/23	jue 20/07/23	17CC+10 días
20		Concreto clase 14MPA	90 días	mar 16/05/23	lun 28/08/23	17CC+5 días
21		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	90 días	mar 30/05/23	lun 11/09/23	20CC+3 días
22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	98 días	lun 8/05/23	mar 29/08/23	5CC+5 días
23		Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100mm	60 días	jue 29/06/23	mié 6/09/23	11CC+45 días
24		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	80 días	mar 13/06/23	mié 13/09/23	26CC+3 días
25		Geotextil Tipo II no tejido	100 días	mié 31/05/23	sáb 23/09/23	17CC+5 días
26		Material granular drenante	100 días	vie 9/06/23	mar 3/10/23	25CC+8 días
27		**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**	**50 días**	**mar 3/10/23**	**mié 29/11/23**	
28		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	50 días	mar 3/10/23	mié 29/11/23	15CC+20 días
29		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	15 días	mar 3/10/23	jue 19/10/23	28CC
30		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	20 días	mar 3/10/23	mié 25/10/23	28CC
31		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	30 días	mar 3/10/23	lun 6/11/23	28CC
32		Defensa metalica	50 días	mar 3/10/23	mié 29/11/23	28CC
33		Captafaros	45 días	lun 9/10/23	mié 29/11/23	28FF
34		**OBRAS VARIAS**	**64 días**	**vie 28/07/23**	**mar 10/10/23**	
35		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	50 días	lun 14/08/23	mar 10/10/23	6CC+30 días
36		Protección de Taludes con bloques de césped	38 días	vie 28/07/23	sáb 9/09/23	15CC+45 días
37		**TRANSPORTES**	**165 días**	**lun 8/05/23**	**mié 15/11/23**	
38		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	165 días	lun 8/05/23	mié 15/11/23	8CC

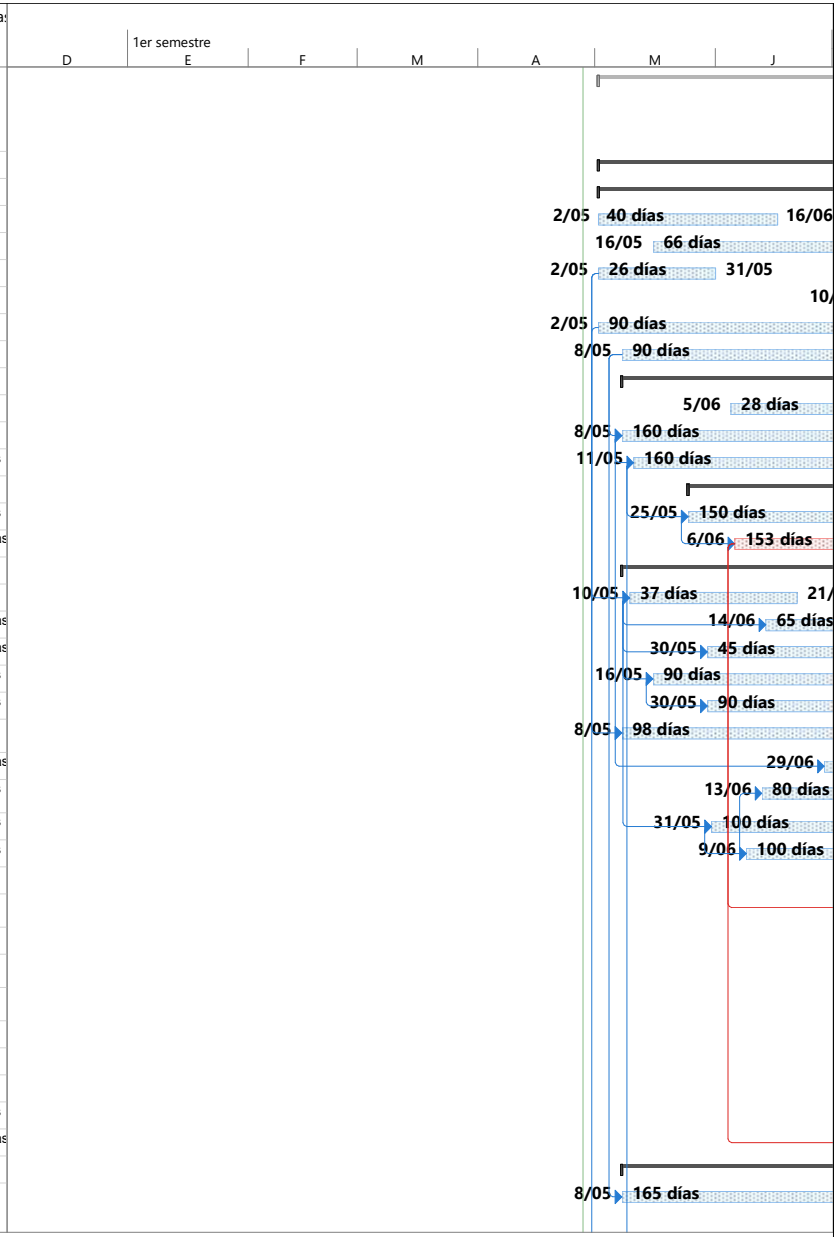


Proyecto: MEJORAMIENTO, GE
Fecha: vie 28/04/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
39		**ITEMS NO PREVISTOS**	**168 días**	**mar 16/05/23**	**lun 27/11/23**	
40		Retiro de cerca	25 días	mié 11/10/23	mié 8/11/23	35
41		Enrocado de protección en piedra pegada	112 días	jue 20/07/23	lun 27/11/23	12CC+60 días
42		Estabilización de subrasante con pedraplén	100 días	mar 16/05/23	vie 8/09/23	7CC
43		Fin	0 días	sáb 9/09/23	sáb 9/09/23	36FF





Proyecto: MEJORAMIENTO, GE
Fecha: vie 28/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 6

FECHA: 16 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No. 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO: 17/03/2021

PLAZO INICIAL: 18 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 36.021.730.588,00

VALOR ACUMULADO: $ 36.021.730.588,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 426.020.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 426.020.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 3.602.173.059,00	28	12	2020	28	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 18.010.865.294,00	28	12	2020	28	12	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 7.204.346.118,00	28	12	2020	28	6	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 10.806.519.176,00	28	6	2022	28	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 127.806.000,00	28	6	2022	28	6	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1002445

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/02/2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones	5,00%	$ 1.801.086.529,00	28	12	2020	28	6	2022
RC contratista y subcontratistas	2,50%	$ 900.543.264,00	28	12	2020	28	6	2022
RC vehículos própios y no propios	1,25%	$ 450.271.632,00	28	12	2020	28	6	2022
RCE Parqueaderos	1,50%	$ 540.325.958,00	28	12	2020	28	6	2022
RC Cruzada	2,50%	$ 900.543.264,00	28	12	2020	28	6	2022
Gastos médicos Siblimite varias personas	1,00%	$ 360.217.305,00	28	12	2020	28	6	2022
RC Patronal Sublimite varias personas	2,50%	$ 900.543.264,00	28	12	2020	28	6	2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 2000041 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/02/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 3.602.173.059,00	17	3	2021	17	3	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 18.010.865.294,00	17	3	2021	17	3	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 7.204.346.118,00	17	3	2021	17	9	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 10.806.519.176,00	17	3	2021	17	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 127.806.000,00	17	3	2021	17	3	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1002445

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/03/2021

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 3.602.173.059,00	8	6	2022	30	5	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 18.010.865.294,00	8	6	2022	30	5	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 7.204.346.118,00	8	6	2022	30	11	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 10.806.519.176,00	30	11	2022	30	11	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 127.806.000,00	30	11	2022	30	11	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1002445

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 24/06/2022

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 3.602.173.059,00	21	11	2022	30	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 18.010.865.294,00	21	11	2022	30	6	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 7.204.346.118,00	21	11	2022	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 10.806.519.176,00	31	12	2022	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 127.806.000,00	31	12	2022	31	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1002445

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 2/12/2022

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 3.602.173.059,00	18	12	2022	1	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 18.010.865.294,00	18	12	2022	1	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 7.204.346.118,00	18	12	2022	31	5	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30	$ 10.806.519.176,00	31	5	2023	31	5	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 127.806.000,00	31	5	2023	31	5	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1002445

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/12/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones	5,00%	$ 1.801.086.529,00	17	3	2021	17	9	2022
RC contratista y subcontratistas	2,50%	$ 900.543.264,00	17	3	2021	17	9	2022
RC vehículos própios y no propios	1,25%	$ 450.271.632,00	17	3	2021	17	9	2022
RCE Parqueaderos	1,50%	$ 540.325.958,00	17	3	2021	17	9	2022
RC Cruzada	2,50%	$ 900.543.264,00	17	3	2021	17	9	2022
Gastos médicos Siblimite varias personas	1,00%	$ 360.217.305,00	17	3	2021	17	9	2022
RC Patronal Sublimite varias personas	2,50%	$ 900.543.264,00	17	3	2021	17	9	2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 2000041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/03/2021

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones	5,00%	$ 1.801.086.529,00	8	6	2022	30	11	2022
RC contratista y subcontratistas	2,50%	$ 900.543.264,00	8	6	2022	30	11	2022
RC vehículos própios y no propios	1,25%	$ 450.271.632,00	8	6	2022	30	11	2022
RCE Parqueaderos	1,50%	$ 540.325.958,00	8	6	2022	30	11	2022
RC Cruzada	2,50%	$ 900.543.264,00	8	6	2022	30	11	2022
Gastos médicos Siblimite varias personas	1,00%	$ 360.217.305,00	8	6	2022	30	11	2022
RC Patronal Sublimite varias personas	2,50%	$ 900.543.264,00	8	6	2022	30	11	2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 2000041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 24/06/2022

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, labores y operaciones	5,00%	$ 1.801.086.529,00	21	11	2022	31	12	2022
RC contratista y subcontratistas	2,50%	$ 900.543.264,00	21	11	2022	31	12	2022
RC vehículos própios y no propios	1,25%	$ 450.271.632,00	21	11	2022	31	12	2022
RCE Parqueaderos	1,50%	$ 540.325.958,00	21	11	2022	31	12	2022
RC Cruzada	2,50%	$ 900.543.264,00	21	11	2022	31	12	2022
Gastos médicos Siblimite varias personas	1,00%	$ 360.217.305,00	21	11	2022	31	12	2022
RC Patronal Sublimite varias personas	2,50%	$ 900.543.264,00	21	11	2022	31	12	2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 2000041 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 2/12/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 DE 6

FECHA	16 (Día)	5 (Mes)	2023 (Año)

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios, labores y operaciones	5,00%	$ 1.801.086.529,00	18	12	2022	31	5	2023
RC contratista y subcontratistas	2,50%	$ 900.543.264,00	18	12	2022	31	5	2023
RC vehículos própios y no propios	1,25%	$ 450.271.632,00	18	12	2022	31	5	2023
RCE Parqueaderos	1,50%	$ 540.325.958,00	18	12	2022	31	5	2023
RC Cruzada	2,50%	$ 900.543.264,00	18	12	2022	31	5	2023
Gastos médicos Siblimite varias personas	1,00%	$ 360.217.305,00	18	12	2022	31	5	2023
RC Patronal Sublimite varias personas	2,50%	$ 900.543.264,00	18	12	2022	31	5	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 2000041 ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5 .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/12/2022 .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: William Cristancho García
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-47527CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
10	15	2000041

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

TIPO DE PÓLIZA: R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	Nº AGRUPADOR	SUCURSAL
29	12	2022	MODIFICACIÓN	5		CARTAGENA

TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
ASEGURADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	CC	000.000.000
DIRECCIÓN	TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3364677

MONEDA	PUNTO DE VENTA	FECHA MAXIMA DE PAGO			VIGENCIA								NÚMERO DE DÍAS
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
Pesos		31	12	2020	18	12	2022	00:00	31	5	2023	00:00	164
TIPO CAMBIO 1,00													

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado : CONSORCIO PAZ CARIBE NIT 901.440.845 - 2
Dirección del Riesgo 1 : TERRITORIO NACIONAL
Ramo : RESPONSABILIDAD CIVIL
Subramo : R.C.E. GENERAL
Objeto del Seguro : PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS ATERCEROS POR EL AS

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	LIMITE POR EVENTO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	1.801.086.529,00	0,00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	900.543.264,00	0,00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	450.271.632,00	0,00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		
R.C.E. PARQUEADEROS	540.325.958,00	0,00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		
R.C. CRUZADA	900.543.264,00	0,00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE		
GASTOS MEDICOS SUBLIMITE VARIAS PERSONAS	360.217.305,00	0,00
Deducible:		

FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO PAZ CARIBE
FORMA DE PAGO : CONTADO CERO DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.
(*) FORMA ANEXA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN CARTAGENA A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022

VALOR ASEGURADO TOTAL	$	0,00
PRIMA	$	2.235.221,00
GASTOS	$	0,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$	424.691,99
AJUSTE AL PESO	$	0,01
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$	2.659.913,00

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.

FIRMA AUTORIZADA DIANA INES TORRES - REPRESENTANTE LEGAL

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO

CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
49721	AGCIA DE SEGI	COLOMBIA DE SEGUROS ASESORES EN SEGUROS	100,00

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
10	15	2000041

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

CERTIFICADO DE : MODIFICACIÓN		HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
ASEGURADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	CC	000.000.000
DIRECCIÓN	TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3364677

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	LIMITE POR EVENTO
R.C. PATRONAL SUBLIMITE VARIAS PERSONAS	900.543.264,00	0,00

Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 2.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
10	15	2000041

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

CERTIFICADO DE : MODIFICACIÓN		HOJA ANEXA No. 2	
TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
ASEGURADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	CC	000.000.000
DIRECCIÓN	TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3364677

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO AXA COLPATRIA PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA DE ACUERDO AL OTROSI DE PRORROGA NO. 3
NUEVO PLAZO DE TERMINACIO: 31/05/2023

VIGENCIA GLOBAL
Desde 17/03/2021 hasta el 31/05/2023

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO AXA COLPATRIA PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA DE ACUERDO AL OTROSI DE PRORROGA NO. 2
NUEVO PLAZO DE TERMINACIO: 31/12/2022
VALOR EL CONTRATO: $36.021.730.588

VIGENCIA GLOBAL
Desde 17/03/2021 hasta el 31/12/2022

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE AXA COLPATRIA CERTIFICA QUE CONOCE DEL MODIFICATORIO NO. 2. DOCUMENTO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

SE PRORROGA EL PLAZO DE EJEUCCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTROSI DE PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO.

NUEVO PLAZO DE TERMINACIÓN: 30/11/2022
VALOR EL CONTRATO: $36.021.730.588

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.

****
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA

LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES.

****
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA EL CORREO DEL INVIAS (ASEGURADO) SE INCLUYE Y/ O ACLARA LO SIGUIENTE:

SE AMPARA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE A PERSONAS O DAÑOS A BIENES REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 1724 DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.

SE AMPARA LA COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES DE ACUERDO CON EL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015 EN SU ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NUMERAL 3

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
10	15	2000041

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

CERTIFICADO DE : MODIFICACIÓN		HOJA ANEXA No. 3	
TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
ASEGURADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845 - 2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	CC	000.000.000
DIRECCIÓN	TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL	TELÉFONO	3364677

TOMADOR: CONSORCIO PAZ CARIBE CON NIT. 901.440.845-2 ESTÁ INTEGRADO POR:
- PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. CON NIT. 900.789.716-6, CON PARTICIPACIÓN DEL 70%
- BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. CON NIT. 901.035.219-5, CON PARTICIPACIÓN DEL 30%

SE DEJA CONSTACIA QUE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.

****

OBJETO

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE A PERSONAS O DAÑOS A BIENES , OCASIONADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASEGURADAS BAJO LA PRESENTE PÓLIZA POR CAUSA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NRO. 1724-2020, DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3

"SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACIÓN AL TERCERO INCLUYE EL DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA VÍCTIMA, SIEMPRE Y CUANDO SE DERIVE DE UN HECHO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA"

"SE CUBRE EL DAÑO MORAL, FISIOLÓGICO O DAÑOS A LA VIDA EN RELACIÓN RESULTANTE DE UN DAÑO PERSONAL FÍSICO QUE SE CAUSE AL TERCERO DAMNIFICADO, SIEMPRE Y CUANDO SE DERIVE DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO - CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA"

"LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES"

TOMADOR: CONSORCICO PAZ CARIBE
NIT: 901.440.845-2
INTEGRADO POR:
PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.789.716-6. PARTICIPACION: 70%
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. NIT: 901.035.219-5. PARTICIPACION: 30%

ASEGURADO: CONSORCIO PAZ CARIBE IDENTIFICADO CON NIT: 901.440.845-2, SE TENDRA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS IDENTIFICADO CON NIT No. 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CABOT COLOMBIANA S.A
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS IDENTIFICADO CON NIT No. 800.215.807-2 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EMITE LA PRESENTE POLIZA QUE SE RIGEN BAJO CONDICIONADO NO 11/01/11-1306-P-06-P001A ENERO/2011

BENEFICIARIOS

Nombre	Documento
TERCEROS AFECTADOS	CC 000.000.000

********** **FIN PÓLIZA** **********

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

REFERENCIA DE PAGO
0610055943

Nombre Tomador	CONSORCIO PAZ CARIBE		
Póliza Número	2000041	Anexo	5
Dirección	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200		
Ciudad	VALLEDUPAR		
Teléfono	3003773079		
Producto	)NSABILIDAD CIVIL R.C. GENERAL CORRELATIVA A C		
Intermediario			
Sucursal Agente	CARTAGENA		
Número de Documento (Ref 2)	NIT 901.440.845 - 2		

PAGOS EN LÍNEA

Botón Pagos en línea en **www.axacolpatria.co**

Pagos recurrentes por PSE o con tarjetas de crédito.

PAGOS PRESENCIALES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Bancolombia Corresponsal Bancario Pagos hasta $3.000.000

Realiza tu pago presentando este formato.

Valor a pagar	2.659.913
Fecha Máxima de Pago	31/12/2020

Cuota No: 1 de: 1

(415)7707336880018(8020)0610055943(8020)9014408452(3900)0002659913(96)20201231

Recuerde que el no pago oportuno del valor de su póliza de seguro, generará la cancelación de la misma

Espacio para Timbre o Firma y Sello del Cajero

ADVERTENCIA: este pago sólo tendrá validez con el sello y firma del cajero. El pago del presente recibo no otorga amparos diferentes a los estipulados en la carátula de la póliza. Para pagos en cheque favor girar a nombre de: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Haz tus pagos personalmente sin ayuda de terceros, protege tus datos. Es fácil y seguro, sigue estos pasos:

Paso 1
Ingesa a **www.axacolpatria.co**

Paso 2
Selecciona el botón **Pagos en Línea** y **luego Pagos recurrentes**.

Paso 3
Paga en línea con **cuentas de ahorro y corriente.**

Paso 4
Al finalizar el pago, recibirás un correo de **confirmación.**

Cualquier inquietud, comunícate con tu Asesor de Seguros o con nuestras líneas de atención al cliente en Bogotá al 423 57 57 y en el resto del país 01 8000 512 620

Dirección Carrera 7 No. 24 - 89, Bogotá D.C. Horario de atención lunes a viernes de 9 a.m a 12 pm y de 1 p.m. a 4 p.m. correo electrónico defensoria@consuelorodriguezvalero.com Telefonos 313 499 80 23CONVENIO BANCOLOMBIA 32522 Línea integral de Atención al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogotá y 018000512620 para el resto del país o #247 o si lo prefiere a la dirección electrónica servicioalcliente@axacolpatria.co

COPIA CLIENTE

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

REFERENCIA DE PAGO
0610055943

Nombre Tomador	CONSORCIO PAZ CARIBE
Póliza Número	2000041
Dirección	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200
Teléfono	3003773079
Número de Documento (Ref 2)	NIT 901.440.845 - 2
Valor a pagar	2.659.913
Fecha de Pago(DD/MM/AAAA)	

PAGOS EN LÍNEA

Botón Pagos en línea en **www.axacolpatria.co**

Pagos recurrentes por PSE o con tarjetas de crédito.

PAGOS PRESENCIALES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Bancolombia Corresponsal Bancario Pagos hasta $3.000.000

Realiza tu pago presentando este formato.

(415)7707336880018(8020)0610055943(8020)9014408452(3900)0002659913(96)20201231

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

SUC.	RAMO	POLIZA No.
10	30	1002445

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
TIPO DE POLIZA : GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

FECHA SOLICITUD DÍA	MES	AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	N° AGRUPADOR	SUCURSAL
29	12	2022	MODIFICACION	7		CARTAGENA

TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
AFIANZADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	KR 59 26 60, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056001

MONEDA	PUNTO DE VENTA	FECHA CORTE NOVEDADES	FECHA MAXIMA DE PAGO DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS	HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS	NÚMERO DE DÍAS
Pesos			29	12	2022	18	12	2022	00:00	31	05	2028	00:00	1991
TIPO CAMBIO 1.00		FECHA LIMITE DE PAGO												

DETALLE DE COBERTURAS

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Ramo : CUMPLIMIENTO
Objeto del Seguro : CONTRATO

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	Vig. Desde	Vig. Hasta
CUMPLIMIENTO	3,602,173,059.00	18/12/2022	01/12/2023
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÒN DEL ANTICIPO	18,010,865,294.00	18/12/2022	01/12/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONE	7,204,346,118.00	18/12/2022	31/05/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA	10,806,519,176.00	31/05/2023	31/05/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	127,806,000.00	31/05/2023	31/05/2028

BENEFICIARIOS

Nombre	Documento
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT 800.215.807-2

AFIANZADOS

NOMBRE	PORCENT	NRO. DOC	TELEFONO	DIRECCION
PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S	70	900.789.716-6	300377307	CRA 19 N 9A 55
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A	30	901.035.219-5		TRV. 52B # 21D-104

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA EL OTROSI NO. 3 DE PRORROGA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE PROCEDE A AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCCION HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023

FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO PAZ CARIBE

FORMA DE PAGO: CONTADO CUMPLIMIENTO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS A CONTINUACIÓN:

VALOR ASEGURADO TOTAL	$ **********0.00
PRIMA	$*******36,319,431.00
GASTOS	$**********0.00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	$********6,900,691.89
AJUSTE AL PESO	$**********0.11
TOTAL A PAGAR EN PESOS	$*******43,220,123.00

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN CARTAGENA A LOS 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION	PRIMA	CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
				49721	Agencia	COLOMBIANA DE SEGUROS ASES	100.00

B6B7E555FAF6BD1

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.1002445

CERTIFICADO DE: MODIFICACION		HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
AFIANZADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	KR 59 26 60, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056001

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE EL 17/03/2021 HASTA EL 01/12/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO VIGENCIA DESDE EL 17/03/2021 HASTA EL 01/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VIGENCIA DESDE EL 17/03/201 HASTA EL 31/05/2026
ESTABILIDAD EN LA OBRA 31/05/2023 HASTA EL 31/05/2028
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO (CALIDAD DEL SERVICIO) VIGENCIA DESDE EL 31/05/2023 HASTA EL 31/05/2028

SE AJUSTAN LAS VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA
LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.

OBJETO DE LA MODIFICACION

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO AXA COLPATRIA PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA DE ACUERDO AL OTROSI DE PRORROGA NO. 2

NUEVO PLAZO DE TERMINACIO: 31/12/2022
VALOR EL CONTRATO: $36.021.730.588

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE EL 17/03/2021 HASTA EL 30/06/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO VIGENCIA DESDE EL 17/03/2021 HASTA EL 30/06/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VIGENCIA DESDE EL 17/03/201 HASTA EL 31/12/2025
ESTABILIDAD EN LA OBRA 31/12/2022 HASTA EL 31/12/2027
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO (CALIDAD DEL SERVICIO) VIGENCIA DESDE EL 31/12/2022 HASTA EL 31/12/2027

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE AXA COLPATRIA CERTIFICA QUE CONOCE DEL MODIFICATORIO NO. 2. DOCUMENTO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

SE PRORROGA EL PLAZO DE EJEUCCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTROSI DE PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO.

NUEVO PLAZO DE TERMINACIÓN: 30/11/2022
VALOR EL CONTRATO: $36.021.730.588

VIGENCIA GLOBAL
CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE EL 17/03/2021 HASTA EL 30/05/2023
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO VIGENCIA DESDE EL 17/03/2021 HASTA EL 30/05/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES VIGENCIA DESDE EL 17/03/201 HASTA EL 30/11/2025
ESTABILIDAD EN LA OBRA 30/11/2022 HASTA EL 30/11/2027
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO (CALIDAD DEL SERVICIO) VIGENCIA DESDE EL 30/11/2022 HASTA EL 30/11/2027

SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA SEÑALADA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.
****

POR MEDIO DEL PRESENTE Y TENIENDO EN CUENTA EL ACTA DE INICIO DE OBRA SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIA SEÑALDA.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.
****

MEDIANTE EL PRESENTE SE CONFIRMA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD EN LA OBRA Y DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (CALIDAD DEL SERVICIO)

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LO SIGUIENTE:

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.1002445

CERTIFICADO DE:	MODIFICACION	HOJA ANEXA No. 2	
TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
AFIANZADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	KR 59 26 60, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056001

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES QUE EL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN Y LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 1724 DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 CUYO OBJETO ES: ´MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ´CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES´. MÓDULO 3.

TOMADOR/ AFIANZADO: CONSORCIO PAZ CARIBE. NIT. 901.440.845-2
INTEGRADOR POR:

- PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.789.716-6. Participación del 70%
- BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. con NIT. 901.035.219-5. Participación del 30%.

LAS DEMAS CONDICIONES SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES.

****
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y TENIENDO EN CUENTA EL CORREO DEL INVIAS (ASEGURADO) SE PROCEDE A INCLUIR Y/O ACLARAR LO SIGUIENTE:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL CONTRATISTA; EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN Y LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 1724 DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 CUYO OBJETO ES: ´MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ´CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES´. MÓDULO 3.

EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.

SE ACLARA QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN DE LOS AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL,

SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE INICIO DE LA GARANTIA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.

TOMADOR: CONSORCIO PAZ CARIBE IDENTIFICADO CON NIT. 901.440.845-2 INTEGRADO POR:

- PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.789.716-6, con participación del 70%
- BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. con NIT. 901.035.219-5 con participación del 30%

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS NIT: 800.215.807-2

LAS DEMAS CONDICIONE SIN MODIFICAR PERMANECEN VIGENTES

****

OBJETO:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS A CARGO DEL AFIANZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO NO. 1724-2020 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2.020, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ´CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES´. MÓDULO 3.

TOMADOR: CONSORCICO PAZ CARIBE

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO POLIZA No.1002445

CERTIFICADO DE: MODIFICACION		HOJA ANEXA No. 3	
TOMADOR	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
AFIANZADO	CONSORCIO PAZ CARIBE	NIT	901.440.845-2
DIRECCIÓN	CT NOMBRE VIA AL AE KM 1 200, VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO	3003773079
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	KR 59 26 60, BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056001

NIT: 901.440.845-2
INTEGRADO POR:
PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.789.716-6. PARTICIPACION: 70%
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S. NIT: 901.035.219-5. PARTICIPACION: 30%

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD EN LA OBRA TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA FINAL DE ENTREGA DE LA OBRA.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO(5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA FINAL DE ENTREGA DE LA OBRA.

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. EMITE LA PRESENTE POLIZA QUE SE RIGEN BAJO CONDICIONADO No: 12/10/2017-1306-P-05-P/531/OCTUBRE/17-D00I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																	20	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	353
Lluvias moderadas																	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Lluvias intensas																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total																	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma

Nombre: Diomar David Villegas Rivera
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202200076 COR

Firma Felipe Campos C.

Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

TABLA No 5

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA EL AGRADO MES MARZO DE 2021					
CodigoEstacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica

FUENTE: IDEAM 2021

TABLA No 6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA EL AGRADO
MES MARZO DE 2021

Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena	Plato

FUENTE IDEAM 2021

TABLA No 7

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA EL AGRADO
MES MARZO DE 2021

FechaInstalacion	echaSuspensio	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	1/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	2/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	3/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	4/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	5/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	6/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	7/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	8/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	9/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	11/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/03/2021 0:00	55	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/03/2021 0:00	29	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/03/2021 0:00	5	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/03/2021 0:00	0	50		900
15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	31/03/2021 0:00	0	50		900

FUENTE IDEAM 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	3	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	22	23	24	24	24	24	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	23	24	24	712
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Diomar David Villegas Rivera
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202200076 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES ABRIL DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica

FUENTE IDEAM 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES ABRIL DE 2021

Entidad	AreaOperativa
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

FUENTE IDEAM 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES ABRIL DE 2021

Magdalena	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspens	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria

FUENTE IDEAM 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES ABRIL DE 2021

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
1/04/2021 0:00	0	50		900
2/04/2021 0:00	0	50		900
3/04/2021 0:00	0	50		900
4/04/2021 0:00	0	50		900
5/04/2021 0:00	0	50		900
6/04/2021 0:00	85	50		900
7/04/2021 0:00	35	50		900
8/04/2021 0:00	1	50		900
9/04/2021 0:00	0	50		900
10/04/2021 0:00	0	50		900
11/04/2021 0:00	0	50		900
12/04/2021 0:00	0	50		900
13/04/2021 0:00	0	50		900
14/04/2021 0:00	16	50		900
15/04/2021 0:00	55	50		900
16/04/2021 0:00	0	50		900
18/04/2021 0:00	0	50		900
21/04/2021 0:00	0	50		900
22/04/2021 0:00	0	50		900
23/04/2021 0:00	2	50		900
26/04/2021 0:00	1	50		900
28/04/2021 0:00	2	50		900

FUENTE IDEAM 2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	4 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	735
Lluvias moderadas	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Kevin Javier Espeleta Brito
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202192140 CND

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES MAYO DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES MAYO DE 2021

Entidad	AreaOperativa
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES MAYO DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES MAYO DE 2021

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
2/05/2021 0:00	0	50		900
3/05/2021 0:00	4	50		900
4/05/2021 0:00	0	50		900
5/05/2021 0:00	0	50		900
6/05/2021 0:00	5	50		900
7/05/2021 0:00	0	50		900
8/05/2021 0:00	0	50		900
9/05/2021 0:00	0	50		900
10/05/2021 0:00	0	50		900
11/05/2021 0:00	0	50		900
12/05/2021 0:00	0	50		900
13/05/2021 0:00	0	50		900
14/05/2021 0:00	0	50		900
15/05/2021 0:00	0	50		900
16/05/2021 0:00	0	50		900
17/05/2021 0:00	0	50		900
18/05/2021 0:00	0	50		900
19/05/2021 0:00	0	50		900
20/05/2021 0:00	0	50		900
21/05/2021 0:00	0	50		900
22/05/2021 0:00	0	50		900
23/05/2021 0:00	0	50		900
24/05/2021 0:00	2	50		900
25/05/2021 0:00	0	50		900
26/05/2021 0:00	0	50		900
27/05/2021 0:00	27	50		900
28/05/2021 0:00	0	50		900
29/05/2021 0:00	0	50		900
30/05/2021 0:00	0	50		900
31/05/2021 0:00	0	50		900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Dia) / 7 / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	21	23	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	23	23	23	24	24	24	24	23	22	23	20	24	24	24	24	704
Lluvias moderadas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	9
Lluvias intensas	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Kevin Javier Espeleta Brito
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202192140 CND

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES JUNIO DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES JUNIO DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	1/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	2/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	3/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	4/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	5/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	6/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	7/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	8/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	9/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	11/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/06/2021 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/06/2021 0:00	8	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/06/2021 0:00	22	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/06/2021 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/06/2021 0:00	26	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/06/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/06/2021 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 8 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	21	23	24	24	24	24	19	24	23	24	24	24	24	22	24	23	23	24	23	24	24	21	23	23	24	20	24	24	24	24	24	720
Lluvias moderadas	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	15
Lluvias intensas	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Kevin Javier Espeleta Brito
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202192140 CND

Firma Felipe Campos C.
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES JULIO DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES JULIO DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	1/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	2/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	3/07/2021 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	4/07/2021 0:00	15	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	5/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	6/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	7/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	8/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	9/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	11/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/07/2021 0:00	6	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	23/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/07/2021 0:00	40	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	26/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/07/2021 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/07/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	31/07/2021 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) / 9 / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	22	24	22	24	24	24	22	24	24	22	24	24	24	22	22	22	24	24	24	23	24	24	23	22	24	23	24	21	20	22	714
Lluvias moderadas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	3	4	2	21
Lluvias intensas	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma

Nombre: Kevin Javier Espeleta Brito
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202192140 CND

Firma

Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES AGOSTO DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES AGOSTO DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	1/08/2021 0:00	9	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	2/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	3/08/2021 0:00	30	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	4/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	5/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	6/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	8/08/2021 0:00	15	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	9/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/08/2021 0:00	29	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/08/2021 0:00	12	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/08/2021 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/08/2021 0:00	26	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/08/2021 0:00	18	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	23/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/08/2021 0:00	25	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	26/08/2021 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/08/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/08/2021 0:00	68	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/08/2021 0:00	14	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	31/08/2021 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) / 10 / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	20	15	24	23	21	24	24	24	24	24	23	24	22	24	24	24	21	24	21	24	24	24	23	22	23,5		690,5
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	4	9	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	2	0		25
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0,5		4,5
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Antonio Orozco Mulford
Director de Obra
Matrícula No.: 08202-54610 ATL

Firma Felipe Campos C.
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES SEPTIEMBRE DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES SEPTIEMBRE DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	01/09/2021 0:00	1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	02/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	03/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	04/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	05/09/2021 0:00	34	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	06/09/2021 0:00	14	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	07/09/2021 0:00	6	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	08/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	09/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/09/2021 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/09/2021 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/09/2021 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/09/2021 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/09/2021 0:00	95	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/09/2021 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	23/09/2021 0:00	7.5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	26/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/09/2021 0:00	18	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/09/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/09/2021 0:00	70	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDE DE PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DEL 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0 + 000 AL PR 15 + 000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	23	24	24	22	24	24	24	23	24	23	24	24	24	23	23	24	19	24	24	730
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	10
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 15202-272125BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

DATOS PRECIPITACIÓN MES OCTUBRE ESTACIÓN METEOROLÓGICA - MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA					
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica

DATOS PRECIPITACIÓN MES OCTUBRE ESTACIÓN METEOROLÓGICA - MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA		
Entidad	**AreaOperativa**	**Departamento**
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena

DATOS PRECIPITACIÓN MES OCTUBRE ESTACIÓN METEOROLÓGICA - MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA									
Municipio	**Fecha Instalacion**	**IdParametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	1/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	2/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	3/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	4/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	5/10/2021 0:00	11	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	6/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	7/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	8/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/10/2021 0:00	17	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	11/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/10/2021 0:00	1	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/10/2021 0:00	6	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/10/2021 0:00	29	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	23/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	26/10/2021 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/10/2021 0:00	24	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/10/2021 0:00	18	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/10/2021 0:00	27	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	31/10/2021 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 12 (Año) 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	21	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	23	20	24	17	22	23	23	24		698,5
Lluvias moderadas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0		10
Lluvias intensas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	4	0	3	0	0	1	0		11,5
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES NOVIEMBRE DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES NOVIEMBRE DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	1/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	2/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	3/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	4/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	5/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	6/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	7/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	8/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	9/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	11/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/11/2021 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/11/2021 0:00	10	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	23/11/2021 0:00	7	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/11/2021 0:00	6	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	26/11/2021 0:00	0.1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/11/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/11/2021 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/11/2021 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) / 1 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDE DE PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 14 DEL 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0 + 000 AL PR 15 + 000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información meteorológica de la estació el AGRADO, del municipio de plato, estación con información disponible más cerca de la zona del proyecto.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matricula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES DICIEMBRE DE 2021

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	Area Operativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
ESTACION PLUVIOMETRICA EL AGRADO
MES DICIEMBRE DE 2021

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	01/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	02/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	03/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	04/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	05/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	06/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	07/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	08/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	09/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	10/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	11/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	12/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	13/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	14/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	15/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	16/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	17/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	18/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	19/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	20/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	21/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	22/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	23/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	24/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	25/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	26/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	27/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	28/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	29/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	30/12/2021 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico	Diaria	31/12/2021 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 2 (Año) 2022

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2022 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

SECTOR: PR 0+000 AL PR 15+000

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	21	24	24	24	24	739
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	5
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/01/2022 0:00	1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/01/2022 0:00	1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/01/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/01/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/03/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	668
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Codigo Estacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/02/2022 0:00	8	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/02/2022 0:00	31	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/02/2022 0:00	27	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/02/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/02/2022 0:00	17	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/02/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/02/2022 0:00	3	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	23	24	24	24	18	22	729
Lluvias moderadas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	2	12
Lluvias intensas	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022							
Codigo Estacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022										
Departamento	Municipio	Fecha Instalacion	Id Parametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Nivel Aprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/03/2022 0:00	1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/03/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/03/2022 0:00	4	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	23	24	22	24	20	21	19	21	21	24	24	24	24	23	18	24	22		686
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	2	4	3	2	0	0	0	0	1	4	0	0		22
Lluvias intensas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2		12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/04/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/04/2022 0:00	10	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/04/2022 0:00	45	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/04/2022 0:00	24	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/04/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/04/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/04/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/04/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	21	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	22	21	24	23	24	24	24	22	24	23	24	22	24	24	24	728
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Erick Amid Camargo Morales
Residente de obra
Matrícula No.: 22202201974 COR

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA ESTACIÓN EL AGRADO PLATO - MAGDALENA MES MAYO DE 2022								
CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira	Magdalena

INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA ESTACIÓN EL AGRADO PLATO - MAGDALENA MES MAYO DE 2022									
Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/05/2022 0:00	2	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/05/2022 0:00	3	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/05/2022 0:00	37	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/05/2022 0:00	35	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/05/2022 0:00	1	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/05/2022 0:00	3	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/05/2022 0:00	6	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/05/2022 0:00	3	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/05/2022 0:00	0	50	900
Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/05/2022 0:00	2	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	24	21	24	24	24	22	24	24	24	24	24	23	23	24	24	23	24	21	23	21	24	21	22	22	23	24	21	22	23	691
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	1	0	0	2	0	14
Lluvias intensas	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	3	0	1	15
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Javier García Gonzalez
Director de Obra
Matrícula No. 08202151180 ATL

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/06/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/06/2022 0:00	29	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/06/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/06/2022 0:00	9	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/06/2022 0:00	8	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/06/2022 0:00	38	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/06/2022 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/06/2022 0:00	28	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/06/2022 0:00	17	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/06/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/06/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	22	24	24	24	21	23	21	22	22	20	24	24	24	24	19	721
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	3	0	3	0	0	4	0	0	0	0	4	20
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Javier García Gonzalez
Director de Obra
Matrícula No. 08202151180 ATL

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/07/2022 0:00	7	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/07/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/07/2022 0:00	9	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/07/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/07/2022 0:00	6	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/07/2022 0:00	38	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/07/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/07/2022 0:00	26	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/07/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/07/2022 0:00	3	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	21	18	19	24	23	24	24	24	23	24	24	24	23	24	22	23	24	24	24	22	24	22	24	24	21	22	24	21	22	22	24	708
Lluvias moderadas	2	3	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	15
Lluvias intensas	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	2	0	0	3	2	0	3	0	2	0	21
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Didier Alexander Ramírez Navarro
Residente de Obra
Matrícula No. 13202-189985 BLV

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/08/2022 0:00	19	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/08/2022 0:00	21	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/08/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/08/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/08/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/08/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/08/2022 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/08/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/08/2022 0:00	87	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/08/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/08/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/08/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/10/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	24	24	23	24	20	24	22	24	23	23	24	24	22	24	24	24	21	21	17	24	24	22	24	24	24	24	24	22	22	21	687
Lluvias moderadas	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	23
Lluvias intensas	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Didier Alexander Ramirez Navarro
Residente de obra
Matrícula No. 13202189985BLV

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/09/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/09/2022 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/09/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/09/2022 0:00	85	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/09/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/09/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/09/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/09/2022 0:00	34	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	22	20	24	24	20	22	22	24	24	24	24	21	19	23	24	24	24	23	24	23	23	23	23	23	21,5	24	24	24	24	24	24	712,5
Lluvias moderadas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15
Lluvias intensas	2	2	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2,5	0	0	0	0	0	0	16,5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: SUJEY BERMUDEZ
Líder de Integración
Matrícula No. 13202104512BLV

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/10/2022 0:00	24	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/10/2022 0:00	6	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/10/2022 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/10/2022 0:00	24	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/10/2022 0:00	11	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/10/2022 0:00	5	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/10/2022 0:00	3	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/10/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/10/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	22	22	20	13	12	18	21	19,50	24,00	22,5	21	20	24	23	24	24	17	24	24	24	23	23	24	24	24	19	24	23,5	24	24	675,5
Lluvias moderadas	0	0	0	2	9	12	6	1	3	0	1,5	3	4	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0,5	0	0	53
Lluvias intensas	0	1	2	2	2	0	0	2	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14,5
Total horas	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Didier Ramirez
Residente de obra
Matrícula No. 13202189985BLV

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/11/2022 0:00	8	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/11/2022 0:00	4	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/11/2022 0:00	24	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/11/2022 0:00	10	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/11/2022 0:00	2	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/11/2022 0:00	41	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/11/2022 0:00	31	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/11/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/11/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2022 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Didier Ramirez
Residente de obra
Matrícula No. 13202189985BLV

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Codigo Estacion	**NombreEstacion**	**Latitud**	**Longitud**	**Altitud**	**Categoria**	**Entidad**	**AreaOperativa**
25021610	AGRADO EL [25021610]	96.856.666.670	-7.450.486.111	100	PluviomÃ©trica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San AndrÃ©s

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022										
Departamento	**Municipio**	**Fecha Instalacion**	**Id Parametro**	**Etiqueta**	**DescripcionSerie**	**Frecuencia**	**Fecha**	**Valor**	**Grado**	**Nivel Aprobacion**
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	1/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	2/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	3/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	4/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	5/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	6/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	7/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	8/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	9/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	10/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	11/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	12/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	13/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	14/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	15/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	16/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	17/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	18/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	19/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	20/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	21/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	22/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	23/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	24/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	25/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	26/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	27/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	28/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	29/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	30/12/2022 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	30117	PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria	31/12/2022 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2023 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Didier Ramirez
Residente de obra
Matrícula No. 13202189985BLV

Firma
Nombre: Luis Felipe Campos Corredor
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 15202-272125 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022									
CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa	Departamento	Municipio
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés	Magdalena	Plato

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/01/2023 0:00	29	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	8/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	9/01/2023 0:00	35	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	10/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	11/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	12/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	13/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	14/01/2023 0:00	8	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	15/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	16/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	17/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	18/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	20/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	29/01/2023 0:00	0	50	900
15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	31/01/2023 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**				**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				672
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Diego Armando Ricardo García
Residente de obra
Matrícula No. 13202238584 BLV

Firma
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Residente de interventoría
Matrícula No. 25202186068 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023							
CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés

REGISTRO PLUVIOMETRICO ESTACIÓN EL AGRADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023										
Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	8/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	9/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	10/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	20/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/02/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	21/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	22/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	23/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	24/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	25/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	26/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	27/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	28/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	29/01/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	31/01/2023 0:00	0	50	900

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 4 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1724 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAZ CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2023 **PROYECTO:** PLATO - TENERIFE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1956 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA PLANES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	739
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se anexa información pluviometrica diaria de la estación Agrado, estación cercana con información disponible del municipio de Plato.

Firma
Nombre: Diego Armando Ricardo García
Residente de obra
Matrícula No. 13202238584 BLV

Firma
Nombre: Iván Darío Montes Otero
Residente de interventoría
Matrícula No. 25202186068 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria	Entidad	AreaOperativa
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés
25021610	AGRADO EL [25021610]	96856666670	-7450486111	100	Pluviométrica	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 05 - Magdalena-Cesar-Guajira-San Andrés

Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	1/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	2/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	3/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	4/03/2023 0:00	1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	5/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	6/03/2023 0:00	1	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	7/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	15/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	16/03/2023 0:00	28	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	18/03/2023 0:00	0	50	900
Magdalena	Plato	15/06/1982 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Día pluviométrico (convencional)	Diaria	19/03/2023 0:00	0	50	900

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOSPARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Contrato y/o Convenio: **Contrato número 1724 de 2020**

Objeto: ***"MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".***

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	NO (*)	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

(*) Manifiesta el Gestor Técnico del proyecto que los documentos contractuales a cargar en el aplicativo SICO han sido dispuestos en el enlace OneDrive:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karteaga_invias_gov_co/Esvla9VqEkNCka1C22leGekBhgeghKo_rmyJHSMmFS86mA?e=oshaXA

y que, dada la intermitencia del aplicativo SICO y/o sus trámites administrativos, no ha permitido la actualización de la documentación propia del contrato 1724 de 2020; el cual se actualizará una vez se supere la misma desde el administrador.

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dada en Bogotá, el 16 de mayo de 2023.

Ing. MANUEL FELIPE YALANDA JURADO
Gestor Técnico del Proyecto – GGP 4
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

SECOP II

Contrato número 1724 de 2020, derivado de la LP-DT-045-2020.



Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución del Contrato | Modificaciones del Contrato | Incumplimiento

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2064143
Número del Contrato	1724-2020
Versión del contrato	8
Objeto del contrato:	"MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	17/03/2021 8:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	15 días para terminar (31/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí / No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	Sí / No
Obligaciones ambientales	Sí / No
Obligaciones pos consumo	Sí / No
Reversión	Sí / No

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PAZ CARIBE

COLOMBIA, Cartagena

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor / Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PAZ CARIBE	BANCOLOMBIA	Corriente	78600000885

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: JOSE ANTONIO MANJARREZ ORTIZ — Fecha de aprobación: 28/12/2020 3:40:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Catalina Téllez Posada — Fecha de aprobación: 28/12/2020 6:57:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado:

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2064143_En ejecución

Información del objeto

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
R-LP-045- MOD 3 NUMERADA.pdf	R-LP-045- MOD 3 NUMERADA.pdf	Desc
carpeta modulo 3.zip	carpeta modulo 3.zip	Desc
R- minuta modificación firmada .pdf	R- minuta modificación firmada .pdf	Desc
_MODIFICACION No. 2 cto 1724-2020.pdf	_MODIFICACION No. 2 cto 1724-2020.pdf	Desc
CONTRATO NÚMERO 1724 DE 2020- ACLARACION NO 1.pdf	CONTRATO NÚMERO 1724 DE 2020- ACLARACION NO 1.pdf	Desc
1. PROYECTO MINUTA PRORROGA No. 1 CONTRATO OBRA No. 1724 - 2020.pdf	1. PROYECTO MINUTA PRORROGA No. 1 CONTRATO OBRA No. 1724 - 2020.pdf	Desc
_Rv PRORROGA No. 2 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf	_Rv PRORROGA No. 2 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf	Desc
MINUTA PRORR. No. 03- CTO 1724-2020.pdf	MINUTA PRORR. No. 03- CTO 1724-2020.pdf	Desc
MODIFICACIÓN No. 03 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf	MODIFICACIÓN No. 03 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf	Desc


¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? Sí / No


Información presupuestal


Imágenes capturadas del aplicativo SECOP II, actualizadas el 16/05/2023.


SICO


Contrato número 1724 de 2020.

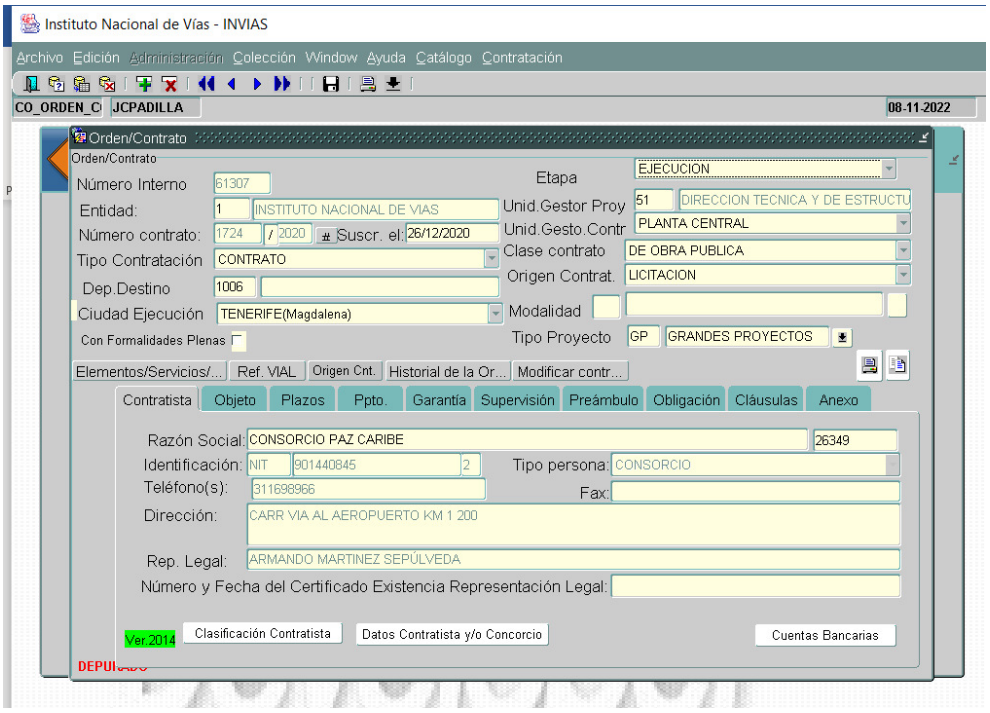

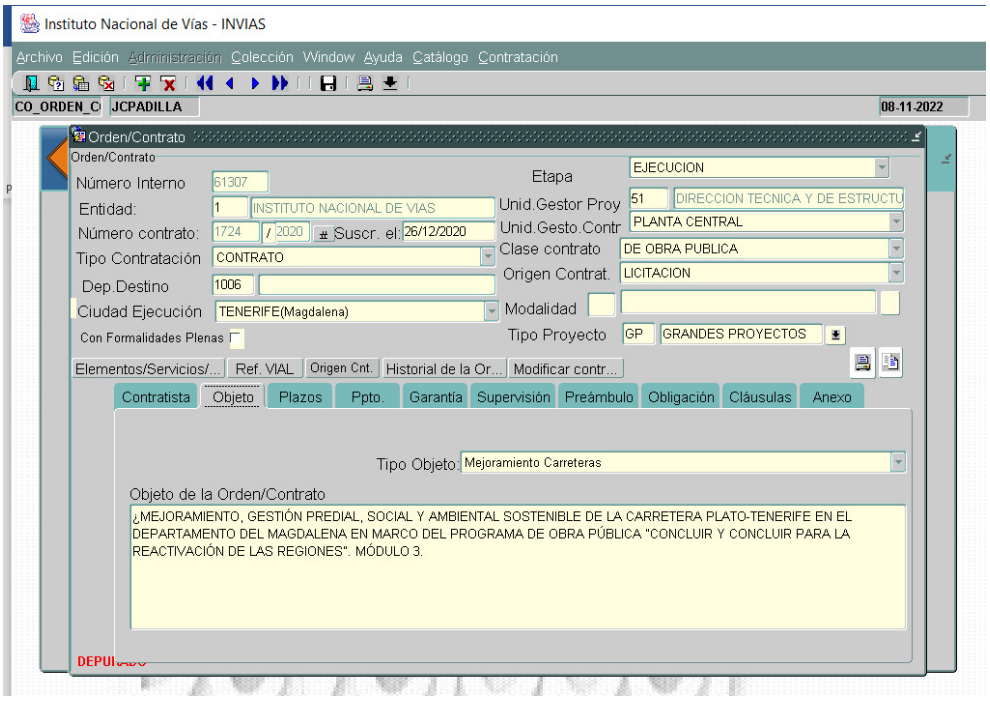

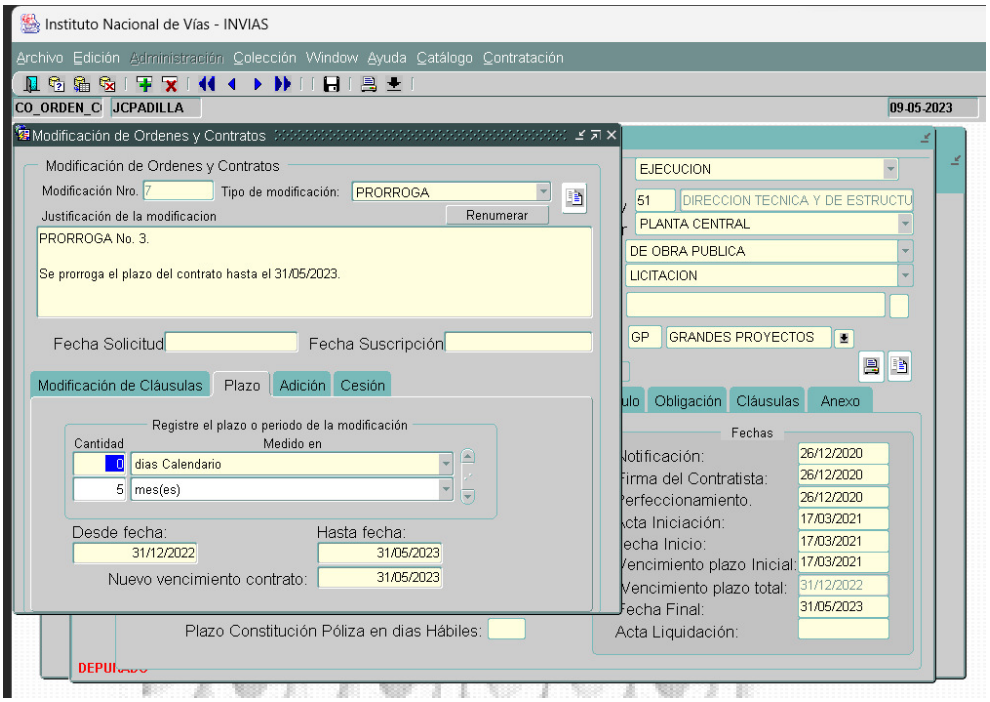
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación
CO_ORDEN_C JCPADILLA
09-05-2023
Modificación de Ordenes y Contratos
Modificación de Ordenes y Contratos
Modificación Nro. 7
Tipo de modificación: PRORROGA
Justificación de la modificacion
Renumerar
PRORROGA No. 3.
Se prorroga el plazo del contrato hasta el 31/05/2023.
Fecha Solicitud
Fecha Suscripción
Modificación de Cláusulas
Plazo
Adición
Cesión
Registre el plazo o periodo de la modificación
Cantidad
Medido en
0 dias Calendario
5 mes(es)
Desde fecha:
31/12/2022
Hasta fecha:
31/05/2023
Nuevo vencimiento contrato:
31/05/2023
Plazo Constitución Póliza en dias Hábiles:
EJECUCION
51 DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTU
PLANTA CENTRAL
DE OBRA PUBLICA
LICITACION
GP GRANDES PROYECTOS
Obligación
Cláusulas
Anexo
Fechas
Notificación: 26/12/2020
Firma del Contratista: 26/12/2020
Perfeccionamiento. 26/12/2020
Acta Iniciación: 17/03/2021
Fecha Inicio: 17/03/2021
Vencimiento plazo Inicial: 17/03/2021
Vencimiento plazo total: 31/12/2022
Fecha Final: 31/05/2023
Acta Liquidación:

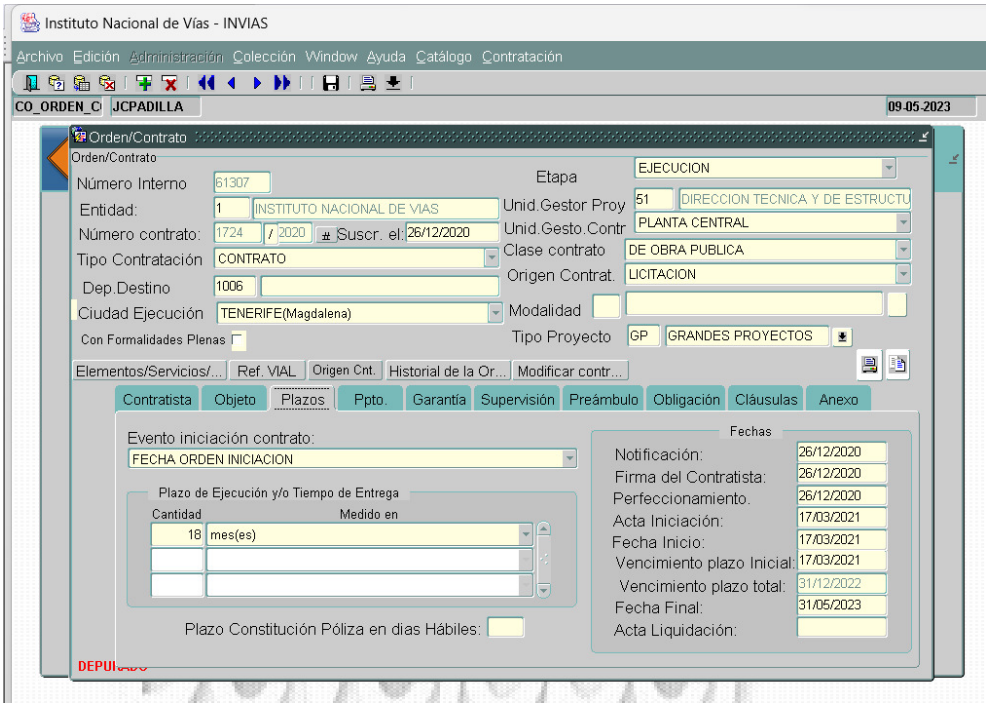

Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación
CO_ORDEN_C JCPADILLA
09-05-2023
Orden/Contrato
Orden/Contrato
Número Interno 61307
Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número contrato: 1724 / 2020 # Suscr. el: 26/12/2020
Tipo Contratación CONTRATO
Dep.Destino 1006
Ciudad Ejecución TENERIFE(Magdalena)
Con Formalidades Plenas
Etapa EJECUCION
Unid.Gestor Proy 51 DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTU
Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL
Clase contrato DE OBRA PUBLICA
Origen Contrat. LICITACION
Modalidad
Tipo Proyecto GP GRANDES PROYECTOS
Elementos/Servicios/...
Ref. VIAL
Origen Cnt.
Historial de la Or...
Modificar contr...
Contratista
Objeto
Plazos
Ppto.
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Evento iniciación contrato:
FECHA ORDEN INICIACION
Plazo de Ejecución y/o Tiempo de Entrega
Cantidad
Medido en
18 mes(es)
Plazo Constitución Póliza en dias Hábiles:
Fechas
Notificación: 26/12/2020
Firma del Contratista: 26/12/2020
Perfeccionamiento. 26/12/2020
Acta Iniciación: 17/03/2021
Fecha Inicio: 17/03/2021
Vencimiento plazo Inicial: 17/03/2021
Vencimiento plazo total: 31/12/2022
Fecha Final: 31/05/2023
Acta Liquidación:

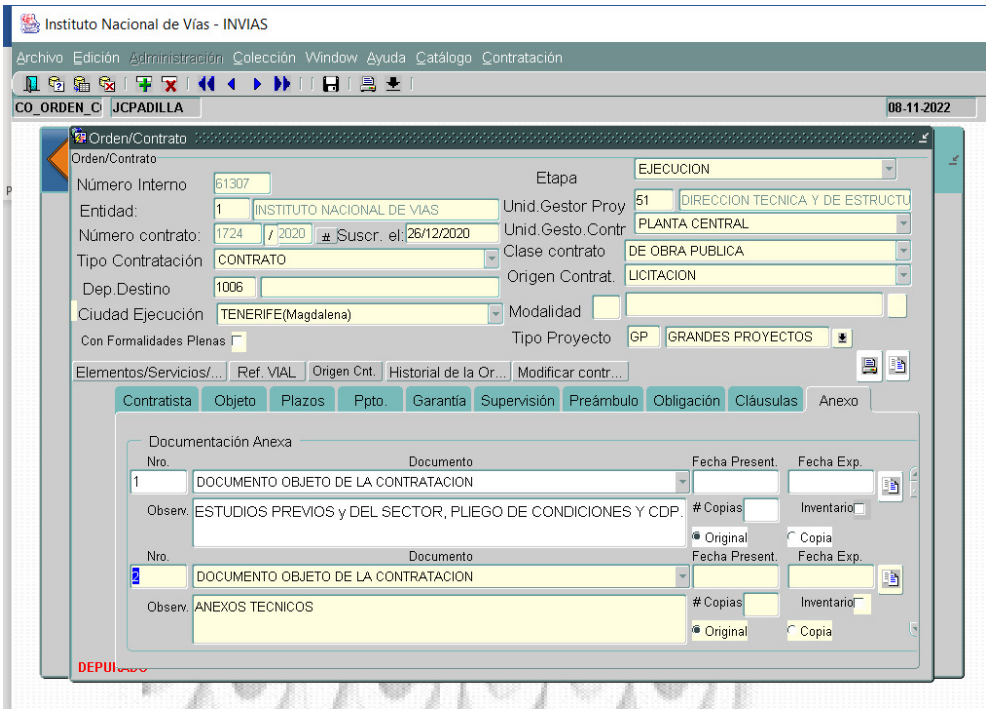


Imágenes actualizadas el día 16/05/2023 por Manuel Felipe Yalanda Jurado (Gestor Técnico del proyecto - GGP 4), quien manifestó que la inestabilidad del aplicativo SICO, no ha permitido la actualización total de la documentación propia del contrato; este **SI** se encuentra actualizado en el aplicativo respecto a minutas de Modificación, contratos Adicionales, Adiciones en valor ($) y/o Prórrogas.

SEPRO


Contrato número 1724 de 2020.

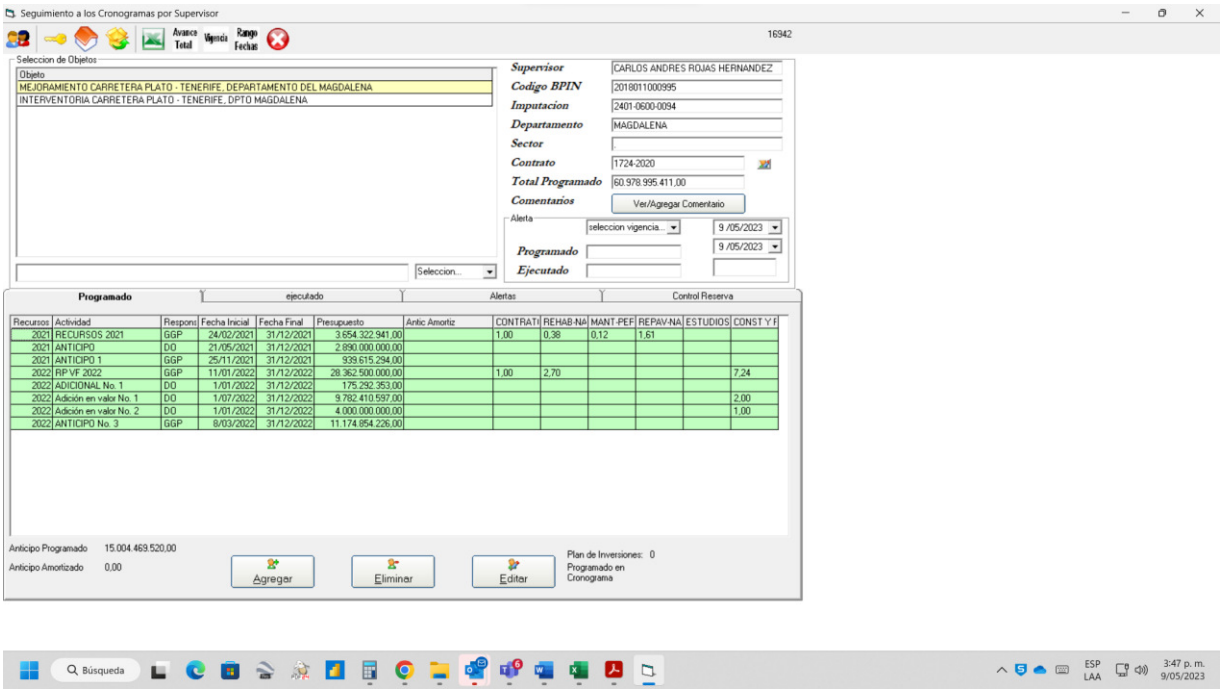


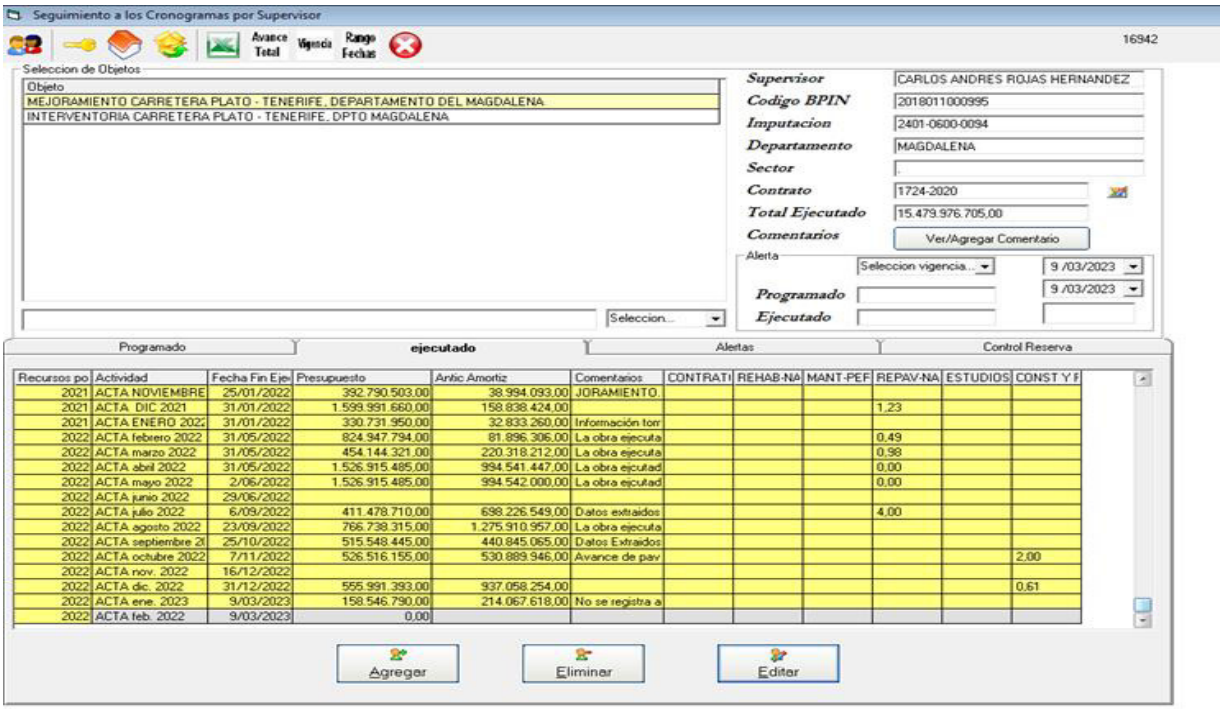

CIFRA

Contrato número 1724 de 2020.

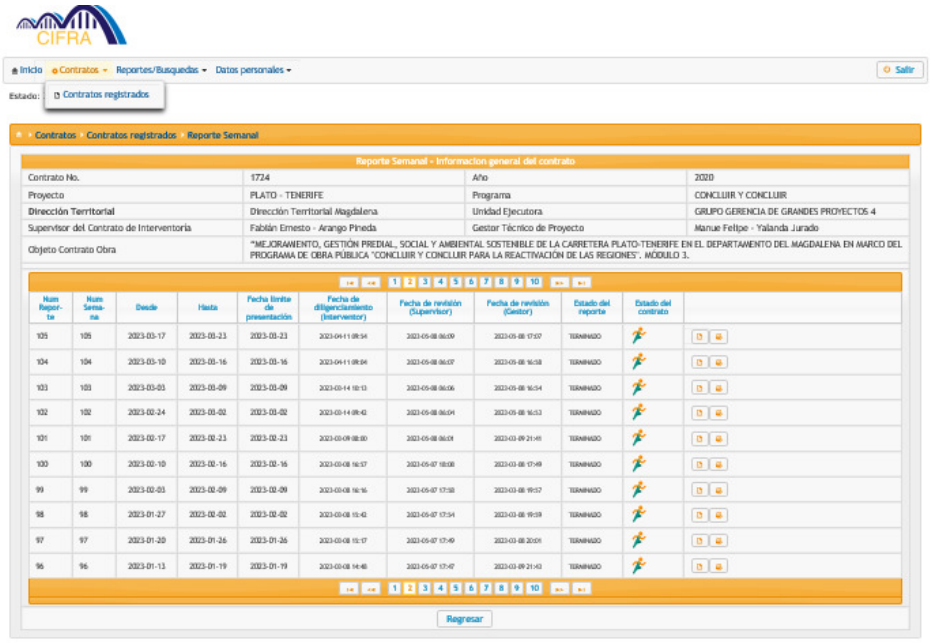

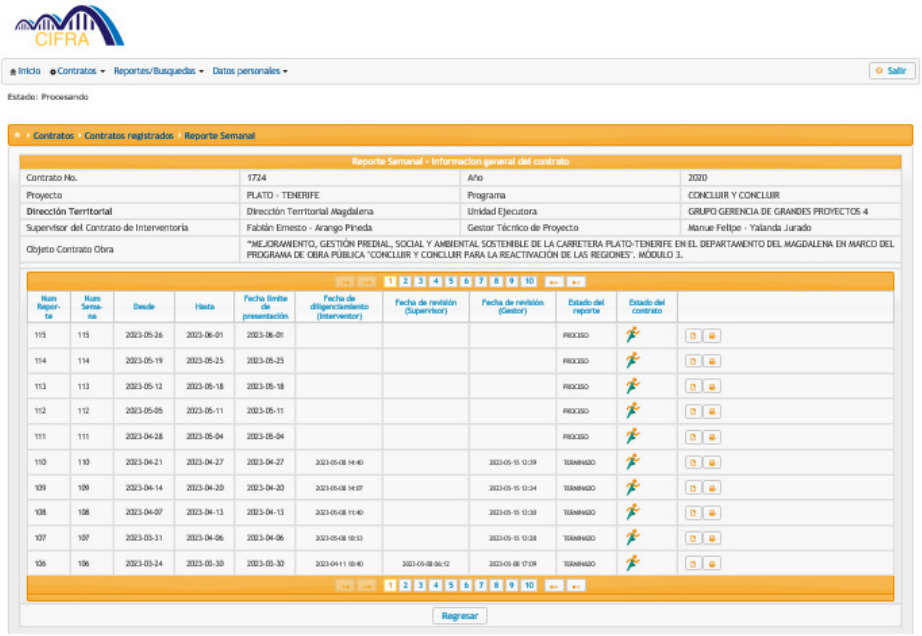

Imágenes capturadas del aplicativo CIFRA, donde se evidencia que el CONSORCIO ICEACSA PLANES (Interventor) ha cargado informes semanales hasta la semana 110, periodo abril 2023.
