CONTRATO / CONVENIO No. Convenio Interadministrativo 0818-2022	**Fecha de suscripción:** 21 de Octubre de 2022

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.

SUPERVISOR: DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ, SUBDIRECTOR(A) DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD

CERTIFICA

Que **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA - INVEST IN BOGOTÁ**, identificado con **NIT 900,106,691-0**, cumplió el objeto contractual y obligaciones durante el periodo comprendido entre el **21 de Diciembre de 2022** y el **16 de Junio de 2023**

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO Y ACUMULADA

Valor ejecutado este periodo: $ 40,000,000.00 Valor ejecutado acumulado (incluyendo este periodo): $ 760,000,000.00

Porcentaje acumulados de ejecución (Incluyen este periodo): Ejecución Física 69.00 % Ejecución Financiera 95.00 %

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adjuntar el correspondiente certificado de aportes a parafiscales, seguridad social y demás de Ley.

FINANCIACIÓN DEL PAGO

Vigencia	Rubro	Valor
2022	O23011601240000007837 Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la	5,000,000.00
2022	O23011601240000007847 Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecos	26,500,000.00
2022	O23011601180000007874 Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipym	8,500,000.00

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Que teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la cláusula FORMA DE PAGO ó DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES según corresponda, del Contrato o Convenio de la referencia, el suscrito supervisor AUTORIZA el pago No. CUATRO (4), correspondiente a la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($40,000,000.00) .**

Por indicación del Contratista o Asociado, el valor neto del pago será consignado en la Cuenta Bancaria de **Ahorros** No. **007045100** de **Banco Itaú**.

Se expide esta certificación para el correspondiente trámite de pago, en Bogotá D.C., el **21 de Junio de 2023**

DIEGO PARDO C.

DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ
SUBDIRECTOR(A) DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD

Los siguientes documentos deben ser entregados a la Dirección de Gestión Corporativa

Esta certificación, soportes y anexos, aceptados por el supervisor: Dos (2) ejemplares de cada documento.
Informes de ejecución aceptados por el supervisor: Un (1) ejemplar para el expediente contractual.

El recibo de la documentación adjunta no implica la verificación ni la aceptación de su contenido por parte de la Entidad.

CORDIS AQUÍ. AHORRE PAPEL: NO USE MEMORANDO REMISORIO

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19c - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono +57 (601) 618 8000
Fax +57 (601) 618 8100
+57 (601) 623 3823

www.home.kpmg/co

AUDFINBOG- CER2023-15910

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN

NIT 900.106.691-0

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales número: 67361826, 67360393; la Corporación efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

1. Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de abril de 2023.
2. Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2023.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de mayo de 2023, por solicitud y con destino a la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región, para efectos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

* * * * *

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Esta certificación es válida en formato original y electrónico.

LEIDY XIOMARA MOJICA GALVIS
Digitally signed by LEIDY XIOMARA MOJICA GALVIS
Date: 2023.05.15 10:10:18 -05'00'

Leidy Xiomara Mojica Galvis
Revisor Fiscal de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica.
T.P. 272149-T
Miembro de KPMG S.A.S.
JM/MB

© 2023 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada, perteneciente a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, ("KPMG International"), una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Identificación	900106691	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	7423030
Razón Social	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD	Dirección	CRA 7 N 71-21 TORRE B OF 901	Fecha Pago	31/05/2022
Clase de Aportante	B - Aportante con menos de 200 cotizantes	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Junio-01
Banco	BANCO ITAU	No. Planilla	59209734	Periodo Pensión	Mayo-01
Total a Pagar	$88,251,900	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	5	$35,491,097	$5,678,700	$0	$0	$131,500	$334,500	$0		$6,144,700
230301	Porvenir	800224808	7	$39,588,774	$6,334,500	$0	$0	$147,100	$147,100	$0		$6,628,700
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	7	$42,737,465	$6,838,500	$0	$0	$182,700	$182,700	$0		$7,203,900
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739	8	$51,165,354	$8,186,900	$0	$0	$221,200	$221,200	$0		$8,629,300
230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	800253055	8	$48,546,537	$7,767,700	$0	$0	$192,800	$192,800	$0		$8,153,300
Totales				$217,529,227	$34,806,300	$0	$0	$875,300	$1,078,300	$0		$36,759,900

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS002	Salud Total EPS	800130907	1	$1,752,471	$219,100	$0	$0		$0		$0		219100	$219,100
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831	3	$25,598,192	$3,199,900	$0	$0		$0		$0		3199900	$3,199,900
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	4	$31,337,189	$3,917,200	$0	$0		$0		$0		3917200	$3,917,200
EPS010	EPS Sura	800088702	6	$36,126,318	$4,516,200	$0	$0		$0		$0		4516200	$4,516,200
EPS005	Sanitas EPS	800251440	11	$79,724,595	$9,773,100	$0	$0		$0		$0		9773100	$9,773,100

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

EPS008	Compensar EPS	860066942	11	$60,800,596	$7,600,600	$0	$0		$0		$0		7600600	$7,600,600
Totales				$235,339,361	$29,226,100	$0	$0		$0		$0		$29,226,100	$29,226,100

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	36	$235,339,361	$1,117,400	$0				1117400	$1,117,400

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	36	$240,967,736	$9,398,600	$0	9398600	$9,398,600
Totales				$240,967,736	$9,398,600	$0	$9,398,600	$9,398,600

SENA ICBF

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899999239	36	$234,926,978	$7,049,600	$0	7049600	$7,049,600
PASENA	SENA	899999034	36	$234,926,978	$4,700,300	$0	4700300	$4,700,300
Totales				$469,853,956	$11,749,900	$0	$11,749,900	$11,749,900

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Invest in Bogot

Cuenta de Cobro No. 202302

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nit.899.999.061-9

Debe A

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA
Nit: 900.106.691-0

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($40.000.000)

Por concepto de cuarto desembolso del Convenio No. 818 de 2022 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y Financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá región, a través de una herramienta digital que permita el Diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de Fortalecimiento y financiación a emprendedores y mi-pymes de la ciudad".

Por favor realizar la transferencia de fondos o consignación al Banco ITAU, Cuenta de Ahorros No. 007-04510-0

5 de junio de 2023

MARIA ISABELA MUÑOZ MENDEZ
Directora Ejecutiva

ACTA DE REUNIÓN CONVENIO 818

DATOS BÁSICOS DEL CONVENIO				
Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE)	**Fecha de suscripción del convenio**	**Día**	**Mes**	**Año**
		21	10	2022
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.			

Con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución del convenio se realiza reunión con las partes. A continuación, se describe el desarrollo de esta:

DETALLES DE LA REUNIÓN DE CIERRE					
Fecha	03/03/2023	**Hora inicio**	**Hora fin**	**Lugar**	Virtual vía Teams Link grabación
		11:50 am	1:07 pm		

Asistentes		
Nombres y apellidos	**Entidad**	**Cargo**
Danna Agudelo S.	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional
Diana Guevara	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Diego Pardo	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Margarita Rubio	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Andrea Figueroa	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista
Iván Pérez	Invest In Bogotá (IIB)	Oficial de Inversiones
Darío Rodríguez	Invest In Bogotá (IIB)	Jefe de Investigaciones e inteligencia de mercados
Camila Barragán	Invest In Bogotá (IIB)	Analista de Investigación
Milena Hernández	Invest In Bogotá (IIB)	Directora de tecnología
José Manuel	Invest In Bogotá (IIB)	Director de Comunicaciones

Temas tratados	
1.	Organización Pre -lanzamiento- Evento Start.co
2.	Evento lanzamiento
3.	Otro sí del convenio
4.	Entregables y papelería del convenio

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS	
1.	**1. Revisión temas para la participación de IIB y la SDDE en el marco de Start.co** Teniendo en cuenta que se desarrollaran espacios estratégicos asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital, el primero de ellos en el marco del evento de Start.co, la reunión inicia con la revisión de los puntos de participación en dicho evento. IIB y la SDDE, hablaron de manera conjunta con el líder organizador de Start.co para que se tuviera en cuenta que las dos entidades compartirán un stand. El cual contará con los elementos tecnológicos y de mobiliario necesarios para la atención del público. Especialmente, se contará con tabletas para facilitar la exposición de la ruta e incentivar el registro de emprendedores y empresarios a la convocatoria. Frente a los requerimientos, es necesario definir los contenidos que estarán rotando por las dos pantallas que estarán ubicadas en la parte de atrás del stand. Así como, quienes serán las personas que estarán atendiendo el Stand y la labor que realizarán. Respecto al presupuesto, el stand será cubierto con los recursos del convenido destinados para el lanzamiento. Es decir, de los $140 millones se destinarán entre $12 y $13 millones para cubrir lo que tiene que ver con el espacio, alquiler del mobiliario, las pantallas, y las tabletas. Para Start.co se requiere que la plataforma disponga del formulario de registro, en pleno funcionamiento.
2.	**2. Evento de lanzamiento** La fecha prevista para el lanzamiento es a mediados de abril. El lugar sugerido es Atrio Piso 25.

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS	
	Es un evento tipo coctel, por ello la invitación será alrededor de 100 miembros claves del ecosistema (entre universidades, entidades públicas de emprendimiento, gremios y asociaciones, Atenea, Agatha y algunos empresarios) La idea es que sea un evento pequeño, con invitados estratégicos que sean aliados para la difusión de la ruta y la consecución de las empresas que se tienen en la meta (725 empresas). La SDDE recuerda el paso a paso de la ruta: **Paso 1.** Preinscripción en el formulario que ya está listo. **Paso 2.** Tan pronto el postulante se inscribe, la plataforma debe enviarle un correo con las credenciales de usuario. **Paso 3.** Los empresarios, deben adjuntar unos documentos para poder acreditar su información (la SDDE están definiendo cuáles son o sí sólo con el registro mercantil), **Paso 4.** Esta documentación es revisada por la SDDE y con base en ello, define quienes cumplen y continúan en la ruta. **Paso 5.** Las empresas pasan a fortalecimiento, posteriormente a los váuchers y luego a conexiones con mercados. La SDDE, con la U del Rosario y el Cesa, están revisando las preguntas de clasificación. Para este aspecto, se puede ir dejando una estructura grafica del formulario dentro de la plataforma. En la sección de “Ecosistema” dentro de la plataforma, se comentó que colgaría información sobre el Distrito de Ciencia y tecnología, Es importante, que la SDDE envíe esta información a IIB. Dentro de lo que se está revisando para el desarrollo del lanzamiento, es contar con un panel de emprendedores colombianos, un speaker de Ecopetrol y un speaker muy llamativo para el cierre. A parte de las palabras de las cabezas de las entidades, así como la exposición de la ruta.
3	**3. Otrosí del convenio.** Teniendo en cuenta que se requiere desarrollar actividades adicionales de posicionamiento y divulgación de la ruta de alto impacto, y considerando que el convenio finaliza en la semana del 24 de abril se concluye la necesidad de realizar un otrosí que amplie el periodo de ejecución del mismo. Para lo anterior se señala la importancia de verificar en detalle las implicaciones de ese cambio en la minuta del convenio. Adicionalmente, se requiere verificar con detalle los recursos económicos disponibles y establecer los entregables que saldrán tanto del evento de lanzamiento, como de las nuevas actividades que se

	desarrollarán en el periodo adicional del Otro sí.

<table>
<tr><th colspan="2">DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS</th></tr>
<tr><td></td><td>La elaboración de este documento de justificación de la necesidad se trabajará de manera conjunta entre IIB y la SDDE.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4. Entregables y papelería del convenio.

La SDDE está en un proceso de auditorías, es importante que todo lo referente a entregables, actas y grabaciones de las reuniones de seguimiento estén listas.

Se trabajará de manera conjunta, para que los entregables de este periodo esten listos para que se entreguen a la SDDE, de manera tal, que inicie el periodo del Otro sí con todo al día.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3.</td><td colspan="3">Siguientes pasos y compromisos</td></tr>
<tr><td>Tema</td><td>Responsable</td><td>Fecha</td></tr>
<tr><td>Definir contenido de las pantallas y las personas que estarían en el stand.

(Videos de Barcelona, Smart city podría ser una opción, renders y Gif de la ruta de alto impacto.
En el otro mostrar temas de innovación del distrito de C&T)

Hablador con el QR para empresarios se puedan registrar en la ruta del alto impacto.</td><td>Secretaria de Desarrollo Económico

Invest in Bogotá</td><td>Semana del 6 de marzo</td></tr>
<tr><td>Se requieren los textos que alimentarán la postulación de los empresarios en la ruta.</td><td>Secretaria de Desarrollo Económico</td><td>03 de marzo</td></tr>
<tr><td>Definición de la justificación para la firma del Otro sí.</td><td>Invest in Bogota y la secretaria de Desarrollo</td><td>Tercera semana de marzo</td></tr>
</table>

SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONVENIO 818-2022.

- Tabla 1:

Fases	Presupuesto
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000
Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000
Fase 3. Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000
Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0

- Tabla 2:

Fases	Presupuesto inicial	Presupuesto Ajustado
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000	$ 169.387.626,00
Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000	$ 490.612.374,00
Fase 3. Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000	$140.000.000
Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0	$ 0

- Tabla 3:

Categoría de la contrapartida IIB	Valor	Valor ajustado
Personal de IIB	$132.565.925	$241.899.419
Otros gastos administrativos (Oficina, TI, papelería, etc)	$6.484.075	$6.484.075
Total	$139.050.000	$248.383.494

CRONOGRAMA AJUS
CONVENIO INTERADMINISTRA
ENTRE SDDE-IIB


PARA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIE



Invest in Bogotá!

TADO
TIVO 818 2022
3

NTO EN BOGOTÁ REGIÓN

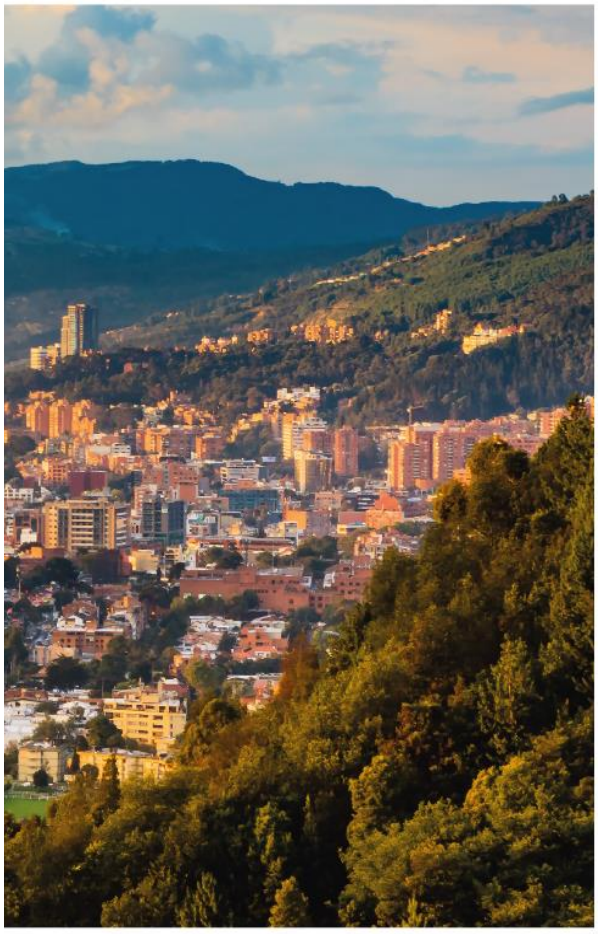

Bogotá

Abril - 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

BOGOTÁ

PLAN DE TRABAJO CONVENIO SDDE - IIB

Convenio interadministrativo entre la SDDE e IIB para fortalecer el posicionamiento del ecosistema de innovación y emprendimiento en Bogotá-Región

De acuerdo con los objetivos y las metas establecidas en el convenio interadministrativo entre la SDDE e IIB para fortalecer el posicionamiento del ecosistema de innovación y emprendimiento en Bogotá-Región , este primer informe describe las actividades, entregables y metas que se desarrollarán para alcanzar el objeto "Aunar esfuerzos para fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través del mejoramiento de una herramienta digital que se convertirá en la herramienta de diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y Mypimes de la ciudad"

El presente convenio busca que, a través del fortalecimiento de una herramienta digital que articule y organice la oferta de servicios, la ruta de financiación, la Ruta de Alto Impacto de Bogotá, se promueva la conexión de los emprendimientos locales dinámicos con inversionistas locales y extranjeros, y creación de networking y comunidad para que de esta forma se articule el ecosistema de emprendimiento dinámico e innovación. Lo anterior se logrará con el cumplimiento de los siguientes obejtivos específicos.

1. Fortalecimiento de una herramienta digital que articule, organice y facilite la información que ofrece el ecosistema de emprendimiento dinámico de la ciudad.
2. Ofrecer a los emprendedores de la ciudad información consolidada del portafolio de servicios de valor agregado de los diferentes actores del ecosistema (Ruta de Servicios), así como las fuentes de financiación disponibles para escalar su crecimiento (Ruta de Financiación).
3. Crear un registro que permita la inscripción y caracterización de los beneficiarios de los programas dirigidos a los emprendimientos de alto impacto de la Secretaria de Desarrollo Económico.
4. Ofrecer a los inversionistas extranjeros una herramienta de búsqueda eficiente de las oportunidades de inversión en emprendimiento en la ciudad.


Lo anterior, se logrará mediante el desarrollo del convenio que incluirá las siguientes fases:

1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región.
2. Mejoramiento de la Herramienta Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.
3. Espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad
4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.

PLAN DE TRABAJO CONVENIO SDDE - IIB

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Objetivo General	Fases	Actividades asociadas	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Aunar esfuerzos para fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través del mejoramiento de una herramienta digital que se convertirá en la herramienta de diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y Mypimes de la ciudad	**FASE 1.** Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región.	• Realizar un mapeo de oferta de servicios y productos, financieros y no financieros, para los emprendimientos con potencial a ser de alto impacto y caracterización.	noviembre de 2022	diciembre de 2022
		• Crear un plan de trabajo con actores claves del ecosistema para obtener y validar información sobre: perfiles de los emprendedores, servicios disponibles y mecanismos de financiación.	noviembre de 2022	noviembre de 2022
		• Elaborar y gestionar memorandos de entendimiento con actores claves del ecosistema.	noviembre de 2022	mayo de 2023
		• Convocar mesas de trabajo con los actores del ecosistema para validar, recoger información y consolidar la oferta de servicios que deba tener la herramienta digital.	noviembre de 2022	enero de 2023
		• Desarrollar una mesa de trabajo enfocada en procesos de innovación abierta con el propósito de solucionar retos de ciudad para el ecosistema de emprendimiento, en alianza con Universidades públicas y privadas de Bogotá.	noviembre de 2022	diciembre de 2022
		• Generar contenidos para el desarrollo de un producto audiovisual dirigido a la capacitación de emprendimientos.	noviembre de 2022	noviembre de 2022
		• Generar contenidos generados con el propósito de ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma.	abril de 2023	septiembre de 2023
	FASE 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	• Estructurar la hoja de ruta del mejoramiento de la Herramienta digital	noviembre de 2022	noviembre de 2022
		• Transformación de la herramienta digital dispuesta para el ecosistema de emprendimiento dinámico con la adición de nuevas secciones que incluyan las rutas de servicios y financiamiento, incorporando los programas, proyectos e iniciativas que se ofrecen los actores públicos y privados a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	noviembre de 2022	marzo de 2023
		• Facilitar el acceso a la Ruta E de la subdirección de emprendimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.	noviembre de 2022	diciembre de 2022
		• Implementar un método de diagnóstico a los emprendedores para identificar sus intereses y necesidades concretas en temas de formación y financiamiento dispuesta en la herramienta digital. Avances en la ejecución del convenio en un tablero de control.	noviembre de 2022	diciembre de 2022
		• Desarrollar la funcionalidad en la herramienta que permita el acceso y registro a los programas, proyectos e iniciativas de la ruta de alto impacto para los emprendimientos dinámicos y de alto impacto de la ciudad.	noviembre de 2022	abril de 2023
		• Realizar sesiones prueba de la herramienta digital con IIB y la SDDE (y también con potenciales usuarios).	noviembre de 2022	abril de 2023
		• Garantizar la disponibilidad de información y datos de uso y caracterización de los usuarios en el marco de la Ruta de Alto Impacto.	noviembre de 2022	marzo de 2023
		• Integrar una herramienta que permita conectar a los emprendimientos y empresarios con potenciales inversionistas nacionales e internacionales.	noviembre de 2022	marzo de 2023
	FASE 3. Espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	• Espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad	noviembre de 2022	agosto de 2023
	FASE 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	• Crear una herramienta alineada al plan de trabajo, en donde se registre periódicamente y visualice el avance del proyecto de acuerdo con las fases planteadas en la presente propuesta.	noviembre de 2022	marzo de 2023
		• Realizar reuniones periódicas de seguimiento al plan de trabajo y revisar el avance y desarrollo de las actividades allí registradas.	noviembre de 2022	marzo de 2023

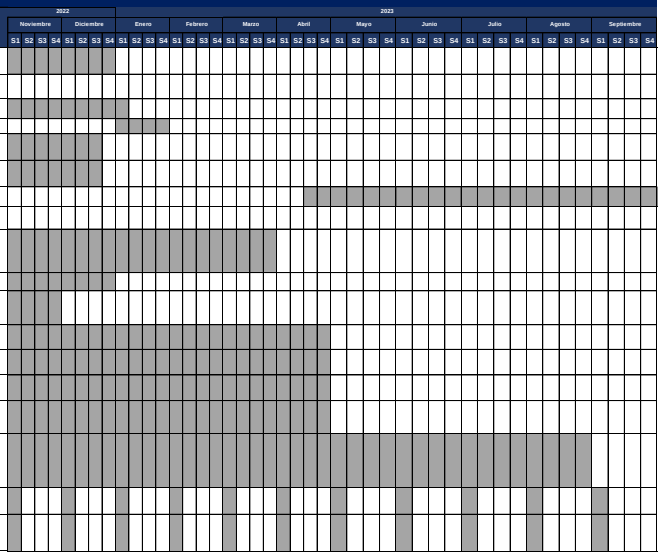

Bogotá D.C., 18 de abril 2023 IIB23-0877

Señor
Diego Fernando Pardo López
Subdirector de Innovación y Productividad
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Ciudad

Asunto: Solicitud otrosí No.1 Convenio 818 / 2022

Reciba un cordial saludo,

A continuación, presentamos la solicitud de Otrosí No.1 con base en lo establecido en las mesas de trabajo realizadas, hasta la fecha, entre los equipos de las entidades involucradas, para dar cumplimiento de la mejor manera a las obligaciones establecidas en el Convenio 818 / 2022.

1. **Objeto del convenio:**

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.

Duración inicial del Convenio: 6 meses.
Fecha inicio (firma acta de inicio): 21 de octubre de 2022.
Fecha de finalización inicial Convenio: 20 de abril de 2023.
Solicitud Duración de ampliación Otrosí No.1: 5 meses y 8 días
Solicitud Fecha fin Otrosí No.1 Convenio: 30 de septiembre de 2023.

Valor del convenio: $939.050.000
Aporte Invest in Bogota: $139.050.000 en especie
Aporte en dinero SDDE: Dirección de Competitividad Bogotá Región $530.000.000 y Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo $270.000.000, es decir: $800.000.000

Desembolsos realizados:

- Primer Desembolso: $240.000.000 recibido **el 25 de noviembre de 2022.**
- Segundo Desembolso: $240.000.000 recibido **el 09 de diciembre de 2022.**
- Tercer Desembolso: $240.000.000 recibido el **13 de enero de 2023**.

Lo anterior equivale al 90% de los recursos aportados por la SDDE en el convenio.

2. Antecedentes de la solicitud:

a) El convenio inició su ejecución a partir de la firma del acta de inicio el 21 de octubre de 2022. Comenzando así la implementación de actividades y el trabajo de los primeros entregables.
b) A la fecha se han entregado los siguientes productos:
   - "Presentación del plan operativo y cronograma de ejecución.
   - Documento con la hoja de ruta para el levantamiento de información y generación de alianzas con actores claves del ecosistema de emprendimiento dinámico y de alto impacto local.
   - Documento con metodología y agenda propuesta para el desarrollo del evento de lanzamiento de la Herramienta digital y la Ruta de Alto Impacto.
   - Documento con la identificación de vehículos de inversión tanto locales como internacionales habilitados para los emprendimientos de la ciudad, lo cual permitirá a los emprendimientos identificar las posibles alternativas de financiación para escalar sus modelos de negocio.
   - Documento con el detalle de la ejecución del convenio en un tablero de control.
   - Documento con estructura de la herramienta digital y sus funcionalidades, que dé cuenta de la caracterización de la actualización de la misma. El informe incluirá una propuesta para el desarrollo de sesiones de prueba, así como el plan de integración de la herramienta que permita conectar emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa.
   - Documento que contenga el desarrollo de la herramienta digital, donde se evidencie la inclusión de un enlace activo a la página de Ruta E o la plataforma que disponga la Secretaría de Desarrollo Económico y el acceso a una herramienta de diagnóstico de los emprendedores en la herramienta digital.
   - Documento que evidencie el acceso a los programas, proyectos e iniciativas que se ofrecen en la Ruta de Alto Impacto; este documento deberá contar con datos de uso y caracterización de los usuarios en el marco de la Ruta de Alto Impacto.
   - Documento que contenga un reporte de la ejecución de los espacios de trabajo que incluya listado de asistentes, memorias y registro fotográfico o video en el marco del mapeo de la oferta.
   - Documento que contenga resultados del diagnóstico realizado en al menos 300 unidades productivas de la ciudad de Bogotá.
   - Documento que compile la evidencia de los contenidos generados y su visualización por parte de mínimo 300 unidades productivas diagnosticadas; contenidos que servirán para la formación virtual de unidades productivas".

c) A la fecha está en curso, la realización y entrega de los siguientes productos:
   - "Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento. Se entregarán los siguientes documentos de la herramienta: manual de usuario final,

manual de administrador, matriz de pruebas y manual de fuentes.

- Documento que contenga desarrollos asociados a la integración de la herramienta que conecte emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa, a partir del conocimiento de Invest in Bogota de herramientas similares disponibles en otros mercados.
- Informe con los resultados del evento de lanzamiento de la Hoja de Ruta de Alto Impacto y de la herramienta digital que incluya listado de asistentes, memorias y registro fotográfico o video.
- Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región".

d) Como resultado del seguimiento al plan operativo, al cronograma y a los objetivos de la ruta se identificó la pertinencia de postergar la fecha para convocar y organizar el evento de lanzamiento oficial de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto, y hacer el desarrollo del mismo por momentos y espacios estratégicos, abriendo la oportunidad de impactar, convocar, atraer, motivar y sensibilizar a más empresas. Toda vez que las actividades se han concentrado en la estructuración, desarrollo y puesta en marcha de la herramienta y aún no cuenta con un número conveniente de empresas registradas. Lo anterior con el propósito de robustecer y contar con una base más amplia de empresas del ecosistema que se puedan interesar en la plataforma, encontrando allí la oportunidad de movilizar y generar una comunidad más dinámica y con más interacciones.

e) Así mismo, en el proceso de ejecución de la fase 1 "Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información)" se generaron eficiencias en el desarrollo de "Convocar mesas de trabajo con los actores del ecosistema para validar, recoger información y consolidar la oferta de servicios que deba tener la herramienta digital", asociadas al alquiler de los espacios para las reuniones con los actores del ecosistema; con lo cual, se generaron ahorros en el desarrollo de la mesa de trabajo enfocada en "Procesos de innovación abierta con el propósito de solucionar retos de ciudad para el ecosistema de emprendimiento, en alianza con Universidades públicas y privadas de Bogotá", en donde el proveedor que fue seleccionado para el desarrollo de esta mesa presentó una propuesta menor al valor estipulado en el proceso de contratación.

f) Adicionalmente para el desarrollo de los productos: 6. Documento que contenga un reporte de la ejecución de los espacios de trabajo que incluya listado de asistentes, memorias y registro fotográfico o video en el marco del mapeo de la oferta; y el producto 11. Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región se contrataron dos consultores por un menor valor al estipulado, generando eficiencias en la ejecución presupuestal de la primera fase del convenio.

3. Justificación:

En línea con el cumplimiento de los objetivos de promover el emprendimiento, fortalecer las

capacidades empresariales de las MiPymes, generar condiciones para que el tejido empresarial pueda superar las barreras a la innovación y dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad, se estipuló un tiempo inicial de ejecución de 6 meses, de acuerdo con las siguientes fases y presupuesto:

Fases	Presupuesto
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000
Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000
Fase 3. Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000
Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0

En este sentido, a la fecha, se han venido ejecutando las actividades de las fases 1, 2 y 4. Sin embargo, frente al desarrollo del evento de lanzamiento de la herramienta digital y la ruta de alto impacto de la fase 3 y con base en lo ya desarrollado en las fases previas, se identificó la pertinencia de modificar la fecha del evento de lanzamiento y hacer el desarrollo de este por momentos y espacios estratégicos y acompañar la interacción y dinamización de los empresarios en la plataforma durante 5 meses, a través de:

1. Realización de espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto, que involucre i) participación en escenarios de impacto, ii) desarrollo de espacios digitales de conexión y divulgación con actores clave del ecosistema, con los que se pueda visibilizar la herramienta y difundir sus propiedades. Adicionalmente, iii) llevar a cabo, un encuentro que permita el reconocimiento y estímulo a las mejores empresas innovadoras de Bogotá, que hayan sido beneficiarias en el marco de la ruta de alto impacto en el pilar de fortalecimiento.

2. En línea con lo anterior, se requiere ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma, generando contenidos actualizados y herramientas dinámicas, que mantengan el interés y el compromiso de los empresarios.

Teniendo presentes los puntos enunciados, se requiere:

1. Ampliar en cinco (5) meses y ocho (8) días calendario el tiempo de ejecución del Convenio hasta el 30 de septiembre de 2023, para completar la ejecución de la Fase 3, toda vez que el tiempo descrito en los estudios previos para implementar la Fase 3 no será suficiente para lograr este último propósito y obtener los resultados esperados. En este sentido, es relevante tener en cuenta los tiempos en que las empresas objetivo, realizan su entrada a la herramienta y a la ruta de alto Impacto y, de esta manera, garantizar el registro, interacción, conexión y creación de un ambiente de articulación entre ellas, para la creación de comunidad, aprovechando las funcionalidades que brinda la herramienta: (i). Diagnóstico (ii). Facilitación de información y promoción (que articula y organiza la oferta de servicios para emprendedores y empresarios, mediante un repositorio de información con dicha oferta) (iii). Visibilización de la ruta de alto impacto (con la oferta de servicios de fortalecimiento, financiación y conexión a mercados de la SDDE para emprendedores dinámicos y MiPymes) y (iv). Emparejamiento (para los inversionistas locales y extranjeros sobre la oferta de posibilidades de inversión en emprendimiento, de manera que se gesten conexiones que permitan escalar la nueva generación de empresas del ecosistema de emprendimiento dinámico y de alto impacto de Bogotá Región).

2. Ajustar el presupuesto propuesto para la ejecución del convenio, así:

Fases	Presupuesto inicial	Presupuesto Ajustado
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000	$ 169.387.626
Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000	$ 490.612.374
Fase 3. Evento de lanzamiento de la herramienta digital y de la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000	$140.000.000

Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0	$ 0

3. Hacer un ajuste en la contrapartida de Invest in Bogota así:

Categoría de la contrapartida IIB	Valor	Valor ajustado
Personal de IIB	$132.565.925	$241.899.419
Otros gastos administrativos (Oficina, TI, papelería, etc)	$6.484.075	$6.484.075
Total	$139.050.000	$248.383.494

Los indicadores actualizados a abril de 2023 son:

Técnicos

- Plan de trabajo que evidencie cronograma y perfil de desarrolladores: 1 documento
- Documento estructurado con funcionalidades de la herramienta digital: 1 documento
- Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento: 0 página web
- Protocolo de gobernanza de datos, roles y permisos, usuarios de la herramienta digital: 0 documento.
- 300 empresas diagnosticadas: 300

Financieros

- Porcentaje de recursos entregados por la SDDE con corte a abril 18 de 2023: 90% de los aportes de la SDDE.
- Porcentaje de recursos ejecutados en el marco del convenio: Con corte a 31 de marzo de 2023 se han ejecutado el 78% de los recursos aportados a la fecha por la SDDE por valor de $561.955.866.

Administrativos

- Número de informes de ejecución y seguimiento elaborados y presentados: 3 informes técnicos.
- Número de informes financieros elaborados y presentados: 5 informes

4. **Solicitud:**

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario prorrogar el tiempo del Proyecto, con el fin de cumplir

con lo estipulado en los documentos que hacen parte esencial del Convenio 818/2022. Se procede a solicitar la gestión del Otrosí No. 1 al Convenio 818/2022 para la modificación de las siguientes cláusulas:

a. Modificación a la cláusula Octava PLAZO

La cláusula Octava establece: El plazo de ejecución del convenio que se suscriba será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Ampliar el plazo de ejecución en 5 meses y 8 días calendario:

Características	Inicial	Otrosí No. 1
Duración	6 meses	5 meses y 8 días
Fecha inicio	21 de octubre de 2022	22 de abril de 2023
Fecha de finalización	20 de abril de 2023	30 de septiembre de 2023

b. Modificación de cláusula tercera OBLIGACIONES DE INVEST IN BOGOTA Y DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Con base en la necesidad de posicionar la plataforma como espacio de encuentro y dinamizador del ecosistema de innovación y emprendimiento del tejido empresarial, y propiciar e impulsar el registro de emprendedores de la ciudad se requieren realizar varios eventos asociados a la divulgación y lanzamiento de la herramienta digital y la ruta de alto impacto, se requiere modificar la obligación 19 de Invest in Bogota, que hace parte de la cláusula tercera, de la siguiente manera: Realizar espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto realizados a la fecha.

Así mismo, en el apartado PRODUCTOS se requiere ampliar el alcance del producto 7, de la siguiente manera: 7. Informe con los resultados de los espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto realizados a la fecha.

Se requiere adicionar, el producto 16 que consistiría en: 16. un reporte de los contenidos generados con el propósito de ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma.

c. Modificación de cláusula quinta VALOR DEL CONVENIO:

Debido a la ampliación de la ejecución del convenio se requiere modificar el valor del convenio, aumentando el total de los aportes en especie por parte de Invest in Bogota así: $248.383.494 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS).

VALOR DEL CONVENIO: MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.048.383.494) M/CTE. Este valor incluye el IVA, impuestos nacionales y distritales y demás gastos directos e indirectos en los que deba incurrir Invest in Bogota en la ejecución del objeto del convenio.

APORTES DE LA SDDE: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE.

APORTES DE INVEST IN BOGOTA: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($248.383.4940), en especie.

d. Modificación de la cláusula séptima FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

Modificar el cuarto desembolso e incluir un quinto desembolso de la siguiente manera:

Un cuarto desembolso por el 5% del total del aporte por parte de la SDDE, correspondientes a CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) posterior a la presentación y aprobación de los productos 5, 8, 9 y 11. (5. Documento que contenga desarrollos asociados a la integración de la herramienta que conecte emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa, a partir del conocimiento de Invest in Bogota de herramientas similares disponibles en otros mercados. 8. Documento que contenga el detalle de la ejecución del convenio en un tablero de control. 9. Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento. Se entregarán los siguientes documentos de la herramienta: manual de usuario final, manual de administrador, matriz de pruebas y manual de fuentes. 11. Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región).

Un quinto desembolso por el 5% del total del aporte por parte de la SDDE, correspondientes a CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) posterior a la presentación y aprobación de los productos restantes, 7 y 16. (7. Informe con los resultados de los espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto realizados a la fecha. 16. un reporte de los contenidos generados con el propósito de ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma).

e. Ajustar el presupuesto propuesto para la ejecución del convenio contemplado en la propuesta técnica, así:

Fases	Presupuesto inicial	Presupuesto Ajustado
Fase 1. Articulación, diagnóstico y caracterización del ecosistema de emprendimiento dinámico de Bogotá Región (validación y levantamiento de información).	$210.000.000	$ 169.387.626

Fase 2. Mejoramiento de la herramienta digital Bogotá Escala que articule, organice y facilite la información del ecosistema de emprendimiento de alto impacto de Bogotá Región.	$450.000.000	$ 490.612.374
Fase 3. Espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto dirigida a los emprendimientos dinámicos de la ciudad.	$140.000.000	$140.000.000
Fase 4. Medición y seguimiento en la ejecución del convenio.	$ 0	$ 0

Cordial saludo,

Maria Isabela Muñoz
Directora Ejecutiva
Invest in Bogota

Revisó y aprobó:

Proyecto: Dario Rodriguez

Anexo:

1. Cronograma actualizado del convenio - solicitud del Otrosí No.1.
2. Soporte 1. Correo de solicitud otrosí No 1.

Fecha de la solicitud:	24 de Abril de 2023
Tipo de solicitud:	Prórroga
Fecha de recepción en la Oficina Asesora Jurídica:	
Nombre y dependencia del Director(a) que presenta la solicitud:	MARIANA DEL PILAR MUÑOZ RINCON DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
Items del plan de compras en que se encuentra prevista esta modificación:	
Tipo y número de Convenio por modificar:	Convenio Interadministrativo 818-2022
Objeto del Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.
Proyectos de inversión o rubros de funcionamiento:	
Nombre del Asociado:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA - INVEST IN BOGOTÁ
Justificación:	1. GENERALIDADES Que el 21 de octubre de 2022 se suscribió el convenio interadministrativo No. 818-2022 entre la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO y la CORPORACIÓN PARA EL DESARRROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGIÓN-REGIÓN DINÁMICA –INVEST IN BOGOTA , con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad”, con un plazo inicial de seis (6) meses, iniciando el 27 de octubre de 2022 y terminación el 26 de abril de 2023, por un valor total de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($939.050.00), aportados de la siguiente manera: • OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) aportados por la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO • CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($139.050.000) en especie, por parte de CORPORACIÓN PARA EL DESARRROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGIÓN-REGIÓN DINÁMICA –INVEST IN BOGOTA Que a la fecha la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ha realizado tres (3) desembolsos por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) cada uno, sumando un total de SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($720.000.000) 2. JUSTIFICACIÓN. En línea con el cumplimiento de los objetivos de promover el emprendimiento, fortalecer las capacidades empresariales de las MiPymes, generar condiciones para que el tejido empresarial pueda superar las barreras para la innovación y dinamizar el ecosistema de emprendimiento, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad, se estipuló un tiempo inicial de ejecución de 6 meses, de acuerdo con las siguientes fases y presupuesto: Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 1.

	En este sentido, a la fecha, se han venido ejecutando las actividades de las fases 1, 2 y 4. Sin embargo, frente al desarrollo del evento de lanzamiento de la herramienta digital y la ruta de alto impacto de la fase 3 y con base en lo desarrollado en las fases previas, se identificó la pertinencia de modificar la fecha del evento de lanzamiento y hacer el desarrollo de este por momentos en diferentes espacios y acompañar la interacción y dinamización de los empresarios en la plataforma durante 5 meses, a través de: 1. Realización de espacios y actividades estratégicas, asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto que involucren: i) Participación en escenarios de impacto; ii) Desarrollo de espacios digitales de conexión y divulgación con actores clave del ecosistema, con los que se pueda visibilizar la herramienta y difundir sus propiedades. Adicionalmente, iii) Llevar a cabo, un encuentro que permita el reconocimiento y estímulo a las mejores empresas innovadoras de Bogotá, que hayan sido beneficiarias en el marco de la ruta de alto impacto en el pilar de fortalecimiento. 2. En línea con lo anterior y articulado con la Fase 1 y la Fase 2 es necesario, para ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma, generar contenidos actualizados y herramientas dinámicas, que mantengan el interés y el compromiso de las empresas. Teniendo presentes los puntos enunciados, se requiere: 1. Ampliar el Convenio hasta el 30 de septiembre de 2023, para completar la ejecución de la Fase 3, toda vez que, el tiempo descrito en los estudios previos para implementar la Fase en mención no será suficiente para lograr este último propósito y obtener los resultados esperados. Al respecto, es relevante tener en cuenta los tiempos en que las empresas objetivo realizan su entrada a la herramienta y a la ruta de alto impacto y, de esta manera, garantizar el registro, interacción, conexión y creación de un ambiente de articulación entre ellas, para la creación de comunidad, aprovechando las funcionalidades que brinda la herramienta: (i) Diagnóstico; (ii) Facilitación de información y promoción (que articula y organiza la oferta de servicios para emprendedores y empresarios, mediante un repositorio de información con dicha oferta); (iii) Visibilización de la ruta de alto impacto (con la oferta de servicios de fortalecimiento, financiación y conexión a mercados de la SDDE para emprendedores dinámicos y MiPymes) y (iv) Emparejamiento (para los inversionistas locales y extranjeros sobre la oferta de posibilidades de inversión en emprendimiento, de manera que se gesten conexiones que permitan escalar la nueva generación de empresas del ecosistema de emprendimiento dinámico y de alto impacto de Bogotá Región. 2. Ajustar el presupuesto propuesto para la ejecución del convenio, así: Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 2. 3. Hacer un ajuste en la contrapartida de Invest in Bogota así: Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 3. Los indicadores actualizados a abril de 2023 son: Técnicos • Plan de trabajo que evidencie cronograma y perfil de desarrolladores: 1 documento • Documento estructurado con funcionalidades de la herramienta digital: 1 documento • Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento: 0 página web • Protocolo de gobernanza de datos, roles y permisos, usuarios de la herramienta digital: 0 documento.

Plaza de los Artesanos Centro de Negocios y Exposiciones - Carera 60 Nº 63 A- 52. Teléfonos 3693777 Ext 240 - 243
e-mail: secretaria@desarrolloeconomico.gov.co

	• 300 Empresas diagnosticadas: 300 Financieros • Porcentaje de recursos entregados por la SDDE con corte a abril 20 de 2023: 90% de los aportes de la SDDE. • Porcentaje de recursos ejecutados en el marco del convenio: Con corte a 31 de marzo de 2023 se han ejecutado el 78% de los recursos aportados a la fecha por la SDDE por valor de $561.955.866. Administrativos • Número de informes de ejecución y seguimiento elaborados y presentados: 3 informes técnicos. • Número de informes financieros elaborados y presentados: 5 informes.

Se adjuntan todos los documentos necesarios para la realización de la modificación solicitada.

DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ
SUBDIRECTOR(A) DE INNOVACION Y PRODUCTIVIDAD
Supervisor del Convenio

MARIANA DEL PILAR MUÑOZ RINCON
DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN

Plaza de los Artesanos Centro de Negocios y Exposiciones - Carera 60 Nº 63 A- 52. Teléfonos 3693777 Ext 240 - 243
e-mail: secretaria@desarrolloeconomico.gov.co

MODIFICACION No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 818-2022

Entre el Ordenador del Gasto delegado de la **SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO**, **SEBASTIAN MARULANDA ROBLEDO**, desempeñando el cargo de Subsecretario de la Entidad, según Resolución No. 645 de fecha 02 de diciembre de 2021, proferido por la Secretaria de Despacho, y Acta de posesión 1141 de fecha 02 de diciembre de 2021, quien en adelante y para efectos del presente acto se denominará la **SDDE**, Entidad identificada con el NIT. No. 899.999.061-9, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y por la otra parte, **MARÍA ISABELA MUÑOZ MENDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.317.723, quien actúa como representante legal de **LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGION BOGOTÁ REGION DINÁMICA INVEST IN BOGOTA,** identificada con NIT No. 900106691-0 y quien en adelante y para efecto del presente acto se denominará **INVEST IN BOGOTA**, hemos convenido suscribir la presente **Modificación No. 1** al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 818-2022**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 21 de octubre del año 2022 se suscribió Convenio Interadministrativo No. 818-2022 entre la **SDDE** y **INVEST IN BOGOTÁ**, con el objeto de *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad."*, por un valor total NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($939.050.00).

2. Que el plazo inicial del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** se pactó en SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, desde el 27 de octubre de 2022 y hasta el 26 de abril de 2023.

3. Que mediante solicitud el supervisor del Convenio Interadministrativo 818 de 2022 remitió a la Oficina Jurídica la justificación de la modificación No. 1 al citado Convenio, en el cual se indica:

MODIFICACION No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 818-2022

En línea con el cumplimiento de los objetivos de promover el emprendimiento, fortalecer las capacidades empresariales de las MiPymes, generar condiciones para que el tejido empresarial pueda superar las barreras para la innovación y dinamizar el ecosistema de emprendimiento, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad, se estipuló un tiempo inicial de ejecución de 6 meses, de acuerdo con las siguientes fases y presupuesto:

Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 1.

En este sentido, a la fecha, se han venido ejecutando las actividades de las fases 1, 2 y 4. Sin embargo, frente al desarrollo del evento de lanzamiento de la herramienta digital y la ruta de alto impacto de la fase 3 y con base en lo desarrollado en las fases previas, se identificó la pertinencia de modificar la fecha del evento de lanzamiento y hacer el desarrollo de este por momentos en diferentes espacios y acompañar la interacción y dinamización de los empresarios en la plataforma durante 5 meses, a través de:

1. Realización de espacios y actividades estratégicas, asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto que involucren:

i) Participación en escenarios de impacto; ii) Desarrollo de espacios digitales de conexión y divulgación con actores clave del ecosistema, con los que se pueda visibilizar la herramienta y difundir sus propiedades. Adicionalmente, iii) Llevar a cabo, un encuentro que permita el reconocimiento y estímulo a las mejores empresas innovadoras de Bogotá, que hayan sido beneficiarias en el marco de la ruta de alto impacto en el pilar de fortalecimiento.

2.En línea con lo anterior y articulado con la Fase 1 y la Fase 2 es necesario, para ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma, generar contenidos actualizados y herramientas dinámicas, que mantengan el interés y el compromiso de las empresas.

Teniendo presentes los puntos enunciados, se requiere:

MODIFICACION No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 818-2022

1. Ampliar el tiempo de ejecución del Convenio hasta el 30 de septiembre de 2023, para completar la ejecución de la Fase 3, toda vez que, el tiempo descrito en los estudios previos para implementar la Fase en mención no será suficiente para lograr este último propósito y obtener los resultados esperados.

Al respecto, es relevante tener en cuenta los tiempos en que las empresas objetivo realizan su entrada a la herramienta y a la ruta de alto impacto y, de esta manera, garantizar el registro, interacción, conexión y creación de un ambiente de articulación entre ellas, para la creación de comunidad, aprovechando las funcionalidades que brinda la herramienta: (i) Diagnóstico; (ii) Facilitación de información y promoción (que articula y organiza la oferta de servicios para emprendedores y empresarios, mediante un repositorio de información con dicha oferta); (iii) Visibilización de la ruta de alto impacto (con la oferta de servicios de fortalecimiento, financiación y conexión a mercados de la SDDE para emprendedores dinámicos y MiPymes) (iv) Emparejamiento (para los inversionistas locales y extranjeros sobre la oferta de posibilidades de inversión en emprendimiento, de manera que se gesten conexiones que permitan escalar la nueva generación de empresas del ecosistema de emprendimiento dinámico y de alto impacto de Bogotá Región.

2. Ajustar el presupuesto propuesto para la ejecución del convenio, así:

Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 2.

3. Hacer un ajuste en la contrapartida de Invest in Bogota así:

Ver anexo: Solicitud de prórroga al convenio 818-2022 – Tabla 3.

Los indicadores actualizados a abril de 2023 son:

Técnicos

• Plan de trabajo que evidencie cronograma y perfil de desarrolladores: 1 documento
• Documento estructurado con funcionalidades de la herramienta digital: 1 documento

MODIFICACION No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 818-2022

• Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento: 0 página web
• Protocolo de gobernanza de datos, roles y permisos, usuarios de la herramienta digital: 0 documento
• 300 Empresas diagnosticadas: 300

Financieros

• Porcentaje de recursos entregados por la SDDE con corte a abril 20 de 2023: 90% de los aportes de la SDDE.
• Porcentaje de recursos ejecutados en el marco del convenio: Con corte a 31 de marzo de 2023 se han ejecutado el 78% de los recursos aportados a la fecha por la SDDE por valor de $561.955.866.

Administrativos

• Número de informes de ejecución y seguimiento elaborados y presentados: 3 informes técnicos.
• Número de informes financieros elaborados y presentados: 5 informes.

4. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a prorrogar y modificar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 818 DE 2022**, con base en las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 818-2022** hasta el 30 de septiembre de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE INVESTIN IN BOGOTA Y DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, en su numeral 19 el cual quedará así:

19. Realizar espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto realizados a la fecha.

MODIFICACION No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 818-2022

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE INVESTIN IN BOGOTA Y DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, en el item PRODUCTOS, en su numeral 7 el cual quedará así:

> *7. Informe con los resultados de los espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto realizados a la fecha.*

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE INVESTIN IN BOGOTA Y DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, en el item PRODUCTOS, incluyendo un producto el cual quedará así:

> *16. Un reporte de los contenidos generados y herramientas dinámicas, con el propósito de ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma.*

CLÁUSULA QUINTA: MODIFICAR LA CLÁUSULA QUINTA- VALOR DEL CONVENIO, la cual quedará así:

VALOR DEL CONVENIO: MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.048.383.494) M/CTE. Este valor incluye el IVA, impuestos nacionales y distritales y demás gastos directos e indirectos en los que deba incurrir Invest in Bogota en la ejecución del objeto del convenio.

APORTES DE LA SDDE: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE.

APORTES DE INVEST IN BOGOTA: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($248.383.494), en especie.

CLÁUSULA SEXTA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA – FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS, la cual quedará así:

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico desembolsará el valor del convenio de la siguiente manera, previo a la entrega de los siguientes productos/entregables:

(…)

> *Un cuarto desembolso por el 5% del total del aporte por parte de la SDDE, correspondientes a CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) posterior a la presentación y aprobación de los productos 5, 8, 9 y 11. (5. Documento que contenga desarrollos asociados a la integración de la herramienta que conecte emprendimientos dinámicos de la ciudad con potenciales inversionistas y viceversa, a partir del conocimiento de Invest in Bogotá de herramientas similares disponibles en otros mercados. 8. Documento que contenga el detalle de la ejecución del convenio en un tablero de control. 9. Herramienta digital como dinamizador del ecosistema de emprendimiento. Se entregarán los siguientes documentos de la herramienta: manual de usuario final, manual de*

administrador, matriz de pruebas y manual de fuentes. 11. Informe que analiza retos y desafíos que enfrenta el ecosistema de emprendimiento local que servirá como insumo para organizar y priorizar los servicios para beneficio de los emprendedores de Bogotá Región).

Un quinto desembolso por el 5% del total del aporte por parte de la SDDE, correspondientes a CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) posterior a la presentación y aprobación de los productos restantes, 7 y 16. (7. Informe con los resultados de los espacios estratégicos y actividades asociadas al lanzamiento y la divulgación de la herramienta digital y la ruta de alto impacto realizados a la fecha. 16. Un reporte de los contenidos generados y herramientas dinámicas con el propósito de ampliar la base de actores del ecosistema emprendedor de alto impacto de Bogotá que participan e interactúan con la plataforma.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS: El contratista deberá ampliar las vigencias y montos contenidos en la Garantía Única de Cumplimiento, de acuerdo con la presente prórroga y modificación y cargarla en el SECOP II, para su aprobación.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones no modificadas a través del presente documento continúan vigentes. Para constancia la firma de las partes se hace electrónicamente a través de SECOP II

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4137771
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/10/2022 8:15:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-818-2022
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MiPymes de la ciudad.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	27/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	157 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA BOGOTÁ
Servicios de asesoría de gestión

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Invest in Bogota

Número de documento 900106691

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Corporacion Bogota Rgion Dinamica-Invest in Bogota	Banco Itau	Ahorros	757-00127-7

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA ISABELA MUÑOZ MENDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2022 12:46:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *sebastian marulanda* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2022 1:22:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4137771_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4137771_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(15/05/2023 2:21:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11685311	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	471.772.572,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10174549	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	422.572.500,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4137771
Proveedor Corporacion Bogota Rgion Dinamica-Invest in Bogota
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 10 No. 28-49 TORRE A
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4137771

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							939.050.000,00	1.048.383.494,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el ecosistema de emprendimiento de Bogotá Región, a través de una herramienta digital que permita el diagnóstico, información, promoción y ruta de acceso a los servicios de fortalecimiento y financiación a emprendedores y MPymes de la ciudad.	1,00	UN	939.050.000,00	1.048.383.494,00	939.050.000,00	1.048.383.494,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO GENERAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IIB - SDDE.pdf	CLAUSULADO GENERAL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IIB - SDDE.pdf	(detalle)
Resolucion 861-2022 INVEST IN BOGOTA´ VF.pdf	Resolucion 861-2022 INVEST IN BOGOTA´ VF.pdf	(detalle)
MODIFICACION 1 CONVENIO 818-2022.pdf	MODIFICACION 1 CONVENIO 818-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	sebastian marulanda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79942976	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	sebastian marulanda	21/10/2022 1:22:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	sebastian marulanda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	800.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	248.383.494
Total	1.048.383.494

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010361	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1248	CDP	No validado	100.000.000 COP		23-01-160-1240-000007837	Editar
☐	1249	CDP	No validado	530.000.000 COP		23-01-160-1240-000007847	Editar
☐	1250	CDP	No validado	170.000.000 COP		23-01-160-1180-000007874	Editar

Saldo de CDP 800.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1154	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1155	Presupuestal (CDP)	-	No validado	530.000.000 COP	530.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1156	Presupuestal	-	No	170.000.000	170.000.000	-	-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	validado	COP	COP	

Saldo de compromisos CDP 800.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 800.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.11012531	Modificar el contrato	26/04/2023 8:20 AM *(UTC -5 horas)*	26/04/2023 6:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
