Nº Radicado 0123004789902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DOSOC-38.10

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2023

Señor TC
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 1 del Contrato No. 098 de 2023
Mensual _X__ ó Final _____

Respetuosamente, me dirijo a la señora TC Maritza Molina Carrillo, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor | EDWIN FERNEY PINZON MORA |
| Dependencia | J3 DISOC |
| Cargo | OFICIAL DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DISOC J3 |
| Apoyo a la supervisión | |

2. Datos del contrato

| | |
|---|---|
| Número y fecha de suscripción del Contrato | 098 DEL 2023, 30 DE MARZO 2023 |
| Contratista | SOFTWARE BUILDERS LTDA. |
| Cedula de Ciudadanía o Nit. | 800220878-5 |
| Objeto | El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZA MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A prestar el servicio de soporte, actualización, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia - bisigoi integrado con el sistema de seguridad hércules del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas RESERVADAS y cuadro de precios |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato. | |
| Valor del Contrato | | TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 399.999.936,00) INCLUIDO IVA | |
| Plazo de ejecución | | 8 meses a partir de 4 de abril del 2023 | |
| Modificatorio No. | | | |
| Adición | Prorroga | Suspensión | Otros |
| Objeto del modificatorio: | | | |

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

| N° | Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato | Cumple | No cumple | Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con las especificaciones técnicas, estudio previo, invitación pública y el presente Contrato, en particular, con los plazos máximos establecidos. | SI | | Acta de seguimiento y control.<br>Carta de garantía.<br>Informe de actividades del mes Abril del 2023. |
| 2 | Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del mismo. | SI | | Acta de seguimiento y control.<br>Informe de actividades del mes Abril del 2023. |
| 3 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas. | SI | | Acta de seguimiento y control.<br>Informe de actividades del mes Abril del 2023. |
| 4 | Entregar al supervisor del contrato el Certificado de aportes parafiscales debidamente suscrito por el representante legal o Revisor Fiscal. | SI | | La empresa anexa el certificado de aportes parafiscales. |
| 5 | Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente Contrato. | SI | | Acta de seguimiento y control.<br>Informe de actividades del mes Abril del 2023. |
| 6 | Responder en los plazos que el MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | | Acta de seguimiento y control.<br>Informe de actividades del mes Abril del 2023. |

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 67306214 con fecha de pago 03 de mayo de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 05 de mayo de 2023, suscrita por el señor César Augusto Riaño representante legal, de la empresa Software Builders LTDA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato Incluido IVA: | $ 399.999.936,00 |
| Que al contrato se le efectuó una adición el _ de XXX de 20XX por valor de: | 0 |
| Valor Total del Contrato es de: | $ 399.999.936,00 |

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

| No Factura | Fecha | Valor de la Factura |
|---|---|---|
| 100781 | 09/05/2023 | $ 49.999.992,00 |
| | | |
| Valor Facturado | | $ 49.999.992,00 |
| Saldo por Facturar | | $ 349.999.992.00 |
| Valor de Reintegro | | $ 0 |
| Valor Total del Contrato | | $ 399.999.936 |

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

_____

_____

_____

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

- Informe de actividades
- Cronograma Inicial
- Cronograma actualizado a 04 Mayo del 2023
- Planilla pago aportes
- Certificación Garantía
- Certificación Pago Aportes
- Medidas de Bioseguridad
- Personal del proyecto
- Certificación de Precios
- Certificación Cumplimiento Protocolo bioseguridad

Atentamente,


TC EDWIN FERNEY PINZON MORA
Supervisor del contrato 098 del 2023
Correo electrónico edwpin@cgfm.mil.co
Celular: 310 8556524


*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME. | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME |
| | 17 MAY/23 | 17 MAY/23 | PO Laura Fonseca 17 MAY/23 11:27 AM | |

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1811 - 23

Bogotá D.C, Mayo 9 de 2023

Señores:
**MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Ciudad

**Ref.:** Contrato de Servicios 098 de 2023

Apreciados Señores:

Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que los precios ofertados se mantendrán durante la vigencia del contrato 098 de 2023.

Atentamente,

César A. Riaño D.

**César Augusto Riaño Delgado**
**Representante Legal**
**Software Builders Ltda**

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800220878-5 | SOFTWARE BUILDERS LTDA | CARRERA 70 D 51 57 | 6014713433 | info@softwarebuilders.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67306214 | $11.375.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1.267.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267.600 | 4 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 388.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000 | 2 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 275.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.100 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.884.800 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | | 1.949.800 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 4.890.400 | 0 | 0 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 | | 5.078.000 | 6 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 270.500 | | | | 270.500 | 0 | 0 | 270.500 | | | 2.705 | 270.500 | 11 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2.046.200 | 0 | 0 | 2.046.200 | 11 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 2.030.700 | 2.030.700 |
| Pensión | 2 | 7.027.800 | 7.027.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 270.500 | 270.500 |
| CCF | 1 | 2.046.200 | 2.046.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 11.375.200 | 11.375.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 800220878-5 | SOFTWARE BUILDERS LTDA | | CARRERA 70 D 51 57 | 6014713433 | info@softwarebuilders.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 11 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67306214 | $11.375.200 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | REGIMEN LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colilla | Sueldo | Extranjero | Colom. retornado | Exonerado | Sus | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1000007425 | CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.500.000 | 100.000 | 14-25 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1007211640 | MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.683.334 | 429.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.683.334 | 107.400 | 14-25 | 2.683.334 | 1 | 14.100 | CCF24 | 2.683.334 | 107.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1007211640 | MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 191.667 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 191.667 | 7.700 | 14-25 | 191.667 | 1 | 0 | CCF24 | 191.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1014267112 | VILLAMIZAR GONZÁLEZ SEBASTIAN FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-25 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF24 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1019079973 | RIAÑO RINCON CESAR ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.639.000 | 742.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.639.000 | 185.600 | 14-25 | 4.639.000 | 1 | 24.300 | CCF24 | 4.639.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1102859816 | SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6.500.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | EPS005 | 6.500.000 | 260.000 | 14-25 | 6.500.000 | 1 | 34.000 | CCF24 | 6.500.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1233604969 | DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.500.000 | 100.000 | 14-25 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 28798542 | MORENO USMA SANDRA YAMILE | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 580.000 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-25 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF24 | 580.000 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 39810074 | LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.200.000 | 1.152.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | EPS008 | 7.200.000 | 288.000 | 14-25 | 7.200.000 | 1 | 37.600 | CCF24 | 7.200.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 51754252 | RINCON JAIMES CLARA INES | 1 | 4 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 9.000.000 | 360.000 | 14-25 | 9.000.000 | 1 | 47.000 | CCF24 | 9.000.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 51830322 | CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.200.000 | 88.000 | 14-25 | 2.200.000 | 1 | 11.500 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 79327478 | RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11.550.000 | 1.848.000 | 0 | 0 | 57.800 | 57.800 | EPS005 | 11.550.000 | 462.000 | 14-25 | 11.550.000 | 1 | 60.300 | CCF24 | 11.550.000 | 462.000 | 11.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800220878-5 | SOFTWARE BUILDERS LTDA | CARRERA 70 D 51 57 | 6014713433 | info@softwarebuilders.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 11 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67306214 | $11.375.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1.267.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267.600 | 4 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 388.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000 | 2 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 275.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.100 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.884.800 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | | 1.949.800 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 4.890.400 | 0 | 0 | 93.800 | 93.800 | 0 | 0 | | 5.078.000 | 6 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 270.500 | | | | 270.500 | 0 | 0 | 270.500 | | | 2.705 | 270.500 | 11 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 2.046.200 | 0 | 0 | 2.046.200 | 11 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 2.030.700 | 2.030.700 |
| Pensión | 2 | 7.027.800 | 7.027.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 270.500 | 270.500 |
| CCF | 1 | 2.046.200 | 2.046.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 11.375.200 | 11.375.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800220878-5 | SOFTWARE BUILDERS LTDA | CARRERA 70 D 51 57 | 6014713433 | info@softwarebuilders.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 11 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67306214 | $11.375.200 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colegiado | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Dependiente | Ing | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1000007425 | CANGREJO SAENZ DANIEL DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.500.000 | 100.000 | 14-25 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1007211640 | MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.683.334 | 429.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.683.334 | 107.400 | 14-25 | 2.683.334 | 1 | 14.100 | CCF24 | 2.683.334 | 107.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1007211640 | MARIN ALVAREZ DAVID FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 191.667 | 30.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 191.667 | 7.700 | 14-25 | 191.667 | 1 | 0 | CCF24 | 191.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1014267112 | VILLAMIZAR GONZALEZ SEBASTIAN FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.800.000 | 72.000 | 14-25 | 1.800.000 | 1 | 9.400 | CCF24 | 1.800.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1019079973 | RIAÑO RINCON CESAR ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.639.000 | 742.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.639.000 | 185.600 | 14-25 | 4.639.000 | 1 | 24.300 | CCF24 | 4.639.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1102859816 | SUAREZ BALDOVINO LEONARDO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6.500.000 | 1.040.000 | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | EPS005 | 6.500.000 | 260.000 | 14-25 | 6.500.000 | 1 | 34.000 | CCF24 | 6.500.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1233504969 | DELGADO MUÑOZ LOREN ALEJANDRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.500.000 | 100.000 | 14-25 | 2.500.000 | 1 | 13.100 | CCF24 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 28798542 | MORENO USMA SANDRA YAMILE | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 580.000 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-25 | 1.160.000 | 1 | 6.100 | CCF24 | 580.000 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 39810074 | LEON URDANETA CLAUDIA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.200.000 | 1.152.000 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | EPS008 | 7.200.000 | 288.000 | 14-25 | 7.200.000 | 1 | 37.600 | CCF24 | 7.200.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 51754252 | RINCON JAIMES CLARA INES | 1 | 4 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 9.000.000 | 360.000 | 14-25 | 9.000.000 | 1 | 47.000 | CCF24 | 9.000.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 51830322 | CASTRO CARDENAS SANDRA ROCIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.200.000 | 88.000 | 14-25 | 2.200.000 | 1 | 11.500 | CCF24 | 2.200.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 79327478 | RIAÑO DELGADO CESAR AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11.550.000 | 1.848.000 | 0 | 0 | 57.800 | 57.800 | EPS005 | 11.550.000 | 462.000 | 14-25 | 11.550.000 | 1 | 60.300 | CCF24 | 11.550.000 | 462.000 | 11.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 737 -23

Bogotá D.C, Mayo 05 de 2023

Señores:
**Ministerio de Defensa Nacional**
**Comando General Dirección administrativa y Financiera**
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

**César Augusto Riaño Delgado**
**Representante Legal**
**C.C. 79.327.478 de Bogotá**

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 737 -23

Bogotá D.C, Mayo 05 de 2023

Señores:
**Ministerio de Defensa Nacional**
**Comando General Dirección administrativa y Financiera**
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D.

**César Augusto Riaño Delgado**
**Representante Legal**
**C.C. 79.327.478 de Bogotá**

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acta No | 001-2023 | Asunto | ACTA DE INICIO CONTRATO 098 DE 2023 |
| Lugar y Fecha | Bogotá, Abril 4 de 2024 | | |
| Hora Inicio | 11:00 am | Hora Finalización | 12:00 M |
| Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora | | COMANDO GENERAL FFMM – J3 | |
| Ausentes | | | |

Orden del día:

- Presentación del grupo de trabajo de SOFTWARE BUILDERS, del supervisor Contrato y del personal Funcional J3 y J4 del COGFM.
- Lectura del objeto del contrato.
- Presentación del cronograma inicial por parte del Gerente de Software Builders.

Desarrollo:

- PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
  Gerente de Proyecto: Ing. César Riaño
  Ingeniero Base de Datos: Ing. César Riaño
  Analista y Desarrollador: Ing. Clara Rincón
  Desarrollador: Tecnóloga Loren Delgado

  GRUPO DE TRABAJO COGFM
  TC Edwin Ferney Pinzón Mora Supervisor del contrato
  SS Diego Moncada – Apoyo J3
  SS Carlos Griego – Apoyo J4
  PD6 Sonia Cavanzo – Apoyo J6

- LECTURA DEL OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO

  Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del sistema de Información del Sistema de Información Gerencial de Operaciones e Inteligencia con el Sistema de Seguridad Hércules del Comando General de las Fuerzas Militares, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios descritos en el anexo único, el cual hace parte integral del contrato.

- EXPLICACIÓN DEL CRONOGRAMA POR PARTE DEL GERENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.
  Se anexa cronograma.

- SOLICITUD DE CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO
  Se propone conformación de grupos de trabajo que participirá en cada actividad de las especificaciones técnicas del contrato:

Medio Ambiente:
Líder Funcional: PD Sindy Piñeros
Soporte Técnico J6: PD Sonia Cavanzo
Software Builders: Clara Rincón

BISIGOI:
Líder Funcional: S2 Diego Moncada / SV Luis Bonilla
Soporte Técnico J6: PD Sonia Cavanzo
Software Builders: César Riaño / Loren Delgado

Logística:
Líder Funcional: S2 Carlos Griego
Soporte Técnico J6: PD Sonia Cavanzo
Software Builders: Clara Rincón

- Se solicita que se hagan reuniones mensuales para hacer seguimiento y control al contrato.
- Durante el proceso de actualización de BISIGOI – Logística y Medio Ambiente se solicita mantener informado al Supervisor del desarrollo de las reuniones de trabajo.


Conclusiones:

Actividades a Realizar:


| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Convocatoria Próxima Reunión | | | |
|---|---|---|---|
| Tema: | | | |
| Fecha - Hora: | | Lugar: | |

| Intervienen y/o Asistentes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | Nombre | Cargo | E-mail | Teléfono | Firma |
| TC | EDWIN FERNEY PINZÓN MORA | SUPERVISOR J3 | edwipin@cgfm.mil.co | 3108556524 | |
| ING. | CESAR AUGUSTO RIAÑO DELGADO | GERENTE DE SOFTWARE BUILDERS | cesar_riano@software-b.com | 3203425285 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ING. | CLARA INÉS RINCON JAIMES | ANALISTA DESARROLLADOR | cirj@software-b.com | 3203425292 |  |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Contrato Mantenimiento BISIGOI 098 2023** | **0%** | **175 días** | **mar 04/04/23** |
| 2 | | 1.3 Mantenimiento Correctivo | 0% | 175 días | mar 04/04/23 |
| 3 | | Mantenimiento Preventivo | 0% | 175 días | mar 04/04/23 |
| 4 | | **1.4 Actualización Software BISIGOI** | **0%** | **175 días** | **mar 04/04/23** |
| 5 | | **Actualización al Software Bisigoi y sus componentes** | **0%** | **175 días** | **mar 04/04/23** |
| 6 | | Reingenieria de los Jobs o ETL a nivel de base de datos CGDJ3, CGDJ4, CGDJ9 Y CGDJ10 | 0% | 175 días | mar 04/04/23 |
| 7 | | Generación de consultas de la base de datos COC, CGEXT, OBIREPO | 0% | 175 días | mar 04/04/23 |
| 8 | | Generación de 3 reportes de analitica | 0% | 175 días | |
| 9 | | **Actualización del Módulo Logístico Conjunto del COGFM** | **0%** | **175 días** | **mar 04/04/23** |
| 10 | | Actualización de las funcionalidades realizadas sobre la integración BW-SILOG y vistas del SIATH, y tablas parametrizaas | 0% | 175 días | mar 04/04/23 |

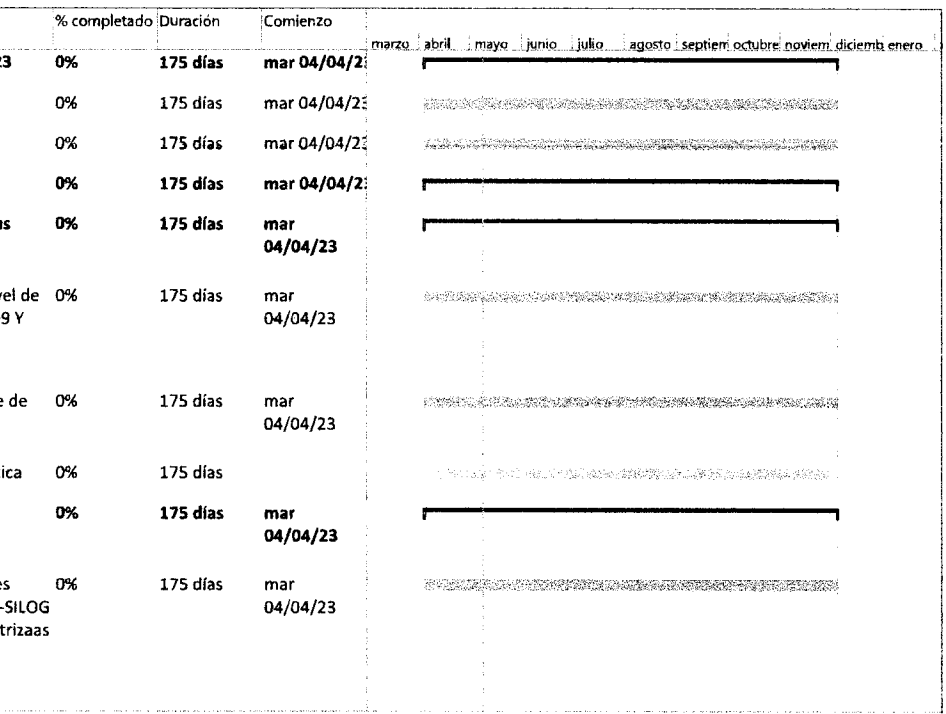


Cesar A. Riaño D.

TC Edwin Pinzon

Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Manejo de la trazabilidad sobre las tablas cagadas de BW-silog (CGEXT -> COC) guardando información en el tiempo | 0% | 160 días | mar 04/04/23 |
| 12 | | Construcción de vistas sobre la información histórica de BW-SILOG | 0% | 160 días | mar 04/04/23 |
| 13 | | Creación del Módulo BILOGISC | 0% | 30 días | mar 04/04/23 |
| 14 | | Consulta sobre Sanidad Militar SALUDSIS | 0% | 160 días | mar 04/04/23 |
| 15 | | Activar botón para que el usuario final o el administrador puedan realizar observaciones | 0% | 20 días | mar 16/05/23 |
| 16 | | Opción para el envio de alertas, notificaciones, observaciones o requerimientos a través de mensajes dentro de la plataforma | 0% | 60 días | mar 13/06/23 |

marzo abril mayo junio julio agosto septiem octubre noviem diciemb enero

Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | **Submódulo Capacidades Logísticas. Formulario de Registro de capacidades por fuerza, Capacidades de Mantenimiento, Situación de comedores de tropa, Capcidades de Abastecimiento, Capacidades Logísticas, numerales A hasta J** | **0%** | **105 días** | **mar 04/04/23** |
| 18 | | Análisis y Diseño | 0% | 40 días | mar 04/04/23 |
| 19 | | Construcción | 0% | 40 días | mar 30/05/23 |
| 20 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 20 días | mar 25/07/23 |
| 21 | | Capacitación | 0% | 5 días | mar 22/08/23 |
| 22 | | **Submódulo de Cooperación, Numeral 2 Desde A. hasta F** | **0%** | **115 días** | **mar 30/05/23** |
| 23 | | Análisis y Diseño | 0% | 10 días | mar 30/05/23 |
| 24 | | Construcción | 0% | 40 días | mar 22/08/23 |
| 25 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 10 días | mar 17/10/23 |
| 26 | | Capacitación | 0% | 5 días | mar 31/10/23 |
| 27 | | **Submódulo Estandarización** | **27%** | **106 días** | **mar 13/06/23** |
| 28 | | Análisis y Diseño | 80% | 3 días | mar 13/06/23 |
| 29 | | Construcción | 0% | 3 días | mar 31/10/23 |

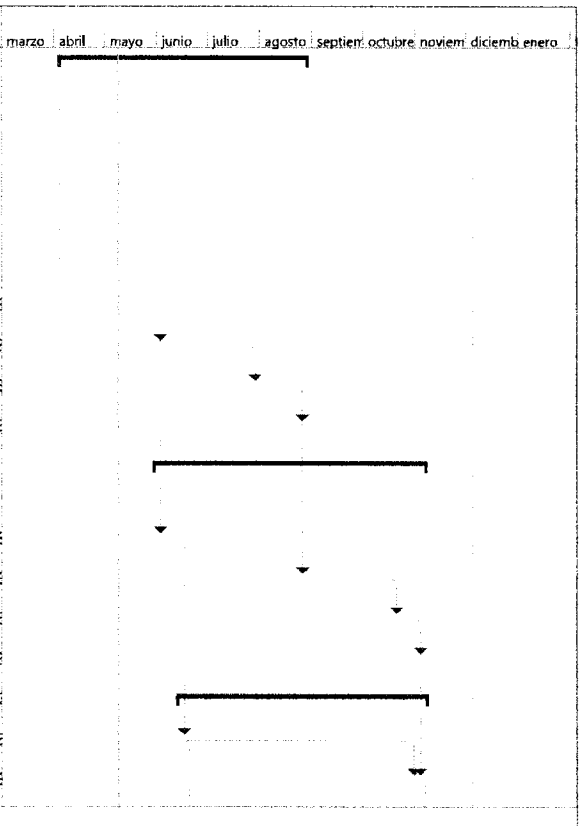


Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 2 días | vie 03/11/23 |
| 31 | | Capacitación | 0% | 1 día | mar 07/11/23 |
| 32 | | **Submódulo Repositorio de documentación** | **0%** | **107 días** | **vie 16/06/23** |
| 33 | | Análisis y Diseño | 0% | 2 días | vie 16/06/23 |
| 34 | | Construcción | 0% | 3 días | mar 07/11/23 |
| 35 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 1 día | vie 10/11/23 |
| 36 | | Capacitación | 0% | 1 día | lun 13/11/23 |
| 37 | | **Submódulo Oferta Académica** | **0%** | **120 días** | **mar 20/06/23** |
| 38 | | Análisis y Diseño | 0% | 15 días | mar 20/06/23 |
| 39 | | Construcción | 0% | 10 días | lun 13/11/23 |
| 40 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 5 días | lun 27/11/23 |
| 41 | | Capacitación | 0% | 1 día | lun 04/12/23 |
| 42 | | **Reportes, consultas e informes generados** | **0%** | **154 días** | **mar 04/04/23** |
| 43 | | Creación vistas sobre COC Y CGEXT | 0% | 150 días | mar 04/04/23 |
| 44 | | 10 Reportes gerenciales | 0% | 90 días | lun 03/07/23 |
| 45 | | 3 reportes de analítica de datos | 0% | 90 días | lun 03/07/23 |

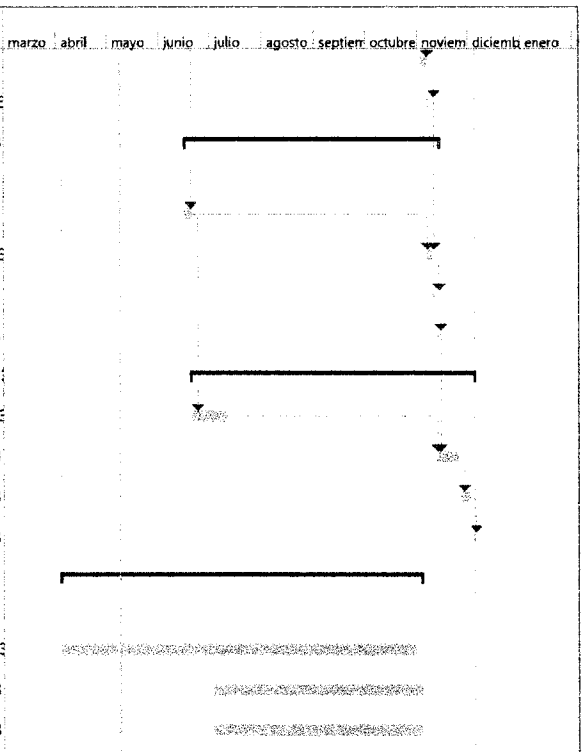


Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Contrato Mantenimiento BISIGOI 098 2023** | **13%** | **175 días** | **mar 04/04/2** |
| 2 | | 1.3 Mantenimiento Correctivo | 13% | 175 días | mar 04/04/2 |
| 3 | | Mantenimiento Preventivo | 13% | 175 días | mar 04/04/2 |
| 4 | | **1.4 Actualización Software BISIGOI** | **12%** | **175 días** | **mar 04/04/2** |
| 5 | | **Actualización al Software Bisigoi y sus componentes** | **9%** | **175 días** | **mar 04/04/23** |
| 6 | | Reingenieria de los Jobs o ETL a nivel de base de datos CGDJ3, CGDJ4, CGDJ9 Y CGDJ10 | 13% | 175 días | mar 04/04/23 |
| 7 | | Generación de consultas de la base de datos COC, CGEXT, OBIREPO | 13% | 175 días | mar 04/04/23 |
| 8 | | Generación de 3 reportes de analitica | 0% | 175 días | |
| 9 | | **Actualización del Módulo Logistico Conjunto del COGFM** | **16%** | **175 días** | **mar 04/04/23** |
| 10 | | Actualización de las funcionalidades realizadas sobre la integración BW-SILOG y vistas del SIATH, y tablas parametrizaas | 13% | 175 días | mar 04/04/23 |

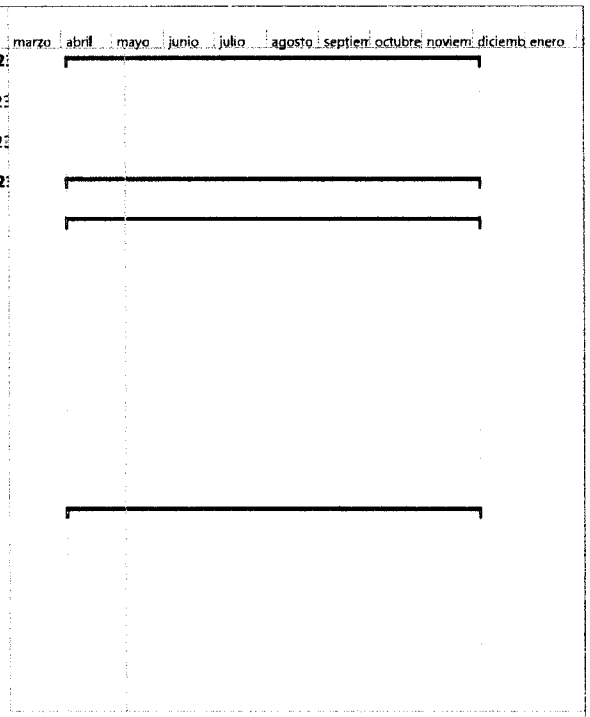


Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Manejo de la trazabilidad sobre las tablas cagadas de BW-silog (CGEXT -> COC) guardando información en el tiempo | 13% | 160 días | mar 04/04/23 |
| 12 | | Construcción de vistas sobre la información histórica de BW-SILOG | 13% | 160 días | mar 04/04/23 |
| 13 | | Creación del Módulo BILOGISC | 50% | 30 días | mar 04/04/23 |
| 14 | | Consulta sobre Sanidad Militar SALUDSIS | 10% | 160 días | mar 04/04/23 |
| 15 | | Activar botón para que el usuario final o el administrador puedan realizar observaciones | 30% | 20 días | mar 16/05/23 |
| 16 | | Opción para el envio de alertas, notificaciones, observaciones o requerimientos a través de mensajes dentro de la plataforma | 30% | 60 días | mar 13/06/23 |

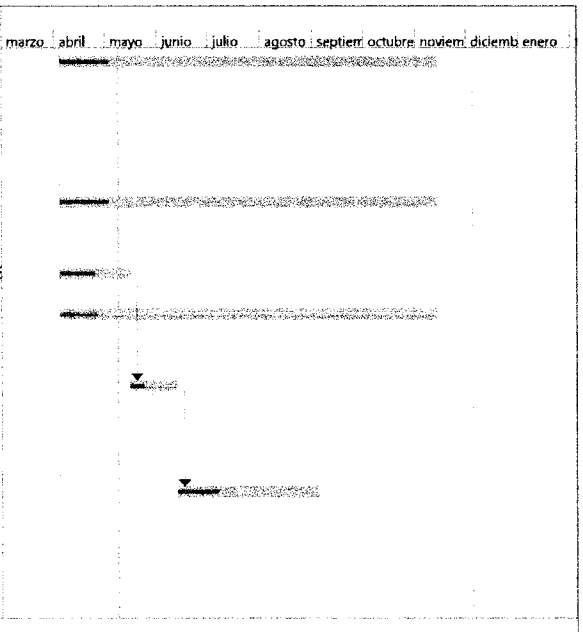


Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |


| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | **Submódulo Capacidades Logísticas. Formulario de Registro de capacidades por fuerza, Capacidades de Mantenimiento, Situación de comedores de tropa, Capcidades de Abastecimiento, Capacidades Logísticas, numerales A hasta J** | **23%** | **105 días** | **mar 04/04/23** |
| 18 | | Análisis y Diseño | 60% | 40 días | mar 04/04/23 |
| 19 | | Construcción | 0% | 40 días | mar 30/05/23 |
| 20 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 20 días | mar 25/07/23 |
| 21 | | Capacitación | 0% | 5 días | mar 22/08/23 |
| 22 | | **Submódulo de Cooperación, Numeral 2 Desde A. hasta F** | **6%** | **115 días** | **mar 30/05/23** |
| 23 | | Análisis y Diseño | 40% | 10 días | mar 30/05/23 |
| 24 | | Construcción | 0% | 40 días | mar 22/08/23 |
| 25 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 10 días | mar 17/10/23 |
| 26 | | Capacitación | 0% | 5 días | mar 31/10/23 |
| 27 | | **Submódulo Estandarización** | **27%** | **106 días** | **mar 13/06/23** |
| 28 | | Análisis y Diseño | 80% | 3 días | mar 13/06/23 |
| 29 | | Construcción | 0% | 3 días | mar 31/10/23 |

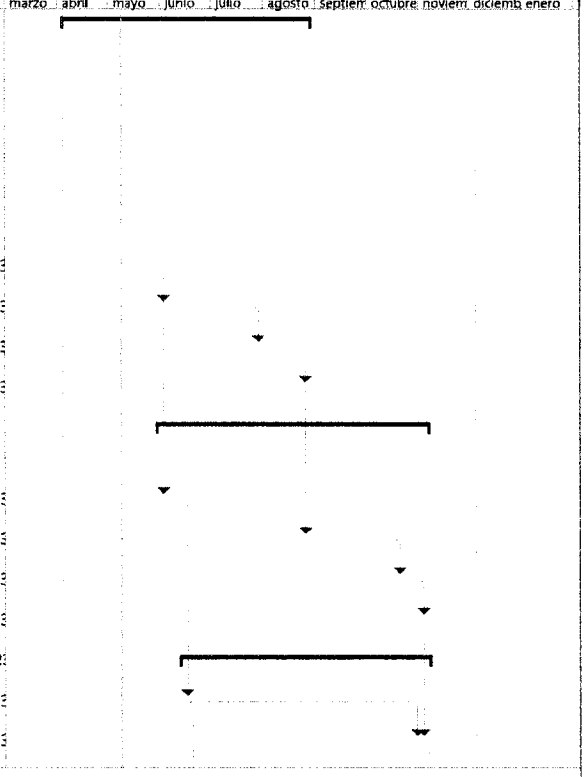


Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | % completado | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 2 días | vie 03/11/23 |
| 31 | | Capacitación | 0% | 1 día | mar 07/11/23 |
| 32 | | **Submódulo Repositorio de documentación** | **17%** | **107 días** | **vie 16/06/23** |
| 33 | | Análisis y Diseño | 60% | 2 días | vie 16/06/23 |
| 34 | | Construcción | 0% | 3 días | mar 07/11/23 |
| 35 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 1 día | vie 10/11/23 |
| 36 | | Capacitación | 0% | 1 día | lun 13/11/23 |
| 37 | | **Submódulo Oferta Académica** | **29%** | **120 días** | **mar 20/06/23** |
| 38 | | Análisis y Diseño | 60% | 15 días | mar 20/06/23 |
| 39 | | Construcción | 0% | 10 días | lun 13/11/23 |
| 40 | | Pruebas y Ajustes | 0% | 5 días | lun 27/11/23 |
| 41 | | Capacitación | 0% | 1 día | lun 04/12/23 |
| 42 | | **Reportes, consultas e informes generados** | **7%** | **154 días** | **mar 04/04/23** |
| 43 | | Creación vistas sobre COC Y CGEXT | 13% | 150 días | mar 04/04/23 |
| 44 | | 10 Reportes gerenciales | 5% | 90 días | lun 03/07/23 |
| 45 | | 3 reportes de analítica de datos | 0% | 90 días | lun 03/07/23 |

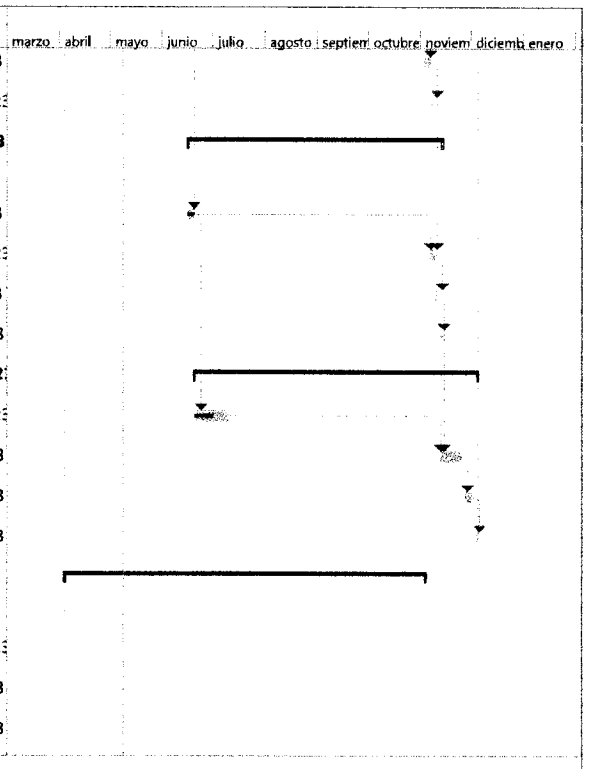


César A. Riaño D. TC Edwin Pinzon

Proyecto: Cronograma_cgfm_2
Fecha: mar 09/05/23

| | | |
|---|---|---|
| Tarea | Resumen inactivo | Tareas externas |
| División | Tarea manual | Hito externo |
| Hito | solo duración | Fecha límite |
| Resumen | Informe de resumen manual | Progreso |
| Resumen del proyecto | Resumen manual | Progreso manual |
| Tarea inactiva | solo el comienzo | |
| Hito inactivo | solo fin | |

Colmena Seguros

Colmena Formación Virtual

La República de Colombia y en su nombre

Colmena Seguros
NIT. 800226175-3

Debidamente autorizada y habilitada por el Ministerio de Trabajo bajo el número de registro RCO 0001, otorga la certificación correspondiente a la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a:

CLARA INES RINCON JAIMES
Identificado con CC 51754252

Número de horas cursadas: 50 Horas

De acuerdo a lo establecido en la resolución Número 4927 del 2016
El presente certificado se expide el 20 de enero de 2021, en la ciudad de Bogotá, D. C.

Luz Stella Rodriguez Rincón

Gerente Técnico Médica de Riesgos Laborales
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A.

**Software Builders**
Evolución Inteligente

Nit 800.220.878-5

SB 1810- 2023

Bogotá D.C, Mayo 04 de 2023

## MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta la realidad que vivimos por el Covid19, la empresa toma las siguientes medidas de seguridad decretados por Resolución 777 del 2 de junio de 2021 las cuales son:

- Diligenciar diariamente el formato de Excel con el reporte de síntomas y toma de temperatura, al iniciar la jornada laboral y finalizarla.
- Hacer las pausas activas mínimo dos veces al día y reportar en el formato Excel.
- Lavado de manos frecuente (cada dos horas si es posible)
- El uso obligatorio del tapabocas
- Distanciamiento social (mínimo un metro)
- Evitar estar en lugares muy concurridos.
- Cuando se visite al cliente, tomar todas las medidas de bioseguridad (uso tapabocas, distanciamiento, lavado de manos)
- Si no es posible el lavado de manos por el lugar donde se encuentre usar gel antibacterial y/o alcohol.
- Reportar a la empresa y la EPS casos sospechosos de contagio por Covid19 y tomar la prueba para descartar o confirmar.
- En caso positivo de Covid19, aislamiento (mínimo 15 días), aplicando los cuidados según las recomendaciones médica que reciba de la EPS. Seguir las recomendaciones de la EPS para toma de muestras de la familia y personas con las que hayan tenido contacto.
- Acudir a los sitios de vacunación cuando estén disponibles según los cronogramas nacionales. No olvidar que la vacuna no evita el contagio, disminuye el impacto de la enfermedad, por ello siempre debe mantener las medidas de bioseguridad.

Esperamos que cada uno tome estas medidas por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias.

Cordialmente,

**Software Builders Ltda.**
**Nit 800.220.878-5**
**Clara Inés Rincón Jaimes**
**C.C. 51.754.252 Bogotá**
**Subgerente**

Software Builders
Evolución Inteligente

SB 1811 - 23

Bogotá D.C, Mayo 9 de 2023

Señores:
**MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
Ciudad

**Ref.:** Contrato de Servicios 098 de 2023

Apreciados Señores:

Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que la empresa y sus colaboradores cumplen con el protocolo de bioseguridad MDN-COGFMPROGESHU-DIPEC.GI.95.1-2 V. 05 de fecha 5 de mayo de 2023, expedido por el Comando General de las Fuerzas Militares y aquel que lo modifique o derogue.

Atentamente,

César A. Riaño D.

**César Augusto Riaño Delgado**
**Representante Legal**
**Software Builders Ltda**

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA
