INFORME MENSUAL DE OBRA
Y ACTA PARCIAL N°01

CONTRATO DE OBRA
SMC-034-2023

"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA ".

PERIODO DE CONTROL:
DEL 20 DE ABRIL 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023

REALIZADO POR:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO
RESIDENTE DE OBRA	JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

TABLA DE CONTENIDO

- **Contenido**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5

2.1. Información general del contrato SMC-034-2023: 5

2.2. Frentes intervenidos durante el periodo: 9

2.3. Descripción de las actividades desarrolladas en cada frente de obra durante el periodo evaluado: 9

2.3.1. Carrera 1 entre calles 2 y 3 9

2.3.2. Carrera 1A entre calles 2 y 3 10

2.3.3. Calle 2 entre carreras 2 y 1A 11

3. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 14

4. MATERIALES UTILIZADOS 14

5. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS 15

6. AVANCE DE OBRA. 15

6.1. AVANCE FISICO 15

6.2. AVANCE ECONOMICO 16

7. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 17

8. Afiliaciones del personal al sistema integral en salud 18

9. ANEXOS 18

9.1. ANEXO 1: Afiliaciones de personal al sistema integral de salud y la correspondiente planilla de pago. 18

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

CONTENIDO DE FOTOS

Imagen 1 Ubicación de los andenes a intervenir 5
Imagen 2 Ubicación de la carrera 1 entre calles 2 y 3 9
Imagen 3 Ubicación de la carrera 1A entre calles 2 y 3 10
Imagen 4 Ubicación de la calle 2 entre carreras 2 y 1A 11
Imagen 5 Perforación del anclaje 13
Imagen 6 Instalación de la latina 13
Imagen 7 Instalación del hilo superior 14
Imagen 8 Aplicación 2 mano de pintura 14

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 Ubicación vías a intervenir 4
Tabla 2. Información Contratista. 6
Tabla 3. Estado de intervención de los frentes de Obra. 9
Tabla 4 Avance de obra Programado Vs Ejecutado 16
Tabla 5. Avance de obra por frente de trabajo. 16
Tabla 6 Avance económico de la obra 17
Tabla 7. Registro de personal en obra. 17
Tabla 8 Listado del personal en obra 18

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Villamaría con la instalación de los barandales pretende mejorar los espacios públicos de diferentes sectores, garantizando de esta forma un mayor seguridad y bienestar de los transeúntes.

Con estas adecuaciones se contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas que transitan por estos sectores. Es por esta razón que se requiere contratar el Suministro, transporte e instalación de los barandales en el barrio Villa Esperanza y otros sectores del municipio de Villamaría, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas y fijadas por la entidad a través de los documentos técnicos y cantidades.

El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad.

La obra pública a que hace referencia el objeto contractual será ejecutada en el Municipio de Villamaría, Caldas, en las vías urbanas, en las siguientes nomenclaturas:

NOMENCLATURA	INICIO		FIN		
NOMBRE	LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD	LONGITUD (m)
carrera 1 entre calles 2 y 3	5° 2'59.98"N	75°30'51.93"O	5° 3'0.90"N	75°30'52.93"O	52.47
carrera 1A entre calles 2 y 3	5° 2'59.31"N	75°30'52.54"O	5° 3'0.27"N	75°30'53.59"O	45.84
calle 2 entre carreras 2 y 1a	5° 3'0.18"N	75°30'54.10"O	5° 2'59.88"N	75°30'54.50"O	7.46

Tabla 1 Ubicación vías a intervenir

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con



Imagen 1 Ubicación de los andenes a intervenir

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato SMC-034-2023:

DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.802.078 quien en calidad de Secretario de Planeación, cargo para el que fue delegado mediante acta de posesión N° 123 de 26 de septiembre de 2022 , facultado para contratar de conformidad con la delegación que le fue hecha por el señor Alcalde a través Decreto 151 del 04 de octubre de 2022, que para todos los efectos del presente contrato se denomina en adelante: EL MUNICIPIO, de acuerdo con los términos de la Invitación Pública SMC-034- 2023 Acepta la propuesta presentada por ESTRUCTURA Y GEOTECNIA S.A.S. que oferto por valor de $27.484.157 M/CTE, quien en este documento se denominará El CONTRATISTA, teniendo en cuenta que la presente comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. El contrato se regirá por lo dispuesto en las normas de contratación estatal vigentes, las condiciones de la invitación pública, de la oferta y en especial por las que se indican continuación:

OBJETO: El objeto del contrato es **"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA."**


CONTRATO	SMC-034-2023
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA
ALCANCE	EL CONTRASTISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A EJECUTAR, A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTAS Y CON SUS PROPIOS MEDIOS: MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLA EN SU PROPUESTA ECONOMICA.
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FEHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE UNICIO
FECHA DE INICIO	20 DE ABRIL DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA No. 1	-
FECHA DE TERMINACION PRÓRROGA No. 1	-
VALOR INICIAL:	$ 27.484.157
ADICION No. 1	-
VALOR TOTAL:	$ 27.484.157
CONTRATISTA	ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S. – NIT 901.609.827-8
SUPERVISOR	

Tabla 2. Información Contratista.

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

A continuación, se presentan las pólizas relacionadas al contrato de obra y a los contratistas correspondientes:

PÓLIZAS ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.:

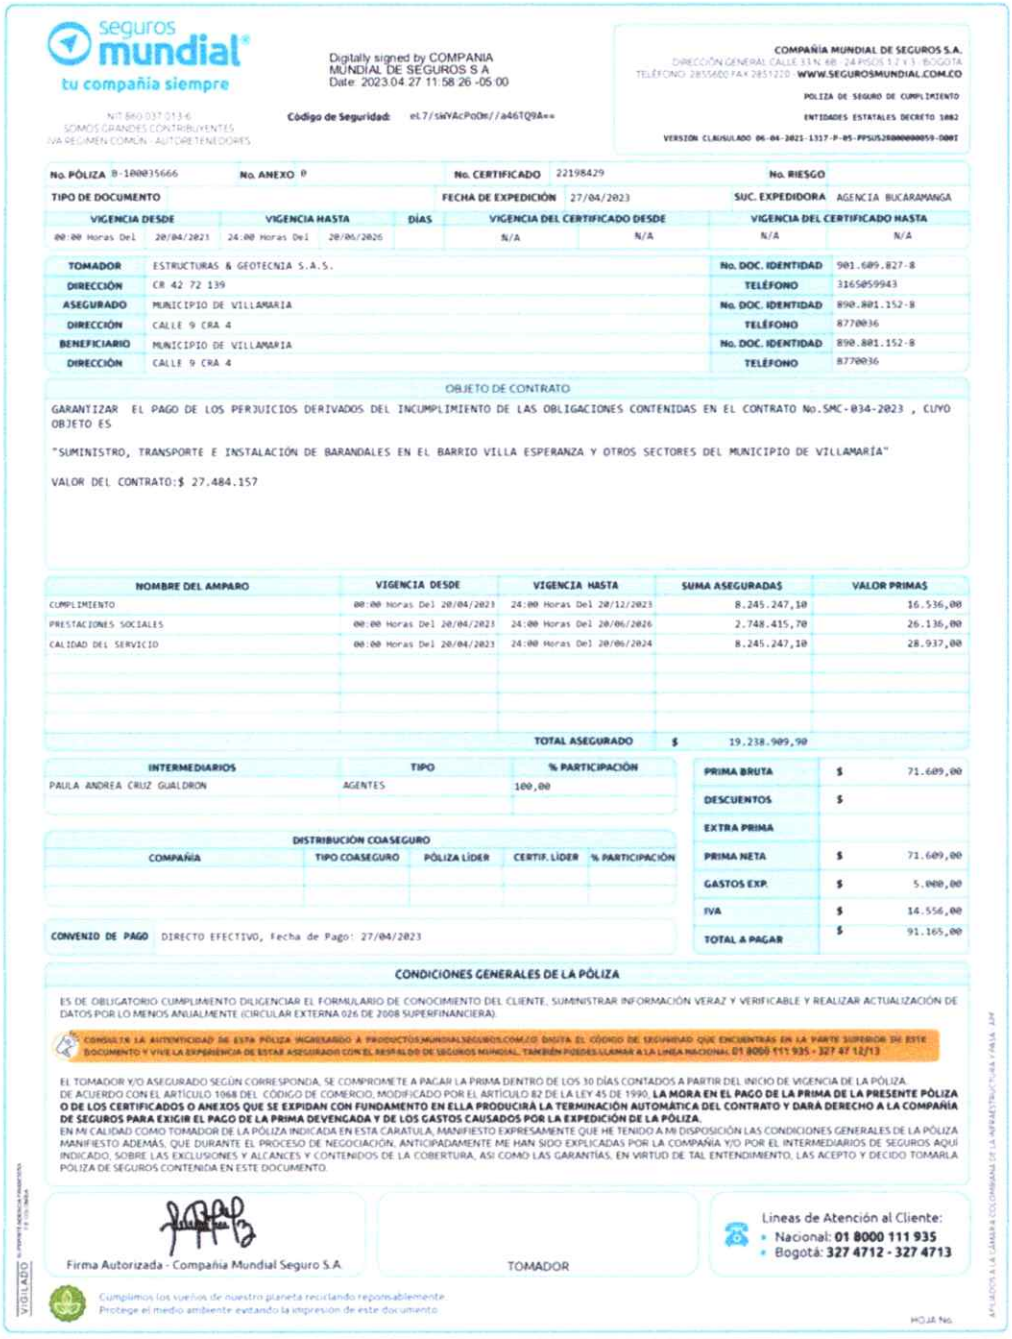

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.27 11:58:26 -05:00

Código de Seguridad: eL7/sWYAcPoOm//a46TQ9A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU520000000059-0001

No. PÓLIZA	B-100035666	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22198429	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/04/2023	24:00 Horas Del	20/06/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.827-8
DIRECCIÓN	CR 42 72 139	TELÉFONO	3165059943
ASEGURADO	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	No. DOC. IDENTIDAD	890.801.152-8
DIRECCIÓN	CALLE 9 CRA 4	TELÉFONO	8770036
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	No. DOC. IDENTIDAD	890.801.152-8
DIRECCIÓN	CALLE 9 CRA 4	TELÉFONO	8770036

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SMC-034-2023 , CUYO OBJETO ES

"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA"

VALOR DEL CONTRATO:$ 27.484.157

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 20/12/2023	8.245.247,10	16.536,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 20/06/2026	2.748.415,70	26.136,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/04/2023	24:00 Horas Del 20/06/2024	8.245.247,10	28.937,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 19.238.909,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	71.609,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	71.609,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	14.556,00
TOTAL A PAGAR	$	91.165,00

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM/CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARÁ EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**


VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PINA SAP

Se presenta a continuación certificado de pago de las pólizas anteriormente mencionadas por un valor de $91.165

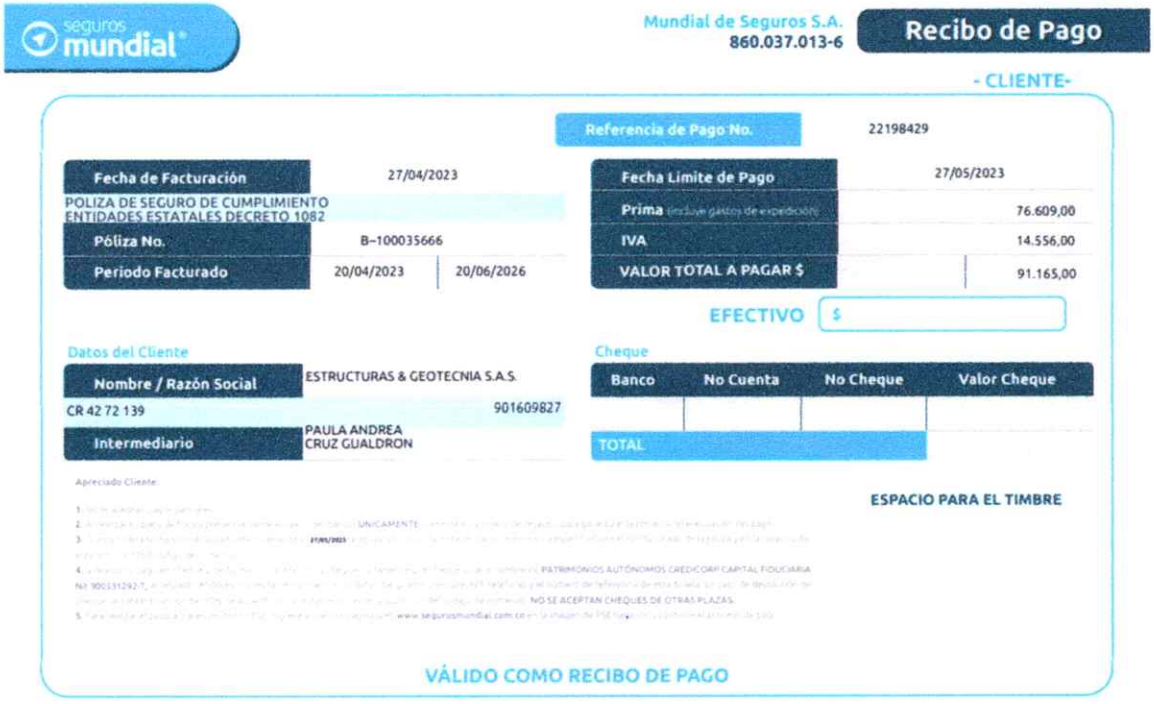

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22198429
Fecha de Facturación	27/04/2023
Fecha Limite de Pago	27/05/2023

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.	B-100035666	
Periodo Facturado	20/04/2023	20/06/2026

Prima (incluye gastos de expedición)	76.609,00
IVA	14.556,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	91.165,00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CR 42 72 139	901609827
Intermediario	PAULA ANDREA CRUZ GUALDRON

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.

www.segurosmundial.com.co

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

2.2. Frentes intervenidos durante el periodo:

Desde la firma del acta de inicio, firmada el día 20 de abril de 2023, hasta el 10 de junio se han intervenido las siguientes frentes dentro del contrato de obra:

FRENTE DE TRABAJO	UBICACION	Estado actual
1	carrera 1 entre calles 2 y 3	INTERVENIDO
2	carrera 1A entre calles 2 y 3	INTERVENIDO
3	calle 2 entre carreras 2 y 1a	INTERVENIDO

Tabla 3. Estado de intervención de los frentes de Obra.

2.3. Descripción de las actividades desarrolladas en cada frente de obra durante el periodo evaluado:

2.3.1. Carrera 1 entre calles 2 y 3



Imagen 2 Ubicación de la carrera 1 entre calles 2 y 3

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

Las actividades realizadas hasta la fecha en esta ubicación son.

- Perforación de anclaje
- Instalación de platina.
- Instalación de pernos expansivos.
- Instalación de concreto en el interior de la tubería.
- Instalación de parales verticales garantizando su verticalidad.
- Instalación hilo superior.
- Instalación hilo inferior.
- Instalación wash primer.
- Aplicación de dos manos de pinturas.
- Retiro de sobrantes.

2.3.2. Carrera 1A entre calles 2 y 3



Imagen 3 Ubicación de la carrera 1A entre calles 2 y 3

Las actividades realizadas hasta la fecha en esta ubicación son.

- Perforación de anclaje

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

- Instalación de platina.
- Instalación de pernos expansivos.
- Instalación de concreto en el interior de la tubería.
- Instalación de parales verticales garantizando su verticalidad.
- Instalación hilo superior.
- Instalación hilo inferior.
- Instalación wash primer.
- Aplicación de dos manos de pinturas.
- Retiro de sobrantes.

2.3.3. Calle 2 entre carreras 2 y 1A



Imagen 4 Ubicación de la calle 2 entre carreras 2 y 1A

Las actividades realizadas hasta la fecha en esta ubicación son.

- Perforación de anclaje

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

- Instalación de platina.
- Instalación de pernos expansivos.
- Instalación de concreto en el interior de la tubería.
- Instalación de parales verticales garantizando su verticalidad.
- Instalación hilo superior.
- Instalación hilo inferior.
- Instalación wash primer.
- Aplicación de dos manos de pinturas.
- Retiro de sobrantes.

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con



Imagen 5 Perforación del anclaje



Imagen 6 Instalación de la latina

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con



Imagen 7 Instalación del hilo superior



Imagen 8 Aplicación 2 mano de pintura

3. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Se cuenta con el siguiente personal en obra en todos los frentes:

- 1 oficial de obra.
- 2 ayudantes de obra.

4. MATERIALES UTILIZADOS

Dado que la naturaleza del contrato está basada en la construcción de una baranda con tubería de hierro galvanizado de 2" se utilizan materiales como:

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

Tubería de hierro galvanizado de 2", perno expansivos, platina de anclaje, concreto, soldadura, pintura, wash prime.

5. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS

Para las obras que se han desarrollado hasta el momento se relacionan los siguientes equipos y maquinaria

Equipos:

- Pulidora manual de 7".
- Taladro percutor
- Herramienta menor
- Equipo de soldadura

6. AVANCE DE OBRA.

6.1. AVANCE FISICO

Con corte a fecha del presente informe, de acuerdo con programación de obra presentada a la interventoría se tiene un avance de obra programado acumulado de 89.58%, frente a un ejecutado acumulado de 89.90%, lo que representa un adelanto en la ejecución de las obras de 0.32%.

Gráficamente se puede ver relacionado en tabla #4.

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	-1,61%
Durante el periodo	83,61%	82,00%	
Acumulado actual	83,61%	82,00%	

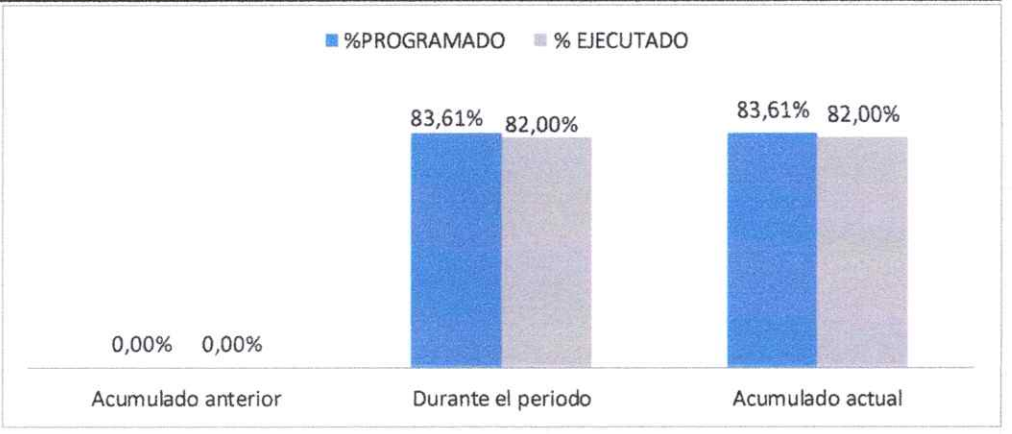


Tabla 4 Avance de obra Programado Vs Ejecutado

FRENTE DE TRABAJO	UBICACION	% Estado avance
1	carrera 1 entre calles 2 y 3	100%
2	carrera 1A entre calles 2 y 3	100%
3	calle 2 entre carreras 2 y 1a	100%

Tabla 5. Avance de obra por frente de trabajo.

6.2. AVANCE ECONOMICO

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

Se presenta a continuación de manera resumida el avance económico del contrato de obra programada Vs ejecutada.

AVANCE DEL CONTRATO					
	DEL PERIODO EVALUADO	ACUMULADO		DEL PERIODO EVALUADO	ACUMULADO
Obra programada	83,61%	83,61%	Obra Física Ejecutada (%)	82,00%	82,00% ####
Valor de la Obra	$ 22.978.557,49	$ 22.978.557,49	Valor de la Obra	$ 22.535.697,84	$ 22.535.697,84

Tabla 6 Avance económico de la obra

7. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Accidentes e incidentes laborales: Durante el período de febrero y marzo no se presentaron accidentes laborales.

Personal en obra: A continuación, se relaciona el personal que se encuentra vinculado actualmente a la obra con su respectivo cargo:

Cargo	Cantidad
Oficial de obra	1
Ayudantes de obra	2
TOTAL	**3**

Tabla 7. Registro de personal en obra.

Se anexa a continuación el listado del personal que actualmente labora en la obra.

No	NOMBRE	APELLIDO	CARGO	EMPRESA
1	ANDRES FERNANDO	MEJIA PELAEZ	Oficial de obra	ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

2	JHEISON	HERNANDEZ PEDROZA	Ayudante	ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
3	GUIDO ALVEIRO	RESTREPO ROLDAN	Ayudante	ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.

Tabla 8 Listado del personal en obra

8. Afiliaciones del personal al sistema integral en salud

El personal que se ha vinculado durante el periodo ha sido afiliado al Sistema integral de salud, (EPS, AFP, ARL) cumpliendo así con lo estipulado en decreto 1295 del 1994.

Se anexa copia de afiliación del personal al sistema integral de salud y la correspondiente planilla de pago. **Anexo 1**

9. ANEXOS

9.1. ANEXO 1: Afiliaciones de personal al sistema integral de salud y la correspondiente planilla de pago.

Cordialmente,

DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO
Representante Legal: ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.

ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
CARRERA 42 # 72 139 MANIZALES – CALDAS Cel: 316 5059943.
Estructurasygeotecniasas@gmail.con

	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAMARIA - CALDAS											CONTRATO No SMC 034-2023			
	CONTRATISTA : ESTRUCTURAS Y GEOTECNIAS SAS											SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION			
	INTERVENTORIA:											FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES			
	PLAZO DE EJECUCION: DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO											VALOR: $ 32.335.479			
	FECHA DE INICIO :20/04/2023											FECHA DE TERMINACION: 20/06/2023			
FECHA DE REPORTE	DIA	18	MES	JUNIO	AÑO	2023	OBJETO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA								
ACTA PARCIAL 01	OBRAS INICIALES CONTRATADAS				MODIFICACION DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	+	-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%	
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	129	$ 213,063.23	$27.485.157.00			151.7647	$32,335,479.00	105.77	22,535,674	105.77	22,535,674.00	69.69%	
				TOTAL (INCLUIDO AIU)	$ 27.485.157				$ 32.335.479		$ 22.535.674		$22.535.674	69.69%	

NOTA1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor del A.I.U

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%)

RESUMEN DEL CONTRATO:		
VALOR DEL CONTRATO		$ 27,485,157
ADICION 1		$ 4,850,322
VALOR ACTA 1	$ 22,535,674	
VALOR ACTA 2	$ -	
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 9,799,805	
SUMAS IGUALES	**$ 32,335,479**	**$ 32,335,479**

VALOR A PAGAR ACTA	VALOR	VALOR TOTAL A PAGAR EL	
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 22.535.674		Veintidós millones quinientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos, m cte.

DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA
SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

Daniel Felipe Vasquez G.

DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO
Representante Legal
ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SAS
NIT: 901.609.827-8

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA

ITEM:	1.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	UNIDAD:	ML

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
	calle 2 entre carreras 2 y 3a	1.41					7.46
		6.05					
		TOTAL ITEM:					7.46
OBSERVACIONES							

JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL
M.P 17202407297 CLD

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA

ITEM:	1.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	UNIDAD:	ML

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
	carrera 1 entre calles 2 y 3	2.14					52.47
		1.20					
		6.15					
		14.05					
		21.16					
		0.77					
		1.40					
		5.60					
		TOTAL ITEM:					52.47

OBSERVACIONES

FIRMA. DISEÑADOR

JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL
M.P 17202407297 CLD

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y

ITEM:	1.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS,	UNIDAD:	ML

DIAGRAMA:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
	carrera 1A en	1.00					45.84
		3.51					
		2.48					
		3.63					
		4.03					
		3.99					
		4.00					
		5.27					
		4.82					
		4.98					
		1.17					
		2.01					
		4.95					
OBSERVACIONES		TOTAL ITEM:					45.84

JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL
M.P 17202407297 CLD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 06296bb93a5cc6d2a673c51dfd68e05e533d3bd5c0b39e883832e6751a064a1415d7923adf2629594f0c4664957d3a31

Número de Factura: FE-21
Fecha de Emisión: 08/06/2023
Fecha de Vencimiento: 08/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
Nombre Comercial: ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901609827
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 42 72 139
Teléfono / Móvil: 3207282213
Correo: ESTRUCTURASYGEOTECNIASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CL 9 CR 4 ESQ
Teléfono / Móvil: 8 9 3 2 3 2 1
Correo: alcaldia@villamaria-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	cd	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 21.270.102,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.270.102,87
2	UT	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 1.063.505,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 202.065,98	19.00			$ 1.063.505,14

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Acta parcial 1 de SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARANDALES EN EL BARRIO VILLA ESPERANZA Y OTROS SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Contrato numero SMC-034-2023

Linea de negocio: Acta parcial 1

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-08 18:10:24
Documento generado el: 2023-06-08 18:10:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			22.333.608,01
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.333.608,01
IVA			202.065,98
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			202.065,98
Total neto factura (=)			22.535.673,99
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	22.535.673,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031642665 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-07-25

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.832.131**

VASQUEZ GIRALDO

APELLIDOS

DANIEL FELIPE

NOMBRES

Daniel Felipe Vasquez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-ENE-1994**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ENE-2012 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0900100-00369150-M-1053832131-20120404 **0029**616759A 2 37721223

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14836117493

(415)7707212489984(8020) 000001483611749 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 8 2 7	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 5 3 8 4 3 7 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	MEJIA	JUAN	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 8 3 2 1 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VASQUEZ	GIRALDO	DANIEL	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Manizales, 7 de Julio de 2022.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ESTRUCTURAS & GEOTECNIA SAS identificado(a) con NIT No. 901609827 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	37300001838	2022/07/07	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14836117493

(415)7707212489984(8020) 000001483611749 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 8 2 7	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1		0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESTRUCTURAS & GEOTECNIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 42 72 139

42. Correo electrónico ESTRUCTURASYGEOTECNIASAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 7 2 8 2 2 1 3	3 1 6 5 0 5 9 9 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 0 1	4 2 1 0	2 0 2 2 0 7 0 1		4 9 2 3	4 2 2 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 05 / 10 : 43: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE
985. Cargo REPRESENTANTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14836117493

(415)7707212489984(8020) 000001483611749 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 9 8 2 7	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria juridica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 2 2 3 6 3 4	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901609827	8	ESTRUCTURAS &GEOTECNIA S.A.S	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 42 72 139		3207282213		ESTRUCTURASYGEOTECNIASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26572552	E	2023-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.699.700	107.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	26572552	2023-05-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 10188599	MANJARRES PATIÑO JOSE VIDAL	1.160.000	F		X							0		5	5	5	5	PROTECCION-230201	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	193.334	7.800	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	66.100	S	5711205
2	CC 10246488	DIRALDO AGUIRRE GUSTAVO DE JESUS	1.160.000	F									0		0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	3	173.600	S	5411105
3	CC 18858760	RODRIGUEZ ESCOBAR ISMAEL JOSE	1.160.000	F	X								0		12	12	12	12	PROTECCION-230201	464.000	74.300	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	464.000	18.600	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	464.000	9.300	14.000	0	0	01	0	206.500	N	5431105
4	CC 70782269	VALENCIA FRANCO ALVARO HERNAN	1.160.000	F		X							0		5	5	5	5	COLPENSION-25-25-14	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	193.334	7.800	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5711205
5	CC 71330648	AGUIAR ARENAS GERMAN DARIO	1.160.000	F	X								0		16	16	16	16	COLFONDOS-231001	618.667	99.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	618.667	77.400	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	618.667	24.800	618.667	43.100	0,06960	618.667	12.400	18.600	0	0	01	0	275.300	N	5431105
6	CC 79603911	HERNANDEZ PEDROZA RODRIGO	1.160.000	F									0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411105
7	CC 1000188244	MONTES SEPULVEDA JHON JAIRO	1.160.000	F		X							0		5	5	5	5	PROTECCION-230201	193.334	31.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	193.334	7.800	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5711205
8	CC 1013653657	ARDILA JIMENEZ SEBASTIAN ANDRES	1.160.000	F		X							0		29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.121.334	179.500	0	0	SANITAS-EPS033	1.121.334	44.900	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5711205
9	CC 1038436486	ZAMBRANO MENESES DAIRO DE JESUS	1.160.000	F									0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411105
10	CC 1047969703	BARCO ESCOBAR JHON ANDERSON	1.160.000	F	X								0		14	14	14	14	PORVENIR-230301	541.334	86.700	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	541.334	21.700	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.800	S	5431105
11	CC 1047970520	MARTINEZ CARDONA ALEJANDRO	1.160.000	F	X								0		6	6	6	6	PORVENIR-230301	232.000	37.200	0	0	EPS SURA-EPS010	232.000	29.000	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	232.000	4.700	7.000	0	0	01	0	103.400	N	5431105
12	CC 1047970917	CARMONA VALENCIA JOHN FREDY	1.160.000	F	X								0		14	14	14	14	PROTECCION-230201	541.334	86.700	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	541.334	67.700	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	541.334	10.900	16.300	0	0	01	0	241.000	N	5431105
13	CC 1047972069	HERNANDEZ SANCHEZ CRISTIAN CAMILO	1.160.000	F	X								0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	193.334	24.200	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	193.334	1.900	5.900	0	0	01	0	86.300	N	5431105
14	CC 1047973539	OROZCO ALARCON JHAN CARLOS	1.160.000	F	X								0		5	5	5	5	PROTECCION-230201	193.334	31.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	193.334	24.200	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	193.334	3.900	5.900	0	0	01	0	86.300	N	5431105
15	CC 1066948167	MEJIA PELAEZ ANDRES FERNANDO	1.200.000	F									0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.200.000	48.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S	5411105
16	CC 1072751598	HERNANDEZ PEDROZA BIBESON	1.160.000	F									0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALC DANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711205
17	CC 1214725991	RESTREPO ROLDAN DUDO ALVEIRO	1.160.000	F		X							0		23	23	23	23	PROTECCION-230201	889.334	142.300	0	0	NUEVA E.P.S. 05A.-EPS037	889.334	35.600	CCF DE CALDAS-CCF11	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5411105

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901609827	8	ESTRUCTURAS &GEOTECNIA S.A.S	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 42 72 139		3207282213			ESTRUCTURASYGEOTECNIASAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26572552	E	2023-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.699.700	107.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	26572552		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.054.673	11.214.673	11.214.673	11.214.673	2.242.869

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	1.609.500	0	47.900	0	1.657.400
PROTECCION	230201	800229739	0	9	953.400	0	28.300	0	981.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	284.600	0	8.500	0	293.100
PORVENIR	230301	800224808	8	4	340.500	0	10.100	0	350.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	31.000	0	1.000	0	32.000
EPS(Administradoras: 6)				17	639.700	0	19.200	0	658.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	44.900	0	1.400	0	46.300
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	3	53.700	0	1.600	0	55.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	46.400	0	1.400	0	47.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	48.000	0	1.500	0	49.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	29.000	0	900	0	29.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	417.700	0	12.400	0	430.100
ARP(Administradoras: 1)				17	781.300	0	23.200	0	804.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	17	781.300	0	23.200	0	804.500
CCF(Administradoras: 2)				17	449.200	0	13.400	0	462.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	12	226.400	0	6.800	0	233.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	5	222.800	0	6.600	0	229.400
SENA(Administradoras: 1)				6	45.100	0	1.400	0	46.500
SENA	PASENA	899999034	1	6	45.100	0	1.400	0	46.500
ICBF(Administradoras: 1)				6	67.700	0	2.100	0	69.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	67.700	0	2.100	0	69.800
Gran Total					3.592.500	0	107.200	0	3.699.700


RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901609827	8	ESTRUCTURAS &GEOTECNIA S.A.S.	S	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 42 72 139		3207282213		ESTRUCTURASYGEOTECNIASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26734547	E	2023-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.968.900	21.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	26734547	2023-06-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRT	VST	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	LRE	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FMSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt.	Tipo Cot.			
1	CC 10246488	UBALDO AGUIRRE GUSTAVO DE JESUS	1.160.000		F												0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.160.000	46.400	1.160.000	80.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	3	173.600	S	5411105
2	CC 18858760	RODRIGUEZ ESCOBAR ISMAEL JOSE	1.160.000		F		X										0	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	4.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	4.900	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	38.667	800	1.200	0	0	01	0	17.400	N	5431105
3	CC 70782269	VALENCIA FRASCO ALVARO HERNAN	1.160.000		F	X	X										0	1	1	1	COLPENSION-ES-25-14	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5711205
4	CC 71330648	AGUIAR ARENAS GERMAN DARIO	1.160.000		F		X										0	22	22	22	COLFONDOS-231001	850.667	136.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	850.667	106.400	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	850.667	34.100	850.667	59.300	0,06960	850.667	17.100	25.600	0	0	01	0	378.700	N	5431105
5	CC 79005911	HERNANDEZ PEDROZA RODRIGO	1.160.000		F		X										0	30	30	30	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	386.667	15.500	CCF DE CALDAS-CCF11	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5411105
6	CC 1038436486	ZAMBRANO MENESES DARIO DE JESUS	1.160.000		F		X										0	3	3	3	COLFONDOS-231001	116.000	18.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.000	4.700	CCF DE CALDAS-CCF11	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	5411105
7	CC 1047965277	BLANDON MEJIA FRANKY HOYAN	1.160.000		F	X	X										0	14	14	14	PORVENIR-230301	541.334	86.700	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	541.334	21.700	CCF DE CALDAS-CCF11	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.800	S	5411105
8	CC 1047969432	ESCALANTE ISAZA WILSON FERNEY	1.160.000		F	X	X										0	3	3	3	PROTECCION-230201	116.000	18.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.000	14.500	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	116.000	2.400	3.500	0	0	01	0	51.800	N	5431105
9	CC 1047969703	BARCO ESCOBAR JHON ANDERSON	1.160.000		F												0	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.160.000	46.400	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5431105
10	CC 1047970520	MARTINEZ CARDONA ALEJANDRO	1.160.000		F		X										0	14	14	14	PORVENIR-230301	541.334	86.700	0	0	EPS SURA-EPS010	541.334	67.700	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	541.334	10.900	16.300	0	0	01	0	241.800	N	5431105
11	CC 1047970917	CARMONA VALENCIA JOHN FREDY	1.160.000		F		X										0	14	14	14	PROTECCION-230201	541.334	86.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	541.334	67.700	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	541.334	10.900	16.300	0	0	01	0	241.800	N	5431105
12	CC 1047972069	HERNANDEZ SANCHEZ CRISTIAN CAMILO	1.160.000		F		X										0	3	3	3	PORVENIR-230301	116.000	18.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.000	14.500	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	116.000	2.400	3.500	0	0	01	0	51.800	N	5431105
13	CC 1047973539	OROZCO ALARCON JHAN CARLOS	1.160.000		F		X										0	10	10	10	PROTECCION-230201	386.667	61.900	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	386.667	48.400	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	386.667	7.800	11.700	0	0	01	0	172.300	N	5431105
14	CC 1068648167	MEJIA PELAEZ ANDRES FERNANDO	1.200.000		F												0	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS005	1.200.000	48.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.200.000	48.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	371.600	S	5411105
15	CC 1072751598	HERNANDEZ PEDROZA BRESON	1.160.000		F												0	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCO DANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711205
16	PT 1123503	CORDERO QUIROZ PUBLIO ANTONIO	1.160.000		F	X	X										0	13	13	13	PORVENIR-230301	502.667	80.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	502.667	62.900	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	502.667	10.100	15.100	0	0	01	0	223.800	N	5411105

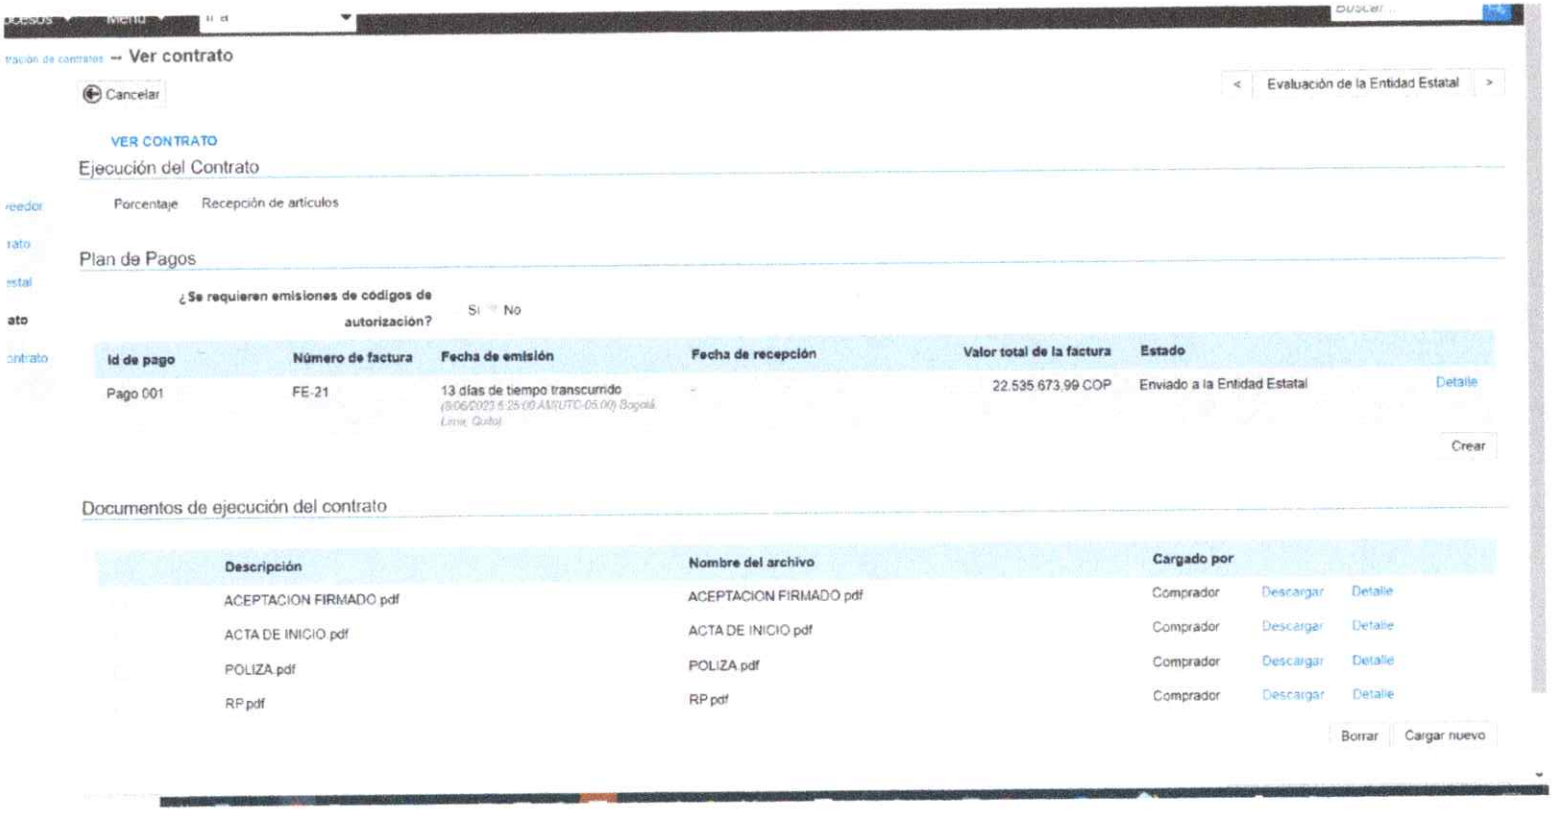
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
FE-21
13 días de tiempo transcurrido
22.535.673,99 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACEPTACION FIRMADO.pdf
ACEPTACION FIRMADO.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
ACTA DE INICIO.pdf
ACTA DE INICIO.pdf
POLIZA.pdf
POLIZA.pdf
RP.pdf
RP.pdf
Borrar
Cargar nuevo

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901609827	8	ESTRUCTURAS &GEOTECNIA S.A.S	0	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 42 72 139		3207282213		ESTRUCTURASYGEOTECNIASAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26734547	E	2023-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.998.900	21.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	26734547		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.696.004	8.856.004	8.856.004	8.856.004	3.093.336

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	1.232.000	0	8.800	0	1.240.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	6.200	0	100	0	6.300
PORVENIR	230301	800224808	8	6	520.000	0	3.700	0	523.700
PROTECCION	230201	800229739	0	6	551.000	0	3.900	0	554.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	154.800	0	1.100	0	155.900
EPS(Administradoras: 5)				16	617.700	0	4.600	0	622.300
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	3	116.500	0	900	0	117.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	67.700	0	500	0	68.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	15.500	0	200	0	15.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	48.000	0	400	0	48.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	370.000	0	2.600	0	372.600
ARP(Administradoras: 1)				16	617.100	0	4.400	0	621.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	617.100	0	4.400	0	621.500
CCF(Administradoras: 3)				16	354.900	0	2.600	0	357.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	5	136.300	0	1.000	0	137.300
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	2	24.900	0	200	0	25.100
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	9	193.700	0	1.400	0	195.100
SENA(Administradoras: 1)				8	62.400	0	500	0	62.900
SENA	PASENA	899999034	1	8	62.400	0	500	0	62.900
ICBF(Administradoras: 1)				8	93.200	0	700	0	93.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	8	93.200	0	700	0	93.900
Gran Total					2.977.300	0	21.600	0	2.998.900

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO identificado con **1.053.832.131 de Manizales** en mi condición de representante legal de **ESTRUCTURA Y GEOTECNIA S.A.S** identificada con NIT **901609827-8**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSE OTONIEL PINILLA ROMERO identificado 10.211.000, y con tarjeta profesional No. 2899T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **ESTRUCTURA Y GEOTECNIA S.A.S** identificada con NIT **)1609827-8** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas e auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 22 días del mes de junio de 2023.

Daniel Felipe Vasquez G.

DANIEL FELIPE VASQUEZ GIRALDO

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 2899-T

OTONIEL PINILLA ROMERO
C.C. 10.211.000 DE MANIZALES
CONTADOR



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

2899-T

OTONIEL
PINILLA ROMERO
C.C. 19.215.900
RESOLUCION INSCRIPCION 132-T FECHA 9-III-78
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
MATRICULA No. 2899-T

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.211.000

PINILLA ROMERO
APELLIDOS

JOSE OTONIEL
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1946
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-AGO-1968 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0900100-35112171-M-0010211000-20030923 0398S03265A 02 123875522

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
MATRICULA No. 2899-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E2958D8334E388D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10211000 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 2899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
