
Plan prospectivo y de internacionalización

Información del Contrato

Informe N°	Prorroga
Desde	7 de julio de 2023
Hasta	4 de noviembre de 2023
Número del Contrato	2006 del 01 de Julio de 2022
Fecha contractual de inicio:	07 de julio de 2022
Fecha contractual de terminación:	6 de julio de 2023
Tiempo transcurrido (semanas):	Prorroga de 120 dias

VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Avance Gráfico del Proyecto

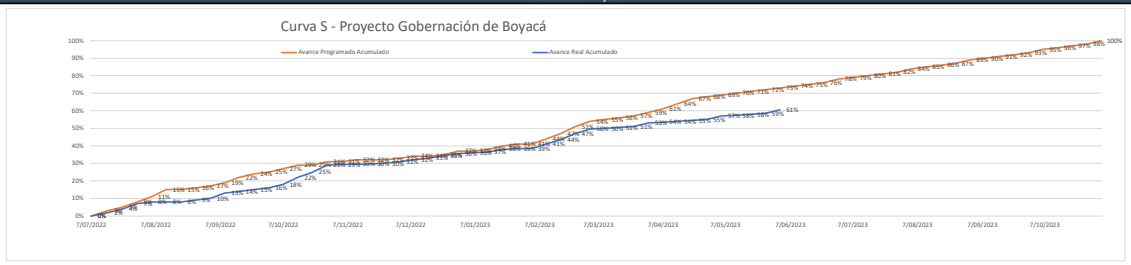

Actividades del proyecto atrasadas

EDT	ACTIVIDAD ATRASADA				CAUSAS DE ATRASO	

Actividades en Ejecución

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programado completado	% Real completado	Desviación
1	**CONSULTORÍA ESTRATÉGICA**	**344 días**	**jue 7/07/22**	**vie 3/11/23**	**61%**	**61%**	**0%**
1.1	**PRESUPUESTO_EJECUCIÓN**	**8 días**	**jue 7/07/22**	**lun 18/07/22**	**100%**	**100%**	0%
1.1.1	Elaboración Presupuesto inicial	3 días	jue 7/07/22	lun 11/07/22	100%	100%	0%
1.1.2	Revisión gerencia - Presupuesto	3 días	mar 12/07/22	jue 14/07/22	100%	100%	0%
1.1.3	Inclusión Observaciones gerencia	1 día	vie 15/07/22	vie 15/07/22	100%	100%	0%
1.1.4	Aprobación Presupuesto	1 día	lun 18/07/22	lun 18/07/22	100%	100%	0%
1.2	**ACTIVIDADES DE INICIO**	**13 días**	**jue 7/07/22**	**mar 26/07/22**	**100%**	**100%**	0%
1.2.1	Firma acta de inicio	0 días	jue 7/07/22	jue 7/07/22	100%	100%	0%
1.2.2	Reunión de inicio (presencial Gob. Boyacá)	2 días	mié 13/07/22	jue 14/07/22	100%	100%	0%
1.2.3	Conformación Comité Técnico	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22	100%	100%	0%
1.3	**ABASTECIMIENTO**	**12 días**	**lun 11/07/22**	**mié 27/07/22**	**100%**	**100%**	0%
1.3.1	Generación de TDR	6 días	lun 11/07/22	lun 18/07/22	100%	100%	0%
1.3.2	Solicitud de documentación	2 días	mar 19/07/22	jue 21/07/22	100%	100%	0%
1.3.3	Revisión y aprobación documentación	2 días	vie 22/07/22	lun 25/07/22	100%	100%	0%
1.3.4	Contratos	2 días	mar 26/07/22	mié 27/07/22	100%	100%	0%
1.4	**CONTRATACIÓN_PERSONAL**	**12 días**	**jue 28/07/22**	**vie 12/08/22**	**100%**	**100%**	0%
1.4.1	Solicitud de documentación a profesionales	5 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	100%	100%	0%
1.4.2	Revisión de documentos por parte de HSE	3 días	jue 4/08/22	lun 8/08/22	100%	100%	0%
1.4.3	Elaboración y firma de contratos	3 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22	100%	100%	0%
1.4.4	Inducción HSEQ para contratistas que ingresan a campo por parte de VEA	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22	100%	100%	0%
1.5	**FASE PLAN PROSPECTIVA**	**256 días**	**vie 15/07/22**	**jue 13/07/23**	**77%**	**77%**	0%
1.5.1	**Producto 1 - Estado del Arte**	**79 días**	**lun 8/08/22**	**mar 29/11/22**	**51%**	**51%**	0%
1.5.1.1	Recopilación información secundaria para identificar las condiciones económicas, sociales, ambientales, culturales, administrativas y políticas	15 días	lun 8/08/22	lun 29/08/22	100%	100%	0%
1.5.1.2	Identificación actores representativos (estado, sectores productivos, academia, sociedad civil)	10 días	mar 6/09/22	lun 19/09/22	100%	100%	0%
1.5.1.3	Elaboración y ajustes documento borrador	64 días	mar 30/08/22	lun 28/11/22	31%	31%	0%
1.5.1.4	Entrega Producto 1	0 días	mar 29/11/22	mar 29/11/22	100%	100%	0%
1.5.2	**Producto 2 -Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva**	**95 días**	**vie 15/07/22**	**mar 29/11/22**	**74%**	**74%**	0%
1.5.2.1	Recopilación información secundaria para identificar las tecnologías que pueden facilitar generación bienestar y prosperidad	20 días	vie 15/07/22	vie 12/08/22	100%	100%	0%
1.5.2.2	Identificación estrategias y focos de conocimiento que a través de CTeI potencialicen el derpartamento	20 días	vie 15/07/22	vie 12/08/22	100%	100%	0%
1.5.2.3	Identificación escalas de formación ciudadana - comunitaria acordes con potencialidades del territorio	10 días	lun 3/10/22	vie 14/10/22	100%	100%	0%
1.5.2.4	Elaboración y ajustes documento borrador	59 días	mar 6/09/22	lun 28/11/22	51%	51%	0%
1.5.2.5	Entrega Producto 2	1 día	mar 29/11/22	mar 29/11/22	100%	100%	0%
1.5.3	**Facturación 1_25%**	**1 día**	**vie 9/12/22**	**vie 9/12/22**	**100%**	**100%**	0%
1.5.3.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.2	Generación hoja de entrada	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.4	Generación factura	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.5	Radicación factura	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.4	**Producto 3 - Escenarios futuros de Boyacá 2040**	**136 días**	**lun 21/11/22**	**lun 29/05/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.4.1	Diseño serie de conversatorios para determinación escenarios y apuesta construcción del futuro Boyacá 2040, y definición estrategias	10 días	lun 21/11/22	vie 2/12/22	100%	100%	0%
1.5.4.2	Planeación Conversatorios 1 y 2 (convocatoria + logística)	30 días	lun 5/12/22	vie 13/01/23	100%	100%	0%
1.5.4.3	Realización Conversatorio 1 - Identificación Factores de Cambio	0 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	100%	100%	0%
1.5.4.4	Realización Conversatorio 2 - Priorización Factores de Cambio	0 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	100%	100%	0%
1.5.4.5	Planeación Conversatorio 3 (convocatoria + logística)	24 días	mié 18/01/23	lun 20/02/23	100%	100%	0%
1.5.4.6	Realización Conversatorio 3 - Focus Group con actores sociales	0 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23	100%	100%	0%
1.5.4.7	Planeación Conversatorios 4 y 5 (convocatoria expertos + logística)	26 días	mié 22/02/23	mié 29/03/23	100%	100%	0%
1.5.4.8	Realización Conversatorio 4 - Identificación Factores que Explican Modelo de Desarrollo	1 día	jue 30/03/23	jue 30/03/23	100%	100%	0%
1.5.4.9	Realización Conversatorio 5 - Escenarios y riesgos para Boyacá 2040	1 día	jue 30/03/23	jue 30/03/23	100%	100%	0%
1.5.4.10	Elaboración y ajuste documento borrador	41 días	vie 31/03/23	vie 26/05/23	100%	100%	0%
1.5.4.11	Entrega Producto 3	0 días	lun 29/05/23	lun 29/05/23	100%	100%	0%
1.5.5	**Facturación 2_25%**	**1 día**	**mar 16/05/23**	**mar 16/05/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.5.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.2	Generación hoja de entrada	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.4	Generación factura	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.5	Radicación factura	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.6	**Producto 4 - Resultados de conversatorios**	**58 días**	**jue 2/02/23**	**lun 24/04/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.6.1	Documentación conversatorios	41 días	jue 2/02/23	jue 30/03/23	100%	100%	0%
1.5.6.2	Elaboración y ajuste documento borrador	16 días	vie 31/03/23	vie 21/04/23	100%	100%	0%
1.5.6.3	Entrega Producto 4	0 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	100%	100%	0%
1.5.7	**Producto 5 - Documento Prospectivo**	**31 días**	**mié 31/05/23**	**jue 13/07/23**	**43%**	**43%**	0%
1.5.7.1	Diseño foro de divulgación	23 días	mié 31/05/23	vie 30/06/23	20%	20%	0%
1.5.7.2	Planeación Foro de divulgación (convocatoria y logística)	8 días	lun 3/07/23	mié 12/07/23	0%	0%	0%
1.5.7.3	Realización Foro de divulgación "Lectura de Boyacá con los lentes del futuro"	0 días	jue 13/07/23	jue 13/07/23	0%	0%	0%
1.5.7.4	Entrega Producto 5 - documento Prospectivo- "Informe de escenarios y estrategias" y	23 días	mié 31/05/23	vie 30/06/23	80%	80%	0%
1.6	**FASE PLAN INTERNACIONALIZACIÓN**	**90 días**	**lun 3/07/23**	**vie 3/11/23**	0%	0%	0%
1.6.1	**Tarea 1 - Mapa de ruta de transformación productiva**	**20 días**	**lun 3/07/23**	**lun 31/07/23**	**0%**	**0%**	0%
1.6.1.1	Tomar los insumos del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para construir en detalle un mapa de ruta de sofisticación de las actividades económicas motoras y estratégicas para Boyacá	5 días	lun 3/07/23	vie 7/07/23	**0%**	**0%**	0%
1.6.1.2	Identificación hitos clave que deben guiar la evolución del proceso de internacionalización	5 días	lun 3/07/23	vie 7/07/23	0%	0%	0%
1.6.1.3	Interacción con actores sociales	5 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	0%	0%	0%
1.6.1.4	Aplicación de índice de sofisticación de productos para un grupo selectivo de productos y/o servicios que hacen parte del mapa de ruta.	5 días	lun 17/07/23	vie 21/07/23	0%	0%	0%
1.6.1.5	Análisis socio cultural de Boyacá en el contexto internacional	10 días	lun 17/07/23	vie 28/07/23	0%	0%	0%
1.6.1.6	Entrega Informe 1	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	0%	0%	0%
1.6.2	**Facturación 3_25%**	**4 días**	**lun 31/07/23**	**jue 3/08/23**	0%	0%	0%
1.6.2.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	3 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23	**0%**	**0%**	0%
1.6.2.2	Generación hoja de entrada	1 día	lun 31/07/23	lun 31/07/23	0%	0%	0%
1.6.2.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	mar 1/08/23	mar 1/08/23	0%	0%	0%
1.6.2.4	Generación factura	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	0%	0%	0%
1.6.2.5	Radicación factura	1 día	jue 3/08/23	jue 3/08/23	0%	0%	0%
1.6.3	**Tarea 2 - Aliados y buenas prácticas internacionales**	**23 días**	**mar 1/08/23**	**jue 31/08/23**	0%	0%	0%
1.6.3.1	Identificar un conjunto clave de potenciales aliados para acceso a fuentes de financiación local e internacional	5 días	mar 1/08/23	lun 7/08/23	**0%**	**0%**	0%
1.6.3.2	Identificar un conjunto clave de IES, centros de I+D+i y en general instituciones locales e internacionales que producen conocimiento de frontera	5 días	mar 1/08/23	lun 7/08/23	0%	0%	0%
1.6.3.3	Identificar un conjunto clave de potenciales socios de negocios en relación al mapa de ruta elaborado en la tarea 1	5 días	mar 8/08/23	lun 14/08/23	0%	0%	0%
1.6.3.4	Elaborar una guia de recomendaciones de acceso con los conjuntos de actores identificados	12 días	mar 15/08/23	mié 30/08/23	0%	0%	0%


Semana	Programado	Ejecutado	Desviación	Observación
1	0%	0%	0%	
2	3%	2%	-1%	
3	5%	4%	-1%	
4	8%	7%	-1%	
5	11%	8%	-3%	
6	15%	8%	-7%	
7	15%	8%	-7%	
8	16%	9%	-7%	
9	17%	10%	-7%	
10	19%	13%	-6%	
11	**22%**	14%	-8%	
12	24%	15%	-9%	
13	25%	16%	-9%	
14	27%	18%	-9%	
15	29%	22%	-7%	
16	29%	25%	-4%	
17	31%	29%	-2%	
18	31%	29%	-2%	
19	32%	30%	-3%	
20	32%	30%	-2%	
21	32%	30%	-2%	
22	33%	31%	-2%	
23	34%	32%	-2%	
24	34%	33%	-1%	
25	35%	35%	-1%	
26	37%	36%	-2%	
27	37%	36%	-1%	
28	38%	37%	-2%	
29	40%	38%	-2%	
30	41%	39%	-3%	
31	41%	39%	-3%	
32	44%	41%	-3%	
33	47%	44%	-4%	
34	51%	47%	-4%	
35	54%	50%	-5%	
36	55%	50%	-5%	
37	56%	51%	-6%	
38	57%	51%	-6%	
39	59%	53%	-6%	
40	61%	54%	-8%	
41	64%	54%	-10%	
42	67%	55%	-13%	
43	68%	55%	-13%	
44	69%	57%	-12%	
45	70%	58%	-13%	
46	71%	58%	-13%	
47	72%	59%	-14%	
48	73%	61%	-13%	
49	74%			
50	75%			
51	76%			
52	78%			
53	79%			
54	80%			
55	81%			
56	82%			
57	84%			
58	85%			
59	86%			
60	87%			
61	89%			
62	90%			
63	91%			
64	92%			
65	93%			
66	95%			
67	96%			
68	97%			
69	98%			
70	100%			

Plan prospectivo y de internacionalización

Información del Contrato

Informe N°	Prorroga
Desde	7 de julio de 2023
Hasta	4 de noviembre de 2023
Número del Contrato	2006 del 01 de Julio de 2022
Fecha contractual de inicio:	07 de julio de 2022
Fecha contractual de terminación:	6 de julio de 2023
Tiempo transcurrido (semanas):	Prorroga de 120 dias

Avance Grafico del Proyecto

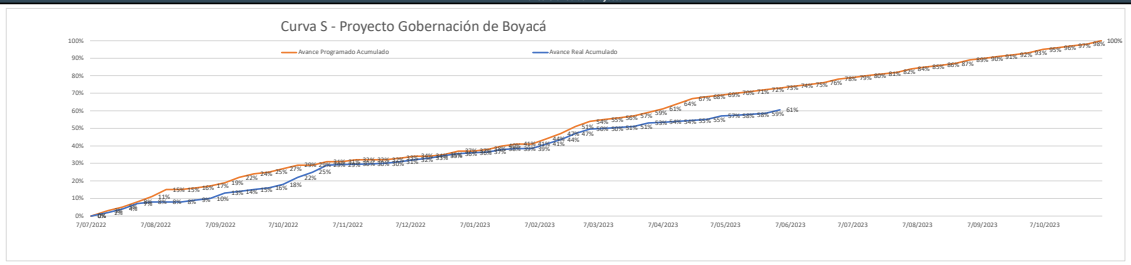

Actividades del proyecto atrasadas

EDT	ACTIVIDAD ATRASADA				CAUSAS DE ATRASO	

Actividades en Ejecución

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programado completado	% Real completado	Desviación
1.6.3.5	Entrega Informe 2	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	0%	0%	0%
1.6.4	**Tarea 3 - Estudio de mercado para diversificar oferta exportable**	**20 días**	**vie 1/09/23**	**vie 29/09/23**	**0%**	**0%**	0%
1.6.4.1	Elección de tres actividades económicas prioritarias entre motoras y estratégicas de las identificadas en el mapa de ruta elaborado en la tarea 1	3 días	vie 1/09/23	mar 5/09/23	0%	0%	0%
1.6.4.2	Análisis espacial-global que oriente proceso de desarrollo de capacidades empresariales que puedan dar forma o fortalecer las constitución de cluster de innovación para las tres actividades económicas priorizadas	8 días	mié 6/09/23	vie 15/09/23	0%	0%	0%
1.6.4.3	Identificar clústeres en el entorno global que pueden ser potenciales competidores para las tres actividades económicas prorizadas	8 días	mié 6/09/23	vie 15/09/23	0%	0%	0%
1.6.4.4	Interacción con la Secretaría de Desarrollo Empresarial	8 días	mié 6/09/23	vie 15/09/23	0%	0%	0%
1.6.4.5	Desarrollar una serie de estrategias para implementar en el programa "Boyacá Exporta"	9 días	lun 18/09/23	jue 28/09/23	0%	0%	0%
1.6.4.6	Entrega Informe 3	0 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	0%	0%	0%
1.6.5	**Tarea 4 - Proyectos prioritarios y de alto impacto para mejoramiento de competitividad de Boyacá**	**25 días**	**lun 2/10/23**	**vie 3/11/23**	0%	0%	0%
1.6.5.1	Elaboración de perfil de plan de acción en forma de mapa de ruta para las tres actividades económicas priorizadas	10 días	lun 2/10/23	vie 13/10/23	**0%**	**0%**	0%
1.6.5.2	Elaboración de perfil de proyectos que guíen la puesta en marcha del plan de acción	10 días	lun 2/10/23	vie 13/10/23	0%	0%	0%
1.6.5.3	Proceso de agregación de capacidades institucionales al mapa elaborado en la tarea 1	9 días	lun 16/10/23	jue 26/10/23	0%	0%	0%
1.6.5.4	Analizar las principales ventajas para el departamento al adherirse a organizaciones de cooperación internacional e identificar proyectos de alto impacto que puedan ser apoyados por estas organizaciones	9 días	lun 16/10/23	jue 26/10/23	0%	0%	0%
1.6.5.5	Entrega Documento Final	0 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	0%	0%	0%
1.6.5.6	Ajustes Documento Final	5 días	lun 30/10/23	vie 3/11/23	0%	0%	0%
2	**COMITÉ TÉCNICO**	**314 días**	**mar 16/08/22**	**mar 31/10/23**	0%	0%	0%
2.1	Reunión 1 - Apertura	0 días	mar 16/08/22	mar 16/08/22	100%	100%	0%
2.2	Reunión 2 - Seguimiento avance	0 días	mié 9/11/22	mié 9/11/22	100%	100%	0%
2.3	Reunión 3 - Seguimiento avance	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	100%	100%	0%
2.4	Reunión 4 - Seguimiento avance	0 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	0%	0%	0%
2.5	Reunión 5 - Seguimiento avance	0 días	mar 5/09/23	mar 5/09/23	0%	0%	0%
2.6	Reunión 6 - Balance actividades y productos	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	0%	0%	0%
3	**FINALIZACIÓN CONSULTORÍA**	**14 días**	**lun 6/11/23**	**jue 23/11/23**	0%	0%	0%
3.1	Formalización terminación actividades	0 días	lun 6/11/23	lun 6/11/23	**0%**	**0%**	0%
3.2	Trámite liquidación contrato	10 días	lun 6/11/23	vie 17/11/23	0%	0%	0%
3.3	**Facturación 4_25%**	**3 días**	**mar 21/11/23**	**jue 23/11/23**	0%	0%	0%
3.3.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	3 días	mar 21/11/23	jue 23/11/23	**0%**	**0%**	0%
3.3.2	Generación hoja de entrada	2 días	mar 21/11/23	mié 22/11/23	0%	0%	0%
3.3.3	Aprobación hoja de entrada	3 días	mar 21/11/23	jue 23/11/23	0%	0%	0%
3.3.4	Generación factura	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	0%	0%	0%
3.3.5	Radicación factura	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	0%	0%	0%

Semana	Programado	Ejecutado	Desviación	Observación
