Tipo de visita	En fase de ejecución x En fase de cierre	
Fecha de informe 28-06-2023	**Fecha de inicio de visita:** 23-05-2023	**Fecha de terminación de la visita:** 24-05-2023
No. Banco de Proyectos: 3125	**No. Resolución:** 351	**Fecha de resolución** 11-10-2021
Nombre del proyecto: Mejorar las capacidades productivas de los pequeños y medianos ganaderos de los municipios de Villanueva y santa rosa de lima Nte de Bolívar pertenecientes (ANUC)		
Ubicación del Proyecto: Municipio de Villanueva-Bolívar.	FINCA CASCAJAL.	

RESULTADO DE LA VISITA

ITEM	DESCRIPCIÓN
Avance POA	Proyecto en mención se está ejecutando de forma directa, la notificación del acto administrativo fue el 12 de Octubre del 2021, la apertura del encargo fiduciario se realizó el 12/11/2021. El proyecto fue socializado el día 29/10/2021, su acta de inicio se llevó a cabo el día 21/ de Febrero del 2022. **Avance Financiero** El porcentaje de avance financiero del proyecto a la fecha es del 80% **Avance Técnico** El porcentaje de avance técnico del proyecto a la fecha es de 75% Se adjunta el POA actualizado a la fecha de la presente visita.
Modificaciones del Proyecto	Para el periodo reportado, verificando los documentos que se encuentran en el módulo de gestión, no se presentaron modificaciones al Plan Operativo de Inversión del proyecto, dando cumplimiento a los objetivos, alcances, cronograma, impactos, indicadores, productos y el valor de las contrapartidas y cofinanciación estipuladas en el marco lógico y el Modelo Técnico Financiero (MTF) del PIDAR 351 11 de Octubre de 2021.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Indicadores del Proyecto

Indicadores del proyecto	Avance %	Análisis
Pie de cría mejora genéticamente: 115 novillas Girolandas.	13%	Los beneficiarios del proyecto recibieron 115 novillas. traves de este lote de novillas , aun se hubiese incrementado el número de reses paridas y solo se ha logrado un 13%, afectadas probablemente por condiciones climáticas , especialmente el verano prolongado, ha afectado en el consumo de alimento, la cantidad y calidad de leche producida ,y tener efectos negativos en la reproducción, también en el fallecimiento de 33 reses, hasta la fecha de visita de seguimiento y control, los cuales se desconocen los diagnósticos de fallecimiento, se está a la espera de visita por parte de los profesionales veterinarios de la VIP que está programada a partir del 4 de julio y .
Material genético padres machos: Dos (2) toros BRAHMAN	100%.	Se recibieron, por parte de la organización, los dos semovientes. Se ha presentado mortalidad de un semoviente a la fecha.

Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Visita a Predios

Resumen General:

Del 23 al 24 de mayo de 2023 se realiza visita de seguimiento para la verificación de las actividades del PIDAR 351. La visita inició con una reunión de apertura, en la que no participó la tesorera de la asociación y 13, de los 118 beneficiarias que equivale al 11% del total de beneficiarios del proyecto de la asociación ANUC de Villa Nueva.

La asociación cuenta con predio para desarrollar el proyecto; sin embargo, actualmente la unidad productiva se encuentra en un lote diferente al especificado por la organización en el marco lógico. Esta situación no ha sido informada por escrito por parte del representante legal. Lo anterior, dado que después de recibir el lote de novillas, el predio sufrió inundación por el fuerte invierno y tuvieron que trasladar los semovientes a diferentes predios y posteriormente al predio actual .

Los beneficiarios expresaron haber recibido insumos agrícolas y veterinario, herramientas, maquinaria semilla de maíz, capacitaciones, pero algunos equipos no se les ha dado uso, tampoco se ha establecido cerca eléctrica porque el lote solo está en arriendo por un año, se está buscando una estabilidad en arriendo mayor a 5 años para poder organizar el terreno con las características que se requiere para continuar con la ejecución del proyecto y evaluar los índices del marco lógico establecidos en el proyecto.

Resumen Detallado:

No.	Beneficiario	Resumen de la Visita
1	Arnett Vargas Cawadias	Beneficiario hace parte de la asociación ANUC Villanueva, expreso que recibieron 115 novillas y 2 toros, recibieron insumos agropecuario, herramientas, maquinaria para uso agrícola, los materiales para instalación de cerca eléctrica, insumos para uso veterinario. Este proyecto desde su ejecución se ha afectado 1ro por el fuerte invierno, obligando al cambio de terreno sin informar a la agencia de desarrollo Rural, y 2do por

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			las condiciones climáticas del entorno principalmente el fuerte verano, afectando el sistema nutricional de las novillas lo que ha ocasionado la muerte de 33 novillas y un toro, hasta la fecha esta muerte se ha incrementado sin saber las causas sin embargo la asociación ha invertido recursos propios para la compra de pasto y caña para alimentación diaria. Se socializo BPG y lecciones aprendidas. Solicita la presencia de un profesional médico veterinario y capacitación a través del SENA para los beneficiarios.
	2	Ines Ortega Vega	Beneficiaria que hace parte de la asociación, es la encargada de cuido de las novillas y el toro, en la finca cascajal con su esposo; manifestó con gran preocupación el fallecimiento de las reses sin tener conocimiento lo que las ha afectado; igualmente manifiesta preocupación frente al incumplimiento de la mano de obra especificada en contrapartida por parte de los beneficiarios y que, a pesar de que se realizaron grupos por semana, siguen incumpliendo en la ejecución de la misma. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	3	Georgina Molina Murieles.	Actualmente es beneficiaria de la asociación, asignaron el cargo de tesorera a partir del mes de febrero, está preocupada por la alimentación de las novillas y la falta de compromiso de los miembros de la asociación para la ejecución de labores asignada en contrapartida. De igual forma, manifiesta preocupación

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			porque frente a la comprar de pasto y la inestabilidad del tiempo de arriendo del lote de ejecución del proyecto. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	4	Roberto Cabeza Ortega.	El sr expresa que hace parte de la asociación ANUC Villanueva, y del equipo de ejecución de mano de obra los días martes, que recibieron 115 novillas y 2 toros, insumos agrícolas, de uso veterinario, herramientas, materiales para la construcción de cerca eléctrica y lotear el terreno donde se desarrolla la unidad productiva, Manifiesta preocupación por el sistema de alimentación de las reses y el estado físico y sanitario de las mismas que, aunque se les compra el pasto y silo, se observan algunas muy mal aspecto. Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	5	Juan Manuel Pedroza.	El beneficiario sigue en la asociación, le preocupa la falta de compromiso de algunos beneficiarios ausentes para el desarrollo de la contrapartida y la inestabilidad del arriendo del lote para el desarrollo de la misma. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	6	Edinson Puerta Martinez	El beneficiario expresa que hace parte de la asociación, y del equipo asignado los martes para ejecución de contrapartida, preocupado por la alimentación de las reses y el aspecto físico de las misma; aunque ellos compran pasto y silo, esto no es suficiente para abastecer el sistema nutricional que las reses requiere De igual forma, manifiesta que ha faltado valoración del médico veterinario para seguimiento de las misma.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	7	Francisco Mercado V	El sr expresa que hace parte de la asociación ANUC Villanueva, No se ha podido establecer las especies asignadas para el banco de proteína por el fuerte verano, preocupado por el aspecto físico de las reses y la afectación sanitaria de las misma, solicita la presencia del médico veterinario para evaluación y seguimiento de las mismas. Socialización BPG y lecciones aprendidas.
	8	Clemente Julio Cabeza.	Manifiesta que hace parte de la asociación, que recibieron lote de 115 novillas y 2 toros , insumos agrícolas, de uso veterinario, herramientas y maquinaria y utensilios veterinario, que algunos están en uso y otros no porque la ejecución del proyecto se ha afectado por el fuerte verano y el tiempo de arriendo del lote no le permite el desarrollo del mismo. Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	9	Fredy Cabeza Marimon.	Hace parte de la asociación de ANUC Villanueva, comprometido con el desarrollo de la labor de contrapartida escrita en el marco lógico; preocupado por el aspecto físico, alimentación y sanidad de las novillas, y el poco tiempo de arriendo del lote para desarrollar el proyecto. Socialice BPG, lecciones aprendidas.
	10	Carlos Enrique Torres Muñoz.	Beneficiario hace parte de la asociación ANUC Villanueva, comprometido con el desarrollo de la labor de contrapartida escrita en el marco lógico. Manifiesta igualmente preocupación por la falta de compromiso de algunos beneficiario

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			para el desarrollo de la contrapartida. Preocupado por el aspecto físico, alimentación y sanidad de las novillas, y el poco tiempo de arriendo del lote para desarrollar el proyecto, la muerte de algunas novillas y un toro y porque no hay un diagnostico especifico. Socialice BPG, lecciones aprendidas.
	11	Galo Medina Pérez.	Beneficiario hace parte de la asociación ANUC Villanueva, está comprometido con su apoyo en la ejecución de mano de obra especificada en contrapartida, ayuda en la mecanización del terreno, pero le preocupa el aspecto físico de las reses y el poco tiempo de arriendo del terreno para la siembra de especies para establecer el banco de proteína para aportar al sistema nutricional de las reses, Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	12	Sol Cawadias Vargas	Sra beneficiaria hace parte de la asociación Anuc Villanueva, hace parte del grupo asignado para ejecución de mano de obra del proyecto, preocupada por el sistema de alimentación, sanidad y aspecto físico de las reses, el tiempo de arriendo del lote para el desarrollo de las especies del banco de proteína; igualmente por la falta de compromiso de algunos beneficiario en la ejecución de mano de obra, falta de conocimiento en prácticas ganaderas de beneficiarios. Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	13	Antonio Cabeza Parra	Sr beneficiario manifiesta hacer parte de la asociación Anuc Villanueva, comprometido con la ejecución de la

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			mano de obra especificada en contrapartida, le preocupa el fuerte verano del municipio, la alimentación, el estado de sanidad de la reses y el tiempo de arriendo del lote para desarrollar un banco de proteína y la falta de compromiso y de conocimientos en prácticas ganaderas de algunos beneficiarios .
	14	Francia Vivanco	Representante Legal de la Asociación ANUC Villanueva, expreso calamidad de salud de un familiar, me dejo encargada con un esposo de otra beneficiario y posteriormente me contacte con la tesorera de la asociación, logrando el desplazamiento hacia el sitio donde se desarrolla el proyecto y poder ejecutar la labor de seguimiento, monitoreo y control .

Sistema de Alertas

El proyecto no cuenta con alertas abiertas y cerradas.

Situaciones de amenaza o alerta identificadas durante la visita:

Al realizar el presente informe se identifica 33 reses y un toro fallecido y se observa que el aspecto físico, nutricional y sanitario del lote de novillas no está en buenas condiciones.

No.	Acción preventiva o correctiva	Descripción
1	Acción preventiva	Convocar a una mesa de respuesta rápida a los profesional de Área de seguimiento y control, directora de UTT2, Representante de célula, apoyo de seguimiento y control para hacer diagnóstico y seguimiento del fallecimiento de las reses y el aspecto físico de las mismas.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Lecciones aprendidas

Para la visita ejecutada se reporta lecciones aprendidas.

Lecciones aprendidas:

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de estructuración
1	Durante el proceso de estructuración, se recomienda verificar previamente el lote de ejecución del proyecto y las condiciones del entorno que puedan afectar al mismo, vías y condiciones climáticas.
2	Durante el proceso de estructuración, se recomienda analizar previamente el conocimiento de los beneficiarios, de acuerdo a la línea productiva que se va desarrollar en el proyecto, y/o capacitación y/o asesoría para la correcta ejecución de esta.

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación
1	Los profesionales contratados evalúen los conocimientos previos de los beneficiarios de acuerdo al área de desarrollo del proyecto y puedan capacitarlos aumentando sus conocimientos y ponerlos en práctica durante la ejecución del mismo.
2	Verificar las condiciones del lote antes de la entrega de los semovientes para la ejecución del proyecto y el sistema de alimentación de los mismo.
3	Dejar carpeta de actas con la entrega del estado nutricional, estado físico y sanidad de los semovientes entregados.
4	Verificar que el lote si es en arriendo, el tiempo de arriendo sea suficiente para el desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto.
5	La asociación debe reportar cada dos meses el avance de ejecución de contrapartida.

Transferencia de conocimiento

Temas tratados en la transferencia de conocimiento: Temas tratados en la transferencia de conocimiento: Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas Ganaderas. Se transfiere conocimiento a los beneficiarios basados en las lecciones aprendidas y buenas prácticas adquiridas por la dirección de Seguimiento y control en el ejercicio de la misionalidad. Se transfirió el conocimiento basado en que

Con formato: Normal

Cuando las organizaciones beneficiarias se empoderan y conocen detalladamente los proyectos, aumentan la posibilidad de cumplir los objetivos y generar un impacto positivo en la población beneficiaria y la comunidad. La adecuada y frecuente comunicación entre los representantes de las organizaciones y los beneficiarios genera una correcta retroalimentación que facilita el mejor desarrollo de las actividades a lo largo de la vida del proyecto.
Buenas Practicas Ganaderas: Aislar animales que presenten enfermedad.
Buenas Prácticas Ganaderas: llevar registro de información por cada animal.
Buenas Prácticas Ganadera: Debe existir un suministro continuo suficiente de agua de bebida.

No.	Beneficiario
1	Arnett Vargas Cawadias.
2	Ines Ortega Vega.
3	Georgina Molina Murieses.
4	Roberto Cabeza Ortega.
5	Juan Manuel Pedroza
6	Edison Puerta Martines.
7	Francisco Mercado V
8	Clemente Julio Cabeza
9	Fredi Cabeza Marimon
10	Carlos Enrique Torres Muñoz
11	Galo Medina Pérez
12	Sol Cawadias Vargas
13	Antonio Cabeza Parra

Se adjunta el acta de visita al predio con firma del beneficiario y soporte fotográfico.

A 13 beneficiarios se les realizó transferencia de conocimiento de manera directa grupal, mediante reunión con la organización beneficiaria: ANUC Villanueva-Bolívar. Se adjunta la lista de asistencia y registro fotográfico.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Recomendaciones

Recomendaciones para la ejecución del proyecto.

Recomendación	Plazo de ejecución
Solicitar a través de la UMATA formación SENA en administración ganadera.	24-05-mayo-2023
Hacer seguimiento de ejecución en mano de obra contrapartida y reporte del avance.	30- Mayo-2023.
Hacer seguimiento del estado físico-nutricional y sanitario de las novillas.	26-05-2023.
Diligenciar formatos de seguimiento a cada novilla y segmentar de acuerdo a la necesidad.	25-05-2023
Hacer siembra de cultivo de maíz para la preparación de silo , utilizar alimentación para época de verano.	30-05-2023.

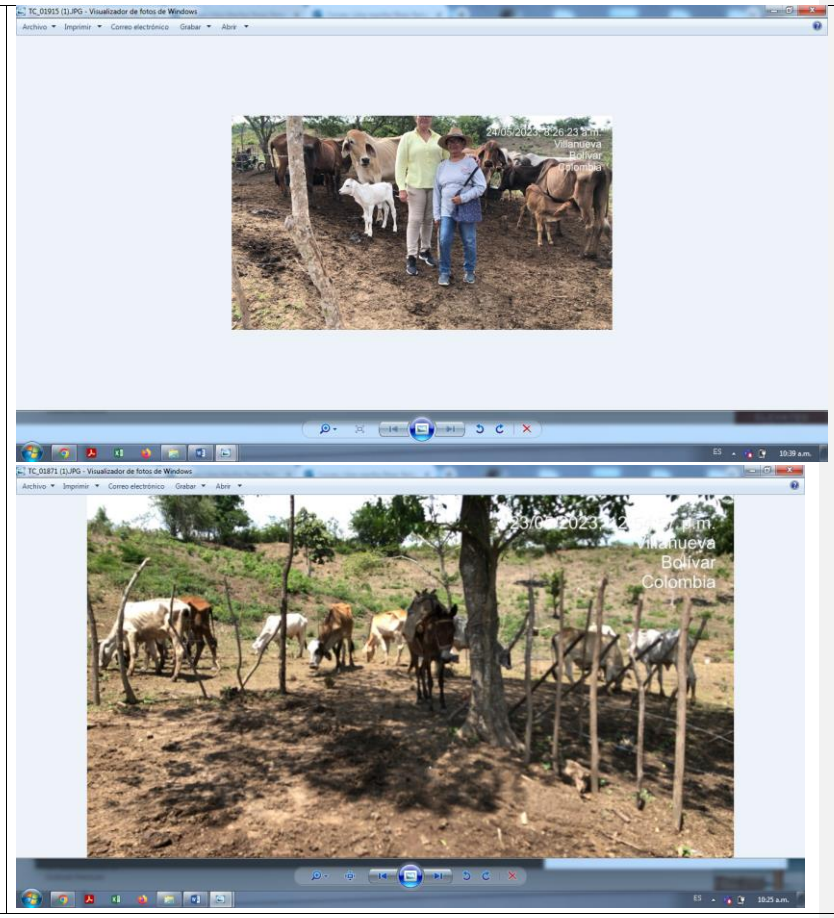
Registro Fotográfico


Imagen No.1: Representante legal de la asociación ANUC Villanueva -Bolivar -Francia Vivanco.23/05/2023.



Beneficiario Anuc Villanueva Pidar Res 351-23/05/2023.


TC_01884 (2).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo
Imprimir
Correo electrónico
Grabar
Abrir
p.m.
Villanueva
Bolívar
Colombia
10:41 a.m.


TC_01915 (1).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
24/05/2023 8:26:23 a.m.
Villanueva
Bolívar
Colombia
TC_01871 (1).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
Villanueva
Bolívar
Colombia

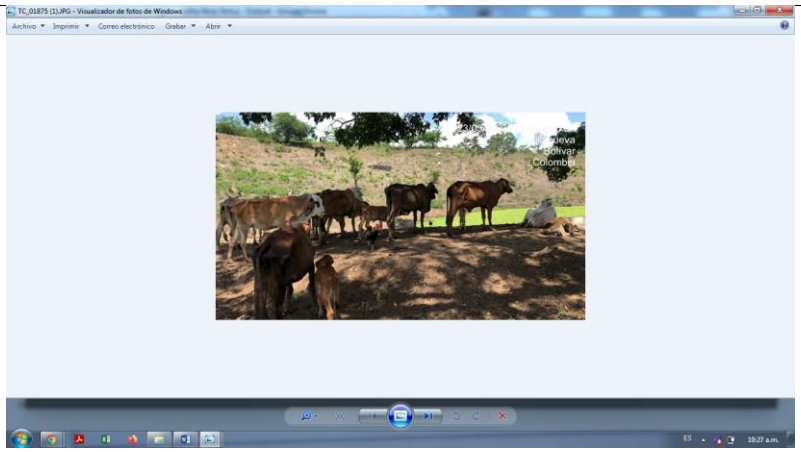

Elaboró: Libia Pérez Pertuz Apoyo Operativo Territorial UTT2.
Libia Pérez Pertuz Utt2 Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos
Revisó:
Firma **NOMBRE DEL PROFESIONAL** Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos

https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F351%2F1%2E%20CAPSULA&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F351%2F2%2E%20EJECUCIONEJECUCION&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F35

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada
