Tipo de visita	En fase de ejecución ☒ En fase de cierre ☐	
Fecha de informe 25-06-2023	**Fecha de inicio de visita: 25-05-2023**	**Fecha de terminación de la visita:** 26-05-2023
No. Banco de Proyectos: 3003	**No. Resolución: 245**	**Fecha de resolución 31-05-2022.**
Nombre del proyecto: Implementar un sistema productivo de ganadería doble propósito como actividad económica principal de 64 pequeños y medianos ganaderos víctima del conflicto armado, pertenecientes a la asociación de productores agrícolas de macayepo 19V asopram.		
Ubicación del Proyecto: Municipio del Carmen de Bolivar.	**Corregimiento de Macayepo.**	

RESULTADO DE LA VISITA

ITEM	DESCRIPCIÓN
Avance POA	Proyecto se esta ejecutando de forma directa, la notificación del acto administrativo fue el 2 de junio del 2022,la apertura del encargo fiduciario se realizó el 28/06/2022,el cual fue suspendido el 1ro de julio /2022 por solicitud del representante legal de la asociación. El proyecto fue socializado y acta de inicio se llevo acabo el día 16 de Junio DEL 2022. Avance Financiero 84% **Avance Técnico**: 62 % Se adjunta el POA actualizado a la fecha de la presente visita.
Modificaciones del Proyecto	El proyecto no ha presentado ninguna modificación durante su ejecución. Para el periodo reportado, verificando los documentos que se encuentran en el módulo de gestión. .

ÍTEM	PLANEADO	MODIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Indicadores del Proyecto</td><td>
En el marco lógico encontramos los indicadores del proyecto, no se han podido evaluar porque las condiciones climáticas han afectado para la evaluación de los mismos y el sistema de alimentación, actualmente hasta la fecha de visita el proyecto se está ejecutando en predios diferentes al especificado en el marco lógico, lo que influye en el seguimiento de los indicadores.
<table>
<tr><th>Indicadores del proyecto</th><th>Avance %</th><th>Análisis</th></tr>
<tr><td>64 novillas preñadas (doble propósito) para la asociación de productores agropecuarios de Macayepo 19-V ASOPRAM</td><td>30/64 paridas hay unas en estado de preñez y otras que se supone pudieron abortar.</td><td>Aun han pasado 7 meses de la entrega de las novillas , aun se hubiese incrementado el número de reses paridas pero las condiciones del verano ha afectado en el consumo de alimento, la cantidad y calidad de leche producida ,y tener efectos negativos en la reproducción.</td></tr>
<tr><td>5 hectáreas de pasto de corte y 65 hectáreas sembradas y establecidas con pasto para recuperación y revitalización de potreros.</td><td>3/5 hectárea de pasto de corte= 60% 15/65= 23 %sembradas con pasto para recuperación de potreros.</td><td>La falta de trabajo en equipo de algunos beneficiario y las condiciones de verano ha afectado la falta de organización del lote, afectando la germinación de la semilla pasto sembrada.</td></tr>
<tr><td>240 días de lactancia</td><td>No Aplica</td><td>Este indicador no se ha podido evaluar</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	o 5 litros/vaca/día para el primer año a 7 y 9 litros/vaca/día para el décimo año		**porque la mayoría de las novillas no se hace ordeño,para poder criar al ternero con pura leche mientras llegaba el invierno y su estomago podía adaptarse al medio de alimentación.**
	Peso al destete 150 kilogramos.	**No Aplica**	**Este indicador no se ha evaluado por las condiciones climáticas del entorno y la falta de seguimiento de los beneficiarios por desconocimiento de los mismos, alimentación no adecuada para el tipo de producción.**
	Precio litro de leche caliente de $1200 por la venta directa al acopiador teniendo en cuenta el manejo en buenas prácticas ganaderas y la concentración de solidos totales del producto.	**No Aplica**	**No se ha evaluado este indicador por la falta de producción de leche y la falta de conocimiento de seguimientos de este parámetro.**
	Ingresos diarios promedios de: $8.400	**No Aplica**	**Este parámetro no se ha evaluado por falta de producción de leche.**
		No Aplica	**Este parámetro no se ha evaluado por la**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	6 litros/leche/día en el primer año y de 9 litros/leche/vaca/para el séptimo año y decimo.		**falta de producción de leche que se ha afectado por condiciones climáticas, cambio de predio, todo esto afectado el sistema de alimentación de las novillas y por ende su producción, se establece compromiso para seguimiento de los parámetros establecidos, ya que en estos momento hay lluvias, cambiado las condiciones climáticas y se pueda evaluar en los próximos meses.**
	64 productores asociados con asistencia técnica especializada en ganadería doble propósito	**Actualmente los 64 productores hacen parte de la asociación.**	**Falta mas trabajo en equipo a los 64 miembros de la asociación y conocer los compromiso de contrapartida y los indicadores estimados en el marco lógico para proyectarse al logro de los mismos.**
	1 asociación con acompañamiento técnico y socio empresarial.	**Es una asociación que ha tenido acompañamiento técnico, aun ha faltado es que los profesionales**	**La falta de compromiso de algunos beneficiarios para el logro y seguimiento de los indicadores**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

		conocieran los indicadores establecido en el marco lógico.	**establecidos en el marco lógico del proyecto y sentido de pertenencia de algunos beneficiarios para la ejecución de la contrapartida.**
	Reducir el % de mortalidad del 5 % al 2% mediante la implementación y buen manejo de prácticas ganadera BPG	**3,06/2% esto se ha incrementado por la falta de alimentación adecuada y las condiciones climáticas del entorno y la falta de conocimientos de BPG.**	**3,06% no cumple con el indicador esperado que es del 2% por las condiciones y la falta de compromiso de algunos beneficiarios de seguimiento al hato ganadero y falta de alimentación adecuada de las reses7.**
Visita a Predios	**Resumen General:** Para la visita reportada se realiza una muestra 10 % de los beneficiarios que son 7. Actualmente la muestra visitada sigue en la asociación ASOPRAM 19V. Las vías de acceso a la vereda donde se desarrolla el proyecto están en buenas condiciones. La asociación cuenta con el terreno para el desarrollo del PIDAR. Esta en el proceso de Organización de lotes , en el momento de la visita no se encuentra cercado, están adecuando el terreno, se requiere tiempo y mano de obra de los beneficiarios, esto expresado por el representante de la asociación. Los semovientes entregados se encuentran en 4 predios diferentes de los beneficiarios, **de las cuales el representante legal notifico por escrito el traslado de las reses a otros predios, porque no se encuentra un lote con extensión de tierra para la cantidad de novillas y puedan**		

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

estar en pastoreo. Esta condición se da por el retraso de la contrapartida por parte de los beneficiarios.

No.	Beneficiario	Resumen de la Visita
1	**Nicanor Pérez Villegas.**	**Sigue en la asociación, recibió a satisfacción los semovientes entregados (66 hembras, 3 Toros) no han podido avanzar en la siembra de pastos y forestales por la falta de trabajo en equipo y la distancia de donde se encuentran los semovientes en arriendo al lote establecido en el marco lógico del, proyecto, es un beneficiario muy comprometido con la ejecución del proyecto , tiene mucha experiencia en ganado vacuno y coloca en practica sus conocimiento. sin embargo se hizo énfasis en seguimiento de los índices de producción y planificación y seguimiento en actividades de sanidad animal. Se socializo BPG y lecciones aprendidas, fue la persona asignada para el acompañamiento de la visita de seguimiento,monitoreo y control.**
2	**Jesus Escorcia Varon**	**Beneficiario hace parte de la asociación, es otro que se encarga del seguimiento de otro lote de ganado bovino en la finca Caña Dulce , está comprometido con el cuidado de estas novillas , pero no lleva registro de seguimiento, preocupado y lo expresa la falta de compromiso de los demás beneficiarios, expresa que los insumos veterinario entregados por parte ADR han sido de muchos beneficio, la entrega de los**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			semovientes sin estar en lote en condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto, ha afectado para las evaluaciones de los índices estimados en el marco lógico.se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	3	**Miguel Eduardo Pérez Martínez.**	**Beneficiario hace parte de la asociación, es otro que se encarga del seguimiento de del lote de ganado bovino en la finca Caña Dulce , está comprometido con el cuidado de estas novillas, pero no lleva registro de seguimiento, beneficiarios, expresa que los insumos veterinario entregados por parte ADR han sido de muchos beneficio y se les esta suministrando al ganado ,el banco de proteína no se esta ejecutando por falta de inestabilidad de arriendo de los lotes, el compromiso es organizar el lote pasa el tiempo que es el asignado para ejecución del proyecto según lo escrito en el marco lógico.se socializo BPG y lecciones aprendidas.**
	4	**Oscar Manjarrez.**	**Beneficiario hace parte de la asociación, es otro que se encarga del seguimiento de del ganado y actividades asignadas de contrapartidas en el lote pasa el tiempo, pero no lleva registro de seguimiento, beneficiarios, expresa que los insumos veterinario entregados por parte ADR han sido de muchos beneficio y se les esta suministrando al ganado ,el banco**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			de proteína esta ejecutando, pero en la 1ra siembra fue afectada por el fuerte verano de la región de tal forma que la semilla de pasto sembrada no germino, el compromiso es organizar el lote pasa el tiempo que es el asignado para ejecución del proyecto según lo escrito en el marco lógico.se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	5	**Astolfo Villega Pacheco**	**Beneficiario hace parte de la asociación, es otro que se encarga del seguimiento de del ganado y actividades asignadas de contrapartidas en el lote pasa el tiempo, pero no lleva registro de seguimiento, beneficiarios, expresa que los insumos veterinario entregados por parte ADR han sido de muchos beneficio y se les está suministrando al ganado ,el banco de proteína está ejecutando, pero en la 1ra siembra fue afectada por el fuerte verano de la región de tal forma que la semilla de pasto sembrada no germino, el compromiso es organizar el lote pasa el tiempo que es el asignado para ejecución del proyecto según lo escrito en el marco lógico. Le preocupa la falta de trabajo en equipo de beneficiario y que es necesario para la organización del lote. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.**
	6	**Alexis de Jesús flores.**	**Beneficiario hace parte de la asociación, es otro que se encarga del seguimiento de del ganado y**

			actividades asignadas de contrapartidas en el lote pasa el tiempo, pero no lleva registro de seguimiento, Expresa que los conocimientos en ganadería lo ha adquirido durante la ejecución de este proyecto, y expresa que debe ampliar aun mas beneficiarios, expresa que los insumos veterinario entregados por parte ADR han sido de muchos beneficio y se les está suministrando al ganado ,el banco de proteína está ejecutando, pero en la 1ra siembra fue afectada por el fuerte verano de la región de tal forma que la semilla de pasto sembrada no germino, el compromiso es organizar el lote pasa el tiempo que es el asignado para ejecución del proyecto según lo escrito en el marco lógico. Le preocupa la falta de trabajo en equipo de beneficiario y que es necesario para la organización del lote para trasladar todo el ganado a un solo sitio, y que requiere de tiempo y trabajo . Se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	7	**Aroldo Enrique Canales Ramos.**	**Es el representante de la asociación ASOPRAM19V,se cerro la visita dialogando con respecto a lo observado en la visita, donde se le expreso que las novillas no se encuentran en el lote especificado en le marco lógico .Expreso que recibieron el lote de novillas(64), 2 Vacas paridas y 3 toros, Insumos agrícolas y veterinarios, herramientas y**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

				maquinaria(Guadaña-motosierra-Picapasto, los cuales se les ha dado uso durante la ejecución del proyectos y los productos veterinario se les han suministrado al ganado bovino, le preocupa es que recibieron las novillas sin tener el lote organizado descrito en el marco lógico en condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto ,lo que han tenido que arrendar 4 lote porque el verano ha afectado las condiciones adecuadas, falleciendo dos novillas en el mes de marzo, esto afectadas por las condiciones climáticas del entorno y pudo afectar el sistema de alimentación de las novillas, actualmente permanecen en estado de pastoreo para no ha afectar el aspecto nutricional y con lotes rotacional y haciendo seguimiento a sanidad animal. **Preocupado por la falta de compromiso de algunos beneficiarios para la ejecución de la contrapartida y la evaluación de los indicadores estimados en el marco lógico, por desconocimiento de los mismo tanto los profesionales contratados como los beneficiarios, los cuales nos sirven de lecciones aprendidas.se socializo BPG y lecciones aprendidas.**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Sistema de Alertas

El proyecto no cuenta con alertas abiertas y las dos que se habían generados están cerradas.
Situaciones de amenaza o alerta identificadas durante la visita:

No.	Acción preventiva o correctiva	Descripción

Lecciones aprendidas

Para la visita ejecutada se reporta lecciones aprendidas.

Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación de los

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de estructuración
1	Socializar el marco lógico con los miembros de la asociación y concertar con ellos.
2	
3	
4	

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación
1	Beneficiarios tienen sentido de pertenecía por lo que hacen y en este sector practican trabajo de labor en equipo.
2	Falta de compromiso de algunos beneficiarios con la ejecución de la contrapartida.
3	Los profesionales se les debe socializar el marco lógico del proyecto para que le hagan seguimiento a los índices estimados en el marco lógico.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Transferencia de conocimiento</td><td>
Temas tratados en la transferencia de conocimiento:
Lecciones aprendidas-Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas Ganaderas.
Se transfiere conocimiento a los beneficiarios basados en las lecciones aprendidas y
buenas prácticas adquiridas por la dirección de Seguimiento y control en el ejercicio de la
misionalidad.
LA: Cuando las organizaciones beneficiarias se empoderan y conocen detalladamente los proyectos, aumenta la posibilidad de cumplir los objetivos y generar un impacto positivo en la población beneficiaria y la comunidad.
LA:La adecuada y frecuente comunicación entre los representantes de las organizaciones y los beneficiarios genera una correcta retroalimentación que facilita el mejor desarrollode las actividades a lo largo de la vida del proyecto.
BPG: llevar información individual por animal(novilla).
BPG: Utilizar únicamente productos veterinarios que no se encuentren vencidos y sin evidencias de cambios físicos a la inspección visual.
Beneficiarios que se le socializo transferencia de conocimientos y Buenas practicas Ganaderas.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Beneficiario</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nicanor Pérez Villegas.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Jesús Escorcia Varon</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Miguel Eduardo Pérez Martínez</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Oscar Manjarrez</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Astolfo Villega Pacheco</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Alexis de Jesús Flórez</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Aroldo Enrique Canoles Ramos</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

se adjunta el acta de visita al predio con firma del beneficiario y soporte fotográfico.
</td></tr>
</table>


Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

<table>
<tr><td></td><td>7 beneficiarios se les realizó transferencia de conocimiento de manera directa grupal, mediante reunión con la organización beneficiaria: Asopram 19V.


Se adjunta la lista de asistencia y registro fotográfico.</td></tr>
<tr><td>Recomendaciones</td><td>Recomendaciones para la ejecución del proyecto.

<table>
<tr><th>Recomendación</th><th>Plazo de ejecución</th></tr>
<tr><td>Solicitar al director de UMATA del municipio Capacitación para los beneficiarios de ASOPRAM 19V, atraves del SENA en Ganadería Intensiva.</td><td>10-06-2023 Representante legal recepcionar Documentos.</td></tr>
<tr><td>.Hacer seguimiento a los beneficiarios de ejecución de contrapartida , realizar siembra de semilla de pasto y lotear terreno,</td><td>2- Junio-2023.,hacer seguimiento a representante legal.</td></tr>
<tr><td>Hacer seguimiento x semoviente (Novilla),llevar registro en control nutricional y sanidad animal.</td><td>28-05-2023.</td></tr>
<tr><td>Hacer reunión de convocatoria a los beneficiarios para conocer las actividades de seguimiento diario y oportuno a las novillas.</td><td>2-06-2023 representante legal.</td></tr>
<tr><td>Organizar predio asignado para ejecución del proyecto, y tener las novillas en un mismo sitio para llevar seguimiento de los indicadores escritos en marco lógico.</td><td>22-10-2023.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Registro Fotográfico</td><td>Imagen No.1: Representante legal de la asociación Asopram 19V -Aroldo Enrique Canoles Ramos..26/05/2023.</td></tr>
</table>

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

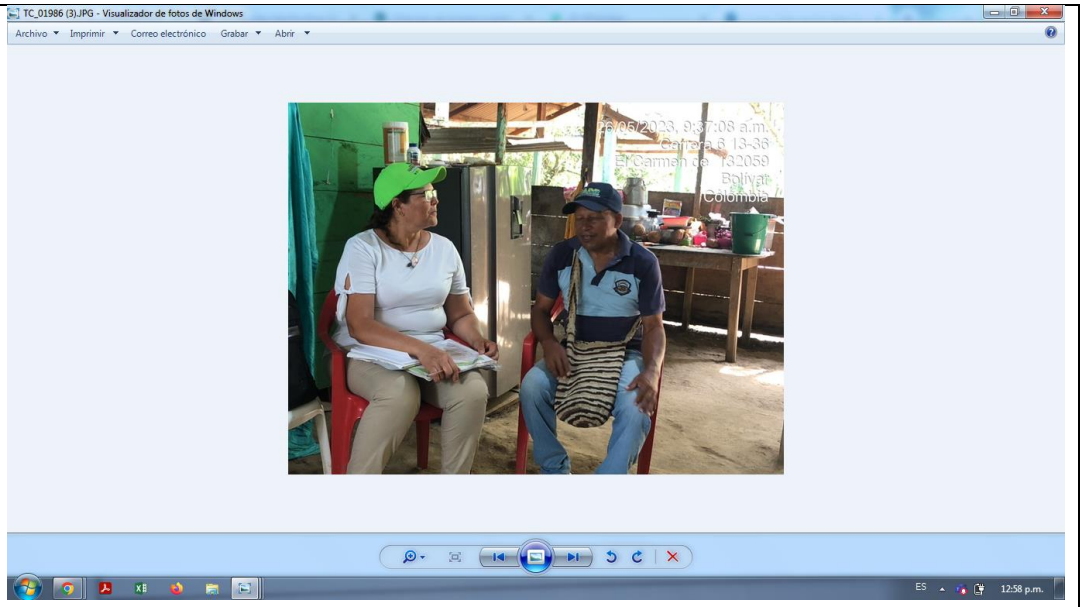


Beneficiario.Miguel Perez/Jesus Escorcia Varon -25/05/2023.

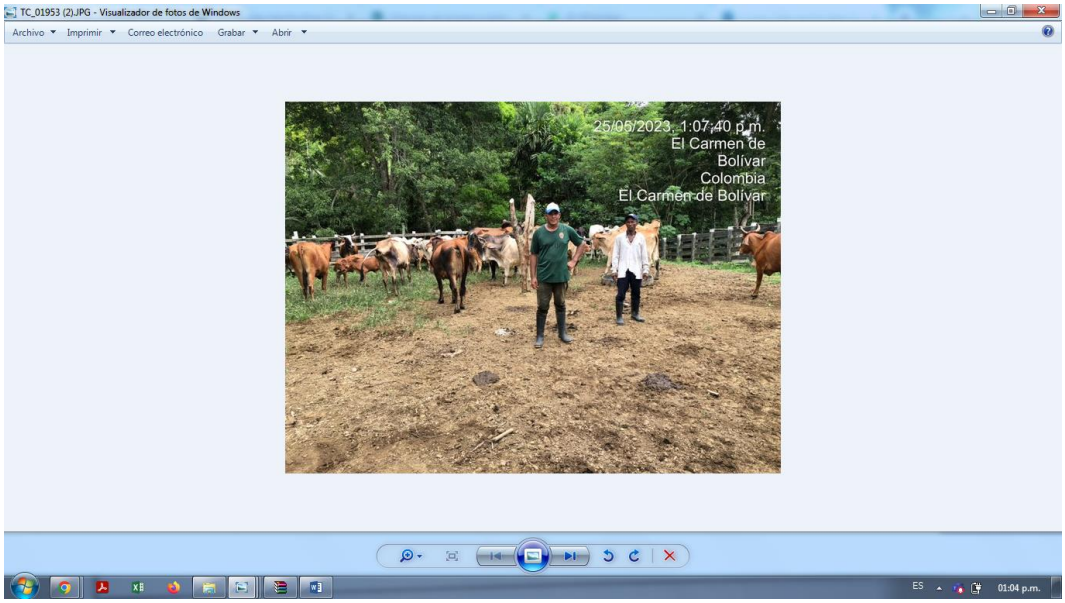

Beneficiario.Nicanor perez villegas-25/05/2023.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

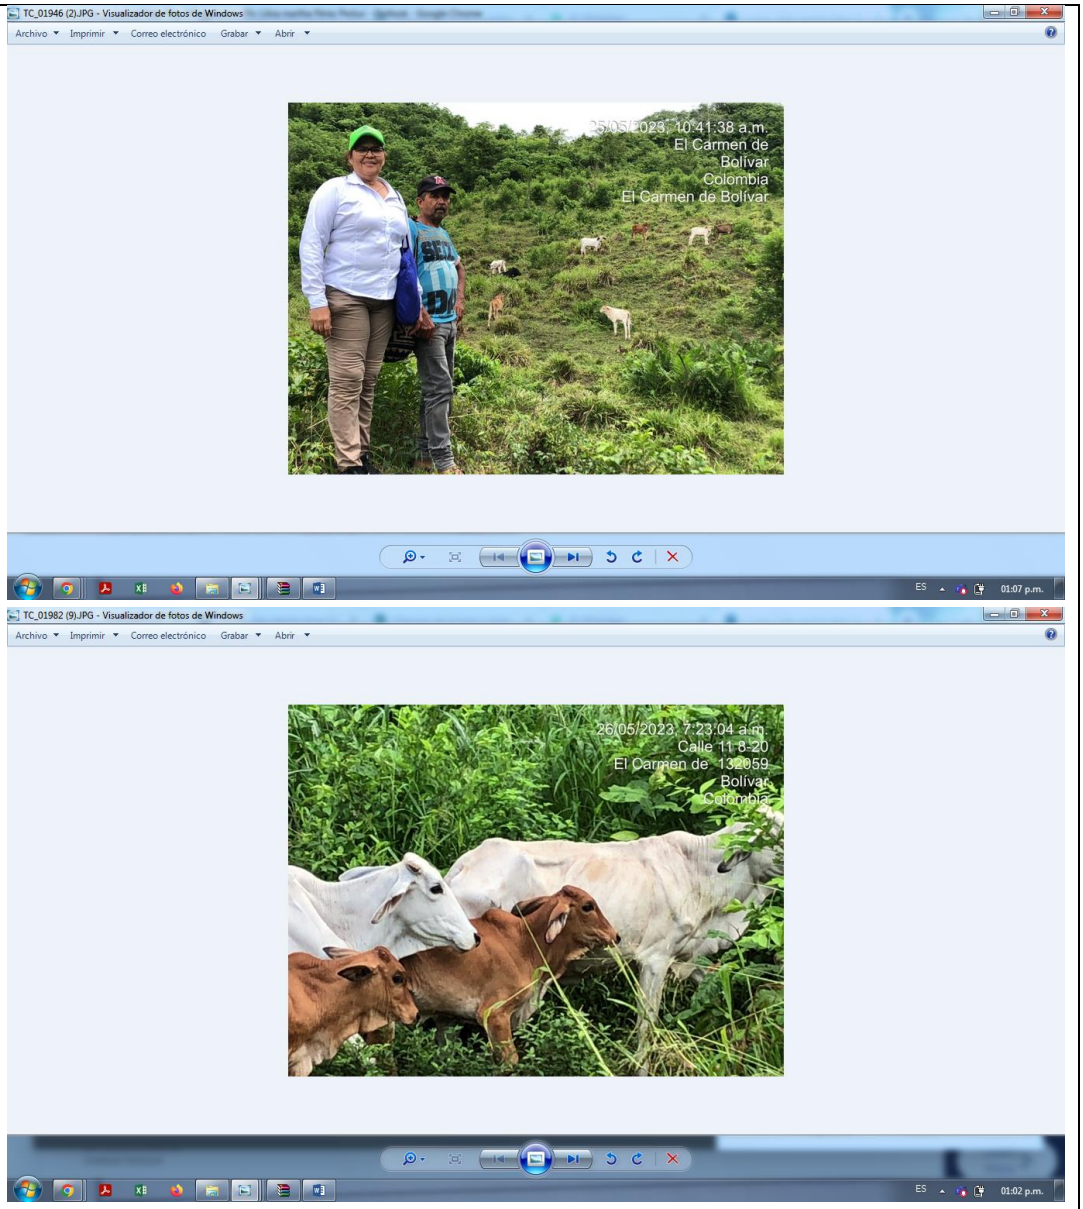
TC_01946 (2).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
25/05/2023, 10:41:38 a.m.
El Carmen de Bolívar
Colombia
El Carmen de Bolívar
01:07 p.m.
TC_01982 (9).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
26/05/2023, 7:23:04 a.m.
Calle 11 8-20
El Carmen de 132059
Bolívar
Colombia
01:02 p.m.

.

Elaboró: Libia Pérez Pertuz Apoyo Operativo Territorial UTT2. https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2022%2F245%2F2%2EEJECUCI%C3%93N%2F2%2E2%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E2%2E1%20COMIT%C3%89%20%28ES%29%20TGL&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2#:~:text=%EE%9C%B4,Contenido%20del%20sitio
Libia Pérez Pertuz Utt2 Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos
Revisó:
Firma **NOMBRE DEL PROFESIONAL** Dirección de Seguimiento y Control Vicepresidencia de Proyectos

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada
