Tipo de visita	En fase de ejecución ☒ En fase de cierre ☐	
Fecha de informe 28-06-2023	**Fecha de inicio de visita: 23-05-2023**	**Fecha de terminación de la visita:** 24-05-2023
No. Banco de Proyectos: 3125	**No. Resolución: 351**	**Fecha de resolución 11-10-2021.**
Nombre del proyecto: Mejorar las capacidades productivas de los pequeños y medianos ganaderos de los municipios de Villanueva y santa rosa de lima Nte de Bolívar pertenecientes (Anuc).		
Ubicación del Proyecto: Municipio de Villanueva-Bolivar.	**FINCA CASCAJAL.**	

RESULTADO DE LA VISITA

ITEM	DESCRIPCIÓN
Avance POA	Proyecto se esta ejecutando de forma directa, la notificación del acto administrativo fue el 12 de Noviembre del 2021,la apertura del encargo fiduciario se realizó el 12/11/2021. El proyecto fue socializado el día 29/10/2021, su acta de inicio se llevó a cabo el día 21/ de Febrero del 2022. **Avance Financiero 80%** **Avance Técnico**: 75% Se adjunta el POA actualizado a la fecha de la presente visita.
Modificaciones del Proyecto	Las modificaciones que se encuentran en el proyecto es en el plan de inversión, re distribución del recurso. .
Indicadores del Proyecto	En el marco lógico encontramos los indicadores del proyecto, no se han podido evaluar porque las condiciones climáticas, especialmente el invierno y verano, y el tiempo de arriendo del predio donde se está ejecutando el

ÍTEM	PLANEADO	MODIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

proyecto que no es el descrito en el marco lógico del proyecto, han afectado para la evaluación de los mismos.

Indicadores del proyecto	**Avance %**	**Análisis**
• Hectáreas con siembra de forrajes mejorados: TRECE(13).	**No Aplica**	**No se ha realizado porque el proyecto se está ejecutando en un lote diferente al especificado en marco lógico y solo tomaron en arriendo por un año.**
• Hectáreas adecuadas con sistema silvopastoril: 40.	**No Aplica.**	**Aunque el lote de arriendo se encuentran en óptimas condiciones sin embargo el verano afecto la sp establecidas.**
• Días de lactancia: 210.	**No Aplica**	**Este indicador no se ha podido evaluar porque no se ejecuta la practica ordeño a las novillas para poder criar al ternero con pura leche mientras llegaba el invierno y su estomago podía adaptarse al medio de alimentación.**
• Producción Diaria de leche: 7 litros/día el primer año.	**No Aplica**	**Este parámetro no se ha evaluado por la falta de producción de leche que se ha afectado por condiciones climáticas, cambio**

			de predio en arrendamiento, debido a que no se ha podido establecer condiciones del predio, todo esto afectado el sistema de alimentación de las novillas y por ende su producción, se establece compromiso para seguimiento de los parámetros establecidos, ya que en estos momento hay lluvias, cambiado las condiciones climáticas y se pueda evaluar en los próximos meses.
	Pie de cría mejora genéticamente: 115 novillas Girolandas.	**Recibieron 115 novillas .**	**Atraves de este lote de novillas , aun se hubiese incrementado el número de reses paridas pero las condiciones climáticas , especialmente el verano prolongado, ha afectado en el consumo de alimento, la cantidad y calidad de leche producida ,y tener efectos negativos en la reproducción,**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			también en el fallecimiento de 43 reses los cuales se desconocen los diagnósticos de fallecimiento, se está a la espera de visita por parte de los profesionales veterinarios de la VIP que esta programada a partir del 4 de junio.
	Material genético padres machos: Dos (2) toros BRAHMAN	**Se recibieron los dos semovientes.(Toros).**	**Se esperaba que tuvieran una buena funcionalidad, buena formación para reproducción, y que diera buena respuesta en sus generaciones, pero no ha cumplido con los objetivos y también falleció uno, los cuales se desconocen las causas de fallecimiento.**
	Peso al destete de 160-180 kilogramos.	**No Aplica**	**Este indicador no se ha evaluado por las condiciones climáticas del entorno y la falta de seguimiento de los beneficiarios por desconocimiento de los mismos, alimentación no adecuada para el**

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			tipo de producción y el suministro que es atraves de pasto picado no se esta suministrando en cantidades 'optimas para evaluación de este indicador.

Visita a Predios

Resumen General:

Reunión 13/118 beneficiarios equivalente al 11% del 100% de los beneficiarios, Actualmente las muestras visitadas hacen parte de la asociación Anuc de villanueva.La asociación cuenta con predio para desarrollar el proyecto, actualmente la unidad productiva se encuentra en un lote diferente al especificado en el marco lógico, los cuales la representante legal no ha notificado por escrito; del cambio de lote porque después de recibir el lote de novillas, el predio sufrió inundación por el fuerte invierno y tuvieron que trasladar los semovientes a diferentes predios y posteriormente al predio actual .expresaron haber recibido insumos agrícolas y veterinario, herramientas, maquinaria semilla de maíz, capacitaciones, pero algunos equipos no se les ha dado uso, tampoco se ha establecido cerca eléctrica porque el lote solo está en arriendo por un año, se está buscando una estabilidad en arriendo mayor a 5 años para poder organizar el terreno con las características que se requiere para continuar con la ejecución del proyecto y evaluar los índices del marco lógico establecidos en el proyecto.

No.	Beneficiario	Resumen de la Visita
1	Arnett Vargas Cawadias	Beneficiario hace parte de la asociación ANUC Villanueva, expreso que recibieron 115 novillas y 2 toros, recibieron insumos agropecuario, herramientas, maquinaria para uso agrícola, los materiales para instalación de cerca eléctrica, insumos para uso veterinario. Este proyecto desde su ejecución se ha afectado 1ro por el fuerte invierno, obligando al cambio

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			de terreno sin informar a la agencia de desarrollo Rural y 2da afectación fue las condiciones climáticas del entorno principalmente el fuerte verano, afectando el sistema nutricional de las novillas lo que ha ocasionado la muerte de 33 novillas y un toro, hasta la fecha esta muerte se ha incrementado sin saber las causas sin embargo la asociación ha invertido recursos propios para la compra de pasto y caña para alimentación diaria. Se socializo BPG y lecciones aprendidas. Solicita la presencia de un profesional médico veterinario y capacitación atraves del SENA para los beneficiarios.
	2	Ines Ortega Vega	Beneficiaria que hace parte de la asociación, es la encargada de cuido de las novillas y el toro en la finca cascajal con su esposo, manifestó con gran preocupación el fallecimiento de las reses sin tener conocimiento lo que las ha afectado, igualmente el incumplimiento de la mano de obra especificada en contrapartida por parte de los beneficiarios y que a pesar –que se realizaron grupos por semana siguen incumpliendo en la ejecución de la misma. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	3	Georgina Molina Murieles.	Actualmente es beneficiaria de la asociación, asignaron el cargo de tesorera a partir del mes de Febrero, Está preocupada ´por la alimentación de las novillas y la falta de compromiso de los miembros de

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			la asociación para la ejecución de labores asignada en contrapartida, preocupada porque cada dos días por semana hay que comprar pasto y aun así se siguen muriendo las reses sin saber que las está afectando, igualmente la falta de compromiso de los beneficiarios para ejecución de la mano de obra de contrapartida y la inestabilidad del tiempo de arriendo del lote de ejecución del proyecto. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.
	4	Roberto Cabeza Ortega.	El sr expresa que hace parte de la asociación Anuc Villanueva, y del equipo de ejecución de mano de obra los días Martes, que recibieron 115 novillas y 2 toros, insumos agrícolas, de uso veterinario, herramientas, materiales para la construcción de cerca eléctrica y lotear el terreno donde se desarrolla la unidad productiva, preocupado por el sistema de alimentación de las reses y el estado físico y sanitario de las mismas que aunque se les compra el pasto y silo, se observan algunas muy mal aspecto. Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	5	Juan Manuel Pedroza.	El beneficiario sigue en la asociación, le preocupa la falta de compromiso de algunos beneficiarios ausente para el desarrollo de la contrapartida y la inestabilidad del arriendo del lote para el desarrollo de la misma. Se socializo BPG y lecciones aprendidas.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	6	Edinson Puerta Martinez	El beneficiario expresa que hace parte de la asociación, y del equipo asignado los martes para ejecución de contrapartida, preocupado por la alimentación de las reses y el aspecto físico de las misma, aunque ellos compran pasto y silo esto no es suficiente para abastecer el sistema nutricional que las reses requiere, también ha faltado valoración del medico veterinario para seguimiento de las misma.
	7	Francisco Mercado V	El sr expresa que hace parte de la asociación Anuc Villanueva, No se ha podido establecer las sp asignadas para el banco de proteína por el fuerte verano, preocupado por el aspecto físico de las reses y la afectación sanitaria de las misma, solicita la presencia del médico veterinario para evaluación y seguimiento de las mismas. Socialización BPG y lecciones aprendidas.
	8	Clemente Julio Cabeza.	El sr manifiesta que hace parte de la asociación, que recibieron lote de 115 novillas y 2 toros , insumos agrícolas, de uso veterinario, herramientas y maquinaria y utensilios veterinario, que algunos están en uso y otros no porque la ejecución del proyecto se ha afectado por el fuerte verano y el tiempo de arriendo del lote no le permite el desarrollo del mismo. Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	9	Fredy Cabeza Marimon.	El sr hace parte de la asociación de Anuc Villanueva, comprometido con

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			el desarrollo de la labor de contrapartida escrita en el marco lógico, preocupado por el aspecto físico ,alimentación y sanidad de las novillas, y el poco tiempo de arriendo del lote para desarrollar el proyecto. Socialice BPG, lecciones aprendidas.
		10	Carlos Enrique Torres Muñoz.	El sr beneficiario hace parte de la asociación Anuc Villanueva, comprometido con el desarrollo de la labor de contrapartida escrita en el marco lógico, igualmente la falta de compromiso de algunos beneficiario para el desarrollo de la misma, preocupado por el aspecto físico, alimentación y sanidad de las novillas, y el poco tiempo de arriendo del lote para desarrollar el proyecto, la muerte de algunas novillas y un toro y no hay un diagnostico especifico. Socialice BPG, lecciones aprendidas.
		11	Galo Medina Pérez.	El sr beneficiario hace parte de la asociación Anuc Villanueva, está comprometido con su apoyo en la ejecución de mano de obra especificada en contrapartida, ayuda en la mecanización del terreno, pero le preocupa el aspecto físico de las reses y poco tiempo de arriendo del terreno para la siembra de sp para establecer el banco de proteína para aportar al sistema nutricional de las reses, Socialice BPG y lecciones aprendidas.
		12	Sol Cawadias Vargas	Sra beneficiaria hace parte de la asociación Anuc Villanueva, hace parte del grupo asignado para

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

			ejecución de mano de obra del proyecto, preocupada por el sistema de alimentación, sanidad y aspecto físico de las reses, el tiempo de arriendo del lote para el desarrollo de las sp del banco de proteína, igualmente falta de compromiso de algunos beneficiario en la ejecución de mano de obra, falta de conocimiento en prácticas ganaderas de beneficiarios. Socialice BPG y lecciones aprendidas.
	13	Antonio Cabeza Parra	Sr beneficiario manifiesta hacer parte de la asociación Anuc Villanueva, comprometido con la ejecución de la mano de obra especificada en contrapartida, preocupa el fuerte verano del municipio, la alimentación, el estado de sanidad de la reses y el tiempo de arriendo del lote para desarrollar un banco de proteína y falta de compromiso y conocimientos en prácticas ganaderas de algunos beneficiarios .
	14	Francia Vivanco	Representante Legal de la Asociación Anuc villanueva, ,inicie reunión de apertura, solo con un saludo, la representante expreso calamidad de salud de un familiar, me dejo encargada con un esposo de otra beneficiario y posteriormente me contacte con la tesorera de la asociación, logrando el desplazamiento hacia el sitio donde se desarrolla el proyecto y poder ejecutar la labor de seguimiento, monitoreo y control .

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Sistema de Alertas

El proyecto no cuenta con alertas abiertas y cerradas.
Situaciones de amenaza o alerta identificadas durante la visita:
Al realizar el presente informe se identifica 33 reses y un toro fallecido y que el aspecto físico ,nutricional y sanitario del lote de novillas no esta en buenas condiciones.

No.	Acción preventiva o correctiva	Descripción
1	Acción preventiva	Convocar a mesa de respuesta rápida apoyo de seguimiento de área, directora de UTT2.representante de célula, apoyo de seguimiento y control para hacer diagnóstico y seguimiento de la situación.

Lecciones aprendidas

Para la visita ejecutada se reporta lecciones aprendidas.

Lecciones aprendidas:

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de estructuración
1	Verificar el lote de ejecución del proyecto y las condiciones del entorno que puedan afectar al mismo, vías y condiciones climáticas.
2	Analizar el conocimiento de acuerdo al área que se va desarrollar de los beneficiarios y capacitarlos antes de la entrega del mismo.
3	
4	

No.	Lecciones aprendidas referidas a la fase de implementación
1	Evaluar los saberes de los beneficiarios de acuerdo al área de desarrollo del proyecto durante la ejecución.

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

	2 Verificar las condiciones del lote antes de la entrega de semovientes para la ejecución del proyecto y el sistema de alimentación de los mismo. 3 Dejar carpeta de actas con la entrega del estado nutricional, físico y sanidad de los semovientes entregados. 4 Verificar que el lote si es en arriendo, el tiempo de arriendo sea suficiente para el desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto. 5 La asociación debe reportar cada dos meses el avance de ejecución de contrapartida.
Transferencia de conocimiento	Temas tratados en la transferencia de conocimiento: LA: Cuando las organizaciones beneficiarias se empoderan y conocen detalladamente los proyectos, aumentan la posibilidad de cumplir los objetivos y generar un impacto positivo en la población beneficiaria y la comunidad. LA: La adecuada y frecuente comunicación entre los representantes de las organizaciones y los beneficiarios genera una correcta retroalimentación que facilita el mejor desarrollo de las actividades a lo largo de la vida del proyecto. BPG :Aislar animales que presenten enfermedad. BPG: llevar registro de información por cada animal. BPG: Debe existir un suministro continuo suficiente de agua de bebida.

No.	Beneficiario
1	Arnett Vargas Cawadias.
2	Ines Ortega Vega.
3	Georgina Molina Murieles.
4	Roberto Cabeza Ortega.
5	Juan Manuel Pedroza
6	Edison Puerta Martines.
7	Francisco Mercado V
8	Clemente Julio Cabeza
9	Fredi Cabeza Marimon

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

10	Carlos Enrique Torres Muñoz	
11	Galo Medina Perez	
12	Sol Cawadias Vargas	
13	Antonio Cabeza Parra	

se adjunta el acta de visita al predio con firma del beneficiario y soporte fotográfico.
13 beneficiarios se les realizó transferencia de conocimiento de manera directa grupal, mediante reunión con la organización beneficiaria: ANUC Villanueva-Bolívar..

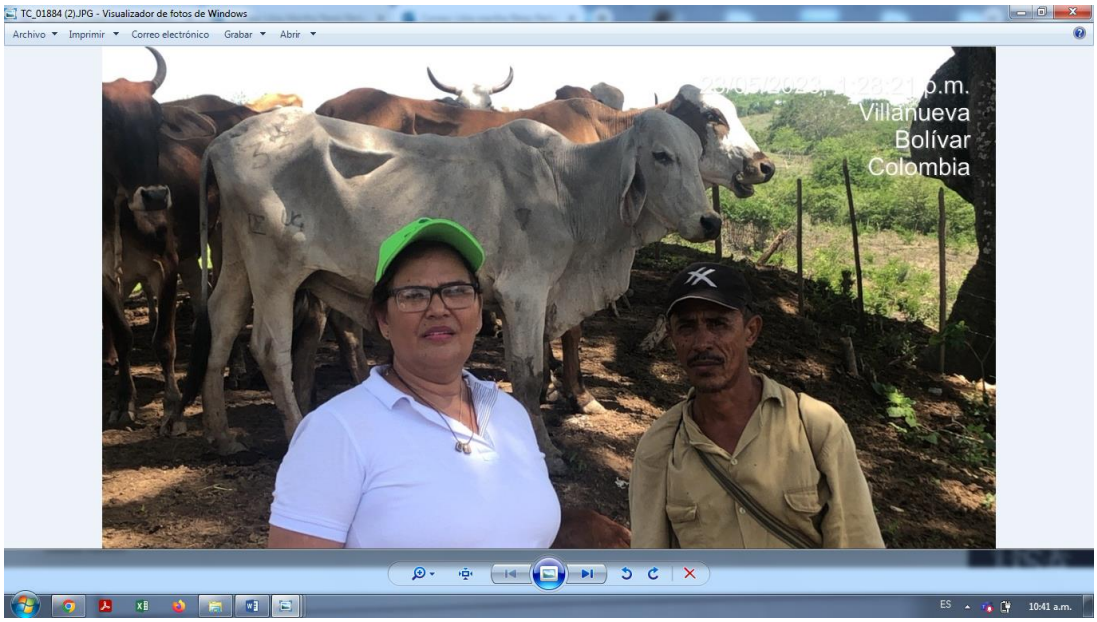
Se adjunta la lista de asistencia y registro fotográfico.

Recomendaciones

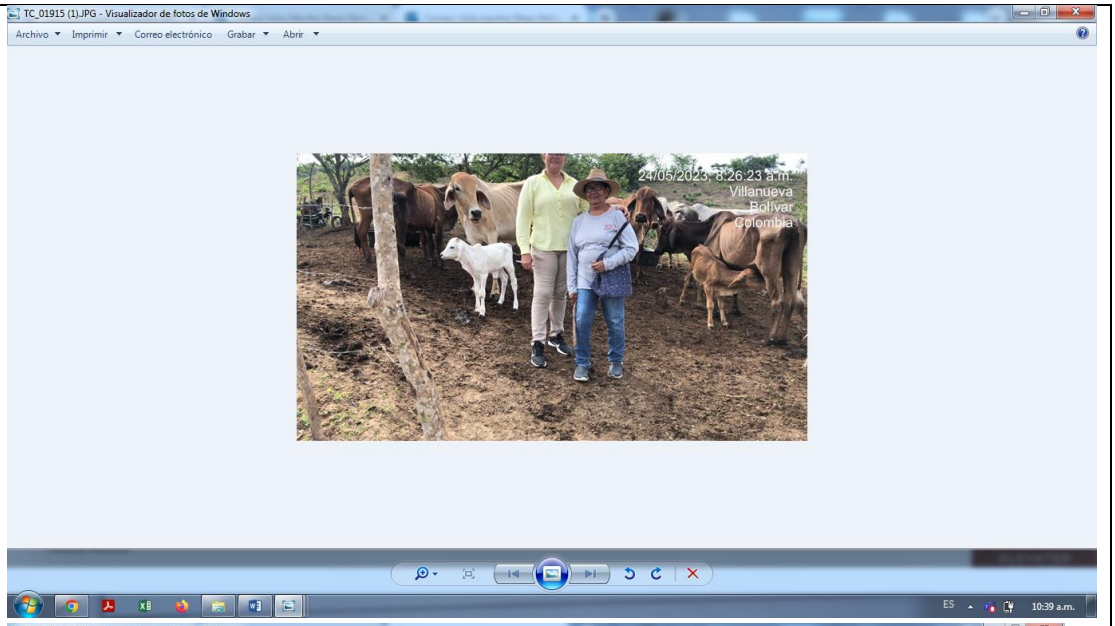
Recomendaciones para la ejecución del proyecto.

Recomendación	Plazo de ejecución
Solicitar atraves de la Umata formación SENA en administración ganadera.	24-05-mayo-2023
Hacer seguimiento de ejecución en mano de obra contrapartida y reporte del avance.	30- Mayo-2023.
Hacer seguimiento del estado físico-nutricional y sanitario de las novillas.	26-05-2023.
Diligenciar formatos de seguimiento a cada novilla y segmentar de acuerdo a la necesidad.	25-05-2023
Hacer siembra de cultivo de maíz para la preparación de silo , utilizar alimentación para época de verano.	30-05-2023.

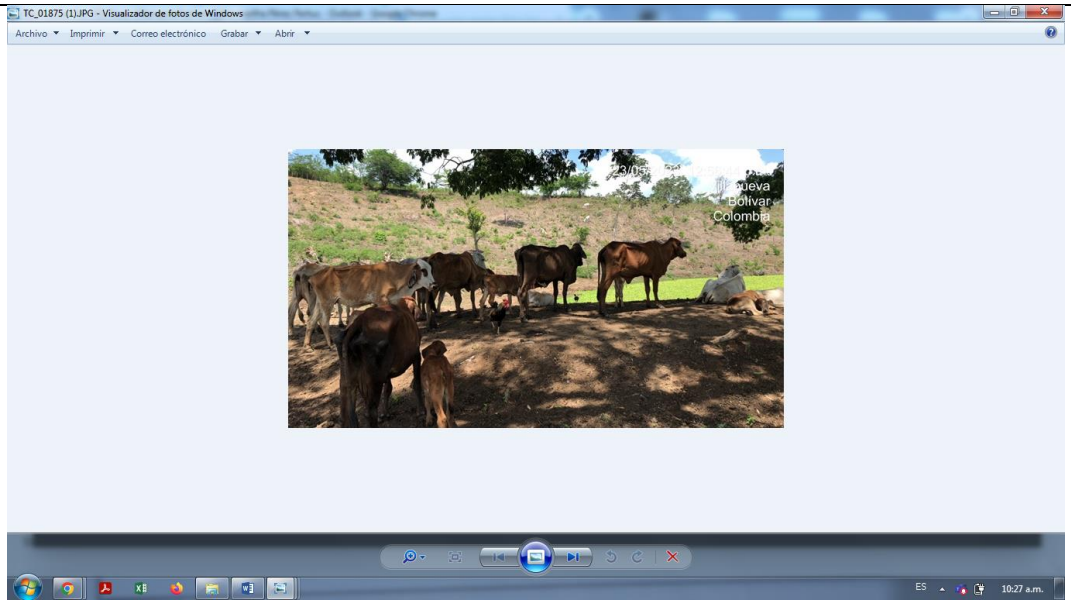
Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada

Registro Fotográfico	Imagen No.1: Representante legal de la asociación ANUC Villanueva - Bolivar -Francia Vivanco.23/05/2023.  Beneficiario Anuc Villanueva Pidar Res 351-23/05/2023. 

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada


TC_01915 (1).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
24/05/2023, 8:26:23 a.m.
Villanueva
Bolívar
Colombia
ES
10:39 a.m.


TC_01871 (1).JPG - Visualizador de fotos de Windows
Archivo Imprimir Correo electrónico Grabar Abrir
Villanueva
Bolívar
Colombia
ES
10:25 a.m.



Elaboró: Libia Pérez Pertuz Apoyo Operativo Territorial UTT2.

Libia Pérez Pertuz Utt2

Dirección de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Proyectos

Revisó:

Firma
NOMBRE DEL PROFESIONAL
Dirección de Seguimiento y Control
Vicepresidencia de Proyectos

https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F351%2F1%2E%20CAPSULA&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F351%2F2%2E%20EJECUCION&viewid=d9adfecd%2D2f13%2D4271%2Dbd77%2D0a8ea1fd12c2
https://adrgov.sharepoint.com/ADR/VIP/DAAP/DocumentosProyectos/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2FADR%2FVIP%2FDAAP%2FDocumentosProyectos%2F2021%2F35

Este documento es fiel copia del original que reposa en el Sistema de Información de la ADR. Su impresión se considera copia no controlada
