| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-12-FR-1 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 6 |

FECHA: 04 jul 2023 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

## ANTECEDENTES

**CONTRATO DE OBRA No.** 927 - 2023

**CONTRATISTA:** CAROLINA REYES PEÑA
(Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 2633 - 2019
2631 - 2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019)
INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:** DOS (2,0) MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 11 (Día) mayo (Mes) 2023 (Año)

**MODIFICACIONES:**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N.A. | N.A. | N.A. |
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS:**

| Contrato No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N.A | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 - julio - 2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 82.924.874,00 **50% EN SMMLV:** $ 31,88
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 82.924.874,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante oficio de fecha **4 de JULIO de 2023**, el contratista CAROLINA REYES PEÑA solicitó la **Adicion de recuros por valor de $17**.075.126,00 y la **prórroga del contrato po el termino de UN (01) mes**, es decir, desde el **11 JUNIO al 10 AGOSTO de 2023**. Teniendo en cuenta que los recuros iniciales no fueron suficiente para cubrir la totalidad de baches presentes en las vías objeto del contrato, los cuales generan un posible riego para el tránsito de estas mismas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Suministro de mezcla asfaltica en la Ruta 6512 - Via Monterrey - Yopal - PR 103+0287 - PR 105+0448, Ruta 6513 - Via Yopal - Paz de Ariporo - PR 0+0000 - PR 90+0380, Ruta 6514 - Via Paz de Ariporo - La Cabuya - PR 0+0000 - PR 73+0380.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN, CORTADORA DE PAVIMENTO, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEZCLA. | $ 82.924.874,00 | $ - | $ 17.075.126,00 | $ 100.000.000,00 |
| **Valor Total** | **$ 82.924.874,00** | | **$ 17.075.126,00** | **$ 100.000.000,00** |

**AVANCE FÍSICO DE OBRA**

Hasta el mes de **JUNIO del año 2023** la obra presenta un avance físico ejecutado del **89,94%**
(mes anterior a la presente solicitud) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del **66,67%**
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

**AVANCE INVERSIÓN DE OBRA**

Inversión programada acumulada: $ 55.286.013,50
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 74.584.174,39
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA**

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 74.584.174,39
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: $ 34.905.586,46 (mes anterior a la presente solicitud) 2023 (año)

Último mes facturado: mayo - 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 8.340.699,61 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

No se han impuesto multas y/o sanciones al contratista.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Debido al estado que presenta la carpeta asfaltiva (descascaramiento, baches, hundimientos) en algunos sectores en la Ruta 6512 - Via Monterrey - Yopal - PR 103+0287 - PR 105+0448, Ruta 6513 - Via Yopal - Paz de Ariporo - PR 0+0000 - PR 90+0380, Ruta 6514 - Via Paz de Ariporo - La Cabuya - PR 0+0000 - PR 73+0380, se hace necesario la adicion y prorrogar el presente contrato, para atender las necesidades de mezcla asfaltica en las Rutas antes mencionadas.

**JURÍDICA:**

Ninguna.

FECHA 04 jul 2023
(Día / Mes / Año)

**FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Se cuenta con un saldo en CDP No. 44723 del 3/06/2023, por un valor de $ 17.075.126,00. Para agotar los recursos a adicionar y atender las necesidades de mezcla asfaltica se requerira la prorroga del contrato al menor de un mes.

**PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

Se cuenta con un saldo en CDP No. 44723 del 3/06/2023, por un valor de $ 17.075.126,00

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)**

N.A

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)**

N.A

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)**

Oficio de solicitud por parte del contratista de fecha 4 de JULIO del año 2023.
Oficio de aval de interventoria, INTE-INV-2631-CGE-1437-2023 de fecha 04 de julio de 2023.
Acta de modificacion de cantidades.
Reprogramacion al programada de inversiones.

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Ninguna.

**Nota:**

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
Representante Legal
Contratista
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Vo.Bo.Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Director (E) Territorial

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Vo.Bo.Firma **N.A**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
JAIME IVÁN GONZÁLEZ SOLARTE
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Firma
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Jefe (E) Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-7-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 2 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA: 06 JULIO 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No:** 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐
POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 1 (Indicar No. y fecha)

**CONTRATO No :** 927 - 2023 (Indique número y año)
**OBJETO:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
**CONTRATISTA:** CAROLINA REYES PEÑA
**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PR 103+0287 AL PR 105+0448), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA A CARGO DE LA DT CASANARE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** 2633 - 2019, 2631 - 2019
**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

**PLAZO INICIAL:** DOS (2,0) MESES **PLAZO ACUMULADO:** TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:** 11 - mayo - 2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 - agosto - 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique día/mes/año)
**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 82.924.874,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 17.075.126,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 100.000.000,00

| No.DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN GR. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. X FECHA X de XXXX de 20XX CANTIDAD | VALOR | MODIFICACIONES: PRESENTES +/- | CANTIDAD | VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 4/JUL/2023 CANTIDAD | VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. EXPLANACIONES** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| **II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| **III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS** | | | | | | | | **$ 69.684.768,00** | | $ - | | | **$ 14.342.098,00** | | **$ 29.332.425,60** | | **$ 84.026.866,00** |
| 1 | 450.9P | | 450P | SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN, CORTADORA DE PAVIMENTO, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEZCLA. | M3 | 86,00 | $ 810.288,00 | $ 69.684.768,00 | | | + | 17,70 | $ 14.342.098,00 | 36,20 | $ 29.332.425,60 | 103,70 | $ 84.026.866,00 |
| **IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| **V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | $ - | | | | | | | | | |
| **VI. OBRAS VARIAS** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| **VII. TRANSPORTE** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| **PROTOCOLO BIOSEGURIDAD** | | | | | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | $ - | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - |
| Ajuste por modificación | | | | | | | | | | | | | $ 6.747,00 | | | | $ 6.747,00 |
| * SUBTOTAL OBRAS (A) | | | | | | | | **$ 69.684.768,00** | | **$ -** | | | **$ 14.348.845,00** | | **$ 29.332.425,60** | | **$ 84.033.613,00** |
| * PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DELPAGA) (B) | | | | | | | | $ - | | $ - | | | | | | | $ - |
| * PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | | | **$ 69.684.768,00** | | **$ -** | | | **$ 14.348.845,00** | | **$ 29.332.425,60** | | **$ 84.033.613,00** |
| * VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | | | $ 13.240.106,00 | | $ - | | | $ 2.726.281,00 | | $ 5.573.160,86 | | $ 15.966.387,00 |
| * VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) | | | | | | | | **$ 82.924.874,00** | | **$ -** | | | **$ 17.075.126,00** | | **$ 34.905.586,46** | | **$ 100.000.000,00** |
| * REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **VALOR TOTAL (F+I+J+K)** | | | | | | | | **$ 82.924.874,00** | | **$ -** | | | **$ 17.075.126,00** | | **$ 34.905.586,46** | | **$ 100.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | **$ 84.033.613,00** | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).** Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:
Adicion de recursos para atender las necesidades del la Ruta 6512 - Via Monterrey - Yopal - PR 103+0287 - PR 105+0448, Ruta 6513 - Via Yopal - Paz de Ariporo - PR 0+0000 - PR 90+0380, Ruta 6514 - Via Paz de Ariporo - La Cabuya - PR 0+0000 - PR 73+0380

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
CAROLINA REYES PEÑA
Representante Legal
Contratista
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)

Firma:
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Firma:
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Jefe (E) Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Revisión:
Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND — Firma (Suscribe según su competencia)
Director (E) Territorial — Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO — MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA SUMINISTRO PÚBLICA

# PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
## (Por PRORROGA No.1)

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECJA: 06 jul 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** CASANARE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 927 - 2023

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** CAROLINA REYES PEÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2633 - 2019, 2631 - 2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

**PLAZO INICIAL:** DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 de agosto de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


**FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 82.924.874,00

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 17.075.126,00

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 100.000.000,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) | VALOR INICIAL PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO PROGRAMADA Miles de pesos | (%) SUMINISTRO PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO SUMINISTRO PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL SUMINISTRO PROGRAMADA / VALOR SUMINISTRO EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | PERIODO 1 (11 al 31 MAY de 2023) | 2 PERIODO (1 al 30 JUN de 2023) | 3 PERIODO (1 al 31 JUL de 2023) | 4 PERIODO (1 al 10 AGOST de 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. EXPLANACIONES | | | | | | | | |
| II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES | | | | | | | | |
| III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | $ 69.684,77 / $ 84.026,87 | 100,00% / 120,58% | 89,94% / $ 62.675,78 | % P / $ P / % E / $ E | 30,15% / $ 21.007 / 42,09% / $ 29.332 | 30,15% / $ 21.007 / 47,85% / $ 33.343 | 30,15% / $ 21.007 | 30,15% / $ 21.007 |
| IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES | | | | | | | | |
| V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | | | | | | | | |
| VI. OBRAS VARIAS | | | | | | | | |
| VII. TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 69.684,77 | 100,00% | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 84.026,87 | 120,58% | | | | | | |

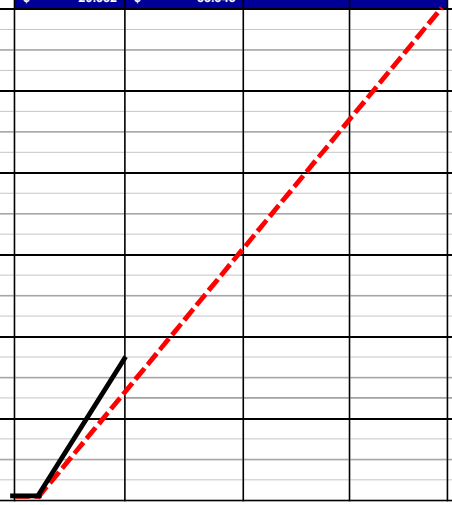

# PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
## (Por PRORROGA No.1)



FECJA: 06 jul 2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** CASANARE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 927 - 2023

**OBJETO:**
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** CAROLINA REYES PEÑA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2633 - 2019, 2631 - 2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

**PLAZO INICIAL:** DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)

**PLAZO ACUMULADO:** TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 de agosto de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 82.924.874,00

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 17.075.126,00

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 100.000.000,00

| | | PERIODO 1<br>11 al 31 MAY de 2023 | PERIODO 2<br>1 al 30 JUN de 2023 | PERIODO 3<br>1 al 31 JUL de 2023 | PERIODO 4<br>1 al 10 AGOST de 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 21.006,72 | $ 21.006,72 | $ 21.006,72 | $ 21.006,72 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 30,10% | 60,20% | 90,00% | 120,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 21.006,72 | $ 42.013,44 | $ 63.020,16 | $ 84.026,88 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 42,09% | 47,85% | 0,00% | 0,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 29.332,43 | $ 33.343,35 | $ - | $ - |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 42,09% | 89,94% | 89,94% | 89,94% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 29.332,43 | $ 62.675,78 | $ 62.675,78 | $ 62.675,78 |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | $ - | % |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 JORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | | $ - | % |
| PROVISION PARA IVA DE SUMINISTRO, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 | | $ - | % |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | $ - | % |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | | $ - | % |
| GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | | $ - | % |
| GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) | | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS ( B' ) | | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | **$ 69.684,77** | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | **$ 84.026,87** | **$ 62.675,78** | **89,94%** |

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
CAROLINA REYES PEÑA
Representante legal
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Aprueba Firma
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Jefe (E) Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Revisó Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Revisó Firma:
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Director (E) Territorial
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
