Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

INFORME No. 01 – CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

Ricaurte
NUESTRO COMPROMISO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA



Periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 13 de marzo de 2023


INTRODUCCION:


A continuación, se describen las actividades que se realizaron en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas entre el Municipio de Ricaurte e Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 354-2022.

DESCRIPCCION DEL PROYECTO:

- localización:

Ricaurte es un municipio de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a 112 km al suroeste de Bogotá, y a una altitud de 284 m s. n. m. La temperatura media anual es de 27 °C.

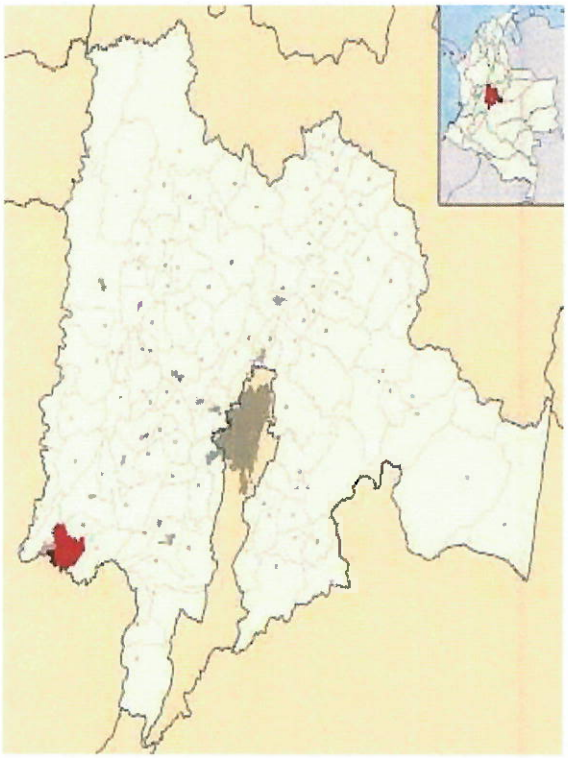

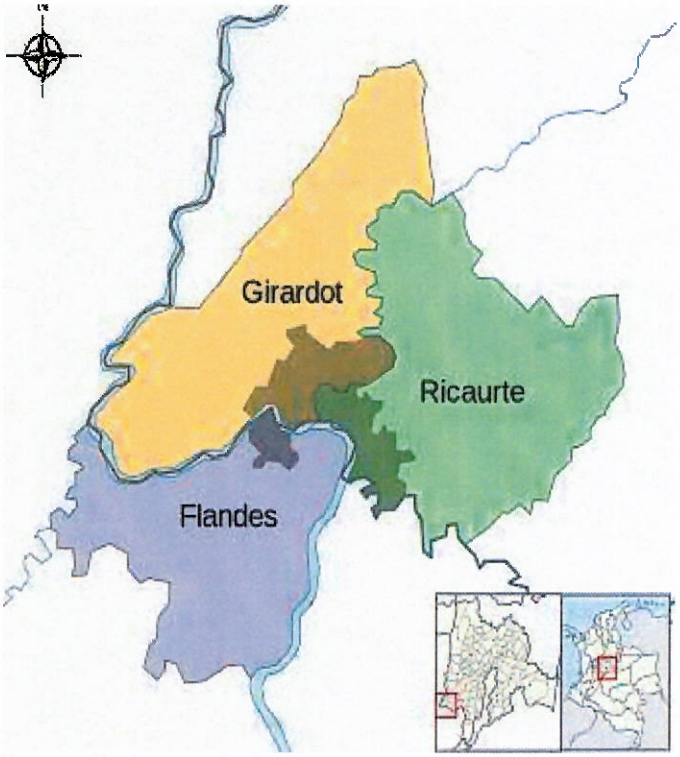

- **Superficie**: 130km2
- **Altitud**: 284msn
- **Temperatura**: 27 C°

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

Generalidades del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 354-2022	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
NIT.	900.480.705-7
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
CEDULA DE CIUDADANÍA	5.471.343 expedida en Ocaña.
DIRECCIÓN	MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
CIUDAD	Ricaurte, Cundinamarca
TELÉFONO	3148468958
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
VALOR	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C ($212.184.217.00)
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

ALCANCE DEL PROYECTO:

- ***Condiciones actualizadas***

CAPITULO 1.		PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PRILIMINARES			ACTA DE MODIFICACION No. 01	
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDADES A EJECUTAR	
No.	ICCU				CANT.	V/TOTAL
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.227,00	1046,23	$ 1.283.724,21
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	$ 106.800,00	177,03	$ 18.906.804,00
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 62.830,00	22,59	$ 1.419.329,70
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	$ 794.000,00	68,26	$ 54.198.440,00
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 535.725,00	50,65	$ 27.134.471,25
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 649.280,00	45,95	$ 29.834.416,00
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.865,00	6754,85	$ 73.391.445,25
ITEM NP.		ITEM NO PREVISTOS				
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 33.133,10	181,55821792	$ 6.015.586,59
				TOTAL	TOTAL	$ 212.184.217,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZAS:

POLIZAS VIGENTES AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	10/01/2023	ANEXO	0
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	27/12/2022	27/02/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	27/12/2022	27/02/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	27/12/2022	27/02/2023	$ 200.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	10/01/2023	ANEXO	0
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	27/12/2022	27/06/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	27/12/2022	27/02/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	27/02/2023	27/02/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	SIN AMPARO		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	SIN AMPAROS		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	1/03/2023	ANEXO	3
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

***ACTIVIDADES*:**

Durante el periodo comprendido del 13 de febrero y el 13 de marzo se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizo conformación del terreno con maquinaria.
- Se realizo retiro de material sobrante.
- Se realizo suministro, corte y figurado del acero necesario para la construcción de las losas en concreto.

PERSONAL DE OBRA:

El Contratista, durante el período al cual corresponde el presente Informe ha mantenido el siguiente personal en la Obra:

NOMBRE	CARGO
CESAR RINCON	DIRECTOR
MARCELA DURAN	RESIDENTE
RUTH AGUILAR	PROFESIONAL DE SALUD
DANIEL GAMEZ.	ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS
JAIME PABON	MAESTRO GENERAL

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

***HERRAMIENTAS*:**

- Pulidora
- Herramienta menor

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Guantes
- Gafas
- Tapa oídos
- Cascos.

INFORMACIÓN GENERAL

- Clima.

CLIMA

PERIODO:	FEBRERO - MARZO	AÑO	2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.		
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ		

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

FEBRERO - MARZO

DIA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ESTADO DEL TIEMPO																													
SOLEADO			x										x	x	x	x	x								x	x	x	x	x
NUBADO	x		x		x	x					x	x	x		x			x					x	x	x		x		
LLOVISNA			x	x							x	x			x								x	x			x		
LLUVIA	x	x		x		x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x	x						

DIAS LABORADOS	X
DIAS NO LABORADOS	X

LOS DIAS NO LABORADOS REPORTADOS EN ESTE CUADRO POR LLUVIAS OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO, DEBEN COINCIDIR DE MANERA EXACTA CON EL REPORTE ESCRITO EN BITACORA DE OBRA.

- Herramientas.

CONTROL MAQUINARIA EN OBRA

PERIODO:	FEBRERO - MARZO	AÑO	2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.		
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ		

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

FEBRERO - MARZO

MAQUINARIA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETRO EXCAVADORA DE LLANTA																									A	A			
MEZCLADORA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPACTADOR TIPO RANA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

LOS DIAS NO LABORADOS REPORTADOS EN ESTE CUADRO DURANTE EL PERIODO, DEBEN COINCIDIR DE MANERA EXACTA CON EL REPORTE ESCRITO EN BITACORA DE OBRA.

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

- Personal.

PERSONAL EN OBRA																												
PERIODO:	FEBRERO-MARZO			AÑO	2023																							
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE																											
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.																											
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ																											
CONTRATO DE OBRA No.	354 - 2022																											
OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA																											
FEBRERO-MARZO																												
PERSONAL	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIRECTOR DE OBRA	A		A							A			A						A	A				A					A
RESIDENTE DE OBRA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RESIDENTE SST		A							A		A							A				A	A	A					A
ESP. G. P.	A			A							A						A					A		A					A
UN (1) MAESTRO		A		A				A		A					A				A				A		A		A		A

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

BALANCE FINANCIERO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA								PORCENTAJE DE AVANCE				
CAPITULO 1.		PRILIMINARES						PERIODO 1		TOTAL		
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT	VALOR	CANT	TOTAL	AVANCE
No.	ICCU											
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1046,23	$ 1.227,00	$ 1.283.724,21		1046,23	$ 1.283.724,21	1046,23	$ 1.283.724,21	0,61%
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	177,03	$ 106.800,00	$ 18.906.804,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,59	$ 62.830,00	$ 1.419.329,70			$ -	0,00	$ -	0,00%
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	68,26	$ 794.000,00	$ 54.198.440,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	50,65	$ 535.725,00	$ 27.134.471,25			$ -	0,00	$ -	0,00%
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,95	$ 649.280,00	$ 29.834.416,00			$ -	0,00	$ -	0,00%
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6754,85	$ 10.865,00	$ 73.391.445,25		2200,00	$ 23.903.000,00	2200,00	$ 23.903.000,00	11,27%
ITEM NP.	ITEM NO PREVISTOS											
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	181,558	$ 33.133,10	$ 6.016.586,59			$ -	0,00	$ -	0,00%
					TOTAL	$ 212.184.217,00			$ 25.186.724,21		$ 25.186.724,21	11,87%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 212.184.217,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 01	**$ 25.186.724,21**
TOTAL EJECUTADO	**$ 25.186.724,21**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 186.997.492,79**
SUMAS IGUALES	**$ 212.184.217,00**

RICAURTE (CUNDI), MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
Celular:314 84689 Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

PORCENTAJE DE EJECUCION:

Durante el periodo del 13 de febrero y el 13 de marzo del 2023 se realizaron actividades que representaran el 11.87% de avance en el contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO:



CORTE Y FIGURADO DE ACERO



CONFORMACION DE VIA

Conclusiones:

Las lluvias presentadas durante la mayor parte del mes de febrero impidieron la correcta ejecución del contrato, por lo que los esfuerzos se centraron en el corte y figurado del 100% del acero necesario para la construcción de las losas, se espera mejoría en el clima para la continuación del contrato sin mayores contratiempos.

Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Nit. 900.480.705-7
R.L. Ing. Hernán Darío Giraldo Romero
C.C. 5.471.343 de Ocaña

RICAURTE (CUNDI), MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
Celular:314 84689 Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11229634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CONJ. MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78756693831		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023	
DÍAS DE MORA:	44				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2037635457

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 185.800	$ 10.000	$ 195.800
SUBTOTALES:										$ 185.800	$ 10.000	$ 195.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 7.800	$ 0	$ 145.000	$ 7.800	$ 0	$ 152.800
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 7.800	$ 0	$ 152.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 1.600	$ 0	$ 29.900
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 1.600	$ 0	$ 29.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSION							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 11229634	RINCON DURAN CESAR ARNOBY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 11229634	$ 28.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 378.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11229634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CONJ. MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7880526474	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES febrero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		58			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/05	NUMERO AUTORIZACIÓN:		2064785442
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA.		7875693631	FECHA DE PASO DE LA PLANILLA ASOCIADA.		2023/04/21

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.500	$ 52.500	$ 3.800	$ 0	$ 56.300
SUBTOTALES:									$ 52.500	$ 3.800	$ 0	$ 56.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11229634	RINCON DURAN CESAR ARNOBY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 11229634	$ 28.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 11229634	RINCON DURAN CESAR ARNOBY	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 11229634	$ 80.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	CC 11229634	RINCON DURAN CESAR ARNOBY	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS017-FAMISANAR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0	$ 11229634	$ 52.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 56.300

Ok pago del Saldo para Riesgo I

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110459922
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARCELA MENDEZ DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 88 # 4D-35 SUR AP 505 T2	TELÉFONO:	2708581
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7870717328	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/10	NUMERO AUTORIZACIÓN:	1962636250

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 185.600	$ 700	$ 186.300
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 700**	**$ 186.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 600	$ 0	$ 145.000	$ 600	$ 0	$ 145.600
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 145.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 300	$ 0	$ 81.100
SUBTOTALES:									**$ 80.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 81.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110459922	MENDEZ DURAN MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	111045992	$ 80.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 413.000

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

C116

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39573529		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888948	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1000000646	9448024239	1	2023/03/08	2023/03/10	BANCO BOGOTA	2	$412,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC 39573529	AGUILAR RUTH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

2023/03/10 10:53 AM

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-25, 09:56:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2023
Empresa	DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075627776
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053106233
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2098477468
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 471.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 15.600
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 145.000	$ 12.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 80.800	$ 6.800
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	1	$ 23.200	$ 2.000
		SubTotales:		$ 434.600	$ 36.600
		Total a Pagar:			$ 471.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-21, 10:13:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1053210696

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 21/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS		
Documento	NI900480705	**Dirección**	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148468958
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	**Identificación**	CC 5471343
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070598224	MARIA ALEJANDRA ARAGON	01	00	X																	0	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 33.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 270.667	$ 10.900	$ 5.500	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 11437263	JAIME ENRIQUE PABON BERNAL	01	00	X																	0	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 33.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 270.667	$ 10.900	$ 5.500	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 79963216	NELSON TRIANA CANTOR	01	00	X	X																0	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 270.667	$ 33.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 270.667	$ 10.900	$ 5.500	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 80493425	ALDEMAR MEJIA MORENO	01	00	X																	0	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 889.334	$ 111.200	6,960	$ 889.334	$ 61.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 889.334	$ 36.900	$ 17.800	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 395.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.701.335	$ 1.701.335	$ 1.701.335	$ 1.701.335	$ 272.500	$ 212.900	$ 118.600	$ 68.300	$ 34.300	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.900	$ 17.700	$ 775.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

INFORME No. 02 – CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

Ricaurte
NUESTRO COMPROMISO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA



Periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2023

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

INTRODUCCION:


A continuación, se describen las actividades que se realizaron en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas entre el Municipio de Ricaurte e Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 354-2022.

DESCRIPCCION DEL PROYECTO:

- localización:

Ricaurte es un municipio de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a 112 km al suroeste de Bogotá, y a una altitud de 284 m s. n. m. La temperatura media anual es de 27 °C.



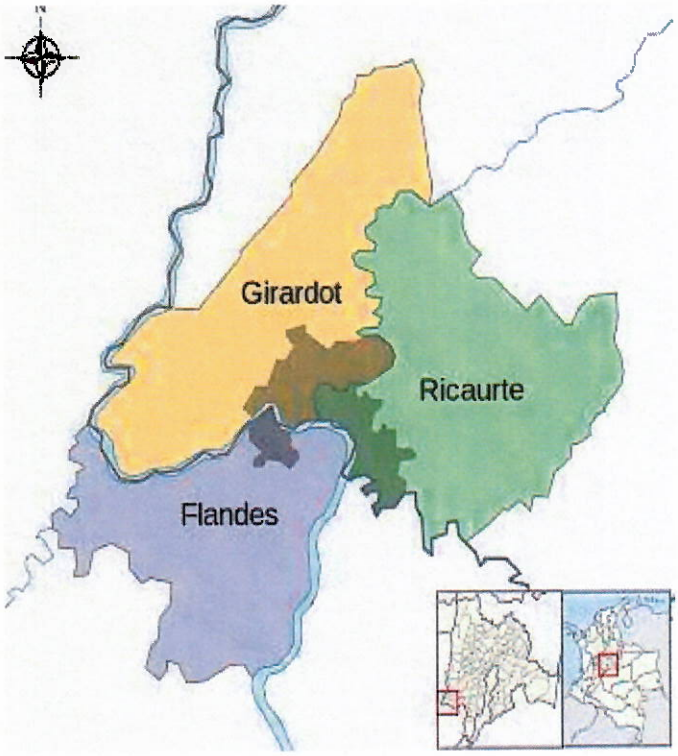

- **Superficie**: 130km2
- **Altitud**: 284msn
- **Temperatura**: 27 C°

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

Generalidades del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 354-2022	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA**
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S**
NIT.	**900.480.705-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**5.471.343 expedida en Ocaña.**
DIRECCIÓN	**MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA**
CIUDAD	**Ricaurte, Cundinamarca**
TELÉFONO	**3148468958**
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
VALOR	**DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C ($212.184.217.00)**
PLAZO	**DOS (2) MESES**
FECHA DE INICIO	**13 DE FEBRERO DE 2023**
FECHA PRORROGA No. 01	**5 DE ABRIL DE 2023 Y PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIO**
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA No. 01	**27 DE MAYO DE 2023**
OBJETO	**OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA**

ALCANCE DEL PROYECTO:

- ***Condiciones según acta de modificación No. 01***

CAPITULO 1.		PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PRILIMINARES			ACTA DE MODIFICACION No. 01	
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDADES A EJECUTAR	
No.	ICCU				CANT.	V/TOTAL
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.227,00	1046,23	$ 1.283.724,21
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	$ 106.800,00	177,03	$ 18.906.804,00
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 62.830,00	22,59	$ 1.419.329,70
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 794.000,00	68,26	$ 54.198.440,00
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 535.725,00	50,65	$ 27.134.471,25
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 649.280,00	45,95	$ 29.834.416,00
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.865,00	6754,85	$ 73.391.445,25
ITEM NP.		ITEM NO PREVISTOS				
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 33.133,10	181,55821792	$ 6.016.586,69
				TOTAL	TOTAL	$ 212.184.217,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZAS:

POLIZAS VIGENTES AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	SIN AMPARO		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	SIN AMPAROS		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	1/03/2023	ANEXO	3
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	10/04/2023	ANEXO	4
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	10/04/2023	ANEXO	4
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	28/09/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	31/05/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

***ACTIVIDADES*:**

Durante el periodo comprendido del 14 de marzo y el 13 de abril se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizo conformación del terreno con maquinaria.
- Se excavación de la vía a intervenir con maquinaria.
- Se realizo retiro de material sobrante.
- Se realizo excavación a mano en lugares donde la maquina no tenia acceso o donde se encontrara tubería de servicios públicos.
- Se realizo instalación de afirmado con maquinaria pesada de la vía en intervención.
- Se inicio con fundida de lozas en concreto reforzado y concreto ciclópeo.
- Se realizo suministro, corte y figurado del acero necesario para la construcción de las losas en concreto.

PERSONAL DE OBRA:
El Contratista, durante el período al cual corresponde el presente Informe ha mantenido el siguiente personal en la Obra:

NOMBRE	CARGO
CESAR RINCON	DIRECTOR
MARCELA DURAN	RESIDENTE
RUTH AGUILAR	PROFESIONAL DE SALUD
DANIEL GAMEZ.	ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS
JAIME PABON	MAESTRO
SEBASTIAN ROMERO	OFICIAL
MIGUEL GIRALDO	AYUDANTE

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

***HERRAMIENTAS*:**

- Pulidora
- Herramienta menor

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Guantes
- Gafas
- Tapa oídos
- Cascos.

INFORMACIÓN GENERAL

- Clima.

CLIMA

PERIODO:	MARZO - ABRIL		AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.				
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				
OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

MARZO - ABRIL

DIA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
ESTADO DEL TIEMPO																														
SOLEADO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NUBADO																														
LLOVISNA		X													X															
LLUVIA	X													X																

DIAS LABORADOS	X
DIAS NO LABORADOS	X

- Herramientas.

CONTROL MAQUINARIA EN OBRA

PERIODO:	MARZO - ABRIL		AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.				
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				
OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

MARZO - ABRIL

MAQUINARIA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
RETRO EXCAVADORA DE LLANTA											A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A					
MEZCLADORA																												A	A	A
COMPACTADOR TIPO RANA																												A	A	A

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

- Personal.

PERSONAL EN OBRA

PERIODO:	MARZO - ABRIL		AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.				
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CONTRATO DE OBRA No.	354 - 2022

OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

MARZO - ABRIL

PERSONAL	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
DIRECTOR DE OBRA	A		A							A			A						A	A				A					A	
RESIDENTE DE OBRA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
RESIDENTE SST		A							A		A							A				A	A	A				A	
ESP. G. P.	A			A							A						A					A		A				A	A
UN (1) MAESTRO	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
UN (1)OFICIALES	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	
UN (1)AYUDANTES	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

BALANCE FINANCIERO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA							PORCENTAJE DE AVANCE						
CAPITULO 1.	PRILIMINARES						PERIODO 1		PERIODO 2		TOTAL		
ITEM													
No.	ICCU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	TOTAL	AVANCE
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1046,23	$ 1.227,00	$ 1.283.724,21	1046,23	$ 1.283.724,21		$ -	1046,23	$ 1.283.724,21	0,61%
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	177,03	$ 106.800,00	$ 18.906.804,00		$ -	156,94	$ 16.761.192,00	156,94	$ 16.761.192,00	7,90%
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,59	$ 62.830,00	$ 1.419.329,70		$ -	18,94	$ 1.190.000,20	18,94	$ 1.190.000,20	0,56%
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	68,26	$ 794.000,00	$ 54.198.440,00		$ -	10,00	$ 7.940.000,00	10,00	$ 7.940.000,00	3,74%
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	50,65	$ 535.725,00	$ 27.134.471,25		$ -	7,00	$ 3.750.075,00	7,00	$ 3.750.075,00	1,77%
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,95	$ 649.280,00	$ 29.834.416,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6754,85	$ 10.865,00	$ 73.391.445,25	2200,00	$ 23.903.000,00	938,00	$ 10.191.370,00	3138,00	$ 34.094.370,00	16,07%
ITEM NP.	ITEM NO PREVISTOS												
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	181,558	$ 33.133,10	$ 6.015.586,59		$ -	173,00	$ 5.732.026,30	173,00	$ 5.732.026,30	2,70%
					TOTAL	$ 212.184.217,00		$ 25.186.724,21		$ 45.564.663,50		$ 70.751.387,71	33,34%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 212.184.217,00
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 01	$ 25.186.724,21
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 02	$ 45.564.663,50
TOTAL EJECUTADO	**$ 70.751.387,71**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 141.432.829,29**
SUMAS IGUALES	**$ 212.184.217,00**

PORCENTAJE DE EJECUCION:

Durante el periodo del 14 de marzo y el 13 de abril del 2023 se realizaron actividades que representaran el 33.34% de avance en el contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO:



EXCAVACION DE VIA CON MAQUINA



EXCAVACIONES EN MATERIAL A MANO



CORTE DE ACERO



INSTALACION DE AFIRMADO

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

Conclusiones:

- Durante el periodo no se presentaron situaciones que impidieran el normal desarrollo de las actividades, salvo algunos días con lluvias los cual fue necesario el cese de actividades.
- Todas las actividades fueron supervisadas por el residente de obra y el profesional universitario delegado por la alcaldía municipal.

Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Nit. 900.480.705-7
R.L. Ing. Hernán Darío Giraldo Romero
C.C. 5.471.343 de Ocaña

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

MARZO 2023

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11229634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CONJ. MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7878875951		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/04/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		204082848

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 185.600	$ 2.800	$ 188.400
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 2.800	$ 188.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 145.000	$ 2.200	$ 0	$ 147.200
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 2.200	$ 0	$ 147.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 500	$ 0	$ 28.800
SUBTOTALES:								$ 28.300	$ 500	$ 0	$ 28.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11229634	RINCON DURAN CESAR ARNOBY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 11229634	$ 28.300	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 364.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11229634
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CONJ MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7880526636
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			23
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/05
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA.			7878675851

TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES marzo AÑO 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2064776580
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA. 2023/04/24
N-CORRECCIONES

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0		$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.500	$ 52.500	$ 1.500	$ 0	$ 54.000
SUBTOTALES:									$ 52.500	$ 1.500	$ 0	$ 54.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110459922
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARCELA MENDEZ DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 # 40-35 SUR AP 505 T2	TELÉFONO:	2706681
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	Otras actividades especializadas para la construc	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7874087611	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2023
DÍAS DE MORA:			6		
FECHA PAGO (aaaammdd):			2023/04/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2026131595

MES marzo AÑO

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 185.600	$ 1.400	$ 187.000
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 1.400**	**$ 187.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 145.000	$ 1.100	$ 0	$ 146.100
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 146.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 600	$ 0	$ 81.400
SUBTOTALES:									**$ 80.800**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 81.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 7.000	$ 100	$ 7.100
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 100**	**$ 7.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110459922	MENDEZ DURAN MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO	19																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 111045992	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 421.600

Planilla Pagada
SOI

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39573529		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888948	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	30047923	9448572549	I	2023/04/12	2023/04/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$411,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 39573529	AGUILAR RUTH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$411,400	$0	$0	$411,400

2023/04/14 11:24 AM

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-07, 08:34:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075627776
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054995750
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2124746534
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 459.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 10.400
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 145.000	$ 8.200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 80.800	$ 4.600
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 23.200	$ 1.300
			SubTotales:	$ 434.600	$ 24.500
			Total a Pagar:		$ 459.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-21, 03:43:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1054134089

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 21/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS		
Documento	NI900480705	**Dirección**	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148468958
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	**Identificación**	CC 5471343
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070588224	MARIA ALEJANDRA ARAGON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 11437283	JAIME ENRIQUE PABON BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 80493425	ALDEMAR MEJIA MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 435.000	$ 242.400	$ 139.200	$ 69.600	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.547.400	$ 32.700	$ 1.580.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070598922		ROMERO CORONADO JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 8A - 31 BARRIO GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3105603861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2068621268	9450628475	N	2023/04/11	2023/05/08	BANCO DAVIVIENDA	27	$83,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800
1	CC	1070598922	ROMERO JUAN	23020 1	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS017	30	($1,160,000)	($145,000)	CCF22	30	($1,160,000)	($23,200)	14-11	0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	($353,800)
2	CC	1070598922	ROMERO JUAN	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$80,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070598922		ROMERO CORONADO JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 8A - 31 BARRIO GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3105603861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2068621268	9450628475	N	2023/04/11	2023/05/08	BANCO DAVIVIENDA	27	$83,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$2,700	$0	$83,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$2,700	$0	$83,500
TOTAL				1	$80,800	$2,700	$0	$83,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121917353		GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 #18-76	CUBARRAL-META	6755876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2017367282	9448734852	I	2023/04/17	2023/04/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Ciudad: CUBARRAL Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
1	CC	1121917353	GIRALDO MIGUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121917353		GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 #18-76	CUBARRAL-META	6755876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2017367282	9448734852	I	2023/04/17	2023/04/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$434,600	$0	$0	$434,600

2023/04/11 08:25 AM

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

INFORME No. 03 – CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

Ricaurte
NUESTRO COMPROMISO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA



Periodo comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo de 2023

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

INTRODUCCION:


A continuación, se describen las actividades que se realizaron en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas entre el Municipio de Ricaurte e Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 354-2022.

DESCRIPCCION DEL PROYECTO:

- localización:

Ricaurte es un municipio de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a 112 km al suroeste de Bogotá, y a una altitud de 284 m s. n. m. La temperatura media anual es de 27 °C.



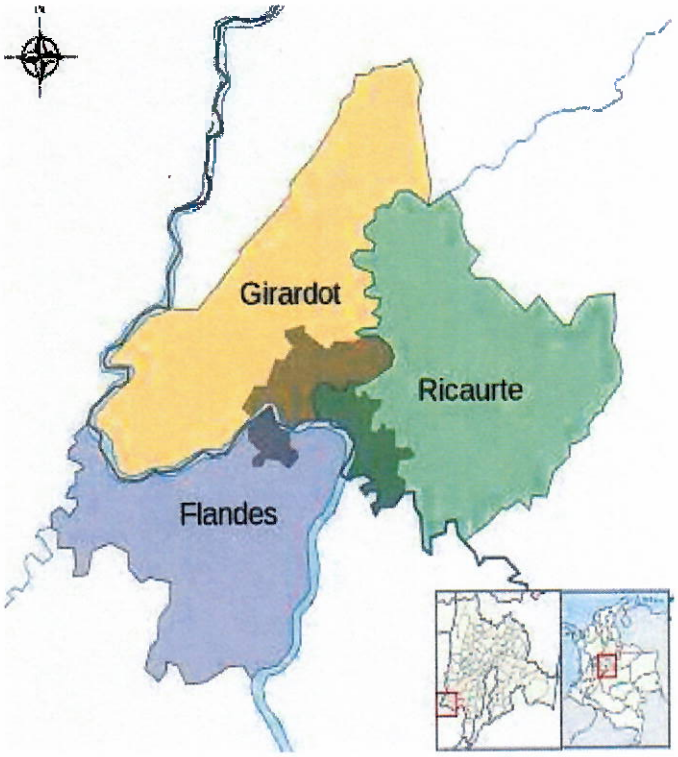

- **Superficie**: 130km2
- **Altitud**: 284msn
- **Temperatura**: 27 C°

Generalidades del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 354-2022	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
NIT.	900.480.705-7
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
CEDULA DE CIUDADANÍA	5.471.343 expedida en Ocaña.
DIRECCIÓN	MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
CIUDAD	Ricaurte, Cundinamarca
TELÉFONO	3148468958
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
VALOR	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C ($212.184.217.00)
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA PRORROGA No. 01	5 DE ABRIL DE 2023 Y PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA No. 01	27 DE MAYO DE 2023
OBJETO	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

ALCANCE DEL PROYECTO:

- ***Condiciones según acta de modificación No. 01***

CAPITULO 1.		PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PRILIMINARES			ACTA DE MODIFICACION No. 01	
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDADES A EJECUTAR	
No.	ICCU				CANT.	V/TOTAL
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.227,00	1046,23	$ 1.283.724,21
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	$ 106.800,00	177,03	$ 18.906.804,00
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 62.830,00	22,59	$ 1.419.329,70
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 794.000,00	68,26	$ 54.198.440,00
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 535.725,00	50,65	$ 27.134.471,25
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 649.280,00	45,95	$ 29.834.416,00
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.865,00	6754,85	$ 73.391.445,25
ITEM NP.		ITEM NO PREVISTOS				
1	VIAS 2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 33.133,10	181,55821792	$ 6.015.586,59
				TOTAL	TOTAL	$ 212.184.217,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZAS:

POLIZAS VIGENTES AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	SIN AMPARO		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	SIN AMPAROS		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	1/03/2023	ANEXO	3
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	10/04/2023	ANEXO	4
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	10/04/2023	ANEXO	4
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	28/09/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	31/05/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

***ACTIVIDADES*:**

Durante el periodo comprendido del 14 de abril y el 13 de mayo se realizaron las siguientes actividades:

- Se continuo con fundida de lozas en concreto reforzado
- Se continuaron actividades de fundida de concreto ciclópeo
- Se realizo suministro, corte y figurado del acero necesario para la construcción de las losas en concreto.

PERSONAL DE OBRA:
El Contratista, durante el período al cual corresponde el presente Informe ha mantenido el siguiente personal en la Obra:

NOMBRE	CARGO
CESAR RINCON	DIRECTOR
MARCELA DURAN	RESIDENTE
RUTH AGUILAR	PROFESIONAL DE SALUD
DANIEL GAMEZ.	ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS
JUAN SEBASTIAN ROMERO	MAESTRO
LUIS LOAIZA	OFICIAL
JUAN DAVID	AYUDANTE

***HERRAMIENTAS*:**

- Pulidora
- Herramienta menor

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Guantes
- Gafas

- Tapa oídos
- Cascos.

INFORMACIÓN GENERAL

- Clima.

CLIMA																													
PERIODO:	ABRIL - MAYO			AÑO	2023																								
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE																												
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.																												
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ																												
CONTRATO DE OBRA No.	354 - 2022																												
OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA																												
ABRIL - MAYO																													
DIA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
ESTADO DEL TIEMPO																													
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
NUBADO																													
LLOVISNA																				X									
LLUVIA																		X	X										X
DIAS LABORADOS	X																												
DIAS NO LABORADOS	X																												

- Herramientas.

CONTROL MAQUINARIA EN OBRA																													
PERIODO:	ABRIL - MAYO			AÑO	2023																								
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE																												
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.																												
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ																												
CONTRATO DE OBRA No.	354 - 2022																												
OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA																												
ABRIL - MAYO																													
MAQUINARIA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
HERRAMIENTA MENOR	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
MEZCLADORA	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A		A	A		A	A	A		A	A	A	A	A
ACTIVO	A																												
REPARACION	R																												
INACTIVO	I																												

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

- Personal.

PERSONAL EN OBRA

PERIODO:	ABRIL - MAYO	AÑO	2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE		
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.		
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ		

CONTRATO DE OBRA No.	354 - 2022

OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

ABRIL - MAYO

PERSONAL	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
DIRECTOR DE OBRA		A				A	A						A						A	A	A						A	A	
RESIDENTE DE OBRA	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
RESIDENTE SST	A			A	A	A					A	A	A	A					A	A	A	A					A	A	
UN (1) MAESTRO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
UN (1)OFICIALES	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
UN (1)AYUDANTES	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

BALANCE FINANCIERO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA							PORCENTAJE DE AVANCE							
CAPITULO 1.	PRELIMINARES						PERIODO 1		PERIODO 2		PERIODO 3		TOTAL	
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	TOTAL	AVANCE
No.	ICCU														
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1046,23	$ 1.227,00	$ 1.283.724,21	1046,23	$ 1.283.724,21		$ -			1046,23	$ 1.283.724,21	6,61%
2	VIAS 3.16	AFIRMADO	M3	177,03	$ 106.800,00	$ 18.906.804,00		$ -	156,94	$ 16.761.192,00	0,00	$ -	156,94	$ 16.761.192,00	7,96%
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,69	$ 62.830,00	$ 1.419.329,70		$ -	18,94	$ 1.190.000,20	1,00	$ 62.830,00	19,94	$ 1.252.830,20	0,59%
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 psi (bases)	M3	69,26	$ 794.000,00	$ 54.998.440,00		$ -	10,00	$ 7.940.000,00	28,70	$ 22.787.800,00	38,70	$ 30.727.800,00	14,48%
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	60,65	$ 636.725,00	$ 27.134.471,25		$ -	7,00	$ 3.750.875,00	20,00	$ 10.714.500,00	27,00	$ 14.464.575,00	6,82%
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,95	$ 649.296,00	$ 29.834.416,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6754,85	$ 10.865,00	$ 73.391.445,25	2200,00	$ 23.903.000,00	938,00	$ 10.191.370,00		$ -	3138,00	$ 34.094.370,00	16,07%
ITEM NP.	ITEM NO PREVISTOS														
1	VIAS 2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	181,558	$ 33.133,10	$ 6.016.596,69		$ -	173,00	$ 5.732.026,30	7,30	$ 241.971,63	180,30	$ 5.973.997,93	2,82%
					TOTAL	$ 212.184.217,00		$ 25.186.724,21		$ 45.564.663,50		$ 33.807.001,63		$ 104.558.389,34	49,28%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 212.184.217,00
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 01	$ 25.186.724,21
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 02	$ 45.564.663,50
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 03	$ 33.807.001,63
TOTAL EJECUTADO	$ 104.558.389,34
SALDO POR EJECUTAR	$ 107.625.827,66
SUMAS IGUALES	$ 212.184.217,00

RICAURTE (CUNDI), MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
Celular:314 84689 Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

PORCENTAJE DE EJECUCION:

Durante el periodo del 14 de abril y el 13 de mayo del 2023 se realizaron actividades que representaran el 49.28% de avance en el contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO:



LOSAS EN CONCRETO DE 3000PSI



CONCRETO CICLOPEO 40% RAJON



SOBREANCHOS EN CONCRETO CICLOPEO



REFUERZO PARA CUNETAS

Conclusiones:

- Durante el periodo se presentaron situaciones que impidieron el normal desarrollo de las actividades, como lo fue los inconvenientes en la entrega de materiales agregados por parte del proveedor de este material, así como fuertes lluvias en la región por el mes de abril.
- Todas las actividades fueron supervisadas por el residente de obra y el profesional universitario delegado por la alcaldía municipal.

Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Nit. 900.480.705-7
R.L. Ing. Hernán Darío Giraldo Romero
C.C. 5.471.343 de Ocaña.

RICAURTE (CUNDI), MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
Celular:314 84689 Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11229634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CONJ MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7880519788	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA.		16			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/25	NUMERO AUTORIZACIÓN:		2096456941

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 185.600	$ 3.600	$ 189.200
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 3.600**	**$ 189.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 145.000	$ 2.800	$ 0	$ 147.800
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 147.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 1.600	$ 0	$ 82.400
SUBTOTALES:									**$ 80.800**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 82.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 11229634	RINCON DURAN CESAR ARNOBY	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 11229634	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 419.400

S12

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110459922
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARCELA MENDEZ DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 86 # 4D-35 SUR AP 586 T2	TELÉFONO:	2706681
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7578648252	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		16			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/24	NUMERO AUTORIZACIÓN:		2099611595

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 185.600	$ 3.600	$ 189.200
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 3.600**	**$ 189.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 145.000	$ 2.800	$ 0	$ 147.800
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 2.800**	**$ 0**	**$ 147.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 1.600	$ 0	$ 82.400
SUBTOTALES:									**$ 80.800**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 82.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 7.000	$ 200	$ 7.200
SUBTOTALES:			**$ 7.000**	**$ 200**	**$ 7.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1110459922	MENDEZ DURAN MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$111045992	$ 80.800	30	$ 1.160.000	SCCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 426.600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39573529		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888948	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	38042581	9449938036	E	2023/05/09	2023/05/17	BANCO DE OCCIDENTE	8	$415,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC 39573529	AGUILAR RUTH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

2023/05/17 04:16 PM

Powered by CamScanner

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-07, 08:39:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075627776
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1055321763
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2124755620
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 445.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 4.400
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 145.000	$ 3.500
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 80.800	$ 2.000
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 23.200	$ 600
			SubTotales:	$ 434.600	$ 10.500
			Total a Pagar:		$ 445.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070598922		ROMERO CORONADO JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 8A - 31 BARRIO GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3105603861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2062396460	9450628163	I	2023/05/08	2023/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
1	CC	1070598922 ROMERO JUAN		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070598922		ROMERO CORONADO JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 8A - 31 BARRIO GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3105603861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2062396460	9450628163	I	2023/05/08	2023/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$434,600	$0	$0	$434,600

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-08, 08:44:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1054260792

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 06/05/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS		
Documento	NI900480705	**Dirección**	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148468958
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	**Identificación**	CC 5471343
Total Afiliados	16	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000126806	SANTIAGO MORENO MAHECHA	01	00	X																	0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 154.667	$ 19.400	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 3.100	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 69.000
CC 1003483199	JUAN DAVID CARVAJAL CARVAJAL	01	00	X																	0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 232.000	$ 29.000	6,998	$ 232.000	$ 16.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 232.000	$ 9.300	$ 4.700	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 103.400
CC 1007600156	BRAYAN STEVEN MOJICA CARDENAS	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 1088179003	BRANDON RAUL BAUTISTA VARGAS	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 425.334	$ 68.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 1070586224	MARIA ALEJANDRA ARAGON	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 1070624840	JHANCARLOS CARVAJAL MOJICA	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 1077032234	DIEGO ANDRES BARRAGAN SOGAMOSO	01	00	X																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 154.667	$ 19.400	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 3.100	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 69.000
CC 1108452142	HARRINSON STEVEN FERRO BOCANEGRA	01	00	X																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 773.334	$ 96.700	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.500	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 344.200
CC 1108452967	LUIS JEFFERSON LOAIZA MONTES	01	00	X																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 812.000	$ 101.500	6,960	$ 812.000	$ 56.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 812.000	$ 32.500	$ 16.300	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 361.300
CC 11205530	JOHN FREDY SOLARTE CARVAJAL	01	00	X																	0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 11306783	JOSE DANIEL VARON	01	03	X																	0	0	20	20	20	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 773.334	$ 96.700	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.500	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 220.400
CC 11310584	JUAN BAUTISTA ROMERO ORDOÑEZ	01	00	X																	0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 812.000	$ 130.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 812.000	$ 101.500	6,960	$ 812.000	$ 56.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 812.000	$ 32.500	$ 16.300	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 361.300
CC 11312934	VICTOR CALDERON BAUTISTA	01	00	X																	0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 11437283	JAIME ENRIQUE PABON BERNAL	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 80493079	ALEXANDER RODRIGUEZ LEAL	01	00	X																	0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 96.700	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.500	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 344.200
CC 80493425	ALDEMAR MEJIA MORENO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-08, 08:44:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1054260792

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 06/05/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS		
Documento	NI900480705	**Dirección**	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148468958
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	**Identificación**	CC 5471343
Total Afiliados	16	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000126806	SANTIAGO MORENO MAHECHA	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 154.667	$ 19.400	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 3.100	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 69.000
CC 1003483199	JUAN DAVID CARVAJAL CARVAJAL	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 232.000	$ 29.000	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 232.000	$ 9.300	$ 4.700	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 103.400
CC 1007600155	BRAYAN STEVEN MOJICA CARDENAS	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 1069179003	BRANDON RAUL BAUTISTA VARGAS	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 425.334	$ 68.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 1070566224	MARIA ALEJANDRA ARAGON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 1070624840	JHANCARLOS CARVAJAL MOJICA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 1077032234	DIEGO ANDRES BARRAGAN SOGAMOSO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 154.667	$ 19.400	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 3.100	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 69.000
CC 1106452142	HARRINSON STEVEN FERRO BOCANEGRA	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 773.334	$ 96.700	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.500	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 344.200
CC 1106452967	LUIS JEFFERSON LOAIZA MONTES	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 812.000	$ 101.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 812.000	$ 32.500	$ 16.300	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 361.300
CC 11205630	JOHN FREDY SOLARTE CARVAJAL	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 11306783	JOSE DANIEL VARON	01	03	X																0	0	20	20	20	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 773.334	$ 96.700	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.500	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 220.400
CC 11310584	JUAN BAUTISTA ROMERO ORDOÑEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 812.000	$ 130.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 812.000	$ 101.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 812.000	$ 32.500	$ 16.300	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 361.300
CC 11312934	VICTOR CALDERON BAUTISTA	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 53.200	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 425.334	$ 17.100	$ 8.600	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 189.500
CC 11437283	JAIME ENRIQUE PABON BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 80493079	ALEXANDER RODRIGUEZ LEAL	01	00	X																0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 96.700	6,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.500	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 344.200
CC 80493425	ALDEMAR MEJIA MORENO	01	00																	e	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

INFORME No. 04 – CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

Ricaurte NUESTRO COMPROMISO

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA



Periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 13 de junio de 2023

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

INTRODUCCION:


A continuación, se describen las actividades que se realizaron en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas entre el Municipio de Ricaurte e Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 354-2022.

DESCRIPCCION DEL PROYECTO:

- localización:

Ricaurte es un municipio de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a 112 km al suroeste de Bogotá, y a una altitud de 284 m s. n. m. La temperatura media anual es de 27 °C.



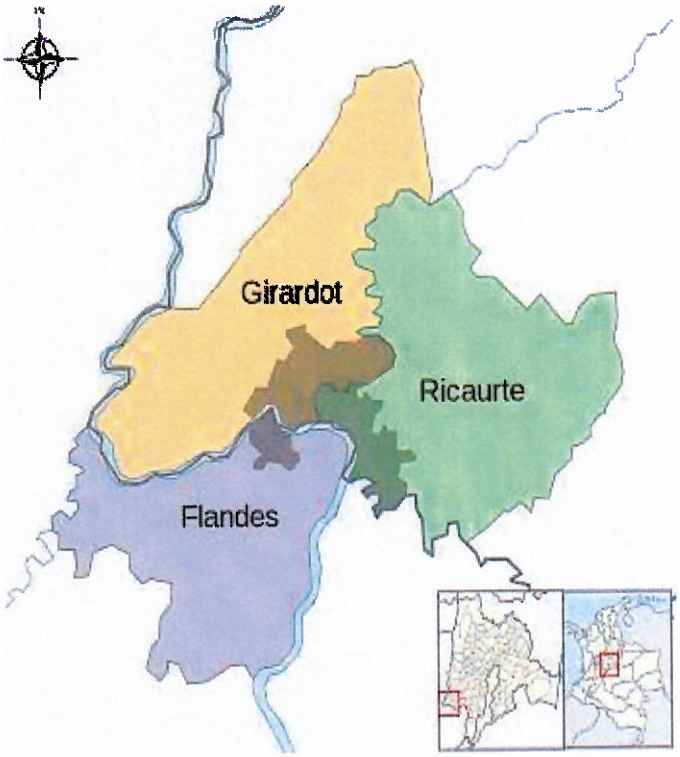

- **Superficie**: 130km2
- **Altitud**: 284msn
- **Temperatura**: 27 C°

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

Generalidades del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 354-2022	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA**
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S**
NIT.	**900.480.705-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**5.471.343 expedida en Ocaña.**
DIRECCIÓN	**MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA**
CIUDAD	**Ricaurte, Cundinamarca**
TELÉFONO	**3148468958**
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
VALOR	**DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C ($212.184.217.00)**
PLAZO	**DOS (2) MESES**
FECHA DE INICIO	**13 DE FEBRERO DE 2023**
FECHA PRORROGA No. 01	**5 DE ABRIL DE 2023 Y PLAZO DE 45 DIAS CALENDARIO**
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA No. 01	**27 DE MAYO DE 2023**
FECHA PRORROGA No. 02	**26 DE MAYO DE 2023 (UN (01) MES)**
FEHCA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA No. 02	**27 DE JUNIO DE 2023**
OBJETO	**OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA**

ALCANCE DEL PROYECTO:

- ***Condiciones según acta de modificación No. 01***

CAPITULO 1.		PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA			ACTA DE MODIFICACION No. 01	
		PRILIMINARES				
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDADES A EJECUTAR	
No.	ICCU				CANT.	V/TOTAL
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.227,00	1046,23	$ 1.283.724,21
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	$ 106.800,00	177,03	$ 18.906.804,00
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 62.830,00	22,69	$ 1.419.329,70
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 794.000,00	68,26	$ 54.198.440,00
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 535.725,00	50,65	$ 27.134.471,25
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 649.280,00	45,95	$ 29.834.416,00
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.865,00	6754,85	$ 73.391.445,25
ITEM NP.		ITEM NO PREVISTOS				
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 33.133,10	181,55821792	$ 6.015.586,59
				TOTAL	TOTAL	$ 212.184.217,00

POLIZAS:

POLIZAS VIGENTES AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	SIN AMPARO		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984			

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	16/04/2023	$ 200.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	1
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	SIN AMPAROS		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115			

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	17/02/2023	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	1/03/2023	ANEXO	3
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	14/08/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	16/04/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	10/04/2023	ANEXO	4
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	31/05/2023	$ 232.000.000,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	10/04/2023	ANEXO	4
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	28/09/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	31/05/2026	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	30/05/2023	ANEXO	5
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	30/06/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	30/06/2023	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046984	13/02/2023	30/06/2023	$ 232.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	30/05/2023	ANEXO	5
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	28/10/2023	$ 21.218.421,70
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	13/02/2023	30/06/2023	$ 10.609.210,85
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101176115	16/04/2023	15/04/2028	$ 42.436.843,40

***ACTIVIDADES*:**

Durante el periodo comprendido del 14 de mayo y el 13 de junio se realizaron las siguientes actividades:

- Se continuo con fundida de lozas en concreto reforzado
- Se continuaron actividades de fundida de concreto ciclópeo
- Se iniciaron actividades de fundida de cuneta en concreto reforzado de 2500PSI
- Se continuo con construcción de riostras en concreto reforzado
- Se realizo suministro, corte y figurado del acero necesario para la construcción de las losas en concreto.

PERSONAL DE OBRA:

El Contratista, durante el período al cual corresponde el presente Informe ha mantenido el siguiente personal en la Obra:

NOMBRE	CARGO
CESAR RINCON	DIRECTOR
MARCELA DURAN	RESIDENTE
RUTH AGUILAR	PROFESIONAL DE SALUD
DANIEL GAMEZ.	ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS
JUAN ROMERO	MAESTRO
SANTIAGO MAHECHA	OFICIAL
DIEGO BARRAGAN	AYUDANTE

***HERRAMIENTAS*:**

- trompo
- Herramienta menor

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Guantes
- Gafas
- Tapa oídos
- Cascos.

INFORMACIÓN GENERAL

- Clima.

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

CLIMA

PERIODO:	MAYO - JUNIO		AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.				
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

MAYO - JUNIO

DIA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
ESTADO DEL TIEMPO																														
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	
NUBADO																					X									
LLOVISNA																			X	X										X
LLUVIA																														

DIAS LABORADOS	X
DIAS NO LABORADOS	X

- Herramientas.

CONTROL MAQUINARIA EN OBRA

PERIODO:	MAYO - JUNIO		AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.				
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

MAYO - JUNIO

MAQUINARIA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
HERRAMIENTA MENOR	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
MEZCLADORA	A	A		A	A	A		A	A		A	A	A	A	A	A			A	A		A	A	A		A	A	A	A	A

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

- Personal.

PERSONAL EN OBRA

PERIODO:	MAYO - JUNIO	AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE			
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.			
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ			

CONTRATO DE OBRA No. 354 - 2022

OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCAOBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

MAYO - JUNIO

PERSONAL	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	31	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIRECTOR DE OBRA	A		A							A			A							A	A			A					A
RESIDENTE DE OBRA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RESIDENTE SST		A							A		A								A				A		A					A
ESP. G. P.	A			A							A						A						A							A
UN (1) MAESTRO		A		A				A		A					A					A				A		A		A		A
UN (1)OFICIALES	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
UN (1)AYUDANTES	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

BALANCE FINANCIERO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA							PORCENTAJE DE AVANCE										
CAPITULO 1.		PRILIMINARES					PERIODO 1		PERIODO 2		PERIODO 3		PERIODO 4		TOTAL		
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	TOTAL	AVANCE
No.	ICCU																
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1046,23	$ 1.227,00	$ 1.283.724,21	1046,23	$ 1.283.724,21		$ -				$ -	1046,23	$ 1.283.724,21	0,61%
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	177,03	$ 106.800,00	$ 18.906.804,00		$ -	156,94	$ 16.761.192,00	0,00	$ -		$ -	156,94	$ 16.761.192,00	7,90%
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,59	$ 62.830,00	$ 1.419.329,70		$ -	18,94	$ 1.190.000,20	1,00	$ 62.830,00	2,65	$ 166.499,50	22,59	$ 1.419.329,70	0,67%
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	68,26	$ 794.000,00	$ 54.198.440,00		$ -	10,00	$ 7.940.000,00	28,70	$ 22.787.800,00	25,92	$ 20.580.480,00	64,62	$ 51.308.280,00	24,18%
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	50,65	$ 535.725,00	$ 27.134.471,25		$ -	7,00	$ 3.750.075,00	20,00	$ 10.714.500,00	22,41	$ 12.005.597,25	49,41	$ 26.470.172,25	12,48%
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,95	$ 649.280,00	$ 29.834.416,00		$ -		$ -		$ -	30,69	$ 19.926.403,20	30,69	$ 19.926.403,20	9,39%
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6754,85	$ 10.865,00	$ 73.391.445,25	2200,00	$ 23.903.000,00	938,00	$ 10.191.370,00		$ -	3101,76	$ 33.700.622,40	6239,76	$ 67.794.992,40	31,95%
ITEM NP.	ITEM NO PREVISTOS																
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	181,558	$ 33.133,10	$ 6.015.586,59		$ -	173,00	$ 5.732.026,30	7,30	$ 241.871,63	0,83	$ 27.500,47	181,13	$ 6.001.398,40	2,83%
					TOTAL	$ 212.184.217,00		$ 25.186.724,21		$ 45.564.663,50		$ 33.807.001,63		$ 86.407.102,82		$ 190.965.492,16	90,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 212.184.217,00**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 01	**$ 25.186.724,21**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 02	**$ 45.564.663,50**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 03	**$ 33.807.001,63**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 04	$ 86.407.102,82
TOTAL EJECUTADO	**$ 190.965.492,16**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 21.218.724,84**
SUMAS IGUALES	**$ 212.184.217,00**

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

PORCENTAJE DE EJECUCION:

Durante el periodo del 14 de mayo y el 13 de junio del 2023 se realizaron actividades que representaran el 90% de avance en el contrato

REGISTRO FOTOGRAFICO:



SOBREANCHO EN CICLOPEO Y ACERO CUNETA



FUNDIDA DE CUNETA



HUELLAS EN CONCRETO, LOSA CENTRAL EN CICLOPEO Y SOBREANCHOS EN CICLOPEO

Conclusiones:

- Todas las actividades fueron supervisadas por el residente de obra y el profesional universitario delegado por la alcaldía municipal.

Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Nit. 900.480.705-7
R.L. Ing. Hernán Darío Giraldo Romero
C.C. 5.471.343 de Ocaña.

RICAURTE (CUNDI), MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
Celular:314 84689 Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUI[illegible]ÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GEN[illegible]RAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	11229634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO	PLANDES	DEPARTAMENTO	TOLIMA
DIRECCIÓN	CONJ MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO	1111111
TIPO APORTANTE	12-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7582163625	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN			2099440339

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 185.600	$ 3.600	$ 189.200
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 3.600	$ 189.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 145.000	$ 2.800	$ 0	$ 147.800
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 2.800	$ 0	$ 147.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 1.600	$ 0	$ 82.400
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 1.600	$ 0	$ 82.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110459922
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARCELA MENDEZ DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 68 # 4D-35 SUR AP 505 T2	TELÉFONO:	2706581
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7883228893	TIPO DE PLANILLA:			I-NDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/24	NUMERO AUTORIZACIÓN:			2194502841

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 185.600	$ 3.000	$ 188.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 3.000	$ 188.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 145.000	$ 2.500	$ 0	$ 147.500
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 2.500	$ 0	$ 147.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 1.300	$ 0	$ 82.100
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 1.300	$ 0	$ 82.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	1	$ 7.000	$ 100	$ 7.100
SUBTOTALES:			$ 7.000	$ 100	$ 7.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110459922	MENDEZ DURAN MARCELA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 111045992	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 425.300

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39573529		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888948	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	1000002139	9451390512	1	2023/06/08	2023/06/13	BANCO BOGOTA	5	$413,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	39573529	AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE																		230301	30	EPS002	30		0	14-11	30	0	No
Total	Afiliados(1)																												

2023/06/22 06:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39573529		AGUILAR TABAREZ RUTH JACQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 11 CASA 3	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8888948	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	1000002139	9451390512	I	2023/06/08	2023/06/13	BANCO BOGOTA	5	$413,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$500	$0	$81,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$500	$0	$81,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$900	$0	$145,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$900	$0	$145,900
TOTAL				1	$411,400	$2,500	$0	$413,900

2023/06/22 06:39 AM

585

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-07, 08:43:05 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	DANIEL FERNANDO GAMEZ CASTAÑEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1075627776
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1055321945
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2124763882
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 434.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 145.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 80.800	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 23.200	$ 0
			SubTotales:	$ 434.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 434.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-20, 11:09:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1055391034

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 20/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS		
Documento	NI900480705	**Dirección**	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148468958
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	**Identificación**	CC 5471343
Total Afiliados	22	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000126806	SANTIAGO MORENO MAHECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 1003483199	JUAN DAVID CARVAJAL CARVAJAL	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 966.667	$ 120.900	8,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 966.667	$ 38.700	$ 19.400	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 430.100
CC 1007800156	BRAYAN STEVEN MOJICA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 1068174196	ROBIN ORLANDO CALDERON CARVAJAL	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 19.400	8,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 154.667	$ 6.200	$ 3.100	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 69.000
CC 1069174670	CARLOS ALFONSO CALDERON ORTIZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 464.000	$ 58.000	8,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 464.000	$ 18.600	$ 9.300	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 206.500
CC 1069179003	BRANDON RAUL BAUTISTA VARGAS	01	00		X															0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 87.000	8,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 696.000	$ 27.900	$ 14.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 309.700
CC 1070586224	MARIA ALEJANDRA ARAGON	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 77.334	$ 9.700	8,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 1.600	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 34.600
CC 1070586627	ALEJANDRO ARIAS CALDERON	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 464.000	$ 58.000	8,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 464.000	$ 18.600	$ 9.300	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 206.500
CC 1070624840	JHANCARLOS CARVAJAL MOJICA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 1077032234	DIEGO ANDRES BARRAGAN SOGAMOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 1108452142	HARRINSON STEVEN FIERRO BOCANEGRA	01	00		X															0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 696.000	$ 87.000	8,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 696.000	$ 27.900	$ 14.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 309.700
CC 1108452967	LUIS JEFFERSON LOAIZA MONTES	01	00		X															0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 87.000	8,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 696.000	$ 27.900	$ 14.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 309.700
CC 11205530	JOHN FREDY SOLARTE CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 11306783	JOSE DANIEL VARON	01	03		X															0	0	18	18	18	(NIN-AF) NINGUNA APP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 696.000	$ 87.000	8,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 696.000	$ 27.900	$ 14.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 198.300
CC 11316584	JUAN BAUTISTA ROMERO ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 11312116	ISMAEL CRUZ ARAUJO	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 58.000	8,960	$ 464.000	$ 32.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 464.000	$ 18.600	$ 9.300	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 206.500
CC 11312934	VICTOR CALDERON BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	8,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 11324208	JUAN PABLO DONCEL	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 96.700	8,960	$ 773.334	$ 53.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.334	$ 31.000	$ 15.600	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 344.200
CC 11437263	JAIME ENRIQUE PABON BERNAL	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 77.334	$ 9.700	8,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 77.334	$ 3.100	$ 1.600	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 34.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO DE OBRA No 354-2022
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO RICAURTE	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.
Ricaurte NUESTRO COMPROMISO	Nit. 900 480 705-7
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.
	R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
	CONTRATO No. 354 - 2022
	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas SUPERVISORA
ACTA PARCIAL No. 01	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 212.184.217,00
FECHA ACTA DE INICIO	13/02/2023
ANTICIPO	N.A.
PLAZO	2 MESES
FECHA DE PRORROGA No. 01:	5/04/2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 01	27/05/2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 02	27/06/2023
FECHA PRESENTE ACTA	13/06/2023

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 01

CAPITULO 1.		PRILIMINARES					ACTA PARCIAL No. 01			
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT. ACUMULADAS	V/TOTAL
No.	ICCU									
1	VIAS 6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1046,23	$ 1.227,00	$ 1.283.724,21	1046,23	$ 1.283.724,21	1046,23	$ 1.283.724,21
2	VIAS 3.15	AFIRMADO	M3	177,03	$ 106.800,00	$ 18.906.804,00	156,94	$ 16.761.192,00	156,94	$ 16.761.192,00
3	VIAS 2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,59	$ 62.830,00	$ 1.419.329,70	22,59	$ 1.419.329,70	22,59	$ 1.419.329,70
4	VIAS 4.6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	68,26	$ 794.000,00	$ 54.198.440,00	64,62	$ 51.308.280,00	64,62	$ 51.308.280,00
5	VIAS 4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	50,65	$ 535.725,00	$ 27.134.471,25	49,41	$ 26.470.172,25	49,41	$ 26.470.172,25
6	VIAS 4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,95	$ 649.280,00	$ 29.834.416,00	30,69	$ 19.926.403,20	30,69	$ 19.926.403,20
7	VIAS 4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6754,85	$ 10.865,00	$ 73.391.445,25	6239,76	$ 67.794.992,40	6239,76	$ 67.794.992,40
ITEM NP.		ITEM NO PREVISTOS								
1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	181,55821792	$ 33.133,10	$ 6.015.588,59	181,13	$ 6.001.398,40	181,13	$ 6.001.398,40
					TOTAL	$ 212.184.217,00	TOTAL	$ 190.965.492,16		$ 190.965.492,16

VALOR CONTRATO	$ 212.184.217,00
ACTA PARCIAL No. 01 (A)	$ 190.965.492,16
VALOR POR EJECUTAR (B)	$ 21.218.724,84
% DE EJECUCION	90,00%
TOTAL A + B	$ 212.184.217,00
VALOR TOTAL	$ 212.184.217,00

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

96

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			CONTRATO N°		354-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.					
PLACA HUELLA			CAPITULO	1	ITEM	1
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE					UND	M2





DESCRIPCION	DIMENSIONES			M2	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
Tramo 1	3,90	50,30		196,17	196,17
Tramo 2	4,45	25,52		113,56	113,56
Tramo 3	3,90	35,00		136,50	136,50
Tramo 4	5,00	120,00		600,00	600,00
				SUBTOTAL	1046,23
				TOTAL	1046,23

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO			Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
NIT. 890.680.059-1							
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA						
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					CONTRATO N°	354-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.						
PLACA HUELLA				CAPITULO	1	ITEM	2
AFIRMADO						UND	M3





DESCRIPCION	DIMENSIONES			M2	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
Tramo 1	3,90	50,30	0,15		29,43
Tramo 2	4,45	25,52	0,15		17,03
Tramo 3	3,90	35,00	0,15		20,48
Tramo 4	5,00	120,00	0,15		90,00
				SUBTOTAL	156,94
				TOTAL	156,94

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C 5 471 343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO			Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
NIT. 890.680.059-1							
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA						
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				CONTRATO Nº		354-2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.						
PLACA HUELLA				CAPITULO	1	ITEM	3
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)						UND	M3







DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
En Tramo 1	0,70	45,00	0,25	1,00	7,88
En Tramo 2	0,70	63,20	0,25	1,00	11,06
Riostras Tramo 1 y 3	0,15	2,70	0,10	27,00	1,09
Riostras Tramo 2	0,15	3,25	0,10	8,00	0,39
Riostras Tramo 4	0,15	3,60	0,10	38,00	2,17
				SUBTOTAL	22,59
				AJUSTE	
				TOTAL	22,59

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.489.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO			Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL
NIT. 890.680.059-1							
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA						
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					CONTRATO N°	354-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.						
PLACA HUELLA				CAPITULO	1	ITEM	4
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)						UND	M3





DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
Huellas en concreto Tramos 1,2,3 y 4	0,90	3,00	0,15	140,00	56,70
Riostras Tramo 1 y 3	0,15	2,70	0,25	25,00	2,53
Riostras Tramo 2	0,15	3,25	0,25	8,00	0,98
Riostras Tramo 4	0,15	3,80	0,25	31,00	4,42
				SUBTOTAL	64,62
				TOTAL	64,62

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.488.796-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5 471.343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

594

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO			Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL	
NIT. 890.680.059-1								
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA							
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA						CONTRATO N°	354-2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.							
PLACA HUELLA				CAPITULO		1	ITEM	5
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES							UND	M3





DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
Huella central con piedra rajon Tramos 1, 2, 3 y 4	0,90	3,00	0,15	73,00	29,57
Sobreancho en concreto ciclopeo Tramo 2	0,55	3,00	0,15	5,00	1,24
Sobreancho en concreto ciclopeo Tramo 2	0,55	1,60	0,15	1,00	0,13
Sobreancho en concreto ciclopeo Tramo 2 (Triángulo)	0,55	1,40	0,15	0,50	0,06
1. Empedrado desague Tramo 2	0,56	2,94	0,15	1,00	0,25
2. Empedrado desague Tramo 2	1,30	2,94	0,15	0,50	0,29
3. Empedrado desague Tramo 2	0,56	1,45	0,15	0,50	0,06
4. Empedrado desague Tramo 2	0,56	1,45	0,15	1,00	0,12
5. Empedrado desague Tramo 2	1,20	1,44	0,15	0,50	0,13
Sobreanchos en concreto ciclopeo Tramo 4 (ambos costados)	0,55	3,00	0,15	71,00	17,57
				SUBTOTAL	49,41
				TOTAL	49,41

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C C 5 471.343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.

CONTRATO N°	354-2022			
PLACA HUELLA	CAPITULO	1	ITEM	6
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR			UND	M3



DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
Cuneta Tramo 1, 2, 3 y 4 costado izquierdo	0,45	230,82	0,15	1,00	15,58
Cuneta Tramo 1, 2, 3 y 4 costado derecho	0,45	218,00	0,15	1,00	14,72
Cuneta final de placa huella					
Desarrollo de cuneta	0,45	5,80	0,15	1,00	0,39

SUBTOTAL	30,69
AJUSTE	
TOTAL	30,69

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			CONTRATO N°		354-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.					
PLACA HUELLA			CAPITULO	1	ITEM	7
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI					UND	KG





DESCRIPCION	DIMENSIONES				KG	MEDIDA TOTAL
	#	LONG(m)	No. ELEM/HUELLA	No. Huellas		
Acero huellas						
transversal	4	1,00	15,00	140,00	0,996	2091,60
longitudinal	4	3,00	5,00	140,00	0,996	2091,60
Acero cuneta						
longitudinal izq	3	220,00	3,00	1,00	0,56	369,60
transversal izq	3	0,70	1154,00	1,00	0,56	452,37
longitudinal der	3	220,00	3,00	1,00	0,56	369,60
transversal der	3	0,70	1174,00	1,00	0,56	460,21
Acero Viga riostras						
Riostras Tramo 1 y 3 (2,7ml)	4,00	3,10	2,00	25,00	0,996	154,38
flejes	3,00	0,23	13,00	26,00	0,56	43,53
Riostras Tramo 2 (3,25ml)	4,00	3,65	2,00	8,00	0,996	58,17
flejes	3,00	0,23	16,00	8,00	0,56	16,49
Riostras Tramo 4 (3,8ml)	4,00	4,20	2,00	12,00	0,996	100,40
flejes	3,00	0,23	19,00	13,00	0,56	31,81
					SUBTOTAL	6239,76
					TOTAL	6239,76

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5 471 343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

009

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	13	MM	6	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LAS VARAS AL SECTOR SAN MARCOS CAMELLON LA PAUJILA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			CONTRATO N°		354-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.					
PLACA HUELLA			CAPITULO	1	ITEM N.P.	1
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)					UND	M3





DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
Tramo 1	3,90	50,30	0,155	1,00	30,41
Tramo 2	4,45	25,52	0,18	1,00	20,44
Tramo 3	3,90	35,00	0,15	1,00	20,48
Tramo 4	5,00	120,00	0,183	1,00	109,80
				SUBTOTAL	181,13
				AJUSTE	
				TOTAL	181,13

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MONICA MALAGON
Profesional Universitario de apoyo SIOP

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

YO HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.471.343 expedida en Ocaña, en mi calidad de Representante Legal de INGENIERA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS

C E R T I F I C O:

Que la empresa INGENIERA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS identificada con el NIT 900480705-7, se encuentra totalmente al día con sus liquidaciones y pagos de prestaciones sociales, de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales del personal activo y que ya no se encuentran vinculado a la empresa durante los últimos 6 meses. Se expide en la ciudad de Girardot, para efectos Legales, a los catorce (14) días del mes de JUNIO del 2023

Cordialmente

R.L. Ing HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S
CC 5.471.343 expedida en Ocaña
