	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/06/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales - SGI / Grupo Grandes Proyectos de Gestión vial - GGPV **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1968 de 2020 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL -SAN GIL - PALENQUE Y BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2327 DE 2020 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GESTION VIAL

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 31/07/2021 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de abril de 2021 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	16/04/2021	Modificación de clausula séptima - Apropiación presupuestal.
2	23/12/2021	Modificación de clausula séptima - Apropiación presupuestal y modificación de alcance del contrato.
3	28/02/2022	Modificación de clausula séptima - Apropiación presupuestal.
4	29/12/2022	Modificación de clausula séptima - Apropiación presupuestal.
5	28/04/2023	Modificación de clausula séptima - Apropiación presupuestal.

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	29/07/2022	01/08/2022	31/12/2022
2	29/12/2022	01/01/2023	30/04/2023
3	28/04/2023	01/05/2023	30/06/2023
3	26/06/2023	01/07/2023	31/08/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-ago-23
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 85.221.396.118,00 **50% EN SMMLV:** 46901
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	29/07/2022	$ 19.200.000.000	19200

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 104.421.396.118,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. DT-CCSA-2023 2313 de fecha 04 de junio de 2023, el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Aclarar el alcance del Contrato No. 1968 de 2020, debido a que se proyecta aclarar el Alcance - Apéndice A de la Licitación Pública INVIAS No. LP-DO-SRN-060-2020 de la siguiente manera:
PARAGRAFO ACLARATORIO: se aclara que las obligaciones relacionadas con Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario finalizarán el 30 de junio de 2023, en consecuencia a partir del 01 de julio de 2023 no le serán exigibles al contratista obligaciones relacionadas con Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con la ejecución del contrato 1968 de 2020.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.10 Fecha: 01/03/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Mantenimiento rutinario	$ 9.202.835.508,00	$ 12.772.398.754,00	NA	$ 12.772.398.754,00

FECHA: 04/06/2023 (Día / Mes / Año)

Mantenimiento periódico	$ 43.990.950.441,00	$ 59.865.406.610,00	NA	$ 59.865.406.610,00
Obras mayores	$ 17.485.276.053,00	$ 13.460.884.819,00	NA	$ 13.460.884.819,00
Servicios al usuario	$ 10.267.936.037,00	$ 14.159.743.938,00	NA	$ 14.159.743.938,00
Señalización	$ 2.414.673.880,00	$ 3.109.551.847,00	NA	$ 3.109.551.847,00
Atención de obras de emergencia	$ 1.859.724.199,00	$ 1.053.410.150,00	NA	$ 1.053.410.150,00
Valor Total	**$ 85.221.396.118,00**	**$ 104.421.396.118,00**	**NA**	**$ 104.421.396.118,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de: FEBRERO (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 89,31%

contra el avance programado del: 84,60%

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 72.220.051.000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 73.602.690.000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 78.243.768.047,00

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ 40.500.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $34.408.627.119,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $6.091.372.881,00

Valor facturado (Incluido IVA) a: FEBRERO (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 82.283.264.586,00

Último mes facturado: feb-23 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $22.138.131.532,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Se encuentran en trámite lo siguiente:

Mediante memorando SGI-GGPV 42573 del 07/06/2023, la Unidad Ejecutora remitió a la SGCP Solicitud de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio - PAS contra el contratista Consorcio Corredor San Alberto en razón del incumplimiento en la corrección de defectos observados en los trabajos realizados en el desarrollo del contrato No 1968 de 2020.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Debido a que durante el periodo de tiempo inicialmente pactado, así como durante las prórrogas aprobadas y suscritas a la fecha se cumplió con la totalidad del objeto del contrato en lo correspondiente a los capítulos de Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario, actividades en las cuales se agotarán los recursos que se pactaron al 30 de junio de 2023.

Así mismo se evidencia que durante el periodo de prorroga solicitado entre el 01 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2023 del contrato 1968-2020 no se ejecutarán los capítulos de Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario porque ya se agotó el monto contractualmente pactado para ello y se cumplió con dichos componentes durante el periodo inicialmente pactado y sus prorrogas

En este sentido, se considera necesario realizar la Aclaracion al apendice A en el sentido de informar que al haber sido ejecutados en su totalidad dichas actividades y a que dichos rubros fueron agotados a cabalidad, no serán exigibles las obligaciones relacionadas con las actividades de: “mantenimiento rutinario” y “servicio de atención al usuario” en el alcance del contrato tal como se dispuso en el Apéndice A - Alcance de la Licitación Pública INVIAS No. LP-DO-SRN-060-2020. Asimismo, se debe indicar que en el mes de junio de 2023 se prevé ejecutar la totalidad de recursos correspondientes a Mantenimiento Rutinario y Servicio de Atención al Usuario. Finalmente se precisa que la reducción del alcance del objeto es solo relativa al plazo de prórroga, debido a que dentro del plazo de ejecución inicialmente pactado y las prorrogas anteriores se ejecutó la totalidad del alcance del objeto del contrato.

De otra parte, mantener la totalidad del alcance del objeto solo para ejecutar las obras faltantes, implicaría un mayor gasto de interventoría, lo cual supera el presupuesto actual de la interventoría.

JURÍDICA:

En atención a que las actividades de Mantenimiento Rutinario y de Servicios de Atención al Usuario serán ejecutadas en su totalidad hasta el 30 de junio de 2023, se requiere aclarar el alcance del objeto del contrato, en el sentido de informar que dichas actividades fueron ejecutadas a cabalidad y por lo tanto, no podrá ser exigible el cumplimiento de dichas actividades al contratista; situación que encuentra sustento en los considerandos técnicos, financieros y ambientales presentados en la solicitud; En ese sentido, la aclaración del alcance del Contrato 1968 de 2020, tiene como fundamento el cumplimiento contractual de dichas actividades, las cuales durante el plazo de la prórroga solicitada no requieren ser ejecutadas. En conclusión, dicha aclaración no afecta el objeto del contrato puesto que su alcance continúa igual que como fue pactado originalmente en todo lo demás.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

No Aplica

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

A partir de los saldos disponibles se garantiza la terminación de las obras en ejecución de acuerdo a su alcance físico, sin la necesidad de vincular recursos adicionales para el contrato.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

No Aplica

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

No Aplica

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/06/2023
(Día / Mes / Año)

Firma
Nombre: JORGE ALBERTO GONGORA MASMELA
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
Matrícula Profesional No.: 13202-13007.

Firma
Nombre: MAYRON A. VERGEL ARMENTA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: C.C. No. 3.957.226

Vo.Bo.Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 2726 CNG

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Director Territorial
Matricula No.: 15219-30424 BYC

Vo.Bo.Firma
Nombre: GABRIEL ANDRÉS VELANDIA GARCÍA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-212087 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSE DAVID MARTINEZ DEL RIO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

DT-CCSA-2023-2313

CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

Bucaramanga, 04 de junio del 2023

Señores:
CONSORCIO GESTION VIAL
Atn. Ing. JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Director de interventoría
Carrera 24A # 101 – 96, Bucaramanga – Santander
direccion@cgvial.com

REFERENCIA: **CONTRATO 1968 DE 2020 – "GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATE - PUENTE NACIONAL - SAN GIL - PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694"**

Asunto: Solicitud de aclaración 01 del Contrato 1968 de 2020.

Respetado Ingeniero,

Por medio de la presente nos permitimos poner de presente que durante el periodo de tiempo inicialmente pactado, así como durante las prórrogas aprobadas y suscritas a la fecha se cumplió con la totalidad del objeto del contrato en lo correspondiente a los capítulos de Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario, capítulos en los cuales se agotarán la totalidad de los recursos que se pactaron hasta el 30 de junio de 2023.

Así mismo, llamamos la atención en cuanto a que se evidencia que durante el periodo de prorroga solicitado entre el 01 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2023, no se ejecutarán los capítulos de Mantenimiento Rutinario y de Servicios de Atención al Usuario dentro del alcance del objeto del contrato 1968-2020, esto por cuanto ya se agotaron los montos contractualmente pactados para dichas actividades, es decir que las actividades previstas en dichos componentes ya se cumplieron en su totalidad durante el término contractual inicialmente pactado así como en lo que a las prórrogas se refiere.

En este orden de ideas, se solicita respetuosamente incluir un parágrafo aclaratorio al Apéndice A de la Licitación Pública INVIAS No. LP-DO-SRN-060-2020 en el que se indique lo siguiente:

> PARAGRAFO ACLARATORIO: se aclara que las obligaciones relacionadas con Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario finalizarán el 30 de junio de 2023, en consecuencia, a partir del 01 de julio de 2023 no le serán exigibles al contratista obligaciones relacionadas con Mantenimiento Rutinario y Servicios de Atención al Usuario.

Como soporte a lo solicitado, de manera atenta nos permitimos anexar la siguiente documentación:

- MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra

Estaremos atentos a brindar la información que considere necesaria y a la aprobación del plazo contractual solicitado en la presente comunicación para proceder de conformidad.

Cordialmente,



Ing. JOSE ARLET HERRERA CUELLAR
Director de Obra.
CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO.

Copia.	Ing. Mayron Vergel:	Representante Legal Consorcio Gestión Vial
	Ing. Juan José Oyuela:	Director Nacional del Instituto Nacional de Vías
	Ing. Alvaro Ruíz:	Gerente de Proyecto INVIAS
	Ing. Gabriel Velandia:	Gestor Proyecto INVIAS
	Ing. Carlos Parra:	Supervisor Contrato Consorcio Gestión Vial

Archivo CCSA

CONSORCIO GESTIÓN VIAL

175-1-4462

Bucaramanga, 05 de junio de 2023

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del contrato de interventoría No 2327 de 2020
atencionciudadano@invias.gov.co
Floridablanca - Santander

REFERENCIA: Contrato No. 2327 de 2020. INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694.

ASUNTO: *Solicitud de Aclaración No 1 al contrato No 1968 de 2020.*

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta interventoría informa que el contratista Consorcio Corredor San Alberto a cargo de la ejecución del contrato No 1968 de 2020 solicitó mediante comunicado DT-CCSA-2023-2313 del 04 de junio de 2023 la aclaración No. 1 al contrato No 1968 de 2020, con fundamento en lo siguiente:

> *"(…) durante el periodo de prorroga solicitado entre el 01 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2023, no se ejecutarán los capítulos de Mantenimiento Rutinario y de Servicios de Atención al Usuario dentro del alcance del objeto del contrato 1968-2020, esto por cuanto ya se agotaron los montos contractualmente pactados para dichas actividades, es decir que las actividades previstas en dichos componentes ya se cumplieron en su totalidad durante el término contractual inicialmente pactado así como en lo que a las prórrogas se refiere. (…)"*

El Consorcio Corredor San Alberto hace claridad en que la aclaración requerida se solicita únicamente para dejar constancia que a partir de la prórroga solicitada, es decir a partir del 1 de julio de 2023 dichas actividades no serán ejecutadas y que por lo tanto su cumplimiento no podrá ser exigible, es por ello que se requiere dicha aclaración.

Por lo anterior, el Consorcio Gestión Vial manifiesta que, se realizó estudio y análisis de la solicitud de aclaración que presenta el contratista Consorcio Corredor San Alberto y se considera viable y necesaria para el contrato No 1968 de 2020, en ese orden de ideas se expone que para la efectiva culminación del contrato No 1968 de 2020 se requiere la aclaración del alcance del objeto del contrato previsto en el Apéndice A.

Se anexan los siguientes documentos para la presentación ante el comité de contratación:

- Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga contrato de Obra
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento garantías contractuales contrato de obra.

CONSORCIO GESTIÓN VIAL

175-1-4462

La información se envía por medio del siguiente enlace:
Anexo 175-1-4462

Sin otro en particular,

Atentamente,

CONSORCIO GESTIÓN VIAL
JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado.
C.C.: Gestor Técnico del proyecto gavelandia@invias.gov.co
Director Territorial (E) opatino@invias.gov.co
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales aeruiz@invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Santander

CONTRATO DE OBRA No. 1968 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

OBJETO DEL CONTRATO:

GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA - UBATE- PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694

FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2021

PLAZO INICIAL: 15,1 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 85.221.396.118,00

VALOR ACUMULADO: $ 104.421.396.118,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.309.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.309.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2327 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GESTION VIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	8%	$ 8.522.139.611	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16%	$ 17.044.279.234	31	12	2020	31	7	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	24%	$ 25.566.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1 y 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/04/2021

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 4.261.069.810,00	31	12	2020	31	7	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100031082 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/04/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.522.139.612	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.044.279.234	31	12	2020	26	11	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 25.566.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/04/2021

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 4.261.069.810,00	20	4	21	18	11	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000031082 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/04/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.522.139.612	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.044.279.234	31	12	2020	26	11	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 25.566.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/04/2021

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 y 2 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 4.261.069.810,00	20	4	21	18	11	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000031082 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/04/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 8.522.139.612	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 17.044.279.234	31	12	2020	26	11	25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 25.566.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/07/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 4.261.069.810,00	20	4	21	18	11	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000031082 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/07/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.442.139.612	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 20.884.279.224	31	12	2020	31	12	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 31.326.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/08/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 5.221.069.805,90	20	4	21	31	12	2022
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000031082 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/08/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.442.139.612	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 20.884.279.224	31	12	2020	30	4	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 31.326.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 5.221.069.805,90	20	4	21	30	4	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000031082 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	6 (Mes)	2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 5 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.442.139.612	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 42.610.698.059	31	12	2020	LIQUIDACIÓN CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 20.884.279.224	31	12	2020	30	6	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 31.326.418.835	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO OBRA		
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 392.700.000	31	12	2020	5 AÑOS RECIBO EST Y DIS		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100148914

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 5 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 5.221.069.805,90	20	4	21	30	6	23
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-1000031082 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

El contrato de Obra No. 1968-2020 cuenta con la garantía de Cumplimiento No. NB–100148914 y de RCE No. NB-100031082 de la aseguradora SEGUROS MUNDIAL la cual ha emitido los siguientes anexos:

- Contrato Principal, amparada por la garantía de Cumplimiento bajo Anexo 1 y 2 y garantía de RCE amparada bajo Anexo 1.
- Orden de Inicio, amparada por la garantía de Cumplimiento bajo Anexo 4 y garantía de RCE amparada bajo Anexo 6.
- Modificación 1, 2 y 3, amparada por la garantía de Cumplimiento bajo Anexo 6 y garantía de RCE amparada bajo Anexo 9.
- Prorroga 1 y Adición 1, amparada por la garantía de Cumplimiento bajo Anexo 7 y garantía de RCE amparada bajo Anexo 10.
- Prorroga 2 y Modificación 4, amparada por la garantía de Cumplimiento bajo Anexo 10 y garantía de RCE amparada bajo Anexo 13 (Enviada mediante SGI-GGPV 30965 del 26/04/2023 y pendiente de aprobación por parte de la SGCP).
- Prorroga 3 y Modificación 5, amparada por la garantía de Cumplimiento bajo Anexo 11 y garantía de RCE amparada bajo Anexo 14 (Enviada mediante SGI-GGPV 40061 del 30/05/2023 y pendiente de aprobación por parte de la SGCP).

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JOSE LUIS USUGA GOMEZ
Director de la Interventoría Consorcio Gestión Vial
Matrícula No.: 0820235362 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCION JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOSADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

CONTRATO No. 1968 DE 2020

CONTRATISTA/ INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO con NIT. 901.442.170-9

OBJETO: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:31/12/2020

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31/07/2022

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: 31/12/2022

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $104.421.396.118.00

VALOR ADICIONAL: $19.200.000.000.00 | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 858222 DEL 02/08/2022

DOCUMENTO QUE AMPARA

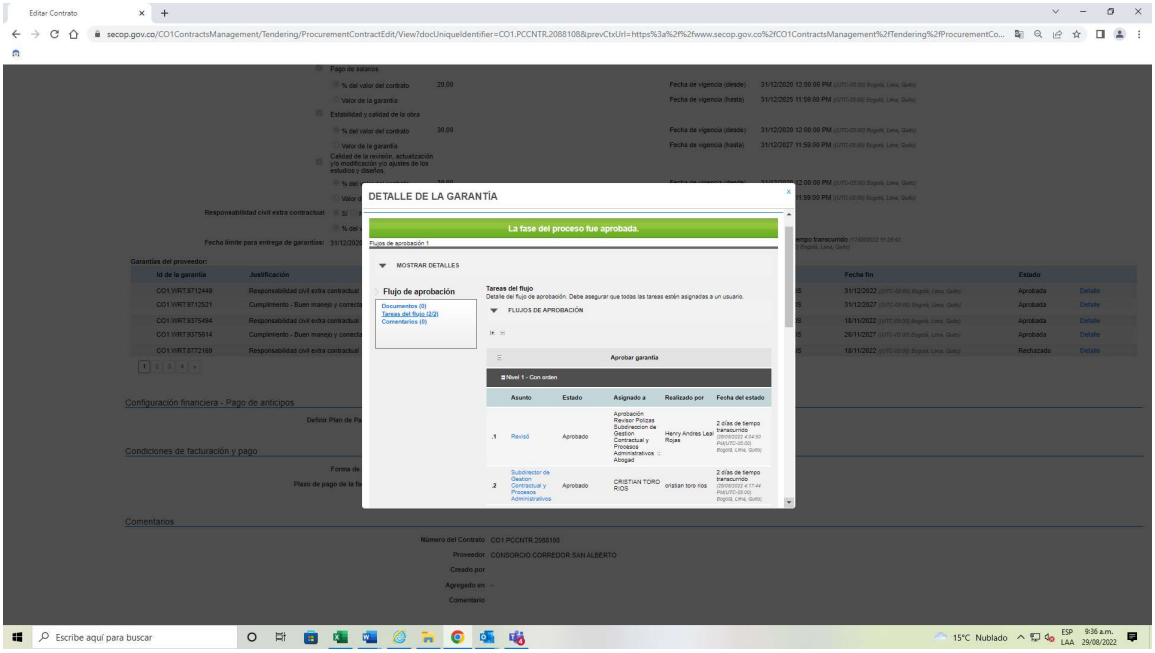
-ADICION 1 PRORROGA 1 DEL 29/07/2022

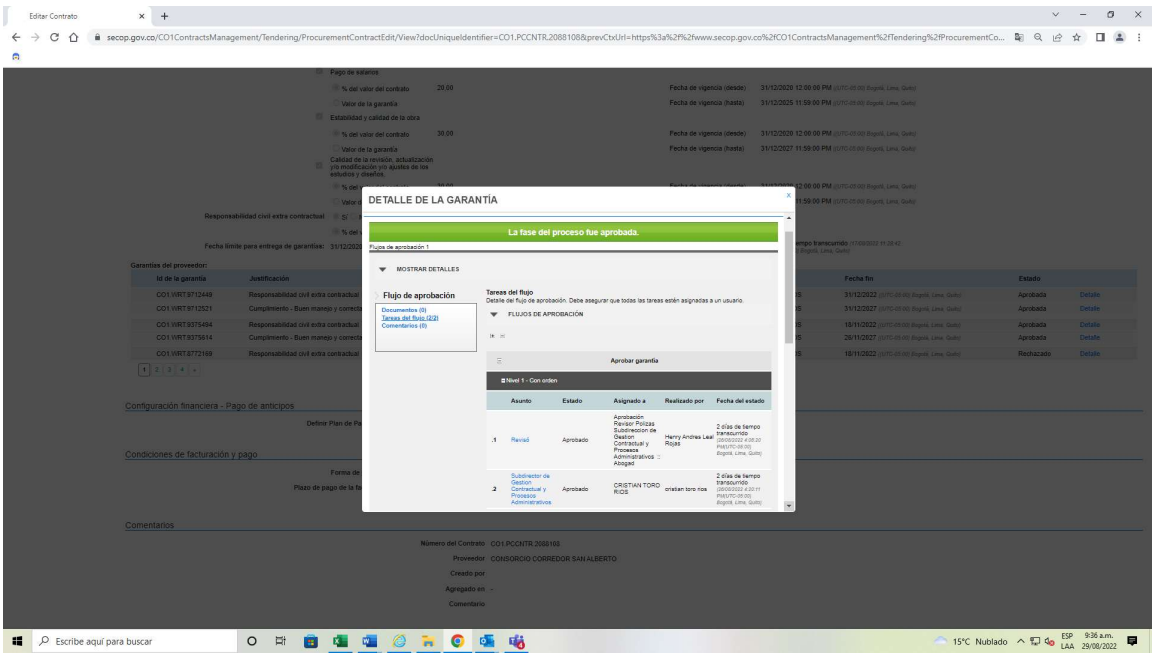
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No: NB-100148914		**Anexo: 7**		**FECHA: 16/08/2022**	**Aseguradora:**	**Mundialde Seguros S.A.**	
Cumplimiento del contrato	DESDE:	31/12/2020	HASTA:	hasta la liquidación del contrato	VALOR:	$10.442.139.611.80	
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo	DESDE:	31/12/2020	HASTA:	hasta la liquidación del contrato	VALOR:	$ 42.610.698.059.00	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	DESDE:	31/12/2020	HASTA:	31/12/2025	VALOR:	$ 20.884.279.223.60	
Estabilidad y Calidad de las Obras	Con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las Obras, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría				VALOR:	$ 31.326.418.835.40	
Calidad de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	Con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños y/o elaboración de cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial				VALOR:	$ 392.700.000.00	
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: NB-100031082		**Anexo: 10**		**FECHA: 16/08/2022**	**Aseguradora:**	**Mundial deSeguros S.A.**	
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	31/12/2020	HASTA:	31/12/2022	VALOR:	$ 5.221.069.805.90	
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante		SI	Perjuicios Extrapatrimoniales		SI	
Contratistas y Subcontratistas	SI	Vehículos propios y no propios		SI	Amparo patronal		SI

OBSERVACIONES:

Elaboró: Stella Ballen Herrera
Revisión: Andrés Leal Rojas
Aprobación: Cristian Toro Rios- Subdirector Gestión Contractual y Procesos Administrativos


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2088108&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementCo...
DETALLE DE LA GARANTÍA
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
Revisó
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos Abogad
Henry Andres Leal Rojas
2 días de tiempo transcurrido
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
CRISTIAN TORO RIOS
cristian toro rios
2 días de tiempo transcurrido
Configuración financiera - Pago de anticipos
Condiciones de facturación y pago
Comentarios
Número del Contrato CO1.PCCNTR.2088108
Proveedor CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
Creado por
Agregado en
Comentario
Escribe aquí para buscar
15°C Nublado
ESP
LAA
9:36 a.m.
29/08/2022


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2088108&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementCo...
DETALLE DE LA GARANTÍA
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
Revisó
Aprobado
Aprobación Revisor Polizas Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos Abogad
Henry Andres Leal Rojas
2 días de tiempo transcurrido
Subdirector de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
Aprobado
CRISTIAN TORO RIOS
cristian toro rios
2 días de tiempo transcurrido
Configuración financiera - Pago de anticipos
Condiciones de facturación y pago
Comentarios
Número del Contrato CO1.PCCNTR.2088108
Proveedor CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
Creado por
Agregado en
Comentario
Escribe aquí para buscar
15°C Nublado
ESP
LAA
9:36 a.m.
29/08/2022

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGI-GGPV 30965

Fecha
26/04/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1800094

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO

Información del Documento

■ **Referencia**	Contrato obra 1968-2020 – Solicitud de aprobación de Garantías Contractuales para la Prorroga No. 2 y Modificación No. 4. Alcance al memorando SGI-GGPV 14866 del 01/03/2023.

Anexos

■ **Anexo**	**5A. Polizas_PR2-MOD4 (Cum A10)_Ctto1968-20.pdf** **5B. Polizas_PR2-MOD4 (REC A13)_Ctto1968-20.pdf** **SGI-GGPV 14866 Solcitud AprobPoliza_PR2-MOD4 (01.03.23).pdf**

■Contenido

Respetada Doctora.

Dando alcance y reiteración al memorando SGI-GGPV 14866 del 01/03/2023, de revisión y trámite correspondiente, las pólizas de cumplimiento NB-100148914 c civil extracontractual NB-100031082 con anexo 13, correspondiente al contrato

Contrato No.	**1968-2020**
Contratista	CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
Objeto	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL-PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694
Tramite	Aprobación de Garantías Prorroga No. 2 y Modificación No. 4.
Gestor técnico del proyecto	Gabriel Andres Velandia Garcia

En el siguiente vínculo de OneDrive se encuentran los documentos relacionados

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gavelandia_invias_gov_co/Esv6yJcmuYlEgwDoEh2e=UAyWLI

Cordialmente,

ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente Grandes Proyectos de Gestión Vial

Elaboró: Gabriel Andres Velandia G. – Gestor Técnico de Proyectos
Revisó: José David Martínez Del Rio. – Abogado SGI-GGPV

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
26/04/2023 11:58:52 am	JOSE DAVID MARTINEZ

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
26/04/2023 09:54:03 am	En Radicación	GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA		
26/04/2023 09:54:03 am	En Aprobación Parcial	JOSE DAVID MARTINEZ DEL RIO	GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA	
26/04/2023 11:59:11 am	En Aprobación	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	JOSE DAVID MARTINEZ DEL RIO	
26/04/2023 04:25:10 pm	Enviado	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	

Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGI-GGPV 40061

Fecha
30/05/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1809131

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS ADRIANA DIAZ IZQUIERDO
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO

Información del Documento

■ **Referencia**	Contrato obra 1968-2020 – Solicitud de aprobación de Garantías Contractuales para la Prorroga No. 3 y Modificación No. 5.

Anexos

■ **Anexo**	**6A. Polizas_PR3-MOD5 (Cum A11)_Ctto1968-20.pdf** **6B. Polizas_PR3-MOD5 (REC A14)_Ctto1968-20.pdf**

■Contenido

Respetada Doctora.

Para su revisión y trámite correspondiente, de manera atenta envió póliza de cumplimiento NB-100148914 con anexo 11 y responsabilidad civil extracontractual NB-100031082 con anexo 14, correspondiente al contrato que se relaciona a continuación:

Contrato No.	**1968-2020**
Contratista	CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL-

Objeto	PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694
Tramite	Aprobación de Garantías Prorroga No. 3 y Modificación No. 5.
Gestor técnico del proyecto	Gabriel Andres Velandia Garcia

En el siguiente vínculo de OneDrive se encuentran los documentos relacionados con el trámite que se solicita.

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gavelandia_invias_gov_co/EpHus6J5VmxFlwXJZFuAKt8BPgUi185rhfFwQCvUUrzn4A?e=dhM43h

Por otro lado, requerimos nos informe el estado del trámite de solicitud de aprobación de Garantías Contractuales para la Prórroga No. 2 y Modificación No. 4, esta solicitud fue radicada mediante Memorando No. SGI-GGPV 14866 del 01/03/2023, la cual fue reiterada mediante Memorando No. SGI-GGPV 30965 del 26/04/2023.

Cordialmente,

ING. ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales

Elaboró: Gabriel Andres Velandia G. – Gestor Técnico de Proyectos SGI-GGPV
Revisó: José David Martínez – Abogado SGI-GGPV

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INVIAS

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
29/05/2023 03:13:13 pm	En Radicación	**GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA**		
29/05/2023 03:13:13 pm	En Aprobación Parcial	**JOSE DAVID MARTINEZ DEL RIO**	**GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA**	
30/05/2023 04:07:58 pm	En Aprobación	**ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**	**JOSE DAVID MARTINEZ DEL RIO**	
30/05/2023 08:34:53 pm	Enviado	**ADRIANA DIAZ IZQUIERDO**	**ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES**	

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Contrato y/o Convenio: CONTRATO No. 1968 DE 2020

Objeto: ***GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL – SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA –SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694.***

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:	X	
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 07 días del mes de Junio año 2023

Firmado digitalmente por ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Nombre: ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Ordenador del Pago
Grupo Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA
Gestor Técnico Proyecto
Grupo Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2088108
Número del Contrato	1968-2020
Versión del contrato	6
Objeto del contrato:	"GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA -SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694"
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	27/04/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	17 días para terminar *(30/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	61 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(1/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	1/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

( ) Cuentas bancarias distintas por proveedor (●) Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE GONGORA* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2020 1:43:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2020 2:47:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2088108_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2088108_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Número del proceso	LP-DO-SRN-060-2020 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA - UBATE- PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694 (Fase
Descripción	GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA - UBATE- PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694
Duración del contrato	19 (Meses)
Unidad de contratación	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
Título de la oferta	CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

Tipo Obra

Cuantía del contrato 104.421.396.118 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ○ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

◉ % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Otro: Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños,

◉ % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ◉ Sí ○ No

◉ % del valor de la oferta 5

Fecha límite para entrega de garantías: 31/12/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23/02/2023 10:15:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fech
CO1.WRT.9712449	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	5.221.069.805,9 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	31/12
CO1.WRT.9375494	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.261.069.810 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	18/11
CO1.WRT.7589262	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.261.069.810 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	18/11
CO1.WRT.9712521	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	105.656.235.729,8 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	31/12
CO1.WRT.6795910	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.261.069.810 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	31/07

1 2 3 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección:	Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Código postal:	118942

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	"GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL – SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA –SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN AL PR93+0694"

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2088108

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio uni
	1	72141003	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	1.00	UN	88,700,000,000.00	85,221,396,11
	1		SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS	1.00	UN	19,200,000,000.00	19,200,000,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
Re__Solicitud_documentos_proceso_LP-DO-SRN-060-2020.zip	Re__Solicitud_documentos_proceso_LP-DO-SRN-060-2020.zip
LP-DO-SRN-060-2020 NUMERADA.PDF	LP-DO-SRN-060-2020 NUMERADA.PDF
_minuta de modificacion cto 1968-2020 R (1).pdf	_minuta de modificacion cto 1968-2020 R (1).pdf
8. CONTRATO 1968-2020 MODIFICACION 3.pdf	8. CONTRATO 1968-2020 MODIFICACION 3.pdf
_ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 CTO 1968-2020.pdf	_ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 CTO 1968-2020.pdf
_RV Modificación 4 1 Prórroga 2 Cto 1968 de 2020.pdf	_RV Modificación 4 1 Prórroga 2 Cto 1968 de 2020.pdf
CONTRATO NÚMERO 1968 DE 2020 MODIFICACION No.5 y PRORROGA No. 3.pdf	CONTRATO NÚMERO 1968 DE 2020 MODIFICACION No.5 y PRORROGA No. 3.pdf

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? ○ Sí ◉ No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Catalina Téllez Posada	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	3519
Supervisor		**Tipo de documento**		**Número de documento**	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Expenditure Approver	Catalina Téllez Posada	31/12/2020 2:47:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	104,421,396,118
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	104,421,396,118

Código BPIN 2018011000034 **Año de vigencia** 2023

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprome
☐	2-2020-052478	VigenciaExtraordinary	No validado	88,700,000,000 COP	88,700,000,000 C
☐	50421	CDP	Con Compromiso	48,800,000,000 COP	48,800,000,000 C
☐	198722	CDP	No validado	19,200,000,000 COP	19,200,000,000 C

Saldo de CDP 68,000,000,000 COP

Saldo de vigencias futuras 88,700,000,000 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 4/27/2021 4:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar
☐	345321	Presupuestal (CDP)	4/20/2021 12:00 AM	Generado	48,800,000,000 COP	48,800,000,000 COP	-

Saldo de compromisos CDP 48,800,000,000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 4/27/2021 4:21 PM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

◉ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
2022-1722. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO 1698 DE 2020 A1P1.pdf	2022-1722. ACTA DE APROBACION POLIZA CONTRATO 1698 DE 2020 A1P1.pdf
ACTA DE APROBACION ORDEN DE INICIO 1968 DE 2020.pdf	ACTA DE APROBACION ORDEN DE INICIO 1968 DE 2020.pdf
INFORME SECOP II.pdf	INFORME SECOP II.pdf
SRN 20812 - ORD. INICIO - 1968 de 2020	SRN 20812 - ORD. INICIO - 1968 de 2020.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.7400293	Modificar el contrato	23/12/2021 11:25 AM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 8:25 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.7836006	Modificar el contrato	28/02/2022 4:46 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2022 8:51 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.8869683	Modificar el contrato	29/07/2022 4:37 PM *(UTC -5 horas)*	29/07/2022 5:57 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.10195565	Modificar el contrato	27/12/2022 7:04 PM *(UTC -5 horas)*	29/12/2022 3:17 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados
CO1.CTRMOD.11018480	Modificar el contrato	26/04/2023 5:21 PM *(UTC -5 horas)*	28/04/2023 11:08 AM *(UTC -5 horas)*	Publicados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1968** **Fecha:** **31 de diciembre de 2020**

Contratista: CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

Objeto: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ ¿ UBATÉ - PUENTE NACIONAL ¿ SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA ¿SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO ¿ SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

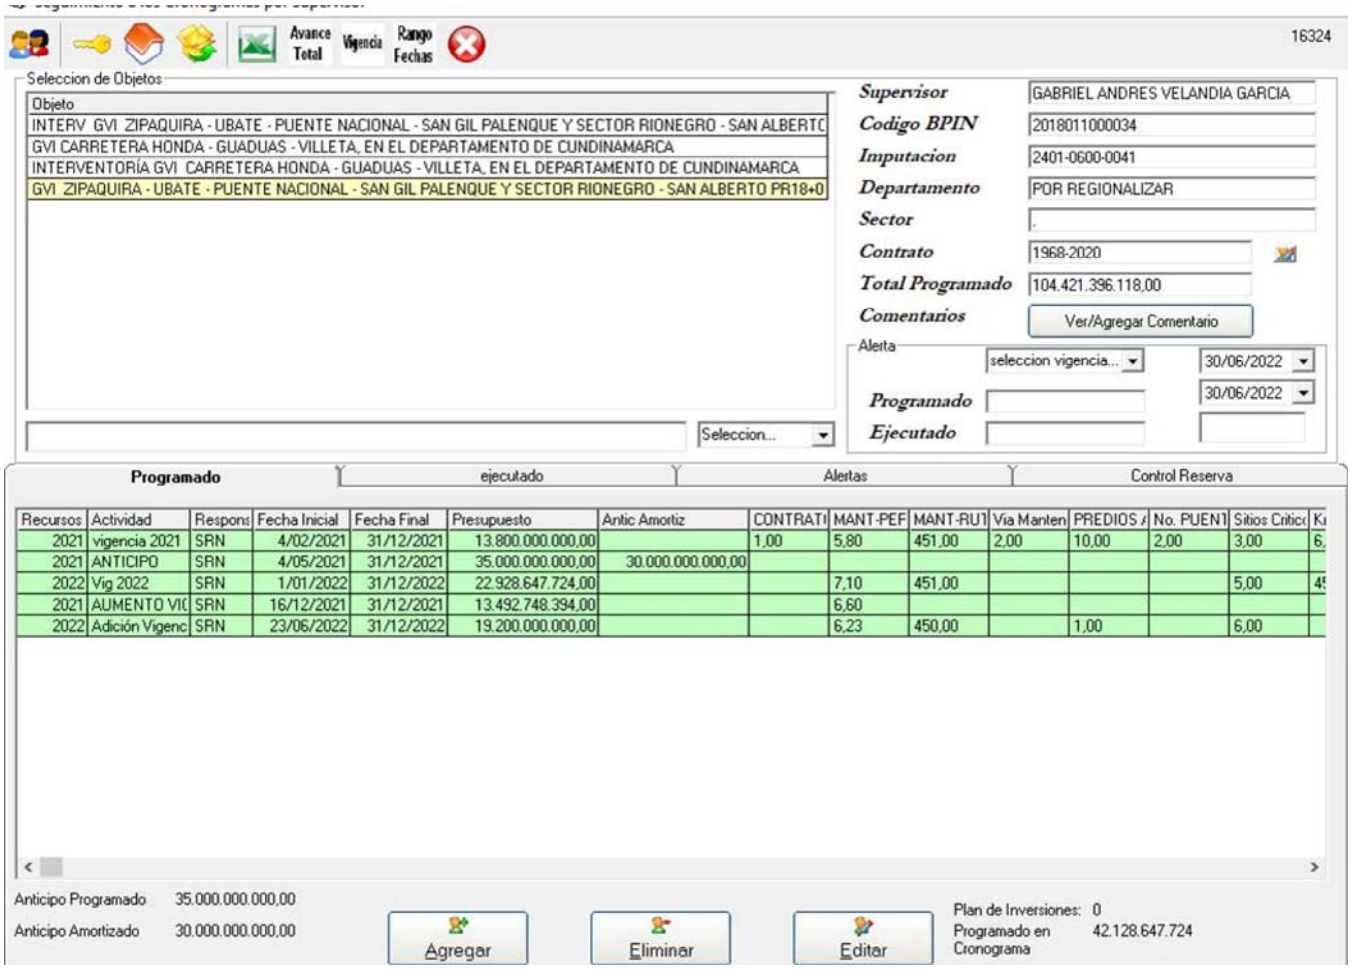
Secuencia	Documento	Observaciones
1	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS No. 70120
2	BASES DE CONTRATACION	AVISO DE CONVOCATORIA LP-DO-SRN-060-2020 - LINK CONTRATO EN SECOP II: https://acortar.link/1968-2020
3	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR
4	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR - ADENDA
5	PLIEGO DE CONDICIONES	DEFINITIVO
6	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE A - ALACNCE DEL CONTRATO
7	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE B - ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS
8	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE C - GESTION DE RIESGO
9	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE D - GESTION AMBIENTAL
10	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE E - GESTION SOCIAL
11	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE PROCESO DE GESTION Y ADQUISICION DE PREDIOS
12	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE SOCIO - AMBIENTAL
13	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES LP-DO-SRN-060-2020
14	RESOLUCION APERTURA	No. 2930 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LP-DO-SRN-060-2020
15	INFORME EVALUACION PROPUESTAS	DE LA LP-DO-SRN-060-2020
16	RESOLUCION DE ADJUDICACION	No. 3433 POR LA CUAL SE ADJUDICA EN AUDIENCIA PUBLICA LA LP-DO-SRN-060-2020
17	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR
18	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CARTA DE PRESENTACION OFERENTE GANADOR

19	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE CONFORMACION DE CONSORCIO
20	FORMULARIO PARA APLICAR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DE RENTA	INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (AFINCO-FR-03)
21	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	DEL CONSORCIO
22	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	CONSORCIADOS
23	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	
24	FOTOCOPIA DE LA CEDULA	REP. LEGAL
25	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
26	CERTIFICACION CONTRALORIA	
27	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	
28	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADO RNMC
29	CERTIFICACION BANCARIA	BANCO DE BOGOTA
30	RESOLUCION	No. 0338 - POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN FUNCIONARIO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2327-2020 A: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
31	RESOLUCION	No. 0283 - POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN FUNCIONARIO COMO GESTOR TECNICO DE PROTECTO A VICTOR HUGO SUAREZ LOPEZ
32	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 50421
33	OFICIO	175-0-009 - CONCEPTO APROBACION DE MODIFICACION DEL CONTRATO
34	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	FORMATO MINFRA-MN-IN-12-FR-1 DE SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO Y SU ANEXOS
35	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	ACTA No. 22, APROBANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO
36	MODIFICACION	MODIFICACION No. 1: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA EN EL SENTIDO DE INCLUIR UN PARAGRAFO EN CUANTO A RESPALDAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
37	REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 345321
38	ORDEN DE INICIACION	SRN 20812 - A PARTIR DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2021.
39	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100031082 ANEXO 1 CERTIFICADO 70969385 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
40	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100148914 ANEXO 1 Y 2 CERTIFICADOS 70969384 Y 70971114 AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL
41	ACTA DE APROBACION DE LA	AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL - INCLUYE MEMORANDO No.

	GARANTIA	DC 28100 (26.04.2021) Y PANTALLAZO SECOP II
42	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100031082 ANEXO 6 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
43	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100148914 ANEXO 4 AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO
44	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO - INCLUYE MEMORANDO No. DC 70148 (22.09.2021) Y PANTALLAZOS SECOP II
45	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA MODIFICACION No. 2
46	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	DE CONTRATACION - ACTA No. 11 Y 13, APROBANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO
47	PLIEGO DE CONDICIONES	APENDICE A
48	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 245521
49	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
50	MODIFICACION	MODIFICACION No. 2: MODIFICAR EL ALCANCE DEL CONTRATO EXCLUYENDO ACTIVIDADES CONTRACTUALES: MANT. PERIOD. NUMERL 1.4.3, 1.4.4., 1.4.5., 1.4.7. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
51	REGISTRO PRESUPUESTAL	No.106821
52	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION
53	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 06 APROBANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION No. 3
54	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 13322
55	MODIFICACION	MODIFICACION No. 3: MODIFICAR LA CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL CUENTA CON EL CDP No. 13322 DEL 18.01.2022 X VALOR DE $22.928.647.724,00 - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
56	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100031082 ANEXO 9 AMPARANDO MODIFICACION No. 1 No. 2 y No.3
57	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100148914 ANEXO 6 AMPARANDO MODIFICACION No. 1 No. 2 y No.3
58	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO MODIFICACION No. 1 No. 2 y No.3 - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 52847 (14.07.2022) Y PANTALLAZO SECOP II
59	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1
60	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 38, APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO
61	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	No. 198722
62	REGISTRO PRESUPUESTAL	No.858222
63	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
64	CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO	ACTUALIZADOS
65	CONTRATO ADICIONAL	ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1: POR LA CUAL SE PRORROGA EL

		PLAZO DESDE EL 31 JUL 2022 HASTA EL 31 DIC 2022. ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $19.200.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA. - INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 57754 (30.07.2022) Y PANTALLAZO SECOP II
66	MEMORANDO REMISORIO	No. SS 94295 REF: CONCEPTO NO OBJECION PLAN DE INVERSION SOCIAL
67	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100031082 ANEXO 10 AMPARANDO LA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1
68	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100148914 ANEXO 7 AMPARANDO LA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1
69	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	AMPARANDO LA ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
70	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No.2 Y MODIFICACION No. 4
71	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 71. APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA Y MODIFICACION AL CONTRATO
72	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
73	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 2 Y MODIFICACION No. 4: SE PRORROGA EL PLAZO DESDE EL 31 DIC 2022 HASTA EL 30 ABR 2023. MODIFICAR LA CLAUSULA 7 APROPIACION PRESUPUESTAL.. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II
74	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 3 Y MODIFICACION No. 5
75	ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN Y PRORROGAS	No. 13. APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA No. 3 Y MODIFICACION No. 5
76	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC
77	CONTRATO ADICIONAL	PRORROGA No. 3 Y MODIFICACION No. 5: SE PRORROGA EL PLAZO DESDE EL 30 ABR 2023 HASTA EL 30 JUN 2023. MODIFICAR LA CLAUSULA 7 APROPIACION PRESUPUESTAL. INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 31676 (28.04.2023) Y PANTALLAZO SECOP II

TOTAL ANEXOS 77


Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
16324
Seleccion de Objetos
Objeto
INTERV GVI ZIPAQUIRA - UBATE - PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO
GVI CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORÍA GVI CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
GVI ZIPAQUIRA - UBATE - PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0
Seleccion...
Supervisor
GABRIEL ANDRES VELANDIA GARCIA
Codigo BPIN
2018011000034
Imputacion
2401-0600-0041
Departamento
POR REGIONALIZAR
Sector
.
Contrato
1968-2020
Total Programado
104.421.396.118,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
seleccion vigencia...
30/06/2022
Programado
30/06/2022
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos
Actividad
Respons
Fecha Inicial
Fecha Final
Presupuesto
Antic Amortiz
CONTRATI
MANT-PEF
MANT-RUT
Via Manten
PREDIOS
No. PUENT
Sitios Critic
2021 vigencia 2021 SRN 4/02/2021 31/12/2021 13.800.000.000,00 1,00 5,80 451,00 2,00 10,00 2,00 3,00
2021 ANTICIPO SRN 4/05/2021 31/12/2021 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00
2022 Vig 2022 SRN 1/01/2022 31/12/2022 22.928.647.724,00 7,10 451,00 5,00
2021 AUMENTO VI SRN 16/12/2021 31/12/2021 13.492.748.394,00 6,60
2022 Adición Vigenc SRN 23/06/2022 31/12/2022 19.200.000.000,00 6,23 450,00 1,00 6,00
Anticipo Programado 35.000.000.000,00
Anticipo Amortizado 30.000.000.000,00
Agregar
Eliminar
Editar
Plan de Inversiones: 0
Programado en Cronograma 42.128.647.724

Inicio | Contratos | Reportes/Busquedas | Datos personales

Estado: Procesando

Contratos > Contratos registrados > Ver contrato

Informacion general

Proyecto	GVI ZIPAQUIRA-PALENQUE Y RIONEGRO SN ALBERTO		
Programa	VIAS PARA LA PROSPERIDAD	Dirección territorial:	Dirección Territ
Unidad ejecutora:	SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS		
Supervisor:	CARLOS ALBERTO PARRA SILVA	Gestor técnico de proyecto:	Gabriel Andrés
Interventor:	CONSORCIO GESTION VIAL	Tramo:	45A
Objeto	"GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA -SA SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694"		

Contrato de obra

Contratista:	CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO			
Integrantes:	Nit	Razon social	Partic	
	900665878-8	GAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
	830106345-3	IC INFRAESTRUCTURA S.A.S		
	900.986.468-9	CONVIASA S.A.S.		
	900888903	CONSTRUCSION S.A.S		
Contrato No:	1968Año:2020	Fecha del contrato	2021-04-28	
Fecha del acta de inicio	2021-04-28	Fecha Final	2023-06-30	
Plazo inicial:	15.10	Valor inicial:	$85,221,396,118.00	

Año	Vigencia	Facturado
2021	$48,800,000,000.(	$99,874,004.00

Año	Corte	
2021	4	
2021	5	
2021	6	
2021	7	
2021	8	
	Total:	

Obra - Prorrogas Registradas

Fecha	Meses	
2022/07/30	5.0	
2022/12/29	4.0	
2023/03/30	2.0	
Total:	0.0	

Obra - Adiciones Registradas

Fecha	Valor	
2022/07/30	$19,200,000,000.00	
Total:	$0.00	

Obra - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

Fecha	Tipo	Descripcion	
No existen registros			

Contrato de Interventoria

Interventor:	CONSORCIO GESTION VIAL		
Integrantes:	Nit	Razon social	
	890403012-8	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A	
	890104625-1	ECOVIAS S.A.S	
Contrato No:	2327 Año: 2020	Fecha del contrato	28/04/21
Fecha del acta de inicio	2021-04-28	Fecha Final	2023-06-30
Plazo inicial:	15.10	Valor inicial:	$9,299,980,246.00

Interventoria - Prorrogas Registradas

Fecha	Meses	
2022/07/30	5.0	
Total:	0.0	

Interventoria - Adiciones Registradas

Fecha	Valor	
2022/07/30	$800,000,000.00	
Total:	$0.00	

Fecha	Meses	
2022/12/29	4.0	
2023/03/30	2.0	
Total:	0.0	

Fecha	Valor
2022/11/22	$1,500,000,000.00
2023/03/30	$1,500,000,000.00
Total:	$0.00

Interventoria - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

Fecha	Tipo	Descripcion	
No existen registros			

Tramos / Actividades / Equipo mínimo

Lista de tramos

Numero	Tramo
1	vía código 45A04 sector Zipaquirá - Ubaté, del PR 28+0200 al PR 67+1134, incluye el sector vial 45ACNB, variante Portachuelo PR 3+0600- PR 5+0160 y Casablanca PR 0+0250-PR 7+0000, se ubica en el departamento de Cundinamarca.
2	vía código 45A05 - Ubaté - Puente Nacional, en una longitud de 90,465 km, del PR 0+000 - PR90+000; incluye los sectores código 45ACNC variante de Uba código 45ABYB variante de Chiquinquirá
3	vía código 45A06 sector Puente Nacional - San Gil, del PR0+0000 (PUENTE NACIONAL), al PR 125+0800 (SAN GIL), se ubica en el departame
4	vía código 45A07 sector San Gil - Floridablanca del PR0+0000 - PR90+0000 y Floridablanca - Palenque, ruta 45AST08, PR0+0000 - PR10+0000, correspond Girón - Floridablanca, se ubica en el departamento de Santander.
5	carretera Bucaramanga - San Albero, sector Rionegro - San Alberto, ruta 45A08 (PR 18+0000 - PR 93+0694), está ubicada al norte del departa

Lista de actvidades

Nombre
BASE GRANULAR CLASE A (m3)
CAPTAFAROS (Und)
ACERO DE REFUERZO fy = 420 MPa (kg)
BARANDA METÁLICA (m)

Equipo mínimo requerido

Nombre
Retroecavadora oruga
Bulldozer
Carrotaller
Grua
Cortadora de concreto
Fresadora de Asfalto
Cargador
Retroexcavadora Neumática
Moto niveladoras:
Finisher
Vibro compactadores:
Compactador de rodillo
Compactador neumático
Barredora mecánica
Carrotanque Irrigador de asfalto y un compresor
Carrotanques
Compresor
Ambulancia
Compactación manual (saltarin)
Mezcladora de concreto
Vibradores de concreto
Volquetas

Regresar

Usuario: Gabriel Andrés Velandia García -CIFRA V:2.24
