Informe de Gestión No. 31
Contrato de Adhesión No. 19 Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Período del 01 al 30 de junio del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Junio 30 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2
1 Informe Administrativo y Financiero 3
1.1 Informe Administrativo 3
1.2 Informe Financiero 3
2 Informe Jurídico 5
3 Informe Técnico 5
3.1 Informe Convocatoria 5
3.2 Informe Acreditación 5
3.3 Informe Evaluación 6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación 7
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría 7
4 Atención al Emprendedor 10
CONCLUSIONES Y RETOS 10
ANEXOS 12

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 "*Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes*"; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: "*Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA*", del contrato de Adhesión No. 19; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de junio de 2023, del contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC .

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: "*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas*".

Este informe presentado al ente aliado Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de junio de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido del 01 al 30 de junio del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Número de Adhesión	19	**Entidad Adherente**	Minera de Cobre Quebradona SAS BIC
Fecha de Inicio		23/12/2020	
Duración	Desde el 23/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato		$ 1.500.000.000	
Valor Aporte SENA		$ 750.000.000	
Valor Aporte Aliado		$ 750.000.000	
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender		Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento	
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada		Alexandra Dávila	
Nombre del Contacto en Entidad Aliada		Alexandra Dávila	
Cargo del Contacto en Entidad Aliada		Jefe de desarrollo de proveedores. Minera de Cobre Quebradona SAS BIC	
Número Telefónico o Celular	3134282202	**Correo Electrónico**	ADavila@AngloGoldAshanti.com
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	**Correo Electrónico**	alrodriguezi@unal.edu.co
Nombre de profesional de enlace regional	Diego Gutiérrez	**Correo Electrónico**	digutierrezb@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de junio del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 19.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9113_JUNIO_2023).

La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Información Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesión No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

No. Convocatoria	184
Recursos SENA	$ 750.000.000

Recursos Adherente	$ 750.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	**$ 1.500.000.000**
Total recursos planes aprobados CDN (b)	**$ 1.463.974.954**
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	**$ 0**
Total recursos planes con desistimientos (d)	**$ 0**
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	**$ 36.025.046**
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	**$ 1.463.974.954**
Valor Reintegro Aliado	$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	$ 731.987.477
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	$ 731.987.477
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	**$ 1.463.974.954**
Ejecución recursos SENA	$ 678.115.453
Ejecución recursos Adherente	$ 678.115.453
Ejecución acumulada total de recursos	**$ 1.356.230.906**

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9113
Saldo Total en Bancos	$ 19.086.062,65
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	$ 1.073.538,39
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	$ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecución de recursos asignados a la convocatoria No. 184 perteneciente a la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC al 30 de junio de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de $1.463.974.954 equivalente al 97.60% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $36.025.046.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de $1.356.230.906, equivalentes al 92.64% de los recursos comprometidos y 90.42% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minería de Cobre Quebradona SAS BIC.

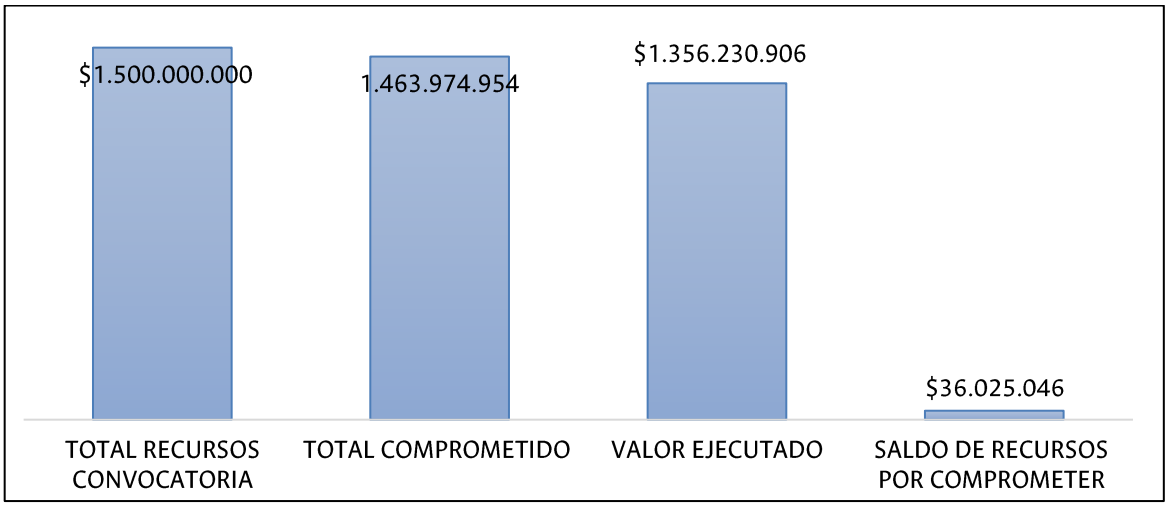

2 Informe Jurídico

Para el período comprendido del 01 al 30 de junio del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico, relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en* ***contratos de adhesión*** *suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales" (...)*, se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 184 - Quedradona, el enlace de acceso se encuentra disponible en: https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1842020.aspx tiene las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Número de Convocatoria	184		
Fecha de Lanzamiento	10/02/2021	**Monto Máximo a Financiar por Plan**	$124.000.000
Fecha de Apertura	09/02/2021	**Fecha de Cierre**	10/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	10/03/2021	**Fecha de Cierre Corte No. 2**	10/05/2021

Durante el período del 01 al 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditación de la convocatoria No. 184.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Número de Convocatoria				**184**			
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**10/02/2021**		**Fecha de Cierre**		**10/03/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	23/03/21	Número de Planes Formalizados	23	Número de Planes Acreditados	13	% de Acreditación	**56%**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/03/2021**		**Fecha de Cierre**		**10/05/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	24/05/21	Número de Planes Formalizados	17	Número de Planes Acreditados	17	% de Acreditación	**100%**

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso teniendo en cuenta que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a continuación, se presentan las generalidades y resultados con respecto al proceso de evaluación de la Convocatoria No. 184.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC

Número de Convocatoria				**184**			
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**10/02/2021**		**Fecha de Cierre**		**10/03/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	12/04/21	Número de Planes Evaluados	13	Número de Planes Viabilizados	3	% de Viabilización	**23%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	3	Valor Planes a Financiar	**$365.866.988**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/03/2021**		**Fecha de Cierre**		**10/05/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	07/06/21	Número de Planes Evaluados	17	Número de Planes Viabilizados	14	% de Viabilización	**82%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	9	Valor Planes a Financiar	**$718.854.994**

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el mes de junio de 2023 no se desarrollaron actividades para este proceso en consideración a que todos los contratos de cooperación empresarial fueron suscritos por las partes.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de junio de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 184, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 184.

Planes de negocio primer corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 184 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74429	337-184-2021	BOLSON	2/09/2021	2/09/2022	$123.561.533	100,00%	111,11%	100,00%	100,00%	TERMINADO
2	74458	338-184-2021	BIOFÁBRICA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS	20/09/2021	20/01/2023	$119.015.455	100,00%	100,00%	100,00%	99,94%	TERMINADO
3	74461	339-184-2021	WONDER TALLER CREATIVO	13/09/2021	13/09/2022	$123.290.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	TERMINADO

Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 184 2C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	74487	401-184-2021	CRIO HASS	5/11/2021	5/11/2022	$109.931.317	0,00%	0,00%	0,00%	4,37%	RENUNCIA
2	74482	400-184-2021	SAYFRE	25/04/2022	25/08/2023	$123.557.020	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	VIGENTE
3	74350	393-184-2021	RESTAURANTE CAMPESTRE EL EDEN	28/10/2021	28/10/2022	$123.559.536	100,00%	100,00%	112,50%	100,00%	TERMINADO
4	74395	394-184-2021	INDUSTRIAS COANA	29/10/2021	28/02/2023	$123.562.188	100,00%	166,67%	100,00%	100,00%	TERMINADO
5	74414	395-184-2021	FINCA CAFETERA LA ARBOLEDA	2/11/2021	2/02/2023	$123.108.652	80,00%	110,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
6	74460	396-184-2021	KARLINA	2/11/2021	2/01/2023	$123.561.059	200,00%	142,86%	100,00%	98,22%	TERMINADO
7	74465	397-184-2021	APICOLA SANTA LAURA	5/11/2021	5/03/2023	$123.558.292	83,33%	112,50%	100,00%	99,75%	TERMINADO
8	74472	398-184-2021	GANADERÍA LOS VÉLEZ	8/11/2021	8/11/2022	$123.708.311	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
9	74479	399-184-2021	AHUMADOS DE VALLECITOS	1/02/2022	1/04/2023	$123.561.591	80,00%	114,29%	100,00%	100,00%	TERMINADO

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador, mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 184 2C.

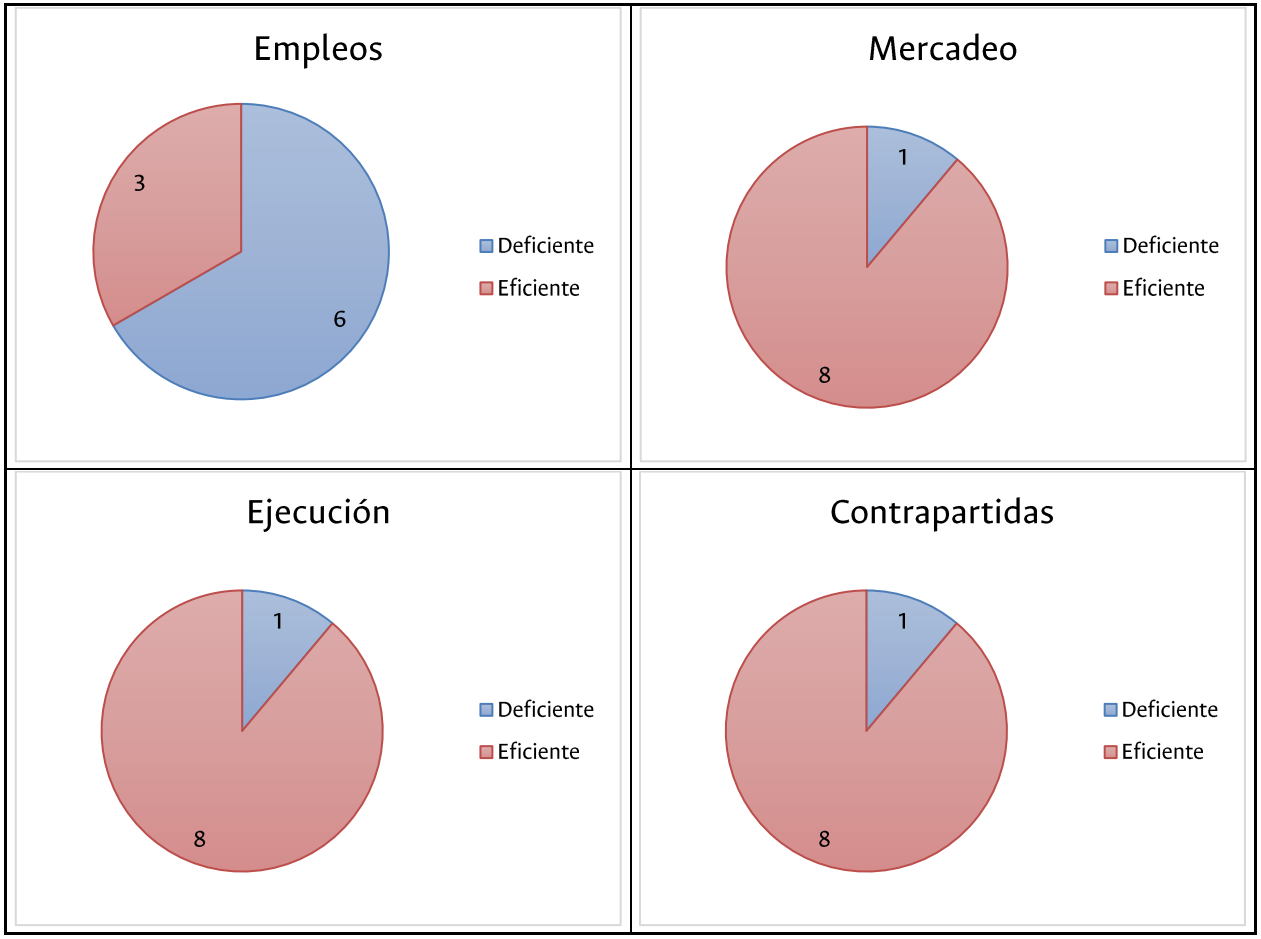

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado a SENA informes finales de interventoría para 4 planes de negocio, con recomendación de condonación. Se está a la espera de la reunión del Consejo Directivo Nacional, instancia encargada de aprobar la recomendación dada por el operador y expedir la respectiva resolución de recomendación de condonación, para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 184 –Quebradona.

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	74350	RESTAURANTE CAMPESTRE EL EDEN	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
2	74429	BOLSON	TERMINADO	7/02/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
3	74461	WONDER TALLER CREATIVO	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
4	74472	GANADERÍA LOS VÉLEZ	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -

4 Atención al Emprendedor

Para el período del 01 al 30 de junio de 2023, no se presentaron observaciones, relacionadas a continuación referentes a atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 184 la cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No. 19 suscrito con la Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	**$1.500.000.000**
Número total de planes formalizados	40
Número total de planes acreditados	30
Número total de planes viables	17
Número de planes financiables	12
Número de planes aprobados en CDN	**12**
Total recursos aprobados en CDN	**$1.463.974.954**
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	$ -
Total recursos comprometidos	$1.463.974.954
Saldo de recursos por comprometer	$ 36.025.046
Ejecución acumulada de recursos	$1.356.230.906

A continuación, se muestra de manera gráfica el estado de los planes aprobados por el Consejo Directivo del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 184– Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

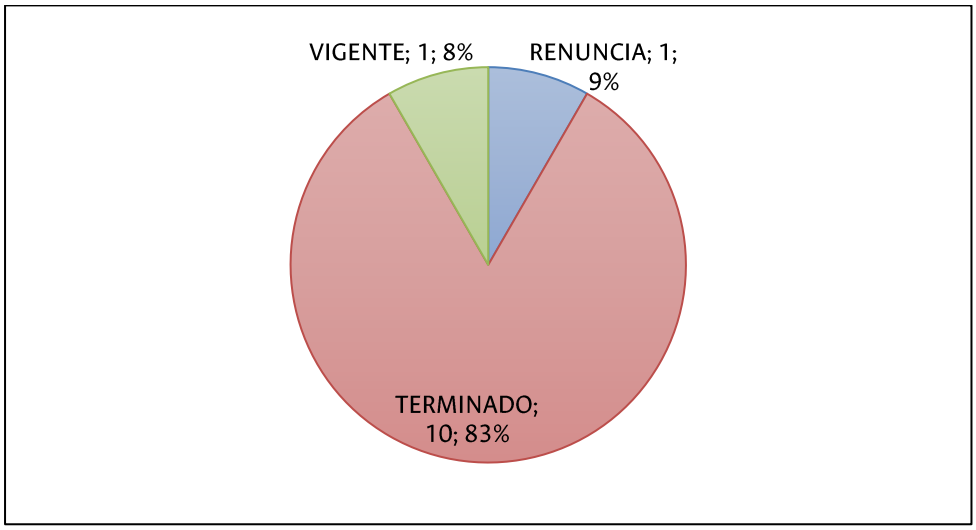

Conclusiones generales del período del 01 al 30 de junio de 2023:

1. La Convocatoria 184 – Fondo Emprender, tuvo un primer cierre el 10/03/2021, donde se formalizaron 23 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 1 de la Convocatoria 184 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 13 de los 23 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 56% de acreditación.
2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 184 – Fondo Emprender, viabilizó 3 de 13 planes de negocios evaluados, para un desempeño del 23%. Los 3 viables fueron recomendados para su financiamiento por valor total de $365.866.988.
3. El segundo corte de la convocatoria se efectuó el 10/05/2021 en donde se formalizaron 17 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 184 – Fondo Emprender, acreditó 17 de los 17 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 184 – Fondo Emprender, viabilizó 14 de 17 planes de negocios, para un desempeño del 82%. Los 9 planes de negocio viables con mejores puntajes fueron recomendados para financiamiento por un valor total de $1.098.107.966.
5. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 43 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (24), otras solicitudes operativas (6), agenda especial (5), terminación anticipada (3), aplazamiento de visitas (2), informes y conceptos (2) y modificaciones de indicadores (1) para la convocatoria 184 - Quebradona, solicitudes resueltas oportunamente.
6. A la fecha la convocatoria presenta 1 renuncia a los recursos de financiamiento por parte del emprendedor del plan de negocio identificado con ID 74487 - CRIO HASS por valor de $109.931.317. El plan a la fecha de la renuncia presenta una ejecución de recursos por valor de $4.739.647.
7. Al 30 de junio de 2023 (10) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la convocatoria 184 se encuentran terminados.
8. Con corte a la fecha los planes de negocios financiados tienen una ejecución acumulada de recursos por valor de $1.356.230.906.

9. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 5 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 3 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos 0 abiertas y 2 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 0 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
10. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 184 se ha presentado 2 pagos exitoso en el periodo de estudio, al cierre de junio de 2023 se tiene un acumulado de 22 pagos rechazados de los cuales el 50% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 23% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 27% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A JULIO 31 DE 2023

Se espera que el plan de negocio vigente de la convocatoria No. 184 continúe en el proceso de ejecución sin novedades.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 184 la interventoría continúe preparando y enviando los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución del proyecto.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 184 por valor total de $36.025.046 por el SENA ($18.012.523) y el ente adherente ($18.012.523), más rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por valor de $1.073.538,39, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9113_ JUNIO_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance emprendimientos CV 184

Anexo1_EXTRACTO_DAV_9113_ JUNIO_2023

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9113

INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	$18,965,706.28
Más Créditos	$120,356.37
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$19,086,062.65
Saldo Promedio	$18,965,706.28

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 06	$ 120,356.37+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Junio 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
74429	BOLSON	184	$ 123.561.533,00	$ 494.246,13	$ 124.055.779,13	$ 123.561.532,06	$ 494.246,13	$ 124.055.778,19	$ -	$ -	$ 0,94
74458	BIOFÁBRICA DE PRODUCTO	184	$ 119.015.455,00	$ 476.061,82	$ 119.491.516,82	$ 118.940.577,32	$ 475.762,31	$ 119.416.339,63	$ -	$ -	$ 75.177,19
74461	WONDER TALLER CREATIVO	184	$ 123.290.000,00	$ 493.160,00	$ 123.783.160,00	$ 123.246.328,00	$ 492.985,31	$ 123.739.313,31	$ -	$ -	$ 43.846,69
74350	RESTAURANTE CAMPESTRE	184-2	$ 123.559.536,00	$ 494.238,14	$ 124.053.774,14	$ 123.559.536,00	$ 494.238,14	$ 124.053.774,14	$ -	$ -	-$ 0,00
74395	INDUSTRIAS COANA	184-2	$ 123.562.188,00	$ 494.248,75	$ 124.056.436,75	$ 123.562.185,36	$ 494.248,74	$ 124.056.434,10	$ -	$ -	$ 2,65
74414	FINCA CAFETERA LA ARBOL	184-2	$ 123.108.652,00	$ 492.434,61	$ 123.601.086,61	$ 123.108.652,00	$ 492.434,61	$ 123.601.086,61	$ -	$ -	$ 0,00
74460	KARLINA	184-2	$ 123.561.059,00	$ 494.244,24	$ 124.055.303,24	$ 121.363.198,01	$ 485.452,79	$ 121.848.650,80	$ -	$ -	$ 2.206.652,44
74465	APICOLA SANTA LAURA	184-2	$ 123.558.292,00	$ 494.233,17	$ 124.052.525,17	$ 123.253.364,30	$ 493.013,46	$ 123.746.377,76	$ -	$ -	$ 306.147,41
74472	GANADERÍA LOS VÉLEZ	184-2	$ 123.708.311,00	$ 494.833,24	$ 124.203.144,24	$ 123.708.254,50	$ 494.833,02	$ 124.203.087,52	$ -	$ -	$ 56,72
74479	AHUMADOS DE VALLECITOS	184-2	$ 123.561.591,00	$ 494.246,36	$ 124.055.837,36	$ 123.561.591,00	$ 494.246,36	$ 124.055.837,36	$ -	$ -	-$ 0,00
74482	SAYFRE	184-2	$ 123.557.020,00	$ 494.228,08	$ 124.051.248,08	$ 123.557.020,00	$ 494.228,08	$ 124.051.248,08	$ -	$ -	$ -
74487	CRIO HASS	184-2	$ 109.931.317,00	$ 439.725,27	$ 110.371.042,27	$ 4.808.667,00	$ 19.234,67	$ 4.827.901,67	$ -	$ -	$ 105.543.140,60
	TOTAL		**$ 1.463.974.954,00**	**$ 5.855.899,81**	**$ 1.469.830.853,81**	**$ 1.356.230.905,55**	**$ 5.424.923,62**	**$ 1.361.655.829,17**	**$ -**	**$ -**	**$ 108.175.024,64**

Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 184

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74429
Plan de Negocios:	BOLSON
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JUAN PABLO PALACIO SUAREZ
Cedula	1039022087
No. Contrato	337-184-2021
Valor Contrato	$123.561.533, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	GRUPO EMPRESARIAL BOLSÓN S.A.S
Nit	901.513.182-2
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/2/2021
Segunda visita	12/29/2021
Tercera visita	5/4/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/2/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	9	10	111%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	59400	54700	92%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$186.300.000, 00	$38.856.989, 00	20,86%	$123.561.533, 00	$123.561.532,060	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74458
Plan de Negocios:	BIOFÁBRICA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	CESAR AUGUSTO ZAPATA RESTREPO
Cedula	8465386
No. Contrato	338-184-2021
Valor Contrato	$119.015.455, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BIOFABRICA DE PRODUCTOS ORGANICOS SAS
Nit	901.512.474-3
Ciudad	Fredonia
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/20/2021
Segunda visita	1/25/2022
Tercera visita	5/19/2022
Cuarta visita	27/01/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	1/20/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	11	11	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	48000	6054	13%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$194.280.000, 00	$,000	0,0%	$119.015.455, 00	$118.940.577,320	99,94%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74461
Plan de Negocios:	WONDER TALLER CREATIVO
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JULIAN DAVID RESTREPO PALACIO
Cedula	1027886908
No. Contrato	339-184-2021
Valor Contrato	$123.290.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	WONDER TALLER CREATIVO SAS
Nit	901.514.129-6
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/13/2021
Segunda visita	1/26/2022
Tercera visita	5/17/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	9/13/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	12	12	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	7470	6857	92%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$172.980.000, 00	$59.571.031, 00	34,44%	$123.290.000, 00	$123.246.328, 00	99,96%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74350
Plan de Negocios:	RESTAURANTE CAMPESTRE EL EDEN
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	JOSE OCTAVIO VASQUEZ ARBOLEDA
Cedula	15527993
No. Contrato	393-184-2021
Valor Contrato	$123.559.536, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	RESTAURANTE CAMPESTRE EL EDEN S.A.S
Nit	901.524.312-0
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	10/28/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	6/21/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	10/28/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	6	100%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	9	113%	12060	972	8%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$221.760.000, 00	$43.701.820, 00	19,71%	$123.559.536, 00	$123.559.536, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74395
Plan de Negocios:	INDUSTRIAS COANA
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	MICHELE LOPEZ FLOREZ
Cedula	1037615185
No. Contrato	394-184-2021
Valor Contrato	$123.562.188, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	INDUSTRIAS COANA SAS
Nit	901.533.089-0
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VANEGAS MORA ORIANA LISSETE
Fecha de Inicio	10/29/2021
Segunda visita	3/2/2022
Tercera visita	6/28/2022
Cuarta visita	27/03/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	2/28/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	6	10	167%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	30150	1630	5%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$216.410.000, 00	$4.483.000, 00	2,07%	$123.562.188, 00	$123.562.185,360	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74414
Plan de Negocios:	FINCA CAFETERA LA ARBOLEDA
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	NANCY YAMILE ARBOLEDA TOBON
Cedula	43405913
No. Contrato	395-184-2021
Valor Contrato	$123.108.652, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	FINCA CAFETERA LA ARBOLEDA S.A.S
Nit	901.534.418-5
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VANEGAS MORA ORIANA LISSETE
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	3/10/2022
Tercera visita	6/22/2022
Cuarta visita	27/02/2023
Prorroga	3
Fecha finalización	2/2/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	10	11	110%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	10620	3979	37%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$212.808.600, 00	$65.574.215, 00	30,81%	$123.108.652, 00	$123.108.652, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74460
Plan de Negocios:	KARLINA
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	SUSANA ARISTIZABAL CASTAÑO
Cedula	1037661098
No. Contrato	396-184-2021
Valor Contrato	$123.561.059, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	KARLINA SAS
Nit	901.533.086-9
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	11/2/2021
Segunda visita	3/7/2022
Tercera visita	6/29/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	1/2/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	10	200%	7	10	143%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	45126	9485	21%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$209.561.597, 00	$132.448.647, 00	63,2%	$123.561.059, 00	$121.363.198,010	98,22%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74465
Plan de Negocios:	APICOLA SANTA LAURA
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	JULIO ISAAC OSPINA MUÑOZ
Cedula	71878512
No. Contrato	397-184-2021
Valor Contrato	$123.558.292, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	APICOLA SANTA LAURA S.A.S.
Nit	901.532.998-6
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VANEGAS MORA ORIANA LISSETE
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/9/2022
Tercera visita	6/23/2022
Cuarta visita	28/03/2023
Prorroga	4
Fecha finalización	3/5/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
6	5	83%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	5870	535	9%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$147.340.000, 00	$8.025.000, 00	5,45%	$123.558.292, 00	$123.253.364,300	99,75%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74472
Plan de Negocios:	GANADERÍA LOS VÉLEZ
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	SEBASTIÁN VÉLEZ ZAPATA
Cedula	1039023221
No. Contrato	398-184-2021
Valor Contrato	$123.708.311, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGROGANADERIA LOS VÉLEZ SAS
Nit	901.534.471-6
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	11/8/2021
Segunda visita	3/11/2022
Tercera visita	6/24/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/8/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	4	4	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	93150	33217	36%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$123.454.000, 00	$72.580.435, 00	58,79%	$123.708.311, 00	$123.708.254,500	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74479
Plan de Negocios:	AHUMADOS DE VALLECITOS
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	FERNANDO DE JESUS MARULANDA VALENCIA
Cedula	70106221
No. Contrato	399-184-2021
Valor Contrato	$123.561.591, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AHUMADOS DE VALLECITOS SAS
Nit	901.533.734-3
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	VANEGAS MORA ORIANA LISSETE
Fecha de Inicio	2/1/2022
Segunda visita	6/3/2022
Tercera visita	10/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	2
Fecha finalización	4/1/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	7	8	114%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	17280	1517	9%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$223.938.000, 00	$25.939.680, 00	11,58%	$123.561.591, 00	$123.561.591, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74482
Plan de Negocios:	SAYFRE
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	INDALECIO OQUENDO MEDINA
Cedula	71763579
No. Contrato	400-184-2021
Valor Contrato	$123.557.020, 00
Estado	VIGENTE

EMPRESA

Razón social	SAYFRE SAS
Nit	901.584.568-5
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	GALVIS BERMÚDEZ MARY SOL
Fecha de Inicio	4/25/2022
Segunda visita	9/9/2022
Tercera visita	12/22/2022
Cuarta visita	
Prorroga	4
Fecha finalización	8/25/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	2	50%	10	10	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	84004	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$183.238.680, 00	$,000	0,0%	$123.557.020, 00	$123.557.020, 00	100%

CONTRATO DE ADHESIÓN 184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74487
Plan de Negocios:	CRIO HASS
Convocatoria	184 - Quebradona (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario	ARLEY DE JESÚS ECHEVERRI CORREA
Cedula	71877975
No. Contrato	401-184-2021
Valor Contrato	$109.931.317, 00
Estado	RENUNCIA

EMPRESA

Razón social	VIVERO CRIO HASS S.A.S.
Nit	901.535.994-0
Ciudad	Jerico
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	FERNÁNDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	
Tercera visita	
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	0	0,0%	5	0	0,0%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	0	0,0%	25000	0	0,0%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$220.000.000, 00	$,000	0,0%	$109.931.317, 00	$4.808.667, 00	4,37%
