Puerto López, 10 de agosto de 2023

SI-150.35-555-08-2023

Señor
RODRIGO ANDRES TORRES
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-000153-2023
PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

Asunto: Entrega modificatoria No.1 con adicion

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por el CONSORCIO MAQUINAS 2023 mediante oficio OF-01-07-2023respecto al ajuste de mayores y menores cantidades del contrato, y una vez revisado, avalado, las actividades son necesidades para incluirlas en el presupuesto del proyecto, nos permitimos hacer entrega de los documentos soporte del Acta de Modificación de obra No. 01 con adición del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-000153-2023

TOTAL, FOLIOS: 69

Sin otro particular,

OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha 10 AGO 2023 10:54am
Recibido por: Helena G

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Raúl Avila Ortega	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Cargo: Apoyo a la supervisión	Cargo: secretaria de Infraestructura	Cargo: secretaria de Infraestructura
Fecha: 10/08/2023	Fecha: 10/08/2023	Fecha: 10/08/2023

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONSORCIO MAQUINAS 2023

PUERTO LOPEZ – META

OF-01-07-2023

Ingeniera
MAYERLY ANDREA ESPINOSA
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía de Puerto López – Meta

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-000153-2023
PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

Asunto: SOLICITUD DE ADICION

Cordial saludo,

Según la formulación del contrato, se requería mayor mantenimiento vial desarrollado por la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, habiéndose formulado con mas horas de esa máquina en comparación de la maquina VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP, dándose una relación de 448 horas y 224 horas respectivamente, sin embargo las condiciones climáticas en razón de la emergencia del fenómeno del niño Desde el pasado mes de abril, informada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció la llegada de un nuevo episodio de El Niño, estimando una probabilidad moderada (60%) de formación de este evento climático, entre mayo y julio de 2023, en donde las altas precipitaciones en el municipio de Puerto Lopez condicionan las actividades proyectadas inicialmente, siendo la mayoría de los suelos un compuesto limo-arcilloso del municipio en la zona rural, que el comportamiento de estos suelos suele ser expansivo y requiere de mayor sellado y compactación para mejorar las condiciones de transito y que los mantenimientos viales rurales extiendan su duración a la erosión y desgaste.

En virtud de lo anterior y en razón de la ejecución del presente contrato, se refleja la necesidad de aumentar la cantidad de horas del equipo completo de maquinaria con el fin de equiparar las actividades que se van desarrollando de manera conjunta con la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, y dar cierre efectivo a la ejecución del contrato, en donde la nivelación y conformación que desarrolla la MOTONIVELADORA se complemente con la compactación y el sellado que ejecuta el VIBROCOMPACTADOR, y se preste el apoyo de la RETOREXCAVADORA de esta manera se maximizan tanto la manera en que se invierten los recursos y el tiempo de conservación de las vías terciarias.

Atentamente.

Diana Silva.

Firma representante legal de CONSORCIO MAQUINAS 2023

Nombre: DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA

CC: 1.121.940.523

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

INFORME SUPERVISOR ADICION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100-103-13-10-000153-2023

PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE PRESETANCION: 09/08/2023

CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINAS 2023
NIT: 901.707.225-4
R/L DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA
C.C. 1121940523

SUPERVISOR: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100-103-13-10-000153-2023

OBJETO	**VALOR**
PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META	$314.003.457,60

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
VALOR:	TRESCIENTOS CATORCE MILLES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($314.003.457,60)
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE LA SIGUIENTE MANERA: UN ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME QUE INCLUYA BITÁCORA DIARIAMENTE DEL SERVICIO Y CONTEO DEL HORÓMETRO DEL EQUIPO CON FIRMA Y AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR Y PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y ACTA DE RECIBO FINAL, ANEXANDO ADEMÁS PAZ Y SALVO DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES POR TODO CONCEPTO, COMPROBANTES DE PAGO EN DONDE SE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF), CUANDO APLIQUE. PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, INFORME DE ACTIVIDADES FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O MATERIALES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR PARA EL TRÁMITE DE SU CUENTA, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS LA

	FACTURA DE VENTA, EN ORIGINAL Y COPIA, LA CUAL DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS FISCALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LA FECHA DE LA FACTURA DEBE CORRESPONDER AL MES DE SU ELABORACIÓN, Y EN ELLA CONSTARÁ EL NÚMERO DEL CONTRATO, EL CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO QUE SE ESTÁ COBRANDO. EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A FACTURAR, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO EQUIVALENTE. SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA CUENTA CON SUS SOPORTES RESPECTIVOS, DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, NO PODRÁ HACER NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA. LOS PAGOS SE REALIZARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LAS CUENTAS DEL CONTRATISTA Y PARA TAL EFECTO SE ENVIARÁN LAS FACTURAS AL CORREO ELECTRÓNICO SECHACIENDA@PUERTOLOPEZ-META.GOV.CO
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	06/06/2023
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	05/10/2023
PRORROGA No. 1	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	//

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		N/A	
OBJETO:		N/A	
FECHA DE INICIACION		N/A	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACION		N/A	
VALOR		CONTRATO	VALOR
		N/A	N/A
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR
		N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00447	06/03/2023	2.3.24.2402.0600.01 BPIN 2020505730016 Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la	$ 318.640.258,00

		infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto López	

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00684	28/04/2023	2.3.24.2402.0600.01 BPIN 2020505730016 Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto López	$ 314.003.457,60

PAGOS REALIZADOS

Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA DE GARANTIASPOLIZAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO - PÓLIZA No. 30-44-101052901

Póliza de seguro cumplimiento.


RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						SUMA ASEGURADA	VIGENTE
	DESDE			HASTA				
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05	06	2023	10	09	2023	$ 31.400.345,76	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05	06	2023	10	09	2026	$ 15.700.172,88	SI
CALIDAD DEL SERVICIO	05	06	2023	10	09	2023	$ 31.400.345,76	SI

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 30-40-101019107

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						SUMA ASEGURADA	VIGENTE
	DESDE			HASTA				
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
AMPARO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05	05	2023	10	09	2023	$ 232.000.000,00	SI

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL 06 DE JUNIO DE 2023 al 09 DE AGOSTO DE 2023) Avance físico de contrato 80%, avance financiero ejecutado 0.00%

GRAFICO:

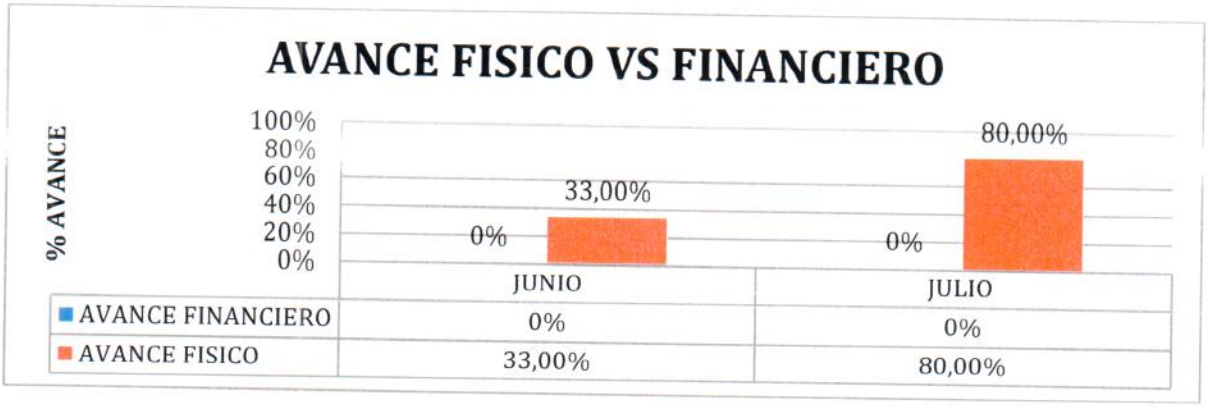


En base a las actividades ejecutadas por el contratista CONSORCIO MAQUINAS 2023 este cumplió a satisfacción las actividades de mantenimiento de vías terciarias según el cronograma establecido.

La ejecución del presente contrato permitió tener mayor rendimiento en la conformación y mantenimiento de vías terciarias, acelerando las actividades de extendido, cargue, conformación, excavación y excavación, la versatilidad de la maquinaria y la facilidad para poder desplazarse en terrenos de malas condiciones permitían aumentar y optimizar labores del proyecto de mantenimiento de vías terciarias, de acuerdo a esto, era necesario y adecuado la ejecución del presente contrato.

ITEMS	ACTIVIDAD
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EN CAMPO

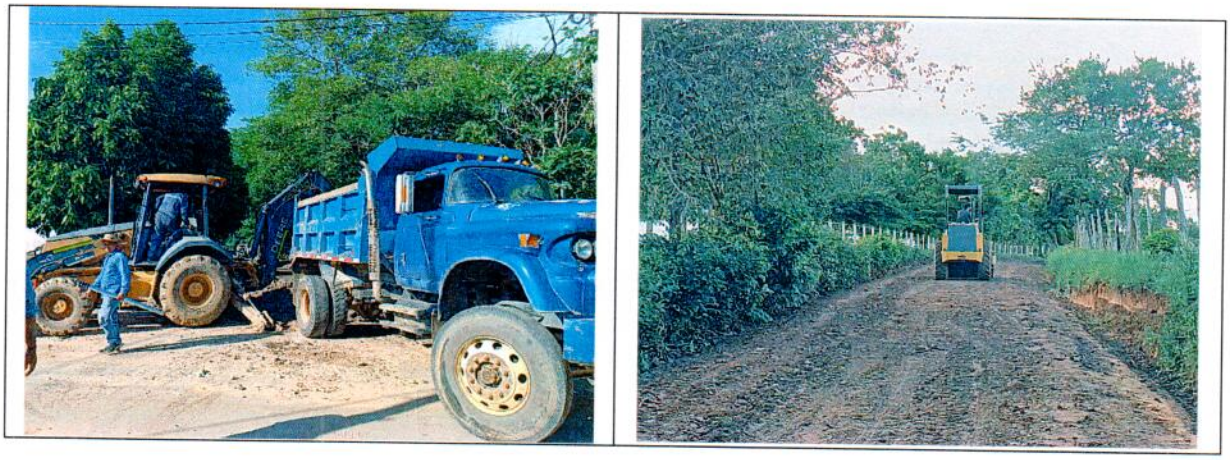









































REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA




REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Código: F – 095
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020
















REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA



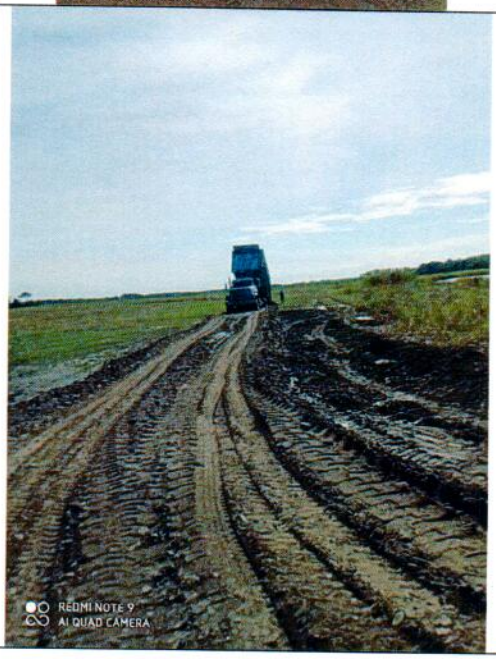



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

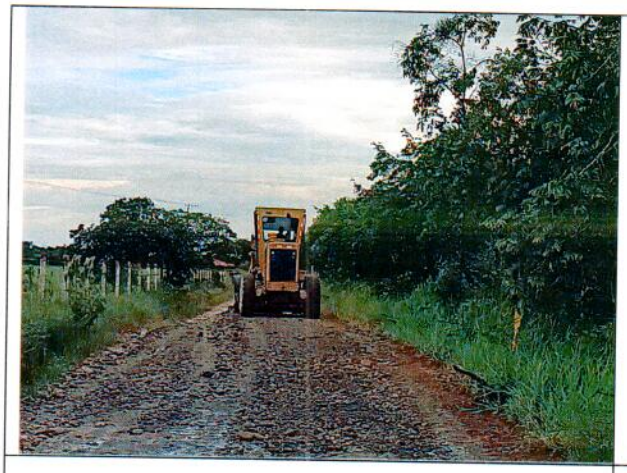





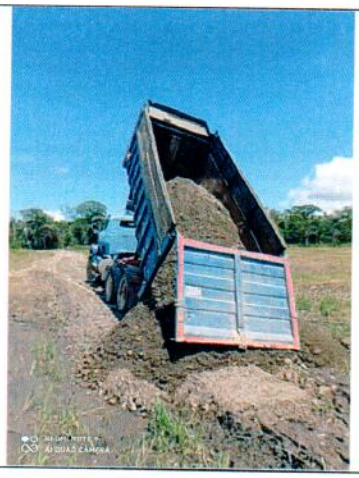





ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Código: F – 095
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	FECHA
FIRMA DEL CONTRATO	28/04/2023
ACTA DE INICIO	06/06/2023

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

CONDICIONES SOLICITADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 100-103-13-00153-2023

CONDICIONES INCIALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,00	ALQUILER, RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	448,00	$ 222.339,60	$ 99.608.140,80			35,50	$ 7.893.055,80	483,50	107.501.196,60
1,01	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON	HR	448,00	$ 166.235,70	$ 74.473.593,60			35,00	$ 5.818.249,50	483,00	80.291.843,10
1,02	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	224,00	$ 135.000,00	$ 30.240.000,00			93,75	$ 12.656.230,70	317,75	42.896.230,70
10,30	ALQUIER VOLQUETA 7 M3	HR	896,00	$ 83.040,00	$ 74.403.840,00					896,00	74.403.840,00
2,10	ALQUILER RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.	HR	136,00	$ 259.396,20	$ 35.277.883,20					136,00	35.277.883,20
				COSTO DIRECTO	$ 314.003.457,60		$ 0,00		$ 26.367.536,00		$ 340.370.993,60
				COSTO TOTAL	$ 314.003.457,60		$ 0,00		$ 26.367.536,00		$ 340.370.993,60

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095**
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTROL AFILIACION PARAFISCAL.

MES DE JUNIO

NOMBRE DEL EMPLEADO	% DEDICACIÓN	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	NO. DE PLANILLA
DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA	NO APLICA	1121940523	REPRESENTANTE LEGAL	SALUD TOTAL	7890274597
WILSON MORALES QUINTERO	100%	17413648	OPERADOR	SALUD TOTAL	7890274597
CRISTIAN FERNEY SEGURA VACA	100%	1.121.918.724	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274597
CARLOS ALBERTO FANDIÑO FORERO	100%	1.016.022.212	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274597
JOSÉ DANEY ORTEGA GARCÍA	100%	71.000.907	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274597
WILLIAM MONROY GUTIERREZ	100%	93.083.126	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274813
LUIS ALFONSO BARAJAS DIAZ	100%	19.313.380	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274813

MES DE JULIO

NOMBRE DEL EMPLEADO	% DEDICACIÓN	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	NO. DE PLANILLA
DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA	NO APLICA	1121940523	REPRESENTANTE LEGAL	SALUD TOTAL	7890435647
WILSON MORALES QUINTERO	100%	17413648	OPERADOR	SALUD TOTAL	7890435647
CRISTIAN FERNEY SEGURA VACA	100%	1.121.918.724	OPERADOR	NUEVA EPS	7890435647

CARLOS ALBERTO FANDIÑO FORERO	100%	1.016.022.212	OPERADOR	NUEVA EPS	**7890435647**
JOSÉ DANEY ORTEGA GARCÍA	100%	71.000.907	OPERADOR	NUEVA EPS	**7890435647**
WILLIAM MONROY GUTIERREZ	100%	93.083.126	OPERADOR	NUEVA EPS	**7890434993**
LUIS ALFONSO BARAJAS DIAZ	100%	19.313.380	OPERADOR	NUEVA EPS	**7890434993**

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Código: F – 095** Versión: 002 Fecha: Septiembre de 2020

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ A la fecha del presente informe se realizó un avance de ejecución del contrato del 80, se realiza la solicitud de adicionar horas máquina para complementar los trabajos que se vienen adelantando.

- ✓ El presente informe nace de la necesidad de realizar adición de recurso por el valor de $26.367.536,00 en horas de maquina según la siguiente descripción:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT
1,00	ALQUILER, RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	35,50
1,01	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON	HR	35,00
1,02	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	93,75

- ✓ El contrato de prestación de servicio se ejecuta de acuerdo con las condiciones contratadas y a las modificaciones efectuadas por parte de la entidad, con las cuales nosotros estamos de acuerdo.

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura
Supervisor

DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA
R/L CONSORCIO MAQUINAS 2023
CC. 1.121.940.523 expedida en Villavicencio

CONSORCIO MAQUINAS 2023

INFORME SOLICITUD DE ADICION

PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

Ing. MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
CC: 40.325.106
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO LOPEZ

CONTRATISTA: CONSORCIO MAQUINAS 2023
NIT: 901.707.225-4
R/L: DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA
CC: 1.121.940.523

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 100-103-13-10-000153-2023

JULIO 2023
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES 6
2.1 ANTECEDENTES 6
2.2 FINALIDAD 6
2.3 LOCALIZACIÓN 7
2.4 ALCANCE 9
3 CONDICIONES DEL CONTRATO 10
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 10
3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 11
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 12
4.1 PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN EL CONTRATO ACTUALIZADA EL CONTRATO – PÓLIZA No. 30-44-101052901 12
4.2 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 30-40-101019107 12
4.5 ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS 13
5 PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA 13
5.1 PERSONAL 13
5.2 EQUIPO UTILIZADO 13
5.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 14
6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 14
7 CONCLUSIONES 40

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 MAPA DE COLOMBIA
ILUSTRACIÓN 2 MAPA DEPARTAMENTO DEL META
ILUSTRACIÓN 3 MUNICIPIOS DE PUERTO LOPEZ

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

1. INTRODUCCIÓN

En el MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META se realiza una contratación justificada por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE PUERTO LÓPEZ** teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, esto es un **contrato de prestación de servicios** el cual el contratista es **CONSORCIO MAQUINAS 2023** identificada con **NIT 901.707.225-4** representada legalmente por **DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA** identificada con **CC 1.121.940.523** por un valor contractual inicial de: TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 314.003.457,00), y que para actualmente se proyecta una adición en presupuesto de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 26.367.536,00)

El presente contrato tiene un tiempo de ejecución inicial de 4 MESES O TOTALIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE LA MAQUINARIA, el día 06 de JUNIO de 2023 se suscribe el acta de inicio, a partir de esta fecha inicia la ejecución de este. La fecha de terminación pactada inicialmente es el 05 de octubre del 2023, sin embargo, está puede ser sujeta a cambios de acuerdo a la necesidad del servicio prestado para el contrato de prestación de servicios No. 100-103-13-10-000153-2023, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META, este proceso apunta a cumplir las metas del macro proyecto denominado construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto Lopez.

Tomando en cuenta que el Municipio de PUERTO LÓPEZ (Meta) dentro de su plan de desarrollo **"GOBIERNO SANO 2020-2023"** contempla el **Eje estratégico:** II. Guía para el Desarrollo de la inversión social. **Sector.** Sector Transporte, **Programa:** Vías urbanas y rurales. **Meta producto:** Construir, mantener, rehabilitar o mejoras las vías terciarias del municipio, **Indicador Producto:** Número de KM en vías terciarias construidas, mantenidas, rehabilitadas o mejoradas.

Las comunidades del área rural, en las constantes comunicaciones verbales que tienen con la Administración, específicamente con la secretaria de infraestructura, exponen muchas necesidades, buscan a toda costa que las vías de penetración a las veredas y caseríos poblados mantengan en buen estado, pues ello les permite un fácil desplazamiento de dichas zonas de producción a las zonas de comercialización de las cosechas y ganado.

Considerando que las mallas viales terciarias en los municipios cumplen una importante tarea como es articular los centros de producción, de comercialización y consumo, lo anterior en el sentido que sobre estas vías se encuentran las empresas productoras y es indispensable contar con una adecuada comunicación Inter veredal que articule a estas con la cabecera municipal.

Actualmente el municipio cuenta con juego de maquinaria amarilla constituido por una retroexcavadora en llantas tipo JCB, una motoniveladora GALION 830B, un vibro compactador BITELI de 8 ton, y un par de volquetas KODIAK sencillas de 6m3, que son insuficientes para cubrir y suplir las necesidades de las vías terciarias de la totalidad del área rural del municipio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el mal estado actual de la mayoría de vías terciarias y veredales del municipio, evidenciado por el seguimiento de los funcionarios y las diferentes solicitudes de la comunidad, la administración municipal en aras de optimizar los recursos y haciendo uso de la figura de mantenimiento de vías terciarias con suministro de material apoyados por los equipos de maquinaria amarilla, busca realizar un proceso de mantenimiento y mejoramiento de las vías, utilizando para ello la maquinaria amarilla de la administración, personal adscrito a la secretaria de infraestructura, y apoyo de mano de obra por parte de la comunidad, para lo cual se realizarán dos tipos de actividades.

Evidenciadas las necesidades y solicitudes para mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas, la secretaria municipal de Puerto López se encuentra ejecutando un plan integral de mantenimiento y

mejoramientos viales donde se establece el cronograma de intervención de los conjuntos de maquinaria con la que cuenta el municipio y apoyados por las maquinas que prestan el servicio resultado del presente proceso para la vigencia 2023 de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892099325-0
SECRETARÌA DE INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA PREVISTO - ARREGLO VIAS TERCIARIAS

DEL	AL	MELUA (ALTO - MEDIO Y BAJO)	SAN PABLO	LA REFORMA	PACHAQUIARO	SAN LUIS DE RIO NEGRO ALTO	SAN LUIS DE RIO NEGRO BAJO	MARAYAL	LA BANQUETA
12/02/2023	18/02/2023								
19/02/2023	25/02/2023								
26/02/2023	4/03/2023								
5/03/2023	11/03/2023								
12/03/2023	18/03/2023								
19/03/2023	25/03/2023								
26/03/2023	1/04/2023								
2/04/2023	8/04/2023								
9/04/2023	15/04/2023								
16/04/2023	22/04/2023								
23/04/2023	29/04/2023								
30/04/2023	6/05/2023								
7/05/2023	13/05/2023								
14/05/2023	20/05/2023								
21/05/2023	27/05/2023								
28/05/2023	3/06/2023								
4/06/2023	10/06/2023								
11/06/2023	17/06/2023								
18/06/2023	24/06/2023								
25/06/2023	1/07/2023								

zonas de atención prioritaria por invierno

NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA DE ATENCION PARA MANTENIMIENTO

he ahí que se evidencia la presente necesidad realizar el PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META (la especificidad de las maquinas obedece condiciones solicitadas de maniobrabilidad, versatilidad y rendimiento) para complementar y apoyar los trabajos que se vienen adelantando de excavación, cajoneo y remoción de material sobrante de excavación, con el fin de aumentar los rendimientos y en virtud de la eficiencia de los recursos que se destinan para dichos mejoramientos y de

esta manera apoyar el proceso de SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO DEL META que se encuentra en ejecución y es un proyecto clave de integración y desarrollo rural del municipio.

Adicionalmente ante la llegada del invierno que dificulta el tránsito de los habitantes rurales del municipio, la secretaria de infraestructura en su plan anual de atención, mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias dispone de material para realizar los mejoramientos en algunas veredas priorizadas por las dificultades de acceso, he ahí donde se conforma un segundo cronograma de ejecución:

Se da una necesidad de carácter especial en el corregimiento de PUEBLO NUEVO, en donde con alta frecuencia las viviendas de los habitantes se ven afectadas por las lluvias y las inundaciones durante la temporada invernal, debido a que están ubicadas en la zona de un bajo que no posee zona de descargue de escorrentía por el terraplén de la vía Nacional que conduce hacia el municipio de Pto Gaitán, se evidencia la necesidad de realizar el ALQUILER RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3, para realizar las actividades de excavación y ubicación de tubería de 36" con la que se dispone para mitigar los daños por las mencionadas inundaciones y brindar las condiciones dignas y de salubridad para los habitantes de pueblo nuevo.

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

2. GENERALIDADES

2.1 ANTECEDENTES

La presente administración del municipio de PUERTO LÓPEZ – META "**GOBIERNO SANO 2020-2023**" suscribió el contrato de prestación de servicio N° **100-103-13-10-000153-2023** con el objeto de gerenciar, promocionar, ejecutar y financiar el contrato denominado es PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META este contrato surge bajo la necesidad de contar con una maquinaria de mejores capacidades y mas adecuada al trabajo que se busca realizar, tal y como se expone en la introducción del presente informe, el cumplimiento del objeto contractual está dirigido a ejecutar actividades de excavación, conformación, cargue de material de excavación y construcción de vías rurales bajo la modalidad de autoconstrucción.

El alquiler de la maquinaria es una excelente opción para cumplir el objetivo y satisfacer la necesidad expuesta, tomando en cuenta que el uso de este equipo es especifico y no es requerido para otras actividades, esto quiere decir que una vez finalizada las actividades podrán no hacer mas uso de la misma y tampoco tendrán que asumir los gastos de mantenimiento u otros que son necesarios para la operación de la máquina.

2.2 FINALIDAD

Dar cumplimiento al objetivo programado y mejorar las condiciones de conectividad de las veredas del municipio de PUERTO LÓPEZ con disposición de obras El Plan de Desarrollo **GOBIERNO SANO 2020-2023**, en la dimensión económica de acuerdo a la **Línea estratégica. II**: Guía para el desarrollo de la inversión social, **Sector:** Transporte, **Dependencia responsable:** secretaria de infraestructura. **Programa:** Vías urbanas y rurales. **Meta de productos:** construir, mantener, rehabilitar o mejorar las vías terciarias del municipio.

El objeto del contrato consiste en PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META que pretende materializar el proyecto mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias del municipio apoyado por un proceso de suministro de material de rio, tiene como finalidad satisfacer una necesidad de la administración municipal, la cual es acelerar las actividades de excavación, conformación y cargue de material excavado a los vehículos de transporte, apoyar actividades de remoción de tierras, suministrar y conformar las vías entre otras que se deriven de las labores de mejoramiento y mantenimiento, la maquinaria solicitada por la entidad es idónea para ese tipo de actividades debido a que el municipio no cuenta con la capacidad y los rendimientos de su maquinaria propia, esto es beneficioso, tomando en cuenta que, las vías intervenidas son espacios de gran tránsito de las comunidades rurales.

2.3 LOCALIZACIÓN

El municipio tiene una extensión total de 6.898 km². La principal vía de acceso es a través de la carretera que la une a Villavicencio. También se comunica con toda la extensión de los Llanos Orientales a través del río Meta y con Venezuela a través del río Orinoco. La mayor parte del municipio se ubica en zonas donde el promedio de la temperatura está entre los 26 °C y 26.5 °C, siendo febrero y marzo los meses más cálidos con valores entre los 27 °C y 28 °C y junio y julio los más fríos con valores promedios de 24 °C. Las temperaturas máximas absolutas han superado los 39.4 °C y las mínimas absolutas han descendido hasta los 14 °C.

Dentro de la red hidrológica y fluvial que recorre el municipio, el río Meta es el más importante, este es a su vez uno de los afluentes Puente Carlos Lleras Restrepo del río Orinoco. Hacia el Suroeste se encuentra con el río Humadea. Al norte se encuentra el río Guayuriba. Donde confluyen el Humadea con el Guayuriba se forma el río Metica que debajo de Puerto López recibe por el margen izquierdo los mayores afluentes como el río Humea.

Limita al norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martín, Meta, y al occidente con los municipios de San Carlos de Guaroa y Villavicencio

Extensión área urbana: 9.5 Km2

Extensión área rural: 6730.5 Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 178

Temperatura media: Está entre los 26 °C y 26.5 °C, siendo febrero y marzo los meses más cálidos con valores entre los 27 °C y 28 °C y junio y julio los más fríos con valores promedios de 24 °C.

CONSORCIO MAQUINAS 2023



Ilustración 1 MAPA DE COLOMBIA

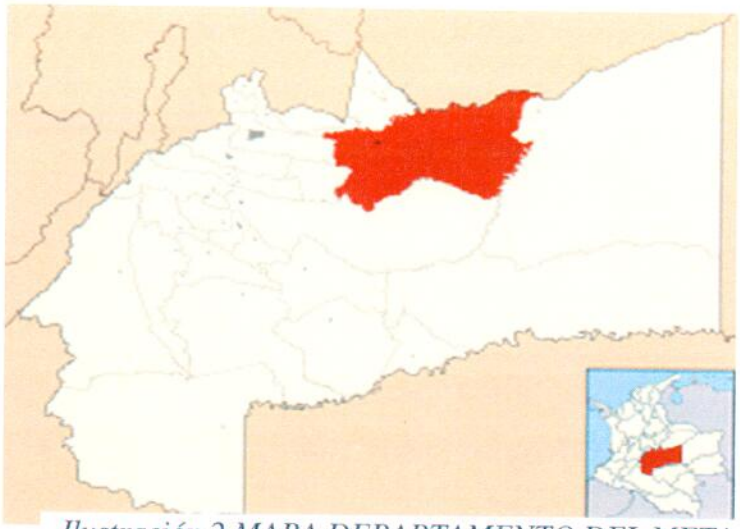


Ilustración 2 MAPA DEPARTAMENTO DEL META



Ilustración 3 MUNICIPIOS DE PUERTO LOPEZ

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

2.4 ALCANCE

Para viabilizar el proyecto se realizaron unos estudios previos con unas descripciones y elementos específicos según se consideró la necesidad que se pretendía atender, es por esto que la administración realizo la contratación de terceros para realizar la ejecución del contrato de prestación de servicios No. **100-103-13-10-000153-2023** con objeto **PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META.** el cual cuenta con un presupuesto de **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 314.003.457,60)**. El alcance del presente contrato fue mejorar y facilitar algunas actividades de mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias y mejorar las condiciones para los transportes y tiempos de los residentes rurales.

Gracias a las actividades ejecutadas por la maquinaria y la necesidad de continuar con la correcta ejecución del proyecto construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto Lopez con énfasis de vías rurales fue necesario realizar la adición No. 1 al presente contrato, por un valor de VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($26.367.536,00) con esto se garantizaba finalizar actividades contractuales y dinamizar las otras actividades futuras de la excavación, ahora bien, el alquiler de la maquinaria facilitó los trabajos con esto se mejoraron los rendimientos del proyecto.

3 CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META**
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 314.003.457,60)
VALOR ADICIÓN	VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($26.367.536,00)
VALOR ACTUALIZADO	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 340.370.993,60)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT	892099325-0
CORREO	Oficinacontratacion@puertolopez.meta.gov.co
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No	100-103-13-10-000153-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINAS 2023
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRZA
PLAZO INICIAL:	4 MESES O TOTALIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE LA MAQUINA
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2023
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES O TOTALIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE LA MAQUINA
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE MAYO DE 2023
PRORROGA No. 1	N/A
TIEMPO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	05 DE OCTUBRE DE 2023
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISOR	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCION
% EJECUTADO	89%

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

El contratista y la supervisión cuentan con una estructura organizativa de personal para la construcción y supervisión del proyecto.



4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Actualmente no se han celebrado actos administrativos como prorrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensiones y reinicio.

Para la ejecución del contrato se garantizó la afiliación al sistema de seguridad social del personal que laboro durante la ejecución del mismo.

4.1 PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN EL CONTRATO ACTUALIZADA EL CONTRATO – PÓLIZA No. 30-44-101052901

Garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de prestación de servicios No. 100-103-13-10-000153-2023

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						SUMA ASEGURADA	VIGENTE
	DESDE			HASTA				
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05	06	2023	10	09	2023	$ 31.400.345,76	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05	06	2023	10	09	2026	$ 15.700.172,88	SI
CALIDAD DEL SERVICIO	05	06	2023	10	09	2023	$ 31.400.345,76	SI

4.2 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 30-40-101019107

Garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de prestación de servicios No. 100-103-13-10-000153-2023

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA						SUMA ASEGURADA	VIGENTE
	DESDE			HASTA				
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
AMPARO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05	05	2023	10	09	2023	$ 232.000.000,00	SI

4.5 ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA
FIRMA DEL CONTRATO	28/04/2023
ACTA DE INICIO	06/06/2023
ACTA DE ADICION No. 1 (SOLICITUD)	09/08/2023

GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

FECHA OFICIO	REF. RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORÓ
AGOSTO	INFORME DE ADICION No1.	INFORME DE ADICION No. 1	Diana Alejandra Silva Pedraza

5 PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA

5.1 PERSONAL

- **WILSON MORALES QUINTERO** con cc 17.413.648, como OPERADOR DE EXCAVADORA ORUGADA
- **Cristian Ferney Segura Vaca** con cc 1.121.918.724, como CONDUCTOR DE VOLQUETA
- **Carlos Alberto Fandiño Forero** con cc 1.016.022.212, como CONDUCTOR DE VOLQUETA
- **José Daney Ortega García** con cc 71.000.907, como OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
- **WILLIAM MONROY GUTIERREZ** con cc 93.083.126, como OPERARIO RETROEXCAVADORA TIPO CARGADOR 510
- **Luis Alfonso Barajas Diaz** con cc 19.313.380, como OPERARIO MOTONIVELADORA

5.2 EQUIPO UTILIZADO

- RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE
- VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP O EQUIVALENTE
- VOLQUETA DE 7m3 A 14 m3
- RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3
- MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON

5.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MES DE JUNIO


NOMBRE DEL EMPLEADO	% DEDICACIÓN	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	NO. DE PLANILLA
DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA	NO APLICA	1121940523	REPRESENTANTE LEGAL	SALUD TOTAL	7890274597
WILSON MORALES QUINTERO	100%	17413648	OPERADOR	SALUD TOTAL	7890274597
CRISTIAN FERNEY SEGURA VACA	100%	1.121.918.724	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274597
CARLOS ALBERTO FANDIÑO FORERO	100%	1.016.022.212	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274597
JOSÉ DANEY ORTEGA GARCÍA	100%	71.000.907	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274597
WILLIAM MONROY GUTIERREZ	100%	93.083.126	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274813
LUIS ALFONSO BARAJAS DIAZ	100%	19.313.380	OPERADOR	NUEVA EPS	7890274813

MES DE JULIO

NOMBRE DEL EMPLEADO	% DEDICACIÓN	NO. DE CEDULA	CARGO	EPS	NO. DE PLANILLA
DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA	NO APLICA	1121940523	REPRESENTANTE LEGAL	SALUD TOTAL	7890435647
WILSON MORALES QUINTERO	100%	17413648	OPERADOR	SALUD TOTAL	7890435647
CRISTIAN FERNEY SEGURA VACA	100%	1.121.918.724	OPERADOR	NUEVA EPS	7890435647
CARLOS ALBERTO FANDIÑO FORERO	100%	1.016.022.212	OPERADOR	NUEVA EPS	7890435647
JOSÉ DANEY ORTEGA GARCÍA	100%	71.000.907	OPERADOR	NUEVA EPS	7890435647
WILLIAM MONROY GUTIERREZ	100%	93.083.126	OPERADOR	NUEVA EPS	7890434993
LUIS ALFONSO BARAJAS DIAZ	100%	19.313.380	OPERADOR	NUEVA EPS	7890434993

6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Desde la fecha de inicio se han desarrollado actividades de conformación y mejoramiento de vías terciarias

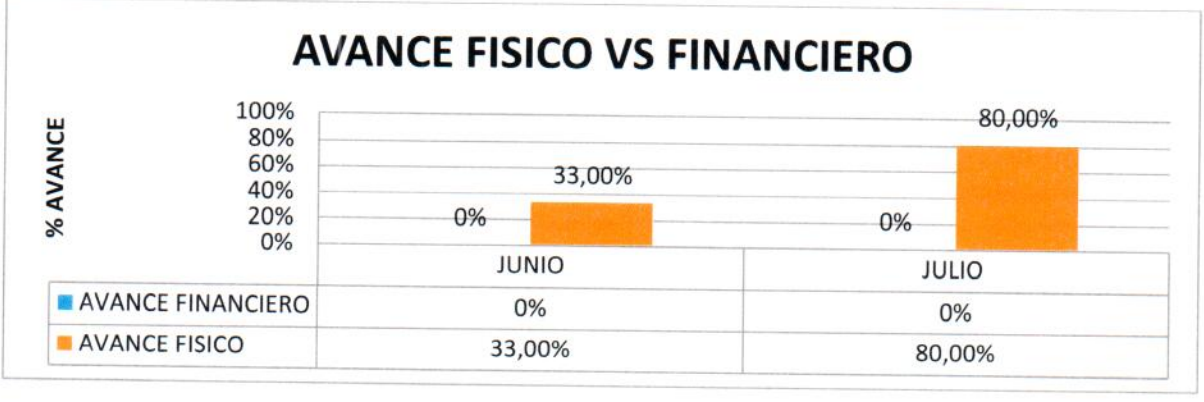


CONSORCIO MAQUINAS 2023

MAQUINA	ACTIVIDAD			RETROEXCAVADORA JD	MOTONIVELADORA	VIBROCOMPACTADOR
FECHA	LUGAR	MEDIA DE HORAS DE TRABAJO	NOVEDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO		
8/06/2023	molino	10	SIN NOVEDAD			
9/06/2023	molino	10	SIN NOVEDAD			
10/06/2023	molino	9	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

11/06/ 2023	molino		DOMINGO NO SE TRABAJO			
12/06/ 2023	molino	8	SIN NOVEDAD			
13/06/ 2023	molino	10	SIN NOVEDAD			


DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

14/06/ 2023	molino	5	SIN NOVEDAD			
15/06/ 2023	molino	8,5	SIN NOVEDAD			
16/06/ 2023	molino	9,5	SIN NOVEDAD			
17/06/ 2023	molino	6	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

18/06/ 2023	molino		DOMINGO NO SE TRABAJO			
19/06/ 2023	molino		SIN NOVEDAD			
20/06/ 2023	molino	10	SIN NOVEDAD			
21/06/ 2023	molino	10	SIN NOVEDAD			


DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

22/06/ 2023	molino	8	SIN NOVEDAD			
23/06/ 2023	molino	0	LLUVIA NO SE TRABAJO			
24/06/ 2023	molino	4	SIN NOVEDAD			


DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

25/06/ 2023	molino	-	DOMINGO NO SE TRABAJO			
26/06/ 2023	RIO NEGRO ALTO	6,9	SIN NOVEDAD			
27/06/ 2023	RIO NEGRO ALTO	9,5	SIN NOVEDAD			


DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

28/06/ 2023	RIO NEGRO ALTO	6,3	SIN NOVEDAD			
29/06/ 2023	RIO NEGRO ALTO	4	STAND BY			
30/06/ 2023	RIO NEGRO ALTO	9,4	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

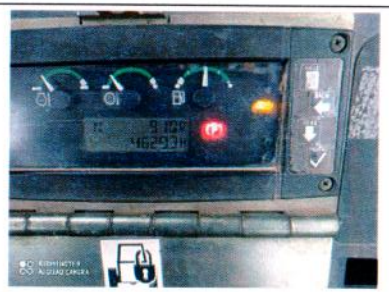1/07/2023	RIO NEGRO ALTO	8,4	SIN NOVEDAD			
2/07/2023	RIO NEGRO ALTO	-	DOMINGO NO SE TRABAJO			
3/07/2023	RIO NEGRO ALTO	4	LLEGARON LOS OPERADORES SOBRE EL MEDIO DIA			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

4/07/2023	RIO NEGRO ALTO	4	STAND BY			
5/07/2023	RIO NEGRO ALTO	4	STAND BY			
6/07/2023	RIO NEGRO ALTO	0	LLUVIA NO SE TRABAJO			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

7/07/2023	RIO NEGRO	8,6	SIN NOVEDAD			
8/07/2023	RIO NEGRO	5	SIN NOVEDAD			
9/07/2023	CABALLEROS	-	DOMINGO NO SE TRABAJO			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

10/07/2023	CABALLEROS	-	SIN NOVEDAD			
11/07/2023	CABALLEROS	7	SIN NOVEDAD			
12/07/2023	CABALLEROS	4	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

13/07/ 2023	MELUA	4	MOVIEMIENTO			
14/07/ 2023	MELUA	4	STAND BY			
15/07/ 2023	MELUA	6	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

16/07/ 2023	MELUA	8	SIN NOVEDAD			
17/07/ 2023	MELUA	7	SIN NOVEDAD			
18/07/ 2023	MELUA	8	SIN NOVEDAD			



DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

19/07/ 2023	MELUA	9	SIN NOVEDAD			
20/07/ 2023	MELUA	5	LUNES FESTIVO NO SE TRABAJO			
21/07/ 2023	MELUA	4,6	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

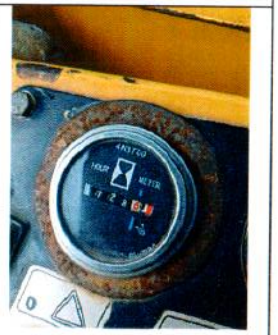
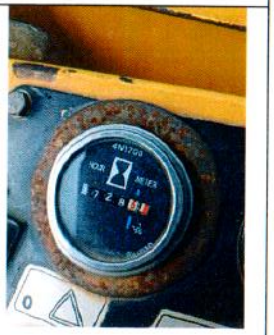
22/07/ 2023	MELUA	0	LLUVIA NO SE TRABAJO			
23/07/ 2023	MELUA	4,8	SIN NOVEDAD			
24/07/ 2023	MELUA	5,5	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

25/07/ 2023	MELUA	5,8	SIN NOVEDAD			
26/07/ 2023	MELUA	5,3	SIN NOVEDAD			
27/07/ 2023	MELUA	4,2	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

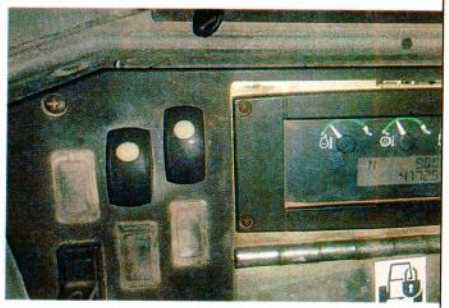28/07/ 2023	MELUA	4,7	SIN NOVEDAD			

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

Nota: de acuerdo con la conformación contractual, las horas de registro para la actividad que registran los equipos-maquinas se determinan por horas, el registro fotográfico de los horómetros se evidencia en la tabla y las volquetas que acompañan las actividades registran las horas medias pues su disposición fue total en las actividades desarrolladas.

ESTADO FINANCIERO

Dentro de las condiciones iniciales del contrato de prestación de servicio No. 100-103-13-10-000153-2023 cuyo objeto es: ***PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META*** se presenta:

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE	$ 314.003.457,00
VALOR ADICION No. 1	$ 26.367.536,00
VALOR TOTAL	$ 340.370.993,00

El presente proyecto se encuentra en ejecución y en virtud del presente informe se realiza el trámite y solicitud de la adición presupuestal debido a las siguientes actividades

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT
1,00	**ALQUILER, RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.**	**HR**	**35,50**
1,01	**ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON**	**HR**	**35,00**
1,02	**ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP**	**HR**	**93,75**

CONSORCIO MAQUINAS 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA EJECUCION EN CAMPO



DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023

















DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023




DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023



DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504


CONSORCIO MAQUINAS 2023

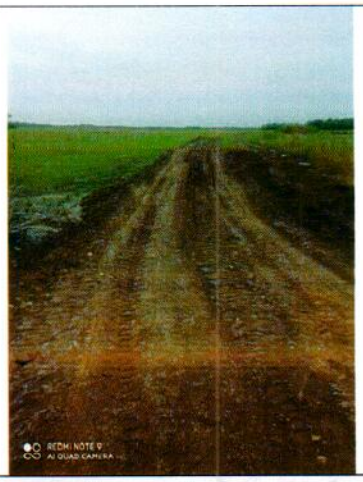







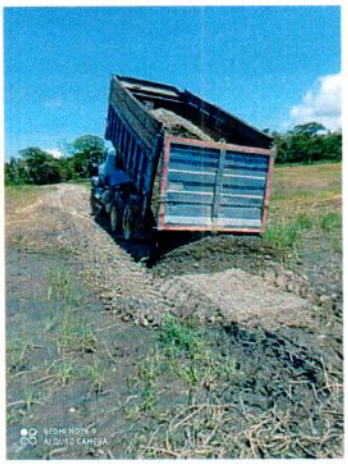




DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023




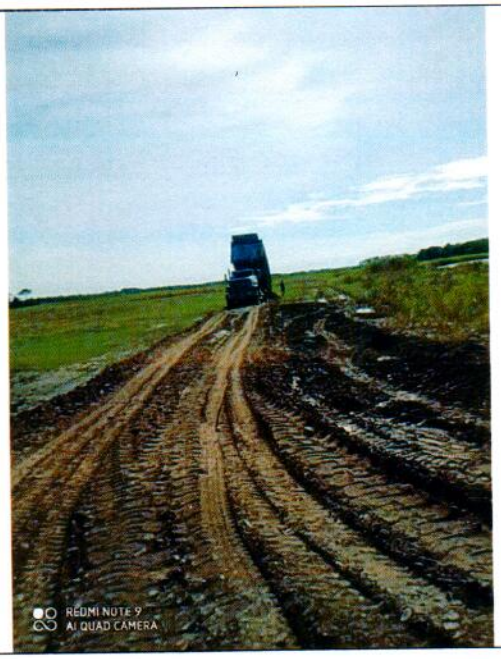







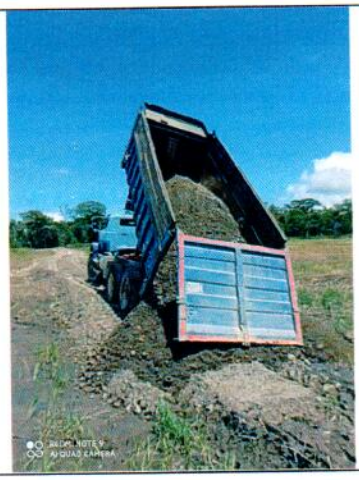

DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

CONSORCIO MAQUINAS 2023









DIRECCIÓN: CLL 20 12 44 BARRIO VILLATERESA-ACACIAS
TELEFONO: 3108047504

7 CONCLUSIONES

- ✓ A la fecha del presente informe se realizó un avance de ejecución del contrato del 80, se realiza la solicitud de adicionar horas máquina para complementar los trabajos que se vienen adelantando.

- ✓ El presente informe nace de la necesidad de realizar adición de recurso por el valor de $26.367.536,00 en horas de maquina según la siguiente descripción:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT
1,00	ALQUILER, RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	35,50
1,01	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON	HR	35,00
1,02	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	93,75

- ✓ El contrato de prestación de servicio se ejecuta de acuerdo con las condiciones contratadas y a las modificaciones efectuadas por parte de la entidad, con las cuales nosotros estamos de acuerdo.

- ✓ Según la formulación del contrato, se requería mayor mantenimiento vial desarrollado por la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, habiéndose formulado con más horas de esa máquina en comparación de la maquina VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP, dándose una relación de 448 horas y 224 horas respectivamente, sin embargo las condiciones climáticas en razón de la emergencia del fenómeno del niño Desde el pasado mes de abril, informada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció la llegada de un nuevo episodio de El Niño, estimando una probabilidad moderada (60%) de formación de este evento climático, entre mayo y julio de 2023, en donde las altas precipitaciones en el municipio de Puerto Lopez condicionan las actividades proyectadas inicialmente, siendo la mayoría de los suelos un compuesto limo-arcilloso del municipio en la zona rural, que el comportamiento de estos suelos suele ser expansivo y requiere de mayor sellado y compactación para mejorar las condiciones de transito y que los mantenimientos viales rurales extiendan su duración a la erosión y desgaste.

- ✓ En virtud de lo anterior y en razón de la ejecución del presente contrato, se refleja la necesidad de aumentar la cantidad de horas del equipo completo de maquinaria con el fin de equiparar las actividades que se van desarrollando de manera conjunta con la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, y dar cierre efectivo a la ejecución del contrato, en donde la nivelación y conformación que desarrolla la MOTONIVELADORA se complemente con la compactación y el sellado que ejecuta el VIBROCOMPACTADOR, y se preste el apoyo de la RETOREXCAVADORA de esta manera se maximizan tanto la manera en que se invierten los recursos y el tiempo de conservación de las vías terciarias.

41

DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA
CC. 1.121.940.523 expedida en Villavicencio
Representante Legal

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA	F - 171
		Versión: 001
		Fecha: Marzo de 2020

PROYECTO:	Objeto contractual: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-000153-2023, "PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"	Fecha de Actualización:	10/07/2023

MAQUINARIA PARA VIAS TERCIARIAS

AIM	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5022	1,00	ALQUILER, RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	35,50	$ 222.339,60	$ 7.893.055,80
3990	1,01	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON	HR	35,00	$ 166.235,70	$ 5.818.249,50
5620	1,02	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	93,75	$ 135.000,00	$ 12.656.230,70
					SUBTOTAL	$ 26.367.536,00
					COSTO TOTAL DIRECTO	$ 26.367.536,00
					TOTAL COSTO PRESUPUESTO	$ 26.367.536,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		RAUL ANDRES AVILA	APROBÓ	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	
		CPS - Profesional Universitario		Secretaria de Infraestructura	
		Firma		Firma	

NOTA 01: LOS PRECIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDE A LA ADOPCION DE PRECIOS DE LA RESOLUCION 217 DE 2020 DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE MODIFICACION No 1	Código: F-236 Versión: 001 Fecha: Agosto de 2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	No. 100-103-13-10-000153-2023	TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAQUINAS 2023	SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 314.003.457,60	PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%):	0%
FECHA PAGO DEL ANTICIPO:	N/A	VALOR DEL ANTICIPO:	$
FECHA ACTA DE INICIO:	6/06/2023	ESTADO:	EN EJECUCION
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	4 MESES O TOTALIDAD DE HORAS DE SERVICIO DE LA MAQUINARIA	FECHA PRESENTE ACTA:	9/08/2023
FECHA DE TERMINACION	5/10/2023		
INTERVENTORIA:	NA		

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: DIANA ALEJANDRA SILVA identificado con Número de cédula 1.121.940.523, en su calidad de Representante legal del CONSORCIO MAQUINAS 2023 cuyo NIT es: 901.707.225-4 y la Ing. MAYERLY ANDREA ESPINOSA., en su calidad de SUPERVISORA y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

CONDICIONES INCIALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,00	ALQUILER, RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO J.D-510 O EQUIVALENTE. ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	448,00	$ 222.339,60	$ 99.608.140,80			35,50	$ 7.893.055,80	483,50	107.501.196,60
1,01	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON	HR	448,00	$ 166.235,70	$ 74.473.593,60			35,00	$ 5.818.249,50	483,00	80.291.843,10
1,02	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	224,00	$ 135.000,00	$ 30.240.000,00			93,75	$ 12.656.230,70	317,75	42.896.230,70
10,30	ALQUIER VOLQUETA 7 M3	HR	896,00	$ 83.040,00	$ 74.403.840,00					896,00	74.403.840,00
2,10	ALQUILER RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3. INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE.	HR	136,00	$ 259.396,20	$ 35.277.883,20					136,00	35.277.883,20
				COSTO DIRECTO	$ 314.003.457,60		$ 0,00		$ 26.367.536,00		$ 340.370.993,60
				COSTO TOTAL	$ 314.003.457,60		$ 0,00		$ 26.367.536,00		$ 340.370.993,60

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: DIANA ALEJANDRA SILVA identificado con Número de cédula 1.121.940.523, en su calidad de Representante legal del CONSORCIO MAQUINAS 2023 cuyo NIT es: 901.707.225-4 y la Ing. MAYERLY ANDREA ESPINOSA., en su calidad de SUPERVISORA y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. **01** con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

CONDICIONES INCIALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 314.003.457,60
VALOR ANTICIPO GIRADO:	$ -
VALOR ADICIONES:	$ 26.367.536,00
MODIFICACIONES (+)	$ 26.367.536,00
MODIFICACIONES (-)	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 340.370.993,60

CONCEPTO DE LA SUPERVISION : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE DAR TRAMITE FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: 09/08/2023

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. Supervisor(a)

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	F-098 Version:002 FEBRERO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ **PRORROGA** ☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO N°:	100-103-13-10- 000153-2023
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO :	4 MESES O TOTALIDAD DE HORAS DE SERVICIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO :	9/06/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL :	8/10/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 314.003.457,60
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAQUINAS 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
CARGO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	8/10/2023

B. SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	$ 314.003.457,60

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 314.003.457,60

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 314.003.457,60			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	0	**DIAS**	4	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/10/2023			

	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	F-098 Version:002 FEBRERO DE 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☑ **PRORROGA** ☐

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☑ al contrato anteriormente citado por valor de $ 26.367.536,00

TIEMPO	
MES	DIAS
-	-

PRORROGA ☐ al contrato anteriormente citado de

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia 10 de AGOSTO de 2023 el Contrato de PRESTACION DE SEVICIOS referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 80.00% contra un avance programado del 50.00 %

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 314.003.457,60
Valor facturado ($)	$ 0,00
Valor facturado reajustes ($)	$ 0,00
Valor anticipo amortizado ($)	N/A
Valor anticipo por amortizar ($)	N/A

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

Según la formulación del contrato, se requería mayor mantenimiento vial desarrollado por la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, habiéndose formulado con mas horas de esa máquina en comparación de la maquina VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP, dándose una relación de 448 horas y 224 horas respectivamente, sin embargo las condiciones climáticas en razón de la emergencia del fenómeno del niño Desde el pasado mes de abril, informada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció la llegada de un nuevo episodio de El Niño, estimando una probabilidad moderada (60%) de formación de este evento climático, entre mayo y julio de 2023, en donde las altas precipitaciones en el municipio de Puerto Lopez condicionan las actividades proyectadas inicialmente, siendo la mayoría de los suelos un compuesto limo-arcilloso del municipio en la zona rural, que el comportamiento de estos suelos suele ser expansivo y requiere de mayor sellado y compactación para mejorar las condiciones de transito y que los mantenimientos viales rurales extiendan su duración a la erosión y desgaste.

En virtud de lo anterior y en razón de la ejecución del presente contrato, se refleja la necesidad de aumentar la cantidad de horas del equipo completo de maquinaria con el fin de equiparar las actividades que se van desarrollando de manera conjunta con la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, y dar cierre efectivo a la ejecución del contrato, en donde la nivelación y conformación que desarrolla la MOTONIVELADORA se complemente con la compactación y el sellado que ejecuta el VIBROCOMPACTADOR, y se preste el apoyo de la RETOREXCAVADORA de esta manera se maximizan tanto la manera en que se invierten los recursos y el tiempo de conservación de las vías terciarias

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

N/A

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 340.370.993,60			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	29	**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/10/2023			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los 10 DE AGOSTO DE 2023

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ SUPERVISOR DEL MUNICIPIO Firma	DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA Representante Legal Contratista Firma

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	FORMATO CARTA DE SOLICITUD CERTIFICADO	Código: F – 110
		Versión: 006
		Fecha: Agosto de 2022

Doctor (a):
HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ
Secretario (a) de Planeación
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICADO ADICION A PROCESO CONTRACTUAL

Cordial saludo,

De manera atenta solicito certificado del Banco de Programas y Proyectos de Inversión para ADICION a proceso contractual teniendo en cuenta la siguiente información:

NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto López
CÓDIGO: BPIN #	2020505730016
EJE ESTRATEGICO:	II. Guía Para el Desarrollo de la Inversión Social
SECTOR:	24. TRANSPORTE
PROGRAMA:	VIAS URBANAS RURALES
META (S) PRODUCTO A LA QUE SE APUNTA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Construir, mantener, rehabilitar o mejorar las vías terciarias del municipio
INDICADOR (ES) META PRODUCTO, AL QUE SE APUNTA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Número de Kilómetros de vías Terciarias Construidas, mantenidas, rehabilitadas o mejorada
ACTIVIDAD (ES) A EJECUTAR CONTENIDAS EN EL PROYECTO:	Construir, mantener, rehabilitar o mejorar las vías terciarias del municipio
FUENTE (S) DE FINANCIACIÓN (Incluir # Código Y/o Rubro presupuestal)	2.3.24.2402.0600.01 ITO BPIN 2020505730016 Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto López

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	FORMATO CARTA DE SOLICITUD CERTIFICADO	Código: F – 110
		Versión: 006
		Fecha: Agosto de 2022

VALOR A CONTRATAR:	VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($26.367.536,00)

Firma: _____

Nombre: **MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nota: la presente solicitud es Vinculante al Objeto contractual: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-000153-2023, "PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"**

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: RAUL ANDRES AVILA ORTEGA	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Cargo: Profesional CPS	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 12/07/2023	Fecha: 12/07/2023	Fecha: 12/07/2023

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Código: F – 111 Versión: 003 Fecha julio de 2023

CONSECUTIVO Nº: 2023-00445

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL (B.P.P.I.M.)

CERT IFICA QUE:

El Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ

Registrado Con Codigo BPIN No: 2020505730016

Código De Archivo No: 140-45-24-0016-2020

Afectacion Al Plan De Desarrollo Municipal "Gobierno Sano 2020 -2023"

LINEA ESTRATEGICA:	II. GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVERSIÓN SOCIAL
SECTOR :	TRANSPORTE
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA:	VIAS URBANAS Y RURALES-
META DE PRODUCTOS:	Realizar renovaciones urbanísticas que garanticen la segura movilidad de los peatones y bici-usuarios en el casco urbano del municipio.
	Realizar los estudios que permitan identificar y realizar la construcción de espacios y senderos para la circulación segura de los peatones.
	Realizar la construcción, de senderos peatonales y alamedas ecológicas en los entornos de las instituciones educativas.
	Realizar la construcción adecuación e implementación de espacios y estrategias que contribuyan a garantizar la segura circulación de los peatones en e
	Implementar medidas para mejorar la seguridad vial del municipio.
	Aplicar medidas que garanticen, regulen y controlen la señalización y seguridad vial en el municipio.
	Estudios, diseños construcción y mantenimiento de puentes, obras de infraestructura vial y obras de arte
	Realizar o gestionar la compra o mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo necesarios para la construcción y conservación de la infraestructura
	Construir, mantener, rehabilitar o mejorar las vías terciarias del municipio.
	construir, mantener, rehabilitar o mejorar vías urbanas del municipio.
INDICADOR META PRODUCTO PDT:	Número de kilómetros de vías terciarias construidas, mantenidas, rehabilitadas o mejoradas

Se Encuentra Registrado Para La Vigencia 2020 - 2021 - 2022- 2023 desde el 28 de julio de 2020 , Cuenta Con Presupuesto Y viabilidad técnica emitida por La Secretaria de Infraestructura Y Da Cumplimiento A La (s) Meta (s):n°:

Construir, mantener, rehabilitar o mejorar las vías terciarias del municipio.

COMPONENTE: 3.1 Vía terciaria ampliada y/o rectificada

El Objeto del contrato cumple con las actividades contempladas en el Proyecto:	Construir, mantener, rehabilitar o mejorar las vías terciarias del municipio	$26,367,536.00

POR VALOR DE: $26.367.536

FUENTE DE FINANCIACION: 2.3.24.2402.0600.01 BPIN 2020505730016 Construcci?n . mejoramiento. mantenimiento y rehabilitaci?n de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la segur $ 26,367,536.00

Software Argus - DM Profesionales

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	F - 087
		Versión: 003
		Fecha: Febrero de 2023

Fecha	6/07/2023			
Dependencia solicitante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Dependencia ordenadora del gasto:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Rubro del gasto:	2.3.24.2402.0600.01			
Nombre del Rubro:	BPIN 2020505730016 Construcción , mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto López			
Codigo CUIPO (FUENTE):	20	**Descripción CUIPO:**	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	
Codigo MGA:	2402-0600-2402114-2020505730016			
Descripción MGA:	Construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y fortalecimiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Puerto López			
Codigo Producto MGA	2402043	**Producto MGA /Objeto de Gasto**	Vía terciaria ampliada y/o rectificada	
Código CCPET:	2.3.2.02.02.008			
Descripción CCPET:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			
Codigo Detalle Sectorial	N/A	**Descripción**	N/A	
Código DANE:	85999	**Descripción DANE:**	Otros servicios de apoyo n c p	
Objeto Contractual	Nota: la presente solicitud es Vinculante al Objeto contractual: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 100-103-13-10-000153-2023, "PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"			
Valor	**En Letras: VEINTI SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE**		**En Cifras: ($26.367.536,00)**	

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Documentos Anexos: Los documentos que aplique deberán ser en Original.		**CUMPLE**		
ITEM	**DOCUMENTOS ORIGINALES**	**SI**	**NO**	**N.A**
1	Estudio Previo			X
2	Certificado de No disponibilidad de personal (solo para contratos de prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión)			X
3	Presupuesto Oficial	X		
4	Certificado Plan de Adquisiciones			X
5	Certificado del Banco de Programas y Proyectos. (si es inversión)	X		
6	Factura de Servicio Público (Aplica para pagos de Servicios Públicos de la Administración central)			X
7	Liquidación (Cesantías, Prestaciones Sociales, Nomina, viaticos)			X

Nombre de quien revisó

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro 01274

Fecha : Julio 21 de 2023

Solicitante : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Objeto : ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 100-103-13-10-00153-2023 PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Inversión para la vigencia fiscal de 2023 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $26,367,536.00, para amparar el compromiso que se pretende adquirir, de acuerdo con el valor (s) y la distribución (s) presupuestal (s) que se detalla a continuación.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
CCION 03 SECTOR	2.3.24.2402.0600.01	BPIN 2020505730016 Construcción . mejoramiento. ma	$26,367,536.00
		Total :	$26,367,536.00

Vigencias futuras : Si el objeto del compromiso con este CDP se ampara, afecta vigencias futuras, indique la referencia de autorización : _____

SECRETARIO DE HACIENDA

ocesado por : JULIO RODRIGUEZ

RP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
OFICINA DE CONTRATACIÓN
ACTA ADICION

Gobierno Sano
PUERTO LÓPEZ - META

ACTA DE ADICION Y ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1 DEL CONTRATO NÚMERO 100-103-13-10-000153-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META Y CONSORCIO MAQUINAS 2023

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
No DE CONTRATO:	100-103-13-10-000153-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAQUINAS 2023 IDENTIFICADO (a) CON NIT. 901.707.225-4 R/L DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA, IDENTIFICADO (A) CON CEDULA No. 1.121.940.523
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CATORCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($314.003.457,60)
FECHA DEL CONTRATO:	28 ABRIL DE 2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA INICIO	9 JUNIO DE 2023
FECHA TERMINACION	8 OCTUBRE DE 2023
ADICION	11 AGOSTO DE 2023
VALOR ADICION	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($26.367.536)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 340.370.993.60)
VALOR MODIFICACION DE CANTIDADES N 1	TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

	NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 340.370.993.60)
FECHA TERMINACION	8 OCTUBRE DE 2023

Entre los suscritos a saber Entre los suscritos a saber **RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.876.446 de Villavicencio, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 103 del 15 de octubre de 2021, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 035 de 2 de febrero de 2016, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO-CONTRATANTE** y por otra parte CONSORCIO MAQUINAS 2023 IDENTIFICADO (a) CON NIT. 901.707.225-4 R/L DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA, IDENTIFICADO (A) CON CEDULA No. 1.121.940.523, quien contractualmente se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta de adición y modificatoria de cantidades Nª 1 al Contrato, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

a) Que con fecha veintiocho (28) de abril de 2023, las partes celebraron el presente contrato.

b) Que el contrato fue iniciado el nueve (9) de junio de 2023.

c) Que la fecha de terminación inicial del contrato es el día ocho (8) de octubre de 2023.

d) Que mediante oficio OF-01-07-2023, el contratista realiza un avance de ejecución donde se evidencia la necesidad de aumentar la cantidad de horas del equipo completo de maquinaria con el fin de equiparar las actividades que se van desarrollando de manera conjunta con la maquinaria.

e) Que el día diez (10) agosto de 2023, la supervisora del contrato solicita a la oficina de contratación que se adicione el contrato en la suma de **VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($26.367.536) y se apruebe el acta de mayores y menores cantidades suscrito el 9 agosto de 2023 entre el contratista y supervisor del contrato.**

Las razones establecidas para la adición son:

"Según la formulación del contrato, se requería mayor mantenimiento vial desarrollado por la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, habiéndose formulado con más horas de esa máquina en comparación de la maquina VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP, dándose una relación de 448 horas y 224 horas respectivamente, sin embargo las

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

condiciones climáticas en razón de la emergencia del fenómeno del niño Desde el pasado mes de abril, informada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció la llegada de un nuevo episodio de El Niño, estimando una probabilidad moderada (60%) de formación de este evento climático, entre mayo y julio de 2023, en donde las altas precipitaciones en el municipio de Puerto Lopez condicionan las actividades proyectadas inicialmente, siendo la mayoría de los suelos un compuesto limo-arcilloso del municipio en la zona rural, que el comportamiento de estos suelos suele ser expansivo y requiere de mayor sellado y compactación para mejorar las condiciones de tránsito y que los mantenimientos viales rurales extiendan su duración a la erosión y desgaste.

En virtud de lo anterior y en razón de la ejecución del presente contrato, se refleja la necesidad de aumentar la cantidad de horas del equipo completo de maquinaria con el fin de equiparar las actividades que se van desarrollando de manera conjunta con la MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON, y dar cierre efectivo a la ejecución del contrato, en donde la nivelación y conformación que desarrolla la MOTONIVELADORA se complemente con la compactación y el sellado que ejecuta el VIBROCOMPACTADOR, y se preste el apoyo de la RETOREXCAVADORA de esta manera se maximizan tanto la manera en que se invierten los recursos y el tiempo de conservación de las vías terciarias"

El valor de la adición se distribuirá así:

PROYECTO:		ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META				
AIM	ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5022	1	ALQUILER RETROEXCAVADORA CARGADORA TIPO JD510 O EQUIVALENTE ALQUILER HORA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	35.50	$ 222.339.60	$ 7.893.055.80
3990	1.01	ALQUILER MOTONIVELADORA POTENCIA 140 HP ANCHO DE CUCHILLA 3.66 M 11 TON	HR	35.00	$ 166.235.70	$ 5.818.249.50
5620	1.02	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	93.75	$ 135.000	$ 12.656.230.70
					TOTAL	$ 26.367.536

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

Como soporte de la solicitud además se adjunta solicitud de adición y acta de mayores y menores cantidades suscrita por supervisor y contratista, presupuesto oficial de adición, banco de proyectos de adición, CDP, informe avance de ejecución del contrato.

f) Que en la cláusula primera del contrato de obra se establecieron los precios unitarios y cantidades de a ejecutar los cuales eran conforme a la propuesta económica presentada por el contratista, sin embargo, durante la ejecución de este surgió la necesidad de modificar los valores de conformidad con el acta de mayores y menores cantidades de obra y análisis de los precios unitarios de fecha 09 de Agosto de 2023 suscrito por contratista y supervisor, el cual consta de 2 folios.

g) Que la secretaria de hacienda municipal expidió el certificado de disponibilidad presupuestal Nª 01274 del 21 de Julio de 2023 por valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($26.367.536), recurso que respalda la presente adición.

h) Que la Oficina de Contratación al revisar las anteriores consideraciones, estima que se hace necesario autorizar la adición, y modificatoria requerida, toda vez que los mismos contribuyen al cumplimiento del objeto del contrato.

I) Que la presente adición y modificatoria de mayores y menores cantidades se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR a la CLÁUSULA PRIMERA del contrato "VALOR DEL CONTRATO", la suma de **VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($26.367.536).** Por lo anterior la cláusula primera quedará así: ***CLAUSULA PRIMERA- VALOR DEL CONTRATO:*** El valor del presente contrato es hasta por la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 340.370.993.60),** incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

CLAUSULA SEGUNDA: La cláusula primera respecto a las actividades específicas quedará así: **ACTIVIDADES ESPECIFICAS:** En el marco del objeto, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas de acuerdo con los precios unitarios que se relacionan en la

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

acta modificatoria de cantidades N° 1, la cual esta anexa a la presente y hace parte integral de la presente acta la cual consta de 2 folios.

CLAUSULA TERCERA: REMITIR copia de la presente acta de adición a la Secretaría de Hacienda para la expedición del correspondiente Registro Presupuestal del contrato.

CLAUSULA CUARTA: GARANTIAS– EL Contratista se obliga a modificar las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, adicionándola proporcionalmente de acuerdo al valor pactado en la presente acta, respecto de los riesgos amparados inicialmente

CLAUSULA QUINTA: PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

Para su legalización requiere la expedición del registro presupuestal de adición y la aprobación de la modificación de la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA SEXTA: Las demás clausulas permanecerán incólumes.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en Puerto López a los once (11) días del Mes de agosto de 2023.

EL CONTRATANTE

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina de Contratación

CONTRATISTA

CONSORCIO MAQUINAS 2023
R.L DIANA ALEJANDRA SILVA PEDRAZA
Contratista

Proyecto: Leidy Lorena Esquivel Murcia
Profesional universitaria

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Código: F - 092
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2017

Fecha	11-ago-23	
Dependencia	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	
Persona/entidad Beneficiaria	CONSORCIO MAQUINAS 2023	
C.c./Nit	901.707.225-4	
Fuente de Financiación	2,3,24,2402,0600,01	
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META	
Valor	**En Letras: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE**	**En Cifras: $ 26.367.536**

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN

Elaborado:		Revisado:		Revisado:	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cargo:		Cargo:	JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
Fecha:	11/08/2023	Fecha:	11/08/2023	Fecha:	11/08/2023

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro : 01346

Fecha : Agosto 14 de 2023

Beneficiario : CONSORCIO MAQUINAS 2023 Identificación: 901707225

Objeto : ADICION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 100-103-13-10-00153-2023 PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ-META

Contrato: 00153 Fecha: 14/08/2023 Clase: C01 Servicios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

En el presupuesto de gastos de Inversión para la vigencia fiscal del 2023 , se reserva la suma de *****26.367.536,00, para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectación presupuestal que se detalla.

Dependencia Programa	Cod Pptal	Denominación - Presupuesto	Valor
39 SECCION 03 SECTOR	2.3.24.2402.0600.01	BPIN 2020505730016 Construcción . mejoramiento.	$26.367.536,00
		Total :	$26.367.536,00

Si el objeto del compromiso de este registro presupuestal, compromete vigencias futuras detallar el No del acto administrativo que lo autoriza

SECRETARIO DE HACIENDA

Procesado por : JULIO RODRIGUEZ
