ANEXO 4
ACTA SUSPENSION 1

ACTA DE SUSPENSIÓN
No 01 / (2023)

_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	60	AÑO:	2022

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS		
	NIT O CC:	900.410.655-8		
	DIRECCIÒN:	CALLE 46 # 16-24 OFIC. 705 EDIF. SAN JUAN PLAZA	**TEL:**	8641641-3214860684
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284 de Garzón/Huila		
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA DENOMINADA GARZON-PARAISO-EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL # 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO # 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
VALOR DE CONTRATO:	$ 527.695.620 M/CTE			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N/A		
FECHA DE INICIO:	**12 /12 / 2022**			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	**SUSPENSIÓN**	**11/ 01/ 2023**	
		REINICIACIÓN		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

FECHA ACTA (SUSPENSIÓN No. 1):	**11/ 01/ 2023**	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**
	EN CALIDAD DE:	Secretaria De Gobierno Y Desarrollo Comunitario
	NOMBRE:	**GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**
	EN CALIDAD DE:	R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S - Contratista de Obra
	NOMBRE:	**MARIO FERNANDO ESTRADA MORA**
	EN CALIDAD DE:	R.L. INDICON INGENIERIA SAS. - Interventor

En la ciudad de Neiva en el despacho de la Secretaría de Gobierno Y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo hoy 11 de enero de 2023, se reunieron La Dra. **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario; El señor **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL,** representante legal de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, como Contratista de obra; y El Ingeniero **MARIO FERNANDO ESTRADA MORA,** representante legal de **INDICON INGENIERIA SAS**, como Interventoría; con el fin de determinar la procedencia para la suspensión No. 01 de la Orden de Servicios No. 60 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 12 de diciembre de 2022, el **DEPARTAMENTO DEL HUILA** suscribió la Orden de Servicios No. 60 de 2022 cuyo objeto es **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA DENOMINADA GARZON-PARAISO-EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL # 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO # 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, con la empresa **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, por un valor de **QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($527.695.620,71) M/CTE.**

2. Que el plazo de ejecución de la Orden de Servicios No. 60 de 2022 se estableció en dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio suscrita el 12 de diciembre de 2022, encontrándose a la fecha vigente y en ejecución.

3. Que el día 11 de enero de 2023, el contratista de Obra, **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S** mediante oficio, solicitó a la interventoría la **suspensión No. 01** de la Orden de Servicios No. 60 de 2022 por el término de **quince (15) días** y/o hasta tanto se superen los hechos y restricciones manifestados, y se tengan garantías para desarrollar las actividades, sustentando las siguientes razones:

la construcción del muro de contención se realiza con el fin de estabilizar el talud existente en la vía, actividad que no puede ser ejecutada a satisfacción ante las fuertes y constantes precipitaciones, puesto que las lluvias podrían saturar las excavaciones que se requieren para la cimentación del muro, además de aumentar fuertemente el riesgo de deslizamiento de calzada. Finalmente es necesario manifestar que, en razón a la situación anteriormente expuesta la totalidad de las operaciones en campo se encuentras suspendidas, por lo que solicitamos comedidamente la suspensión del contrato a partir del 11 de enero de 2023 por un periodo de 15 días calendario, tiempo necesario para que las condiciones climáticas en el territorio, mejoren y se puedan restablecer las actividades de ejecución de obra, transporte de material y equipos.

4. Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta la ola invernal que se viene presentando en nuestro Departamento, se puede observar que existen condiciones ajenas a la voluntad de las partes que han impedido desarrollar de forma adecuada la ejecución de las actividades de la orden de servicios No 60 de 2022.

5. Que, una vez analizadas las razones expuestas por el Contratista de Obra, la Interventoría manifiesta mediante oficio de fecha 11 de enero de 2023 dirigido a la Secretaria de Gobierno Y Desarrollo Comunitario y supervisor de la orden de servicio No 60 de 2022, manifestó que "*...efectuada la revisión de la información relacionada, se pudo constatar que la misma guarda coherencia con la situación que se plantea por lo que, y con el fin de anticiparse a hechos que puedan generar la afectación financiera, técnica, jurídica y demás relacionadas en la ejecución de la Orden de Servicios No 60 de 2022, esta interventoría considera viable y acepta suspender la orden de servicios de la referencia por el plazo de quince (15) días y/o hasta tanto se superen los hechos y restricciones manifestados, y se tengan para desarrollar las actividades, por lo que se deja constancia que, en caso de presentarse las condiciones que permitan el desarrollo normal del contrato, en un plazo inferior al solicitado de la presente suspensión se procederá a dar el reinicio de las actividades*", por lo cual, con ese oficio se tiene el aval por parte del interventor para proceder a suscribir la suspensión No.01. De igual manera una vez superado las condiciones climáticas y dando reinicio a las actividades el contratista de obra se compromete a llevar a cabo las actividades contempladas.

Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el artículo 26 de la ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y al encontrar justificado todo lo anteriormente expuesto las partes consideran la procedencia de:

1. Suspender el plazo de ejecución de la Orden de Servicios No. 60 de 2022, por un plazo de quince (15) días contados a partir de la suscripción del presente documento, estableciéndose como fecha de reinicio el día 26 de enero de 2023 y/o hasta tanto se superen los hechos y

restricciones manifestados, y se tengan garantías para desarrollar las actividades, por lo que se deja constancia que, en caso de presentarse las condiciones que permitan el desarrollo normal del contrato, en un plazo inferior al solicitado de la presente suspensión se procederá a dar el reinicio de las actividades.

2. El contratista de la Orden de Servicios deberá informar a la compañía aseguradora sobre la suspensión No. 01 de la ejecución de la Orden de Servicios No. 60 de 2022, para la respectiva aplicación de las vigencias de las pólizas correspondientes.

3. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán reanudar la Orden de Servicios en cualquier tiempo, dentro del plazo de la suspensión.

4. Que una vez finalice esta suspensión, las partes continuaran con el normal desarrollo y ejecución de la Orden de Servicios.

Para constancia se firma en Neiva por quienes en ella intervinieron, hoy 11 de enero de 2023.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	11/01/2023

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Contratista de Obra

MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
R.L. INDICON INGENIERIA SAS
Interventor

Neiva, 11 de enero de 2023

Señores
INDICON INGENIERÍA SAS
Ing. Mario Fernando Estrada Mora
Interventor orden de servicio No. 60 de 2022

REFERENCIA: Orden de servicio No. 60 de 2022 con objeto contractual: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA DENOMINADA GARZON-PARAISO-EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL # 059 del 9 de marzo de 2022, prorrogado mediante decreto # 299 del 7 de septiembre de 2022"

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022

Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de la orden de servicio No. 60 de 2022 con objeto contractual: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA DENOMINADA GARZON-PARAISO-EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON I A DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL # 059 del 9 de marzo de 2022, prorrogado mediante decreto # 299 del 7 de septiembre de 2022" y que tiene un tiempo de ejecución por 2 meses contados a partir del 12 de diciembre de 2022 me permito solicitar suspensión de contrato por las siguientes razones:

1. La construcción del muro de contención se realiza con el fin de estabilizar el talud existente en la vía, actividad que no puede ser ejecutada a satisfacción ante las fuertes y constantes precipitaciones, puesto que las lluvias podrían saturar las excavaciones que se requieren para la cimentación del muro, además de aumentar fuertemente el riesgo de deslizamiento de calzada. Finalmente es necesario manifestar que, en razón a la situación anteriormente expuesta la totalidad de las operaciones en campo se encuentras suspendidas, por lo que solicitamos comedidamente la suspensión del contrato a partir del 11 de diciembre por un periodo de 15 días calendario, tiempo necesario para que las condiciones climáticas en el territorio, mejoren y se puedan restablecer las actividades de ejecución de obra, transporte de material y equipos.

Agradezco su atención,

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. CEQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Cel. 3214860684

ANEXO 5
ACTA REINICIO 1

ACTA DE REINICIACION
No 01 / (2023)

X__ CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	60	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S		
	NIT O CC:	900.410.655-8		
	DIRECCIÒN:	CALLE 46 # 16-24 OFIC. 705 EDIF. SAN JUAN PLAZA	**TEL.:**	8641641-3214860684
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284 de Garzón/Huila		
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA DENOMINADA GARZON-PARAISO-EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL # 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO # 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
VALOR DE CONTRATO:	$ 527.695.620 M/CTE			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	**N/A**		
FECHA DE INICIO:	**12 /12 / 2022**			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	**11 / 01 / 2023**	
		REINICIACIÓN	**26 / 01 / 2023**	
FECHA ACTA (REINICIACION No. 1):	**26 / 01 / 2023**			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**		
	EN CALIDAD DE:	Secretaria De Gobierno Y Desarrollo Comunitario		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

	NOMBRE:	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
	EN CALIDAD DE:	R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S - Contratista de Obra
	NOMBRE:	MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
	EN CALIDAD DE:	R.L. INDICON INGENIERIA SAS. - Interventor

En la ciudad de Neiva en el despacho de la Secretaría de Gobierno Y Desarrollo Comunitario del Departamento del Huila, siendo hoy 26 de enero de 2023, se reunieron La Dra. **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario; El señor **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL,** representante legal de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S,** como contratista de obra; y El Ingeniero **MARIO FERNANDO ESTRADA MORA,** representante legal de **INDICON INGENIERIA SAS**, como Interventoría; con el fin de suscribir el Acta de Reiniciación No. 01 de la Orden de Servicios No. 60 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que una vez superada los motivos generadores de la suspensión No 01 de la Orden de Servicios No. 60 de 2022, se decide reiniciar las actividades correspondientes

Por la razón anteriormente expuesta, las partes intervinientes acuerdan:

1. Reiniciar la Orden de Servicios No. 60 de 2022, a partir del 26 de enero de 2023.

2. El contratista debe informar a la compañía aseguradora sobre el reinicio de la ejecución del contrato, para las respectivas ampliaciones de las vigencias de las pólizas correspondientes.

Para constancia se firma en Neiva por quienes en ella intervinieron, hoy 26 de enero de 2022.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	26/01/2023

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Contratista de obra

MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
R.L. INDICON INGENIERIA SAS
Interventor

ANEXO 6
OTRO SI No. 1

OTRO SI No. 01 A LA ORDEN DE SERCIVIOS Nro. 60 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S NIT: 900.410.655-8
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 527.695.620 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
SUSPENSION 1:	11 DE ENERO DE 2023
REINICIACIÒN 1:	26 DE ENERO DE 2023

Entre los suscritos a saber, **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 36.303.858 expedida en Villavieja, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL HUILA, entidad territorial identificada con Nit: 800.103.913-4 en su calidad de Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, nombrada mediante el Decreto Departamental No. 282 de 2022 y Acta de Posesión No 209 del 26 de agosto de 2022, y en ejercicio de la facultad de administrador y ordenador del gasto de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 259 de 2022, quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** representante legal de **EQUISEVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, quien para efectos del presente Contrato se ha venido denominando **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI No 01** al Contrato de **ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022** previas las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el **DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el día 14 de octubre de 2022, el contrato de orden de servicio No. 60 de 2022 el cual tiene por objeto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA

DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022". **2.** Que conforme a lo estipulado en el contrato de Orden de Servicio No. 60 de 2022, el plazo de ejecución del Contrato es DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ACTA DE INICIO. **3.** Que el día 12 de diciembre de 2022 se suscribió el Acta de Inicio y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecución. **4.** Que conforme al Acta de Justificación No. 01 de 2023, suscrita por la secretaria de gobierno y desarrollo comunitario, el Contratista y la interventoría, se determinó la oportunidad y conveniencia de modificar las condiciones iniciales del contrato, por las razones allí consignadas; la cual hace parte integral del presente documento. **5.** Que con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente OTRO SI No.01, el cual se rige por las siguientes Clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** que el numeral 3 de la orden de servicio OS 60 de 2022 quedara así:

> ***PLAZO DE EJECUCIÒN Y VIGENCIA, PLAZO DEL CONTRATO,*** *el plazo de ejecución del presente contrato es de DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y en todo caso estará vigente hasta la culminación de la obra y/o su liquidación.*

CLÁUSULA SEGUNDA: Hace parte integral del presente OTRO SI No. 01 el ACTA DE JUSTIFICACION No 01 / 2023 del contrato **ORDEN DE SERVICIOS FDGRD No. 60 DE 2022** de fecha de 23 de febrero de 2023. **CLÁUSULA TERCERA:** Para el perfeccionamiento y legalización el presente OTRO SI No. 01, se requiere de las firmas de las partes. **CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO** Quedan vigentes las demás estipulaciones del contrato principal que no hayan sido modificadas o adicionadas por el presente OTRO SI No. 01, las cuales se conservan en su integridad.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el día 23 de febrero de 2023.

POR EL DEPARTAMENTO:

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de gobierno y desarrollo comunitario

CAMPO_REVISO
Reviso: JOSE LUIS ROJAS
Abogado

POR EL CONTRATISTA:

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
CC. 12.193.284

ACTA DE JUSTIFICACION
No 01 / 2023

_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIO FDGRD	Nº:	60	AÑO:	2022

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S		
	NIT:	900.410.655-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 46 No 16-24, Ofi 705-706	**TEL:**	8641641-3214860684
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284		
	E-MAIL	equiserviciossas@equindustriales.com		
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	$ 527.695.620 M/CTE			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A		
PLAZO INICIAL:	**DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

FECHA DE INICIO:	12/12/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	11/01/2023
		REINICIACIÓN	26/01/2023
FECHA DE ACTA JUSTIFICACIÓN:	23 de febrero de 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		**GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**
	EN CALIDAD DE:		R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S – Contratista de obra
	NOMBRE:		**MARIO FERNANDO ESTRADA**
	EN CALIDAD DE:		R.L. INDICON INGENIERIA SAS – Interventor

En la ciudad de NEIVA, en el despacho de la SECRETARIA DE VIAS del Departamento del Huila, siendo las nueve (9.00) AM de hoy veintitrés (23) de febrero de (2023), se reunieron la Dra. **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario; El señor **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** representante legal de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, como Contratista de obra; y el Ingeniero **MARIO FERNANDO ESTRADA MORA**, Representante Legal de **INDICON INGENIERIA S.A.S,** como Interventoría; con el fin de suscribir la presente Acta de **JUSTIFICACION Nº01.**

Teniendo en referencia que el contrato de obra en su objeto contempla la realización de estudios y diseños de igual modo la ejecución de la obra, y que el establecimiento del plazo contractual obedece a un supuesto en razón de que para su formulación se desconocen las características técnicas reales de la obra final a ejecutar y por consiguiente no puede estar ni evaluado ni ajustado a la realidad. Toda vez que a la fecha ya se cuenta con la ingeniería de diseño correspondiente debidamente aprobado por interventoría y socializado con la supervisión del contrato de interventoría, se evidencia que si bien algunos de los ítems contractuales pueden ajustarse a la ejecución de la obra existen condiciones del diseño de la obra, que no están contempladas en el presupuesto contractual por consiguiente se solicita la ampliación del plazo contractual del contrato de obra e interventoría de tal forma que permita la terminación oportuna, en un plazo coherente a la obra a ejecutar, teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra vigente, y en ejecución. La solicitud de esta ampliación de plazo adicional corresponde a 20 días calendario con el fin de que en este periodo de tiempo se pueda surtir el respectivo trámite de evaluación de las condiciones ajustadas a la realidad y que anexo a esta solicitud se entrega para la evaluación pertinente del Departamento los soportes técnicos con su respectiva justificación.

Por tal motivo las condiciones iniciales del contrato deben modificarse de la siguiente manera

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es de dos meses y veinte dias contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y en todo caso estará vigente hasta la culminación de la obra y/o su liquidación

Esta modificación, no modifica el valor inicial del contrato. Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el Interventor consideran viable realizar la modificación a ORDEN DE SERVICIO No. 60 de 2022.

Para constancia se firma en NEIVA por quien en ella intervinieron, hoy Veintitrés (23) de febrero de 2023.

TANIA BEATRIZ BENAFIEL ESPAÑA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

INDICON INGENIERIA S.A.S
R.L. MARIO FERNANDO ESTRADA M.
INTERVENTORÍA

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	14/01/2023

ANEXO 7
OTRO SI No. 2

OTRO SI No. 02 A LA ORDEN DE SERVICIOS Nro. 60 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S NIT: 900.410.655-8
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO - EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 527.695.620 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL:	VEINTE (20) DIAS
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO
SUSPENSION 1:	11 DE ENERO DE 2023
REINICIACIÒN 1:	26 DE ENERO DE 2023

Entre los suscritos a saber, **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 36.303.858 expedida en Villavieja, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL HUILA, entidad territorial identificada con Nit: 800.103.913-4 en su calidad de Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, nombrada mediante el Decreto Departamental No. 282 de 2022 y Acta de Posesión No

209 del 26 de agosto de 2022, y en ejercicio de la facultad de administrador y ordenador del gasto de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 259 de 2022, quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** representante legal de **EQUISEVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, quien para efectos del presente Contrato se ha venido denominando **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI No 02** al Contrato de **ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022** previas las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el **DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el día 14 de octubre de 2022, el contrato de orden de servicio No. 60 de 2022 el cual tiene por objeto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022". **2.** Que conforme a lo estipulado en el contrato de Orden de Servicio No. 60 de 2022, y otro si No 001 de 2023, el plazo de ejecución del Contrato es DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ACTA DE INICIO. **3.** Que el día 12 de diciembre de 2022 se suscribió el Acta de Inicio y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecución. **4.** Que conforme al Acta de Justificación No. 02 de 2023, suscrita por la Secretaria de gobierno y desarrollo comunitario, el Contratista y la interventoría, se determinó la oportunidad y conveniencia de modificar las condiciones iniciales del contrato, por las razones allí consignadas; la cual hace parte integral del presente documento. **5.** Que con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente OTRO SI No.02, el cual se rige por las siguientes Clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** que el numeral 3 de la orden de servicios OS 60 de 2022 quedara así:

PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIAS, PLAZO DEL CONTRATO, el plazo de ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

CLÁUSULA SEGUNDA: hace parte integral del presente OTRO SI No 02 el ACTA DE JUSTIFICACION No 02/2023 de la **ORDEN DE SERVICIOS FDGRD No. 60 de 2022** de fecha de 14 de marzo de 2023. **CLÁUSULA TERCERA:** para el perfeccionamiento y legalización del presente OTRO SI No 02, se requiere de las firmas de las partes **CLAUSULA CUARTA - MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO**

Quedan vigentes las demás estipulaciones del contrato principal que no hayan sido modificadas o adicionadas por el presente OTRO SI No. 02, las cuales se conservan en su integridad.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el día 14 de marzo de 2023.

POR EL DEPARTAMENTO:

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de gobierno y desarrollo comunitario

CAMPO_REVISO
Reviso: JOSE LUIS ROJAS
Abogado

POR EL CONTRATISTA:

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
CC. 12.193.284

ACTA DE JUSTIFICACION
No 02 / 2023

_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIO FDGRD	Nº:	60	AÑO:	2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S					


CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S		
	NIT:	900.410.655-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 46 No 16-24, Ofi 705-706	TEL:	8641641-3214860684
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284		
	E-MAIL	equiserviciossas@equindustriales.com		
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
VALOR DE CONTRATO:	$ 527.695.620 M/CTE			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO			


	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	VEINTE (20) DIAS	
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	11/01/2023
		REINICIACIÓN	26/01/2023
FECHA DE ACTA JUSTIFICACIÓN:	14 de marzo de 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**	
	EN CALIDAD DE:	R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S – Contratista de obra	
	NOMBRE:	**MARIO FERNANDO ESTRADA**	
	EN CALIDAD DE:	R.L. INDICON INGENIERIA SAS – Interventor	

En la ciudad de NEIVA, en el despacho de la SECRETARIA DE EDUCACION del Departamento del Huila, siendo las nueve (9.00) AM de hoy catorce (14) de marzo de 2023, se reunieron la Dra. **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario; El señor **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** representante legal de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, como Contratista de obra; y el Ingeniero **MARIO FERNANDO ESTRADA MORA**, Representante Legal de **INDICON INGENIERIA S.A.S,** como Interventoría; con el fin de suscribir la presente Acta de **JUSTIFICACION Nº02.**

Se solicita la ampliación del plazo contractual de la orden de servicios No 60 de 2022 debido a que la construcción del muro de contención se realiza con el fin de estabilizar el talud existente en la vía, actividad que se ha visto afectada en su rendimiento por las fuertes y constantes precipitaciones, puesto que estas lluvias podran saturar las excavaciones que se requieren para la cimentación del muro y retrasar los llenos. Finalmente es necesario manifestar que en razón a la situación anteriormente expuesta las actividades de excavaciones, fundición de concreto y rellenos se han venido retrasando notablemente, por lo que solicitamos la ampliación del contrato por un periodo de 25 días calendario, tiempo necesario para que las condiciones climáticas en el territorio mejoren y se puedan restablecer las actividades de ejecución de obra. Se anexa registro fotográfico de las actividades que no se han llevado a cabo en su totalidad.

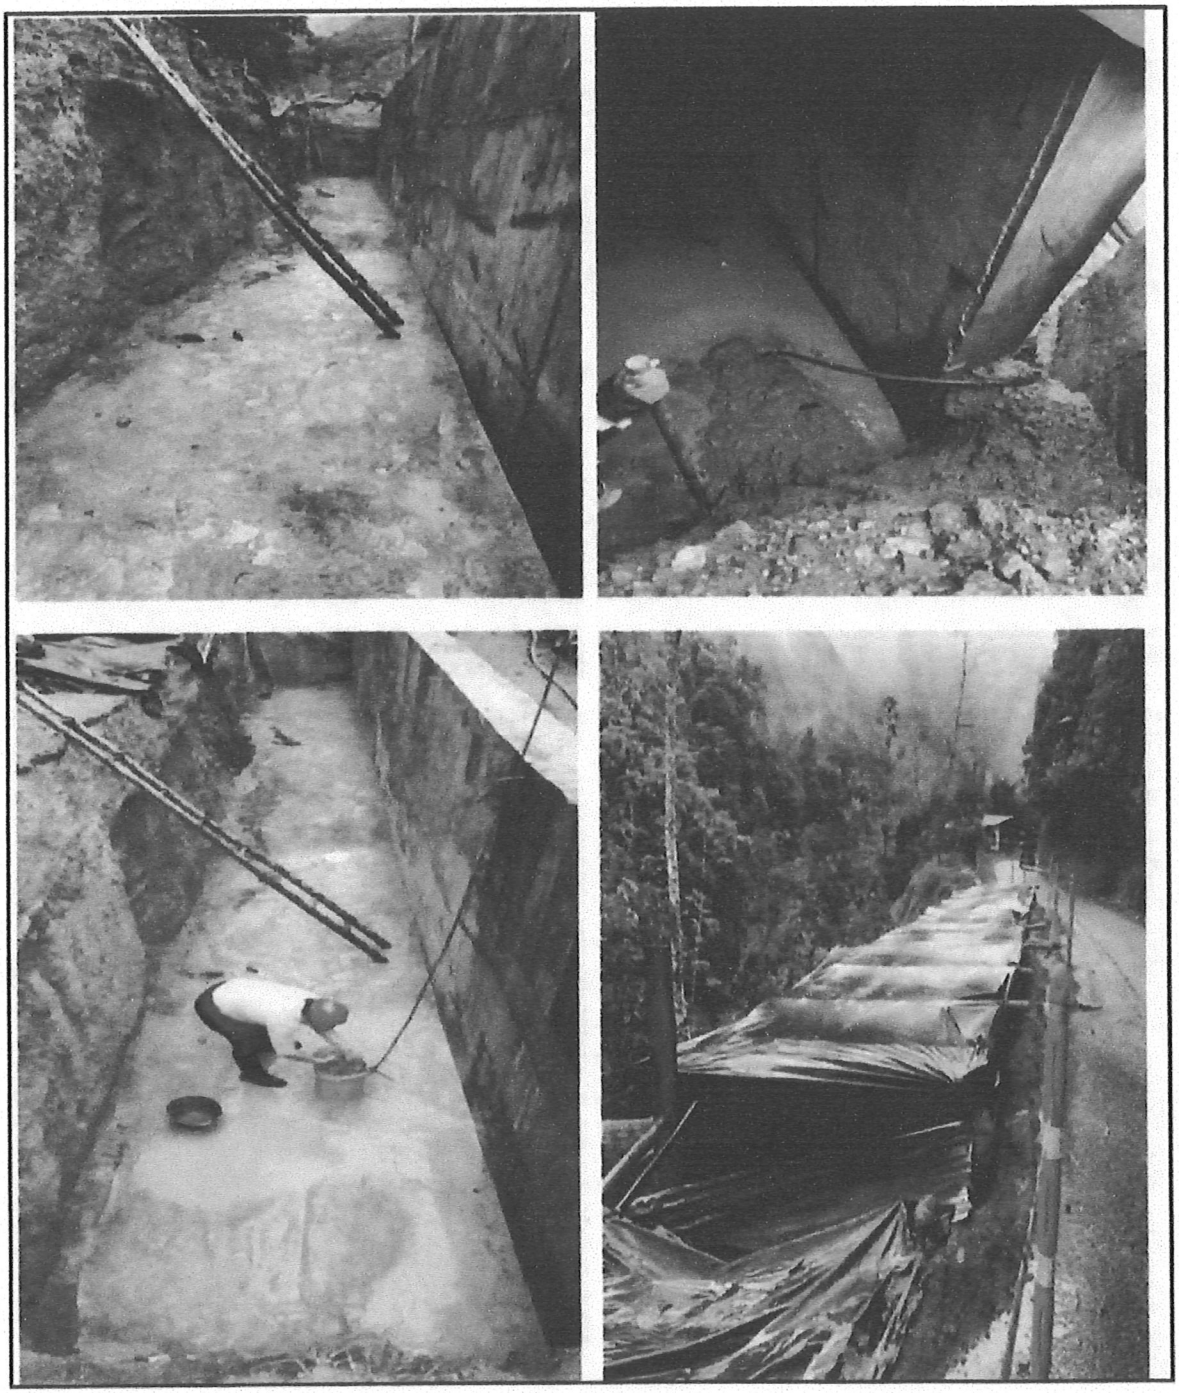

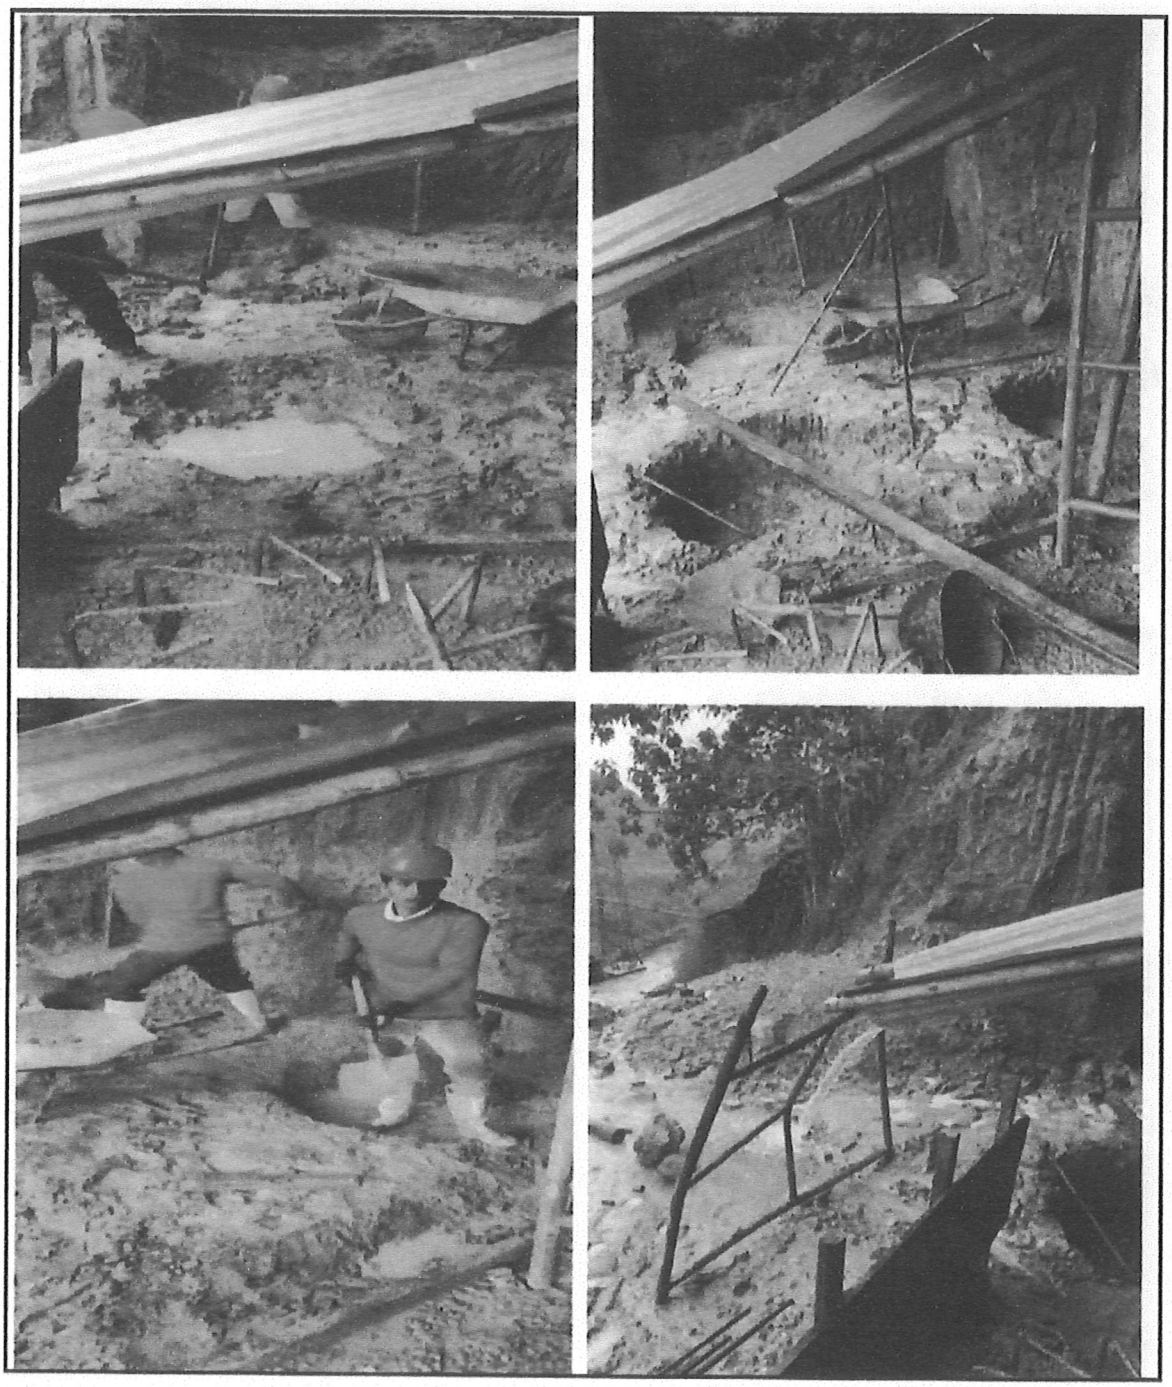

Por tal motivo las condiciones iniciales del contrato deben modificarse de la siguiente manera

PLAZO: el plazo de ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

Esta modificación, no modifica el valor inicial del contrato. Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el interventor considera viable realizar la modificación a ORDEN DE SERVICIOS No 60 de 2022.

Para constancia se firma en NEIVA por quien en ella intervinieron, hoy catorce (14) de marzo de 2023.

TANIA BEATRIZ RENAFIEL ESPAÑA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ
CONTRATISTA DE OBRA

INDICON INGENIERIA S.A.S
R.L. MARIO FERNANDO ESTRADA M.
INTERVENTORÍA

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	14/03/2023

ANEXO 8
OTRO SI No. 3

OTRO SI No. 03 A LA ORDEN DE SERVICIOS Nro. 60 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S NIT: 900.410.655-8
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO - EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL:	$ 527.695.620 M/CTE
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL 1:	VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONAL 2:	VEINTICINCO (25) DIAS
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO
SUSPENSION 1:	11 DE ENERO DE 2023
REINICIACIÒN 1:	26 DE ENERO DE 2023

Entre los suscritos a saber, **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 36.303.858 expedida en Villavieja, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL HUILA, entidad territorial identificada con Nit:

800.103.913-4 en su calidad de Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, nombrada mediante el Decreto Departamental No. 282 de 2022 y Acta de Posesión No 209 del 26 de agosto de 2022, y en ejercicio de la facultad de administrador y ordenador del gasto de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, delegada por el Gobernador mediante el Decreto Departamental No. 259 de 2022, quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** representante legal de **EQUISEVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, quien para efectos del presente Contrato se ha venido denominando **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI No 03** al Contrato de **ORDEN DE SERVICIO No. 60 DE 2022** previas las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el **DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA**, se suscribió el día 14 de octubre de 2022, el contrato de orden de servicio No. 60 de 2022 el cual tiene por objeto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. **2.** Que conforme a lo estipulado en el contrato de Orden de Servicio No. 60 de 2022, el otro si No 01 de 2023 y el otro si No 02 de 2023 el plazo de ejecución del Contrato es TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA ACTA DE INICIO. **3.** Que el día 12 de diciembre de 2022 se suscribió el Acta de Inicio y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecución. **4.** Que conforme al Acta de Justificación No. 03 de 2023, suscrita por la Secretaria de gobierno y desarrollo comunitario, el Contratista y la interventoría, se determinó la oportunidad y conveniencia de modificar las condiciones iniciales del contrato, por las razones allí consignadas; la cual hace parte integral del presente documento. **5.** Que con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente OTRO SI No.03, el cual se rige por las siguientes Clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** que el numeral 2 de la orden de servicios 60 de 2022 quedara así:

OBJETO Y ALCANCE

OBJETO. ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIA DENOMINADA GARZÓN-PARAISO - EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CÓDIGO 45HL03- 1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ALCANCE DEL OBJETO. El Contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas, unidades y cantidades entregadas por EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA, el cual hace parte integral del presente contrato, que se detallarán a continuación. El contratista se obliga para con la entidad a ejecutar el contrato a los precios establecidos en el mencionado documento y con sus propios medios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal) en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación, aceptación y recibo a satisfacción.

CONSTRUCCIÓN DE MURO No. 1 EN CONCRETO REFORZADO										
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, VOLUMENES	M2	40.00	$ 1,400	$ 56,000.00	+	11.30	$ 15,820.00	51.30	$ 7
2	EXPLANACIÓN									
2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000m) ESP. 900-07INV	M3-Km	715.00	$ 1,350	$ 965,250.00	-	-290.40	-$ 392,040.00	424.60	$ 5
2.2	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA A TODO COSTO	M3	143.00	$ 2,271	$ 324,753.00	-	26.84	$ 60,954.00	169.84	$ 3
3	ESTRUCTURA Y DRENAJE									
3.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	110.00	$ 27,672	$ 3,043,920.00	-	-110.00	-$ 3,043,920.00	0.00	
3.2	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	80.00	$ 81,190	$ 6,495,200.00	+	51.87	$ 4,211,325.00	131.87	$ 10,7
3.3	CONCRETO CLASE F (SOLADO 140KG/CM2) PARA SOLADO DE LIMPIEZA Y/O RELLENO FLUIDO	M3	3.40	$ 559,737	$ 1,903,105.80	+	0.70	$ 391,816.20	4.10	$ 2,2
3.4	ACERO DE REFUERZO	Kg	900.00	$ 6,701	$ 6,030,900.00	+	2469.01	$ 16,544,836.00	3369.01	$ 22,5
3.5	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=280 KG/CM2 PARA MURO EN CONCRETO REFORZADO	M3	21.00	$ 932,000	$ 19,572,000.00	+	29.17	$ 27,188,440.00	50.17	$ 46,7
3.6	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	2.50	$ 613,137	$ 1,532,842.50	+	1.93	$ 1,183,354.50	4.43	$ 2,7
5	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO									
5.1	SEÑAL VERTICAL	UND	2.00	$ 301,382	$ 602,764.00	=	0.00	$ 0.00	2.00	$ 6
NP	ITEMS NO PREVISTOS									
NP1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0.00	$ 95,000	$ 0.00	+	4.95	$ 470,250.00	4.95	$ -
NP2	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NT-1600	M2	0.00	$ 6,100	$ 0.00	+	47.50	$ 289,750.00	47.50	$ 2
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PERFORADO	ML	0.00	$ 19,473	$ 0.00	+	21.00	$ 408,933.00	21.00	$
NP4	EXCAVACION MECANICA	M3	0.00	$ 13,437	$ 0.00	+	169.84	$ 2,282,140.00	169.84	$ 2,
SUBTOTAL DIRECTO MURO					$ 40,526,736.30			$ 49,609,659.70		$ 90,
A.I.U 30%					$ 12,158,020.89			$ 14,882,897.41		$ 27,
VALOR OBRA MURO 1					$ 52,684,755.69			$ 64,492,556.11		$ 117,
COSTO CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 4,028,150.00			$ 0.00		$ 4,

CONSTRUCCIÓN DE MURO No. 2 EN CONCRETO REFORZADO

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, VOLUMENES.	M2	88.00	$ 1,400.00	$ 123,200.00		-	-27.20	-$ 38,080.00	60.80	$ 85,120.00
2	EXPLANACIÓN										
2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000+) E.S.P. 900-07/INV	M3-Km	500.50	$ 1,350.00	$ 675,675.00		-	-404.07	-$ 545,494.00	96.43	$ 130,181.00
2.2	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA A TODO COSTO	M3	50.05	$ 2,271.00	$ 113,683.55		+	142.79	$ 324,278.45	192.84	$ 437,940.00
3	ESTRUCTURA Y DRENAJE										
3.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	38.50	$ 27,672.00	$ 1,065,372.00		-	-38.50	-$ 1,065,372.00	0.00	$ 0.00
3.2	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	209.00	$ 81,190.00	$ 16,968,710.00		-	-12.59	-$ 1,022,182.00	196.41	$ 15,946,528.00
3.3	CONCRETO CLASE F (SOLADO 140KG/CM2) PARA SOLADO DE LIMPIEZA Y/O RELLENO FLUIDO	M3	33.00	$ 559,737.00	$ 18,471,321.00		-	-29.27	-$ 16,383,692.00	3.73	$ 2,087,619.00
3.4	ACERO DE REFUERZO (INCLUIDO EL DE LOS CAISSONS)	Kg	16464.0	$ 6,701.00	$ 110,325,264.000		-	-7864.26	-$ 52,688,406.00	8599.74	$ 57,636,858.00
3.5	CAISSONS EN CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1M INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	48.00	$ 2,100,000.00	$ 100,800,000.00		-	-48.00	-$ 100,800,000.00	0.00	$ 0.00
3.6	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1.5M	ML	48.00	$ 790,000.00	$ 37,920,000.00		-	-48.00	-$ 37,920,000.00	0.00	$ 0.00
3.7	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=280 KG/CM2 PARA MURO EN CONCRETO REFORZADO	M3	64.00	$ 932,000.00	$ 59,648,000.00		-	-2.65	-$ 2,656,200.00	61.15	$ 56,991,800.00
3.8	ANCLAJE DE SEIS (6) TORONES INCLUYE PRIMER Y SEGUNDO	ML	20.00	$ 410,000.00	$ 8,200,000.00		-	-20.00	-$ 8,200,000.00	0.00	$ 0.00
3.9	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	20.00	$ 95,000.00	$ 1,900,000.00		-	-20.00	-$ 1,900,000.00	0.00	$ 0.00
3.10	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NT-1600	M2	62.00	$ 6,100.00	$ 378,200.00		-	-14.50	-$ 88,450.00	47.50	$ 289,750.00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 36" EN CONCRETO REFORZADO	ML	3.00	$ 462,984.00	$ 1,388,952.00		=	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,388,952.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS										
NP5	CAISSON EN CONCRETO VACIADO EN SITU, DE DIAMETRO 0.8M INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	0.00	$ 1,680,000.00	$ 0.00		+	72.00	$ 120,960,000.00	72.00	$ 120,960,000.00
NP6	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1M	ML	0.00	$ 526,667.00	$ 0.00		+	72.00	$ 37,920,024.00	72.00	$ 37,920,024.00
NP7	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	0.00	$ 613,137.00	$ 0.00		+	5.51	$ 3,378,385.00	5.51	$ 3,378,385.00
NP8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0.00	$ 95,000.00	$ 0.00		+	4.95	$ 470,250.00	4.95	$ 470,250.00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PERFORADO	ML	0.00	$ 19,473	$ 0.00		+	21.00	$ 408,933.00	21.00	$ 408,933.00
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	0.00	$ 193,253	$ 0.00		+	14.94	$ 2,887,200.00	14.94	$ 2,887,200.00
NP11	EXCAVACION MECANICA	M3	0.00	$ 13,437	$ 0.00		+	192.84	$ 2,591,191.00	192.84	$ 2,591,191.00
NP12	ENTIBADO EN MADERA	M2	0.00	$ 71,259	$ 0.00		+	57.00	$ 4,061,763.00	57.00	$ 4,061,763.00
SUBTOTAL DIRECTO MURO					$ 567,676,397.55				-$ 60,315,663.55		$ 507,662,634.00
A.I.U 20%					$ 107,393,907.27				-$ 15,094,699.27		$ 92,299,808.00
VALOR OBRA MURO 2					$ 466,371,864.82				-$ 66,410,362.82		$ 399,961,502.00
COSTO CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 6,610,680.00				$ 0.00		$ 6,610,680.00
VALOR OBRA (Muro 1 + Muro 2)					$ 616,068,620.71				-$ 817,806.71		$ 617,138,814.00
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (Muro 1 + Muro 2)					$ 9,639,000.00				$ 0.00		$ 9,639,000.00
TOTAL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCION					$ 627,696,620.71				-$ 817,806.71		$ 626,777,814.00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

INDICON INGENIERIA SAS
R.L MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
INTERVENTOR

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

CLÁUSULA SEGUNDA: hace parte integral del presente OTRO SI No 03 el ACTA DE JUSTIFICACION No 03/2023 de la **ORDEN DE SERVICIOS FDGRD No. 60 de 2022** de fecha de 28 de marzo de 2023. **CLÁUSULA TERCERA:** para el perfeccionamiento y legalización del presente OTRO SI No 03, se requiere de las firmas de las partes **CLAUSULA CUARTA - MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO** Quedan vigentes las demás estipulaciones del contrato principal que no hayan sido modificadas o adicionadas por el presente OTRO SI No. 03, las cuales se conservan en su integridad.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, el día 28 de marzo de 2023.

POR EL DEPARTAMENTO:

TANIA BEATRIZ RENAFIEL ESPAÑA
Secretaria de gobierno y desarrollo comunitario

CAMPO_REVISO
Reviso: JOSE LUIS ROJAS
Abogada

POR EL CONTRATISTA:

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
CC: 12.193.284

ACTA DE JUSTIFICACION
No 03 / 2023

X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIO FDGRD	Nº:	60	AÑO:	2022
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S		
	NIT:	900.410.655-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 46 No 16-24, Ofi 705-706	TEL:	8641641-3214860684
	CIUDAD:	NEIVA - HUILA		
	REPRESENTANTE	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284		
	E-MAIL	equiserviciossas@equindustriales.com		
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÒN EN LA VIA DENOMINADA GARZON - PARAISO -EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 45HL03-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No 059 DE 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
VALOR DE CONTRATO:	$ 527.695.620,71 M/CTE			
	Valor en Letras: QUNIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N/A		
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	VEINTE (20) DIAS		

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO ADICIONAL	**No. 2**	VEINTICINCO (25) DIAS	
PLAZO TOTAL:		TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIO:	12/12/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	11/01/2023
		REINICIACIÓN	26/01/2023
FECHA DE ACTA JUSTIFICACIÓN:	28 de marzo de 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		**GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**
	EN CALIDAD DE:		R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S – Contratista de obra
	NOMBRE:		**MARIO FERNANDO ESTRADA**
	EN CALIDAD DE:		R.L. INDICON INGENIERIA SAS – Interventor

En la ciudad de NEIVA, en el despacho de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO del Departamento del Huila, hoy veintiocho (28) de marzo de (2023), se reunieron la Dra. **TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario; El señor **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** representante legal de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S**, como Contratista de obra; y el Ingeniero **MARIO FERNANDO ESTRADA MORA**, Representante Legal de **INDICON INGENIERIA S.A.S**, como Interventoría; con el fin de suscribir la presente Acta de **JUSTIFICACION Nº03.**

Que se realizó en conjunto contratista e interventor, una verificación del presupuesto inicial con los diseños definidos y aprobados encontrándose algunas cantidades mayores y menores y la necesidad de crear ítems nuevos no previstos que son necesarios para la completa y satisfactoria terminación del contrato. Por lo tanto, fue necesario realizar la justificación del presupuesto.

Una vez realizada por parte del contratista e interventoría una revisión detallada de la orden de servicios No 60 se observó que existen errores de digitalización en el presupuesto inmerso en esta orden de servicio. Estos fueron comparados y verificados con el presupuesto realizado por la supervisión por parte de la gobernación encontrando los siguientes errores involuntarios en la transcripción del presupuesto en la orden de servicios No 60.

1. En el presupuesto destinado para el muro 2 se observó que el valor del ítem 3.8 "Anclaje de seis (6) torones incluye primer y segundo" no corresponde al valor destinado por la supervisión al momento de realizar el presupuesto.

2. En el presupuesto destinado para el muro 2 se observó que el ítem 3.9 relleno con material filtrante este no fue incluido durante la transcripción del presupuesto.

Una vez realizada esta verificación se evidencio que para la ejecución de todas las actividades previstas se genera la necesidad de ajustar cantidades y crear ítems nuevos que permitan llevar a cabo la ejecución total de la orden de servicio.

Se anexa presupuesto contractual:

CONSTRUCCIÓN DE MURO No. 1 EN CONCRETO REFORZADO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITAR.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo incluye. Levantamiento topográfico, planos planta perfil, secciones volúmenes.	M2	40,0	$1.400	$56.000
2	EXPLANACIÓN				
2,1	Transporte de material proveniente de excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) ESP. 900-07INV	M3-Km	715,00	$1.350	$965.250
2,2	Conformación de botadero o escombrera a todo costo.	M3	143,00	$2.271	$324.753
3	ESTRUCTURA Y DRENAJE				
3,1	Excavación varias sin clasificar	M3	110.00	$27.672,00	$3.043.920,00
3,2	Relleno para estructura con material seleccionado	M3	80,00	$81,190	$6.495.200,00
3,3	Concreto clase F (Solado 140Kg/Cm2) para solado de limpieza y/o relleno fluido.	M3	3,40	$559.737	$1.903.105,80
3,4	Acero de refuerzo	Kg	900,00	$6.701	$6.030.900,00
3,5	Concreto estructural F'C=280 Kg/CM2 para muro en concreto reforzado	M3	21,00	$932.000	$19.572.000,00
3,6	Construcción de cuneta en concreto de 210 Kg/CM2	M3	2,50	$613.137,00	$1.532.842,50
5	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				
5,1	Señal vertical	UND	2,00	$301.382	$602.764
SUBTOTAL DIRECTO MURO					$40.526.735,30
A.I.U. 30%					$12.158.020,59
VALOR OBRA MURO					$52.684.755,89

CONSTRUCCIÓN DE MURO No. 2 EN CONCRETO REFORZADO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITAR.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo incluye: Levantamiento topográfico, planos planta perfil, secciones volúmenes.	M2	88,0	$1.400	$123.200
2	EXPLANACIÓN				
2,1	Transporte de material proveniente de excavación de	M3-Km	500,50	$1.350	$675.675

	la explanación, cunetas y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) UBP 000 07INV				
2,2	Conformación de botadero o escombrera a todo costo	M3	50,00	$2.271	$113.554,753
3	ESTRUCTURA Y DRENAJE				
3,1	Excavación varias sin clasificar	M3	38,50	$27.672,00	$1.065.372,00
3,2	Relleno para estructura con material seleccionado	M3	209,00	$81.190	$16.968.710,00
3,3	Concreto clase F (Solado 140Kg/Cm2) para solado de limpieza y/o relleno fluido	M3	33,00	$559.737	$18.471.321,00
3,4	Acero de refuerzo (Incluido el de los caissons)	Kg	16.464,00	$6.701	$110.325.264,00
3,5	Caisson en concreto vaciado in situ, de diámetro 1M Incluye excavación (No incluye acero de refuerzo)	Ml	48,00	$2.100.000	$100.800.000,00
3,6	Camisa permanente de diámetro exterior 1,5M	Ml	48,00	$790.000,00	$37.920.000,00
3,7	Concreto estructural F'C=280 Kg/Cm2 para muro en concreto reforzado	M3	64,00	$932.000	$59.648.000,00
3,8	Anclaje de seis (6) torones incluye primer y segundo	Ml	20,00	$95.000,00	$1.900.000,00
3,10	Geotextil de refuerzo tipo NT-1600	M2	62,00	$6.100,00	$378.200,00
5,1	Suministro e instalación de tubería de 30'en concreto reforzado	Ml	3,00	$462.984	$1.388.952
SUBTOTAL DIRECTO MURO					$357.978.357,55
A.I.U. 30%					$107.393.507,27
VALOR OBRA MURO					$465.371.864,82
Costo consultoria estudios y diseños					$5.610.850,00
Valor total muro diseño más obra					470.982.714,82

RESUMEN CONTRATO ESTUDIOS – DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA VIA GARZÓN – PARAISO – RECREO, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO.	
VALOR OBRA (Muro 1 + Muro 2)	$518.056.620,71
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (Muro 1 + Muro 2)	$9.639.000,00
TOTAL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	$527.695.620,71

Tal como menciona la Ing. Beatriz Luna en informe de agosto18 de 2022, para la construcción se anexa presupuesto preliminar, el cual debe ajustarse a las condiciones de diseño final.

Los ITEMS NUEVOS que se anexan al presupuesto inicial son los siguientes: *Relleno con material filtrante, geotextil de refuerzo tipo nt-1600, suministro e instalación de tubería 4" perforado,* Excavación mecánica, *caisson en concreto vaciado en situ, de diámetro 0.8m. incluye excavación (no incluye acero de refuerzo), camisa permanente de diámetro exterior 1m, construcción de cuneta en concreto de 210 kg/cm2, relleno con material filtrante, suministro e instalación de tubería 4" perforado, demolición de estructuras en concreto, Excavación mecánica y Entibado en madera.* Los ítems mencionados

anteriormente son necesarios para garantizar el cumplimento del objeto contractual y suplir las necesidades reales.

ITEM NUEVO No.1

1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	4.95	$95.000	$ 470.250

De acuerdo al diseño estructural para el muro 1 se plantea un filtro francés el cual se utilizará principalmente para evitar que el agua subterránea y superficial penetre o dañe los cimientos de la estructura. Son zanjas recubiertas de geotextil y rellenas de material filtrante, en el que suele haber un conducto inferior de transporte.

ITEM NUEVO No. 2

2	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NT-1600	M2	47.5	$ 6.100	$ 289.750

De acuerdo al diseño estructural para el muro 1 se plantea un filtro francés el cual se utilizará principalmente para evitar que el agua subterránea y superficial penetre o dañe los cimientos de la estructura. Este elemento hace parte de la estructura especificando el recubrimiento general de la tubería perforada y la grava con geotextil NT-1600.

ITEM NUEVO No. 3

3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" PERFORADO	ML	21	$19.473	$ 408.933

De acuerdo al diseño estructural para el muro 1 se plantea un filtro francés el cual se utilizará principalmente para evitar que el agua subterránea y superficial penetre o dañe los cimientos de la estructura. Este elemento es el complemento final de captación de agua planteado con tubería perforada para desagüe de 4" flexible.

ITEM NUEVO No. 4

4	EXCAVACION MECANICA	M3	169.84	$13.437	$2.282.140

Es necesario la creación de este ítem puesto que el precio unitario del ítem 3.1 "Excavaciones varias sin clasificar" corresponde a una excavación de tipo manual; por lo tanto, se ajustan a valores reales.

ITEM NUEVO No. 5

5	CAISSON EN CONCRETO VACIADO EN SITU, DE DIAMETRO 0.8M. INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	72	$1.680.000	$120.960.000

De acuerdo al diseño realizado para cimentar la estructura de contención en el muro 2 se plantea caisson de 80 cms de diámetro y teniendo en cuenta que el ítem contractual esta para un diámetro de 1 mt se modifican las condiciones ajustando su dimensión.

ITEM NUEVO No. 6

6	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1M	MI	72	$526.667	$ 37.920.024

De acuerdo al diseño presentado y aprobado para el muro 2 se plantea una camisa permanente de 1mt de diámetro se decide realizar las modificaciones ajustando su dimensión.

ITEM NUEVO No. 7

7	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	5.51	$613.137	$ 3.378.385

Este ítem se plantea con el propósito de drenar las aguas lluvias en la zona de influencia del muro 2 de contención y las vías, ya que se evidencia de la existencia de una cuneta colapsada el cual necesita ser reconstruida para evitar futuras socavaciones y/o afectaciones a la estructura.

ITEM NUEVO No. 8

8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	4.95	$95.000	$ 470.250

De acuerdo al diseño estructural para el muro 2 se plantea un filtro francés el cual se utilizará principalmente para evitar que el agua subterránea y superficial penetre o dañe los cimientos de la estructura. Este relleno se plantea especificando el recubrimiento de la tubería perforada con grava TM 1".

ITEM NUEVO No. 9

9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PERFORADO	Ml	21	$19.473	$ 408.933

De acuerdo al diseño estructural para el muro 1 se plantea un filtro francés el cual se utilizará principalmente para evitar que el agua subterránea y superficial penetre o dañe los cimientos de la estructura. Son zanjas recubiertas de geotextil y rellenas de material filtrante, en el que suele haber un conducto inferior de transporte. Este elemento es el complemento final de captación de agua planteado con tubería perforada para desagüe de 4" flexible.

ITEM NUEVO No. 10

10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	14.94	$193.253	$ 2.887.200

En visita realizada de obra se evidencio de la presencia de un volumen considerable de escombros en concreto reforzado que impiden con la actividad de excavación para la construcción del muro 2.

ITEM NUEVO No. 11

11	EXCAVACION MECANICA	M3	192.84	$13.437	$ 2.591.191

Es necesario la creación de este ítem puesto que el precio unitario del ítem 3.1 "Excavaciones varias sin clasificar" corresponde a una excavación de tipo manual; por lo tanto, se ajustan a valores reales.

ITEM NUEVO No. 12

12	ENTIBADO EN MADERA	M2	57	$71.259	$ 4.061.763

Es necesario la creación de este ítem debido a las condiciones de riesgos que tendría el talud al momento de realizar las excavaciones ya que estas serían realizadas de forma vertical y estas podrían generar deslizamientos súbitos del talud sin desconocer que las lluvias también generarían este tipo de riegos.

Por tal motivo las condiciones iniciales del contrato deben modificarse de la siguiente manera como aparece en la justificación y como se anexa en el acta de modificación de mayores y menores cantidades.

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTÓN INTEGRADO FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL ó LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Código : DAC-P-1110-F-07 Fecha Aprobación: 29 DE AGOSTO 2012 Versión: 1 Pagina 1 de 1

ACTA DE MODIFICACIÓN

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO		Nº:	60	AÑO:	2022		VALOR CONTRATO:		$ 527,695,620.71	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO		ACTA Nº	1	HOJA	1	DE	1		PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	ESSINSERVICIOS INDUSTRIALES SAS		FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO	PLAZO			
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS				27	3	2023				$ 0.00
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA DENOMINADA GARZON-PARAISO-EL RECREO, IDENTIFICADA CON EL CODIGO 40-LID-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL # 089 del 9 de marzo de 2022, prorrogado mediante decreto # 280 del 7 de septiembre de 2022.		2 MESES	20 DIAS	V.R. TOTAL	
12/dic/2022	Nº 1	11/ene/2023	28/ene/2023								$ 527,695,620.71
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

CONSTRUCCIÓN DE MURO No. 1 EN CONCRETO REFORZADO

	CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, VOLUMENES	M2	40.00	$ 1,400	$ 56,000.00		+	11.50	$ 15,820.00	51.50	$ 71,820.00
2	EXPLANACIÓN										
2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE M.L METROS (1 000m) ESP. 600-07INV	M3-Km	715.00	$ 1,360	$ 965,250.00		-	-290.40	-$ 392,040.00	424.60	$ 573,210.00
2.2	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA A TODO COSTO	M3	143.00	$ 2,271	$ 324,753.00		-	28.84	$ 65,564.00	169.84	$ 386,707.00
3	ESTRUCTURA Y DRENAJE										
3.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	110.00	$ 27,672	$ 3,043,920.00		-	-110.00	-$ 3,043,920.00	0.00	$ 0.00
3.2	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	93.00	$ 61,160	$ 5,685,288.00		+	51.67	$ 4,211,525.00	131.67	$ 10,706,525.00
3.3	CONCRETO CLASE F (SOLADO f'c=2000 KG/CM2) PARA SOLADO DE LIMPIEZA Y/O RELLENO FLUIDO	M3	3.40	$ 680,737	$ 1,903,105.80		+	0.70	$ 301,810.20	4.10	$ 2,204,922.00
3.4	ACERO DE REFUERZO	Kg	600.00	$ 6,701	$ 6,030,900.00		+	2488.01	$ 16,544,606.00	3088.01	$ 22,575,706.00
3.5	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=280 KG/CM2 PARA MURO EN CONCRETO REFORZADO	M3	21.00	$ 932,000	$ 19,572,000.00		+	28.17	$ 27,186,440.00	60.17	$ 46,758,440.00
3.6	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	2.50	$ 613,137	$ 1,532,842.50		+	1.93	$ 1,183,354.50	4.43	$ 2,716,197.00
5	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO										
5.1	SEÑAL VERTICAL	UND	2.00	$ 301,382	$ 602,764.00		=	0.00	$ 0.00	2.00	$ 602,764.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0.00	$ 65,000	$ 0.00		+	4.95	$ 470,250.00	4.95	$ 470,250.00
NP2	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NT-1600	M2	0.00	$ 6,100	$ 0.00		+	47.50	$ 289,750.00	47.50	$ 289,750.00
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PERFORADO	ML	0.00	$ 19,473	$ 0.00		+	21.00	$ 408,933.00	21.00	$ 408,933.00
NP4	EXCAVACION MECANICA	M3	0.00	$ 13,457	$ 0.00		+	169.04	$ 2,282,140.00	169.04	$ 2,282,140.00
SUBTOTAL DIRECTO MURO					$ 40,536,735.30				$ 49,509,658.70		$ 90,136,394.00
A.I.U 30%					$ 12,156,026.59				$ 14,852,897.41		$ 27,040,918.00
VALOR OBRA MURO 1					$ 52,694,755.89				$ 64,362,555.11		$ 117,177,312.00
COSTO CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 4,699,150.00				$ 0.00		$ 4,699,150.00

CONSTRUCCIÓN DE MURO No. 2 EN CONCRETO REFORZADO

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO INCLUYE: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANOS PLANTA PERFIL, SECCIONES, VOLUMENES	M2	80.00	$ 1,498.00	$ 123,200.00	-	-27.20	-$ 38,080.00	80.80	$ 85,120.00
2	EXPLANACIÓN									
2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1 000m) EBP 000-0*M/	M3-Km	500.50	$ 1,350.00	$ 675,675.00	-	-404.07	-$ 545,494.00	96.43	$ 130,181.00
2.2	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA A TODO COSTO	M3	50.05	$ 2,271.00	$ 113,683.55	+	142.78	$ 324,278.41	192.84	$ 437,962.00
3	ESTRUCTURA Y DRENAJE									
3.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	30.50	$ 37,572.00	$ 1,065,372.00	-	-30.50	-$ 1,065,372.00	0.00	$ 0.00
3.2	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	200.00	$ 81,100.00	$ 16,968,710.00	-	-12.59	-$ 1,022,182.00	190.41	$ 15,946,528.00
3.3	CONCRETO CLASE F (SOLADO 140KG/CM2) PARA SOLADO DE LIMPIEZA Y/O RELLENO FLUIDO	M3	33.00	$ 559,737.00	$ 18,471,321.00	-	-20.27	-$ 10,303,502.00	3.73	$ 2,087,819.00
3.4	ACERO DE REFUERZO (INCLUIDO EL DE LOS CAISSONS)	Kg	16464.0	$ 6,701.00	$ 110,325,264.000	-	-7004.26	-$ 52,000,400.00	9460.74	$ 57,626,800.00
3.5	CAISSONS EN CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIAMETRO 1M INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	48.00	$ 2,100,000.00	$ 100,800,000.00	-	-48.00	-$ 100,800,000.00	0.00	$ 0.00
3.6	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1.5M	ML	48.00	$ 790,000.00	$ 37,920,000.00	-	-48.00	-$ 37,920,000.00	0.00	$ 0.00
3.7	CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=280 KG/CM2 PARA MURO EN CONCRETO REFORZADO	M3	84.00	$ 932,000.00	$ 58,848,000.00	-	-2.85	-$ 2,656,200.00	81.15	$ 56,991,800.00
3.8	ANCLAJE DE SEIS (6) TORONES INCLUYE PRIMER Y SEGUNDO	ML	20.00	$ 410,000.00	$ 8,200,000.00	+	+20.00	$ 8,200,000.00	9.00	$ 0.00
3.9	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	20.00	$ 95,000.00	$ 1,900,000.00	-	-20.00	-$ 1,900,000.00	0.00	$ 0.00
3.10	GEOTEXTIL DE REFUERZO TIPO NT-1000	M2	62.00	$ 6,100.00	$ 378,200.00	-	-14.50	-$ 88,450.00	47.50	$ 289,750.00
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 30" EN CONCRETO REFORZADO	ML	3.00	$ 462,984.00	$ 1,388,952.00	=	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,388,952.00
NP	ITEMS NO PREVISTOS									
NP5	CAISSON EN CONCRETO VACIADO EN SITU DE DIAMETRO 0.8M INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	0.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	+	72.00	$ 120,960,000.00	72.00	$ 120,960,000.00
NP6	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1M	ML	0.00	$ 528,067.00	$ 0.00	+	72.00	$ 37,920,024.00	72.00	$ 37,920,024.00
NP7	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 210 KG/CM2	M3	0.00	$ 613,137.00	$ 0.00	+	5.51	$ 3,378,385.00	5.51	$ 3,378,385.00
NP8	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0.00	$ 95,000.00	$ 0.00	+	4.95	$ 470,250.00	4.95	$ 470,250.00
NP9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PERFORADO	ML	0.00	$ 19,479	$ 0.00	+	21.00	$ 408,933.00	21.00	$ 408,933.00
NP10	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	0.00	$ 193,253	$ 0.00	+	14.94	$ 2,887,200.00	14.94	$ 2,887,200.00
NP11	EXCAVACION MECANICA	M3	0.00	$ 13,437	$ 0.00	+	192.84	$ 2,591,191.00	192.84	$ 2,591,191.00
NP12	ENTIBADO EN MADERA	M2	0.00	$ 71,250	$ 0.00	+	57.00	$ 4,061,703.00	57.00	$ 4,061,703.00
SUBTOTAL DIRECTO MURO					$ 367,978,307.55			-$ 50,311,683.59		$ 307,662,684.00
A.I.U 30%					$ 107,393,507.27			-$ 15,094,698.27		$ 92,298,809.00
VALOR OBRA MURO 2					$ 465,371,864.82			-$ 65,410,382.83		$ 399,961,482.00
COSTO CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 5,010,000.00			$ 0.00		$ 5,010,000.00
VALOR OBRA (Muro 1 + Muro 2)					$ 518,058,020.71			-$ 917,006.71		$ 517,138,014.00
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS (Muro 1 +Muro 2)					$ 9,639,000.00			$ 0.00		$ 9,639,000.00
TOTAL CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCION					$ 527,695,020.71			-$ 917,006.71		$ 526,777,014.00

Se anexa acta de modificación de obra, tener en cuenta que, al realizar la creación de los nuevos ítems, no aumenta el valor inicial del contrato. Por lo anterior mencionado el Departamento, el Contratista y el Interventor consideran viable realizar la modificación a ORDEN DE SERVICIO No. 60 de 2022.

Para constancia se firma en NEIVA por quien en ella intervinieron, hoy veintiocho (28) de marzo de 2023.

TATIANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L. GUSTAVO ERNESTO **RODRIGUEZ**
CONTRATISTA **DE OBRA**

INDICON INGENIERIA S.A.S
R.L. MARIO FERNANDO ESTRADA M.
INTERVENTORÍA

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	28/03/2023

Revisó Interventoría

ANEXO 9
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DIC 2022 A ABRIL 2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25353113	E	2023-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.655.200	125.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
65	25353113	2023-01-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IVG	INET	LMA	TDE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDCL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 96332224	ALVAREZ CORTES JHON FREY	1.450.000	F		X							X								0		15	15	15	15	PORVENIR-230301	948.541	151.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	948.541	38.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.368.333	94.800	948.541	66.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	350.700	S	5429001
2	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
3	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
4	CC 1075208495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.320.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.320.000	211.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.320.000	52.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.320.000	52.800	1.320.000	6.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	323.700	S	5429001
5	CC 1129994682	BARRAGAN ALDANA FABIAN ARLEXIS	1.000.000	F		X															0		10	10	10	10	PORVENIR-230301	333.334	53.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	333.334	13.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	413.899	16.600	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	106.700	S	5429001
6	CC 1077632206	BRAHAM RIVAS YERSON REILER	1.000.000	F		X															0		15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	551.389	22.100	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	156.900	S	5429001
7	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.600.000	F									X								0		0	30	30	30	NINAFP-NINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.351.041	54.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.351.041	54.100	1.351.041	94.100	0,06960	0	0	0	0	0	03	5	202.300	S	5429001
8	CC 12260989	CALDERON RIVERA JORGE	1.000.000	F	X																0		12	12	12	12	PORVENIR-230301	400.000	64.000	0	0	SANITAS-EPS005	400.000	16.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	400.000	16.000	400.000	27.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	123.900	S	5429001
9	CC 1075283803	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.300.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	5429001
10	CC 43154874	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.000.000	F									X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.010.417	161.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.010.417	40.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.010.417	40.500	1.010.417	70.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	313.100	S	5429001
11	CC 12120162	CESPEDES CRUZ OSMAR EDUARDO	1.400.000	F	X								X								0		0	15	15	15	NINAFP-NINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	714.583	28.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	714.583	28.600	714.583	49.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	107.000	S	5429001
12	CC 1013893807	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.000.000	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.162.500	186.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.162.500	46.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.162.500	46.500	1.162.500	81.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	360.000	S	5429001
13	CC 1075279844	CHARRY ANDRADE NATALIA ALEJANDRA	1.400.000	F									X								0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.599.791	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.599.791	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.599.791	64.000	1.599.791	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
14	CC 55172446	CHAVEZ RIVERA SANDRA GICELLA	1.600.000	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
15	CC 1075318459	CLEVES GONZALEZ SANTIAGO	1.400.000	F		X							X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.677.812	268.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.677.812	67.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.778.923	71.200	1.677.812	116.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	523.700	S	5429001
16	CC 1113652340	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
17	CC 83962871	CORTES ASTUDILLO HERNAN	1.000.000	F	X																0		1	1	1	1	COLFONDOS-231001	33.334	5.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	33.334	1.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	61.112	2.500	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	11.700	S	5429001
18	CC 55179280	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	1.600.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
19	CC 7729393	FERRO ALDANA JHON JESUS	1.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
20	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000		F						X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.926.303	308.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.926.303	77.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.926.303	77.100	1.926.303	134.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	596.600	S	5429001
21	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	22.500	22.500	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.438.200	S	5429001
22	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.200.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
23	CC 83169239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.185.937	189.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.185.937	47.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.185.937	47.500	1.185.937	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5429001
24	CC 1075710139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.600.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.130.209	180.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.130.209	45.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.130.209	45.300	1.130.209	78.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	350.200	S	5429001
25	CC 1083872554	HEREDIA ROJAS FERLEY	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.043.750	167.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.043.750	41.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.043.750	41.800	1.043.750	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	423.300	S	5429001
26	CC 1075540804	LASSO ESQUIVEL JOHN JAIRO	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.664.272	266.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.664.272	66.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.664.272	66.600	1.664.272	115.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	515.400	S	5429001
27	CC 1079412617	LEIVA CUMBE YERLY MAIRETH	1.600.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
28	CC 1075292695	LOZADA ALAPE LEIDY JOHANA	1.400.000		F	X							X							0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	1.284.792	205.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.284.792	51.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.284.792	51.400	1.284.792	89.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	397.900	S	5429001
29	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.679.167	268.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.679.167	67.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.679.167	67.200	1.679.167	116.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	520.000	S	5429001
30	CC 83221604	MEDINA TORRES EDSON CHRISTOPHER	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.355.208	216.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.355.208	54.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.355.208	54.300	1.355.208	94.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	419.900	S	5429001
31	CC 79680911	MORILLO GALVAN FERLIS JOSE	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-34CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
32	CC 10941174	MORILLO GALVAN FLORENCIO ANTONIO	1.000.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-34CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
33	CC 73550818	MURILLO GARCIA JOHN JAIRO	1.000.000		F		X													0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	534.722	21.400	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	156.200	S	5429001
34	CC 83243697	MUÑOZ MORA FABIER	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.172.396	187.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.172.396	46.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.172.396	46.900	1.172.396	81.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	363.000	S	5429001
35	CC 1075257607	NARVAEZ GUIO LAURA VICTORIA	1.400.000		F	X														0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	186.667	29.900	0	0	SANITAS-EPS005	186.667	7.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	186.667	7.500	186.667	13.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	57.900	S	5429001
36	CC 8438644	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.662.917	266.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.662.917	66.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.662.917	66.600	1.662.917	115.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	515.100	S	5429001
37	CC 17653643	OROZCO RIVAS JAIR	1.000.000		F	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	244.445	9.800	66.667	4.730	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	27.900	S	5429001
38	CC 1075257554	PANIAGUA ABELLO MANUEL HORACIO	1.000.000		F	X							X							0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	610.417	97.700	0	0	SANITAS-EPS005	610.417	24.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	610.417	24.500	610.417	42.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	189.200	S	5429001
39	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.000.000		F								X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.222.917	355.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.222.917	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.222.917	89.000	2.222.917	154.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.500	S	5429001
40	CC 1084578837	PAZ ZUÑIGA DINON ARNULFO	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
41	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.400.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.821.458	291.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.821.458	72.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.821.458	72.900	1.821.458	126.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	564.100	S	5429001
42	CC 7716816	PERDOMO GUTIERREZ JOSE ALIRIO	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.782.084	285.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.782.084	71.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.782.084	71.300	1.782.084	124.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	551.900	S	5429001
43	CC 73121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.937	189.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.185.937	47.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.185.937	47.500	1.185.937	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5429001
44	CC 7731714	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.363.438	378.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.363.438	94.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.363.438	94.600	2.363.438	164.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	731.900	S	5429001
45	CC 19710807	PUTO CASTILLO JOHANDRI JOSE	1.100.000		F	X							X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	957.918	153.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	957.918	38.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.042.640	81.800	957.918	66.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	5429001
46	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
47	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD				RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
48	CC 1075.800301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.400.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.828.749	292.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.828.749	73.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.828.749	73.200	1.828.749	127.360	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	566.300	S	5429001
49	CC 1075246470	REYES GONZALEZ WILLIAM RICARDO	1.000.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
50	CC 7689428	REYES RAMIREZ YAIR	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.251.041	200.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.251.041	50.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.251.041	50.100	1.251.041	87.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	387.500	S	5429001
51	CC 1012507854	RODRIGUEZ AGUILLON GABRIEL EDUARDO	4.000.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	20.000	20.000	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR-CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.020.900	S	5429001
52	CC 12193284	RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO	9.000.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	9.000.000	1.440.000	45.000	45.000	SANITAS-EPS005	9.000.000	360.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	9.000.000	360.000	9.000.000	47.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.297.000	S	5429001
53	CC 1003805522	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.232.292	197.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.232.292	49.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.232.292	49.300	1.232.292	85.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	323.600	S	5429001
54	CC 7728653	ROJAS OLAYA JUAN DE LA CRUZ	1.300.000		F	X							X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-241001	1.607.396	257.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.607.396	64.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.733.785	69.400	1.607.396	111.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	502.800	S	5429001
55	CC 7730705	ROJAS QUINTERO ROBERT REINALDO	2.100.000		F	X														0			18	18	18	18	PORVENIR-230401	1.260.000	201.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S	5429001
56	CC 12119056	ROMERO SEGURA LUIS ALBERTO	1.400.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
57	CC 83169849	RUIZ WILLINTON RAUL	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.792	275.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.792	68.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.719.792	68.800	1.719.792	119.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	532.500	S	5429001
58	CC 1007829093	RUIZ COGOLLO EDWIN JOSE	1.000.000		F	X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	300.000	12.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	351.389	14.100	300.000	20.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.000	S	5429001
59	CC 1024574168	SALAZAR PUENTES LUIS MIGUEL	1.000.000		F	X														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	366.667	58.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	366.667	14.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	366.667	14.700	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	113.700	S	5429001
60	CC 1007465605	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.300.000		F								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.645.312	263.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.645.312	65.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.645.312	65.900	1.645.312	114.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	509.700	S	5429001
61	CC 1075242790	SANTOS PERDOMO INGRID YICED	2.500.000		F	X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	5.760.417	230.500	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	904.500	S	5429001
62	CC 1014205737	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMPENSAR-CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
63	CC 19318003	SUAREZ HERNANDO	1.300.000		F	X							X							0			0	22	22	22	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	980.417	39.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.142.917	45.800	980.417	68.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	153.400	S	5429001
64	CC 1004063206	SUAZA VANEGAS YANCARLOS	1.000.000		F	X														0			3	3	3	3	PORVENIR-230401	100.000	16.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	100.000	4.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	116.056	4.800	100.000	7.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	31.800	S	5429001
65	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.232.291	197.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.-EPS041	1.232.291	49.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.232.291	49.300	1.232.291	85.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	381.600	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	8	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25353113	E	2023-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.655.200	125.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
65	25353113		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
90.731.723	93.777.764	93.777.764	100.374.363	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				62	14.693.400	0	66.900	0	14.760.300
PROTECCION	230201	800229739	0	18	4.809.100	0	21.800	0	4.830.900
PORVENIR	230301	800224808	8	29	5.821.500	0	26.500	0	5.848.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	2.898.900	0	13.300	0	2.912.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	7	1.163.900	0	5.300	0	1.169.200
EPS(Administradoras: 6)				65	3.752.900	0	17.200	0	3.770.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	54.700	0	300	0	55.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	7	319.900	0	1.500	0	321.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	30	1.463.100	0	6.600	0	1.469.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	21	1.664.800	0	7.600	0	1.672.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	210.400	0	1.000	0	211.400
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	40.000	0	200	0	40.200
ARP(Administradoras: 1)				65	5.066.600	0	22.900	0	5.089.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	65	5.066.600	0	22.900	0	5.089.500
CCF(Administradoras: 3)				65	4.017.000	0	18.300	0	4.035.300
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	208.000	0	1.000	0	209.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	120.000	0	600	0	120.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	60	3.689.000	0	16.700	0	3.705.700
Gran Total					27.529.900	0	125.300	0	27.655.200

Empresa: EQUISERVICIOS SAS **Nit:** 900410655
Usuario: DELFA QUINTERO QUINTERO

21 de Enero de 2023 2:27:53 PM
Dirección IP: 190.158.94.108

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: sábado, 21 de enero de 2023 - 2:03 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	DQ2019
Fecha _ hora:	2023-01-17 14:30:11
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	ASOPAGOS
Número de factura:	25353113
Identificación del contribuyente:	10.10.11.80
Concepto:	NIT
Razón Social:	900410655
Descripción del pago:	Pago de seguridad Social Integrado
Valor a pagar:	$27,655,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2023-01-17 14:32:52
Cuenta a debitar:	454-232850-50
Número de comprobante:	0000020746
Id usuario aprobador:	GERE14

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25636112	E	2023-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.770.300	106.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
79	25636112	2023-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	ARPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonio de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 96032224	ALVAREZ CORTES JHON FREY	1.450.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.305.000	208.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.305.000	52.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.305.000	52.200	1.305.000	90.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	404.100	S	5429001
2	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
3	CC 7714939	ARDILA CALDERON JUAN CARLOS	1.800.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.620.000	259.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.620.000	64.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.620.000	64.800	1.620.000	112.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	501.600	S	5429001
4	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
5	CC 1075268495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.460.000	F						X										0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	58.400	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
6	CC 1066349410	BARRIOS VANEGAS VICTOR ALFONSO	1.400.000	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	140.000	22.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	140.000	5.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	140.000	5.600	140.000	9.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	5429001
7	CC 12190292	BENAVIDES LUGO FERNANDO	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
8	CC 12195718	BENAVIDES LUGO JORGE	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
9	CC 12194360	BENAVIDES LUGO JOSE JAVIER	1.160.000	F	X															0			13	13	13	13	COLPENSION-ES-25-14	502.667	80.500	0	0	SANITAS-EPS005	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.900	S	5429001
10	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.160.000	F																0			0	13	13	13	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	75.400	S	5429001
11	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.160.000	F													X			0			0	17	17	17	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	5	52.600	S	5429001
12	CC 19306323	CALDERON CALDERON EFRAIN	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	COLPENSION-ES-25-14	657.334	105.200	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5429001
13	CC 12200989	CALDERON RIVERA JORGE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
14	CC 12128984	CALLEJAS BASTOS ISAAC	2.300.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION-ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
15	CC 1075283603	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.460.000	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	58.400	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
16	CC 12122227	CASTAÑEDA MUÑOZ FRANCISCO	1.450.000	F	X															0			11	11	11	11	COLPENSION-ES-25-14	531.667	85.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	531.667	21.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	531.667	21.300	531.667	37.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	164.800	S	5429001
17	CC 43156874	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
18	CC 12120162	CESPEDES CRUZ OMAR EDUARDO	1.450.000	F							X		X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.573.958	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.573.958	63.000	1.573.958	109.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	235.600	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IKG	RET	TDE	TAE	TEP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
19	CC 1003893807	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
20	CC 1075279844	CHARRY ANDRADE NATALIA ALEJANDRA	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
21	CC 55172446	CHAVEZ RIVERA SANDRA LUCELLA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
22	CC 83225779	CLAROS CABRERA JOSE OTAIN	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
23	CC 1113652340	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
24	CC 55179280	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5924001
25	CC 7720393	FIERRO ALDANA JHON JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
26	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.707.032	273.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.707.032	68.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.707.032	68.300	1.707.032	118.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	528.700	S	5429001
27	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.393.200	S	5429001
28	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
29	CC 17711204	GONZALEZ CALLEJAS ABELARDO	1.400.000	F	X															0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	280.000	44.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	280.000	11.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	280.000	11.200	280.000	19.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	86.700	S	5429001
30	CC 83166239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
31	CC 1006093118	GUZMAN ASCENCIO JAIDER MAURICIO	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
32	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.160.000	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.178.125	188.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
33	CC 1083872554	HEREDIA ROJAS YERLEY	1.160.000	F								X								0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.178.125	188.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
34	CC 1075320940	IBARRA PENAGOS GABRIELA	1.400.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.260.000	201.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	398.100	S	5429001
35	CC 1075540804	LASSO ESQUIVEL JOHN JAIRO	1.400.000	F					X		X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.540.156	246.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.540.156	61.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.540.156	61.700	1.540.156	107.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	477.100	S	5429001
36	CC 1079412617	LEIVA CUMBE YERLY MAIRETH	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.268.687	90.800	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	522.200	S	5429001
37	CC 96331839	LEON VARGAS JULICER	1.160.000	F	X															0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0	0	EPS-S MALLAMAS-EPSI05	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
38	CC 1075304381	LOPEZ CORTES LUIS FELIPE	1.450.000	F	X															0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.353.334	216.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.353.334	54.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.353.334	54.200	1.353.334	94.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	419.200	S	5429001
39	CC 1075232695	LOZADA ALAPE LEIDY JOHANA	1.400.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.523.958	243.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.523.958	61.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.523.958	61.000	1.523.958	106.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	472.000	S	5429001
40	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.400.000	F							X		X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.469.271	235.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.469.271	58.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.469.271	58.800	1.469.271	102.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	455.000	S	5429001
41	CC 83221604	MEDINA TORRES EDSON CHRISTOPHER	1.160.000	F		X														0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	618.667	99.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.096.445	43.900	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	210.800	S	5429001
42	CC 1077872606	MENDEZ PALACIO NICOLAS	1.680.000	F	X															0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	1.066.667	170.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.066.667	42.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.066.667	42.700	1.066.667	74.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	330.400	S	5429001
43	CC 12139977	MONJE CHALA MICHEL	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	464.000	74.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	464.000	18.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5429001
44	CC 79680911	MORILLO GALVAN FERLIS JOSE	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	580.000	92.800	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	580.000	23.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.021.134	40.900	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	197.300	S	5429001
45	CC 10941174	MORILLO GALVAN FLORENCIO ANTONIO	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	580.000	92.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	580.000	23.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.021.134	40.900	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	197.300	S	5429001
46	CC 12188076	MUÑOZ ARCENIO	1.160.000	F	X															0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
47	CC 83223697	MUÑOZ MORA FABER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001

	EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CC			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	IRT	TDE	TAE	TEP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	APL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Ecónomica
48	CC 1075257007	NARVAEZ GUIO LAURA VICTORIA	1.400.000		F														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5829001
49	CC 6119105	OCAMPO OBANDO ULDIVIER DE JESUS	1.160.000		F	X													0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	464.000	74.300	0	0	SANITAS-EPS005	464.000	18.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5829001
50	CC 8438644	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.400.000		F							X		X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.449.625	230.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.449.625	57.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.449.625	57.700	1.449.625	100.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	446.200	S	5829001
51	CC 1075257554	PANIAGUA ABELLO MANUEL HORACIO	1.160.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5829001
52	CC 79500020	PARRA TOVAR WILSON REINALDO	2.500.000		F	X													0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	2.333.334	373.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.333.334	93.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.333.334	93.400	2.333.334	12.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	572.400	S	5829001
53	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.000.000		F														0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5829001
54	CC 1084578337	PAZ ZUÑIGA DIXON ARNULFO	1.160.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5829001
55	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.450.000		F						X		X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.630.833	261.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.630.833	65.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.630.833	65.300	1.630.833	113.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	505.200	S	5829001
56	CC 7716816	PERDOMO GUTIERREZ JOSE ALIRIO	1.400.000		F						X		X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.605.834	257.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.605.834	64.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.605.834	64.300	1.605.834	111.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	497.400	S	5829001
57	CC 73121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.160.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5829001
58	CC 7731714	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000		F									X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.865.625	298.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.865.625	74.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.865.625	74.700	1.865.625	129.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	577.800	S	5829001
59	CC 19710887	PUPO CANTILLO JOHANDRI JOSE	1.160.000		F	X													0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	541.334	86.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	541.334	21.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.800	S	5829001
60	CC 76294608	QUINAYAS QUINAYAS RUBER	1.160.000		F	X													0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	38.667	6.280	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	2.700	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5829001
61	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000		F														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5829001
62	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5829001
63	CC 1075300301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.450.000		F							X		X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.633.073	261.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.633.073	65.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.633.073	65.400	1.633.073	113.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	505.800	S	5829001
64	CC 1075246470	REYES GONZALEZ WILLIAM RICARDO	1.160.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5829001
65	CC 7689428	REYES RAMIREZ YAIR	1.160.000		F														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5829001
66	CC 1032507854	RODRIGUEZ AGUILLON GABRIEL EDUARDO	4.000.000		F														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR-CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	980.900	S	5829001
67	CC 1007392888	RODRIGUEZ CARVAJAL DIEGO ALEJANDRO	1.700.000		F	X	X												0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	680.000	108.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	680.000	27.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	708.333	28.300	680.000	47.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	211.800	S	5829001
68	CC 12195284	RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO	9.000.000		F														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	9.000.000	1.440.000	45.000	45.000	SANITAS-EPS005	9.000.000	360.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	9.000.000	360.000	9.000.000	47.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.297.600	S	5829001
69	CC 1003805525	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.160.000		F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.178.125	188.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5829001
70	CC 7730705	ROJAS QUINTERO ROBERT REINALDO	2.100.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5829001
71	CC 1077837747	ROMERO HENAO CAMILO ANDRES	1.800.000		F	X													0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.140.000	182.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.140.000	45.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.140.000	45.600	1.140.000	79.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.000	S	5829001
72	CC 12119056	ROMERO SEGURA LUIS ALBERTO	1.400.000		F		X												0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	513.334	82.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	513.334	20.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	688.334	27.600	513.334	35.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	166.200	S	5829001
73	CC 83169849	RUIZ WILLINTON RAUL	1.400.000		F							X		X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.592.292	254.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.592.292	63.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.592.292	63.700	1.592.292	110.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.100	S	5829001
74	CC 1024574168	SALAZAR PUENTES LUIZ MIGUEL	1.160.000		F														0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5829001
75	CC 1007465405	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.400.000		F							X		X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.516.667	242.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.516.667	60.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.516.667	60.700	1.516.667	105.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.700	S	5829001

EMPLEADO					NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSN	FNDSP	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
76	CC 12109374	SERRANO PEREZ JAVIER	1.160.000		F	X														0	0		0	5	5	5	SINAFP-SINAFP	0	0	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	29.100	S	5429001
77	CC 1014205737	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMPENSAR -CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
78	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.160.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.172.083	187.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.172.083	46.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.172.083	46.900	1.172.083	81.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	363.000	S	5429001
79	CC 7719481	VARGAS SANDOVAL JULIO CESAR	1.160.000		F	X														0			17	17	17	17	PROTECCION-230201	657.334	105.200	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5429001
80	CC 79940691	ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	1.160.000		F	X														0			14	14	14	14	COLPENSION 25-25-14	541.334	86.700	0	0	SANITAS-EPS005	541.334	21.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.800	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1		CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25636112	E	2023-02-16	TODOS-LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.770.300	106.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
79	25636112		Pagada							


TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
99.211.167	102.138.460	102.138.460	104.370.566	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				76	15.965.300	0	57.000	0	16.022.300
PROTECCION	230201	800229739	0	22	4.828.100	0	17.200	0	4.845.300
PORVENIR	230301	800224808	8	32	6.683.600	0	23.800	0	6.707.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	17	3.315.300	0	11.900	0	3.327.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.138.300	0	4.100	0	1.142.400
EPS(Administradoras: 7)				79	4.087.600	0	14.900	0	4.102.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	31	1.949.300	0	7.000	0	1.956.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	8	336.700	0	1.200	0	337.900
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	1.600	0	100	0	1.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	32	1.485.000	0	5.300	0	1.490.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	92.800	0	400	0	93.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	199.000	0	800	0	199.800
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	23.200	0	100	0	23.300
ARP(Administradoras: 1)				79	5.434.100	0	19.300	0	5.453.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	79	5.434.100	0	19.300	0	5.453.400
CCF(Administradoras: 3)				79	4.177.100	0	15.000	0	4.192.100
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	208.000	0	800	0	208.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	74	3.840.900	0	13.700	0	3.854.600
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	128.200	0	500	0	128.700
Gran Total					29.664.100	0	106.200	0	29.770.300

Comprobante

de pago en línea

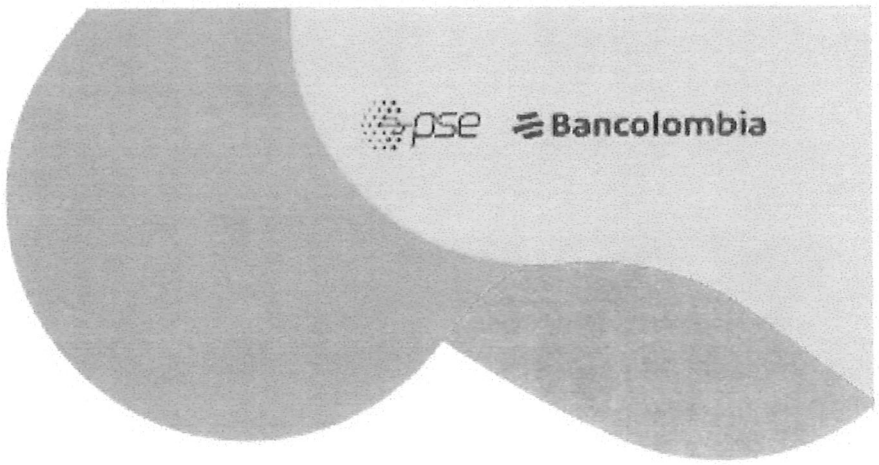

ASOPAGOS

Pago realizado por: DELFA QUINTERO QUINTERO

Nro. de recibo: 25636112

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: NIT

Razón Social: 900410655

Fecha y hora de la transacción: Jueves 16 de Febrero de 2023 03:31:07 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 29,770,300.00

Cuenta: *******5050

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641041		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÒN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25906076	E	2023-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.814.900	126.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109	25906076	2023-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
2	CC 7714939	ARDILA CALDERON JUAN CARLOS	1.800.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.062.500	330.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.062.500	82.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.062.500	82.500	2.062.500	143.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	638.600	S	5429001
3	CC 4943816	AROCA VERA GONZALO	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	386.667	61.900	0	0	EPS-S.A.I.C DE CAUCA-EPSIC3	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	27.000	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5429001
4	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
5	CC 1075208495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.460.000	F																0			30	30	35	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	7.700	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
6	CC 1077872723	BENAVIDES CASTILLO ELIANA CONSTANZA	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
7	CC 12190292	BENAVIDES LUGO FERNANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
8	CC 12195711	BENAVIDES LUGO JORGE	1.160.000	F		X														0			17	17	17	17	PROTECCION-230201	657.334	105.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	692.778	27.800	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	205.100	S	5429001
9	CC 12194360	BENAVIDES LUGO JOSE JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
10	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.160.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFT-SINAFT	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.326.750	53.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.326.750	92.900	1.326.750	92.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	198.600	S	5429001
11	CC 1077860855	CABRERA OSPINA YESSICA LEANDRA	1.160.000	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	618.667	99.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	618.667	43.100	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	191.700	S	5429001
12	CC 19306323	CALDERON CALDERON EFRAIN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
13	CC 12200989	CALDERON RIVERA JORGE	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.634.875	261.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.634.875	65.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.634.875	113.800	1.634.875	113.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	506.200	S	5429001
14	CC 12128984	CALLEJAS BASTOS ISAAC	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5429001
15	CC 1082885413	CAMPOS GARZON MAICOL SMITH	1.160.000	F	X	X														0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	618.667	99.000	0	0	SANITAS-EPS005	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	644.445	25.800	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	192.700	S	5429001
16	CC 1075283803	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.460.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	730.000	116.800	0	0	SANITAS-EPS005	730.000	29.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.265.671	50.700	730.000	3.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	200.600	S	5429001
17	CC 1080180651	CASANOVA MANJARREZ JAVIER	1.160.000	F	X															0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	270.667	43.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	270.667	10.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	270.667	18.900	270.667	18.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
18	CC 12122227	CASTAÑEDA MUÑOZ FRANCISCO	1.450.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	101.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			C			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VCT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPIST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
19	CC 43154674	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.160.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.178.125	188.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
20	CC 12120162	CESPEDES CRUZ OMAR EDUARDO	1.450.000	F								X								0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.904.635	76.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.904.635	76.200	1.904.635	132.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	285.000	S	5429001
21	CC 1003893807	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.160.000	F	X							X								0			16	16	16	16	COLPENSION-ES-25-14	654.917	104.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	654.917	26.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	867.584	34.800	654.917	45.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	211.400	S	5429001
22	CC 83225779	CLAROS CABRERA JOSE OTAIN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
23	CC 1084899610	CLAROS RODRIGUEZ ERMINSON FABIAN	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
24	CC 1084900110	CLAROS RODRIGUEZ JOSE OTAIN	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
25	CC 1113652340	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
26	CC 1075246432	CORTES PINTO YEINSON	1.400.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	653.334	104.600	0	0	SANITAS-EPS005	653.334	26.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	653.334	26.200	653.334	45.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	202.500	S	5429001
27	CC 93343524	CRUZ CENON	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	COLFONDOS-231001	928.000	148.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
28	CC 1075281720	DAZA MALLUNGO NOFAR FERNANDO	1.860.000	F	X							X								0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	868.000	138.900	0	0	SANITAS-EPS005	868.000	34.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	868.000	34.800	868.000	60.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	269.000	S	5429001
29	CC 12197855	ESCOBAR LAMILLA ALEXANDER	1.160.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5429001
30	CC 1077852171	ESCOBAR LEMUS DUVAN ARLED	1.160.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5429001
31	CC 4943400	ESQUIVEL TRUJILLO EDGAR	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSION-ES-25-14	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
32	CC 7729393	FIERRO ALDANA JHON JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	SUSUBSIDIO-CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
33	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	50.000	8.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	50.000	2.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.402.083	56.100	50.000	3.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	69.600	S	5429001
34	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.393.200	S	5429001
35	CC 1006527590	GARCIA RAMIREZ CAMILO HUMBERTO	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
36	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.200.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	600.000	24.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	664.167	26.600	600.000	3.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	149.800	S	5429001
37	CC 17711204	GONZALEZ CALLEJAS ABELARDO	1.400.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.557.500	249.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.557.500	62.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.557.500	62.300	1.557.500	108.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	482.300	S	5429001
38	CC 83169239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.160.000	F								X								0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.416.959	226.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.416.959	56.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.416.959	56.700	1.416.959	98.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	438.900	S	5429001
39	CC 1006093118	GUZMAN ASCENCIO JAIDER MAURICIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
40	CC 1082805124	GUZMAN MURCIA CARLOS YEVINSON	1.160.000	F	X	X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	201.390	8.100	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.400	S	5429001
41	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.160.000	F											X					0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	154.667	24.800	0	0	SANITAS-EPS005	154.667	6.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	154.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	31.000	S	5429001
42	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.160.000	F		X							X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	455.542	72.900	0	0	SANITAS-EPS005	455.542	18.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	721.375	28.900	455.542	31.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	151.900	S	5429001
43	CC 1083872554	HEREDIA ROJAS FERLEY	1.160.000	F		X						X								0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	636.792	101.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	636.792	25.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	936.459	37.500	636.792	44.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	209.300	S	5429001
44	CC 12131701	HERNANDEZ VALENZUELA MARIO	3.000.000	F	X							X								0			14	14	14	14	COLPENSION-ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
45	CC 1075320590	IBARRA PENAGOS GABRIELA	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
46	CC 1079412617	LEIVA CUMBE YERLY MAIRETH	1.600.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	53.334	8.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	53.334	2.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	720.001	28.900	53.334	3.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	43.500	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
47	CC 96331839	LEON VARGAS ELICER	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	580.000	92.800	0	0	EPS-S MALLAMAS-EPSIC5	580.000	23.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	604.167	24.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	189.600	S	5429001
48	CC 1075304381	LOPEZ CORTES LUIS FELIPE	1.450.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.713.959	274.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.713.959	68.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.713.959	68.600	1.713.959	119.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	530.200	S	5429001
49	CC 1080293875	LOSADA SALAZAR KLISMAN	1.160.000	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	502.667	80.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.900	S	5429001
50	CC 1075232695	LOZADA ALAPE LEIDY JOHANA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.020.521	323.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.020.521	80.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.020.521	80.900	2.020.521	140.700	0,06960	0	0	0	0	0	02	0	625.800	S	5429001
51	CC 1082804720	LUGO PERDOMO JOSETH	1.160.000	F	X															0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	773.334	123.800	0	0	SANITAS-EPS005	773.334	31.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	773.334	31.000	773.334	53.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	239.700	S	5429001
52	CC 1007404732	MAGE ALVARADO ALBEIRO	1.160.000	F	X															0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	232.000	37.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	232.000	9.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.900	S	5429001
53	CC 1118022632	MANQUILLO DUCUARA EDINSON	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
54	CC 1118022237	MANQUILLO OLIVEROS OCLIDES	1.160.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	232.000	37.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	232.000	9.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.900	S	5429001
55	CC 1081392947	MANRIQUE POLANCO JUAN CAMILO	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
56	CC 1081732952	MARTINEZ GONZALEZ DILFREDO	1.160.000	F	X															0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	425.334	68.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	425.334	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5429001
57	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.572.083	251.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.572.083	62.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.572.083	62.900	1.572.083	109.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	486.900	S	5429001
58	CC 1077872606	MENDEZ PALACIO NICOLAS	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
59	CC 12139977	MONJE CHALA MICHEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
60	CC 1013612234	MORALES TOMBE FLORESMIRO	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
61	CC 12188076	MUÑOZ ARCENIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
62	CC 83243697	MUÑOZ MORA FAIBER	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.469.334	235.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.469.334	58.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.469.334	58.800	1.469.334	102.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	455.600	S	5429001
63	CC 1075257007	NARVAEZ GUIO LAURA VICTORIA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.615.833	258.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.615.833	64.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.615.833	64.700	1.615.833	112.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	500.500	S	5429001
64	CC 6139105	OCAMPO OBANDO ULDIVIER DE JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
65	CC 6438644	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.542.916	246.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.542.916	61.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.542.916	107.400	1.542.916	107.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	477.900	S	5429001
66	CC 1075320922	ORTIZ PERDOMO JUAN DIEGO	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	SANITAS-EPS005	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
67	CC 1075293901	ORTIZ RIOS GUSTAVO ANDRES	1.160.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	EPS-S PIAOSALUD-EPSIC6	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5429001
68	CC 7689416	ORTIZ TORRES GUSTAVO	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
69	CC 1075257554	PANIAGUA ABELLO MANUEL HORACIO	1.360.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.580.501	252.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.580.501	63.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.580.501	110.100	1.580.501	110.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	489.600	S	5429001
70	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.600.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.154.166	344.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.154.166	86.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.154.166	150.000	2.154.166	150.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	667.100	S	5429001
71	CC 1084578337	PAZ ZUÑIGA DIXON ARNULFO	1.160.000	F		X														0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	812.000	130.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	812.000	32.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	945.722	37.900	812.000	56.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	257.000	S	5429001
72	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.450.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.450.000	232.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	101.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S	5429001
73	CC 73121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.439.125	230.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.439.125	57.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.439.125	100.200	1.439.125	100.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	445.700	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
74	CC 1007821200	PLAZAS HERNANDEZ RIGOBERTO	1.160.000	F	X															0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	270.667	43.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	270.667	10.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	270.667	10.900	270.667	18.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
75	CC 7731714	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.993.125	318.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.993.125	79.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.993.125	138.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	617.500	S	5429001
76	CC 762048608	QUINAYAS QUINAYAS RUBER	1.160.000	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
77	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION-88-25-14	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	600.000	24.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.680.000	67.200	600.000	3.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	190.400	S	5429001
78	CC 12186618	QUINTERO GAITAN ORLANDO	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
79	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5429001
80	CC 12200476	QUINTERO YUCUMA HERNAN	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
81	CC 7698433	RAMIREZ ROMERO EDGAR	1.700.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	850.000	136.000	0	0	SANITAS-EPS005	850.000	34.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	850.000	34.000	850.000	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
82	CC 1075300301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.450.000	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.665.989	266.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.665.989	66.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.665.989	66.700	1.665.989	116.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	516.000	S	5429001
83	CC 1075246470	REYES GONZALEZ WILLIAM RICARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
84	CC 1077860613	REYES MOTTA DARWIN FELIPE	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
85	CC 1075226424	RIVERA JOSE ARNOLDO	1.300.000	F	X								X							0			28	28	28	28	COLFONDOS-231001	1.449.584	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.449.584	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.449.584	100.900	1.449.584	100.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	448.900	S	5429001
86	CC 1032507854	RODRIGUEZ AGUILLON GABRIEL EDUARDO	4.000.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMPENSAR-CCF24	5.182.813	207.400	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	617.900	S	5429001
87	CC 1076985689	ROJAS CORDOBA EDILBERTO	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	EPS ECOOPSOS S.A.S-ESSC91	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	27.000	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5429001
88	CC 1003805525	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.160.000	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.238.542	198.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.238.542	49.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.238.542	86.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	383.700	S	5429001
89	CC 7730705	ROJAS QUINTERO ROBERT REINALDO	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5429001
90	CC 1075245862	ROMERO CORTES JHON FREDDY	3.000.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
91	CC 1077873747	ROMERO HENAO CAMILO ANDRES	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
92	CC 83222480	RUBIANO FIGUEROA ORLANDO	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
93	CC 1125178092	RUIZ MUÑOZ MOISES OVIDIO	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	773.334	123.800	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPS023	773.334	31.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	773.334	53.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	219.700	S	5429001
94	CC 1075242396	SAAB YEPES MARIA ANGELICA	2.000.000	F	X							X								0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	933.334	149.400	0	0	SANITAS-EPS005	933.334	37.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	933.334	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.200	S	5429001
95	CC 1075292837	SALAS CRUZ LINDA TATIANA	1.400.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	653.334	104.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	653.334	26.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	653.334	45.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	202.500	S	5429001
96	CC 1024574168	SALAZAR PUENTES LUIZ MIGUEL	1.160.000	F		X							X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.556.938	249.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.556.938	62.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.671.327	66.900	1.556.938	108.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	486.800	S	5429001
97	CC 1007462605	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.600.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.672.917	267.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.672.917	67.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.672.917	67.000	1.672.917	116.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	518.200	S	5429001
98	CC 12109374	SERRANO PEREZ JAVIER	1.160.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	173.600	S	5429001
99	CC 1014205747	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	600.000	96.000	0	0	SANITAS-EPS005	600.000	24.000	COMPENSAR-CCF24	2.175.000	87.000	600.000	3.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	210.200	S	5429001
100	CC 1082804134	TEJARO DIAZ WALTHE	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
101	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.262.708	202.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.262.708	50.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.262.708	50.600	1.262.708	87.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	391.200	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD					RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
102	CC 1117960965	URBINA OSPINA JHON FREDDY	1.160.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	232.000	37.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	232.000	9.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		72.900	S	5429001
103	CC 1104776494	VARGAS CASTILLO ABIMAEL	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	EPS ECOOPSOS S.A.S-ESSC91	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	402.778	16.200	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		129.600	S	5429001
104	CC 12203574	VARGAS OSPINA WILSON	1.160.000	F	X	X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		95.900	S	5429001
105	CC 1007681703	VARGAS PEÑA JOSE DANIEL	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		95.900	S	5429001
106	CC 7719481	VARGAS SANDOVAL JULIO CESAR	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		359.200	S	5429001
107	CC 83258378	VELA TRUJILLO EDWIN	1.160.000	F	X															0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	618.667	99.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	618.667	24.800	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		191.700	S	5429001
108	CC 12139295	VIDAL MONJE JAIME	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		287.500	S	5429001
109	CC 83242884	YUSUNGUAIRA TOVAR LUIS EDUARDO	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	SANITAS-EPS005	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		119.900	S	5429001
110	CC 79940691	ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0		359.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	S	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641			EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25906076	E	2023-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.814.900	126.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109	25906076		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
110.658.139	115.049.524	115.049.524	124.487.092	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				106	17.708.100	0	64.500	0	17.772.600
PROTECCION	230201	800229739	0	30	4.971.500	0	18.100	0	4.989.600
PORVENIR	230301	800224808	8	53	8.334.900	0	30.300	0	8.365.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	1.856.000	0	6.800	0	1.862.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	2.545.700	0	9.300	0	2.555.000
EPS(Administradoras: 11)				109	4.605.300	0	17.200	0	4.622.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	94.800	0	400	0	95.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	40	2.066.200	0	7.500	0	2.073.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	7	220.700	0	800	0	221.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	45	1.845.500	0	6.700	0	1.852.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	198.200	0	800	0	199.000
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	2	46.500	0	200	0	46.700
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	23.200	0	100	0	23.300
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	35.600	0	200	0	35.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	31.100	0	200	0	31.300
Gran Total					22.270.000	0	81.400	0	22.351.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410955	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	8	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25906076	E	2023-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.814.900	126.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109	25906076		Pagada							

PAGADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901093846	0	2	31.000	0	200	0	31.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	12.400	0	100	0	12.500
ARP(Administradoras: 1)				109	7.391.400	0	26.900	0	7.418.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	109	7.391.400	0	26.900	0	7.418.300
CCF(Administradoras: 3)				109	4.983.300	0	18.200	0	5.001.500
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	46.400	0	200	0	46.600
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	294.400	0	1.100	0	295.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	106	4.642.500	0	16.900	0	4.659.400
Gran Total					34.688.100	0	126.800	0	34.814.900

Comprobante

de pago en línea

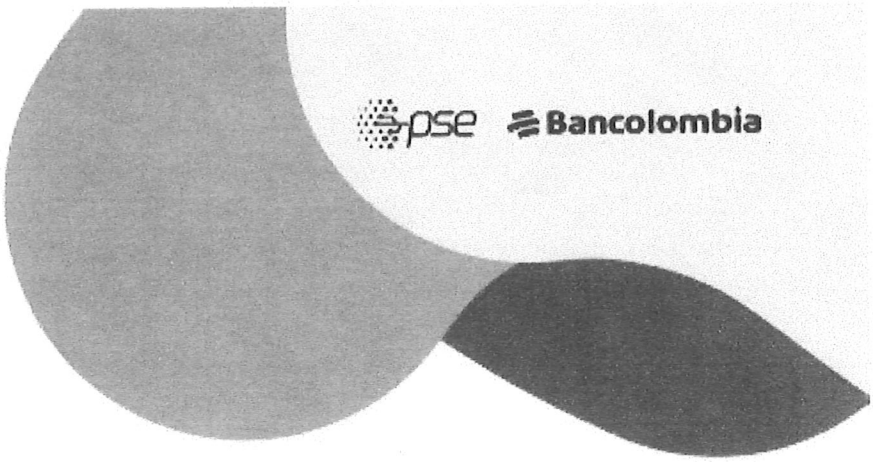

ASOPAGOS

Pago realizado por: MARTHA NATALY BALLESTEROS BUITRAGO

Nro. de recibo: 25906076

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: NIT

Razón Social: 900410655

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 15 de Marzo de 2023 08:03:58 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 34,814,900.00

Cuenta: *******5050

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

RESUMEN NILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
ODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25889068	E	2023-03-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7,827,600	10,000	BANCO DAVIVIENDA

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	25889068	2023-03-13	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
CC 96332224	ALVAREZ CORTES JHON FREY	1.550.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.680.782	269.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.680.782	67.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.680.782	67.300	1.680.782	117.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	520.600	S	5429001
CC 1066349410	BARRIOS VANEGAS VICTOR ALFONSO	1.790.000	F							X		X							0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	880.990	141.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	880.990	35.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	880.990	61.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	273.000	S	5429001
CC 1066349410	BARRIOS VANEGAS VICTOR ALFONSO	1.790.000	F																15			15	15	15	15	PORVENIR-230301	850.000	136.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	850.000	34.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	850.000	0	850.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	170.000	S	5429001
CC 1075279844	CHARRY ANDRADE NATALIA ALEJANDRA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.421.875	227.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.421.875	56.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.421.875	56.900	1.421.875	99.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.300	S	5429001
CC 55172446	CHAVEZ RIVERA SANDRA GICELLA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
CC 55179280	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5924001
CC 1075540864	LASSO ESQUIVEL JOIN JAIRO	1.500.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.677.344	268.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.677.344	67.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.677.344	67.100	1.677.344	116.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	519.400	S	5429001
CC 79500020	PARRA TOVAR WILSON REINALDO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.512.889	100.600	2.500.000	15.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.700	S	5429001
CC 7716816	PERDOMO GUTIERREZ JOSE ALIRIO	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.585.937	253.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.585.937	63.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.585.937	63.500	1.585.937	110.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	491.200	S	5429001
CC 19710887	PUPO CANTILLO JOHANDRI JOSE	1.250.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.416.016	226.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.416.016	56.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.416.016	56.700	1.416.016	98.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	438.600	S	5429001
CC 7689428	REYES RAMIREZ YAIR	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.588.355	254.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.588.355	63.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.588.355	63.600	1.588.355	110.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	492.000	S	5429001
CC 12193284	RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO	9.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	9.000.000	1.440.000	45.000	45.000	SANITAS-EPS005	9.000.000	360.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	9.000.000	360.000	9.000.000	47.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.297.000	S	5429001
CC 83169849	RUIZ WILLINTON RAUL	1.700.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230501	1.843.438	295.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.843.438	73.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.843.438	73.800	1.843.438	128.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	571.000	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641			EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25889068	E	2023-03-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.827.600	10.000	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	25889068		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.644.737	27.644.737	27.644.737	27.657.626	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 3)				12	4.513.500	0	5.800	0	4.519.300
ROTECCION	230201	800229739	0	3	909.800	0	1.200	0	911.000
OLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.784.200	0	2.300	0	1.786.500
ORVENIR	230301	800224808	8	7	1.819.500	0	2.300	0	1.821.800
S(Administradoras: 3)				12	1.106.200	0	1.500	0	1.107.700
AMISANAR	EPS017	830003564	7	1	67.100	0	100	0	67.200
ANITAS	EPS005	800251440	6	2	424.000	0	600	0	424.600
UEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	615.100	0	800	0	615.900
P(Administradoras: 1)				12	1.125.100	0	1.400	0	1.126.500
OSITIVA	14-23	860011153	6	12	1.125.100	0	1.400	0	1.126.500
F(Administradoras: 1)				12	1.072.800	0	1.300	0	1.074.100
OMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	12	1.072.800	0	1.300	0	1.074.100
n Total					7.817.600	0	10.000	0	7.827.600
