FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Agosto 29 de 2023 INTERV-NACION 001-2022-076

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Robinson Galindo Tarazona
DIRECCION TERRIOTORIAL PACIFICO

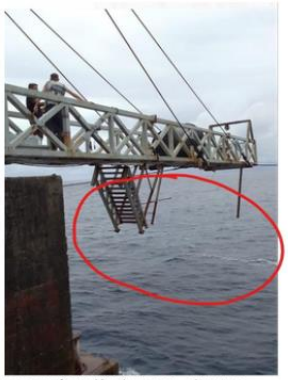
REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. DTPA-SAMC-NACION-2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATOS DE OBRA NACION 004 DE 2022

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento, el pasado 27 de mayo de 2023 en horas de la noche el puente voladizo Tangón, el cual presta sus servicios como único acceso al SFF Malpelo, sufrió una fuerte afectación a causa del fuerte oleaje y los vientos, los cuales golpearon la parte baja de la estructura del tangón, desgarrando la zona en donde se soportaba la escalera que permitía subir de las embarcaciones a la estructura y posterior acceso a la isla. Como se menciona anteriormente, siendo el tangón el único medio para el ingreso de los materiales, víveres y personas al SFF isla Malpelo, esta interventoría emite concepto favorable a la solicitud expuesta por el contratista por medio del documento NACION 004-2022-021 y recomienda a la entidad otorgar la prórroga de 61 días (contados a partir del próximo 1 de septiembre de 2023) para continuar con la ejecución del contrato de obra NACION 004 DE 2022, dando como fecha de finalización el próximo 31 de Octubre de 2023.


Imagen sin afectación con acceso al tangon


Imagen con afectación sin acceso al tangon

Muchas gracias por la atención prestada,

Atentamente,

María Margarita Zapata P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA MALPELO
