AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

LISTA DE CHEQUEO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS

112-ECP-FR-216-V04
05/07/2023

CONTRATO N°	396 del 2023	PROYECTO N°	20233005500062

MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
SOLICITUD (Solicitud de conveniente y descripción de justificación)	-	SI ✓
INFORME SUPERVISOR ENTIDAD	-	SI ✓
ACTA DE PROYECCCIÓN DE MODIFICACION DE CANTIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	112-ECP-FR-107	SI ✓
ACTA CAMBIO ESPECIFICACIONES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	112-ECP-FR-227	N/A
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (Si contempla Items nuevos)	112-ECP-FR-103	SI ✓
COTIZACIONES (Si contempla items nuevos y no se encuentran en la lista de precios de referencia de la AIM)	-	N/A
COMPARACIÓN Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	112-ECP-FR-108	N/A
MEMORIA DE CALCULO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	112-ECP-FR-109	SI ✓
INFORME DE SUPERVISIÓN CPS	112-ECP-FR-067	SI ✓
ACTA COMITÉ (Particip. RL Contratista, RL Interventoria, Jefe del Area, Gerente)	112-ECP-FR-002	SI
MINUTA	120-GCO-FR-029	SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre:ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matricula Profesional:

Firma
Nombre:MAYERLY ANDREA ESPINOZA SUAREZ
SUPERVISOR AIM
N° Matricula Profesional:

Firma
Nombre:JHON HARVEY DUQUE BINALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matricula Profesional:

V°B°
Nombre:KARLA ISLENA SANTOS PINZON
REVISÓ

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Puerto López, 01 de agosto de 2023 SI-150.35-509-08-2023

Ingeniero,
Óscar Daniel Salamanca
Gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)
Ciudad.

Asunto: solicitud de modificación al convenio 396 de 2023 celebrado entre la agencia para la infraestructura del Meta y el Municipio de Puerto López

Cordial saludo,

Por medio de la presente el municipio de Puerto López, a través de la secretaria de infraestructura, amablemente solicitamos a ustedes sea modificado el ítem presentado en el convenio 396 de 2023, el cual tiene como descripción:

ACTIVIDADES	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE OBRA
CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	77,90	$ 3.202.951,28	$ 249.509.904,71	$249.509.904,71

Por los ítems:

N° ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3	4220,00	$ 17.969,60	$ 75.831.712,00
1,2	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3	1716,00	$ 41.215,03	$ 70.724.991,48
1,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	68504,1	$ 1.502,75	$ 102.944.536,28
				Subtotal	$ 249.501.239,76
				SUBTOTAL OBRAS	$ 249.501.239,76
				VALOR TOTAL OBRA (REDONDEADO A CEROS)	$ 249.501.240,00

Debido que, una vez revisado el ítem propuesto por ustedes, este solo incluye el alquiler de maquinaria, pero no incluye compra de material de río para el mantenimiento, ni tampoco el transporte del mismo, siendo esto fundamental para la ejecución y el correcto mantenimiento.

Por otra parte, el municipio de Puerto López cuenta con un banco de maquinaria amarilla para ser usada en el cumplimiento del objeto contractual del presente convenio, esto se certifica mediante documento emitido por la secretaría de infraestructura y la cual será anexada a la presente solicitud, tomando en cuenta lo anterior, es más beneficioso y necesario el material de río, en base a lo anterior,

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

elevamos esta solicitud y en caso de ser favorable la petición solicitamos sea modificado por los ítems propuestos en esta solicitud,

Sin otro particular,

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Sebastian Fernando Buitrago	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Cargo: CPS Profesional Universitario	Cargo: secretaria de Infraestructura	Cargo: secretaria de Infraestructura

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

MODIFICATORIA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 396 DE 2023

INFORME MODIFICATORIA "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

2023

LOCALIZACION DE LA VIA

La localización de la vía se encuentra situada en el municipio de puerto López, más exactamente a uno 3 km después de la vereda la Balsa a unos 18 km aproximadamente del casco urbano del municipio, las coordenadas de la inicio y fin son las siguientes:

LOCALIZACIÓN	*COORDENADAS GEOGRÁFICAS*	
Punto Inicio	4° 4'36.59"N	73° 4'37.04"O
Punto Final	4° 8'12.02"N	73° 5'13.00"O

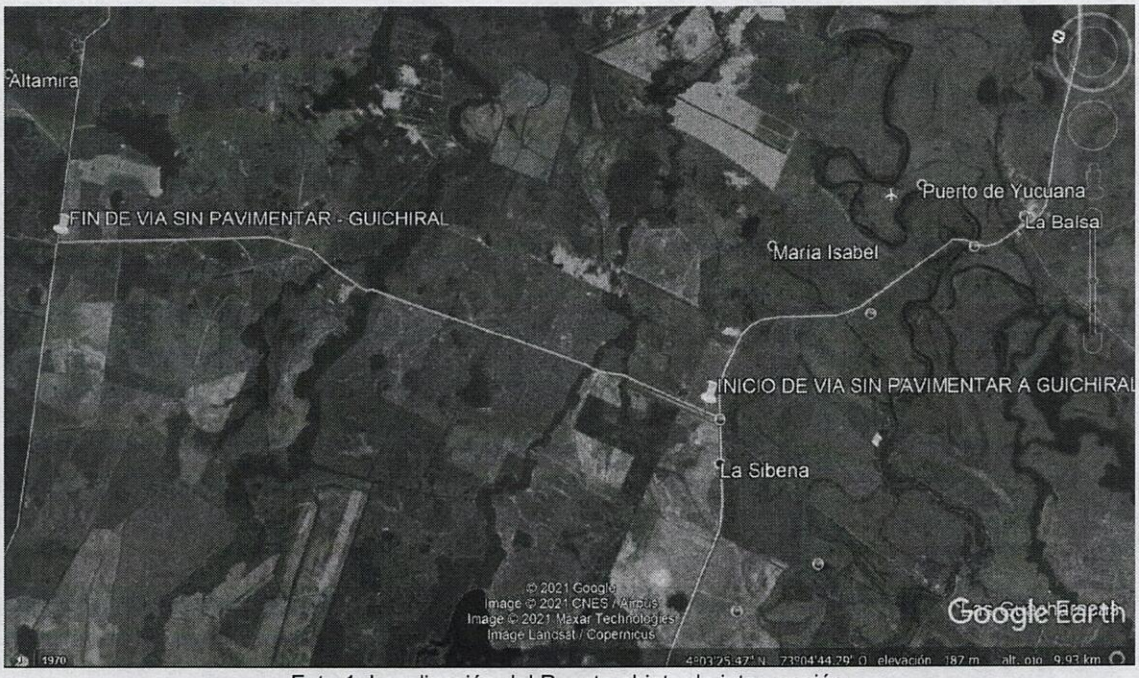


Foto 1. Localización del Puente objeto de intervención.
Fuente. Propia

El inicio de la vía en estudio se encuentra por la entrada de la pista de Tobasia, aproximadamente 3 km después de la vereda la balsa, sobre la vía nacional que comunica Villavicencio y Puerto López el cual se denominará como K0+000.



Foto 2. Punto de inicio pista de tobasia.
Fuente. Google Earth

La vía del presente diagnostico comunica las veredas, guichiral, el tigre, Patagonia con el casco urbano del municipio de Puerto López, vía de suma importancia para la dinamización de la economía, la interacción entre el campo y la zona urbana, esta vía es el medio para acceder a diferentes servicios que se ofrecen en la cabecera municipal, así como elemento fundamental en el sustento de familias que tienen su operación económica fuera del casco urbano, de acuerdo a lo anterior el tener una malla vial en buen estado beneficia tanto a la comunidad rural como a la urbana.

DATOS GENERALES Y DESCRIPCION

Los datos registrados a continuación inician en el K0+000 y corresponden a la entrada de la pista tobasia, hacia la vereda Guichiral.

Desde el punto de inicio K0+000 se evidencia que la capa de rodadura esta en pavimento flexible pero el cual se encuentra en muy mal estado, se presentan hundimientos, abultamientos, descascaramiento, ahuellamiento, baches, así como pérdida total del pavimento flexible en algunos tramos de la vía en mención.

La vía en estudio tiene una longitud de aproximadamente 6,87 km desde su punto de inicio al punto final, según las coordenadas antes expuestas, esa vía comunica la vía nacional ruta Puerto López – Villavicencio, con un cruce que comunica a las veredas Guichiral, el tigre y Patagonia.

La vía cuenta con un ancho de vía de aproximadamente 9 m, cuenta con algunas estructuras de drenaje como puentes y alcantarillas, la vía se encuentra pavimentada en algunos tramos sin embargo este pavimento no está en buenas condiciones, cuenta con señales de tránsito, existen estructuras eléctricas en algunos costados de la vía.

Esta vía tiene constante tráfico de vehículo de carga pesada, como volquetas doble troque, camiones de carga animal, entre otros vehículos de menores dimensiones, el tráfico de estos vehículos hace que la vía se deteriore muy fácilmente y generé inconformidad con las diferentes comunidades a las que comunica.



Foto 3. Foto aérea de la vía y la pista de tobasia.
Fuente. Foto Propia

ANÁLISIS DE LA VÍA Y ESTADO ACTUAL

La vía objeto de este diagnóstico a lo largo de su recorrido se encuentra en paupérrimas condiciones, debido a que presenta una capa de rodadura de mala calidad, en las cuales se destaca, presencia de material arcilloso, diferentes patologías del pavimento, puentes y estructuras en malas condiciones, falta de señalación.

No existe a lo largo del recorrido una demarcación de la vía, pocas señales de tránsito, debido que a los daños que se han venido presentando año tras año, los

conductores transitan fuera de la vía debido a su mal estado, eso hace que se amplié el ancho de vía.

La vía se encuentra delimitada en algunas zonas, sin embargo, el mal estado de algunas zonas ha causado otras zonas de paso de los vehículos afectando más el estado de la vía actual.
De acuerdo con el Manual INVÍAS, el ancho de calzada mínimo es de 6 metros con un ancho de berma entre 0.5m y 1m y se podría decir que esto se podría cumplir en el momento de hacer un mejoramiento o rehabilitación de la vía.

El trazado actual de vía presenta algunas curvas simples que no significan problema para un mejoramiento y/o rehabilitación de la vía, en cuanto a seguridad si refleja un gran inconveniente ya que no se encuentra señalizada, no cuenta con iluminación y/o alumbrado público, adicional la capa de rodadura está en mal estado lo cual puede producir accidente de tránsito y daños a los vehículos que allí transitan.

Se ha analizado que para la intervención de dicha vía es necesario la conformación de una nueva estructura de vía que soporte la carga que sobre ella transita, tomando en cuenta el tránsito y tipo de vehículos, de esta forma se asegura una vida útil más prolongada, se ahorraran gasto de mantenimiento correctivo y se verá una ahorro económico a largo plazo.

A pesar que la vía cuenta con obras de arte tipo alcantarilla y puentes, se encuentra en mal estado por la aparición de baches los cuales se han convertido en huecos de grandes dimensiones, lo que ha causado, perdida del bombeo de la vía, empozamiento de aguas lluvia, así como daño estructural de la vía

Sobre la vía en referencia no existen curvas verticales considerables, únicamente en zonas donde se encuentran alcantarillas construidas o puentes, que hacen la vez de una especie de curva vertical pequeña.

A lo largo del recorrido se encontró con algunas estructuras tipo puentes y alcantarillas, que en la inspección visual se encontraban en buen estado, sin embargo, es necesario realizarle un diagnóstico más detallado, en la actualidad ninguna de estas estructuras presenta fallas o fracturas visibles, se encuentran un poco colmatadas, pero esto es fácil de subsanar.

ESTRUCTURA	COORDENADA
PUENTE 1	4° 6' 46,443"N – 73°4'43,664" W
PUENTE 2	4°6'32,048"N – 73°4'45,428" W
PUENTE 3	4°5'15,501"N – 73°4'39,03" W
PUENTE 4	4° 05'04,48" N – 73°04'37,08" W

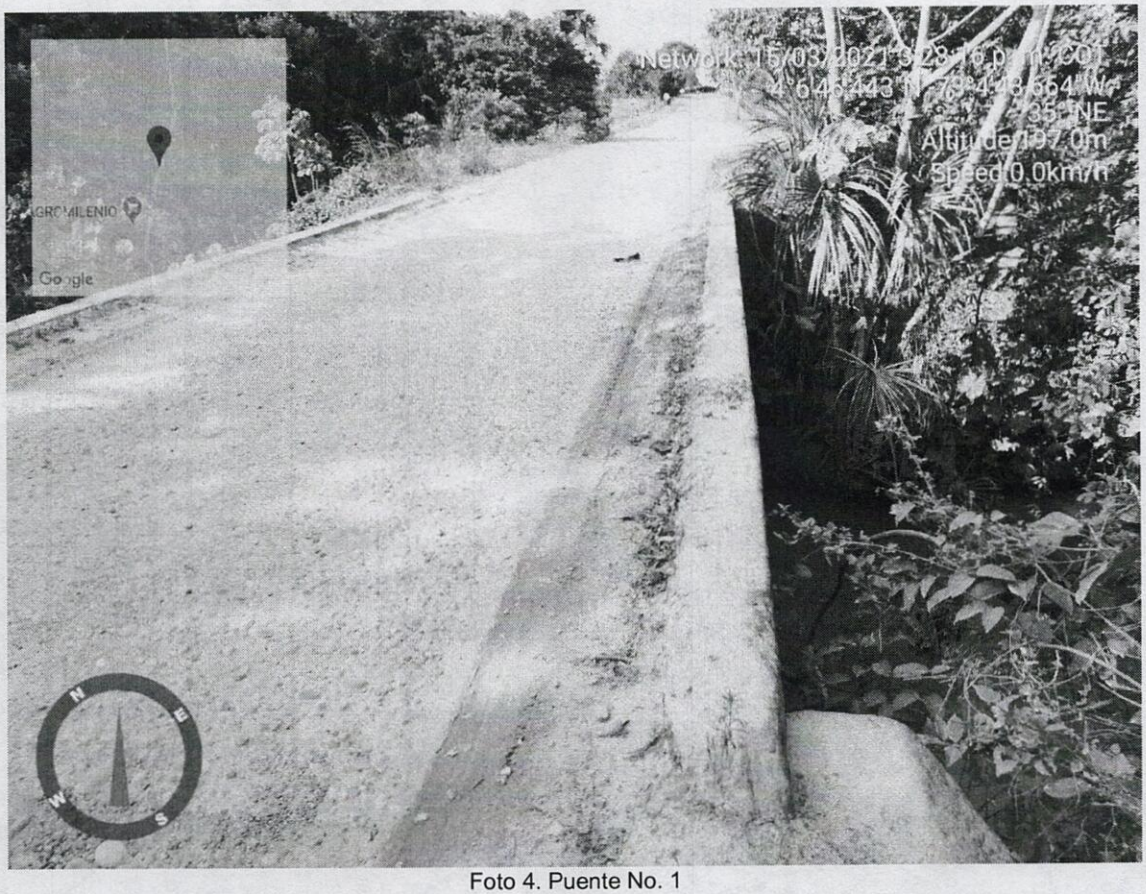


Foto 4. Puente No. 1
Fuente. Foto propia.

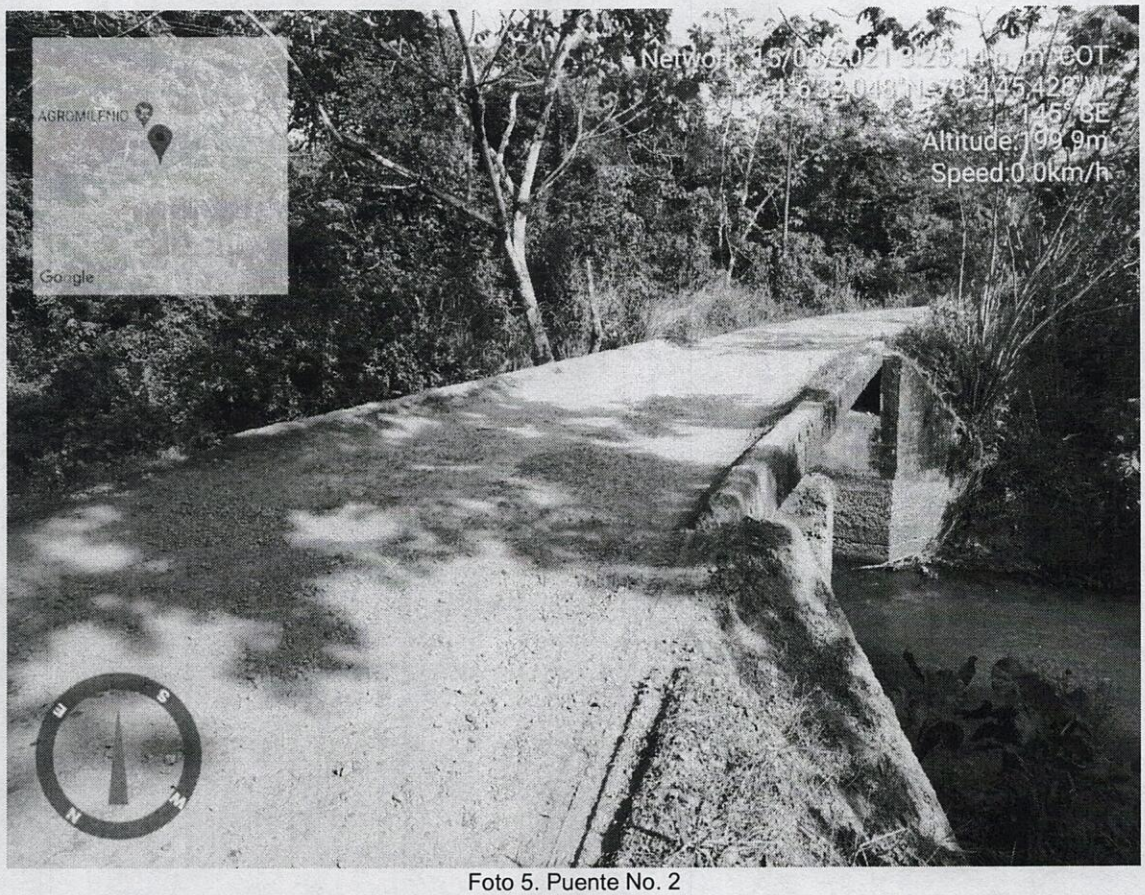


Foto 5. Puente No. 2
Fuente. Foto propia.



Foto 6. Puente No. 3
Fuente. Foto propia.

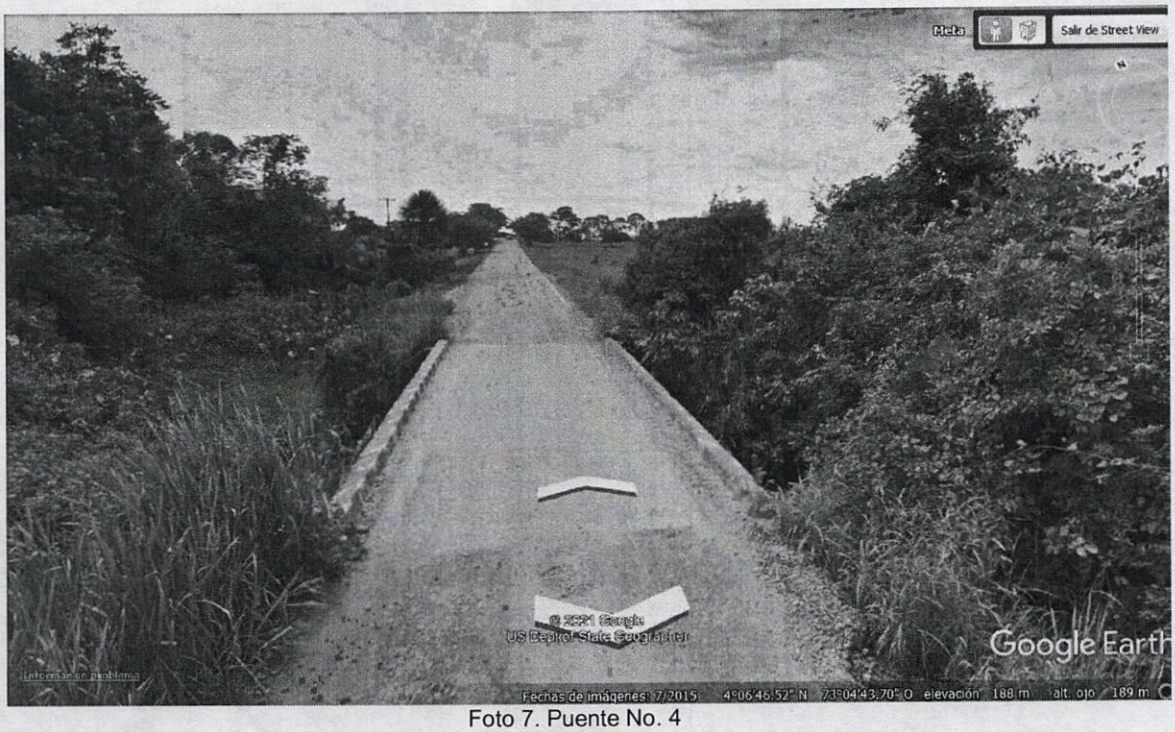


Foto 7. Puente No. 4
Fuente. Google Earth.

Sobre este recorrido se encontró varía afluentes por los que se debe pasar para llegar la vereda guichiral, esto se deja plasmado en este documento debido que siempre es importante contemplar este tipo de aspectos en documentos de diagnóstico.

En cuanto al recorrido realizado, encontramos que la rasante de la vía se encuentra en mal estado, muchos baches a lo largo de todo el recorrido, varias patologías del pavimento que nos indican que se debe hacer una reparación total de la vía, ya que no es viable simplemente realizar un bacheo y parcheo sobre esta, por ello se requiere una construcción total que genere un solución contundente y definitiva.

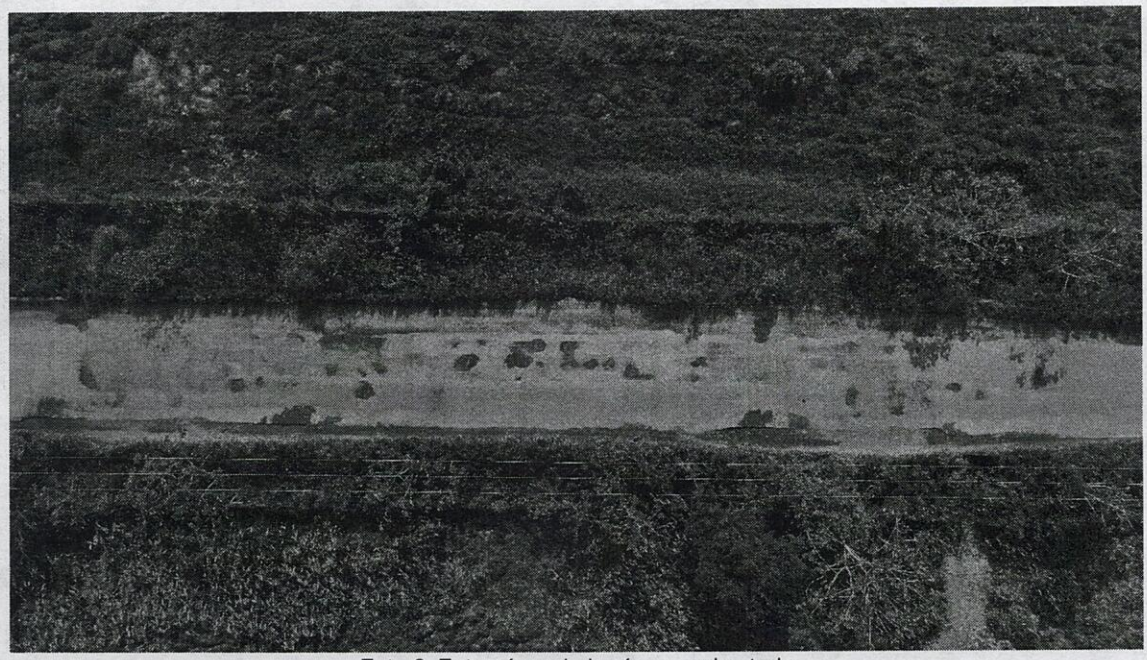


Foto 8. Foto aérea de la vía en mal estado
Fuente. Foto propia.

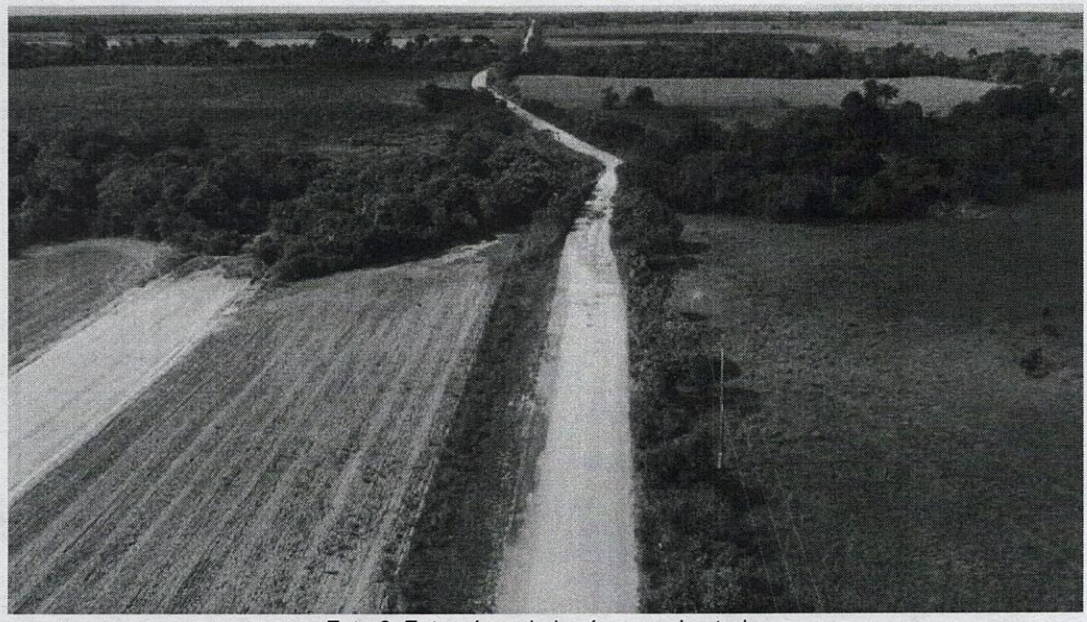


Foto 9. Foto aérea de la vía en mal estado
Fuente. Foto propia.



Foto 10. Foto del estado de la vía
Fuente. Foto propia.

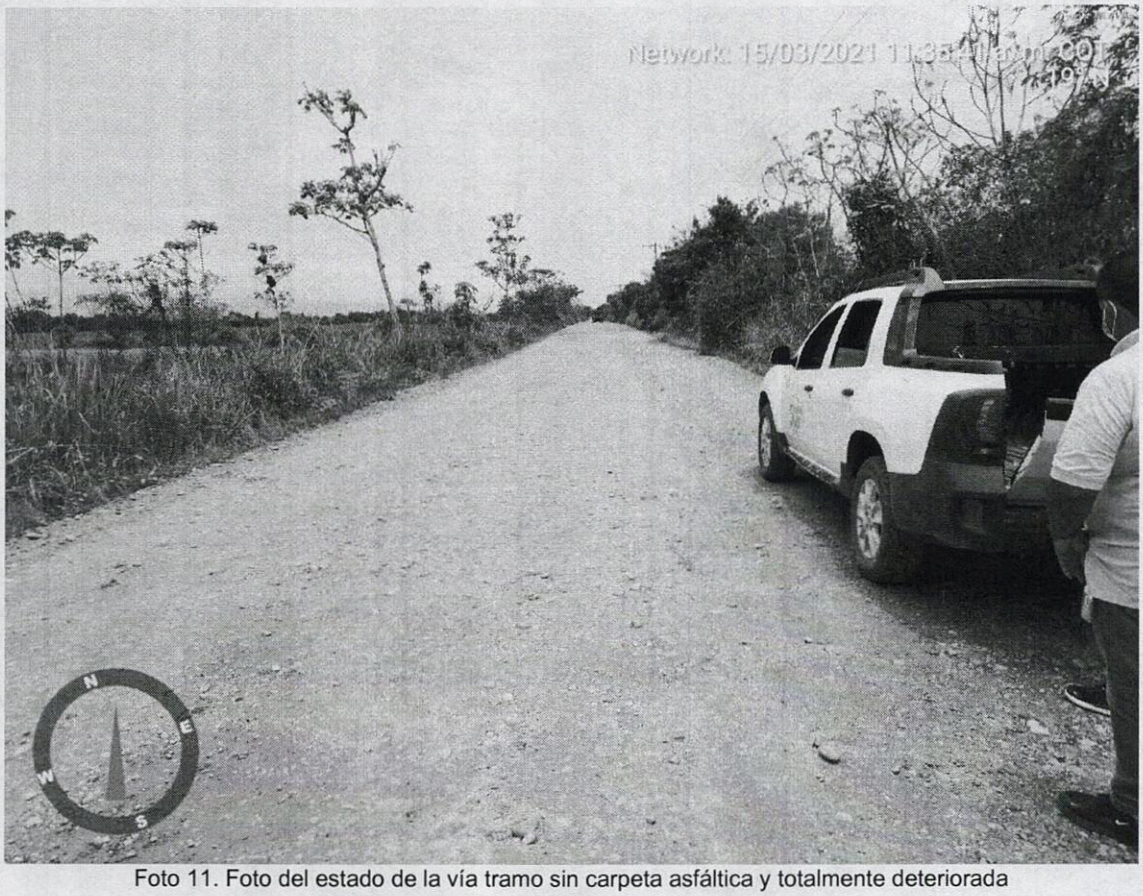


Foto 11. Foto del estado de la vía tramo sin carpeta asfáltica y totalmente deteriorada
Fuente. Foto propia.

INCIDENCIA DEL BUEN ESTADO DE LA VÍA

La incidencia del buen estado de la vía es indispensable para el progreso económico de la zona, debido que sobre esta área operan diferentes empresas y actividades económicas, como lo son minas de extracción de agregados pétreos, así como fincas ganaderas, fincas agrícolas, finca productora de arroz, molino de arroz, pista de aterrizaje para avionetas y diferentes proyectos productivos, por esta misma vía, adicional nos encontramos con la intersección que tiene como ruta principal a otras veredas como lo son, el Tigre, Guichiral, Patagonia, Puerto Porfia, Brisas de Guatiquia y Bajo Humea, así como también es una ruta alterna a Villavicencio por la vía de caños negros y al Cabuyaro pasando por el Puente del rio Humea. En esta zona se encuentran diferentes empresas y actividades económicas que allí tienen sus labores, utilizan esta vía como medio principal para trasladar sus productos a las diferentes zonas tanto del municipio como del departamento.

En esta misma zona operan diferentes empresas que suministran agregados pétreos, empresas que contribuyen en el progreso y construcción de la infraestructura del municipio, empresas de suma importancia para el dinamismo económico que necesita el municipio y el departamento, luego de la recesión presentada por la pandemia, el tener una malla vial en óptimas condiciones genera una repercusión positiva para la economía del municipio, incentiva la contratación de personal, mayor productividad, mejora de la calidad de vida, menor gasto en combustibles, costos de transporte, dinamismo de la economía local.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, se establece que la población directamente beneficiada sería las veredas GUICHIRAL, EL TIGRE, PATAGONIA PUERTO PORFIA, BRISAS DE GUATIQUIA Y BAJO HUMEA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, por lo tanto, se relación la población beneficiada a continuación:

CUADRO POBLACIONAL SEGÚN LAS TABLAS DEL SISBEN

POBLACION	EL TIGRE	PTO PORFIA	GUICHIRAL	PATAGONIA	BOCAS DEL GUAYURIBA	HUMEA	TOTAL
TOTAL POBLACIÓN	**188**	**264**	**344**	**68**	**54**	**1**	**919**
NIVEL 1	95	203	251	60	32	1	642
NIVEL 2	30	18	32	2	2	0	84
NIVEL 3	63	43	61	6	20	0	193

Tomando en cuenta lo anterior, la población beneficiada directamente sería de 864 personas, sin tener en cuenta las personas beneficiadas indirectamente, ya que esta misma vía comunica otras poblaciones como lo son, caños negros y el municipio de

Villavicencio, esta población también se verá beneficiada por el óptimo estado de la vía.

Es de resaltar que esta vías es de alto impacto para la municipio de Puerto López ya que sobre toda esta zona se generan varias actividades económicas, como molinos de arroz, fincas arroceras, empresa de producción de huevos y gallinas, Empresas de suministro de agregados pétreos, es una vía fundamental que comunica a Puerto López con Villavicencio, siendo esta vía su vía alterna, de igual manera se comunica al municipio de Cabuyaro, tomando esto en cuenta es de gran importancia como canal de interacción económica y social, por esto, se hace necesario y casi indispensable contar con esta vía en óptimas condiciones.

Además, se verán beneficiadas empresas agropecuarias, empresas relacionadas al suministro de agregados pétreos, empresas pequeñas de la zona, microempresas, empresas unifamiliares y demás que realizan su actividad económica en esta zona.

Al igual que la economía, también se verán beneficiados los niños y niñas que toman clases en el colegio de la vereda Guichiral, Patagonia, El tigre, ya que se ha venido evidenciando que existen una cantidad importante de niños que se desplazan por esta vía para llegar a la institución educativa, dicho lo anterior nuestra población beneficiada será mucho mayor, tomando en cuenta la población educativa, la población que es beneficiada indirectamente, población flotante entre otros.

PRODUCCION AGROPECUARIA –SECTOR TOBASIA, GUICHIRAL, PORFIA, BRISAS DEL GUATIQUIA, HUMEA Y EL TIGRE

Esta es una zona altamente agrícola debido a la calidad de sus suelos, los cereales es el cultivo que predominan en este sector y jalonan la economía de éste, es así que el arroz cuenta con un gran área establecida, además de contar con un distrito de riego que permite el establecimiento de arroz en los dos semestres, lo que hace notorio que a pesar de todos los inconvenientes que se ha presentado con el arroz en relación a importaciones, precios de compra y al programa de incentivo al almacenamiento de arroz, los productores le siguen apostando al establecimiento y comercialización este cereal. De igual forma existe en la vereda Tobasia una actividad agroindustrial dedicada al almacenamiento, secamiento, trilla y empaque de arroz, que compra un gran porcentaje del grano producido en este sector.

Otro de los establecimientos agrícolas que continúa incrementándose en esta zona es el del cultivo de Palma de aceite, seguido de plátano, papaya y yuca.

En el área pecuaria, la mayor explotación en la zona son los bovinos, destacándose las explotaciones ganaderas dedicadas a la cría y la ceba, en promedio 126 predios

en la zona suman un inventario de 12.674 cabezas de ganado, seguidas de explotaciones porcícolas y aves de patio a nivel de economía campesina.

Otra actividad económica importante en la zona es la pesca artesanal, la cual se desarrolla sobre los ríos Guatiquia y Humea, donde aproximadamente 50 familias derivan su sustento de esta actividad.

El uso de maquinaria agrícola, por la mayoría de productores agropecuarios es altamente tecnificada y se usa tanto en la preparación de terrenos, siembra, labores de mantenimiento y recolección de cosechas.

En estas veredas la administración municipal, a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, presta el servicio de Asistencia Técnica a pequeños y medianos productores, de igual forma fomenta el cultivo de hortalizas a través de programas de huertas caseras y promueve la explotación de especies menores con la cría de pollos de engorde como estrategia de seguridad alimentaria dirigida a la población más vulnerable de estas comunidades.

Producción agrícola por vereda (Hectáreas)

VEREDA	ARROZ	PALMA ACEITE	PLATANO	PAPAYA	YUCA
TOBASIA	600	0	0	0	0
GUCHIRAL	120	0	20	10	10
BRISAS GUATIQUIA	180	0	40	12	12
TIGRE	650	500	30	20	10
HUMEA	450	0	40	30	15
TOTAL	2.000	500	130	72	47

MODIFICACIÓN AL CONVENIO

Para los mantenimientos rurales es necesario contar con maquinaria, equipos, talento humano e insumos para el mantenimiento, sin embargo, en el ítem sobre el que se elaboró el presupuesto establece únicamente el alquiler de maquinaria, maquinaria con la que cuenta el municipio y están a disposición para el mantenimiento de las vías, por otra parte, el municipio no cuenta con una cantera autorizada para la extracción de material, lo que nos lleva a realizar la compra de esté, debido a esto se solicita amablemente a la Agencia para la Infraestructura del Meta, se modifique el ítem y se permita la compra de material de río, con el fin de cumplir con el objeto contractual y los mantenimientos viales.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la visita, e inspeccionado la vía y los diferentes puntos relacionados en el presente documento, encontramos que es de vital importancia realizar una intervención importante sobre esta vía que es de gran importancia para el municipio y la cual generará gran impacto en la población aledaña a esta, así como también al municipio, al departamento y la nación, debido que muchas productos producidos en esta zona son distribuidos a diferentes partes del país, lo que nos está significando una actividad económica, social y política muy importante, dicho todo esto, es viable y muy importante poder generar un vía totalmente pavimentada que permita el transito fluido y constante de los diferentes vehículos que realizan sus operaciones y su recorrido por allí, realizando el debido manejo de aguas de escorrentía, así como la instalación de la señalización pertinente y la demarcación de la vía, vemos con gran necesidad la intervención de esta vía que tanto provecho nos genera al municipio y sobre la cual se mejoraran en gran medida las condiciones de vida de las personas que allí habitan.

Como conclusión a este diagnóstico, se determina que es viable y necesario realizar la demolición, excavación y nueva conformación de la estructura de la vía, y pavimentación de la misma debido al mal estado en que se encuentra, se requiere realizar un diagnóstico o estudio de vulnerabilidad a los puentes para determinar su estado estructural.

De acuerdo a lo anterior, se requiere realizar una modificación al convenio tomando en cuenta que en el contrato inicial está contemplado únicamente el alquiler de la maquinaria, pero el municipio de Puerto López requiere la compra de material de rio adecuado para el mantenimiento y conformación de las vías propuestas en el presente informe.

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA PROYECCIÓN MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-107-V02
06/08/2021

CONVENIO N°	**396 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2023005500062**

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 249.509.904,71
ENTIDADO INSTITUCION:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892099325-0
REPRESENTANTE LEGAL :	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
CORREO ELECTRONICO:	contratacion@puertolopez-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co
SUPERVISIOR AIM:	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419-2023
CORREO ELECTRONICO:	arqjhonduque@gmail.com
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 13 de septiembre de 2023

			CONDICIONES INICIALES				PRESENTE MODIFICACION				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL		MAS (+)	V. TOTAL	MENOS (-)	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	OBRA											
1,1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR RIEGO Y COMPACTACION)	KM	77,90	$ 3.202.951,28	$	249.509.904,71		$ -	77,90	$ 249.509.904,71	0,00	$ -
1,2												
1,3												
	SUBTOTAL				$	249.509.904,71		$ -		$ 249.509.904,71		$ -
2												
2,1					$	-		$ -		$ -	0,00	$ -
2,2					$	-		$ -		$ -	0,00	$ -
2,3					$	-		$ -		$ -	0,00	$ -
					$	-		$ -		$ -		$ -
3												
3,1					$	-		$ -		$ -	0,00	$ -
3,2					$	-		$ -		$ -	0,00	$ -
					$	-		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS											
N.P.1	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3		$ 17.969,60	$	-	4.220,00	$ 75.831.712		$ -	4.220,00	$ 75.831.712
N.P.2	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3		$ 41.215,03	$	-	1.716,00	$ 70.724.991		$ -	1.716,00	$ 70.724.991
N.P.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.502,75	$	-	68.504,10	$ 102.944.536		$ -	68.504,10	$ 102.944.536
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$	-		$ 249.501.240		$ -		$ 249.501.240
					$	249.509.904,71		$ 249.501.239,76		$ 249.509.904,71		$ 249.501.239,76
	VALOR TOTAL CONVENIO				$	249.509.904,71		$ 249.501.240,00		$ 249.509.904,71		$ 249.501.240,00

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONVENIO INICIAL O ULTIMA MODIFICACION:	$	249.509.904,71
MODIFICACIONES (+)	$	249.501.240,00
MODIFICACIONES (-)	$	249.509.904,71
VALOR ADICIONAL	-$	8.664,71
VALOR TOTAL	$	249.501.240

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONVENIENTE A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA SUPERVISION Y APOYO A LA SUPERVISIÓN CONSIDERAN VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Nota: Las cantidades establecidas en la presente acta no modifican las condiciones iniciales de AIU del convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el día **miércoles, 13 de septiembre de 2023**

Firma:
Nombre:RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma:
Nombre:ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional:25202-45962 CND

Firma:
Nombre:MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional:25202-121005 CND

Firma:
Nombre:JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
MONITOR
N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS ADJUNTOS A ESTA ACTA : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE SUPERVISIÓN, COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
IENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@ipm-vieta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CAMBIO ESPECIFICACIONES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-227-V02
09/08/2021

CONVENIO No	396 de 2023	PROYECTO No.	2023005500062
OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 249.509.304,71		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892099325-0		
REPRESENTANTE LEGAL :	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN		
CORREO ELECTRONICO:	contratacion@puertolopez-meta.gov.co		
SUPERVISOR ENTIDAD:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co		
SUPERVISIÓR AIM:	ELVIA LUCY MARIA MORALES RODRIGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419-2023		
CORREO ELECTRONICO:	argihonduque@gmail.com		

Me permito solicitar cambio de especificaciones al convenio en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V UNITARIO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N.P.1	M3	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3	$17.969,60
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N.P.2	M3	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3	$41.215,03
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N.P.3	M3/KM	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	$1.502,75

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

N.P.1: LA ACTIVIDAD COMPRENDE EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 2", INVOLUCRANDO SOLAMENTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXTENDIDO CON MANO DE OBRA. LOS RELLENOS CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SE REALIZAN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS DE LA SUBRASANTE DE LOS SUELOS SOBRE LOS CUALES SE CIMENTARÁ UNA OBRA CIVIL YA SEA UNA VÍA, EDIFICACIÓN, ETC. SE EJECUTARÁ SIGUIENDO LAS NORMAS VIGENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FABRICANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, Y TENIENDO EN CUENTA EL ESTUDIO DE SUELOS Y LOS PLANOS DEL PROYECTO ESPECÍFICO.

N.P.2: LA ACTIVIDAD CONSISTE ÚNICAMENTE EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE PRÉSTAMO O DE PLANTAS TRITURADORAS HASTA LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN. SE EJECUTARÁ SIGUIENDO LAS NORMAS VIGENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FABRICANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, Y TENIENDO EN CUENTA LOS PLANOS DEL PROYECTO ESPECÍFICO.

N.P.3: LA ACTIVIDAD COMPRENDE EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁXIMO 3", INVOLUCRANDO SOLAMENTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE EXTENDIDO CON MANO DE OBRA. LOS RELLENOS CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SE REALIZAN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS DE LA SUBRASANTE DE LOS SUELOS SOBRE LOS CUALES SE CIMENTARÁ UNA OBRA CIVIL YA SEA UNA VÍA, EDIFICACIÓN, ETC. SE EJECUTARÁ SIGUIENDO LAS NORMAS VIGENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FABRICANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, Y TENIENDO EN CUENTA EL ESTUDIO DE SUELOS Y LOS PLANOS DEL PROYECTO ESPECÍFICO.

Calle 35 No. 35-01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO
SE SOLICITA A LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META EL ANEXO DE LAS ESPECIFICACIONES DE "RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" Y 3", SUMINISTRO Y EXTENDIDO" Y "TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR", TODO ESTO CON EL FIN DEL MEJORAMIENTO DE CARRETEABLES CRÍTICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ Y PRIORIZAR EL DETERIORO DE LOS TRAMOS AFECTADOS QUE CONDUCEN DE LA VEREDA LA BALSA A BOCAS DEL GAYURIVA,VEREDA INSPECCION EL TIGRE A LA VEREDA PATAGONIA, VEREDA TOBASIA A CRUSE CASCO URBANO GUACHIRAL , YA QUE LA COMUNIDAD PRIORIZA EL TRÁNSITO POR ESTOS CARRETEABLES.

REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES		
Solicitante	**No. Oficio**	**Fecha**
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SI-150.35-509-08-2023	01/08/2023

Firma:

Nombre: RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

AVAL Y OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN
SE AVALA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE "RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" , 3" Y SUMINISTRO Y EXTENDIDO" Y "TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR" POR PARTE DE LA SUPERVISORA.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN: QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente **viernes, 8 de septiembre de 2023**

Firma:
Nombre: RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma:
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional: 25202-121005 CND

Firma:
Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 25202-45962 CND

Firma:
Nombre: JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-103-V02
06/08/2021

CONVENIO N°	0396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062
FECHA DE INICIO:	27/07/23	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	26/12/23
OBJETO CONVENIO	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
SUPERVISOR ENTIDAD:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
SUPERVISOR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419 DE 2023		

ACTA:	MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO 0396 DE 2023	
CAPITULO:		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	0

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m3 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
50101003	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR			M3/KM	1502,75	1502,75
					Subtotal	1502,75
					Total Costo Directo	$ 1.502,75

JUSTIFICACIÓN CONVENIO

LUEGO DE ANALIZAR EL ESTADO DE LAS VÍAS SUSCEPTIBLES AL MANTENIMIENTO SE HAN PRIORIZADOS TRAMOS DE VÍA A INTERVENIR TENIENDO EN CUENTA SU AVANZADO ESTADO DE DETERIORO Y/O LA POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA.

OBSERVACIÓN SUPERVISION	
FACTOR DE INCREMENTO	1
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	$ 1.502,75
TOTAL	$ 1.502,75

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **miércoles, 13 de septiembre de 2023**

APRUEBA:

OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 42 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-103-V02
06/08/2021

CONVENIO N°	0396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062
FECHA DE INICIÓ:	27/07/23	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26/12/23
OBJETO CONVENIO	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
SUPERVISOR ENTIDAD:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
SUPERVISOR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419 DE 2023		

ACTA:	MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO 0396 DE 2023	
CAPITULO:		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 2	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
20901011	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	1,0000	M3	$ 41.215,03	$ 41.215,03
				Subtotal	**$ 41.215,03**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	**0**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
					Subtotal	**0**
					Total Costo Directo	**$ 41.215,03**

JUSTIFICACIÓN CONVENIO
LUEGO DE ANALIZAR EL ESTADO DE LAS VÍAS SUSCEPTIBLES AL MANTENIMIENTO SE HAN PRIORIZADOS TRAMOS DE VÍA A INTERVENIR TENIENDO EN CUENTA SU AVANZADO ESTADO DE DETERIORO Y/O LA POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA.

OBSERVACIÓN SUPERVISION	
FACTOR DE INCREMENTO	1
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	$ 41.215,03
TOTAL	$ 41.215,03

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **miércoles, 13 de septiembre de 2023**

APRUEBA:

OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

-01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-103-V02
06/08/2021

CONVENIO N°	0396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062
FECHA DE INICIÓ:	27/07/23	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26/12/23
OBJETO CONVENIO	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
SUPERVISOR ENTIDAD:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
SUPERVISOR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419 DE 2023		

ACTA:	MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO 0396 DE 2023	
CAPITULO:		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 1	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3

I. MATERIALES

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
20901009	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	1,0000	M3	$ 17.969,60	$ 17.969,60
				Subtotal	**$ 17.969,60**

II. EQUIPOS

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	**0**

III. MANO DE OBRA

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
				Subtotal	

IV.TRANSPORTE

N°	Descripción	Volumen ó Peso	Distancia	m2 ó Ton/Km	Valor Unitario	Valor Total
					Subtotal	**0**
					Total Costo Directo	**$ 17.969,60**

JUSTIFICACIÓN CONVENIO
LUEGO DE ANALIZAR EL ESTADO DE LAS VÍAS SUSCEPTIBLES AL MANTENIMIENTO SE HAN PRIORIZADOS TRAMOS DE VÍA A INTERVENIR TENIENDO EN CUENTA SU AVANZADO ESTADO DE DETERIORO Y/O LA POBLACIÓN A BENEFICIAR CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA.

OBSERVACIÓN SUPERVISION		
FACTOR DE INCREMENTO		1
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO	$	17.969,60
TOTAL	$	17.969,60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **miércoles, 13 de septiembre de 2023**

APRUEBA:

OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

COMPARACIÓN Y APROBACIÓN PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-108-V02
05/08/2021

CONVENIO N°	0396 de 2023	PROYECTO N°	2023005500062
FECHA DE INICIÓ:	27/07/23	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26/12/23
OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"		
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 249.448.093,47		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892099325-0		
REPRESENTANTE LEGAL :	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN		
CORREO ELECTRONICO:	contratacion@puertolopez-meta.gov.co		
SUPERVISIOR ENTIDAD:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co		
SUPERVISIOR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHONHARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	419 de 2023		
CORREO ELECTRONICO:	argjhonduque@gmail.com		

COMPARACION DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO			
				Cotizacion 1	Cotizacion 2	Cotizacion 3	Valor Pactado /Determinado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Mediante el presente documento, Rodrigo Andres Torres Guzman representante legal del municipio de Puerto Lopez y jhon harvey duque giraldo quien ejerce como apoyo a la supervisión, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el convenio, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
N.P.1	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3	$ 17.969,60
N.P.2	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3	$ 41.215,03
N.P.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	1502,75

NOTAS:

1. Los precios unitarios correspondientes a los Item no previstos están referidos al origen del convenio y se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N°088 de 2023 y los costos vigentes determinados con el estudio de mercado.
2. Hacen parte de la presente Acta de Fijación los documentos relacionados en el numeral 1 en XXX folios. <indique el número de folios >.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que intervinieron en ella , el día **miércoles, 13 de septiembre de 2023**

Firma
Nombre:RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma
Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 25202-45962 CND

Firma
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional:25202-121005 CND

Firma
Nombre: JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-109-V02
06/08/2021


CONVENIO N°	0396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062
FECHA DE INICIO:	27/07/23	FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/23
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."		
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 249.509.904,71		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS		
SUPERVISOR ENTIDAD:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN		
SUPERVISIÓR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°			

ACTA:	MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO 0396 DE 2023

CAPITULO:		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	VOLUMEN	DISTANCIA		TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA GUICHIRAL - PUENTE SOBRE RIO HUMEA - MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" -	480,0	13,6		6528,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA BALSA - BOCAS DEL GUAYURIBA - MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" -	1062,0	19		20178,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA SECTOR PISTA TOBASIA - CASCO URBANO DE GUICHIRAL - MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" -	1059,0	9,5		10060,50
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA EL TIGRE - PATAGONIA - MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" -	340,00	16,2		5508,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA INTERSECCION CRUCE SINAI HACIA LA VEREDA EL TIGRE - MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" -	128,00	11,8		1510,40
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA GUICHIRAL - PUENTE SOBRE RIO HUMEA - MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	128,00	13,6		1740,80
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA BALSA - BOCAS DEL GUAYURIBA - MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	560,00	19		10640,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA SECTOR PISTA TOBASIA - CASCO URBANO DE GUICHIRAL - MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	560,00	9,5		5320,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA EL TIGRE - PATAGONIA - MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	340,00	16,2		5508,00
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA INTERSECCION CRUCE SINAI HACIA LA VEREDA EL TIGRE - MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	128,00	11,8		1510,40
PASAN:			SUBTOTAL	68504,10
			TOTAL	68504,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

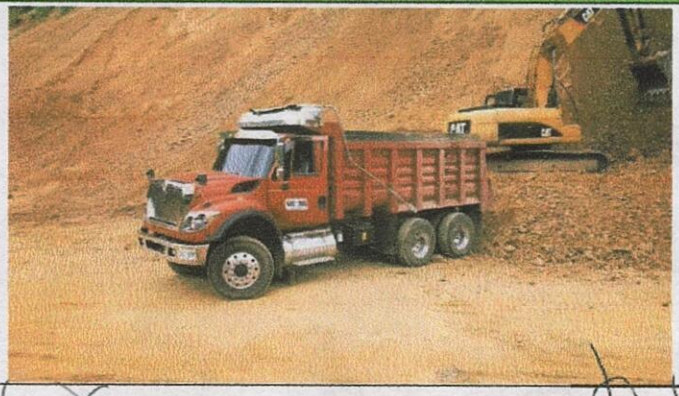

Firma
Nombre:RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma
Nombre:MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional:25202-121005 CND

Firma
Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 25202-45962 CND

Firma
Nombre: JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-109-V02
06/08/2021

CONVENIO N°	**0396 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2023005500062**
FECHA DE INICIO:	27/07/23	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	26/12/23
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."		
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 249.509.904,71		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS		
SUPERVISOR ENTIDAD:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN		
SUPERVISIÓR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°			

ACTA:	MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO 0396 DE 2023
CAPITULO:	

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.2	**CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)**	**KM**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VEREDA GUICHIRAL VIA PUENTE RIO HUMEA HACIA CASCO URBANO VEREDA GUICHIRAL	0,8	0,2	800	1	128
VEREDA LA BALSA - BOCAS DEL GUARYURIBA HASTA SECTRO PUERTO ALICIA	1	0,2	2800	1	560
VÍA UBICADA DESDE LA BALSA A GUICHIRAL (SECTOR PISTA TOBASIA)	1	0,2	2800	1	560
VÍA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA VEREDA GUICHIRAL, LA INSPECCIÓN TIGRE HASTA PATAGONIA	1	0,2	1700	1	340
VÍA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DEL CRUCE DEL SINAI A VEREDA EL TIGRE	0,8	0,2	800	1	128
PASAN: **TOMADAS DE VISITA TÉCNICA REALIZADA**				**SUBTOTAL**	1716,00
				TOTAL	1716,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



Firma
Nombre:RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma
Nombre:MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional:25202-121005 CND

Firma
Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 25202-45962 CND

Firma
Nombre: JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

MEMORIA DE CALCULO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-109-V02
06/08/2021


CONVENIO N°	0396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062
FECHA DE INICIO:	27/07/23	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	26/12/23
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META."		
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 249.509.904,71		
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS		
SUPERVISOR ENTIDAD:	RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN		
SUPERVISIÓR AIM:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°			

ACTA:	MODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO 0396 DE 2023
CAPITULO:	

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y EXTENDIDO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VEREDA GUICHIRAL VIA PUENTE RIO HUMEA HACIA CASCO URBANO VEREDA GUICHIRAL	3	0,2	800	1	480,00
VEREDA LA BALSA - BOCAS DEL GUARYURIBA HASTA SECTRO PUERTO ALICIA	3	0,15	2360	1	1062,00
VÍA UBICADA DESDE LA BALSA A GUICHIRAL (SECTOR PISTA TOBASIA)	3	0,15	2353	1	1058,85
VÍA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA VEREDA GUICHIRAL, LA INSPECCIÓN TIGRE HASTA PATAGONIA	3	0,2	1900	1	1140,00
VÍA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DEL CRUCE DEL SINAI A VEREDA EL TIGRE	3	0,2	798	1	478,80
PASAN: TOMADAS DE INFORME TÉCNICO				SUBTOTAL	4219,65
				TOTAL	4220,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

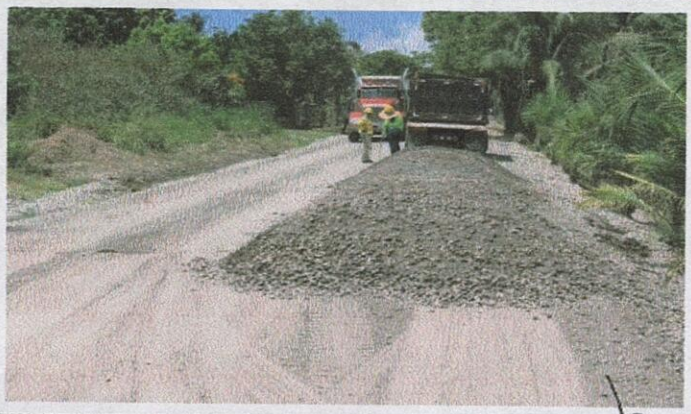


Firma
Nombre:RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma
Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 25202-45962 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre:MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ENTIDAD
N° Matrícula Profesional:25202-121005 CND

Firma
Nombre: JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

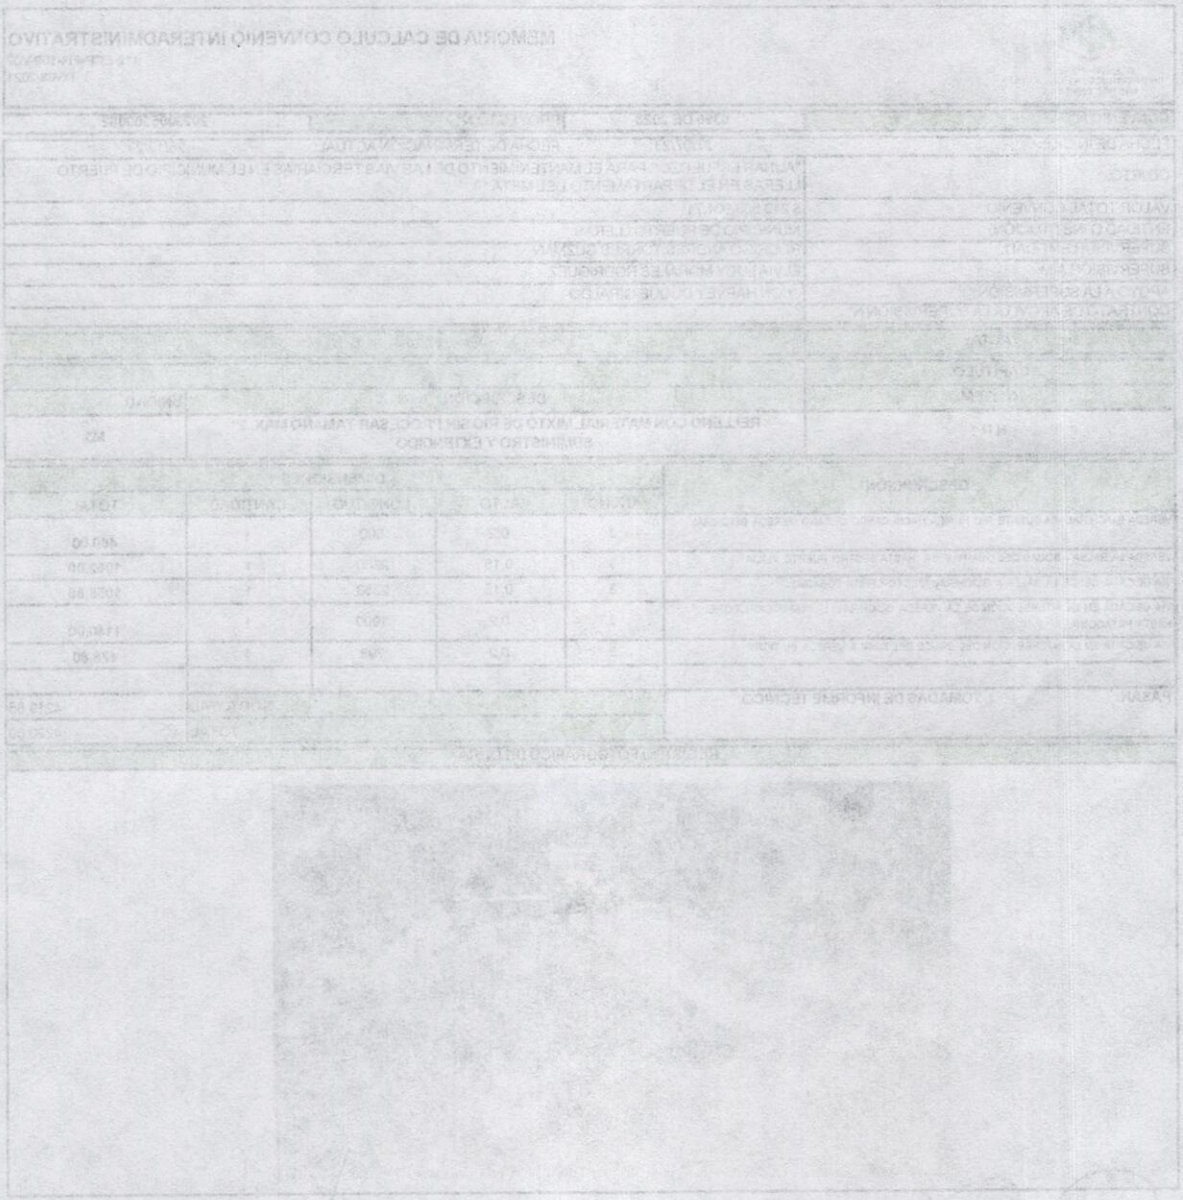

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LOPEZ	1	07	09	2023	8:00 am	11:00 am

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐ Gestión Gerencial	■ Ejecución y control de proyectos	☐ Gestión de Talento Humano
☐ Gestión Estratégica	☐ Gestión Jurídica	☐ Gestión de Evaluación y Control
☐ Gestión de Proyectos	☐ Gestión Documental	☐ Tecnología de la Información
☐ Gestión de Contratación	☐ Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

☐ Obra	☐ Convenio Solidario	☐ Mínima Cuantía
☐ Interventoría	■ Convenio Interadministrativo	☐ Urgencia Manifiesta
☐ Prestación de Servicios	☐ Consultoría	☐ Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°:396 DE 2023 PROYECTO N°:2023005500062

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

CONTRATISTA:

ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN	**JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION**	**ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ**
MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	**SUPERVISOR ALCALDIA**	**ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ**
ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ	**SUPERVISORA**	**AIM**
JHON HARVEY DUQUE GIRALDO	**MONITOR**	**AIM**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LOPEZ	1	07	09	2023	8:00 am	11:00 am

III. OBJETIVO

Siendo las 8:00 am del catorce (27) de Julio de 2023, se reunieron en el municipio de puerto López – Meta : RODRIGO ANDRESTORRES GUZMAN (jefe de la oficina de contratación del municipio de puerto López), MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ, (supervisor alcaldía), la Ingeniera. ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ, en calidad de Supervisora del convenio interadministrativo AIM y el Arquitecto JHON HARVEY DUQUE GIRALDO como (Monitor) AIM, con el objetivo de verificar los requisitos establecidos en la lista de chequeo CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MODIFICACION Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NUEVOS


"

relleno con material seleccionado de rio hasta 2" y material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro y extendido, transporte de material granular

- SOLICITUD
- INFORME DEL SUPERVISOR
- ACTA DE PROYECCION DE MODIFICACION DE CANTIDADES CONVENIO
- APU
- MEMORIA DE CALCULO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
- INFORME DEL SUPERVISOR CPS

convenio interadministrativo No 396 DE 2023– proyecto No. 2023005500062

FOTOS DE REUNION:

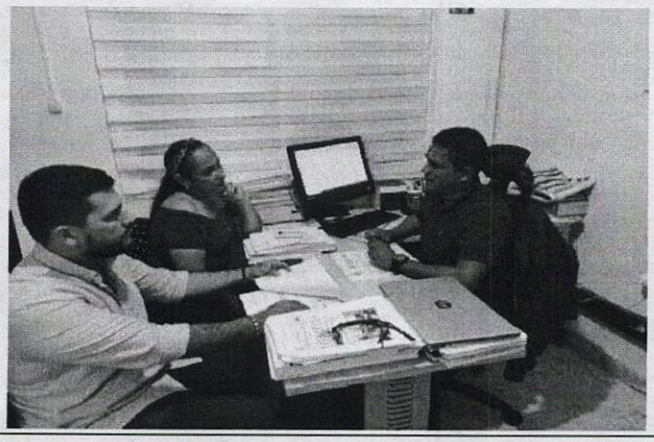

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LOPEZ	1	07	09	2023	8:00 am	11:00 am

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR			
N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	INCORPORACION DE LOS RECURSOS	REPRESENTANTE LEGAL	
2	PONER A DISPOSICIÓN LA MAQUINARIA Y BRINDAR TODO EL APOYO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPALES	SUPERVISOR ALCALDIA	
3			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

la ingeniera MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ (secretaria de infraestructura) mediante solicitud de oficio solicito al AIM modificación del convenio 396 de 2023 municipio de puerto López, teniendo en cuenta las siguientes razones:

de acuerdo con la visita técnica realizada 12 de agosto se puedo evidenciar que la necesidad de las vías beneficiadas requieren del subministro de material granular por tanto se requiere

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LOPEZ	1	07	09	2023	8:00 am	11:00 am

modificar el ítem (conformación de la banca existente (incluye: escarificar, perfilar, extender, cunetear riego y compactación); ya que la alcaldía municipal cuenta con un kit de maquinaria, que puede realizar las actividades de confirmación en la banca, por la cual solicita a la AIM modificar el ítem contractual establecido por el ítem de (material seleccionado de rio hasta 2") y (relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro y extendido) toda vez que la necesidad actual es la compra de material granular, debido a que el municipio no cuenta con cantera autorizada para la extracción del material, de esta manera la alcaldía busca garantizar la optimación de recursos a través de actividades de conformación de banca y el relleno de material granular.

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			
3			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR:
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNÍON:

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
PUERTO LOPEZ	1	07	09	2023	8:00 am	11:00 am

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	**FIRMA**
RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN	
MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	
ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ	
JHON HARVEY DUQUE GIRALDO	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

INFORME MODIFICACIÓN
Periodo de 27/08/2023 a 13/09/2023
Fecha de Presentación: 13/09/2023

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO PROYECTO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR DEL PROYECTO:	$ 249.448.093,47
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 249.448.093,47
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
CORREO ELECTRÓNICO:	contratacion@puertolopez-meta.gov.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	27/07/2023
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2023
5 Meses	Días

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	419 DE 2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JHON HARVEY DUQUE GIRALDO

A. AVANCE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

1. CONTROL DE COSTOS


CATEGORIA	CARGO	N° PERSONAS	% DEDICACION	TIEMPO EN MESES
PERFIL PROFESIONAL				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERFIL TÉCNICO				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERFIL AUXILIAR				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COSTOS DIRECTOS			
TIPO	CANTIDAD	%	MESES
N/A	N/A	N/A	N/A

Avance físico programado 0% y avance físico ejecutado 0%

2. AVANCE FISICO

PERIODOS	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	%0	$ 0.00	%0	$ 0.00	%0	$0.00	%0	$ 0.00

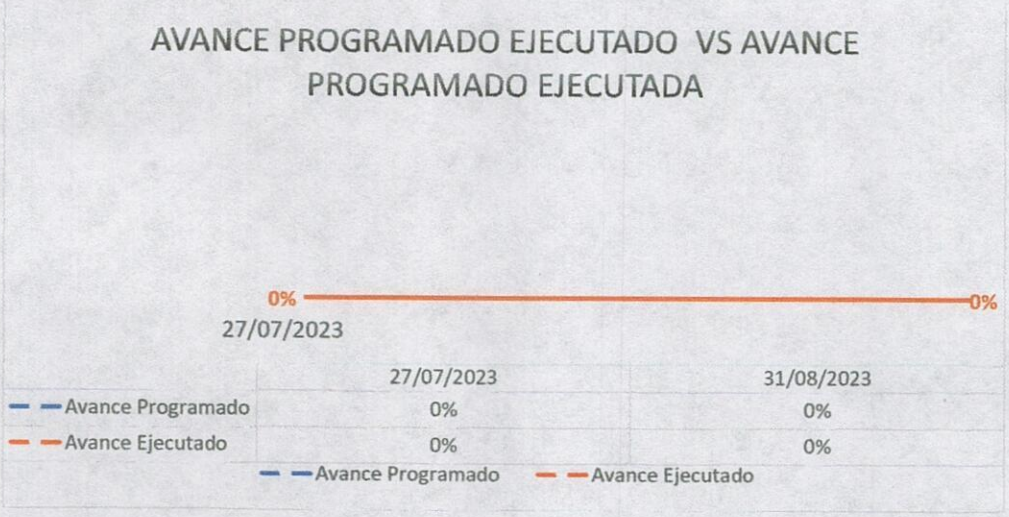

3. AVANCE OBRA

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

CONTRATO No. 396 DE 2023	
OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR:	$ 249.448.093,47
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 249.501.240,00
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
CORREO ELECTRONICO:	contratacion@puertolopez-meta.gov.co
FECHA DE INICIACIÓN:	27/07/2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	26/12/2023
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	0%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	0%
AVANCE FINANCIERO:	0%
OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HA PRESENTADO AVANCE A CAUSA DE UNA MODIFICATORIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, DE ESTA MANERA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONVIENIO Y ADEMAS TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS OPERATIVOS EN LAS VIAS TERCIARIAS.	

B. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD

Plan de Calidad para el desarrollo de la Interventoría, en el cual se establezca la metodología que incluya mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo,

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

el seguimiento, control y evaluación del componente técnico, administrativo, financiero, legal, social, de calidad, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en el proyecto.

2. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SGSST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Anexo:112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01 de agosto de 2023	SI-150.35-509-08-2023	solicitud de modificación al convenio 396 de 2023 celebrado entre la agencia para la infraestructura del Meta y el Municipio de Puerto López	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Óscar Daniel Salamanca Gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) Ciudad.

2. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
N/A	N/A
N/A	N/A

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

El contratista presentó planilla de pago N°: N/A
Anexo: Formato 112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA **(NO APLICA)**

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTÍAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado para el contrato de obra>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	
ANEXO N°	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	
ANEXO N°	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE SUPERVISION

112-ECP-FR-027-V03
18/09/2021

INFORME DE MODIFICACION N° 1

CONTRATO N°	398 DE 2023	PROYECTO N	20230058900E2

El contratista presento planilla de pago N°: N/A
Anexo: Formato 112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL
INTERVENTORIA (NO APLICA)

1. INFORME GESTION CONTRACTUAL Y AVANCE DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA:

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, ADICIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES - DIAS)	JUSTIFICACION	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICION			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACION	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACION			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACION	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

<Describa los modulos que considere necesarios, segun la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS <Describir las polizas actualizadas de acuerdo con el ultimo acto administrativo celebrado para el contrato de obra>

GARANTIAS			

Calle 16 No. 46 -04 Lobby 1 - Piso 8
CC Plazuela Lutheria - Villavicencio
comercio@gilm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 27/07/2023 A 08/09/2023

Avance físico ejecutado del 0% y avance financiero ejecutado 0%

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA, identificación de personal y costos directos ejecutados por la interventoría.



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS – VISITA TECNICA – VIA QUE COMUNICA VEREDA GUICHIRAL – PUENTE RIO HUMEA.	EJECUTADO	0%


DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

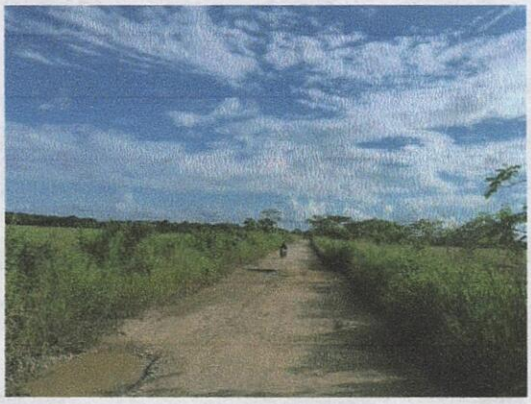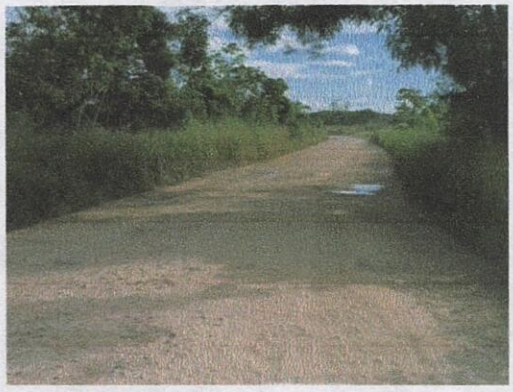

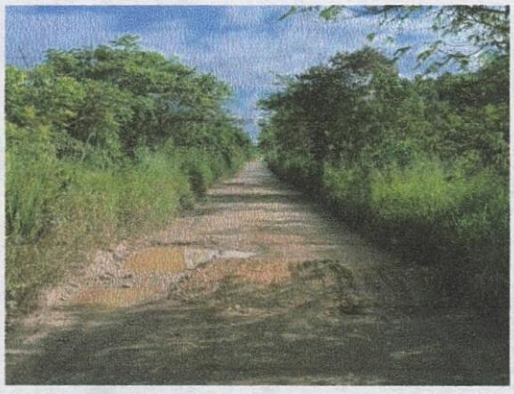OBSERVACIONES

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS - VISITAS TECNICAS – VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA BALSA – BOCAS DEL GUAYURIBA	EJECUTADO	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co











INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

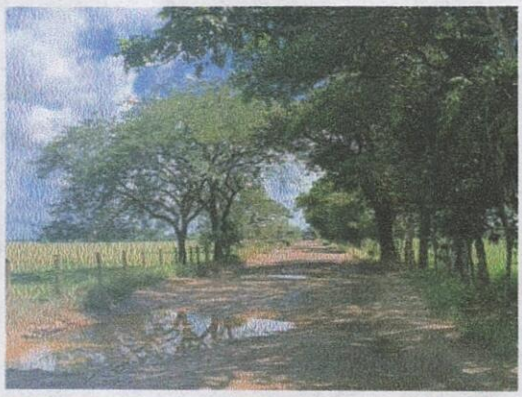

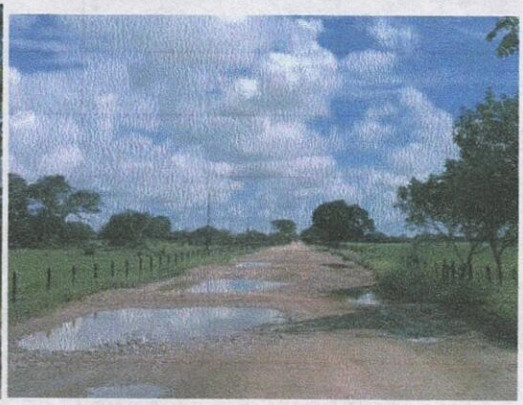OBSERVACIONES


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS – VIA QUE COMUNICA EL SECTOR PISTA TOBASIA – CRUCE SINAI (SECTOR GUICHIRAL)	EJECUTADO	0%


DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

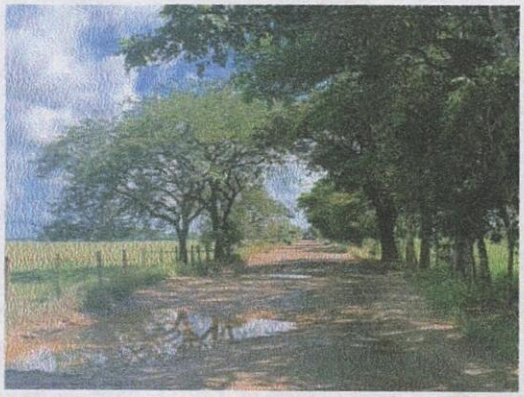

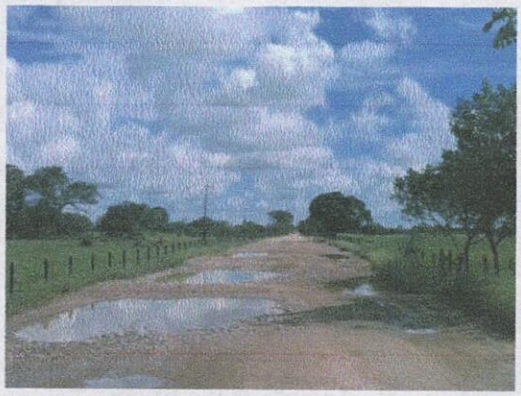
OBSERVACIONES


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VISITAS TECNICAS – VIA QUE COMUNICA LA INSPECCION EL TIGRE A PATAGONIA	EJECUTADO	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co


CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

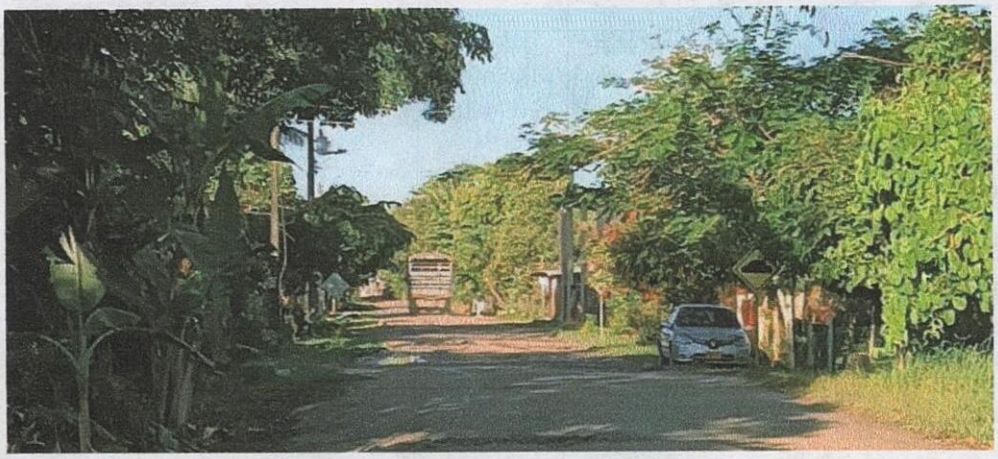

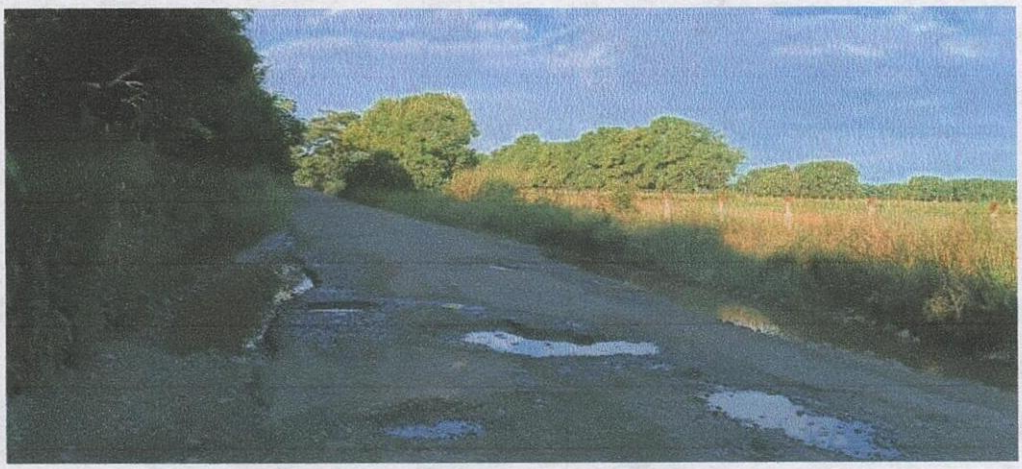

DEPARTAMENTO DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

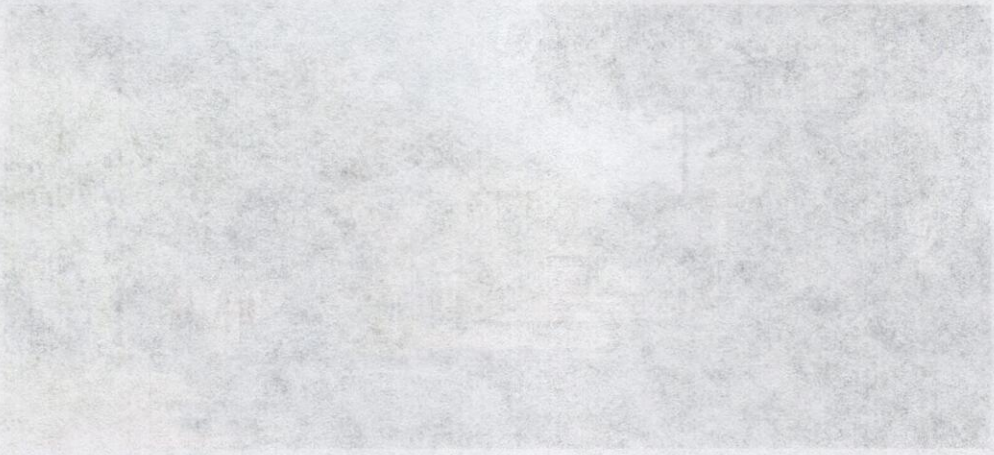




CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062



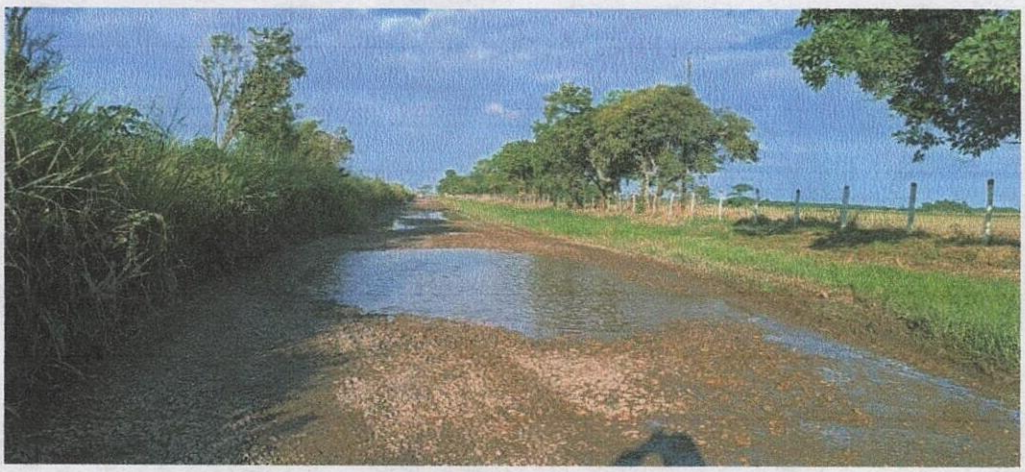


DEPARTAMENTO DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

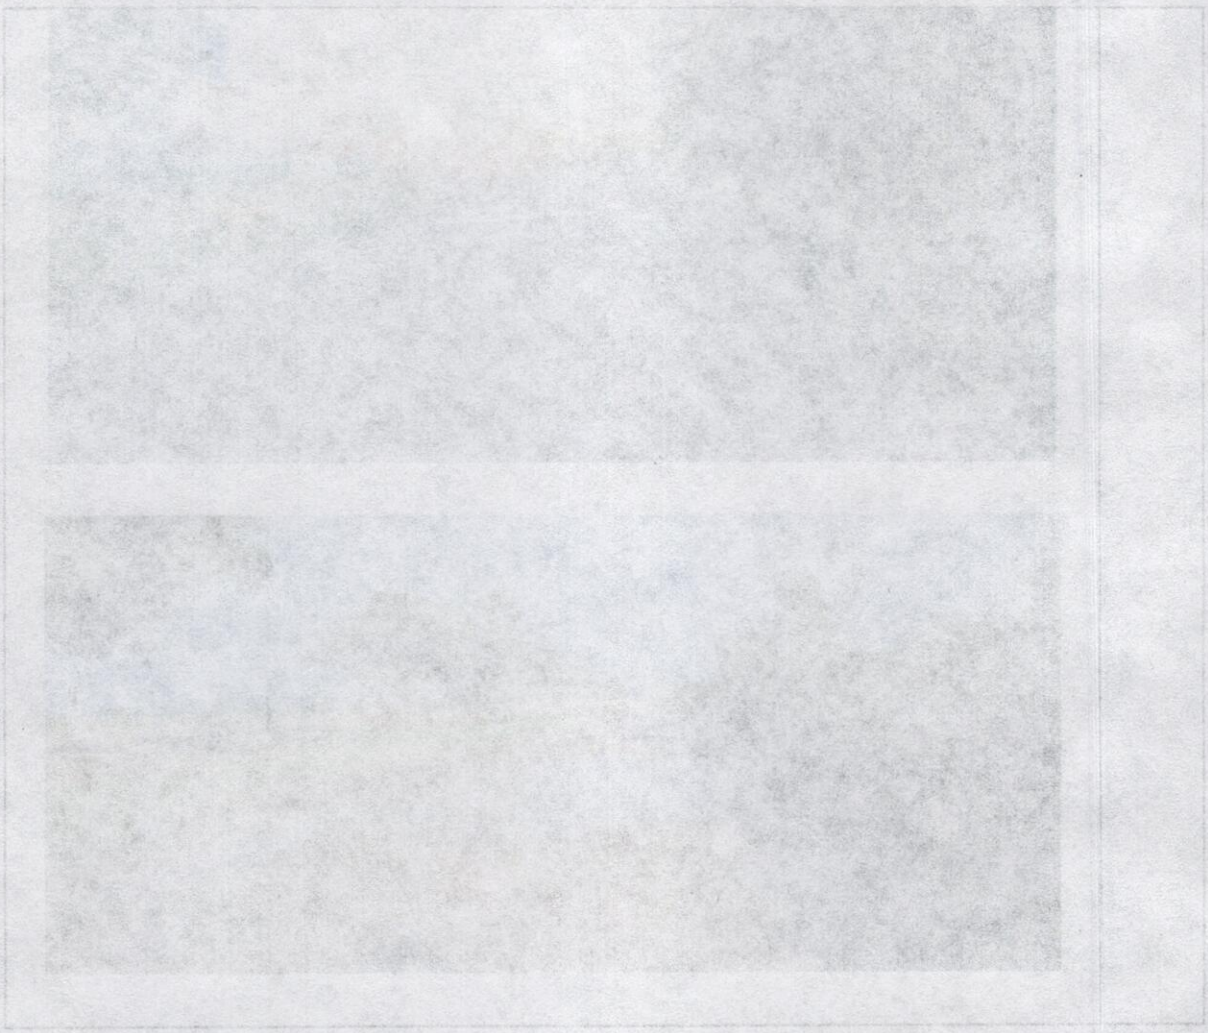

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

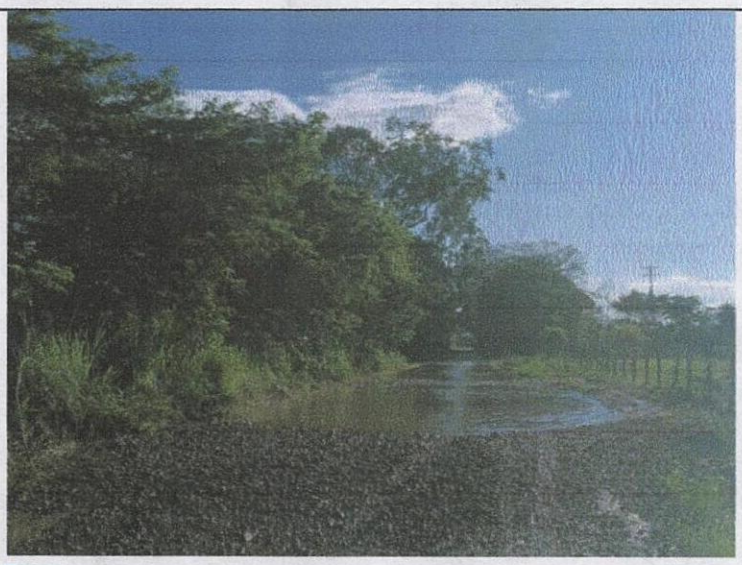

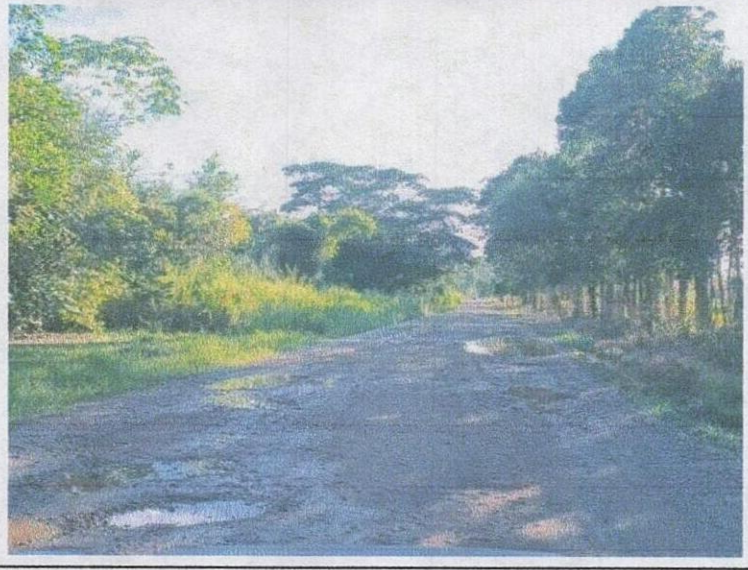

OBSERVACIONES

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

INFORME DE MODIFICACIÓN N° 1

CONTRATO N°	396 DE 2023	PROYECTO N°	2023005500062

A la fecha no se ha presentado avance del convenio interadministrativo, debido que se encuentra en proceso una modificatoria para la compra de material de río, dado que la minuta del contrato del presente convenio, no contenía actividades de suministro de material, lo que causa un perjuicio para el municipio a causa que este cuenta con maquinaria y equipo operativo para la operación de estas, pero no con una cantera de material para el mantenimiento de las vías, a causa de esto se hace necesario la compra de este insumo para una correcta ejecución de actividades, ahora bien, el municipio debe realizar un proceso de selección para la compra de material, pero para efectuar esta selección debe formalizar la modificación del convenio.

H. ANEXOS

- **SE ANEXA ACTA DE VISITA DE LAS DIFERENTE VEREDAS A INTERVENIR QUE SON INCLUIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO.**
- **APUS**
- **MODIFICATORIA**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 13 días del mes septiembre del 2023.

Firma	Firma V°B°
Nombre: ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ	Nombre:JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
SUPERVISOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202-45962 CND	N° Matrícula Profesional: A417632019-1121826598

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONTRATISTA	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - -META.** **NIT: 892099325** **REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR CARLOS JULIO GUTIERREZ TURRIAGO** **IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.387.867 DE PUERTO LÓPEZ – META.**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META**
FECHA	**25 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Entre los suscritos, **OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.724.607 de Bogotá D.C, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM**, creada mediante Decreto de transformación 297 del quince (15) de Septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 483 del catorce (14) de diciembre del 2022 y posesionado mediante acta 176 de fecha 14 de diciembre de 2022, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformacion 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META y/o AIM** por una parte y por la otra **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META, identificado con NIT. 892.099.325, y REPRESENTADO LEGALMENTE por: CARLOS JULIO GUTIERREZ TURRIAGO identificado con CC 17.387.867 DE PUERTO LOPEZ,** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido suscribir la presente **ACTA MODIFICATORIA No. 1** al convenio interadministrativo No. 396 de 2023 con base en las siguientes consideraciones:

1). Que el día 27 de junio de 2023, la Agencia para la Infraestructura del Meta, suscribió el Convenio Interadministrativo No. 396 de 2023, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**

2) . Hace parte integral del presente contrato el siguiente proyecto:

- ✓ Proyecto No. 2023005500062 cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL META"**

3) Que el término de ejecución inicial del convenio interadministrativo y el proyecto anteriormente relacionado fue establecido desde la suscripción del acta de inicio por CINCO (5) meses, que el convenio interadministrativo fue por la suma de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($249.509.904,71)

4) Que el convenio interadministrativo tiene fecha de inicio 27 de julio de 2023 con fecha de terminación 26 de diciembre de 2023.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CONTRATISTA	ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META NIT: 892099328 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR CARLOS JULIO GUTIERREZ TURRIAGO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.387.897 DE PUERTO LOPEZ – META.
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META
FECHA	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

5) Mediante acta de comité de fecha siete (07) de septiembre de 2023, suscrita por RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN (Jefe de la oficina de contratación del Municipio de Puerto López); MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ (supervisora por parte de la alcaldía); Elvia Lucy Morales Rodríguez, Supervisora del convenio por parte de AIM y Jhon Harvey Duque Monitor del Convenio por parte de la AIM; De acuerdo con la solicitud presentada formalmente por la alcaldía de Puerto López a la Agencia para la Infraestructura del Meta, se establece en la reunión la necesidad de requerir una modificación respecto del presupuesto del convenio interadministrativo vigente entre ambas partes.

I. DESARROLLO DEL COMITÉ
Se inicia el comité de obra con la participación de **RODRIGO ANDRESTORRES GUZMAN** (jefe de la oficina de contratación del municipio de puerto López), **MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ**, (supervisor de la alcaldía de puerto López), **ELVIA LUCY MORALES RODRIGUEZ**, (supervisora del convenio interadministrativo por parte del AIM) **JHON HARVEY DUQUE GIRALDO** (Apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo) del proyecto denominado "ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META El jefe de la oficina de contratación y la supervisora de la entidad del municipio de Puerto López exponen la solicitud de agregar a las especificaciones los precios unitarios del convenio interadministrativo en mención, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: "En calidad de jefe de la oficina de contratación del municipio de Puerto López solicitó la modificación del convenio de referencia, toda vez, que para el mantenimiento de las vías terciarias del municipio es necesario contar con suministro de material de río de tamaño máximo de 2" y 3" pulgadas que permita afianzar los carreteables en puntos críticos que se presentan en las vías, a su vez, se requiere contar con el transporte de este material a las zonas afectadas. Así las cosas, luego de analizar el estado de las vías susceptibles al mantenimiento se han priorizado tramos de vía a intervenir teniendo en cuenta su avanzado estado de deterioro y/o la población a beneficiar con el mantenimiento de la vía. Los puntos críticos y/o tramos de vía objeto de intervención son los siguientes: • VIA QUE COMUNICA VEREDA GUICHIRAL – PUENTE RIO HUMEA. • VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA BALSA – BOCAS DEL GUAYURIBA • VIA QUE COMUNICA EL SECTOR PISTA TOBASIA – CRUCE SINAI (SECTOR GUICHIRAL) • VIA QUE COMUNICA LA INSPECCION EL TIGRE A PATAGONIA Por esta razón se solicita a la agencia para la infraestructura del meta AIM realizar dicha modificación en el mejoramiento de la vía. El arquitecto **JHON HARVEY DUQUE** pide la palabra y realiza el siguiente análisis: "luego de la visita técnica realizada al punto a intervenir en el municipio de Puerto López, se logra evidenciar un importante mejoramiento de los carreteables críticos de las veredas mencionadas anteriormente y se viabiliza el mejoramiento de vía"

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

La supervisora (**ELVIA LUCY MORALES RODRÍGUEZ**) del convenio interadministrativo interviene:

"Teniendo en cuenta lo solicitado por el jefe de la oficina de contratación del municipio de Puerto López, el señor RODRIGO ANDRESTORRES GUZMAN, veo viable realizar dicha modificación del convenio interadministrativo No. 0396 de 2023 siempre y cuando se cumpla con el alcance del convenio."

Por lo anterior se viabiliza la modificación de precios unitarios, sin aumentar el valor inicial al convenio interadministrativo en mención.

La del municipio de Puerto López, afirmó que están de acuerdo y quedan a disposición para continuar con el trámite de modificación

El apoyo a la supervisión (**JHON HARVEY DUQUE GIRALDO**) interviene y procede a realizar el acta de mayores y menores cantidades del convenio 0396 de 2023.

Se da por terminado el comité siendo las 11:00 am.

6) Que en mérito de lo expuesto la Agencia de Infraestructura del Meta, considera viable y pertinente realizar el ACTA MODIFICATORIA No.1 al Convenio Interadministrativo No. 396 de 2023 en los siguientes términos.

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el presupuesto del Convenio Interadministrativo No. 396 de 2023, de conformidad con lo manifestado en el acta de comité de fecha 07 de septiembre de 2023 quedando de la siguiente manera:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

FECHA PRESENTE ACTA		miércoles, 13 de septiembre de 2023										
CONDICIONES INICIALES						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	MAS (+)	V. TOTAL	MENOS (-)	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	OBRA										
1.1	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR RIEGO Y COMPACTACION)	KM	77.90	$ 3,202,951.28	$ 249,509,904.71		$ -	77.90	$ 249,509,904.71	0.00	$ -
1.2											
1.3											
	SUBTOTAL				$ 249,509,904.71		$ -		$ 249,509,904.71		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
N.P.1	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3		$ 17,969.60	$ -	4,220.00	$ 75,831,712		$ -	4,220.00	$ 75,831,712
N.P.2	MATERIAL SELECCIONADO DE RIO HASTA 2"	M3		$ 41,215.03	$ -	1,716.00	$ 70,724,991		$ -	1,716.00	$ 70,724,991
N.P.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3KM		$ 1,502.75	$ -	68,504.10	$ 102,944,536		$ -	68,504.10	$ 102,944,536
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				$ -		$ 249,501,240		$ -		$ 249,501,240
					$ 249,509,904.71		$ 249,501,239.76		$ 249,509,904.71		$ 249,501,239.76
	VALOR TOTAL CONVENIO				$ 249,509,904.71		$ 249,501,240.00		$ 249,509,904.71		$ 249,501,240.00

CUADRO RESUMEN		
VALOR CONVENIO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN:	$	249,509,904.71
MODIFICACIONES (+)	$	249,501,240.00
MODIFICACIONES (-)	$	249,509,904.71
VALOR ADICIONAL	-$	8,664.71
VALOR TOTAL	$	249,501,240

Página 1

SEGUNDO: Todas las demás cláusulas y estipulaciones contractuales del Convenio Interadministrativo No. 396 de 2023, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2023.

OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS
Gerente de la AIM

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
Jefe Oficina de Contratación Alcaldía de Puerto López

JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica

Proyectó:
Melissa Rojas Mendieta
Coordinadora Jurídica
Alianzas con la Gente

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co
