FECHA DE ELABORACIÓN	25/SEPTIEMBRE/2023		INFORME No.	06
TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO DE OBRA No.	2223-2022			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	0176-2023			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2023		FECHA ACTA DE INICIO	24/02/2023
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."			
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL BUENOS AIRES 2023		NIT. No.	901.612.242-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO MARÍN MORALES		C.C. No.	5´577.128
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS		NIT. No.	901.666.013-2
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA		C.C. No.	80'037.941
SUPERVISOR	ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO		CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
VALOR	INICIAL		$ 2.320´220.350,0	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
		N/A	N/A	N/A
	MODIFICATORIO No. 01		N/A	
PLAZO	INICIAL		TRECE (13) MESES	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	FECHA
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACIÓN
		N/A	N/A	N/A

PÓLIZAS CONTRATO INICIAL				
GARANTÍAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL No. 3872 DE 2022				
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 28 de diciembre de 2022. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 3872 de 2022.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	23-12-2022	23-05-2024	$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		23-12-2022	23-01-2029	$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		23-12-2022	23-01-2027	$ 116´011.018,00
PÓLIZAS OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0176-2023				
GARANTÍAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 16 de enero de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 0176 de 2023.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	10-01-2023	10-06-2024	$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		10-02-2024	10-02-2029	$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		10-01-2023	10-02-2027	$ 116´011.018,00
Nota: El contrato suscrito se perfeccionó con la firma electrónica de la parte contratante el día 10 de enero de 2023, pero el clausulado complementario contenía el número 3872-2022 que correspondía a la vigencia pasada (2022), por tal motivo se hace necesario aclarar que, para todos los efectos, el número de contrato asignado corresponde al 0176-2023.				
PÓLIZAS ACTA DE INICIO				
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**	
Póliza de cumplimiento No: 15-44-101273310 del 2 de marzo de 2023. Ampara el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra en virtud del Contrato Principal No. 0176 de 2023.				
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A. Nit. 860.009.578-6	24-02-2023	25-07-2024	$ 464´044.070,00
Calidad del servicio		26-03-2024	27-03-2029	$ 232´022.035,00
Pago Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		24-02-2023	27-03-2027	$ 116´011.018,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	No.	FECHA	VALOR	VALOR EJECUTADO
	41523	22/02/2023	$2.320´220.350	$ 223´580.003

De conformidad con el inciso 4 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría.

Según las labores desarrolladas por el suscrito Supervisor y los documentos y actas entregados por el apoyo a la supervisión de la Gobernación del Cauca se presenta la siguiente información:

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (Reuniones, socializaciones, comités y/o visitas realizadas)

FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
09 AGOSTO A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	- Demolición alcantarilla ubicada en la abscisa k17+590 y losa existente desde la abscisa k15+120 al k15+125. - Actividades de corte de taludes y cajeo para ampliación de la vía desde la abscisa k15+580 al k15+840, del k16+000 al k16+170 y del k16+200 al k16+610. - Construcción de terraplén con material seleccionado desde la abscisa k15+580 al k15+840, del k16+000 al k16+170 y del k16+200 al k16+610 para mejoramiento de subrasante. - Instalación de subbase granular desde la abscisa k21+360 al k21+520. - Instalación de base granular desde la abscisa k20+070 al k20+140. - Excavación para construcción modulos 1 y 2 de muro ubicado desde la abscisa k19+632 al k19+645 lado derecho. - Excavación para construcción encole y cuerpo de alcantarilla ubicada en la abscisa k17+590 lado izquierdo. - Solado de limpieza para construcción de zarpa módulos 1 y 2 de muro ubicado desde la abscisa k19+632 al k19+645 lado derecho. - Losa de piso y atraque de tubería de 36" en medio cuerpo de alcantarilla ubicada en la abscisa k17+590. - Concreto clase F para renivelación de los estribos 1 y 2 del pontón ubicado en la abscisa k23+450. - Instalación acero de refuerzo para construcción de zarpa, dentellón y vástago modulos 1 y 2 de muro ubicado desde la	Se cuenta con un avance del 33,95% representado en actividades preliminares como localización y replanteo, remoción de derrumbes, corte de taludes y explanación para la ampliación de la vía, conformación de subrasante, construcción de terraplenes, instalación de subbase granular, construcción de muros de contención, construcción de subdrenes, obras de mitigación ambientales y sociales, implementación del plan de manejo de tránsito e implementación del protocolo de bioseguridad y construcción de alcantarillas e instalación de mezcla asfáltica. Durante este periodo se inició con la construcción de cunetas en los tramos que cuentan con carpeta asfáltica. Se solicita al contratista por parte de la interventoría realizar la protección inmediata con material tipo suelo seleccionado de la subrasante expuesta, una vez se realicen las actividades de excavación o explanación para evitar posibles daños por lluvias que puedan repercutir en costos adicionales y/o en cierres viales que afecten la transitabilidad de la comunidad aledaña al proyecto. A la fecha se cuenta con los equipos: excavadora sobre orugas, motoniveladora, retroexcavadora de llantas, vibro compactador, carrotanque, volquetas sencillas y doble troque.

	abscisa k19+632 al k19+645 lado derecho. - Instalación acero de refuerzo y construcción de encole en alcantarilla ubicada en la abscisa k17+590 lado izquierdo. - Instalación acero de refuerzo y construcción de gradas de nivelación, zapata, espaldar, guardarrueda, muros de acompañamiento y topes sismicos de los estribos 1 y 2 del pontón ubicado en la abscisa k23+450. - Instalación acero de refuerzo y construcción de cunetas desde la abscisa k22+720 al k23+295 lado derecho y del k22+024 al k23+307 lado izquierdo. - Construcción de disipador en descole de alcantarilla ubicada en la abscisa k20+670 lado derecho. - Instalación tubería de 36" de diametro en cuerpo de alcantarilla ubicada en la abscisa k17+590. - Relleno sobre cuerpo de tubería instalada en alcantarilla ubicada en la abscisa k17+590. - Construcción de subdrén desde la abscisa k16+577 al k16+671, del k17+031 al k17+118 lado izquierdo y del k17+624 al k17+764 lado derecho.	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

2.2.1. RECURSOS COMPROMETIDOS

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Recursos iniciales	$2.320´220.350				$2.320´220.350
Recursos adicionales					
Total recursos comprometidos					$2.320´220.350

2.2.2. MANEJO DEL ANTICIPO

ENTIDAD	NACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	OTROS	TOTAL
Anticipo entregado	N/A				
Anticipo amortizado	N/A				
Anticipo sin amortizar	N/A				

2.2.3. BALANCE DE PAGOS		
ACTA DE PAGO No.	**FECHA**	**VALOR ACTA / DESEMBOLSO**
1	23/03/2023	$ 108´100.851
2	23/04/2023	$ 115´479.152
3	23/05/2023	$ 103´367.602
4	23/06/2023	$ 115´618.364
5	08/08/2023	$ 192´221.333
6	23/09/2023	$ 201´966.257
TOTALES		**$ 836´753.559**
VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.320´220.350,00**
2.3. ANOTACIONES ADICIONALES		
N/A		

3. ANEXOS Y OBSERVACIONES

A la fecha del presente informe se cuenta con un plazo transcurrido total de **58,33%,** el contratista presenta un avance ejecutado total del 37,78% en obra física ejecutada, contra un porcentaje de avance programado acumulado del 38,09%.

Actividades de localización y replanteo con un alcance desde la abscisa K12+440 al K23+560; las actividades de explanación de la vía cuentan con un avance desde la abscisa K15+120 al K15+220, del K15+260 al K15+400, del K15+420 al K15+510, del K15+580 al K16+170, del K16+200 al K16+330, del K16+690 al K16+920, del K17+000 al K18+570, del K19+000 al K19+200, del K19+730 al K21+520 y del K21+710 al K23+580.

Construcción de terraplén para mejoramiento de subrasante desde la abscisa K15+120 al K15+220, del K15+260 al K15+400, del K15+420 al K15+510, del K15+580 al K16+170, del K16+200 al K16+330, del K16+690 al K16+920, del K17+000 al K18+570, del K19+000 al K19+200, del K19+730 al K21+520 y del K21+700 al K23+560.

Instalación de subbase granular desde el K19+730 al K21+360 y del K22+130 al K23+500, instalación de base granular desde la abscisa K20+070 al K20+140, del K20+370 al K21+350 y del K22+200 al K23+350.

Instalación de mezcla asfáltica desde la abscisa K22+202 al K23+330 lado derecho y del K22+242 al K23+335 lado izquierdo.

Construcción de **veintitrés (23) alcantarillas** de las cincuenta y seis (56) proyectas.

Construcción zarpa, dentellón y vástago de muros ubicados desde la abscisa K17+588 al K17+623; del K19+607 al K19+620; del K19+632 al K19+645; del K20+244 al K20+285; K20+438 al K20+454; del K20+491 al K20+503; del K20+575 al K20+650 lado derecho; del K20+570 al K20+570 lado derecho; del K20+594 al K20+619 lado izquierdo; del K20+770 al K20+790; del K20+833 al K20+845; del K20+865 al K20+925; del K20+968 al K20+993; del K21+040 al K21+090; del K21+230 al K21+244; del K21+260 al K21+275; del K21+351 al K21+358; del K21+420 al K21+500; del K21+830 al K21+850; del K21+872 al K21+880; del K21+885 al K21+900; del K22+095 al K22+161; del K22+161 al K22+167; del K22+396 al K22+402; del K22+445 al K22+465; del K22+528 al K22+552; del K22+884 al K22+908; del K23+105 al K23+125 y del K23+133 al K23+139.

Construcción de 4650 ml de subdren longitudinal en los tramos requeridos entre las abscisas K16+577 al K16+671, del K17+031 al K17+118, del K17+624 al K17+764, del K18+030 al K18+376, del K19+100 al K19+180, del K19+790 al K21+350 y del K22+135 al K23+455.

Instalación de tubería de 36" de diámetro en cuerpo completo en veintitrés (23) alcantarillas. Construcción de cunetas desde la abscisa K22+720 al K23+295 lado derecho y del K22+024 al K23+307 lado izquierdo.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).





EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES.







TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN.





TERRAPLENES, MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO






SUBBASE GRANULAR (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADO)





BASE GRANULAR (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADO)

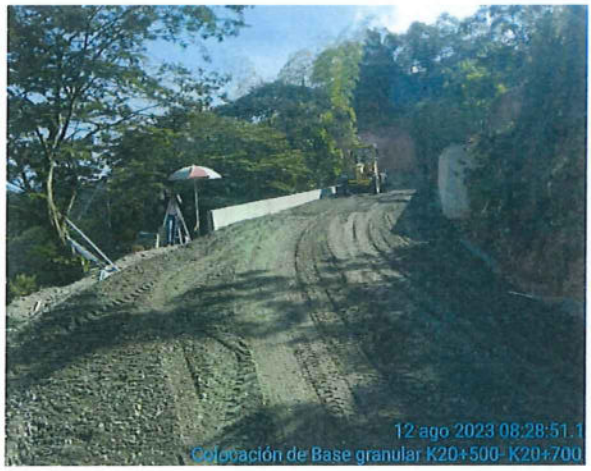



TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR.






RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1





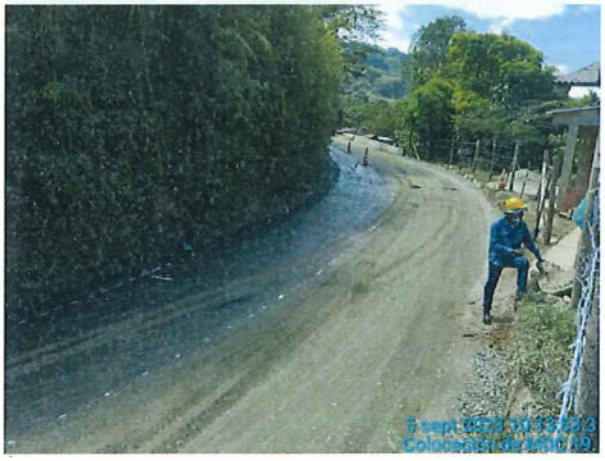




MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19







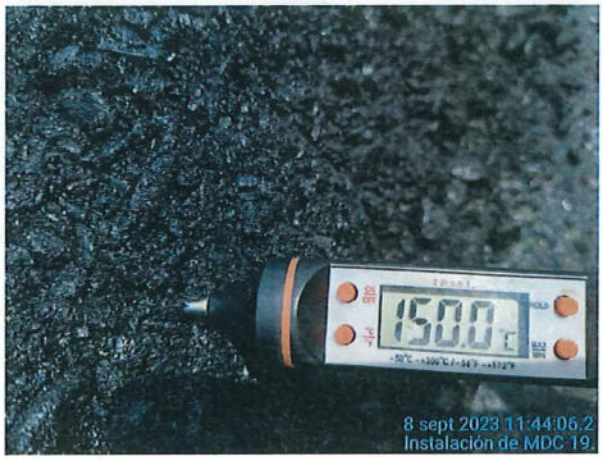

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA









EXCAVACIONES VARIAS PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN SECO.





CONCRETO CLASE C (28 MPa) (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).





CONCRETO CLASE D (21 MPA), CLASE F (14 MPA)- INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.









SUMINISTRO, FIGURADO ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA PARA ALCANTARILLA









TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DIAMETRO INTERIOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).





RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HEMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN).









CUNETA DE CONCRETO CLASE D (21 MPa) VACIADA IN SITU.





SUBDREN PARA VÍA CON GEOTEXTIL – MATERIAL GRANULAR – TUBERÍA REFORZADA.







ANDRÉS ARTURO MEJÍA MADROÑERO
Supervisor

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
ACTA DE RECIBO Nº 06

42 Motivos para avanzar

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO N° 0176-2023	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - R/L RAFAEL VILLAR OSPINA	
SUPERVISOR	ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.320.220.350	Incluido el IVA (19%)
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.320.220.350	Incluido el IVA (19%)
PLAZO TOTAL	13 MESES	

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los VEINITCUATRO (24) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron los Ingenieros: ANDRÉS ARTURO MEJIA M. en su calidad de Supervisor por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca y RAFAEL VILLAR OSPINA en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS, en su calidad de Interventor, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO Nº 06 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	10 DE ENERO DE 2023
PLAZO CONTRACTUAL	13 MESES
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	24 DE FEBRERO DE 2023
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	24 DE MARZO DE 2024

4. VALOR CONSULTORIA CONTRATADA

VALOR CONTRATO Nº 0176-2023	$2.320.220.350,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA	$2.320.220.350,00

5. VALOR INTERVENTORIA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

CANT	DESCRIPCION	FORMA DE PAGO	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	POR CUOTA FIJA 25% VR. CTO INTERVE. (13 CUOTAS MENSUALES)	# CUOTA	# CUOTAS ACUMULADA
			1,5	7,0
		POR PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 60% VR. CONTRATO INTERV,	% AVANCE OBRA MES	% AVANCE OBRA ACUMULADO
			9,70%	37,67%
		PROVISION LIQUIDACIÓN 15% VR. CONTRATO INTERV,	PAGO ACTA. LIQ	PAGO ACTA. LIQ
			0,000%	0,000%

Para constancia se firma por los que intervienen.

ING. RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
Contratista de Interventoria

ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DPTO DEL CAUCA
Supervisor del Contrato

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

PLAZO INICIAL	13 MESES	VR CONTRATO	$ 2.320.220.350
INICIO	24-feb-2023		
TERMINACIÓN	24-mar-2024		
PLAZO TOTAL	13 MESES	VALOR TOTAL	$ 2.320.220.350

CONTRATO N° 0176-2023

ACTA DE PAGO No. 6

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PERIODO DE PAGO: 9 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

42 Motivos para avanzar

SUPERVISOR: ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - REPRESENTANTE LEGAL Ing. RAFAEL VILLAR OSPINA

CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCION DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS DE LA VÍA 25CC24-1 LA BALSA - BUENOS AIRES - HONDURAS - ASNAZÚ, SECTOR BUENOS AIRES - ASNAZÚ, EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	GLOBAL	1,00	$ 2.320.220.350	$ 2.320.220.350

INTERVENTORIA EJECUTADA

FORMA DE PAGO - CONTRATO INICIAL	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	VALOR POR MES o POR ACTA	PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
				MESES	% AVANCE OBRA	VALOR	MESES	% AVANCE OBRA	VALOR
MEDIANTE PAGOS FIJOS MENSUALES	25,0%	$ 487.441.249,0	$ 37.495.481,0	1,50		$ 56.243.221,0	7,00		$ 262.468.367,0
AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	60,0%	$ 1.169.859.000,0			9,70%	$ 113.476.323,0		37,67%	$ 440.685.885,0
AL RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	15,0%	$ 292.464.751,0							
SUBTOTAL COSTO BÁSICO:	**100,0%**	**$ 1.949.765.000,0**			Vr. Básico Acta de Costos	**$ 169.719.544,0**	Vr. Total Básico Costos		**$ 703.154.252,0**
VALOR IVA:	**19,0%**	**$ 370.455.350,0**			Vr. IVA 19%	**$ 32.246.713,0**	Vr. Total IVA 19%		**$ 133.599.307,0**
VALOR TOTAL:		**$ 2.320.220.350,0**			Vr. Presente Acta	**$ 201.966.257,0**	Vr. Total Ejecutado		**$ 836.753.559,0**

RESUMEN CONTRATO DE INTERVENTORIA

ESTADO DEL ANTICIPO :		ESTADO DEL CONTRATO :	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	N.A.	VALOR CONTRATO PRINCIPAL $	2.320.220.350,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	N.A.	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $	-
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	N.A.	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA $	201.966.257,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	N.A.	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA $	836.753.559,00
SALDO POR AMORTIZAR	N.A.	SALDO POR EJECUTAR $	1.483.466.791,00

NOTAS: EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A: *CUOTA FIJA: 1.5 MES (9 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023) * POR AVANCE DE OBRA: 9.7% (AVANCE DE OBRA REPORTADO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

La presente acta no exime al contratista e interventor de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE PAGO $201.966.257,00

DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REGIMEN: COMUN

CONSIGNAR : CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.19200003551 A NOMBRE DE: CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS NIT. 901.666.013-2

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al acta de recibo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

El Supervisor del Departamento ùnicamente certifica que revisò matemàticamente el contenido de este documento

Aprobado para pago:

ING. RAFAEL VILLAR OSPINA
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS
INTERVENTOR

ING. ANDRES ARTURO MEJIA M.
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Vo./Bo.
ING. JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
SECRETARIO DE INFRESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

*Yo, **RAFAEL VILLAR OSPINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.450.678, actuando como Representante Legal del CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS identificado con NIT. 901.666.013-2 (Integrantes IAR PROYECTOS SAS NIT. 900.709.306-8 y PROYECTOS IAR SAS NIT. 900.974.559-9), certifico de acuerdo con las planillas correspondientes, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2023, exigidos por la ley, y que el Consorcio y sus integrantes se encuentran al día por todo concepto relacionado con dichos aportes cuando a ello haya lugar en desarrollo del contrato de Interventoría No. 0176-2023 suscrito con la Gobernación del Cauca.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., en 25 de septiembre de 2023.

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal

C.C. Archivo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	BUENOS AIRES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	14/09/2023	70383210	$8.055.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	600.000	0		0		0	9	6.000	0	606.000	6
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.000	0		0		0	9	700	0	68.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.000	0		0		0	9	3.000	0	303.000	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	56.000	0		0		0	9	600	0	56.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.176.000	0	0	0	0	9	21.500	0	2.197.500	6
231001	Colfondos	800227940-6	272.000	0	0	0	0	9	2.700	0	274.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.648.000	0	0	25.000	25.000	9	16.300	600	1.714.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.782.100				1.782.100	9	17.600	1.799.700			17.821	1.799.700	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.024.000	9	10.100	1.034.100	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.024.000	1.034.300
Pensión	3	4.146.000	4.187.100
Riesgos Laborales	1	1.782.100	1.799.700
CCF	1	1.024.000	1.034.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.976.100	8.055.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	BUENOS AIRES		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	14/09/2023	70383210	$8.055.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10294226	SOLARTE ASTAIZA EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS018	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1061800183	FLOREZ TOBAR CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1080265100	OSPINA CHAVEZ LAURA MARGARITA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
4	CC	11224016	VARGAS PEREZ OSCAR ALFONSO	1	0			S																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	76316526	SANDOVAL LOPEZ JEIMY	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC62	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
6	CC	76320950	ORDOÑEZ GRIJALBA JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	76322879	PERDOMO BENAVIDES GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	91103620	MURCIA CARREÑO JUSTO PASTOR	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	93389742	SOSA CHISCO JUAN MIGUEL	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
10	CC	94366644	GALINDO LOPEZ JAIR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS037	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF14	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS	ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	BUENOS AIRES		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71026105	$7.976.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	600.000	0		0		0	0	0	0	600.000	6
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	300.000	0		0		0	0	0	0	300.000	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.176.000	0	0	0	0	0	0		2.176.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.648.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.698.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.782.100				1.782.100	0	0	1.782.100			17.821	1.782.100	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.024.000	0	0	1.024.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.024.000	1.024.000
Pensión	3	4.146.000	4.146.000
Riesgos Laborales	1	1.782.100	1.782.100
CCF	1	1.024.000	1.024.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.976.100	7.976.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901666013-2	CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS		ED CONEX OF 511 VIA CHIA - CAJICA	3154541593	iarproyectos.servicios@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	BUENOS AIRES	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71026105	$7.976.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Duplicado	RIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	94360644	GALINDO LOPEZ JAIR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS037	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF14	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
2	CC	10294226	SOLARTE ASTAIZA EDGAR ALBERTO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS018	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
3	CC	1061600183	FLOREZ TOBAR CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
4	CC	1060255100	OSPINA CHAVEZ LAURA MARGARITA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	11224916	VARGAS PEREZ OSCAR ALFONSO	1	0			S																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF14	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	76320960	ORDOÑEZ GRIJALBA JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF14	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	76322870	PERDOMO BENAVIDES GUSTAVO ADOLFO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	93389742	SOSA CHISCO JUAN MIGUEL	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	5	194.900	CCF14	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
9	CC	78316526	SANDOVAL LOPEZ JEIMY	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC62	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	91103520	MURCIA CARREÑO JUSTO PASTOR	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF14	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

IAR PROYECTOS SAS

Certificación – 006

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, CAROLINA ÁLVAREZ OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713.914, actuando como Representante Legal de IAR PROYECTOS S.A.S y ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO identificado con C.C. No. 79.314.459. de Bogotá y T.P. No. 18011-T, certificamos que la empresa IAR PROYECTOS SAS identificado con NIT. No. 900.709.306-8 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (art. 50 de la ley 789 de 2002) y aportes a las cajas de compensación familiar, durante los meses de agosto y septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria) y el decreto 1828 de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los once (25) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. No. 18011-T

CAROLINA ÁLVAREZ OSPINA
C.C. No. 52.713.914 de Bogotá
Representante Legal

C.C. Archivo

NO SIRVE COMO DOCUMENTO PARA IDENTIFICACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79314459

JARAMILLO BUITRAGO
APELLIDOS

JESUS ESTEBAN
NOMBRES

FIRMA







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1963
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500103-42098135-M-0079314459-20020226 0681102056A 02 111066340

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



18011-T

JESUS ESTEBAN
JARAMILLO BUITRAGO
C.C. 79314459
RESOLUCION INSCRIPCION 1331 FECHA 04/06/87
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE ELGA INES SANCHEZ CORTES 25545

27 ABR 2010
LILIANA OSSA COLIMA

IDEQS

000517

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E511F4937682A75

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ESTEBAN JARAMILLO BUITRAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79314459 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 18011-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS	CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	70383115	$6.353.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	840.000	0		0		0	8	7.400	0	847.400	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.000	0		0		0	8	500	0	48.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	30.000	30.000	8	10.100	600	1.222.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.680.000	0	0	42.500	42.500	8	14.800	800	1.780.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.545.200				1.545.200	8	13.600	1.558.800			15.452	1.558.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	48.000	8	500	48.500	1
CCF21	Cafam	860013570-3	840.000	8	7.400	847.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	888.000	895.900
Pensión	2	2.977.000	3.003.300
Riesgos Laborales	1	1.545.200	1.558.800
CCF	2	888.000	895.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.298.200	6.353.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS		CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	70383115	$6.353.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	38164386	OSPINA DE ALVAREZ BERTHA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF21	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
2	CC	52712914	ALVAREZ OSPINA CAROLINA	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF21	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
3	CC	60380952	ALVAREZ OSPINA DIANA MARCELA	1	0			S																	28-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	60037941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	1	0			S																	28-14	8.500.000	1.360.000	0	0	42.500	42.500	EPS001	8.500.000	340.000	14-4	8.500.000	5	591.600	CCF21	8.500.000	340.000	0	0	0	0	0
5	CC	9976864	GIRALDO GALVIS JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF11	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS	CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71024781	$6.298.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	840.000	0		0		0	0	0	0	840.000	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.152.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.212.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.680.000	0	0	42.500	42.500	0	0		1.765.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.545.200				1.545.200	0	0	1.545.200			15.452	1.545.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	48.000	0	0	48.000	1
CCF21	Cafam	860013570-3	840.000	0	0	840.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	888.000	888.000
Pensión	2	2.977.000	2.977.000
Riesgos Laborales	1	1.545.200	1.545.200
CCF	2	888.000	888.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.298.200	6.298.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS		CRA 46 # 22 B 20 OFICINA 507	3145384	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71024781	$6.298.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	RED	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporta ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	38164388	OSPINA DE ALVAREZ BERTHA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF21	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
2	CC	80037941	VILLAR OSPINA RAFAEL ALFREDO	1	0			S																	25-14	8.500.000	1.360.000	0	0	42.500	42.500	EPS001	8.500.000	340.000	14-4	8.500.000	5	591.600	CCF21	8.500.000	340.000	0	0	0	0	0
3	CC	9976864	GIRALDO GALVIS JULIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF11	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	52713914	ALVAREZ OSPINA CAROLINA	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF21	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
5	CC	60380952	ALVAREZ OSPINA DIANA MARCELA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PROYECTOS IAR SAS

Certificación – 006

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, RAFAEL VILLAR OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.037.941 expedida en Bogotá D.C., actuando como Representante Legal Suplente, certifico que la empresa PROYECTOS IAR SAS identificada con NIT. No. 900.974.559-9, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales ARL (art. 50 de la ley 789 de 2002) y aportes a las cajas de compensación familiar, durante los meses de agosto y septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma tributaria) y el decreto 1828 de 2013.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

RAFAEL VILLAR OSPINA
Representante Legal Suplente

C.C. Archivo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS	CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	70383135	$5.925.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	553.600	0		0		0	0	0	0	553.600	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.000	0		0		0	0	0	0	136.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.974.200	0	0	0	0	0	0		1.974.200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.088.000	0	0	0	0	0	0		1.088.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.332.300				1.332.300	0	0	1.332.300			13.323	1.332.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	765.600	0	0	765.600	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	765.600	765.600
Pensión	2	3.062.200	3.062.200
Riesgos Laborales	1	1.332.300	1.332.300
CCF	1	765.600	765.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	5.925.700	5.925.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS	CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	12/09/2023	70383135	$5.925.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014238859	HERRERA GAONA NATALIA	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF14	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	1061710362	VALDES CHECA CLAUDIA MERCEDES	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
3	CC	1061721010	DIAZ ZUÑIGA JAIR ANTONIO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF14	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061746224	CHAVEZ FLOREZ CARLOS ALFREDO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061866223	RINCON RUIZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF14	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
6	CC	1061812172	GARCES ALEGRIA LADY DAHIANNA	1	0			S		X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF14	38.667	1.600	0	0	0	0	0
7	CC	1113311186	SEGURA LONDOÑO VALENTINA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	34317822	GARCIA LOPEZ ANA MARIA	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF14	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
9	CC	78305823	ORTEGA IBARRA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF14	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS	CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71205369	$4.477.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	497.900	0		0		0	0	0	0	497.900	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.600	0		0		0	0	0	0	4.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.225.700	0	0	0	0	0	0		1.225.700	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.088.000	0	0	0	0	0	0		1.088.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.006.700				1.006.700	0	0	1.006.700			10.067	1.006.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	578.500	0	0	578.500	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	578.500	578.500
Pensión	2	2.313.700	2.313.700
Riesgos Laborales	1	1.006.700	1.006.700
CCF	1	578.500	578.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.477.400	4.477.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900974559-9	PROYECTOS IAR SAS	CARRERA 46 No. 22B - 20 OFICINA 507	3154541593	rafaelvillarospina@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	28/09/2023	71205369	$4.477.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014236859	HERRERA GAONA NATALIA	1	0			S		X															25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.500	CCF14	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	1061746224	CHAVEZ FLOREZ CARLOS ALFREDO	1	0			S		X															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
3	CC	1113311186	SEGURA LONDOÑO VALENTINA	1	0			S		X															25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF14	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061805223	RINCON RUIZ FRANCISCO JAVIER	1	0			S		X															25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF14	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061710362	VALDES CHECA CLAUDIA MERCEDES	1	0			S		X															230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS005	46.667	1.900	14-4	46.667	5	3.300	CCF14	46.667	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1061721010	DIAZ ZUÑIGA JAIR ANTONIO	1	0			S		X															230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS037	66.667	2.700	14-4	66.667	5	4.700	CCF14	66.667	2.700	0	0	0	0	0
7	CC	34317522	GARCIA LOPEZ ANA MARIA	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF14	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
8	CC	78306523	ORTEGA IBARRA LUIS FERNANDO	1	0			S		X															230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS037	46.667	1.900	14-4	46.667	5	3.300	CCF14	46.667	1.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
