	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Consultor y el Supervisor del contrato de consultoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1588-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PÍNILLOS-CALENDARIA-LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

CONTRATO DE OBRA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Grupo Artinco SAS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: 2 meses
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/09/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 82,326,580.00 **50% EN SMMLV:** $ 35.49
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 82,326,580.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Desde los procesos de licitación IP-SEP-SPI-004-2023 y IP-SEP-SPI-005-2023 nacen los contratos 1703 DE 2023 cuyo objeto es ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN CON DRONE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PINILLOS – CANDELARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y 1588 de 2023 cuyo objeto es ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR siendo este último el que se tratará en la presente solicitud. Los dos contratos anteriormente nombrados tienen las actividades a ejecutar en el corredor Pinillos – Calendaria – Las Boquillas.Y para un correcto desarrollo de las mismas el Estudio De Levantamiento Topográfico y Georreferenciación (CTO 1703-23) debía entregar un insumo preliminar de sus actividades al Estudio para Caracterización y Análisis De Suelos (CTO 1588-23). Dicho compromiso fue cumplido en la reunion de 25 de agosto de 2023 por lo cual el Estudio para Caracterización y Análisis De Suelos (CTO 1588-23) da incio a sus actividades de campo el día 28 de agosto de 2023. Una vez iniciadas las actividades de campo el contratista expresa que presentado dificultades para accesibilidad en el trazado indicado además que existen o tramos muy cenagosos, lo que ha dificultado la logística de transporte obligando a realizar recorridos muy largos a pie con los equipos de exploración.

Por lo anterior y mediante comunicación escrita No. ARTINCO-CA1588-2023_02 DE FECHA12 de septiembre de 2023 la consultoría solicita lo siguiente: "… 25 de agosto de 2023 (Reunión virtual): Se realizó una cuarta reunión en la cual, y de acuerdo con el nuevo trazado se presentas los puntos de control compartidos por la consultoría encargada del levantamiento topográfico, la presente consultoría se proyectó para dar inicio a las labores en campo desde el día 28 de agosto de 2023 en el municipio de Pinillos, Bolívar. Se hace necesario mencionar que, durante el desarrollo de las actividades acordes al trazado presentado, si bien presenta zonas con cierto nivel de accesibilidad, existen otros tramos muy cenagosos, lo que ha dificultado la logística de transporte obligando a realizar recorridos muy largos a pie con los equipos de exploración lo que ha reducido significativamente los rendimientos inicialmente proyectado.En este orden de ideas y teniendo en cuenta las circunstancias presentadas que han significado un retraso para el inicio de las actividades, así como las condiciones de accesibilidad, geográficas y topográficas que han dificultado la logística y movilización de personal y equipos, Se solicita una prórroga por 45 días calendario que representa una ampliación del plazo hasta el día 15 de noviembre de 2023 con el fin de cumplir con los trabajos de campo, la realización de los ensayos y presentación de los informes requeridos, aplicables para la carta de aceptación 1588-2023 cuyo objeto es "Estudio para caracterización y análisis de suelos de la vía Pinillos-Calendaría-Las Boquillas del municipio de Mompox, departamento de Bolívar". Es de anotar que dicha ampliación NO implica costos, ni gastos adicionales a los ya establecidos..."

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)
Solicitud de prorroga por 45 días

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las actividades contractuales atrasadas para el cumplimiento del objeto del contrato

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ - Último mes facturado: N.A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 82,326,580.00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto trámite de multas o sanciones
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Expuesto lo anterior el supervisor de CTO 1588 da aval a la presente solicitud de prórroga por 45 dias, hasta el 15 de noviembre de 2023, por ser ciertas las causas expuestas en la solicitud del Consultor. Esta prórroga no implica adición presupuestal.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	13/09/2023 (Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: Oscar Mauricio García Galeano
Representante Legal o Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No. 05702004812 ANT

Firma
Nombre: Nelson Eduardo Romero Hernández
Supervisor del Contrato de Consultoría
INVIAS Territorial Bolívar
Matrícula Profesional No. 15219-21989 BYC

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolívar

Vo.Bo.Firma
Nombre: Angelica Patricia Barrera Peñaloza
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: Julian Andres Manjarrez Urbina
Abogado Unidad Ejecutora

Firma
Firmado digitalmente por SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 01113-10666 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Medellín, 12 de septiembre de 2023 **ARTINCO-CA1588-2023_02**

Señor (es)
Ing. Nelson Eduardo Romero Hernández
Supervisor del contrato
Dirección Territorial Bolívar
INVIAS

ASUNTO: Solicitud de prorroga Oficio N°2 Carta de aceptación 1588-2023.

REFERENCIA: Carta de aceptación 1588-2023 con objeto "ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PÍNILLOS-CALENDARIA-LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

Cordial Saludo.

De acuerdo al comunicado SPI 44479 de aceptación de la oferta No. 1588 de 2023 cuyo asunto es "ORDEN DE INICIO – CARTA DE ACEPTACIÓN 1588 – 2023 - ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" del 01 de agosto de 2023 y donde se expresa "*Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la carta de aceptación 1588 de 2023 que tiene por objeto "ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR", le informo que a partir del primero (01) de Agosto de 2023, se imparte la orden de inicio para la ejecución de la citada carta de aceptación", i*nformación que fue recibida vía correo electrónico el día 04 de agosto de 2023, dándose de esta manera una serie de reuniones como se citan a continuación:

1. **8 de agosto de 2023 (Acta de Reunión 1 -1588-23):** Se realizó la reunión de inicio en la que se revisaron los puntos de la invitación publica, alcances y documentación a entregar para la legalización del contrato; a su vez se indicó el trazado inicial, el cual fue tomado de los estudios realizados por la gobernación y cuyo objeto fue "*Mejoramiento de concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Pinillos al Municipio de Mompox, del departamento de Bolívar."* Con dicha información la consultoría definió el número de ensayos y localización sobre la proyección del trazado realizado en Google Earth Pro.

2. **14 de agosto de 2023 (Reunión virtual):** En esta reunión se presenta por parte del consultor algunas dudas que se presentan referentes al trazado, los cruces de los ríos y quebradas en relación con los tipos y cantidades de ensayos proyectados para el proyecto. La supervisión presenta un nuevo trazado acorde con los alcances del contrato propuesta "VÍA PINILLOS – CANDELARIA – LAS BOQUILLAS", para lo que la consultoría presenta un nuevo plan de trabajo mediante oficio N°1 "ARTINCO-CA1588-2023_Cronograma_1" con la programación de las exploraciones directas en el sitio de trabajo según el nuevo trazado.

3. **18 de agosto de 2023 (Acta de Reunión 2 -1588-23 y 1703-23):** Para esta reunión, se contó con la asistencia del contratista encargado de la realización de los estudios topográficos, en ella se definió el nuevo trazado como se indica en el objeto de la propuesta que surge de la integración de la información secundaria con la que se cuenta inicialmente en los estudios realizados por la gobernación cuyo objeto fue el "*Mejoramiento de concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Pinillos al Municipio de Mompox, del departamento de Bolívar"* y los carreteables que se pueden observar en los visores de Google Earth Pro.



Figura 1. Trazado inicial Mompox – Pinillos Contrato de consultoría 1588-23.

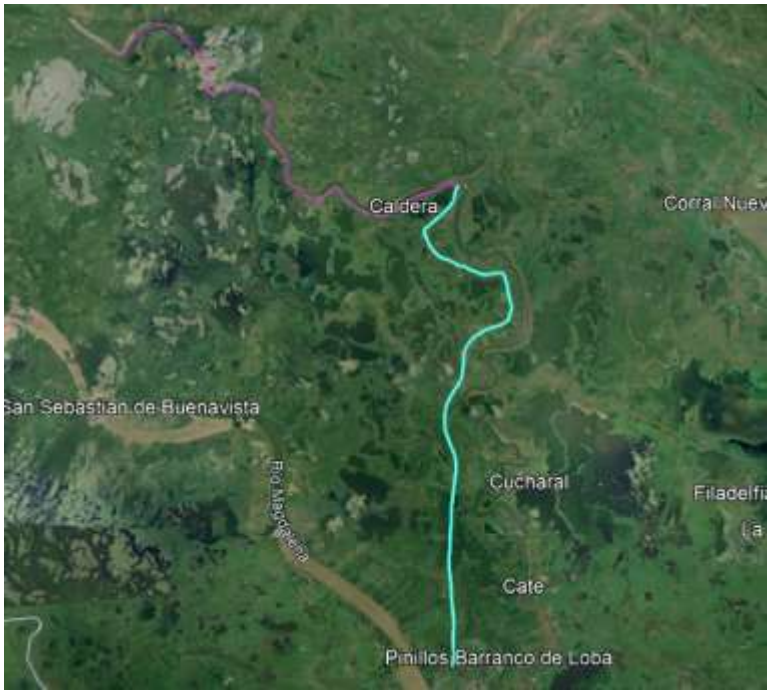


Figura 2. Trazado a desarrollar Via Pinillos – Candelaria – Las Boquillas contratos de consultoría 1588-23 y 1703-23.

El consultor de la topografía (contrato 1703-23) plantea como fecha inició de los trabajos el día 22-08-2023, y estaría entregando el día 25/08/2023 un primer reporte con los puntos de control que se hayan tomado hasta la fecha, con esta información nuestra consultoría (contrato 1588-23) podrá iniciar trabajos de campo alineado con el trazado que se plantea en campo.

4. 25 de agosto de 2023 (Reunión virtual): Se realizó una cuarta reunión en la cual, y de acuerdo con el nuevo trazado se presentas los puntos de control compartidos por la consultoría encargada del levantamiento topográfico, la presente consultoría se proyectó para dar inicio a las labores en campo desde el día 28 de agosto de 2023 en el municipio de Pinillos, Bolívar.

Se hace necesario mencionar que, durante el desarrollo de las actividades acordes al trazado presentado, si bien presenta zonas con cierto nivel de accesibilidad, existen otros tramos muy cenagosos, lo que ha dificultado la logística de transporte obligando a realizar recorridos muy largos a pie con los equipos de exploración lo que ha reducido significativamente los rendimientos inicialmente proyectados.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta las circunstancias presentadas que han significado un retraso para el inicio de las actividades, así como las condiciones de accesibilidad, geográficas y topográficas que han dificultado la logística y movilización de personal y equipos, Se solicita una prórroga por 45 días calendario que representa una ampliación del plazo hasta el día 15 de noviembre de 2023 con el fin de cumplir con los trabajos de campo, la realización de los ensayos y presentación de los informes requeridos, aplicables para la carta de aceptación 1588-2023 cuyo objeto es “Estudio para caracterización y análisis de suelos de la vía Pinillos-Calendaría-Las Boquillas del municipio de Mompox, departamento de Bolívar”. Es de anotar que dicha ampliación NO implica costos, ni gastos adicionales a los ya establecidos.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO GARCIA
Representante Legal
GRUPO ARTINCO S.A.S

DANIEL ALEJANDRO BRAVO
Coordinador de estructuras y geotecnia
GRUPO ARTINCO.S.A.

1. Acta de Reunión 1 -1588-23 del 08 de agosto de 2023

	Instituto Nacional de Vías **PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
1	08	08	2023	03:00	03:30

Tema(s) a Tratar	Reunión inicial del Carta de aceptación 1588 de 2023 "ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"
Convocada por:	INVIAS

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
CONSULTOR	GRUPO ARTINCO S.A.S
GESTOR	INVIAS – PLANTA CENTRAL
SUPERVISOR	INVIAS – DT BOLIVAR

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1	Reunión inicial	Se revisan los puntos de la invitación publica, alcance y documentación a entregar.
2	Entrega de documentación inicial	Se solicita al consultor la entrega de la entrega del cronograma y pólizas actualizadas a la fecha de orden de inicio.
3	Definición del trazado	Se indica que el trazado es el entregado en los estudios realizados por la gobernación, cuyo objeto es "Mejoramiento de concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Pinillos al Municipio de Mompox, del departamento de Bolívar."

No	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Entrega de pólizas y cronograma	GRUPO ARTINCO S.A.S	10/08/2023


	Instituto Nacional de Vías **PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
1	08	08	2023	03:00	03:30

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

NOMBRE	FIRMA
ANGELICA PATRICIA BARRERA	
NELSON EDUARDO ROMERO	
DANIEL BRAVO HERNÁNDEZ	
OSCAR MAURICIO GARCIA	
JONATHAN MUÑOZ RUEDA	

2. Citación a reunión para el día 14 de agosto de 2023

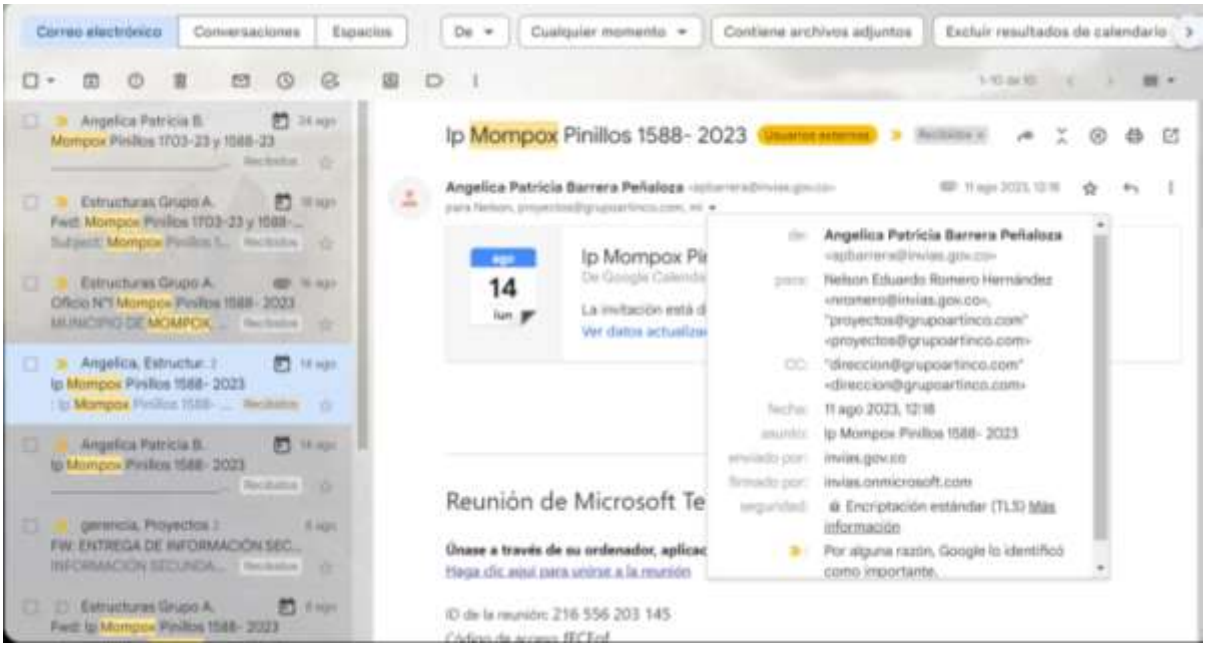

3. Acta de Reunión 2 -1588-23 y 1703-23 del 18 de agosto de 2023

	Instituto Nacional de Vías **PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	ABIENS-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
3	18	08	2023	12:00	12:30

Tema(s) a Tratar	Reunión seguimiento Carta de aceptación 1588 de 2023 **"ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"** y Carta de aceptación **1703 de 2023 "ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN CON DRONE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PINILLOS – CANDELARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".**
Convocada por:	INVIAS

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
CONSULTOR	GRUPO ARTINCO S.A.S
CONSULTOR	BRAIN INGENIERA VIAL S.A.S
SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCURA	INVIAS – PLANTA CENTRAL
GESTOR	INVIAS – PLANTA CENTRAL
SUPERVISOR	INVIAS – DT BOLIVAR

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1	Definición inicios de trabajo	Teniendo en cuenta el objeto de las cartas de aceptación: **-1588 de 2023** "ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" **-1703 de 2023** "ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN CON DRONE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PINILLOS

		– CANDELARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" En los cuales se indica la VÍA PINILLOS – CANDELARIA – LAS BOQUILLAS se presenta el siguiente y trazado el cual surge de la integración de la información secundaria con la que se cuenta (estudios realizados por la gobernación cuyo objeto es "Mejoramiento de concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Pinillos al Municipio de Mompox, del departamento de Bolívar." Y los carreteables que se pueden observar en los visores de google. A continuación, se presenta un esquema donde se pude observar la continuidad del trazado PINILLOS – CANDELARIA – LAS BOQUILLAS:  Figura 1. Trazado a desarrollar para el alcance de las cartas de aceptación 1588-23 y 1703-23.


		Es importante mencionar que el presente trazado busca dar alternativas a la posible conexión Mompox - Pinillos, y el cual servirá de insumo para un proceso futuro de análisis de alternativas del corredor mencionado.
2.	Definición inicios de trabajo	El consultor de la topografía (1703-23) inicia trabajos el día 22-08-2023, y entregara el día 25/08/2023 un reporte de los puntos de control que se hayan tomado hasta la fecha. Con este documento el consultor de la determinación de suelos (1588-23) podrá iniciar trabajos de campo alineado con el trazado que se rectifique en campo.
No	**NUEVAS TAREAS**	**RESPONSABLE** / **FECHA DE CUMPLIMIENTO**
1	Reunión de seguimiento	INVIAS / 25/08/2023

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

NOMBRE	FIRMA
FERNANDO PRIETO	
DANIEL BRAVO	
JHONATAN MUNOZ	
MAURICIO GARCIA	
NELSON EDUARDO ROMERO	
ANGELICA PATRICIA BARRERA	
SIRLEY DABEIBA MERCHAN	

Grupo Artinco S.A.S.
PBX: (604) 2668100
Cra 43ª No 1 Sur – 31 Oficina 205
Edificio BBVA el Poblado P.H.
Medellín - Colombia

4. Citación a reunión para el día 25 de agosto de 2023

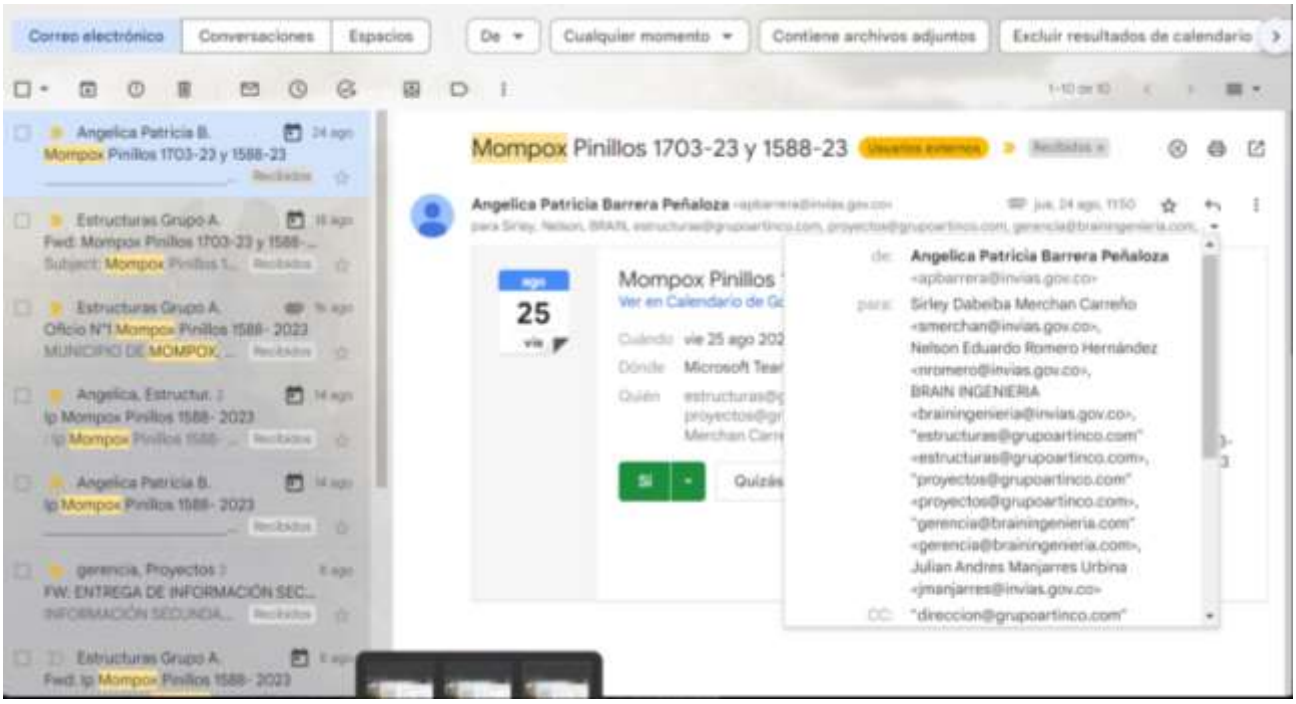

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1588 DE 2023 **CONTRATISTA:** Grupo Artinco SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
"ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PÍNILLOS-CALENDARIA-LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL: 2 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 82,326,580.00
VALOR ACUMULADO: $ 82,326,580.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTOR:** N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 8,232,658.00	1	8	2023	2	4	2024
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 8,232,658.00	1	8	2023	2	4	2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$ 8,232,658.00	1	8	2023	1	10	2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20%	$ 16,465,316.00	1	8	2023	1	10	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101222139
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre :Oscar Mauricio García Galeano
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05702004812 ANT

Firma
Nombre :Nelson Eduardo Romero Hernández
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No. 15219-21989 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DELOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de losproyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1703 de 2023

Objeto: ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 13 días del mes de septiembre de 2023

Nombre: Angélica Patricia Barrera Peñaloza
Gestora de Proyecto
Subdirección Planificación de Infraestructura
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

Avance Total | Vigencia | Rango Fechas

20113

Seleccion de Objetos

ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VIA PINILLOS | CALENDARIA | LAS BOQUILLAS D

20113 | Consecutivo

Supervisor	MARIA CECILIA ALSINA F
Codigo BPIN	2018011001003
Imputacion	2499-0600-0022
Departamento	BOLIVAR
Sector	.
Contrato	No hay Contrato
Total Programado	115.900.000,00
Comentarios	Ver/Agregar Comentario

Alerta: seleccion vigencia.. | 13/09/2023 | 13/09/2023

Programado | Ejecutado

Programado | ejecutado | Alertas | Control Reserva

Recurso	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	INFORMES
2023	RECURSOS 2	SAT	11/04/2023	31/12/2023	115.900.000,00		1,00

Anticipo Programado 0,00

Anticipo Amortizado 0,00

Agregar | Eliminar | Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en Cronograma 115.900.000

-115.900.000

Nacional de Vías - INVIAS

ción Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación

CSRODRIGUE

13-09-2

rden/Contrato

n/Contrato

mero Interno 67939 Etapa EJECUCION

idad 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Unid.Gestor Proy 2312 SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INF

mero contrato 1588 / 2023 * Suscr. el 24/05/2023 Unid.Gesto.Contr PLANTA CENTRAL

o Contratación CONTRATO Clase contrato ESTUDIOS Y DISEÑOS

p.Destino 2312 SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE INFR Origen Contrat. SELECCION ABREVIADA

dad Ejecución BOGOTA_D.C (BOGOTA D.C.) Modalidad

Formalidades Plenas Tipo Proyecto N OTROS

mentos/Servicio Ref VIAI Origen Cnt Historial de la Modificar contr

Contratista | Objeto | Plazos | Ppto. | Garantía | Supervisión | Preámbulo | Obligación | Cláusulas | Anexo

Razón Social: GRUPO ARTINCO S.A.S. 26944

Identificación: NIT 900492777 9 Tipo persona: PERSONA NATURAL

Teléfono(s): 604-4238208 Fax:

Dirección: CARRERA 43A N°1SUR-31 OFICINA 205 EDIFICIO BBVA

Rep. Legal: OSCAR MAURICIO GARCIA GALEANO

Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:

Ver.2014 Clasificación Contratista Datos Contratista y/o Concor... Cuentas Bancarias
