GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**	Código: FO-M7-P6-008 Versión: 01 Fecha de aprobación:01 de febrero de 2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	23IA113B1149	
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/06/2023	
OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS CORREGIMIENTOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CD113B0423		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. GEN+	
		NIT	900.251.423-3	
VALOR [$]:		INICIAL	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($3.822.880.542)	
		ACTUAL (CON ADICIONES)	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L ($3.822.880.542)	
PLAZO:		INICIAL	CUATRO (4) MESES	
			INICIO	26/06/2023
			TERMINACIÓN INICIAL	26/10/2023
		PRÓRROGAS	N/A	
		SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:			26/10/2023	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.04	09/10/2023

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado con sus respectivos anexos.

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No.1					
TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO	**X**	CLÁUSULA	**X**
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		
SOLICITUD	Prórroga al contrato interadministrativo de mandato sin representación No. 4600014903 por un (1) MES y diecinueve (19) días, para una nueva fecha de terminación del 15 de diciembre de 2023.				

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El proyecto contempla tres etapas para su ejecución a saber, plan de trabajo, diagnósticos, diseños y modernización. Es teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con un avance del 73,82% discriminado en 30% del plan de trabajo, 30% del 100% de los diagnósticos de los corregimientos que no presentaron hallazgos por la interventoría y avance del 13,82% en instalación de la

modernización en 12 corregimientos.

En la ejecución del contrato se encontró que en 5 corregimientos o ya se había adelantado procesos de modernización o en su defecto se había realizado concesiones del sistema de alumbrado público. Es así como desde Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. GEN+ con aval de la interventoría se solicitó aprobación al mandante para modificar estos corregimientos, lo que fue aprobado.

Estos corregimientos incluidos en el proyecto ya cuentan con la etapa de plan de trabajo y diagnósticos, pero se hace necesario contar con un (1) mes y diecinueve (19) días más para poder realizar los diseños y que los mismos sean aprobados por la interventoría y por el mandante para poder modernizarlos toda vez que forman parte del objeto contractual.

Por lo anterior, se hace necesaria la prórroga del convenio por un término de un (1) MES y diecinueve (19) días atendiendo al plazo de ejecución del contrato derivado más el término para poder liquidar


4. ANEXOS

- Lista de chequeo de prorroga
- Solicitud del asociado para la modificación al convenio.
- Informe de seguimiento a la contratación No.04 del 09/10/2023
- Constancia de consultas: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación,
- Policía Nacional de Colombia
- Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del asociado.

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	N/A
TIPO DE AMPARO	**OBSERVACION**

Para constancia, se firma la presente justificación el 09/10/2023



JULIO ORLANDO CASTRO GUAMÁN
Supervisor

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

2023030445011

Medellín, 10/10/2023

Doctor
JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
GENMAS S.A. E.S.P
jsuaza@genmas.com.co

ASUNTO: Aprobación a solicitud de otrosí para ampliación de tiempo, del contrato interadministrativo número 23IA113B1149.

Cordial saludo,

La Gerencia de Servicios Públicos – Dirección de Electrificación, después de analizar las razones expuestas en la solicitud de prórroga, aprueba la solicitud ampliación de tiempo, del contrato interadministrativo número 23IA113B1149, lo anterior para que continúe con el proceso de aprobación, Comité Interno de Contratación y el Comité de Orientación y Evaluación de la Gobernación de Antioquia.

JULIO ORLANDO CASTRO GUAMÁN
Director de Electrificación
Gerencia de Servicios Públicos

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Alonso Maya Castillo Profesional Universitario		**10/10/2023**
Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Envigado, 05 de Octubre de 2023

170-0683-2023
OF_010


Empresa de Generación y Promoc
de Energía de Antioquia S.A. E.S

Señor:
Julio Castro Guamán
Dirección de electrificación.
Gerencia de Servicios Públicos.
julio.castro@antioquia.gov.co

Asunto: Otrosí para ampliación de tiempo, del contrato interadministrativo número 23IA113B1149.

En relación al contrato interadministrativo del asunto, celebrado entre el departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos y la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. GEN+, se tienen que:

A la fecha se acumula un avance contractual del 73,82% representado de la siguiente forma.

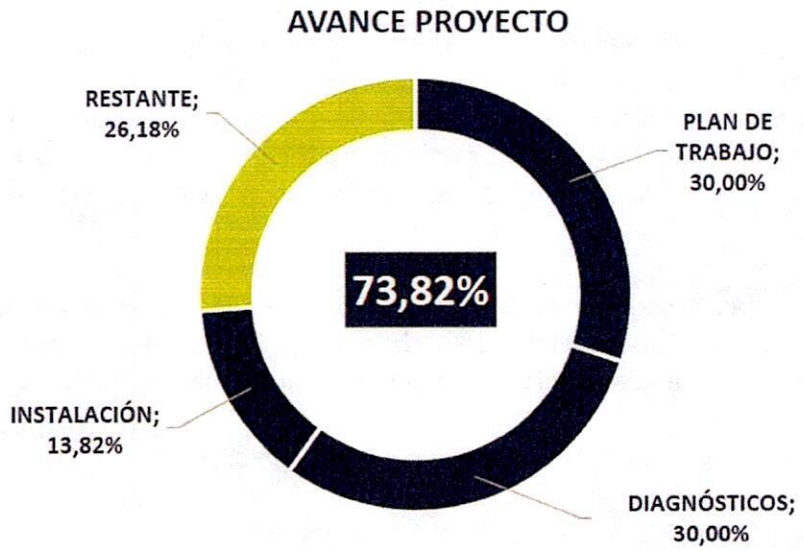

Es de anotar que previo a la modernización, y como se describe en el presente contrato interadministrativo, se deben surtir las etapas de diagnóstico y diseño para luego dar paso a las modernizaciones.
A la fecha se han diagnosticado todos los corregimientos hábiles que no presentaron hallazgos por la interventoría.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Así mismo se han modernizado los siguientes corregimientos, según la numeración del presente contrato.

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS	ESTADO_MODERNIZACIÓN
1	Occidente	Frontino	Nutibara	TERMINADO
3	Suroeste	Betania	La Libia	TERMINADO
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	TERMINADO
7	Norte	Belmira	Labores	TERMINADO
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	TERMINADO
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	TERMINADO
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	TERMINADO
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	TERMINADO
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	TERMINADO
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	TERMINADO
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	TERMINADO
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	TERMINADO

Es de anotar que durante la etapa de diagnóstico, se evidencio que algunos municipios adelantaron actividades de modernización sobre los corregimientos objeto del presente contrato, o en su defecto realizaron concesiones del sistema de alumbrado público.

Dichos hallazgos fueron validados por la interventoría, así como por la supervisión de GEN+, estos soportes se anexaron con el oficio OF_008_170-0677-2023_Inclusión_Corregimientos, incluyendo contratos y demás soportes documentales que dan cuenta de las novedades en dichos corregimientos. Adicionalmente se procedió con la comunicación a las administraciones municipales para solicitar mayor información del estado actual.

Producto de estas comunicaciones, se solicitó al mandante la autorización para la modificación en la priorización de los corregimientos, del presente contrato interadministrativo, esta autorización fue otorgada el día 28 se septiembre de 2023.

Con este oficio se relaciona el historial de comunicaciones:

- FL_007_Oficio_No_Modernización_Corregimientos
- OF_001_Oficio_Evaluación_Modernización
- OF_005_170_0660_2023_Inclusión_Corregimientos
- OF_008_170-0677-2023_Inclusión_Corregimientos
- OF_009_0680-2023_Justificación_Corregimientos

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Los puntos expuestos anteriormente han contribuido a retrasos en el cronograma, en tanto no ha sido posible proceder con los debidos diagnósticos, por ende tampoco realizar los diseños y modernización para estos cinco (5) corregimientos,

Con el fin de surtir las etapas descritas en el contrato Diseños y Modernización, se presenta el cronograma para la intervención de los 5 corregimientos restantes, este documento se anexa con este oficio.

- 2. 20231004_Cronograma_22_Corregimientos_V2

Dicho cronograma presenta las actividades con fecha de finalización de diciembre 15 de 2023, se considera que las actividades concernientes a la ejecución de estos cinco (5) corregimientos, se inician desde la fecha de la presente solicitud, toda vez que forman parte del objeto contractual y con el fin de aprovechar el tiempo restante al máximo.

Las actividades objeto de la presente solicitud de prórroga se evidencian a partir de la EDT 1.4.2 denominada GRUPO 2 del cronograma anexo.

1.4.2	**GRUPO 2**	**47,5 días**	**mar 3/10/23**	**mié 13/12/23**
1.4.2.1	**Tapartó - Municipio de Andes (205)**	**24,5 días**	**mar 3/10/23**	**mié 8/11/23**
1.4.2.2	**El Salto - Municipio de Gómez Plata (188)**	**29,5 días**	**vie 6/10/23**	**mar 21/11/23**
1.4.2.3	**Horizontes - Municipio de Sopetrán (26)**	**29,5 días**	**mié 11/10/23**	**vie 24/11/23**
1.4.2.4	**El Oro - Municipio de Sabanalarga (38)**	**30,5 días**	**vie 13/10/23**	**mié 29/11/23**
1.4.2.5	**Ambalema - Municipio de Uramita (10)**	**31,5 días**	**mié 18/10/23**	**lun 4/12/23**
1.4.2.6	**Corregimiento - Municipio (Pendiente por confirmar 153)**	**35,5 días**	**vie 20/10/23**	**mié 13/12/23**
1.5	**Documentación ejecución**	**60 días**	**vie 15/09/23**	**mié 13/12/23**
1.5.1	Actualización diseños, planos y documentación de las actividades desarrolladas	60 días	vie 15/09/23	mié 13/12/23
1.5.2	Generación de insumos para actualización de Aforos	60 días	vie 15/09/23	mié 13/12/23
1.5.3	**BOLSA DE RECURSOS**	**30 días**	**lun 30/10/23**	**mié 13/12/23**
1.5.3.1	Ejecución de la bolsa	30 días	lun 30/10/23	mié 13/12/23
1.6	**Cierre del Proyecto**	**33 días**	**vie 27/10/23**	**vie 15/12/23**
1.6.1	Liquidación y entrega Grupo 1	1 día	vie 27/10/23	vie 27/10/23
1.6.2	Liquidación y entrega Grupo 2	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23

Ilustración 1. Resumen de cronograma de trabajo.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Km 17 vía Las Palmas – Parque Tecnológico Manantiales
Finca el Eugenio
Teléfono (574) 322 9910 | Envigado – Colombia
www.genmas.com.co

Por lo anteriormente expuesto se solicita la ampliación de tiempo según cronograma anexo, al **15 de diciembre de 2023** con fin de dar término al alcance del presente contrato.
Quedamos atentos a su evaluación y respuesta al respecto de las aprobaciones solicitadas

Cordialmente,

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
GENMAS S.A. E.S.P.

CARLOS JOSE ARANGO VANEGAS
Abogado
GENMAS S.A. E.S.P.

Proyectó: **DIEGO HERNÁNDEZ MEJÍA**
Supervisor Antioquia LED -Corregimientos
GENMAS S.A. E.S.P.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Km 17 vía Las Palmas – Parque Tecnológico Manantiales
Finca el Eugenio
Teléfono (574) 322 9910 | Envigado – Colombia
www.genmas.com.co

FL_007

Medellín, 30 de julio de 2023

Doctor
JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
GENMAS S.A. E.S.P.
Km 17 via Las Palmas, Parque tecnológico Manantiales, Finca El Eugenio Envigado, Colombia
PBX. (604)-3229910 Envigado – Colombia
contactenos@genmas.com.co

ASUNTO: Recomendación No Modernización – Corregimientos Priorizados de Antioquia

Cordial saludo,

En el marco del contrato No. 40-2023 firmado entre las empresas GENMAS S.A. E.S.P. y FLUXES INGENIERÍA S.A.S., que tiene por objeto *"Realizar la interventoría técnica de la modernización del sistema de alumbrado público de los diferentes corregimientos del departamento de Antioquia, los cuales fueron priorizados por la gobernación de Antioquia"*, y que tuvo como acta de inicio el 30 de junio de 2023, luego de realizar la validación con cada administración municipal sobre el estado de los sistemas de Alumbrado Público de los diferentes Corregimientos Priorizados de Antioquia objeto de modernización, se evidencia que cinco (5) de éstos ya presenta actualización tecnológica del Alumbrado Público y/o éstos sistemas se encuentran bajo la figura de Concesión. A continuación se exponen los corregimientos en mención:

- Damasco – Santa Bárbara (182 luminarias)
- Sitio Viejo – Titiribí (30 luminarias)
- Los Azules – Santa Fe de Antioquia (14 luminarias)
- Cristales – San Roque (36 luminarias)
- Llanos de Ovejas – San Pedro de los Milagros (5 luminarias)

Con base a lo anterior, dado que en ninguno de los casos expuestos es factible la intervención, ya sea porque el sistema de Alumbrado Público ya se encuentra modernizados en su totalidad en tecnología LED adecuado o porque el sistema de Alumbrado Público del municipio se encuentra concesionado y es ésta la que contractualmente es responsable de la modernización, se **recomienda** no intervenir los corregimientos mencionados y retirarlos del proyecto, así como liberar las luminarias que éstos contemplan, los cuales ascienden a un total de 267 luminarias.

Así mismo, con el objetivo de suplir la vacante que dejaría el retiro de estos corregimientos del proyecto, se recomienda adelanta gestiones en cinco (5) corregimientos diferentes donde sea factible la modernización de su sistema de Alumbrado Público y donde el total de las cantidades de luminarias por modernizar ronden las cantidades que quedarían liberadas (267 luminarias) más el uso de un porcentaje de las cantidades establecidas como adicionales para reforzamiento de los sistemas.

Quedamos atentos a las decisiones y las acciones a tomar por parte de la interventoría tanto con los corregimientos recomendados a retirar, así como los corregimientos que se incluirían, si así se decide.

Cordialmente,

Jorge Mario
Restrepo M.

JORGE MARIO RESTREPO MURCIA
Representante Legal
Fluxes Ingeniería S.A.S.

Envigado, 31 de julio de 2023 **OF_001**

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.

Señor:
Julio Castro Guamán
Dirección de electrificación.
Gerencia de Servicios Públicos.

Asunto: EVALUACION DE CORREGIMIENTOS. "*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 23IA113B1149, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. GEN+".*

En mi calidad de supervisor designado para el contrato referenciado en el asunto, se procedió a validar la información recibida por parte de la interventoría FLUXES INGENIERÍA, según la relación contractual 040 de 2023. En dicha revisión se evidencio condiciones que impiden la intervención de algunos corregimientos, debido a que modernizaron su sistema de alumbrado público a LED, o celebraron contratos de concesión que impiden intervenir dichos corregimientos. En el anexo aportado con este oficio se relacionan dichos hallazgos.

SUBREGION	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTO	MOTIVO DE RETIRO	LUMINARIAS DEL PROYECTO
Occidente	Santa Fe de Antioquia	Las Azules	CONCESIÓN	14
Norte	San Pedro de los Milagros	Llano de Ovejas	CONCESIÓN	5
Suroeste	Titiribí	Sitio Viejo	CONCESIÓN	30
Nordeste	San Roque	Cristales	CONCESIÓN	36
Suroeste	Santa Bárbara	Damasco	MODERNIZADO	182

Anexos:
"FL_007_Oficio_No_Modernización_Corregimientos"

Cordialmente,

Diego Hernández Mejía
Supervisor Antioquia LED -Corregimientos
Proyectos Genmas
dhernandez@genmas.com.co

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Envigado, 13 de Septiembre de 2023

170-0660-2023
OF_005

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.

Señor:
Julio Castro Guamán
Dirección de electrificación.
Gerencia de Servicios Públicos.
julio.castro@antioquia.gov.co

Asunto: Inclusión de nuevos corregimientos priorizados de Antioquia

En relación al contrato interadministrativo número 23IA113B1149, celebrado entre el departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos y la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. GEN+, y después de realizar los respectivos diagnósticos de los corregimientos allí descritos, se encontró que algunos presentan relaciones contractuales para sus sistemas de alumbrado público.

Por lo anterior se procede a poner en consideración la siguiente priorización. En donde los corregimientos 6,9,10,16 y 17 de la siguiente tabla, reemplazan los corregimientos suscritos originalmente en el contrato interadministrativo número 23IA113B1149.

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	LUMINARIAS ESTIMADAS
1	Occidente	Frontino	Nutibara	145
2	Occidente	Giraldo	Manglar	107
3	Suroeste	Betania	La Libia	2
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	19
5	Bajo Cauca	Nechí	Colorado	153
6	Norte	Gómez Plata	El Salto	188
7	Norte	Belmira	Labores	37
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	26
9	Suroeste	Andes	Tapartó (Andes)	205
10	Occidente	Sopetran	Horizontes	26
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	35
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	84
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	69
14	Uraba	Necoclí	Mulatos	124
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	69
16	Occidente	Sabanalarga	el oro	38
17	Occidente	Uramita	Ambalema	10

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Km 17 vía Las Palmas – Parque Tecnológico Manantiales
Finca el Eugenio
Teléfono (574) 322 9910 | Envigado – Colombia
www.genmas.com.co

18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	15
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	132
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	29
21	MagdalenaM	Maceo	La Susana	78
22	Occidente	Olaya	Sucre	94
23	Bolsa			292
		TOTALES		**1977**

Cordialmente,

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
GENMAS S.A. E.S.P.

CARLOS JOSÉ ARANGO VANEGAS
Director Jurídico (E)
GENMAS S.A. E.S.P.

Proyectó: **DIEGO HERNÁNDEZ MEJÍA**
Supervisor Antioquia LED -Corregimientos
GENMAS S.A. E.S.P.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural renovable, reciclable y 100% biodegradable

Km 17 vía Las Palmas – Parque Tecnológico Manantiales
Finca el Eugenio
Teléfono (574) 322 9910 | Envigado – Colombia
www.genmas.com.co

Envigado, 21 de Septiembre de 2023

170-0677-2023
OF_008

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.

Señor:
Julio Castro Guamán
Dirección de electrificación.
Gerencia de Servicios Públicos.
julio.castro@antioquia.gov.co

Asunto: Modificación de corregimientos priorizados de Antioquia, dentro del contrato interadministrativo número 23IA113B1149.

En relación al contrato interadministrativo del asunto, celebrado entre el departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos y la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. GEN+, después de realizar los respectivos diagnósticos de acuerdo al contrato se presentan las siguientes consideraciones para su análisis:

1. El día 31 de Julio de 2023 se envió oficio al mandante, en donde se informó de 5 corregimientos que hacen parte del contrato actual y los cuales presentan diferentes hallazgos, la interventoría realiza la recomendación de no modernización de dichos corregimientos, los documentos soportes se relacionan a continuación:

- OF_001_Oficio_Evaluación_Modernización.
- FL_007_Oficio_No_Modernización_Corregimientos

2. Adicionalmente estos mismos corregimientos, tienen contratos actuales de concesión o modernización tal como se muestra en la siguiente tabla, estos se anexan al presente oficio.

MUNICIPIO	PROCESO	TIPO	OPERADOR	OBJETO
TITIRIBÍ	LP 004 DE 2017	CONCESIÓN	ASER SERVICIOS E.S.P S.A	CONTRATACION POR EL SISTEMA DE CONCESION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ZONA URBANA Y RURAL
SAN PERO DE LOS MILAGROS	001-2017	CONCESIÓN	ASESORIAS Y SERVICIOS E.S.P. S.A.	CONTRATACION POR EL SISTEMA DE CONCESION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN EXPANSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ZONA URBANA Y RURAL

MUNICIPIO	PROCESO	TIPO	OPERADOR	OBJETO
RAN ROQUE	LP-001-2015	SOCIO ESTRATÉGICO	EMPRESA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ROQUE	SELECCIONAR EL SOCIO ESTRATEGICO QUE CONFORMARA JUNTO CON EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE (ANTIOQUIA) UNA SOCIEDAD O EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA DENOMINADA ¿EMPRESA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ROQUE¿ LA CUAL SE ENCARGARÁ DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, SUSTITUCIÓN, REPOTENCIACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA
SANTA BARBARA	LP N° 002 DE 2022	CONCESIÓN	UNIÓN TEMPORAL - ALUMBRADO PÚBLICO SANTA BÁRBARA	CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, EXPANSIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ASOCIADO AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA.
SANTA FE DE ANTIOQUIA	CI 002 DE 2023	MODERNIZACIÓN	EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGIA DE ANTIOQUIA SA ESP	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA TIPO LED, EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS, PROMOVIENDO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por tanto y de acuerdo a la recomendación de la interventoría, se pone en consideración de la Gerencia de Servicios Públicos no priorizar dichos corregimientos.

Así mismo y teniendo en cuenta los municipios que sirvieron como insumo para la priorización de este contrato, se presentó El día 13 de septiembre de 2023, solicitud de inclusión de nuevos corregimientos priorizados para cumplir con el objeto contractual, y el alcance esperado.

A continuación se relacionan estos documentos y son anexos a este oficio.

- OF_004_170-0661-2023_Justificación_Corregimientos
- OF_005_170_0660_2023_Inclusión_Corregimientos

Con base en lo anteriormente expuesto se pone a consideración del Mandante, y se solicita aprobación de la inclusión de estos corregimientos, los cuales entrarían a reemplazar el listado de priorización en las posicione 6,9,10,16 y 17 tal como se presenta a continuación, con número de luminarias estimadas y ajustando el valor de la bolsa contractual.

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	LUMINARIAS ESTIMADAS
1	Occidente	Frontino	Nutibara	145
2	Occidente	Giraldo	Manglar	107
3	Suroeste	Betania	La Libia	2
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	19
5	Bajo Cauca	Nechí	Colorado	153
6	**Norte**	**Gómez Plata**	**El Salto**	**188**
7	Norte	Belmira	Labores	37

Papel elaborado 100% de fuentes responsables, libre de cloro y 100% biodegradable

8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	26
9	**Suroeste**	**Andes**	**Tapartó (Andes)**	**205**
10	**Occidente**	**Sopetran**	**Horizontes**	**26**
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	35
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	84
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	69
14	Uraba	Necoclí	Mulatos	124
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	69
16	Occidente	Sabanalarga	el oro	38
17	**Occidente**	**Uramita**	**Ambalema**	**10**
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	15
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	132
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	29
21	MagdalenaM	Maceo	La Susana	78
22	Occidente	Olaya	Sucre	94
23	Bolsa			292
		TOTALES		**1977**

Quedamos atentos a su evaluación y respuesta al respecto de las aprobaciones solicitadas

Cordialmente,

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
GENMAS S.A. E.S.P.

CARLOS JOSÉ ARANGO VANEGAS
Director Jurídico (E)
GENMAS S.A. E.S.P.

Proyectó: **DIEGO HERNÁNDEZ MEJÍA**
Supervisor Antioquia LED -Corregimientos
GENMAS S.A. E.S.P.

Km 17 vía Las Palmas – Parque Tecnológico Manantiales
Finca el Eugenio
Teléfono (574) 322 9910 | Envigado – Colombia
www.genmas.com.co

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.

Envigado, 28 de Septiembre de 2023

170-0680-2023
OF_009

Señor:
Julio Castro Guamán
Dirección de electrificación.
Gerencia de Servicios Públicos.
julio.castro@antioquia.gov.co

Asunto: Priorización para inclusión de nuevos corregimientos priorizados de Antioquia

En relación al contrato interadministrativo número 23IA113B1149, celebrado entre el departamento de Antioquia - Gerencia de Servicios Públicos y la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P. GEN, se presenta el listado de corregimientos priorizados que fue insumo para la selección de los 22 corregimientos objetivo.

El 30 de enero de 2023, se presenta oferta a la Gobernación de Antioquia, como un acuerdo marco entre GEN+ S.A. E.S.P una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de energía y eficiencia energética, y VALOR+ como una BPO prestadora de servicios tecnológicos, producto de dicha unión se construye dicho listado de corregimientos.

Las cantidades se han proyectado de acuerdo a la información registrada del operador de red, dichas cifras deben ser verificadas en una etapa de diagnóstico.
Es de anotar que los municipios pueden realizar modernizaciones en sus sistemas de alumbrado público, sin declararlos al operador de Red, lo que resulta en información desactualizada para las bases de datos.

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTO	LUMINARIAS
1	Occidente	Frontino	Nutibara	145
2	Occidente	Giraldo	Manglar	107
3	Suroeste	Betania	La Libia	2
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	19
5	Bajo Cauca	Nechí	Colorado	153
6	Occidente	Santa Fe de Antioquia	Las Azules	14
7	Norte	Belmira	Labores	37
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	26
9	Norte	San Pedro de los Milagros	Llano de Ovejas	5

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

10	Suroeste	Titiribí	Sitio Viejo	30
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	35
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	84
#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTO	LUMINARIAS
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	69
14	Uraba	Necoclí	Mulatos	124
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	69
16	Nordeste	San Roque	Cristales	36
17	Suroeste	Santa Bárbara	Damasco	182
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	15
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	132
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	29
21	MagdalenaM e	Maceo	La Susana	78
22	Occidente	Olaya	Sucre	94
	Bolsa			492
				1977

SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTO	LUMINARIAS
Norte	Gómez Plata	El Salto	188
Suroeste	Andes	Tapartó (Andes)	205
Occidente	Sopetran	Horizontes	26
Occidente	Sabanalarga	el oro	38
Occidente	Uramita	Ambalema	10
Uraba	Mutatá	Pavarandocito	129
Suroeste	Salgar	Peñalisa	36
Suroeste	Ciudad Bolívar	San Bernardo de los Farallones	59
Oriente	Sonsón	La Danta	181
Oriente	Abejorral	Pantanillo	57
Oriente	La Unión	Mesopotamia	149
Bajo Cauca	Caucasia	El Pando	46

Diego Hernández Mejía
Supervisor Antioquia LED -Corregimientos
Proyectos Genmas
dhernandez@genmas.com.co

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Empresa de Generación y Promoción
de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.

INFORME No 3 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 23IA113B1149.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS CORREGIMIENTOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023
ELABORACIÓN 01 OCTUBRE 2023

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P

Contenido

1. PRESENTACIÓN 3
2. PLAZO DE EJECUCIÓN 3
3. SITIOS DE INTERVENCIÓN 3
4. OBJETIVOS 4
5. SEGUIMIENTO 4
5.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO 4
5.2. ETAPA DE DISEÑO. 6
5.3. ETAPA DE MODERNIZACIÓN. 7
5.4. REINTEGROS. 9
5.5. MEDICIONES. 10
6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. 11
7. CONCLUSIONES 12

Ilustración 1. Diagnóstico de corregimientos. 5
Ilustración 2. Modernización corregimientos. 8
Ilustración 3. Avance en hitos. 9
Ilustración 4.Reintegros. 9

Tabla 1. Corregimientos de intervención. 4
Tabla 3.Diagnóstico diseño y modernización de corregimientos. 5
Tabla 4 Diseño de corregimientos. 6
Tabla 5. Luminarias modernizadas por corregimiento. 7
Tabla 6.Avance ejecución 11

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P.

1. PRESENTACIÓN

En el presente documento se consolidan el seguimiento, las observaciones, recomendaciones y novedades, referentes al avance del contrato interadministrativo 23IA113B1149 celebrado entre en DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS en adelante Mandante, y la EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. GEN+ en adelante Mandatario.

En orden de presentación este informe es el tercero para el presente contrato y comprende el corte a 30 de septiembre del 2023.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023

3. SITIOS DE INTERVENCIÓN

El 28 de septiembre de 2023 el mandatario aprueba la modificación de la tabla de municipios, esto teniendo en cuenta las recomendaciones de la interventoría y la supervisión del mandante. De esta forma la priorización de corregimientos queda así:

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS
1	Occidente	Frontino	Nutibara
2	Occidente	Giraldo	Manglar
3	Suroeste	Betania	La Libia
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas
5	Bajo Cauca	Nechí	Colorado
6	Norte	Gómez Plata	El Salto
7	Norte	Belmira	Labores
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)
9	Suroeste	Andes	Tapartó (Andes)
10	Occidente	Sopetran	Horizontes
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal
14	Uraba	Necoclí	Mulatos
15	Oriente	San Francisco	Aquitania
16	Occidente	Sabanalarga	el oro
17	Occidente	Uramita	Ambalema

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azucar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia
21	MagdalenaM	Maceo	La Susana
22	Occidente	Olaya	Sucre

Tabla 1. Corregimientos de intervención.

4. OBJETIVOS

1. Dar cumplimiento a los lineamientos normativos de RETILAP frente al proceso de modernización de alumbrado público.

2. Establecer una línea de trabajo en aras de mejora continua en la prestación de servicio de alumbrado público para el objeto del presente contrato.

3. Informar sobre el estado actual de los diferentes sitios y procesos involucrados en la prestación del servicio y proponer mejoras.

5. SEGUIMIENTO

5.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO.

Dando cumplimiento al parágrafo tercero del contrato interadministrativo, se procede al cumplimiento de las 3 etapas descritas allí, y se establecen la lista de entregables solicitados para dar cierre técnico a cada uno de los corregimientos objeto de intervención.

A la fecha se ha cumplido con el 100% de los diagnósticos de los corregimientos hábiles, por lo anterior se da por terminada la etapa 1. Diagnostico.

Los corregimientos relacionados en la tabla 3 han sido validados y aprobados por la interventoría en lo que respecta al diagnóstico, se relaciona el oficio de aprobación "FL_013_Oficio_Aprobación_Diagnóstico_Masivo_Corregimientos" en la siguiente ruta

- *10. Entregas\7. Interventoría\Aprobaciones_de_ Diagnosticos*

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS	DIAGNÓSTICO	INTERVENTORÍA
1	Occidente	Frontino	Nutibara	TERMINADO	APROBADO
2	Occidente	Giraldo	Manglar	TERMINADO	APROBADO
3	Suroeste	Betania	La Libia	TERMINADO	APROBADO
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	TERMINADO	APROBADO
7	Norte	Belmira	Labores	TERMINADO	APROBADO
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	TERMINADO	APROBADO
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	TERMINADO	APROBADO
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	TERMINADO	APROBADO
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	TERMINADO	APROBADO
14	Uraba	Necoclí	Mulatos	TERMINADO	APROBADO
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	TERMINADO	APROBADO
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	TERMINADO	APROBADO
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	TERMINADO	APROBADO
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	TERMINADO	APROBADO
21	MagdalenaM	Maceo	La Susana	TERMINADO	APROBADO
22	Occidente	Olaya	Sucre	TERMINADO	APROBADO

Tabla 2.Diagnóstico diseño y modernización de corregimientos.

Así mismo se está a la espera de la respuesta del municipio de Nechí para viabilizar la intervención.

La información de diagnósticos se deja en la ruta:

- 10. Entregas\1. Corregimientos.

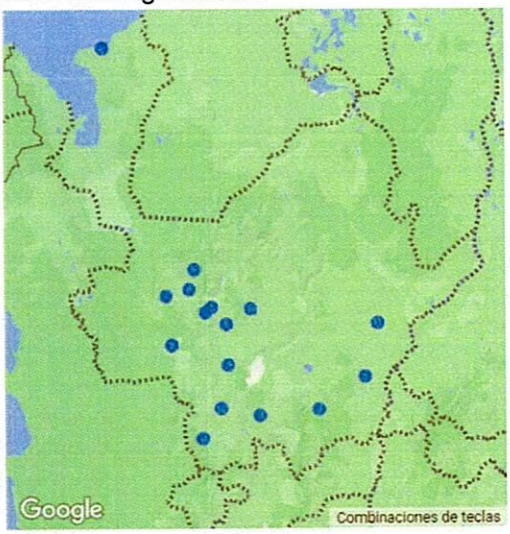


Ilustración 1. Diagnóstico de corregimientos.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

5.2. ETAPA DE DISEÑO.

A continuación se presenta el estado de diseño de los corregimientos aprobados por interventoría

MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS	ESTADO_DISEÑO
Frontino	Nutibara	TERMINADO
Giraldo	Manglar	TERMINADO
Betania	La Libia	TERMINADO
Montebello	Sabaletas	TERMINADO
Nechí	Colorado	PENDIENTE
Gómez Plata	El Salto	PENDIENTE
Belmira	Labores	TERMINADO
San Carlos	Puerto Garza (Narices)	TERMINADO
Andes	Tapartó (Andes)	EN PROCESO
Sopetran	Horizontes	PENDIENTE
Urrao	La Encarnación	TERMINADO
Venecia	Bolombolo	TERMINADO
Cañasgordas	Cestillal	TERMINADO
Necoclí	Mulatos	EN PROCESO
San Francisco	Aquitania	TERMINADO
Sabanalarga	el oro	PENDIENTE
Uramita	Ambalema	PENDIENTE
Buriticá	Llanos de Urarco	TERMINADO
Ebéjico	Sevilla	TERMINADO
Dabeiba	Camparrusia	TERMINADO
Maceo	La Susana	EN PROCESO
Olaya	Sucre	EN PROCESO

Tabla 3 Diseño de corregimientos.

Los entregables para esta etapa cumplen lo descrito en el presente contrato interadministrativo, la estructura planteada se divide así:

a. Perfiles_Diseños_Iluminación
b. Memorias de cálculo de iluminación
c. Informe criterios de diseños
d. Planos
e. Declaración de cumplimiento RETILAP
f. Cálculo del DPEA, EER
g. Plan y programa de mantenimiento
h. Validación de Software
i. Fichas técnicas de los productos

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P

j. Certificación de producto
k. Reportes fotométricos
l. Garantías

5.3. ETAPA DE MODERNIZACIÓN.

A continuación se presenta el estado de modernización de los corregimientos así como las cantidades de luminarias instaladas. Actualmente se tienen instaladas 523 luminarias

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS	ESTADO_MODERNIZACIÓN	MODERNIZACIÓN
1	Occidente	Frontino	Nutibara	TERMINADO	134
2	Occidente	Giraldo	Manglar	PENDIENTE	0
3	Suroeste	Betania	La Libia	TERMINADO	15
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	TERMINADO	17
5	Bajo Cauca	Nechí	Colorado	PENDIENTE	0
6	Norte	Gómez Plata	El Salto	PENDIENTE	0
7	Norte	Belmira	Labores	TERMINADO	14
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	TERMINADO	33
9	Suroeste	Andes	Tapartó (Andes)	PENDIENTE	0
10	Occidente	Sopetran	Horizontes	PENDIENTE	0
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	TERMINADO	51
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	TERMINADO	84
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	PENDIENTE	0
14	Uraba	Necoclí	Mulatos	PENDIENTE	0
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	PENDIENTE	0
16	Occidente	Sabanalarga	el oro	PENDIENTE	0
17	Occidente	Uramita	Ambalema	PENDIENTE	0
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	TERMINADO	16
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	TERMINADO	127
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	TERMINADO	32
21	MagdalenaM	Maceo	La Susana	PENDIENTE	0
22	Occidente	Olaya	Sucre	PENDIENTE	0
23	Bolsa				
	TOTALES			**10**	**523**
					26,5%

Tabla 4. Luminarias modernizadas por corregimiento.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azucar, materia prima natural renovable, reciclable y 100% biodegradable

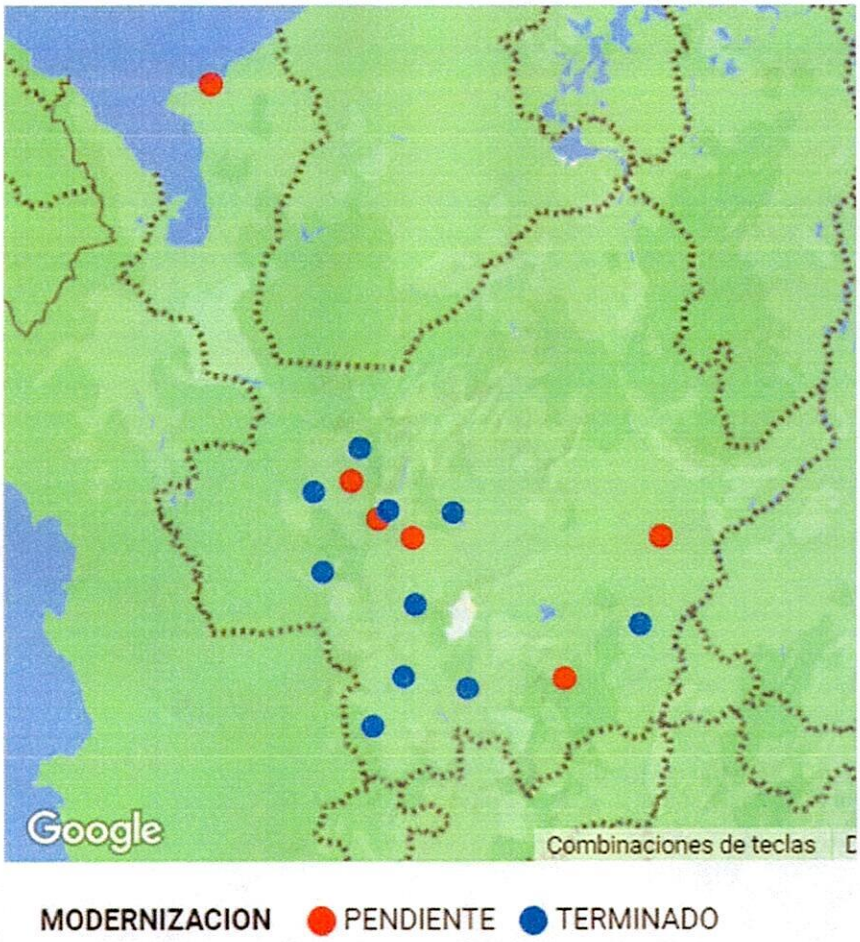


Ilustración 2. Modernización corregimientos.

Los entregables para esta etapa cumplen lo descrito en el presente contrato interadministrativo, la estructura planteada se divide así:

a. Fichas de modernización
b. Georreferenciación
c. Base de datos
d. Salidas graficas

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

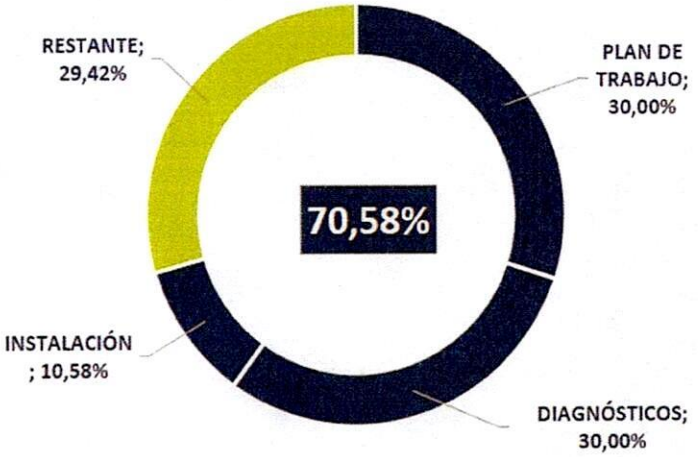


Ilustración 3. Avance en hitos.

5.4. REINTEGROS.

A la fecha se han efectuado cuatro (9) reintegros con un total de 284 luminarias, proyectores y/o bombillas, con su respectivo cableado, fotocontroles y brazos asociados, que se han entregado para custodia y disposición final por parte del municipio en cada corregimiento. Éstos se evidencian a continuación.

El detalle de cada uno de los reintegros es evidenciado en el acta de reintegro firmada entre las partes y las imágenes de los materiales

Corregimiento	Fecha	Sodio 70 W			Sodio 150 W			Sodio 250 W			Proyector Sodio 70 W			Proyector Sodio 250 W			Bombillas LED diferentes potencias			Luminarias / Proyectores LED diferentes potencias			Total luminarias reintegradas
		Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total	
Sabaletas (Montebello)	12/07/2023	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Labores (Belmira)	26/07/2023	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sevilla (Ebéjico)	15/08/2023	0	17	17	5	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	113
Bolombolo (Venecia)	29/08/2023	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	0	1	1	16	44	60	67
Camparrusia (Dabeiba)	6/09/2023	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	28
La Encarnación (Urrao)	8/09/2023	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
La Libia (Betania)	13/09/2023	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Llano de Urarco (Buritica)	16/09/2023	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	9
Puerto Garza (San Carlos)	1/09/2023	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
Total		0	76	108	5	8	13	0	1	1	0	1	1	0	4	1	0	6	6	16	138	154	284

Fotocontrol electrónico		Total fotocontroles reintegrados	Brazo corto (0.8 m aprox.)			Brazo largo (1.5 m aprox.)			Total brazos reintegrados	Cable (Varios)			Total Cableado reintegrados
Buen estado	Mal estado		Buen estado	Mal estado	Total	Buen estado	Mal estado	Total		Buen estado	Mal estado	Total	
0	6	6	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 m	3 m	3 m
0	92	92	25	0	25	0	0	0	25	0	48 kg	48 kg	48 kg (3 cajas)
0	16	16	0	2	2	0	1	1	3	0	Rollos	Rollos	Ver imágenes (Sin medida por falta de báscula)
0	23	23	0	16	16	0	0	0	16	0	80	80	80 m (dúplex y encauchetado)
0	32	32	0	10	10	0	0	0	10	0	Rollos	Rollos	Ver imágenes (Sin medida por falta de báscula)
0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1 m	1 m	1 m
0	9	9	0	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0
0	26	26	0	11	11	0	0	0	11	0	Rollo	Rollo	Ver imágenes (Sin medida por falta de báscula)
0	206	206	25	49	74	0	1	1	75	0	Varios	Varios	Varios

Ilustración 4.Reintegros.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P

5.5. MEDICIONES.

Para los corregimientos con categoría tipo B y C, acorde a RETILAP, Tabla 610.2 Categorización de los proyectos de Alumbrado Público, se realizan mediciones de iluminación.

PROYECTOS NUEVOS O REMODELACIÓN		Nivel A	Nivel B	Nivel C
		Bajo Impacto	Medio Impacto	Alto Impactos
SISTEMA VIAL	Clase de iluminación de la vía o Tipo de área			
	M1 – M2	P ≤ 25 ó L = 0	25 <P ≤ 75 ó L ≤ 1.000	P >75 ó L >1.000
	M3 – M4	P ≤ 25 ó L ≤ .1000	25 <P ≤ 100 ó 1.000 <L ≤ 2.000	P >100 ó L > 2.000
	M5	10 <P ≤ 25 ó L ≤ 1.000	25 <P ≤100 ó 1.000<L ≤ 2.000	P >100 ó L >2.000
OTRAS ÁREAS	Alamedas, ciclo rutas, parques, paseos, plazas, plazoletas, vías peatonales, puentes y túneles peatonales.	10 <P ≤ 25 ó L ≤ 1.000	25 <P ≤ 50 ó 1.000 <L ≤ 2.000	P >50 ó L >2.000
ESPECIALES [2°]	Zonas históricas de conservación, y otros que por sus características revista de un especial interés para el municipio.	P ≤ 25	25<P ≤ 50	P >50

Tabla 610.2 Categorización de los proyectos de Alumbrado Público

Dado que los corregimientos que ya cuentan con acta de cierre técnico (Sabaletas – Montebello y Labores – Belmira) no superan las 25 luminarias, no se requieren mediciones de iluminación, por tanto, no se reportan en este informe.

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P

6. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.

Con respecto al avance presupuesta, actualmente se tiene recibido a satisfacción con acta de cierre en los corregimientos de Sabaletas (Montebello) y Labores (Belmira). En total suman **treinta y un (31)** luminarias con la obra civil y componente eléctrico asociado y requerido, recibidas en las respectivas actas, con un valor total ejecutado de **$51,978,185** sobre un total presupuestado para ambos de **$ 77,503,679**. Con respecto al presupuesto global, se tiene un porcentaje de ejecución de **1.62%**

Variable	Presupuestado	Ejecutado	% Ejecución
Cantidad de luminarias	1977	31	1.57%
Presupuesto	$ 3,218,362,685	$ 51,978,185	1.62%

Tabla 5.Avance ejecución.

#	SUBREGIÓN	MUNICIPIOS	CORREGIMIENTOS	EJECUTADO
1	Occidente	Frontino	Nutibara	-
2	Occidente	Giraldo	Manglar	-
3	Suroeste	Betania	La Libia	-
4	Suroeste	Montebello	Sabaletas	24.778.200
7	Norte	Belmira	Labores	27.199.985
8	Oriente	San Carlos	Puerto Garza (Narices)	
11	Suroeste	Urrao	La Encarnación	-
12	Suroeste	Venecia	Bolombolo	
13	Occidente	Cañasgordas	Cestillal	-
14	Uraba	Necoclí	Mulatos	-
15	Oriente	San Francisco	Aquitania	-
18	Occidente	Buriticá	Llanos de Urarco	-
19	Occidente	Ebéjico	Sevilla	
20	Occidente	Dabeiba	Camparrusia	-
21	MagdalenaM	Maceo	La Susana	-
22	Occidente	Olaya	Sucre	-
				51.978.185

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azúcar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable

Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P

7. CONCLUSIONES


- Se ha efectuado y aprobado el total de diagnósticos disponibles por parte de interventoría, para un total de dieciséis (16).
- Se ha aprobado por parte del mandante la modificación de cinco (5) corregimientos
- Se han realizado Trece (13) Diseños, los restantes diseños están en proceso de revisión por parte de la interventoría
- Se han modernizado Diez (10) corregimientos para un total de 523 luminarias con su respectivo componente civil y eléctrico, que corresponden al 26,5%.
- Se ha realizado el cierre técnico de Dos (2) corregimientos. Sabaletas (Montebello) y Labores (Belmira)

JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO
Gerente
GENMAS S.A. E.S.P.

Diego Hernández Mejía
Supervisor Antioquia LED -Corregimientos
Proyectos Genmas
dhernandez@genmas.com.co

Papel elaborado 100% de la fibra de caña de azucar, materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Esperado
1		1	CRONOGRAMA - MODERNIZACIÓN SALP CORREGIMIENTOS	117 días	lun 26/06/23	vie 15/12/23		35%	46%
2		1.1	Etapa contractual	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23		100%	100%
3		1.1.1	Firma del contrato	0 días	lun 26/06/23	lun 26/06/23		100%	100%
4		1.1.2	Adquisición de polizas	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	3	100%	100%
5		1.1.3	Firma acta de inicio	0 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23	4	100%	100%
6		1.2	Prealistamiento Operativo	64 días	jue 29/06/23	lun 2/10/23		50%	90%
7		1.2.1	Integración de cronograma	1 día	jue 29/06/23	jue 29/06/23	5	100%	100%
8		1.2.2	Consolidación de riesgos	1 día	vie 30/06/23	vie 30/06/23	7	100%	100%
9		1.2.3	Modelo de gobierno de proyecto	1 día	mar 4/07/23	mar 4/07/23	8	100%	100%
10		1.2.4	Plan de trabajo	2 días	mié 5/07/23	jue 6/07/23	9	100%	100%
11		1.2.5	Aprobación por parte de la gobernación de Antioquia de los nuevos corregimientos a intervenir	5 días	mar 26/09/23	lun 2/10/23		0%	80%
12		1.3	Implementación del proyecto	112 días	mar 4/07/23	vie 15/12/23		57%	57%
13		1.3.1	Seguimiento y control (operativo, financiero y contractual)	112 días	mar 4/07/23	vie 15/12/23		57%	57%
14		1.3.1.1	Comités de Articulación Municipal	60,5 días	vie 7/07/23	mié 4/10/23		73%	73%
15		1.3.1.1.1	Comité de articulación No. 1 - Municipio de Montebello	2 horas	vie 7/07/23	vie 7/07/23	10	100%	100%
16		1.3.1.1.2	Comité de articulación No. 2 - Municipio de Buriticá	2 horas	vie 7/07/23	vie 7/07/23	15	100%	100%
17		1.3.1.1.3	Comité de articulación No. 3 - Municipio de Dabeiba	2 horas	vie 7/07/23	vie 7/07/23	16	100%	100%
18		1.3.1.1.4	Comité de articulación No. 4 - Municipio de Betania	2 horas	vie 7/07/23	vie 7/07/23	17	100%	100%
19		1.3.1.1.5	Comité de articulación No. 5 - Municipio de San Carlos	2 horas	lun 10/07/23	lun 10/07/23	18	100%	100%
20		1.3.1.1.6	Comité de articulación No. 6 - Municipio de Belmira	2 horas	lun 10/07/23	lun 10/07/23	19	100%	100%
21		1.3.1.1.7	Comité de articulación No. 7 - Municipio de Urrao	2 horas	lun 10/07/23	lun 10/07/23	20	100%	100%
22		1.3.1.1.8	Comité de articulación No. 8 - Municipio de Maceo	2 horas	lun 10/07/23	lun 10/07/23	21	100%	100%
23		1.3.1.1.9	Comité de articulación No. 9 - Municipio de Necoclí	2 horas	mar 11/07/23	mar 11/07/23	22	100%	100%
24		1.3.1.1.10	Comité de articulación No. 10 - Municipio de Cañasgordas	2 horas	mar 11/07/23	mar 11/07/23	23	100%	100%
25		1.3.1.1.11	Comité de articulación No. 11 - Municipio de Olaya	2 horas	mar 11/07/23	mar 11/07/23	24	100%	100%
26		1.3.1.1.12	Comité de articulación No. 12 - Municipio de Venecia	2 horas	mar 11/07/23	mar 11/07/23	25	100%	100%
27		1.3.1.1.13	Comité de articulación No. 13 - Municipio de Ebéjico	2 horas	mié 12/07/23	mié 12/07/23	26	100%	100%
28		1.3.1.1.14	Comité de articulación No. 14 - Municipio de Giraldo	2 horas	mié 12/07/23	mié 12/07/23	27	100%	100%
29		1.3.1.1.15	Comité de articulación No. 15 - Municipio de Frontino	2 horas	mié 12/07/23	mié 12/07/23	28	100%	100%
30		1.3.1.1.16	Comité de articulación No. 16 - Municipio de San Francisco	2 horas	mié 12/07/23	mié 12/07/23	29	100%	100%
31		1.3.1.1.17	Comité de articulación No. 17 - Municipio de Gómez Plata	2 horas	mar 3/10/23	mar 3/10/23	11	0%	0%
32		1.3.1.1.18	Comité de articulación No. 18 - Municipio de Andes	2 horas	mar 3/10/23	mar 3/10/23	31	0%	0%
33		1.3.1.1.19	Comité de articulación No. 19 - Municipio de Sopetrán	2 horas	mar 3/10/23	mar 3/10/23	32	0%	0%
34		1.3.1.1.20	Comité de articulación No. 20 - Municipio de Sabanalarga	2 horas	mar 3/10/23	mar 3/10/23	33	0%	0%
35		1.3.1.1.21	Comité de articulación No. 21 - Municipio de Uramita	2 horas	mié 4/10/23	mié 4/10/23	34	0%	0%
36		1.3.1.1.22	Comité de articulación No. 22 - Municipio de xxxxxx	2 horas	mié 4/10/23	mié 4/10/23	35	0%	0%
37		1.3.1.2	Comités Directivos Antioquia LED	111,5 días	mar 4/07/23	vie 15/12/23		50%	50%
38		1.3.1.2.1	Comité Directivo 1	2 horas	mar 4/07/23	mar 4/07/23	9CC	100%	100%
39		1.3.1.2.2	Comité Directivo 2	2 horas	jue 3/08/23	jue 3/08/23	38FC+21 días	100%	100%
40		1.3.1.2.3	Comité Directivo 3	2 horas	mar 5/09/23	mar 5/09/23	39FC+21 días	100%	100%
41		1.3.1.2.4	Comité Directivo 4	2 horas	mié 4/10/23	mié 4/10/23	40FC+21 días	0%	0%
42		1.3.1.2.5	Comité Directivo 5	2 horas	mar 7/11/23	mar 7/11/23	41FC+21 días	0%	0%
43		1.3.1.2.6	Comité Directivo 6	2 horas	vie 15/12/23	vie 15/12/23	42FC+26 días	0%	0%
44		1.3.1.3	Comité Técnico de Seguimiento	112 días	mar 4/07/23	vie 15/12/23		50%	50%
45		1.3.1.3.1	Comité Técnico 1	1 día	mar 4/07/23	mar 4/07/23	38CC	100%	100%
46		1.3.1.3.2	Comité Técnico 2	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	45FC+9 días	100%	100%
47		1.3.1.3.3	Comité Técnico 3	1 día	jue 3/08/23	jue 3/08/23	46FC+10 días	100%	100%
48		1.3.1.3.4	Comité Técnico 4	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	47FC+8 días	100%	100%
49		1.3.1.3.5	Comité Técnico 5	1 día	vie 1/09/23	vie 1/09/23	48FC+9 días	100%	100%
50		1.3.1.3.6	Comité Técnico 6	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	49FC+10 días	100%	100%
51		1.3.1.3.7	Comité Técnico 7	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	50FC+9 días	0%	0%
52		1.3.1.3.8	Comité Técnico 8	1 día	mar 17/10/23	mar 17/10/23	51FC+9 días	0%	0%
53		1.3.1.3.9	Comité Técnico 9	1 día	lun 30/10/23	lun 30/10/23	52FC+8 días	0%	0%
54		1.3.1.3.10	Comité Técnico 10	1 día	mar 14/11/23	mar 14/11/23	53FC+8 días	0%	0%
55		1.3.1.3.11	Comité Técnico 11	1 día	lun 27/11/23	lun 27/11/23	54FC+8 días	0%	0%
56		1.3.1.3.12	Comité Técnico 12	1 día	vie 15/12/23	vie 15/12/23	55FC+12 días	0%	0%
57		1.4	Intervención del Corregimiento - Municipio	112 días	jue 29/06/23	mié 13/12/23		51%	60%
58		1.4.1	GRUPO 1	81 días	jue 29/06/23	jue 26/10/23		73%	86%
59		1.4.1.1	Sabaletas - Municipio de Montebello (19)	9 días	jue 29/06/23	mié 12/07/23		100%	100%
60		1.4.1.1.1	Prediseño	6 días	jue 29/06/23	vie 7/07/23		100%	100%
61		1.4.1.1.1.1	Construcción de diseños tipicos y planos	3 días	jue 29/06/23	mar 4/07/23	5	100%	100%
62		1.4.1.1.1.2	Revisión prediseños	1 día	mié 5/07/23	mié 5/07/23	61	100%	100%
63		1.4.1.1.1.3	Ajuste prediseños	2 días	jue 6/07/23	vie 7/07/23	62	100%	100%
64		1.4.1.1.1.4	Prediseños aprobados	0 días	vie 7/07/23	vie 7/07/23	63	100%	100%
65		1.4.1.1.2	Diagnóstico-Ejecución	2 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23		100%	100%
66		1.4.1.1.2.1	Levantamiento, modernización y expansión de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	2 días	mar 11/07/23	mié 12/07/23	64FC+1 día	100%	100%
67		1.4.1.1.2.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 12/07/23	mié 12/07/23	66FF	100%	100%
68		1.4.1.2	Labores - Municipio de Belmira (37)	5 días	lun 24/07/23	vie 28/07/23		100%	100%
69		1.4.1.2.1	Prediseño	5 días	lun 24/07/23	vie 28/07/23		100%	100%
70		1.4.1.2.1.1	Construcción de diseños tipicos y planos	3 días	lun 24/07/23	mié 26/07/23	107	100%	100%
71		1.4.1.2.1.2	Revisión prediseños	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	70	100%	100%
72		1.4.1.2.1.3	Ajuste prediseños	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	71	100%	100%
73		1.4.1.2.1.4	Prediseños aprobados	0 días	vie 28/07/23	vie 28/07/23	72	100%	100%
74		1.4.1.2.2	Diagnóstico-Ejecución	2 días	mar 25/07/23	mié 26/07/23		100%	100%
75		1.4.1.2.2.1	Levantamiento, modernización y expansión de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	2 días	mar 25/07/23	mié 26/07/23	66FC+7 días	100%	100%
76		1.4.1.2.2.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 26/07/23	mié 26/07/23	75FF	100%	100%
77		1.4.1.3	Sevilla - Municipio de Ebéjico (132)	11 días	mar 8/08/23	mié 23/08/23		100%	100%
78		1.4.1.3.1	Diagnóstico	4 días	mar 8/08/23	vie 11/08/23		100%	100%

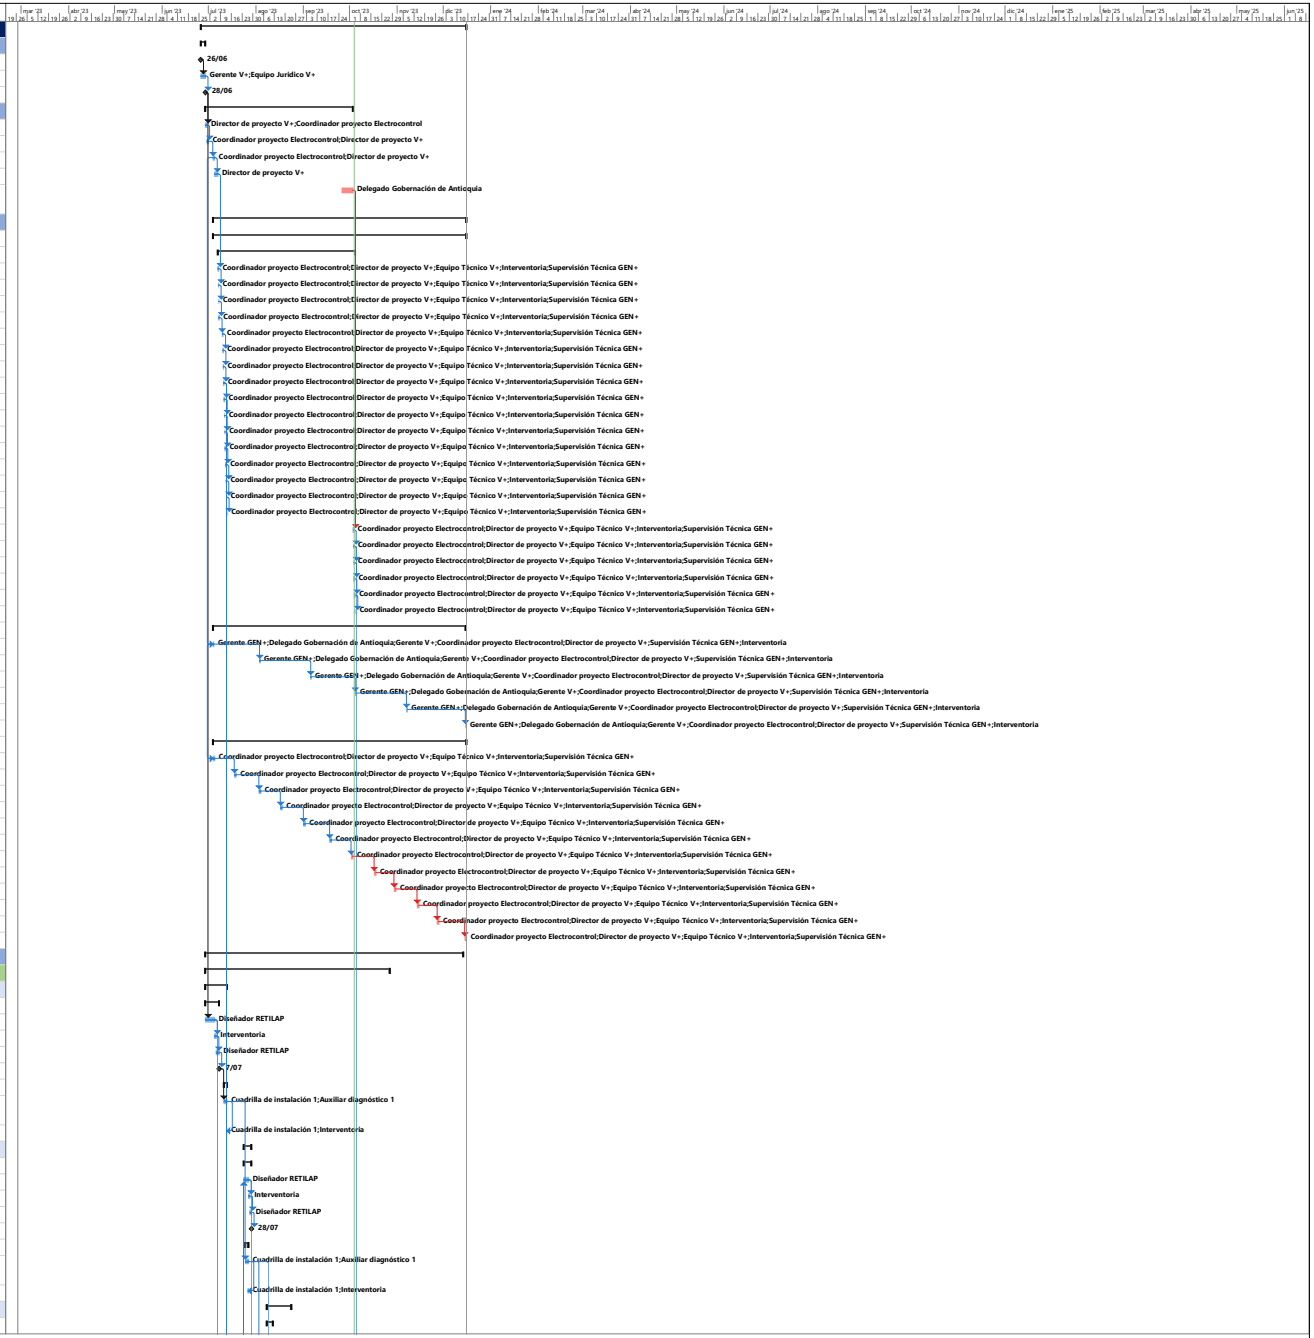

Proyecto: 20230623_Cronogram
Fecha: mié 4/10/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Esperado
79		1.4.1.3.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas.	3 días	mar 8/08/23	jue 10/08/23	93	100%	100%
80		1.4.1.3.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	2 días	jue 10/08/23	vie 11/08/23	79FF	100%	100%
81		**1.4.1.3.2**	**Diseño**	**3 días**	**lun 14/08/23**	**mié 16/08/23**		**100%**	**100%**
82		1.4.1.3.2.1	Elaboracion de los perfiles típicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23	80	100%	100%
83		1.4.1.3.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mié 16/08/23	mié 16/08/23	82	100%	100%
84		**1.4.1.3.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**jue 17/08/23**	**mié 23/08/23**	**83**	**100%**	**100%**
85		1.4.1.3.3.1	Revisión de diseños	3 días	jue 17/08/23	mar 22/08/23	83	100%	100%
86		1.4.1.3.3.2	Ajustes de diseño	1 día	mié 23/08/23	mié 23/08/23	85	100%	100%
87		1.4.1.3.3.3	Aprobación de diseños	0 días	mié 23/08/23	mié 23/08/23	86	100%	100%
88		**1.4.1.3.4**	**Ejecución**	**6 días**	**mié 9/08/23**	**mié 16/08/23**		**100%**	**100%**
89		1.4.1.3.4.1	Modernización	6 días	mié 9/08/23	mié 16/08/23	75FC+8 días	100%	100%
90		1.4.1.3.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 16/08/23	mié 16/08/23	89FF	100%	100%
91		**1.4.1.4**	**Bolombolo - Municipio de Venecia (84)**	**18 días**	**mié 2/08/23**	**mar 29/08/23**		**100%**	**100%**
92		**1.4.1.4.1**	**Diagnóstico**	**4 días**	**mié 2/08/23**	**mar 8/08/23**		**100%**	**100%**
93		1.4.1.4.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas.	3 días	mié 2/08/23	vie 4/08/23	237	100%	100%
94		1.4.1.4.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	2 días	vie 4/08/23	mar 8/08/23	93FF	100%	100%
95		**1.4.1.4.2**	**Diseño**	**3 días**	**mié 9/08/23**	**vie 11/08/23**		**100%**	**100%**
96		1.4.1.4.2.1	Elaboracion de los perfiles típicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23	94	100%	100%
97		1.4.1.4.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	vie 11/08/23	vie 11/08/23	96	100%	100%
98		**1.4.1.4.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**lun 14/08/23**	**jue 17/08/23**	**97**	**100%**	**100%**
99		1.4.1.4.3.1	Revisión de diseños	3 días	lun 14/08/23	mié 16/08/23	97	100%	100%
100		1.4.1.4.3.2	Ajustes de diseño	1 día	jue 17/08/23	jue 17/08/23	99	100%	100%
101		1.4.1.4.3.3	Aprobación de diseños	0 días	jue 17/08/23	jue 17/08/23	100	100%	100%
102		**1.4.1.4.4**	**Ejecución**	**5 días**	**mié 23/08/23**	**mar 29/08/23**		**100%**	**100%**
103		1.4.1.4.4.1	Modernización	5 días	mié 23/08/23	mar 29/08/23	90FC+3 días	100%	100%
104		1.4.1.4.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mar 29/08/23	mar 29/08/23	103FF	100%	100%
105		**1.4.1.5**	**Puerto Garza (Narices) - Municipio de San Carlos (26)**	**31 días**	**mar 18/07/23**	**vie 1/09/23**		**100%**	**100%**
106		**1.4.1.5.1**	**Prediseño**	**5 días**	**mar 18/07/23**	**mar 25/07/23**		**100%**	**100%**
107		1.4.1.5.1.1	Construcción de diseños típicos y planos	3 días	mar 18/07/23	vie 21/07/23	143	100%	100%
108		1.4.1.5.1.2	Revisión prediseños	1 día	lun 24/07/23	lun 24/07/23	107	100%	100%
109		1.4.1.5.1.3	Ajuste prediseños	1 día	mar 25/07/23	mar 25/07/23	108	100%	100%
110		1.4.1.5.1.4	Prediseños aprobados	0 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23	109	100%	100%
111		**1.4.1.5.2**	**Diagnóstico**	**2,75 días**	**mié 26/07/23**	**vie 28/07/23**		**100%**	**100%**
112		1.4.1.5.2.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas	2 días	mié 26/07/23	jue 27/07/23	110;148	100%	100%
113		1.4.1.5.2.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	jue 27/07/23	vie 28/07/23	112FF	100%	100%
114		**1.4.1.5.3**	**Ejecución**	**2 días**	**jue 31/08/23**	**vie 1/09/23**		**100%**	**100%**
115		1.4.1.5.3.1	Modernización	2 días	jue 31/08/23	vie 1/09/23	103FC+1 día	100%	100%
116		1.4.1.5.3.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 1/09/23	vie 1/09/23	115FF	100%	100%
117		**1.4.1.6**	**Camparrusia - Municipio de Dabeiba (29)**	**40 días**	**lun 10/07/23**	**mié 6/09/23**		**100%**	**100%**
118		**1.4.1.6.1**	**Prediseño**	**5 días**	**lun 10/07/23**	**vie 14/07/23**		**100%**	**100%**
119		1.4.1.6.1.1	Construcción de diseños típicos y planos	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23	155	100%	100%
120		1.4.1.6.1.2	Revisión prediseños	1 día	jue 13/07/23	jue 13/07/23	119	100%	100%
121		1.4.1.6.1.3	Ajuste prediseños	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23	120	100%	100%
122		1.4.1.6.1.4	Prediseños aprobados	0 días	vie 14/07/23	vie 14/07/23	121	100%	100%
123		**1.4.1.6.2**	**Diagnóstico**	**1 día**	**jue 27/07/23**	**jue 27/07/23**		**100%**	**100%**
124		1.4.1.6.2.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23		100%	100%
125		1.4.1.6.2.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	124FF	100%	100%
126		**1.4.1.6.3**	**Ejecución**	**2 días**	**mar 5/09/23**	**mié 6/09/23**		**100%**	**100%**
127		1.4.1.6.3.1	Modernización	2 días	mar 5/09/23	mié 6/09/23	116FC+1 día	100%	100%
128		1.4.1.6.3.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 6/09/23	mié 6/09/23	127FF	100%	100%
129		**1.4.1.7**	**La Encarnación - Municipio de Urrao (35)**	**32 días**	**jue 27/07/23**	**mar 12/09/23**		**100%**	**100%**
130		**1.4.1.7.1**	**Prediseño**	**5 días**	**jue 27/07/23**	**mié 2/08/23**		**100%**	**100%**
131		1.4.1.7.1.1	Construcción de diseños típicos y planos	3 días	jue 27/07/23	lun 31/07/23	70	100%	100%
132		1.4.1.7.1.2	Revisión prediseños	1 día	mar 1/08/23	mar 1/08/23	131	100%	100%
133		1.4.1.7.1.3	Ajuste prediseños	1 día	mié 2/08/23	mié 2/08/23	132	100%	100%
134		1.4.1.7.1.4	Prediseños aprobados	0 días	mié 2/08/23	mié 2/08/23	133	100%	100%
135		**1.4.1.7.2**	**Diagnóstico**	**2,75 días**	**jue 3/08/23**	**mar 8/08/23**		**100%**	**100%**
136		1.4.1.7.2.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas	1 día	jue 3/08/23	jue 3/08/23	134;75	100%	100%
137		1.4.1.7.2.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 4/08/23	mar 8/08/23	136FF	100%	100%
138		**1.4.1.7.3**	**Ejecución**	**3 días**	**vie 8/09/23**	**mar 12/09/23**		**100%**	**100%**
139		1.4.1.7.3.1	Modernización	3 días	vie 8/09/23	mar 12/09/23	127FC+1 día	100%	100%
140		1.4.1.7.3.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mar 12/09/23	mar 12/09/23	139FF	100%	100%
141		**1.4.1.8**	**La Libia - Municipio de Betania (2)**	**42 días**	**jue 13/07/23**	**mié 13/09/23**		**100%**	**100%**
142		**1.4.1.8.1**	**Prediseño**	**5 días**	**jue 13/07/23**	**mié 19/07/23**		**100%**	**100%**
143		1.4.1.8.1.1	Construcción de diseños típicos y planos	3 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23	119	100%	100%
144		1.4.1.8.1.2	Revisión prediseños	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	143	100%	100%
145		1.4.1.8.1.3	Ajuste prediseños	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	144	100%	100%
146		1.4.1.8.1.4	Prediseños aprobados	0 días	mié 19/07/23	mié 19/07/23	145	100%	100%
147		**1.4.1.8.2**	**Diagnóstico**	**1,75 días**	**vie 21/07/23**	**lun 24/07/23**		**100%**	**100%**
148		1.4.1.8.2.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23	136	100%	100%

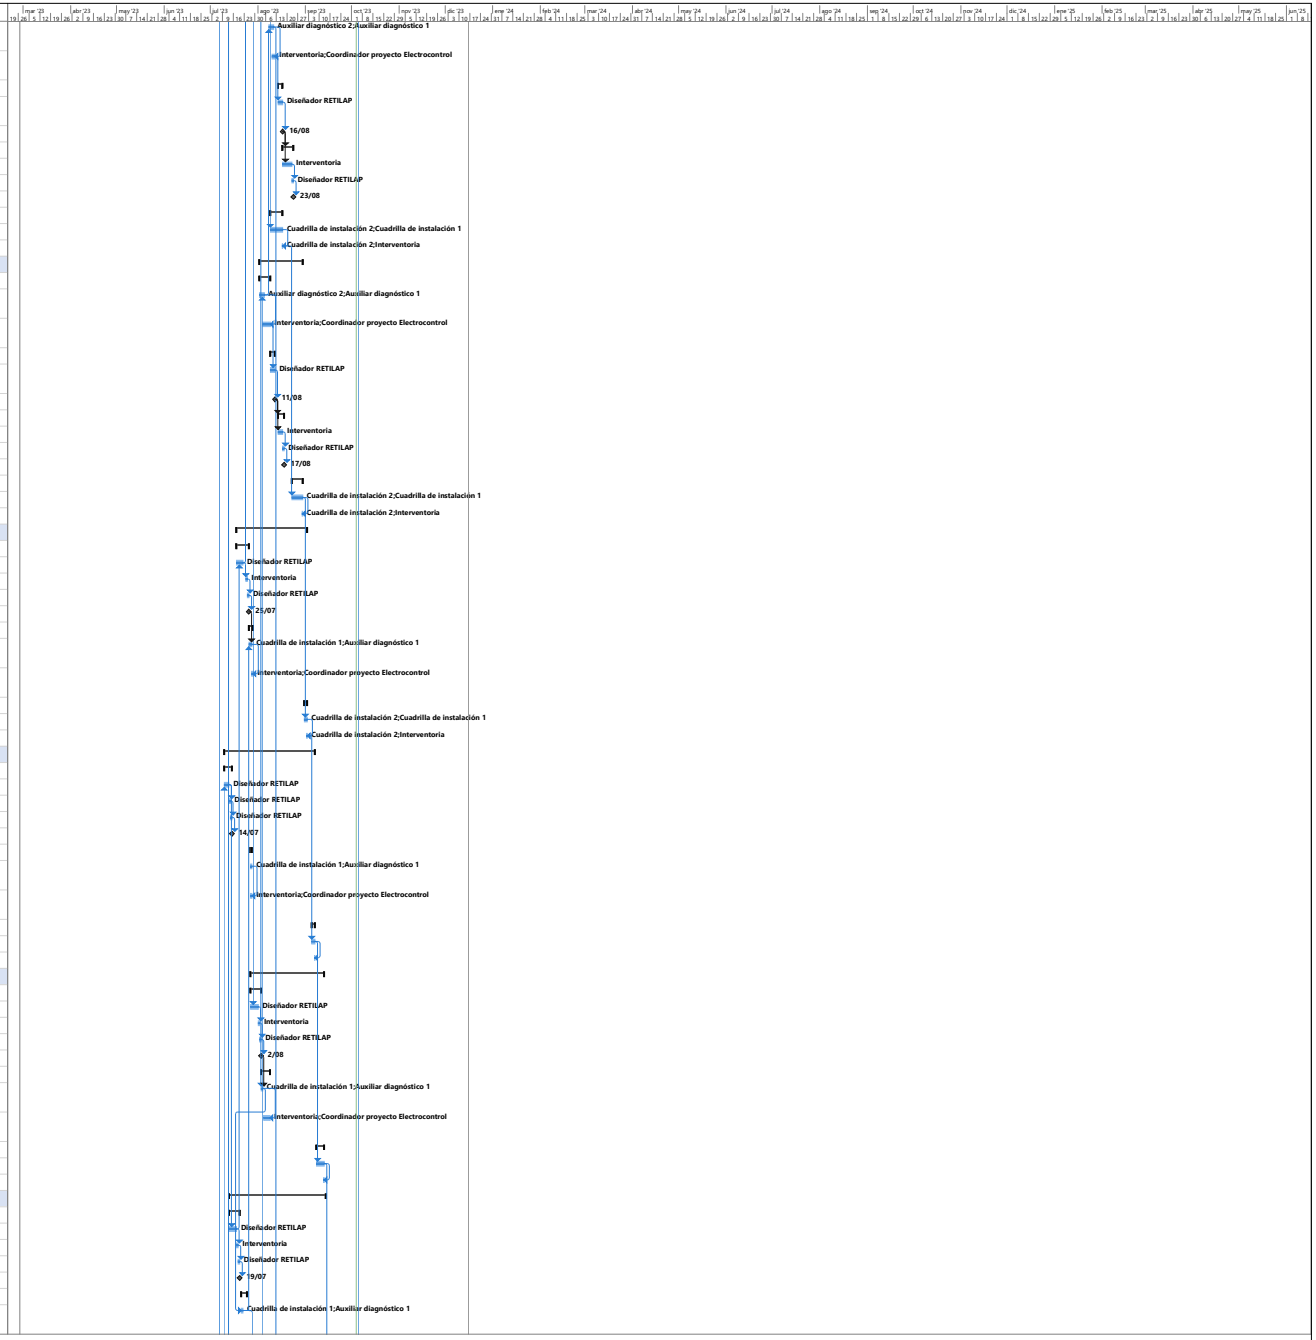

Proyecto: 20230623_Cronogram
Fecha: mié 4/10/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Esperado
149		1.4.1.8.2.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 21/07/23	lun 24/07/23	148FF	100%	100%
150		**1.4.1.8.3**	**Ejecución**	**1 día**	**mié 13/09/23**	**mié 13/09/23**		**100%**	**100%**
151		1.4.1.8.3.1	Modernización	1 día	mié 13/09/23	mié 13/09/23	139	100%	100%
152		1.4.1.8.3.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 13/09/23	mié 13/09/23	151FF	100%	100%
153		**1.4.1.9**	**Llanos de Urarco - Municipio de Buriticá (15)**	**50 días**	**mié 5/07/23**	**vie 15/09/23**		**100%**	**100%**
154		**1.4.1.9.1**	**Prediseño**	**5 días**	**mié 5/07/23**	**mar 11/07/23**		**100%**	**100%**
155		1.4.1.9.1.1	Construcción de diseños típicos y planos	3 días	mié 5/07/23	vie 7/07/23	61	100%	100%
156		1.4.1.9.1.2	Revisión prediseños	1 día	lun 10/07/23	lun 10/07/23	155	100%	100%
157		1.4.1.9.1.3	Ajuste prediseños	1 día	mar 11/07/23	mar 11/07/23	156	100%	100%
158		1.4.1.9.1.4	Prediseños aprobados	0 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	157	100%	100%
159		**1.4.1.9.2**	**Diagnóstico**	**1,75 días**	**vie 11/08/23**	**lun 14/08/23**		**100%**	**100%**
160		1.4.1.9.2.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23		100%	100%
161		1.4.1.9.2.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 11/08/23	lun 14/08/23	160FF	100%	100%
162		**1.4.1.9.3**	**Ejecución**	**1 día**	**vie 15/09/23**	**vie 15/09/23**		**100%**	**100%**
163		1.4.1.9.3.1	Modernización	1 día	vie 15/09/23	vie 15/09/23	151FC+1 día	100%	100%
164		1.4.1.9.3.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 15/09/23	vie 15/09/23	163FF	100%	100%
165		**1.4.1.10**	**Nutibara - Municipio de Frontino (145)**	**40 días**	**vie 28/07/23**	**lun 25/09/23**		**94%**	**100%**
166		**1.4.1.10.1**	**Diagnóstico**	**1 día**	**vie 28/07/23**	**vie 28/07/23**		**100%**	**100%**
167		1.4.1.10.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas.	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23		100%	100%
168		1.4.1.10.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	167FF	100%	100%
169		**1.4.1.10.2**	**Diseño**	**3 días**	**mié 23/08/23**	**vie 25/08/23**		**100%**	**100%**
170		1.4.1.10.2.1	Elaboracion de los perfiles típicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	168	100%	100%
171		1.4.1.10.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	vie 25/08/23	vie 25/08/23	170	100%	100%
172		**1.4.1.10.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**lun 28/08/23**	**jue 31/08/23**	**171**	**100%**	**100%**
173		1.4.1.10.3.1	Revisión de diseños	3 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23	171	100%	100%
174		1.4.1.10.3.2	Ajustes de diseño	1 día	jue 31/08/23	jue 31/08/23	173	100%	100%
175		1.4.1.10.3.3	Aprobación de diseños	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	174	100%	100%
176		**1.4.1.10.4**	**Ejecución**	**5 días**	**mar 19/09/23**	**lun 25/09/23**		**83%**	**100%**
177		1.4.1.10.4.1	Modernización	5 días	mar 19/09/23	lun 25/09/23	163FC+1 día	87%	100%
178		1.4.1.10.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	lun 25/09/23	lun 25/09/23	177FF	0%	100%
179		**1.4.1.11**	**Manglar - Municipio de Giraldo (107)**	**35 días**	**vie 11/08/23**	**vie 29/09/23**		**46%**	**100%**
180		**1.4.1.11.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**vie 11/08/23**	**mar 15/08/23**		**100%**	**100%**
181		1.4.1.11.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas.	3 días	vie 11/08/23	mar 15/08/23	79	100%	100%
182		1.4.1.11.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mar 15/08/23	mar 15/08/23	181FF	100%	100%
183		**1.4.1.11.2**	**Diseño**	**3 días**	**jue 17/08/23**	**mar 22/08/23**		**100%**	**100%**
184		1.4.1.11.2.1	Elaboracion de los perfiles típicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	jue 17/08/23	mar 22/08/23		100%	100%
185		1.4.1.11.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mar 22/08/23	mar 22/08/23	184	100%	100%
186		**1.4.1.11.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**mié 23/08/23**	**lun 28/08/23**	**185**	**0%**	**100%**
187		1.4.1.11.3.1	Revisión de diseños	3 días	mié 23/08/23	vie 25/08/23	185	0%	100%
188		1.4.1.11.3.2	Ajustes de diseño	1 día	lun 28/08/23	lun 28/08/23	187	0%	100%
189		1.4.1.11.3.3	Aprobación de diseños	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	188	0%	100%
190		**1.4.1.11.4**	**Ejecución**	**4 días**	**mar 26/09/23**	**vie 29/09/23**		**0%**	**100%**
191		1.4.1.11.4.1	Modernización	4 días	mar 26/09/23	vie 29/09/23	177	0%	100%
192		1.4.1.11.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 29/09/23	vie 29/09/23	191FF	0%	100%
193		**1.4.1.12**	**Aquitania - Municipio de San Francisco (69)**	**34 días**	**mar 22/08/23**	**vie 6/10/23**		**39%**	**59%**
194		**1.4.1.12.1**	**Diagnóstico**	**2 días**	**mar 22/08/23**	**mié 23/08/23**		**100%**	**100%**
195		1.4.1.12.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas.	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23	167	100%	100%
196		1.4.1.12.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mié 23/08/23	mié 23/08/23	195FF	100%	100%
197		**1.4.1.12.2**	**Diseño**	**2 días**	**vie 25/08/23**	**lun 28/08/23**		**100%**	**100%**
198		1.4.1.12.2.1	Elaboracion de los perfiles típicos, areas tipicas y construcción de planos	2 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23	196	100%	100%
199		1.4.1.12.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	198	100%	100%
200		**1.4.1.12.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**2,5 días**	**mar 29/08/23**	**jue 31/08/23**	**199**	**0%**	**100%**
201		1.4.1.12.3.1	Revisión de diseños	2 días	mar 29/08/23	mié 30/08/23	199	0%	100%
202		1.4.1.12.3.2	Ajustes de diseño	0,5 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	201	0%	100%
203		1.4.1.12.3.3	Aprobación de diseños	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	202	0%	100%
204		**1.4.1.12.4**	**Ejecución**	**5 días**	**lun 2/10/23**	**vie 6/10/23**		**0%**	**0%**
205		1.4.1.12.4.1	Modernización	5 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23	191	0%	0%
206		1.4.1.12.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 6/10/23	vie 6/10/23	205FF	0%	0%
207		**1.4.1.13**	**Castillal - Municipio de Cañasgordas (69)**	**53 días**	**lun 24/07/23**	**vie 6/10/23**		**68%**	**68%**
208		**1.4.1.13.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**lun 24/07/23**	**mié 26/07/23**		**100%**	**100%**
209		1.4.1.13.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas criticas.	3 días	lun 24/07/23	mié 26/07/23	251FC+1 día	100%	100%
210		1.4.1.13.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mié 26/07/23	mié 26/07/23	209FF	100%	100%
211		**1.4.1.13.2**	**Diseño**	**3 días**	**vie 28/07/23**	**mar 1/08/23**		**100%**	**100%**
212		1.4.1.13.2.1	Elaboracion de los perfiles típicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	vie 28/07/23	mar 1/08/23	210	100%	100%
213		1.4.1.13.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mar 1/08/23	mar 1/08/23	212	100%	100%
214		**1.4.1.13.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**mié 2/08/23**	**mar 8/08/23**		**100%**	**100%**
215		1.4.1.13.3.1	Revisión de diseños	3 días	mié 2/08/23	vie 4/08/23	213	100%	100%
216		1.4.1.13.3.2	Ajustes de diseño	1 día	mar 8/08/23	mar 8/08/23	215	100%	100%
217		1.4.1.13.3.3	Aprobación de diseños	0 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	216	100%	100%

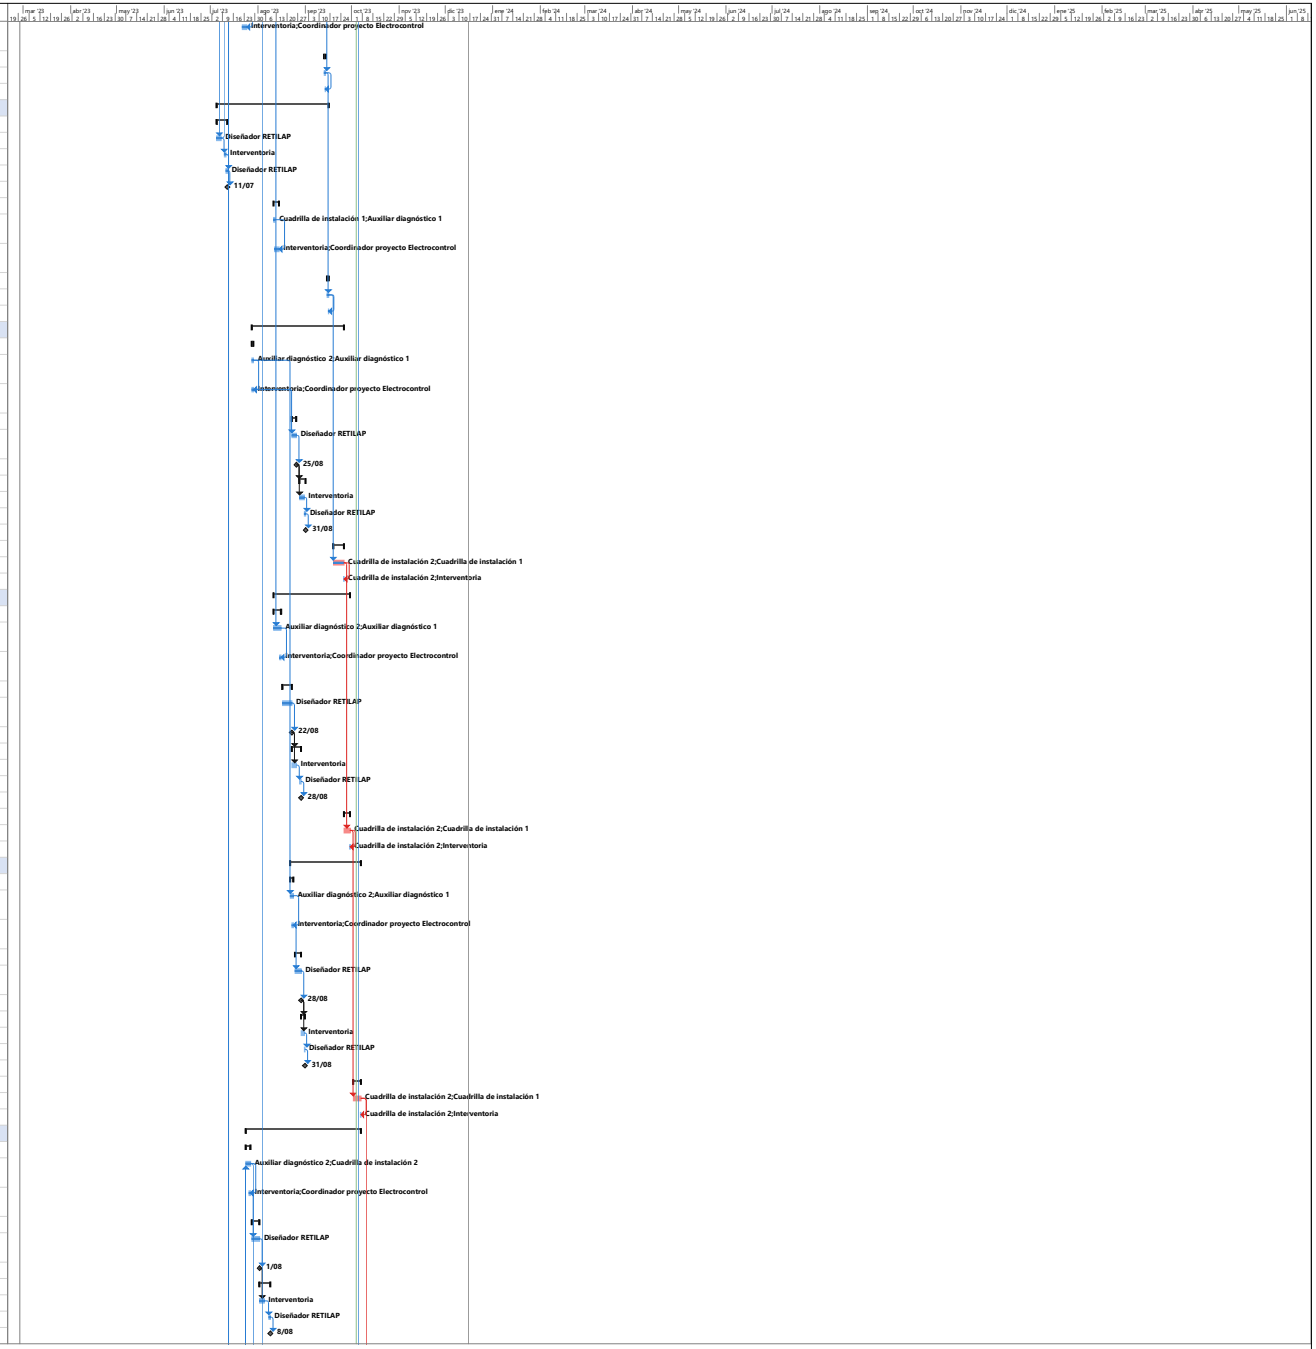

Proyecto: 20230623_Cronogram
Fecha: mié 4/10/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Esperado
218		**1.4.1.13.4**	**Ejecución**	**5 días**	**lun 2/10/23**	**vie 6/10/23**		**0%**	**0%**
219		1.4.1.13.4.1	Modernización	5 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23	205FF	0%	0%
220		1.4.1.13.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 6/10/23	vie 6/10/23	219FF	0%	0%
221		**1.4.1.14**	**La Susana - Municipio de Maceo (78)**	**66 días**	**mar 11/07/23**	**vie 13/10/23**		**43%**	**68%**
222		**1.4.1.14.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**mar 11/07/23**	**jue 13/07/23**		**100%**	**100%**
223		1.4.1.14.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	3 días	mar 11/07/23	jue 13/07/23	22	100%	100%
224		1.4.1.14.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	jue 13/07/23	jue 13/07/23	223FF	100%	100%
225		**1.4.1.14.2**	**Diseño**	**3 días**	**lun 17/07/23**	**mié 19/07/23**		**100%**	**100%**
226		1.4.1.14.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	lun 17/07/23	mié 19/07/23	224	100%	100%
227		1.4.1.14.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mié 19/07/23	mié 19/07/23	226	100%	100%
228		**1.4.1.14.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**vie 21/07/23**	**mié 26/07/23**	**227**	**0%**	**100%**
229		1.4.1.14.3.1	Revisión de diseños	3 días	vie 21/07/23	mar 25/07/23	227	0%	100%
230		1.4.1.14.3.2	Ajustes de diseño	1 día	mié 26/07/23	mié 26/07/23	229	0%	100%
231		1.4.1.14.3.3	Aprobación de diseños	0 días	mié 26/07/23	mié 26/07/23	230	0%	100%
232		**1.4.1.14.4**	**Ejecución**	**5 días**	**lun 9/10/23**	**vie 13/10/23**		**0%**	**0%**
233		1.4.1.14.4.1	Modernización	5 días	lun 9/10/23	vie 13/10/23	219	0%	0%
234		1.4.1.14.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 13/10/23	vie 13/10/23	233FF	0%	0%
235		**1.4.1.15**	**Sucre - Municipio de Olaya (94)**	**54 días**	**vie 28/07/23**	**vie 13/10/23**		**46%**	**70%**
236		**1.4.1.15.1**	**Diagnóstico**	**4 días**	**vie 28/07/23**	**mié 2/08/23**		**100%**	**100%**
237		1.4.1.15.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	3 días	vie 28/07/23	mar 1/08/23	205FC+1 día	100%	100%
238		1.4.1.15.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	2 días	mar 1/08/23	mié 2/08/23	237FF	100%	100%
239		**1.4.1.15.2**	**Diseño**	**3 días**	**jue 3/08/23**	**mar 8/08/23**		**100%**	**100%**
240		1.4.1.15.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	jue 3/08/23	mar 8/08/23	238	100%	100%
241		1.4.1.15.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mar 8/08/23	mar 8/08/23	240	100%	100%
242		**1.4.1.15.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**mié 9/08/23**	**lun 14/08/23**		**0%**	**100%**
243		1.4.1.15.3.1	Revisión de diseños	3 días	mié 9/08/23	vie 11/08/23	241	0%	100%
244		1.4.1.15.3.2	Ajustes de diseño	1 día	lun 14/08/23	lun 14/08/23	243	0%	100%
245		1.4.1.15.3.3	Aprobación de diseños	0 días	lun 14/08/23	lun 14/08/23	244	0%	100%
246		**1.4.1.15.4**	**Ejecución**	**5 días**	**lun 9/10/23**	**vie 13/10/23**		**0%**	**0%**
247		1.4.1.15.4.1	Modernización	5 días	lun 9/10/23	vie 13/10/23	233FF	0%	0%
248		1.4.1.15.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 13/10/23	vie 13/10/23	247FF	0%	0%
249		**1.4.1.16**	**Mulatos - Municipio de Necoclí (124)**	**70 días**	**lun 17/07/23**	**jue 26/10/23**		**21%**	**57%**
250		**1.4.1.16.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**lun 17/07/23**	**mié 19/07/23**		**100%**	**100%**
251		1.4.1.16.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	3 días	lun 17/07/23	mié 19/07/23	223FC+1 día	100%	100%
252		1.4.1.16.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	251FF	100%	100%
253		**1.4.1.16.2**	**Diseño**	**3 días**	**vie 21/07/23**	**mar 25/07/23**		**0%**	**100%**
254		1.4.1.16.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	vie 21/07/23	mar 25/07/23	252	0%	100%
255		1.4.1.16.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23	254	0%	100%
256		**1.4.1.16.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**4 días**	**mié 26/07/23**	**lun 31/07/23**		**0%**	**100%**
257		1.4.1.16.3.1	Revisión de diseños	3 días	mié 26/07/23	vie 28/07/23	255	0%	100%
258		1.4.1.16.3.2	Ajustes de diseño	1 día	lun 31/07/23	lun 31/07/23	257	0%	100%
259		1.4.1.16.3.3	Aprobación de diseños	0 días	lun 31/07/23	lun 31/07/23	258	0%	100%
260		**1.4.1.16.4**	**Ejecución**	**8 días**	**mar 17/10/23**	**jue 26/10/23**		**0%**	**0%**
261		1.4.1.16.4.1	Modernización	8 días	mar 17/10/23	jue 26/10/23	247	0%	0%
262		1.4.1.16.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	jue 26/10/23	jue 26/10/23	261FF	0%	0%
263		**1.4.2**	**GRUPO 2**	**47,5 días**	**mar 3/10/23**	**mié 13/12/23**		**0%**	**0%**
264		**1.4.2.1**	**Tapartó - Municipio de Andes (205)**	**24,5 días**	**mar 3/10/23**	**mié 8/11/23**		**0%**	**0%**
265		**1.4.2.1.1**	**Diagnóstico**	**4 días**	**mar 3/10/23**	**lun 9/10/23**		**0%**	**0%**
266		1.4.2.1.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	3 días	mar 3/10/23	vie 6/10/23	32	0%	0%
267		1.4.2.1.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 6/10/23	lun 9/10/23	266	0%	0%
268		**1.4.2.1.2**	**Diseño**	**3 días**	**lun 9/10/23**	**jue 12/10/23**		**0%**	**0%**
269		1.4.2.1.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	lun 9/10/23	jue 12/10/23	267	0%	0%
270		1.4.2.1.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	jue 12/10/23	jue 12/10/23	269	0%	0%
271		**1.4.2.1.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**3 días**	**jue 12/10/23**	**mié 18/10/23**		**0%**	**0%**
272		1.4.2.1.3.1	Revisión de diseños	2 días	jue 12/10/23	mar 17/10/23	270	0%	0%
273		1.4.2.1.3.2	Ajustes de diseño	1 día	mar 17/10/23	mié 18/10/23	272	0%	0%
274		1.4.2.1.3.3	Aprobación de diseños	0 días	mié 18/10/23	mié 18/10/23	273	0%	0%
275		**1.4.2.1.4**	**Ejecución**	**8 días**	**vie 27/10/23**	**mié 8/11/23**		**0%**	**0%**
276		1.4.2.1.4.1	Modernización	8 días	vie 27/10/23	mié 8/11/23	261	0%	0%
277		1.4.2.1.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 8/11/23	mié 8/11/23	276FF	0%	0%
278		**1.4.2.2**	**El Salto - Municipio de Gómez Plata (188)**	**29,5 días**	**vie 6/10/23**	**mar 21/11/23**		**0%**	**0%**
279		**1.4.2.2.1**	**Diagnóstico**	**4 días**	**vie 6/10/23**	**jue 12/10/23**		**0%**	**0%**
280		1.4.2.2.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	3 días	vie 6/10/23	mié 11/10/23	266	0%	0%
281		1.4.2.2.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mié 11/10/23	jue 12/10/23	280	0%	0%
282		**1.4.2.2.2**	**Diseño**	**3 días**	**jue 12/10/23**	**mié 18/10/23**		**0%**	**0%**
283		1.4.2.2.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	jue 12/10/23	mié 18/10/23	281	0%	0%
284		1.4.2.2.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mié 18/10/23	mié 18/10/23	283	0%	0%
285		**1.4.2.2.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**3 días**	**mié 18/10/23**	**lun 23/10/23**		**0%**	**0%**
286		1.4.2.2.3.1	Revisión de diseños	2 días	mié 18/10/23	vie 20/10/23	284	0%	0%

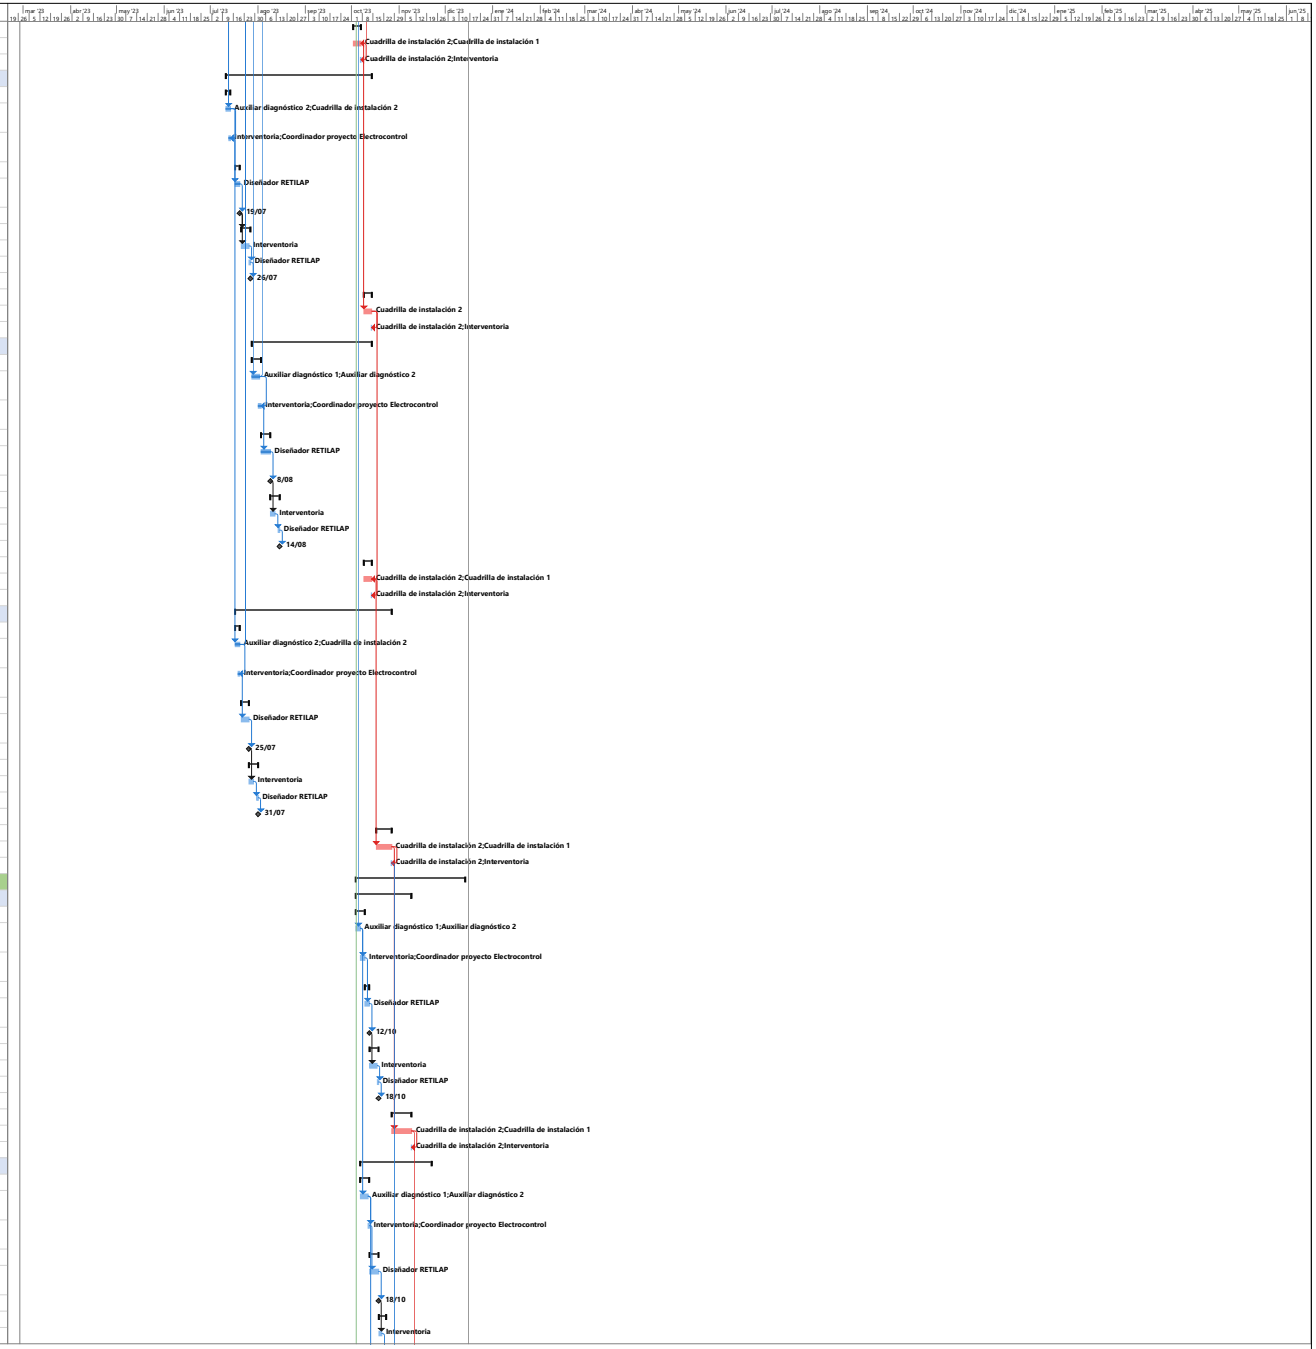

Proyecto: 20230623_Cronogram
Fecha: mié 4/10/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Esperado
287		1.4.2.2.3.2	Ajustes de diseño	1 día	vie 20/10/23	lun 23/10/23	286	0%	0%
288		1.4.2.2.3.3	Aprobación de diseños	0 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	287	0%	0%
289		**1.4.2.2.4**	**Ejecución**	**8 días**	**jue 9/11/23**	**mar 21/11/23**		**0%**	**0%**
290		1.4.2.2.4.1	Modernización	8 días	jue 9/11/23	mar 21/11/23	276	0%	0%
291		1.4.2.2.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mar 21/11/23	mar 21/11/23	290FF	0%	0%
292		**1.4.2.3**	**Horizontes - Municipio de Sopetrán (26)**	**29,5 días**	**mié 11/10/23**	**vie 24/11/23**		**0%**	**0%**
293		**1.4.2.3.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**mié 11/10/23**	**mar 17/10/23**		**0%**	**0%**
294		1.4.2.3.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	2 días	mié 11/10/23	vie 13/10/23	280	0%	0%
295		1.4.2.3.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 13/10/23	mar 17/10/23	294	0%	0%
296		**1.4.2.3.2**	**Diseño**	**3 días**	**mar 17/10/23**	**vie 20/10/23**		**0%**	**0%**
297		1.4.2.3.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	mar 17/10/23	vie 20/10/23	295	0%	0%
298		1.4.2.3.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	vie 20/10/23	vie 20/10/23	297	0%	0%
299		**1.4.2.3.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**3 días**	**vie 20/10/23**	**mié 25/10/23**		**0%**	**0%**
300		1.4.2.3.3.1	Revisión de diseños	2 días	vie 20/10/23	mar 24/10/23	298	0%	0%
301		1.4.2.3.3.2	Ajustes de diseño	1 día	mar 24/10/23	mié 25/10/23	300	0%	0%
302		1.4.2.3.3.3	Aprobación de diseños	0 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	301	0%	0%
303		**1.4.2.3.4**	**Ejecución**	**3 días**	**mié 22/11/23**	**vie 24/11/23**		**0%**	**0%**
304		1.4.2.3.4.1	Modernización	3 días	mié 22/11/23	vie 24/11/23	290	0%	0%
305		1.4.2.3.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	vie 24/11/23	vie 24/11/23	304FF	0%	0%
306		**1.4.2.4**	**El Oro - Municipio de Sabanalarga (38)**	**30,5 días**	**vie 13/10/23**	**mié 29/11/23**		**0%**	**0%**
307		**1.4.2.4.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**vie 13/10/23**	**jue 19/10/23**		**0%**	**0%**
308		1.4.2.4.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	2 días	vie 13/10/23	mié 18/10/23	294	0%	0%
309		1.4.2.4.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mié 18/10/23	jue 19/10/23	308	0%	0%
310		**1.4.2.4.2**	**Diseño**	**3 días**	**jue 19/10/23**	**mar 24/10/23**		**0%**	**0%**
311		1.4.2.4.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	jue 19/10/23	mar 24/10/23	309	0%	0%
312		1.4.2.4.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mar 24/10/23	mar 24/10/23	311	0%	0%
313		**1.4.2.4.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**3 días**	**mar 24/10/23**	**vie 27/10/23**		**0%**	**0%**
314		1.4.2.4.3.1	Revisión de diseños	2 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	312	0%	0%
315		1.4.2.4.3.2	Ajustes de diseño	1 día	jue 26/10/23	vie 27/10/23	314	0%	0%
316		1.4.2.4.3.3	Aprobación de diseños	0 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	315	0%	0%
317		**1.4.2.4.4**	**Ejecución**	**3 días**	**lun 27/11/23**	**mié 29/11/23**		**0%**	**0%**
318		1.4.2.4.4.1	Modernización	3 días	lun 27/11/23	mié 29/11/23	304	0%	0%
319		1.4.2.4.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 29/11/23	mié 29/11/23	318FF	0%	0%
320		**1.4.2.5**	**Ambalema - Municipio de Uramita (10)**	**31,5 días**	**mié 18/10/23**	**lun 4/12/23**		**0%**	**0%**
321		**1.4.2.5.1**	**Diagnóstico**	**3 días**	**mié 18/10/23**	**lun 23/10/23**		**0%**	**0%**
322		1.4.2.5.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	2 días	mié 18/10/23	vie 20/10/23	308	0%	0%
323		1.4.2.5.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	vie 20/10/23	lun 23/10/23	322	0%	0%
324		**1.4.2.5.2**	**Diseño**	**3 días**	**lun 23/10/23**	**jue 26/10/23**		**0%**	**0%**
325		1.4.2.5.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	lun 23/10/23	jue 26/10/23	323	0%	0%
326		1.4.2.5.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	jue 26/10/23	jue 26/10/23	325	0%	0%
327		**1.4.2.5.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**3 días**	**jue 26/10/23**	**mar 31/10/23**		**0%**	**0%**
328		1.4.2.5.3.1	Revisión de diseños	2 días	jue 26/10/23	lun 30/10/23	326	0%	0%
329		1.4.2.5.3.2	Ajustes de diseño	1 día	lun 30/10/23	mar 31/10/23	328	0%	0%
330		1.4.2.5.3.3	Aprobación de diseños	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	329	0%	0%
331		**1.4.2.5.4**	**Ejecución**	**3 días**	**jue 30/11/23**	**lun 4/12/23**		**0%**	**0%**
332		1.4.2.5.4.1	Modernización	3 días	jue 30/11/23	lun 4/12/23	318	0%	0%
333		1.4.2.5.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	lun 4/12/23	lun 4/12/23	332FF	0%	0%
334		**1.4.2.6**	**Corregimiento - Municipio (Pendiente por confirmar 153)**	**35,5 días**	**vie 20/10/23**	**mié 13/12/23**		**0%**	**0%**
335		**1.4.2.6.1**	**Diagnóstico**	**4 días**	**vie 20/10/23**	**jue 26/10/23**		**0%**	**0%**
336		1.4.2.6.1.1	Levantamiento de infraestructura existente: Postes, luminarias, identificación de áreas críticas.	3 días	vie 20/10/23	mié 25/10/23	322	0%	0%
337		1.4.2.6.1.2	Validación al inventario diagnosticado de la infraestructura existente y elaboración del informe del diagnostico del SALP	1 día	mié 25/10/23	jue 26/10/23	336	0%	0%
338		**1.4.2.6.2**	**Diseño**	**3 días**	**jue 26/10/23**	**mar 31/10/23**		**0%**	**0%**
339		1.4.2.6.2.1	Elaboracion de los perfiles tipicos, areas tipicas y construcción de planos	3 días	jue 26/10/23	mar 31/10/23	337	0%	0%
340		1.4.2.6.2.2	Entrega Diagnosticos, diseños y presupuesto	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	339	0%	0%
341		**1.4.2.6.3**	**Aprobación de diseños y presupuesto**	**3 días**	**mar 31/10/23**	**vie 3/11/23**		**0%**	**0%**
342		1.4.2.6.3.1	Revisión de diseños	2 días	mar 31/10/23	jue 2/11/23	340	0%	0%
343		1.4.2.6.3.2	Ajustes de diseño	1 día	jue 2/11/23	vie 3/11/23	342	0%	0%
344		1.4.2.6.3.3	Aprobación de diseños	0 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	343	0%	0%
345		**1.4.2.6.4**	**Ejecución**	**6 días**	**mar 5/12/23**	**mié 13/12/23**		**0%**	**0%**
346		1.4.2.6.4.1	Modernización	6 días	mar 5/12/23	mié 13/12/23	332	0%	0%
347		1.4.2.6.4.2	Disposición elementos desmontados	2 horas	mié 13/12/23	mié 13/12/23	346FF	0%	0%
348		**1.5**	**Documentación ejecución**	**60 días**	**vie 15/09/23**	**mié 13/12/23**		**0%**	**15%**
349		1.5.1	Actualización diseños, planos y documentación de las actividades desarrolladas	60 días	vie 15/09/23	mié 13/12/23	347FF	0%	18%
350		1.5.2	Generación de insumos para actualización de Aforos	60 días	vie 15/09/23	mié 13/12/23	349FF	0%	18%
351		**1.5.3**	**BOLSA DE RECURSOS**	**30 días**	**lun 30/10/23**	**mié 13/12/23**		**0%**	**0%**
352		1.5.3.1	Ejecución de la bolsa	30 días	lun 30/10/23	mié 13/12/23	350FF	0%	0%
353		**1.6**	**Cierre del Proyecto**	**33 días**	**vie 27/10/23**	**vie 15/12/23**		**0%**	**0%**
354		1.6.1	Liquidación y entrega Grupo 1	1 día	vie 27/10/23	vie 27/10/23	262	0%	0%
355		1.6.2	Liquidación y entrega Grupo 2	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	346	0%	0%

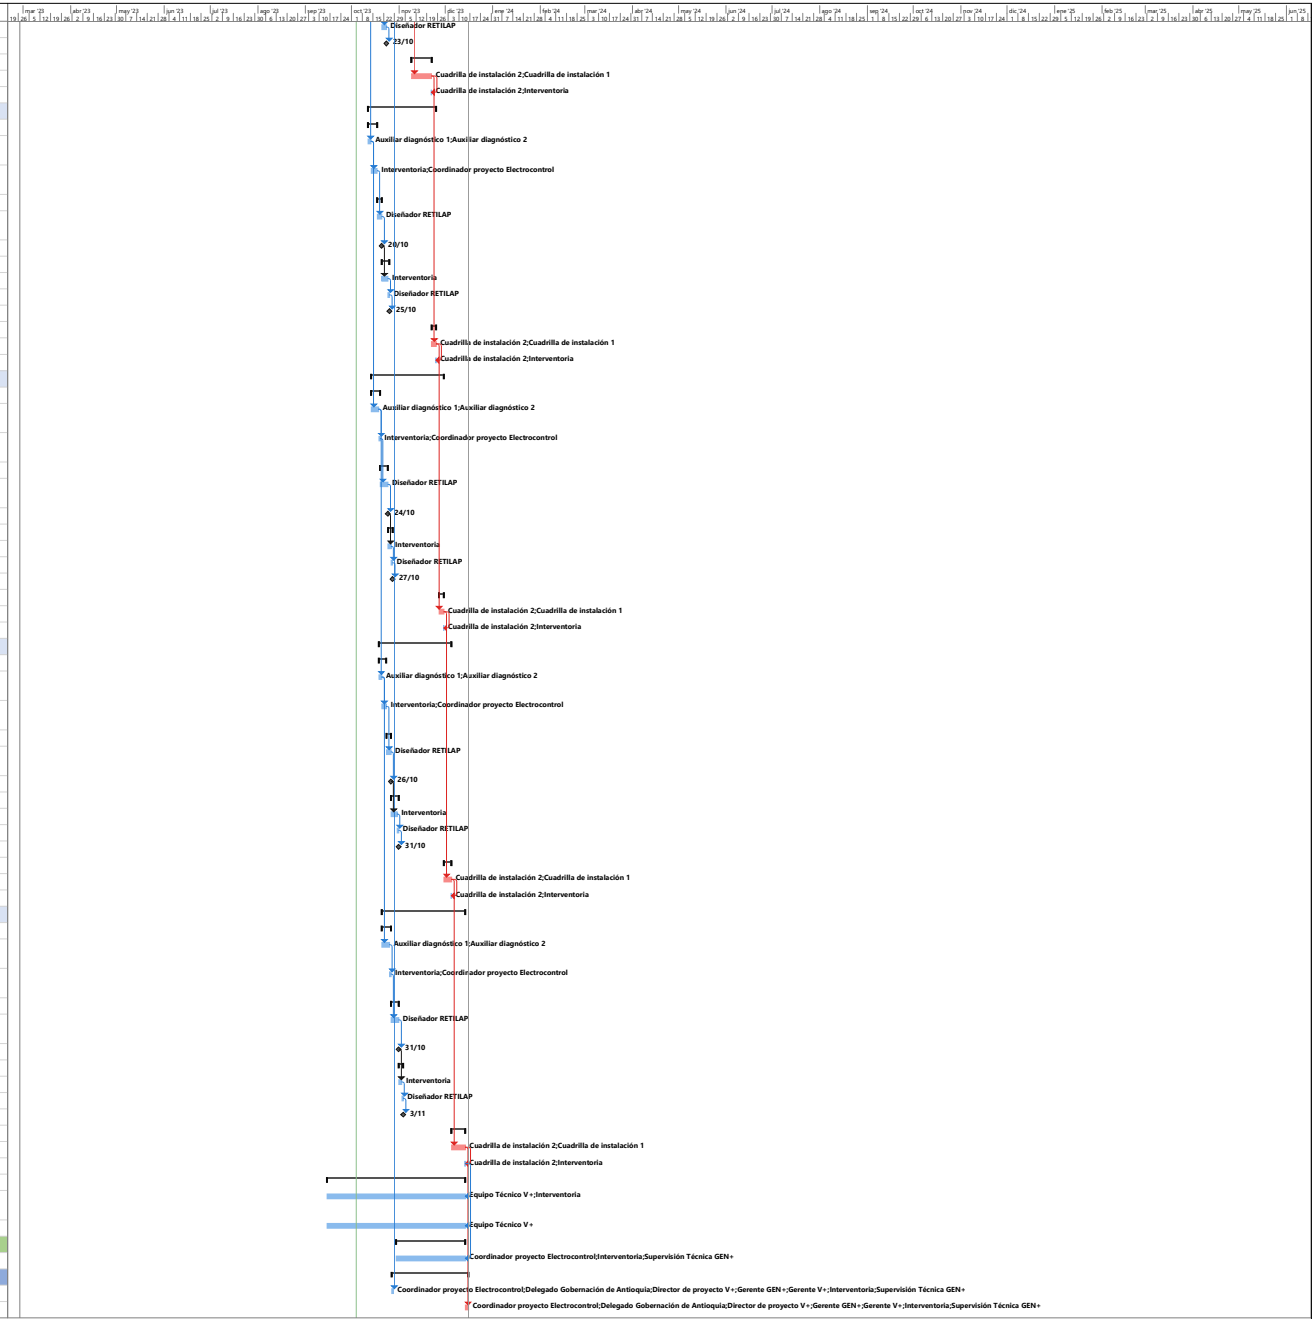

Proyecto: 20230623_Cronogram
Fecha: mié 4/10/23

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS** **REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN**	Código: FO-M1-P1-007 Versión: 03 Fecha de aprobación 23/10/2013

Fecha de generación: Jueves 28 de Septiembre del 2023 **Vigente hasta:** Jueves 28 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Nombre MGA:	Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia		
Nombre corto:	Energia		
BPIN/BPID:	2020003050215	**Elemento PEP:**	15-0026
Entidad Responsable:	GER DE SERVICIOS PUBLICOS		
Sector:	21 - Minas y energia	**Estado:**	Registrado Actualizado
Serv. público formulador:	NADIA MARYORI MAYA LOPERA	**Teléfono:**	3839111

ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO	
Plan de Desarrollo:	(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Programa:	420601-Unidos por la energía para la equidad territorial

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Nombre Actividad	2020	2021	2022	2023	Total Actitividad
Conexiones energía eléctrica	5,000,000,000	5,000,000,000	15,322,060,552	14,382,188,177	39,704,248,729
Energia eléctrica alternativos	1,710,741,321	1,986,080,849	53,415,691	14,423,236,337	18,173,474,198
Total Actividades	**6,710,741,321**	**6,986,080,849**	**15,375,476,243**	**28,805,424,514**	**57,877,722,927**

Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeación
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Campo Empresarial
Consulting, Tax, Legal & Audit

CAMPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 900.991.578-0

gerencia@campoempresarial.com
Edificio **Sao Paulo Plaza** Oficina **715**
Cr 43 A 18 sur 135 Av. El Poblado, Medellín.
WhatsApp: **310 845 10 36**

Medellín, 18 de septiembre de 2023.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: certificación de cumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento y, obrando en calidad de Revisor Fiscal,

CERTIFICO

Que La sociedad EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P., identificada con el NIT 900.251.423-3 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar por el mes de agosto de 2023.

Cordialmente,

Wilmar A. Campo Balbín
Revisor Fiscal
Cédula 98.562.998 de Envigado (Ant.)
Tarjeta Profesional No 61.364-T
En nombre de CAMPO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.991.578-0
Tarjeta de Registro Profesional 3448 UAE- JCC Resol. 356 de 21/6/19.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 18:05:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900251423
Código de Verificación	900251423231002180551

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de octubre de 2023, a las 18:07:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	8061755
Código de Verificación	8061755231002180704

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 232380501

PIB
18:13:00

Bogotá DC, 02 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. identificado(a) con NIT número 9002514233:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 232380360

PIB
18:11:05

Bogotá DC, 02 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN FERNANDO SUAZA RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8061755:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/10/2023 05:13:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **8061755 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75420824** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:14:18 PM horas del 02/10/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **8061755**
Apellidos y Nombres: **SUAZA RESTREPO JUAN FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:23:28 horas del 10/10/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **8061755,**
Apellidos y Nombres **SUAZA RESTREPO JUAN FERNANDO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **GEN+**, con NIT **900251423-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2023

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

Campo Empresarial
Consulting, Tax, Legal & Audit

CAMPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT: 900.991.578-0

gerencia@campoempresarial.com
Edificio **Sao Paulo Plaza** Oficina **715**
Cr 43 A 18 sur 135 Av. El Poblado, Medellín.
WhatsApp: **310 845 10 36**

Medellín, 09 de octubre de 2023.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: certificación de cumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – SSSI.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento y, obrando en calidad de Revisor Fiscal,


CERTIFICO

Que La sociedad EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P., identificada con el NIT 900.251.423-3 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar por el mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Wilmar A. Campo Balbín
Revisor Fiscal
Cédula 98.562.998 de Envigado (Ant.)
Tarjeta Profesional No 61.364-T
En nombre de CAMPO EMPRESARIAL SAS
NIT 900.991.578-0
Tarjeta de Registro Profesional 3448 UAE- JCC Resol. 356 de 21/6/19.


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
UAE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA DE REGISTRO
3448
CAMPO TRIBUTARIO
CAMPO TRIBUTARIO S.A.S.
NIT. 900891578-0
FECHA 21/09/2018
RESOLUCION DE INSCRIPCION 385
NUMERO DE REGISTRO 3448
DIRECTOR GENERAL
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA

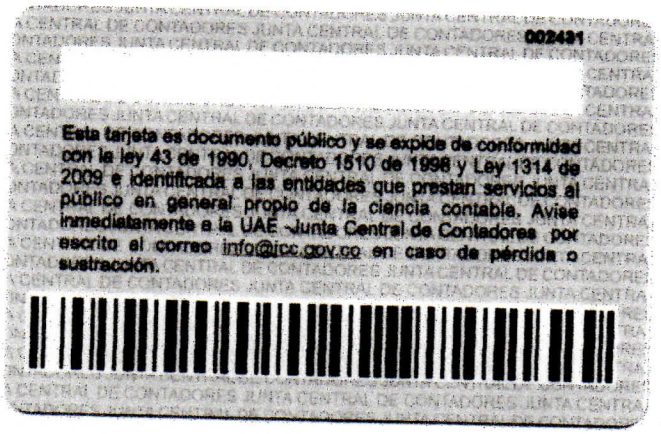
002431
Esta tarjeta es documento público y se expide de conformidad con la ley 43 de 1990, Decreto 1510 de 1998 y Ley 1314 de 2009 e identificada a las entidades que prestan servicios al público en general propio de la ciencia contable. Avise inmediatamente a la UAE -Junta Central de Contadores por escrito al correo info@jcc.gov.co en caso de pérdida o sustracción.




República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61364-T

WILMAR ALFREDO
CAMPO SALBIN
C.C. 98562998
RESOLUCION INSCRIPCION 138 FECHA 12/11/1998
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 69984

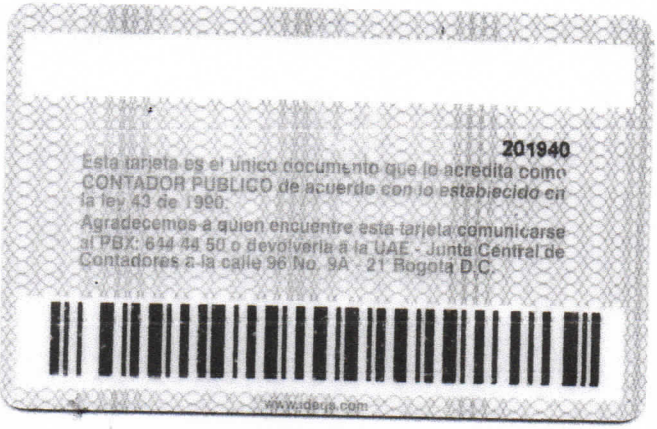

201940

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.562.998

CAMPO BALBIN

APELLIDOS

WILMAR ALFREDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1973

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | A- G.S. RH | M SEXO

30-AGO-1991 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0104900-00024241-M-0098562998-20080716 0001079546A 1 2170009251

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 F 2 1 F E 5 7 7 A 9 7 0 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILMAR ALFREDO CAMPO BALBIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98562998 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 61364-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 8061755 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 03/10/2023 09:57 AM

Código Verificación: **V326XHQJTN**

Válida hasta: **01/01/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Medellín, 18/10/2023

LA SUSCRITA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRACTUAL
EN CALIDAD DE SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO EN CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – COS

CERTIFICA

Que el Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia - COS en la sesión ordinaria Nro. 086 de 2023 verificó que el proyecto presentado se realiza conforme a la Ley y Decretos Departamentales.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Solicita recomendación para realizar prórroga Nro. 01 al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación Nro. 23IA113B1149 celebrado con la Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia S.A. E.S.P GEN+

SECOP: CD113B0423 ANTIOQUIA LED

Objeto	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la modernización del alumbrado público de los corregimientos priorizados en el departamento de Antioquia
Valor inicial	$3.822.880.542
Plazo inicial	04 meses inicio: 26/06/2023 hasta el 26/10/2023
Prórroga solicitada Nro. 01	01 mes y 19 días calendario, hasta el 15/12/2023.

Recomendaciones: se puede verificar en el acta de la sesión ordinaria del COS Nro. 086 del martes 17 de octubre de 2023.

DIANA MARCELA RAIGOZA DUQUE
Directora Asesoría Jurídica Contractual
Secretaria Técnica del COS
