ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL **HOJA DE RUTA** ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN	FUNZA ciudad líder	11-FR-02 Versión: 08 Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

FUNZA ciudad líder CONTABILIDAD

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5301008	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24	08	2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	31	12	2023
TIPO DE CONTRACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	CLASE DE CONTRATO	20 SEP 2023	CONTRATO DE OBRA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES--2023002029	FECHA DE EXPEDICIÓN	25	08	2023
ACTA DE INICIO	SI X NO	FECHA DE ACTA DE INICIO	25	08	2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 520.000.000,00	FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		

TIPO DE POLIZA	Seguro de Cumplimiento Estatal		NUMERO DE LA POLIZA			62-44-101018382		
AMPAROS	1) CUMPLIMIENTO	Vigencia	DESDE			HASTA		
			24	08	2023	30	06	2024
		Valor	$ 52.000.000,00					
	2) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Vigencia	DESDE			HASTA		
			31	12	2023	31	12	2025
		Valor	$ 78.000.000,00					
	3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Vigencia	DESDE			HASTA		
			24	08	2023	31	12	2026
		Valor	$ 52.000.000,00					
TIPO DE POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		NUMERO DE LA POLIZA			62-44-101018382		
AMPAROS	4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Vigencia	DESDE			HASTA		
			24	08	2023	31	12	2023
		Valor	$ 232.000.000,00					

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE FUNZA — NIT. No. 899.999.433-5
CONTRATISTA	AYG SERVICIOS E INGENIERÍA — NIT. No. 900.067.776-1

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS				PAGO ACTUAL	UNO (1)			
DE AVANCE O PARCIAL	PARCIAL			DE TERMINACIÓN				
INICIO PERIODO A PAGAR	25	08	2023	TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR	11	09	2023	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							
VALOR A PAGAR	$ 257.043.014,80			Cód Rubro	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.51005			
				Rubro				
VALOR TOTAL	$ 257.043.014,80							

SECRETARÍA JURÍDICA 10 OCT 2023 FUNZA ciudad líder

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ADICIONES	
$ 520.000.000,00			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGO ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	SALDO
$ 520.000.000,00	$ -	$ 257.043.014,80	$ 262.956.985,20

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	VARIAS	PERIODO CANCELADO	Agosto	AFILIADO	SI	X	NO
FONDO DE PENSIONES	VARIAS	PERIODO CANCELADO	Agosto	AFILIADO	SI	X	NO
ARL	VARIAS	PERIODO CANCELADO	Agosto	AFILIADO	SI	X	NO

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL PAGO			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA QUE VERIFICO EL PAGO	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
11	9	2023	14	09	2023	Mauricio Suarez Bohorquez	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	FIRMA	
CARGO	Secretario de Infraestructura		
CEDULA DE CIUDADANIA	79.569.929		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

ESTA COPIA DEBE REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO

Factura electrónica de venta N°: JA 1123

A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
900.067.776-1
CL 15 4 A 49 IN 5
Funza - Colombia
(031) 8237378
electricos_ayg@yahoo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nit: 899.999.433-5
Teléfono: (031) 8263311
Dirección: CALLE 14 No. 13 05
Correo: msuarez_ing@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2023, 11:57
Expedición	15/09/2023, 11:58
Vencimiento	30/09/2023
Vendedor	A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS A&G
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAGO DE ACTA PARCIAL NO. 01 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. CONTRATO CO1.PCCNTR.5301008 de 2023	1.00	197,725,396.00	197,725,396.00
2	ADMINISTRACION 23%	1.00	45,476,841.08	45,476,841.08
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	3,954,507.92	3,954,507.92
4	UTILIDAD 5%	1.00	9,886,269.80	9,886,269.80

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y siete millones cuarenta y tres mil catorce pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 257,043,014.80

Total Bruto	257,043,014.80
Total a Pagar	257,043,014.80

Observaciones:
Favor de consignar a la cuenta corriente Bancolombia 15972298363 a nombre de A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055834358 aprobado en 20230911 prefijo JA desde el número 1122 al 1500
Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 5.9 X 1000
CUFE:
5ae3ad439da72c20d97d93fe12e2873b9cc77c52c52fca0f66e795ca95012d787e4fee9ad4041f29e071dcf7e19c108d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: iSligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: iSligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Factura electrónica de venta N°: JA 1123

A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS
900.067.776-1
CL 15 4 A 49 IN 5
Funza - Colombia
(031) 8237378
electricos_ayg@yahoo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nit: 899.999.433-5
Teléfono: (031) 8263311
Dirección: CALLE 14 No. 13 05
Correo: msuarez_ing@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2023, 11:57
Expedición	15/09/2023, 11:58
Vencimiento	30/09/2023
Vendedor	A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS A&G
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PAGO DE ACTA PARCIAL NO. 01 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. CONTRATO CO1.PCCNTR.5301008 de 2023	1.00	197,725,396.00	197,725,396.00
2	ADMINISTRACION 23%	1.00	45,476,841.08	45,476,841.08
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	3,954,507.92	3,954,507.92
4	UTILIDAD 5%	1.00	9,886,269.80	9,886,269.80

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y siete millones cuarenta y tres mil catorce pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 257,043,014.80

Total Bruto	257,043,014.80
Total a Pagar	257,043,014.80

Observaciones:
Favor de consignar a la cuenta corriente Bancolombia 15972298363 a nombre de A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS.

Aesta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055834358 aprobado en 20230911 prefijo JA desde el número 1122 al 1500 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 5.9 X 1000

CUFE:
5ae3ad439da72c20d97d93fe12e2873b9cc77c52c52fca0f66e795ca95012d787e4fee9ad4041f29e071dcf7e19c108d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificado
Bancario

Miércoles, 03 de mayo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 900067776, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	15972298363	2017/02/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

Funza, 15 septiembre de 2023

Señores:

SECRETARIA DE HACIENDA

Ciudad

CONTRATO CO1.PCCNTR.5301008 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Certificacion de IVA

Cordial saludo:

El suscrito representante legal de AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS, Rodrigo Acosta Garzón, identificado con C.C. No. 79.457.078 expedida en Bogotá, presento a su despacho la liquidación del valor correspondiente a AIU generado para la legalización del contrato en referencia, asi:

Valor del contrato: $ 520.000.000,00

Impuestos AIU: $ 120.000.000,00

Valor del contrato antes de impuestos: $ 400.000.000,00

Nota: el contrato no incluye IVA

Agradecemos su atención,

Rodrigo Acosta Garzón

C.C. No. 79.457.078 de Bogotá

Representante Legal

AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS

NIT: 900.067.776-1

ALCALDIA DE FUNZA

Nit. 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

COD.15FR26

VER.

Nro: 202300203

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 12 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300167

Proveedor A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS, DIR: C 15 4A 49 IN 5, TEL:8257916 , NIT: 900067776 FAX:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	104100020	PACH PANEL CATEGORIA 6	UND	2.00	601,310.00	1,202,620.00
2	104090140	RELEVO AUXILIAR DE ARRANQUE	UND	8.00	43,273.20	346,185.60
3	104040600	MULTITOMA TIERRA ASILADA 12 SALIDAS	UND	1.00	174,409.50	174,409.50
4	104120244	ORGANIZADOR 1U	UND	3.00	49,216.80	147,650.40
5	104120245	BANDEJA DESLIZABLE	UND	1.00	126,560.40	126,560.40
6	104120246	TROQUELES LOGICOS	UND	47.00	11,900.10	559,304.70
7	104120147	TROQUELES ELECTRICOS	UND	47.00	11,900.10	559,304.70
8	104120059	CABLE UTP 6A	UND	1,487.00	1,834.20	2,727,455.40
9	104120247	FACE PLATE DOBLE	UND	49.00	5,454.60	267,275.40
10	104120248	KEYSTONE JACK	UND	74.00	9,543.60	706,226.40
11	104120052	CANALETA METALICA 12 X 5	MTL	94.00	30,849.60	2,899,862.40
12	104040601	INSTALACION DE PUESTA A TIRRA	UND	1.00	358,994.10	358,994.10
13	104090121	CONTADOR PARA BOMBAS DE SUCCION	UND	2.00	189,842.40	379,684.80
14	104120249	CABLE PAR TRENZADO 3X12 LIBRE DE HALOGENOS	MTR	570.00	5,197.50	2,962,575.00
15	104040545	ACOMETIDA ELECTRICA	UND	2.00	3,800,229.30	7,600,458.60
16	104120250	BY PASS PARA UPS 10KVA	UND	2.00	2,156,790.00	4,313,580.00
17	104040521	PATCH CORD RACK X 1 M CATEGORIA 6	UND	51.00	11,978.70	610,913.70
18	104040602	PATCH CORD USUARIO PATCH AZUL	UND	51.00	15,188.40	774,608.40
19	104040603	ESCALERILLA CABLEOFIL 30X10	MTR	51.00	29,318.70	1,495,253.70
20	104120152	JACK CATEGORIA 6A METALICOS BLINDADOS	UND	24.00	18,055.80	433,339.20
21	104040604	CAJA PLASTICA GALVANIZADA Y/O RADWELL	UND	47.00	10,877.40	511,237.80
22	104040605	CABLE CU 4#8+ 1#10	MTR	30.00	16,629.30	498,879.00
23	104040606	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFLABLE DE 20A	UND	12.00	7,585.50	91,026.00
24	104040607	BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A/3X80A	UND	1.00	106,128.30	106,128.30
25	104040586	TOMA CORRIENTE	UND	47.00	5,400.30	253,814.10
26	104040280	TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UND	1.00	187,323.60	187,323.60
27	104040369	TOMA DOBLE CON TAPA PARA RED REGULADA (NARANJA) MONOFASICA	UND	47.00	20,328.00	955,416.00

Total	$	31,250,087.20

RESUMEN

Grupo	Valor
10404	13,618,462.80
10409	725,870.40
10410	1,202,620.00
10412	15,703,134.00
Total	31,250,087.20

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

OFICINA DE RECURSOS FISICOS

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300203

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 12 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300167

Proveedor A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS, DIR: C 15 4A 49 IN 5, TEL:8257916 , NIT: 900067776 FAX:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE EQUIPOS ELECTRICOS RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SON TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 20 CTVS. MC.

Elaboró	rodrigo
Modificó:	rodrigo

JEFE DE ALMACEN
ALMACEN GENERAL

RECIBIDO POR

SE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

COD.15FR23

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

VER.

Nro: 202300204

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 12 SEPTIEMBRE 2023 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO N 202300167

Proveedor A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS, DIR: C 15 4A 49 IN 5, TEL:8257916 , NIT: 900067776 FAX: **Remisión Nº**

Nro	Codigo	Und	Cant	Placa	Serie Anterior	Referencia	Valor
1	20704000	UN	1	29022	0	GABINETE (RACK)	1,052,561.70
2	20704024	UN	1	29023	0	SWITCH DE 48 PUERTOS	1,306,215.00
3	20704024	UN	1	29024	0	SWITCH DE 48 PUERTOS	1,306,215.00
4	20704026	UN	1	29025	0	UPS ONLINE 10KVA 9KW BIFASICA	8,094,017.75
5	20704026	UN	1	29026	0	UPS ONLINE 10KVA 9KW BIFASICA	8,094,017.75

Grupo	Valor
20704	19,853,027.20
Total	**19,853,027.20**

Detalle: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE EQUIPOS ELECTRICOS RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

Destino: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SO DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTI SIETE PESOS CON 20 CTVS. MC.

JEFE DE ALMACEN

ALMÀCEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	1000001176	9449296256	E	2023/04/21	2023/04/04	BANCO BOGOTA	0	$1,691,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (6 Afiliados)						$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (4 Afiliados)						$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79651718	ACOSTA OSCAR	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (2 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$427,800
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$427,800
5	CC	52850246	ACOSTA DIANA	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
6	CC	41413543	GARZON MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(6)						$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	1000001176	9449296256	E	2023/04/21	2023/04/04	BANCO BOGOTA	0	$1,691,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$748,800	$0	$0	$748,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$382,600	$0	$0	$382,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$382,600	$0	$0	$382,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$280,000	$0	$0	$280,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$280,000	$0	$0	$280,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$94,400	$0	$0	$94,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				6	$1,691,400	$0	$0	$1,691,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2070459854	9450358698	E	2023/05/18	2023/05/09	BANCOLOMBIA	0	$1,691,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (6 Afiliados)							$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	79122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79651718	ACOSTA OSCAR		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$427,800
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$427,800
5	CC	52850246	ACOSTA DIANA		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
6	CC	41413543	GARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(6)							$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2070459854	9450358698	E	2023/05/18	2023/05/09	BANCOLOMBIA	0	$1,691,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$748,800	$0	$0	$748,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$382,600	$0	$0	$382,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$382,600	$0	$0	$382,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$280,000	$0	$0	$280,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$280,000	$0	$0	$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$280,000	$0	$0	$280,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$94,400	$0	$0	$94,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				6	$1,691,400	$0	$0	$1,691,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-05	2023-06	3189190	9452532561	E	2023/06/21	2023/06/22	BANCOLOMBIA	1	$1,693,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (6 Afiliados)							$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)							$3,520,000	$563,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$326,000		$0	$0		$1,263,600
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79651718	ACOSTA OSCAR	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$427,800
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$56,600		$0	$0		$427,800
5	CC	52850246	ACOSTA DIANA	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,700
6	CC	41413543	GARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(6)							$4,680,000	$748,800			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$382,600		$0	$0		$1,691,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8237378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	3189190	9452532561	E	2023/06/21	2023/06/22	BANCOLOMBIA	1	$1,693,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$748,800	$1,000	$0	$749,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$300	$0	$192,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$700	$0	$557,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$382,600	$500	$0	$383,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$382,600	$500	$0	$383,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$280,000	$400	$0	$280,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$280,000	$400	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$280,000	$500	$0	$280,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$94,400	$200	$0	$94,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$300	$0	$185,900
TOTAL				6	$1,691,400	$2,400	$0	$1,693,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31552113	9453338153	E	2023/07/21	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	31552113	9453338153	E	2023/07/21	2023/07/06	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	124535193	9455544046	E	2023/08/18	2023/08/28	BANCOLOMBIA	10	$1,037,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ingret	tde	tan	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$273,500			$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$245,200			$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$245,200			$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO																	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300			$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300			$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total			Afiliados(4)																			$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$273,500			$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	124535193	9455544046	E	2023/08/18	2023/08/28	BANCOLOMBIA	10	$1,037,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$4,300	$0	$381,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$2,200	$0	$194,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$3,100	$0	$276,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$3,100	$0	$276,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$2,200	$0	$189,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$2,200	$0	$189,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$2,200	$0	$189,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$600	$0	$48,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$1,600	$0	$140,800
TOTAL				4	$1,025,500	$11,800	$0	$1,037,300

2023/09/11 11:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A B G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-09	153636867	9456172897	E	2023/09/19	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)							$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457078	ACOSTA RODRIGO		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	CARZON MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)							$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A B G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153636867	9456172897	E	2023/09/19	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153636867	9456172897	E	2023/09/19	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRAS (4 Afiliados)						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500
Centro de Trabajo: OBRAS PERSONAL OPERATIVO (3 Afiliados)						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						$2,360,000	$377,600			$3,520,000	$140,800			$3,520,000	$140,800			$3,520,000		$245,200		$0	$0		$904,400
1	CC	52114799	ACOSTA MARTHA	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	19122731	ACOSTA MIGUEL		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600
3	CC	79457878	ACOSTA RODRIGO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL CUNDINAMRCA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$121,100
4	CC	41413543	GARZON MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$121,100
Total Afiliados(4)						$2,360,000	$377,600			$4,680,000	$187,200			$4,680,000	$187,200			$4,680,000		$273,500		$0	$0		$1,025,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900067776	1	A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	CALLE 15 No 4A 49 INT 5	FUNZA-CUNDINAMARCA	8780191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	153636867	9456172897	E	2023/09/19	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$1,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$0	$0	$377,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$273,500	$0	$0	$273,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$273,500	$0	$0	$273,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$187,200	$0	$0	$187,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$187,200	$0	$0	$187,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$0	$0	$139,200
TOTAL				4	$1,025,500	$0	$0	$1,025,500

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES:

JORGE VILLAMIL VILLAMIL Contador Público de ***A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS*** certifica que dicha entidad, identificada con NIT. 900.067.776-1 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la compañía y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Después de revisadas las planillas físicas de los últimos seis meses se comprobaron que se encuentran liquidadas y pagadas en su totalidad sin ninguna observación alguna.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los Quince (15) días del mes de septiembre del año 2023, en Funza (Cundinamarca).

Cordialmente,

JORGE VILLAMIL VILLAMIL
Contador Publico
TP. 144748-T
A&G SERVICIOS E INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.055.630**


VILLAMIL VILLAMIL

APELLIDOS

JORGE ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

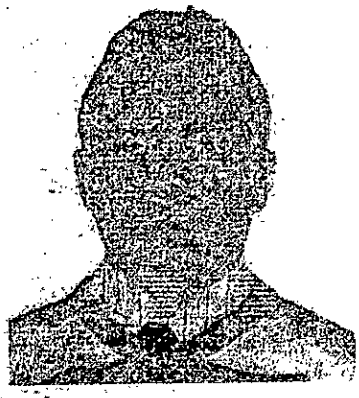



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-DIC-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00139677-M-0080055630-20081219 0008408907A 1 1550028361

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144748-T



JORGE ALBERTO
VILLAMIL VILLAMIL
C.C. 80055630
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154956

68982

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9648598A6D4F9A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ALBERTO VILLAMIL VILLAMIL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80055630 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 144748-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

FUNZA, 15 SEPTIEMBRE 2022

ING MAURICIO SUAREZ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5301008 de 2023

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.


INFORME JURIDICA

ACTA PARCIAL No. 01

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBAS DE PRESIÓN COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO

SE EVIDENCIO CONTACTORES DAÑADOS EN TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS, SE PROCEDE AL CAMBIO DE CONTACTORES PARA EL CORRECTOR CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

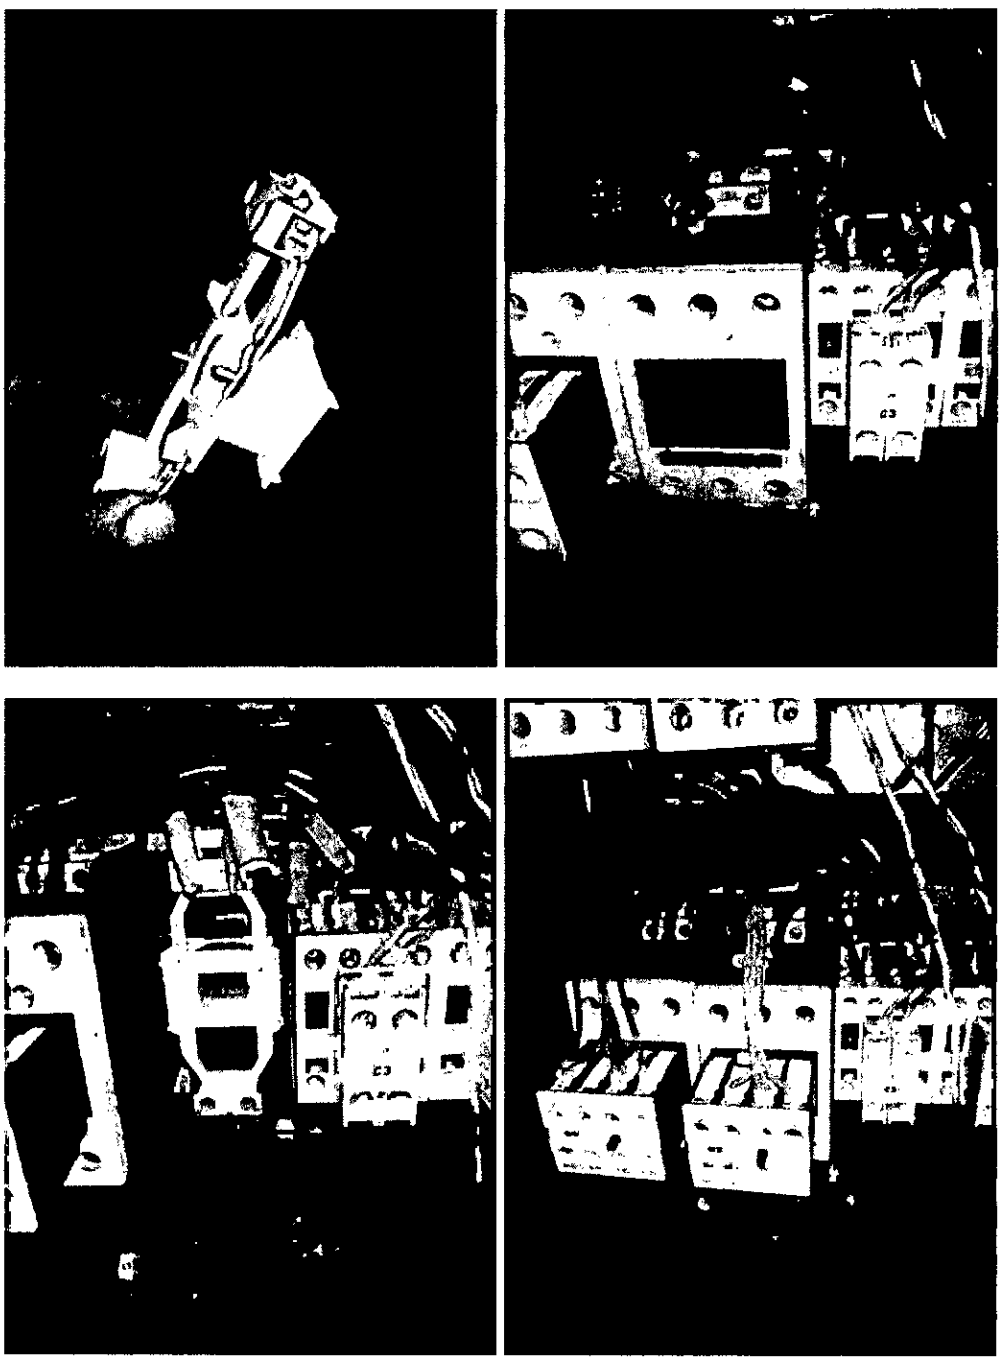


electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

PLAZA NARANJA RED REGULADA


SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA, CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO

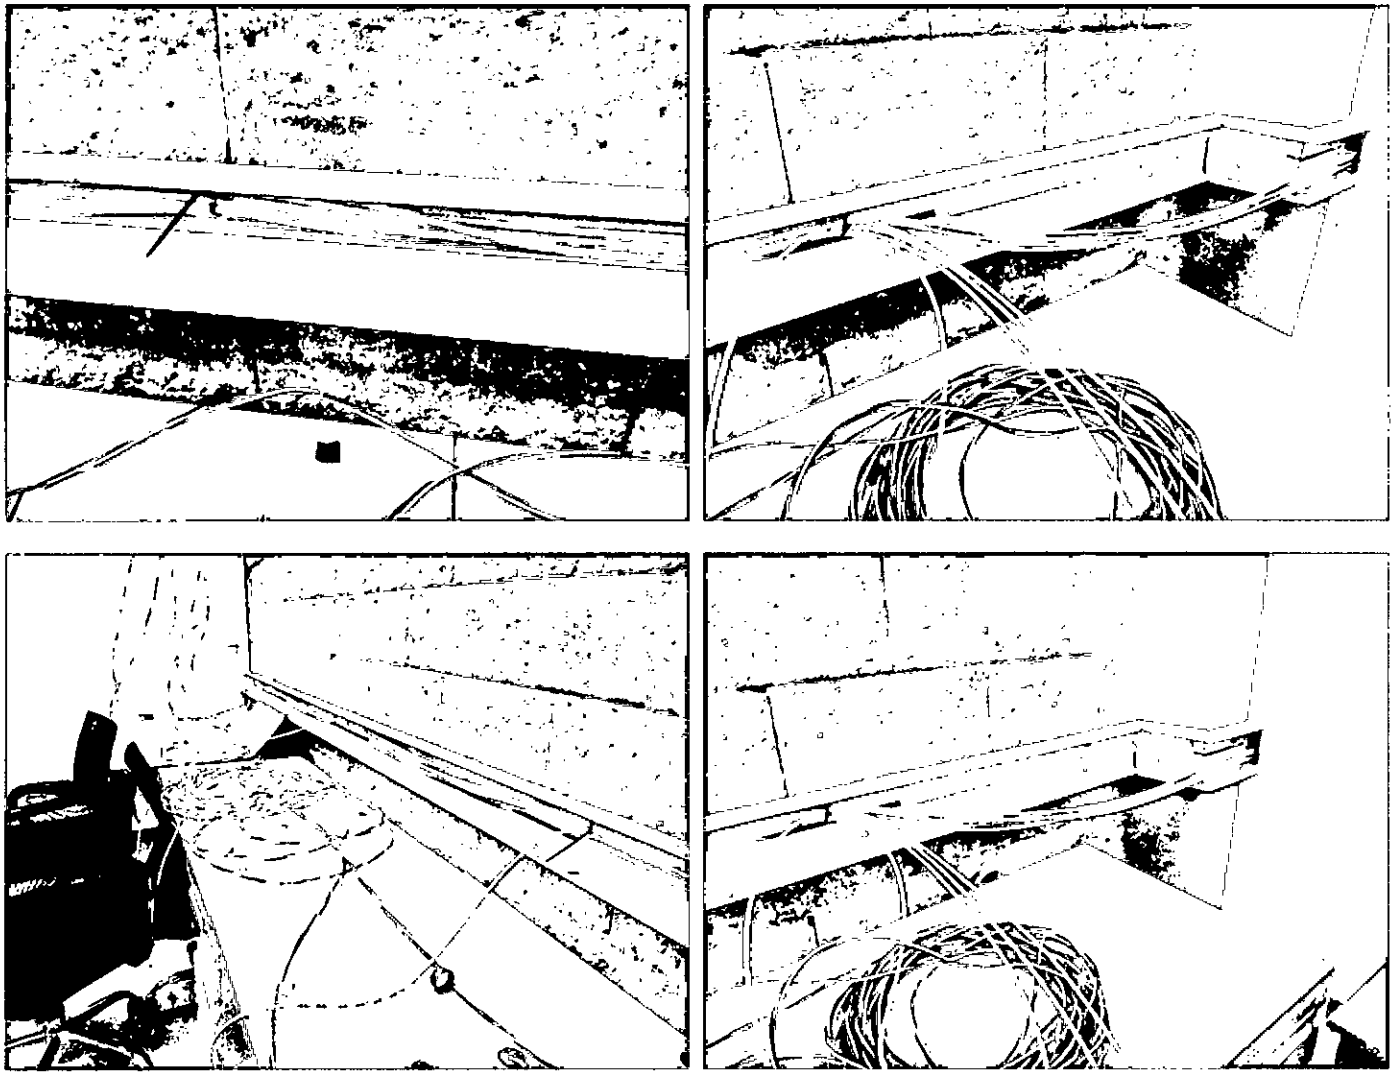

electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.





CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO FASE AZUL Y FASE ROJA POR CANALETA METALICA

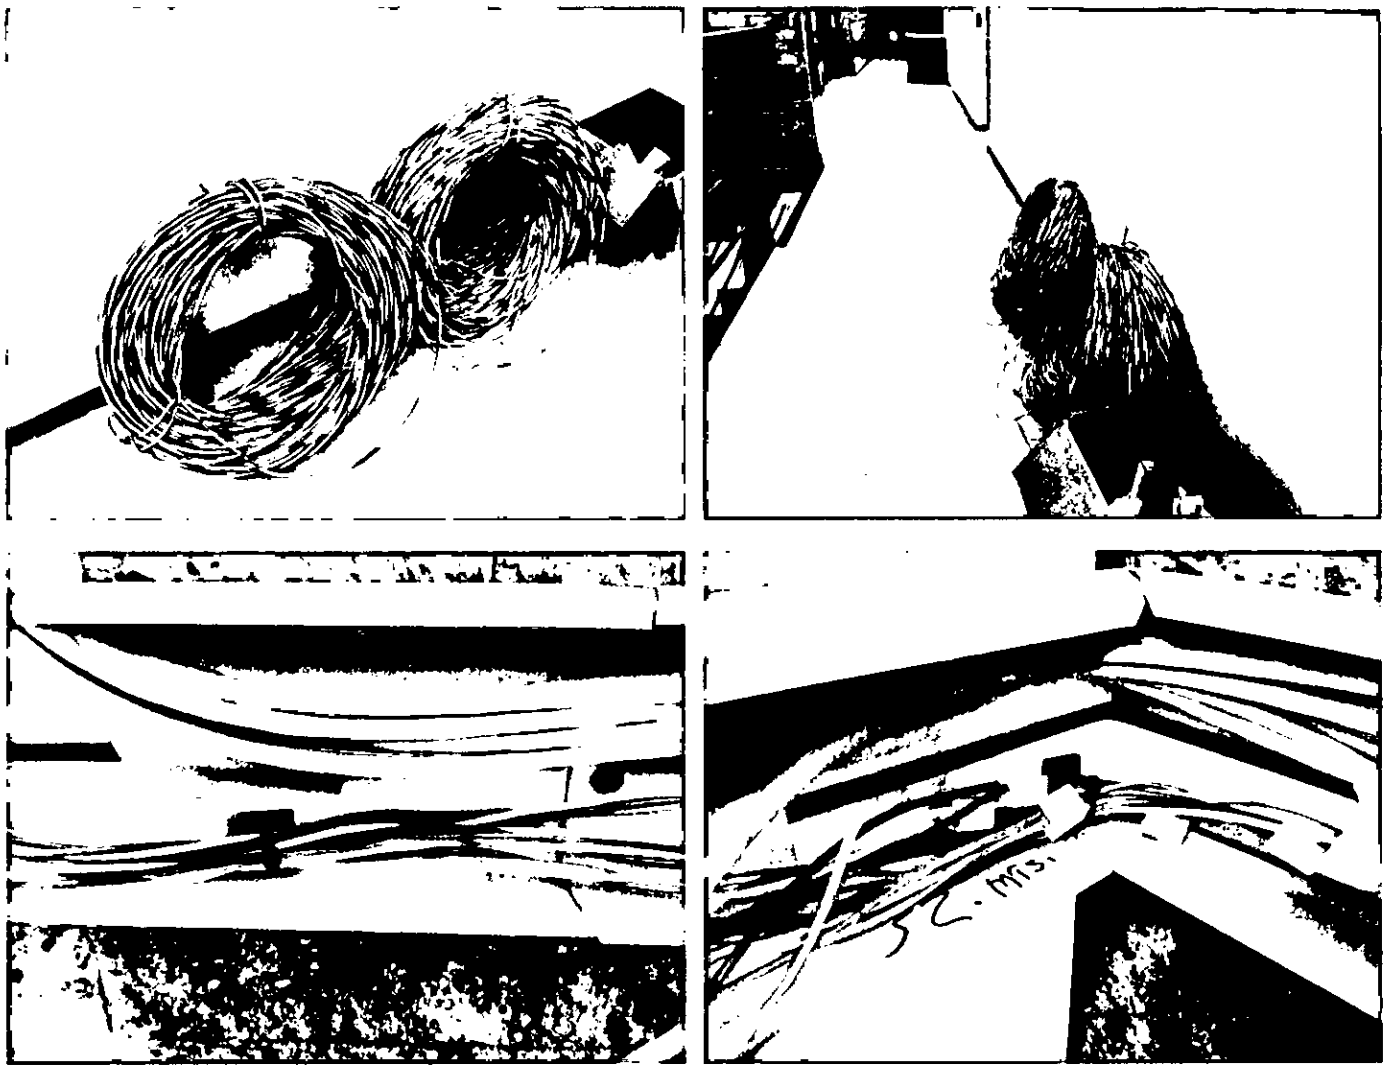

electricos_aygayahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.


CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO FASE AZUL Y FASE ROJA POR CANALETA METALICA

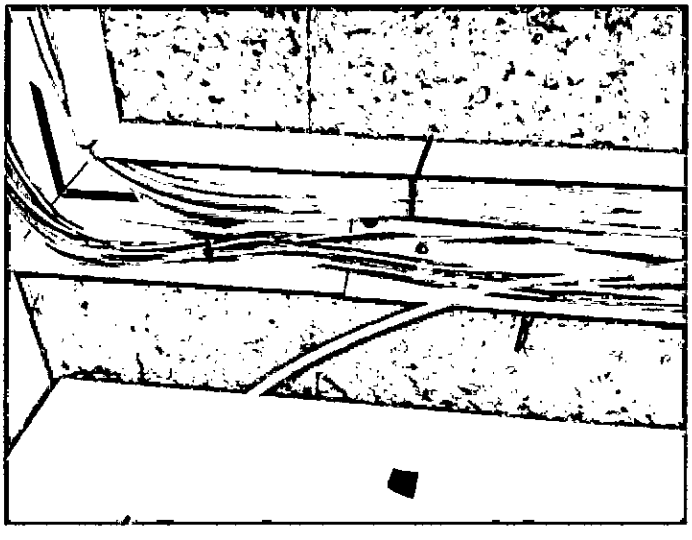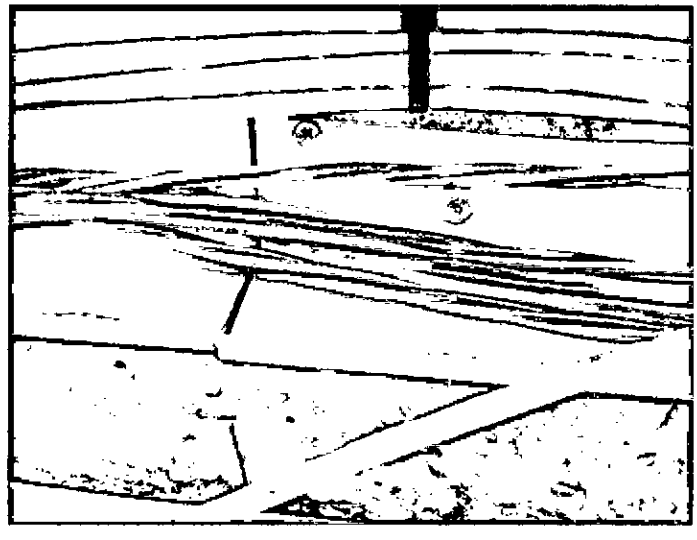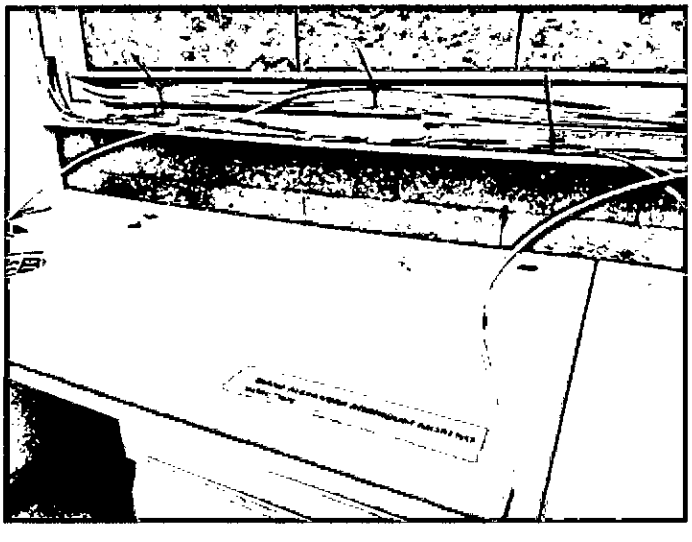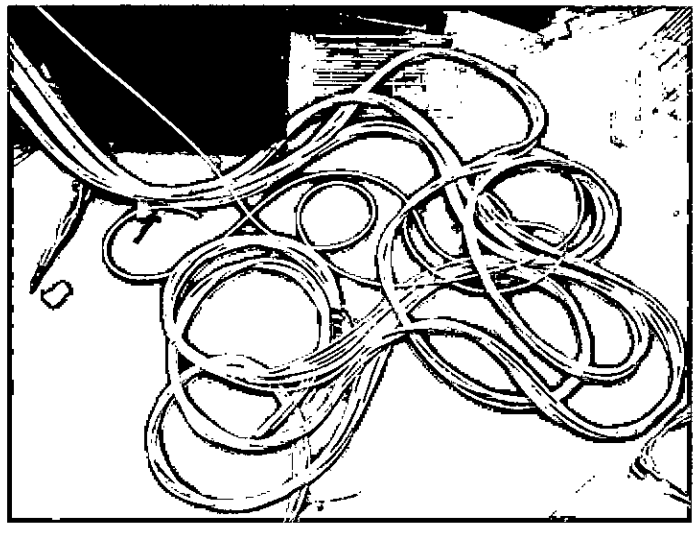electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.


CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO FASE AZUL Y FASE ROJA POR CANALETA METALICA

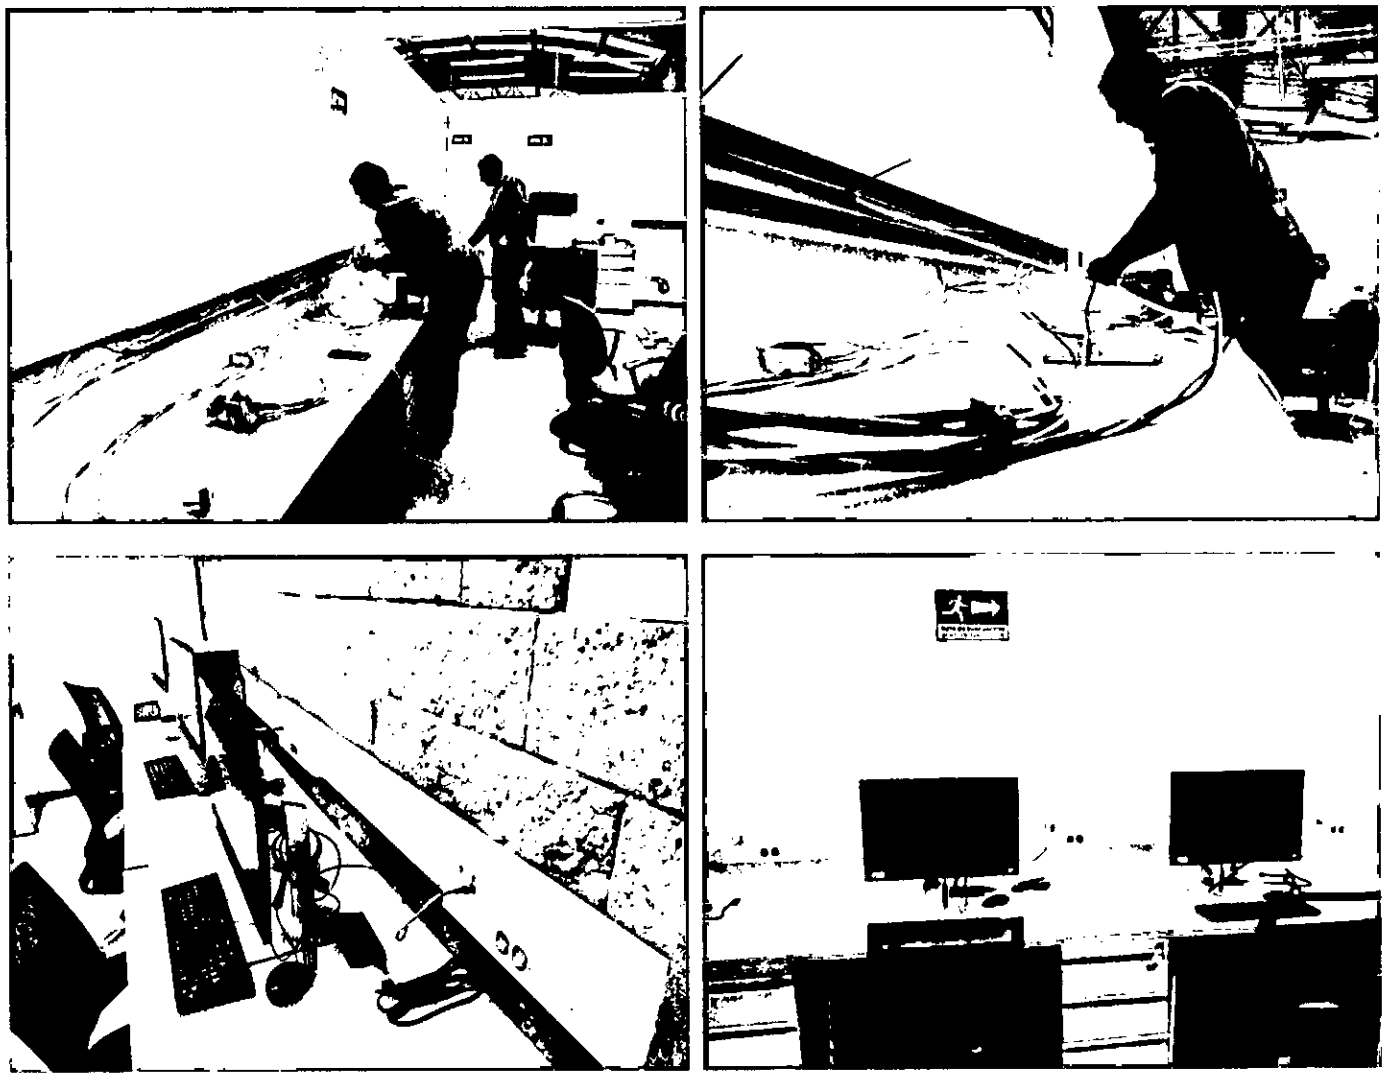



electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

INSTALACION DE SWICHT, PACH PANEL Y PACHTCORD EN RACK DE COMUNICACIONES, ACCESS POINT

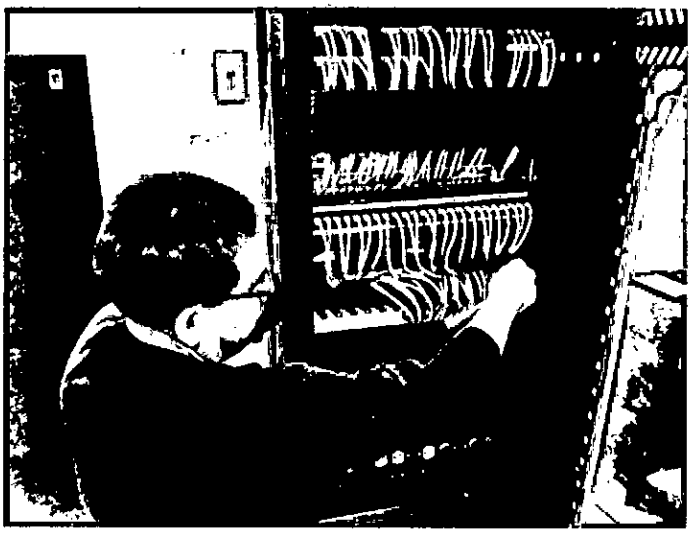

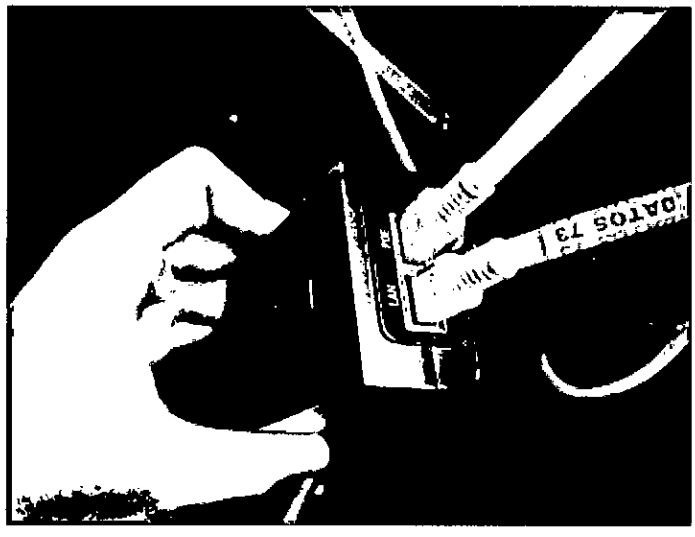

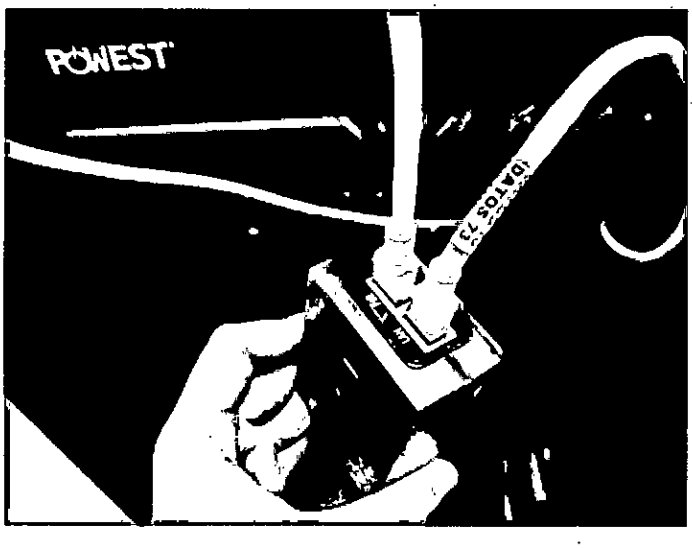





electricos_ayg@yahoo.com
3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, SE REALIZA LA INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL

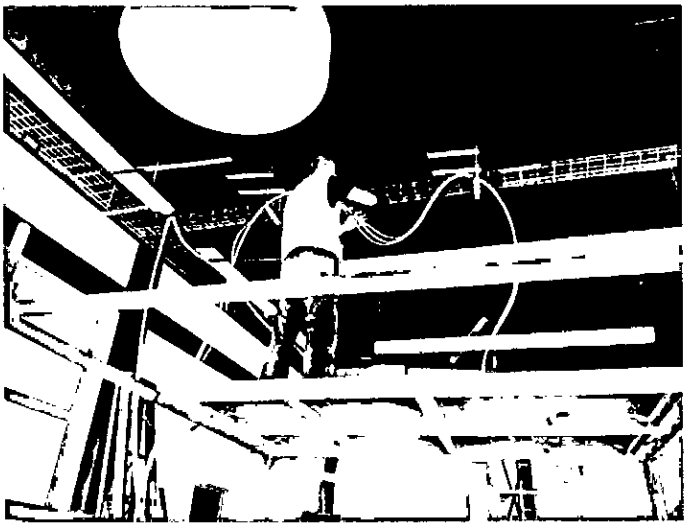

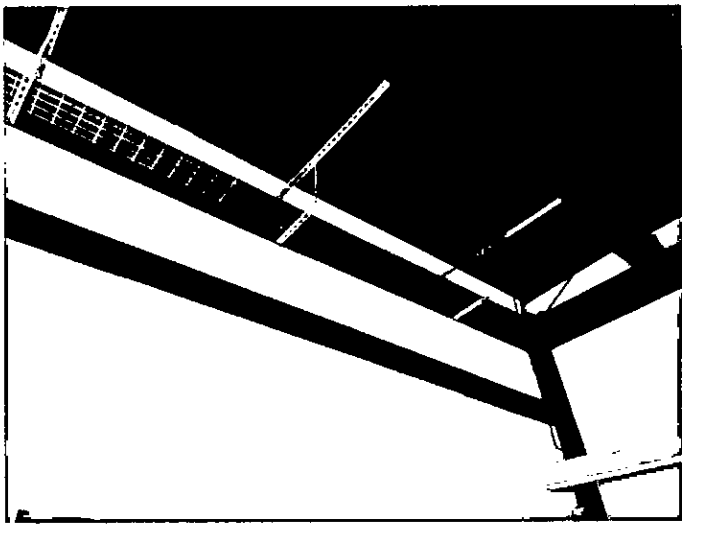
electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

ASCENSOR CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL CEO

SE REALIZA VISITA TÉCNICA EN ASCENSOR DEL CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIO DAÑOS EN LOS RELEVOS Y TEMPORIZADOR DEL TABLERO DE CONTROL, POR LO QUE PROCEDIMOS A DESMONTARLOS PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO



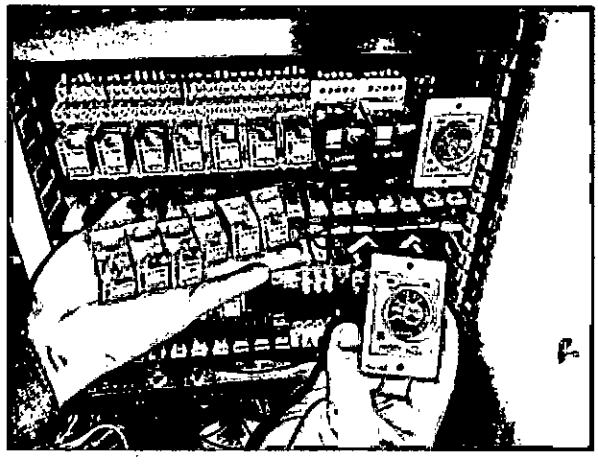









electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SE REALIZA EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE RELEVOS Y TEMPORIZADOR EN TABLERO DE CONTROL

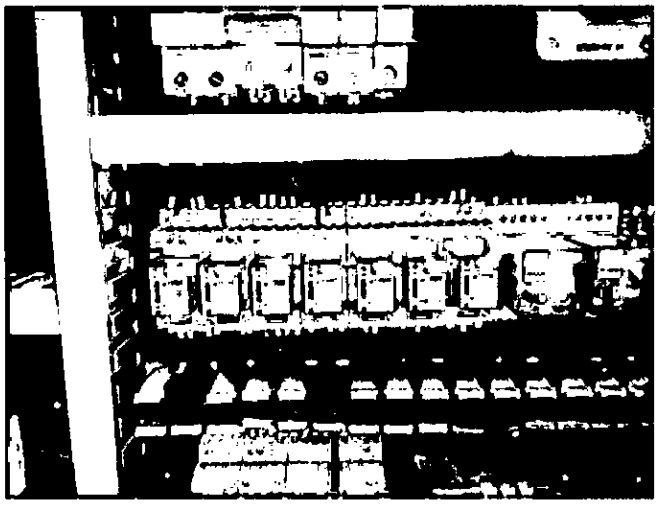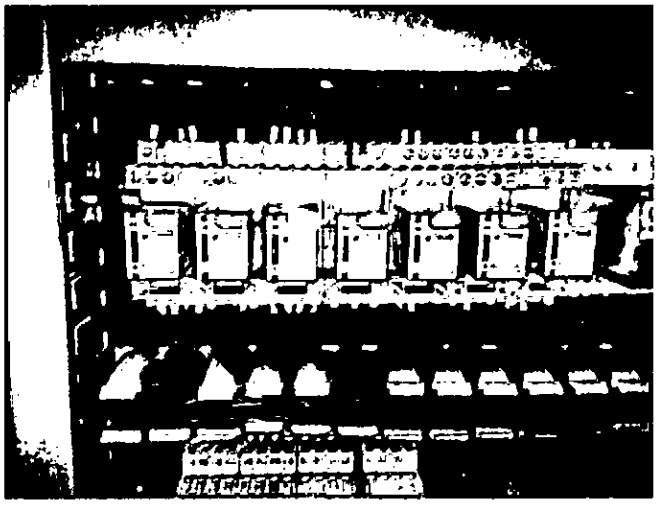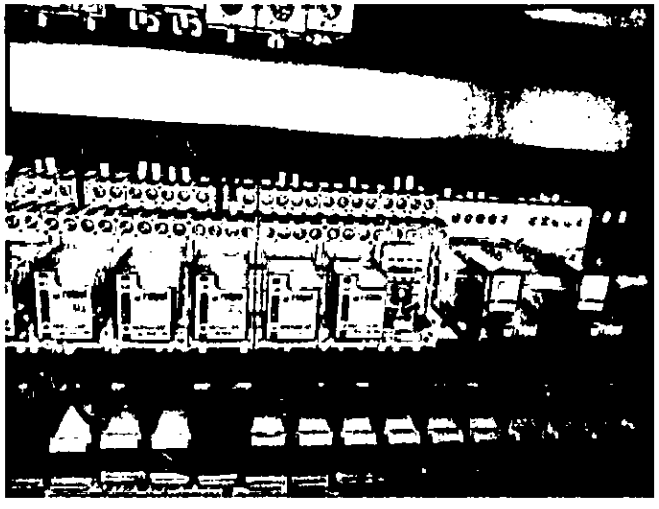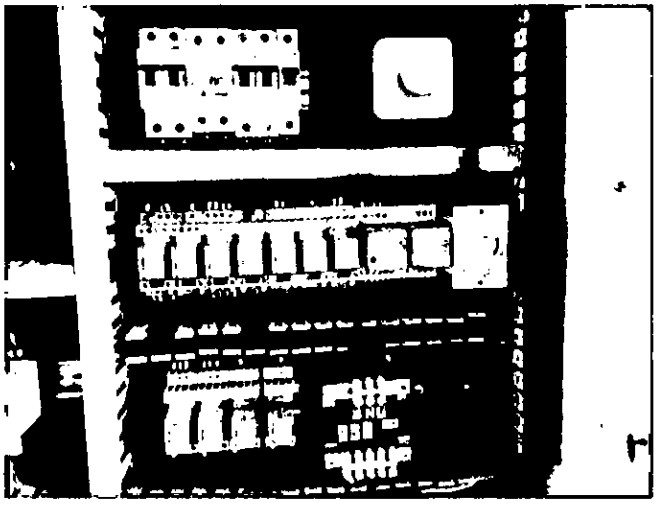electricos_aygayahoo.com
3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

FUNZA, 15 SEPTIEMBRE 2022

ING MAURICIO SUAREZ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5301008 de 2023

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.





INFORME EJECUTIVO

ACTA PARCIAL No. 01

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBAS DE PRESIÓN COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO

SE EVIDENCIO CONTACTORES DAÑADOS EN TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS, SE PROCEDE AL CAMBIO DE CONTACTORES PARA EL CORRECTOR CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

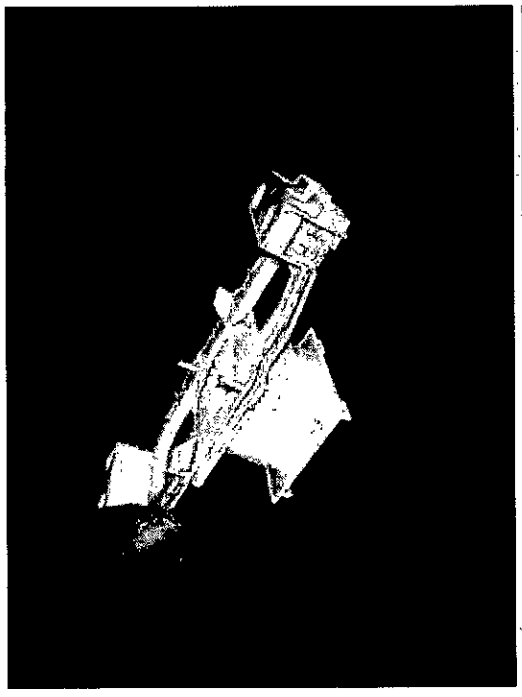
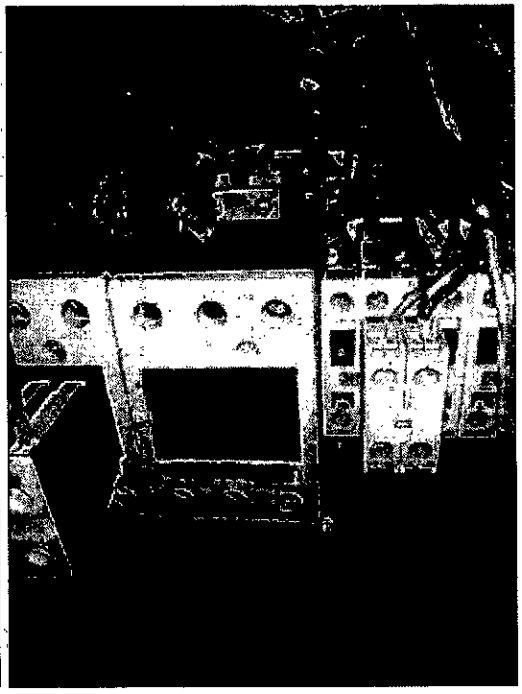
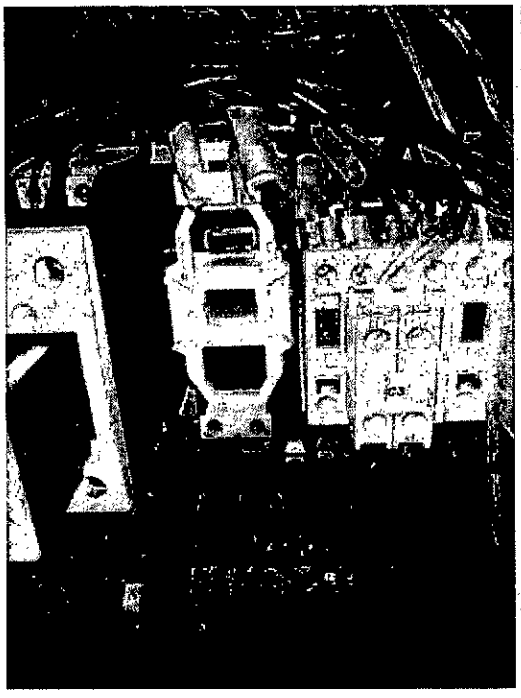
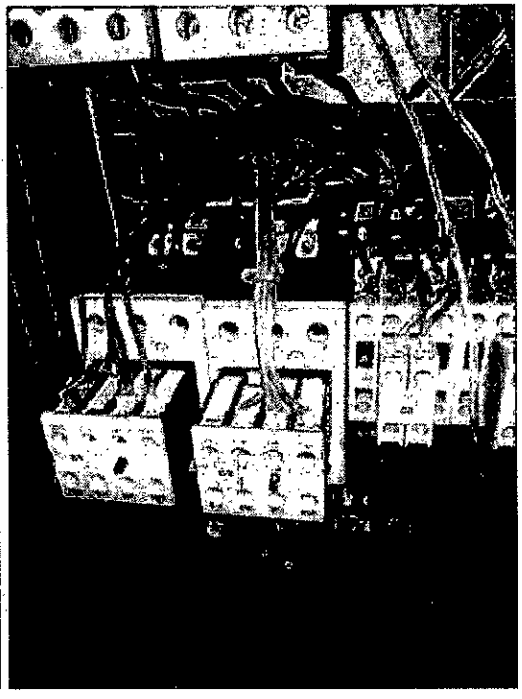





electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

PLAZA NARANJA RED REGULADA

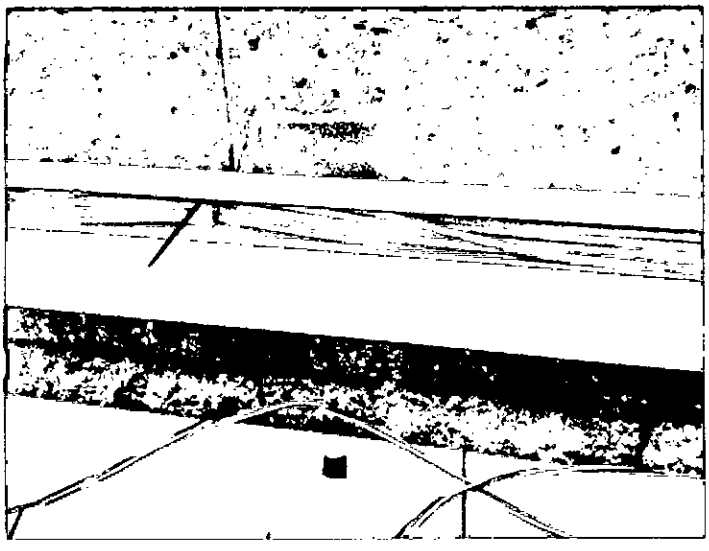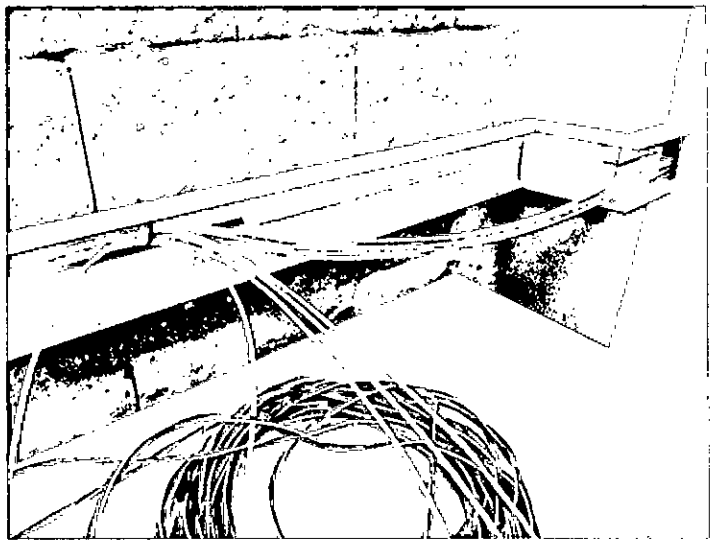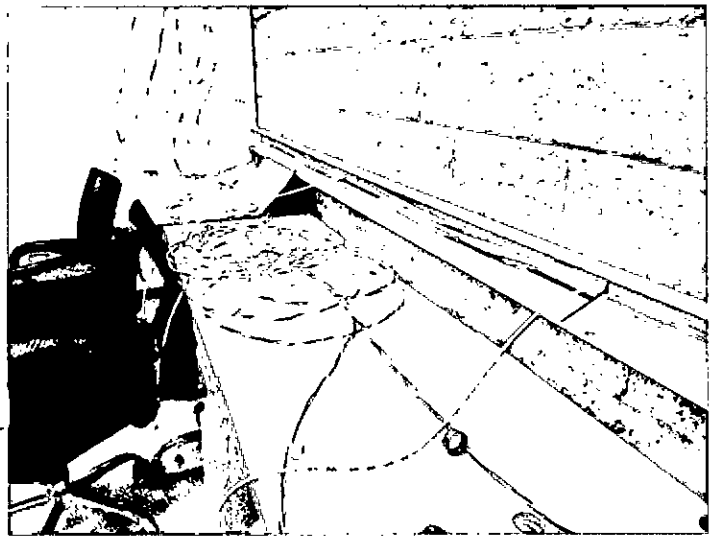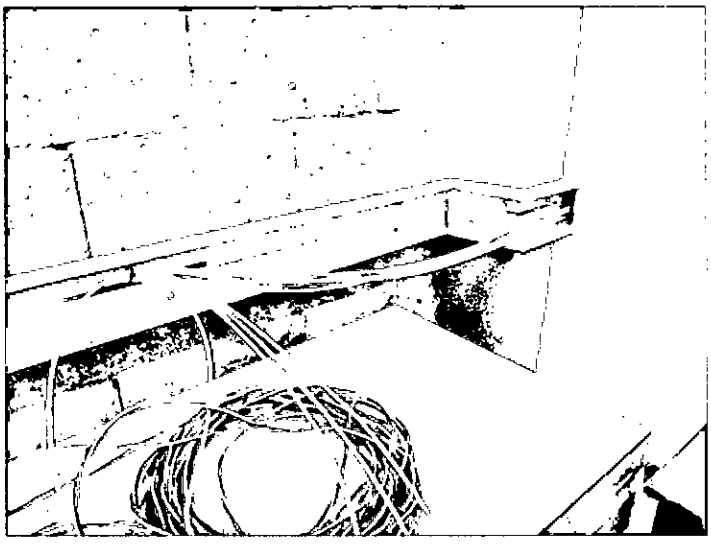
SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA, CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO







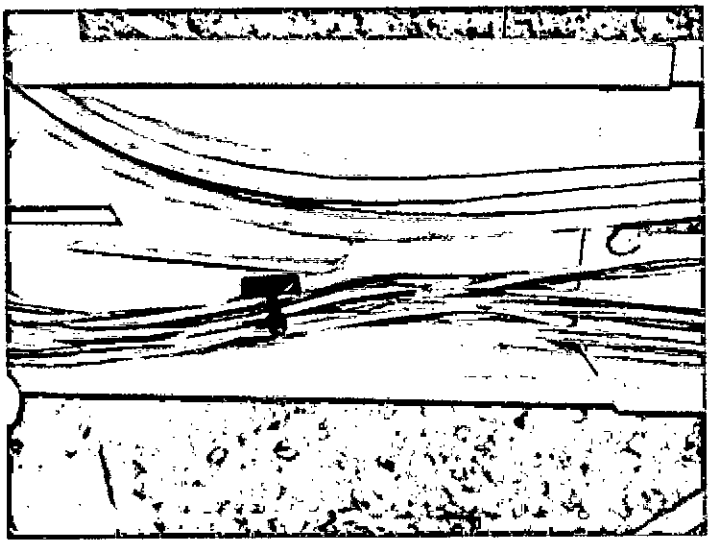
electricos_ayg@yahoo.com 3108164426


A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

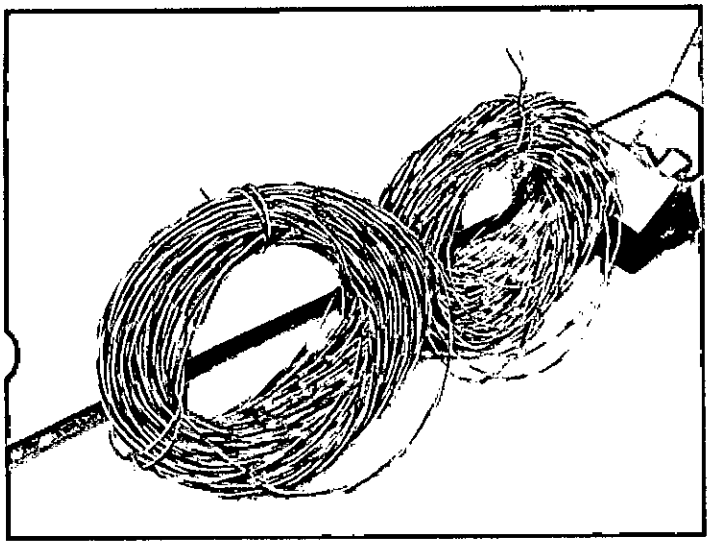CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO FASE AZUL Y FASE ROJA POR CANALETA METALICA

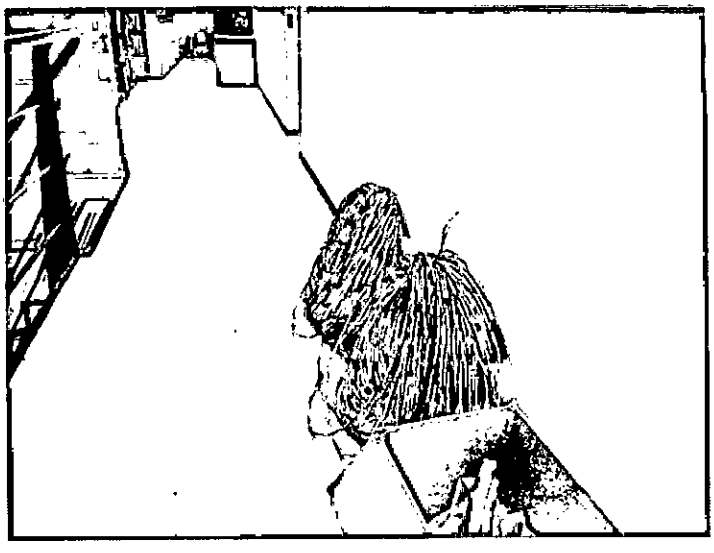









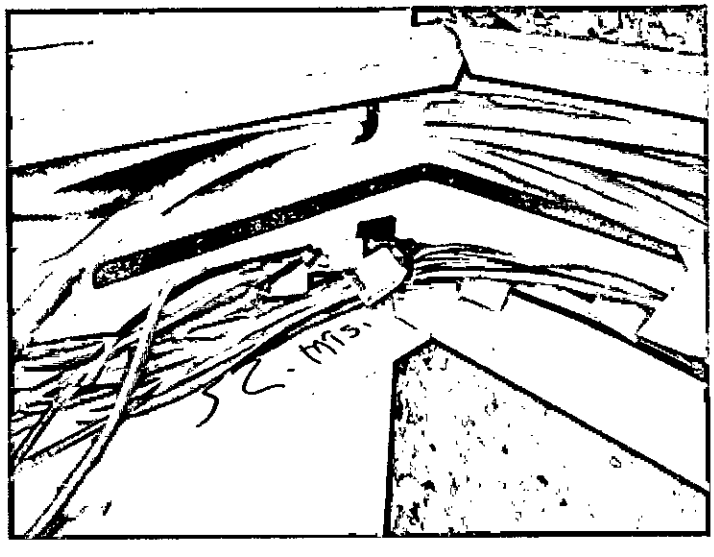

electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.





CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO FASE AZUL Y FASE ROJA POR CANALETA METALICA

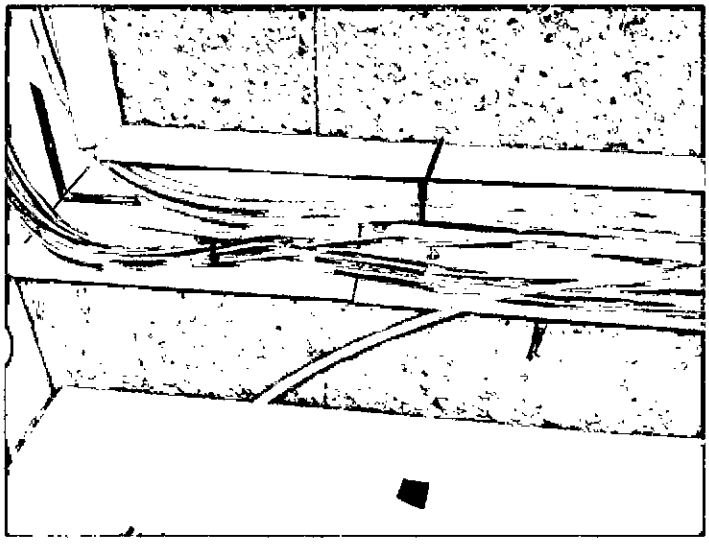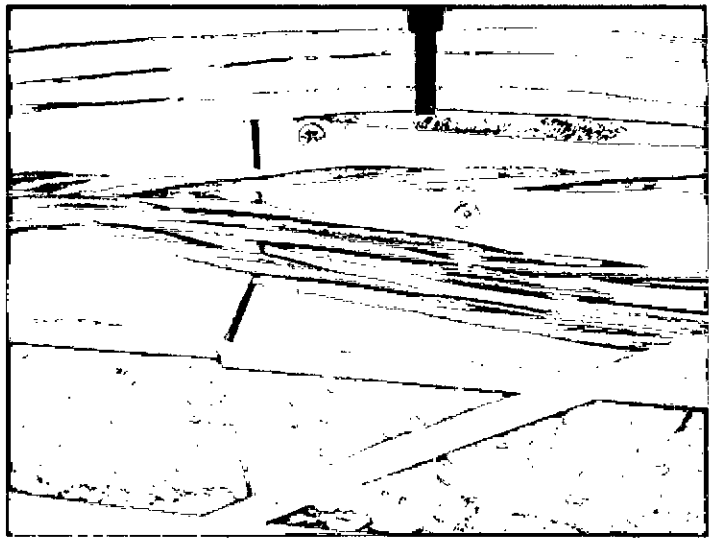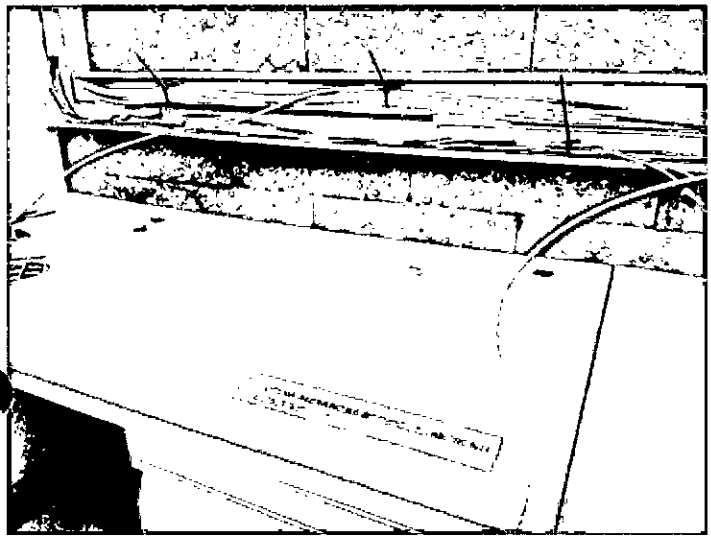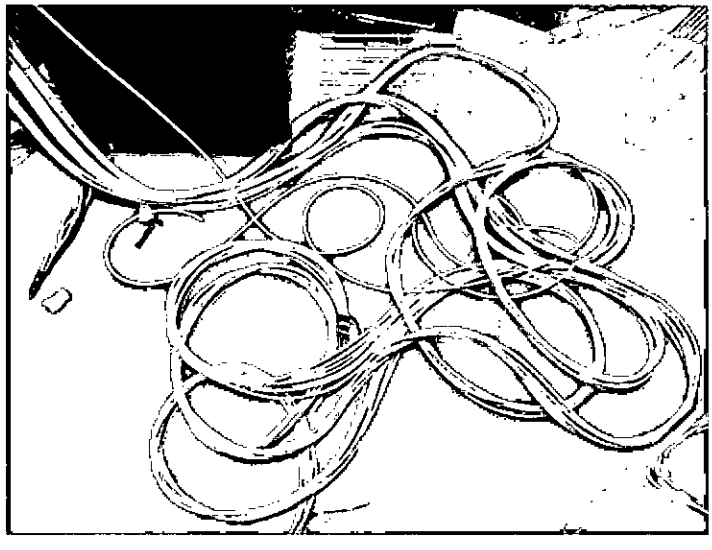electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.


CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, INSTALACIÓN DE CABLE UTP Y CABLE PAR TRENZADO FASE AZUL Y FASE ROJA POR CANALETA METALICA




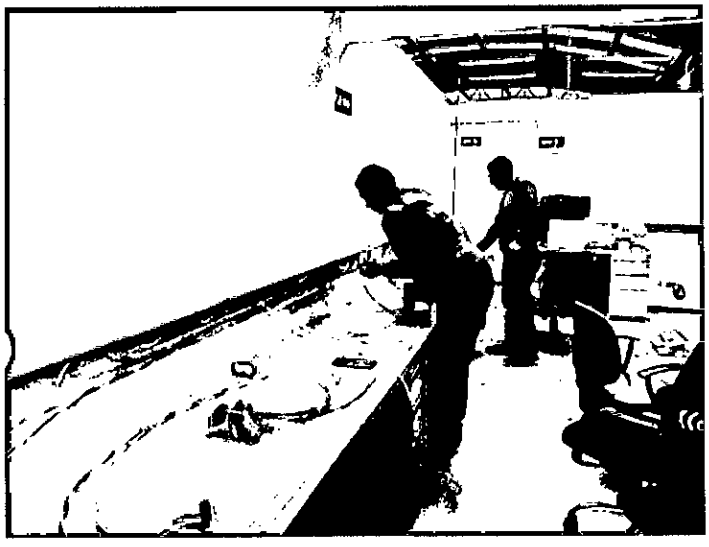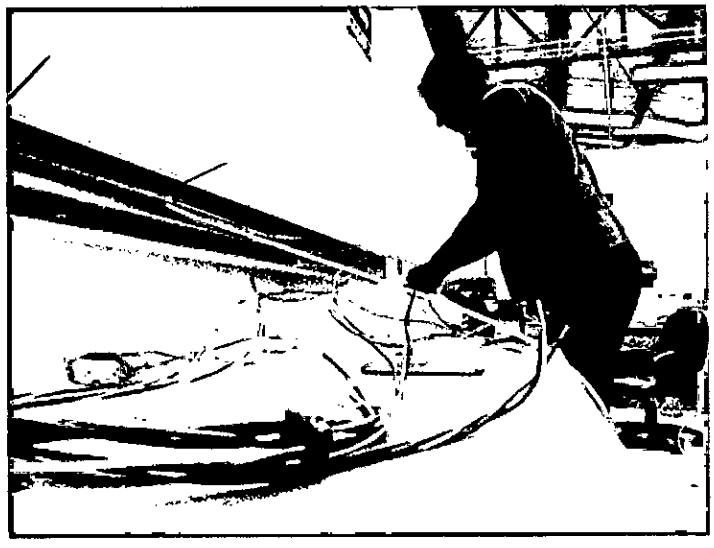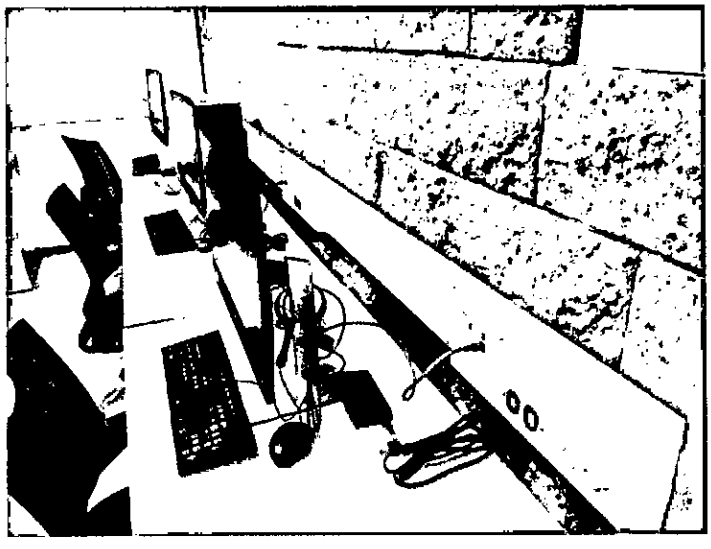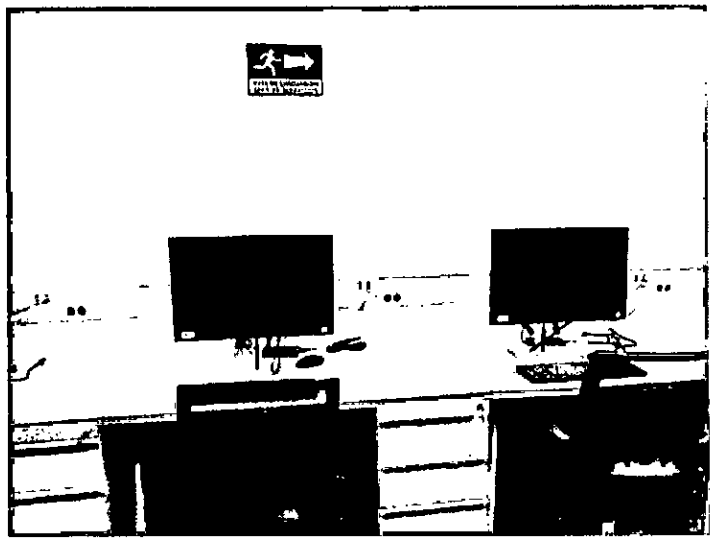


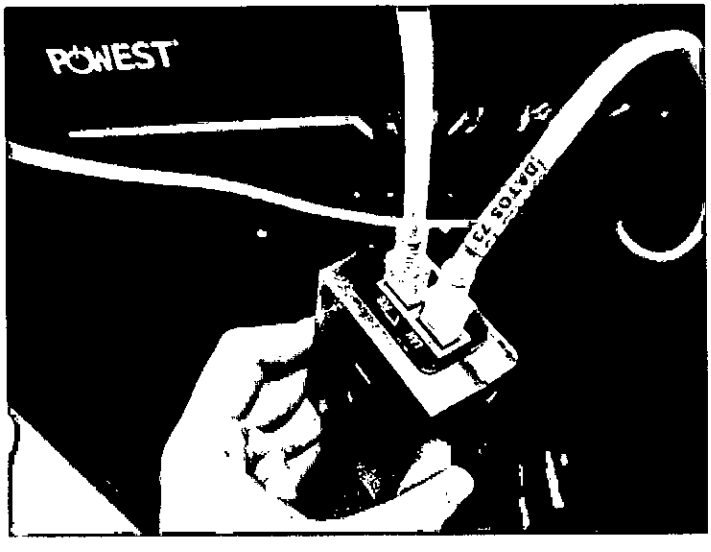
electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

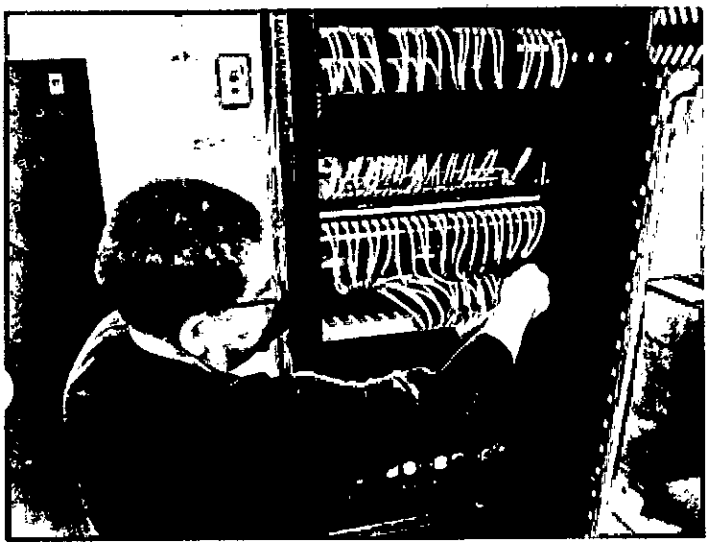INSTALACION DE SWICHT, PACH PANEL Y PACHTCORD EN RACK DE COMUNICACIONES, ACCESS POINT

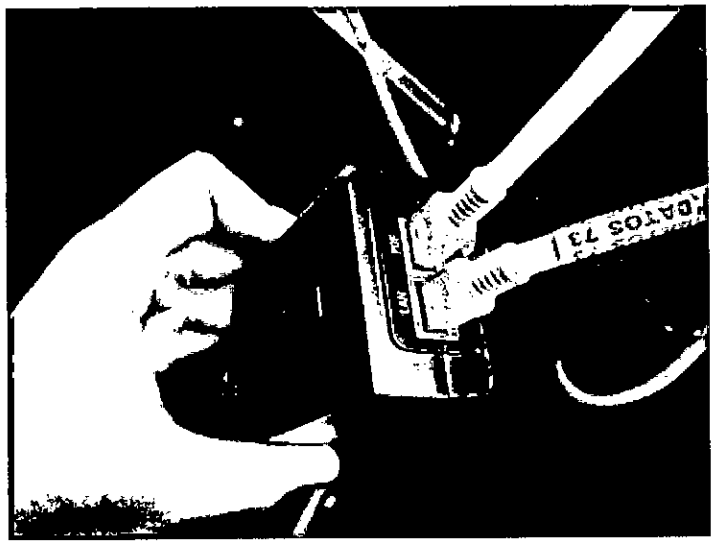









electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RED Y DATOS, SE REALIZA LA INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE CABLOFIL

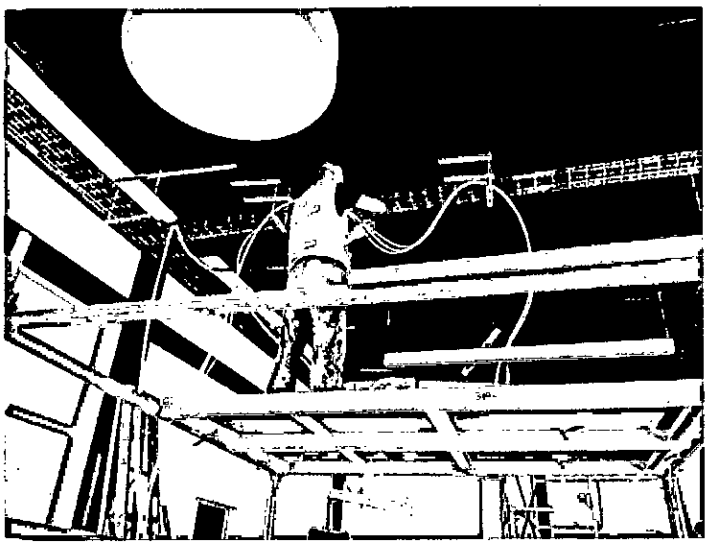

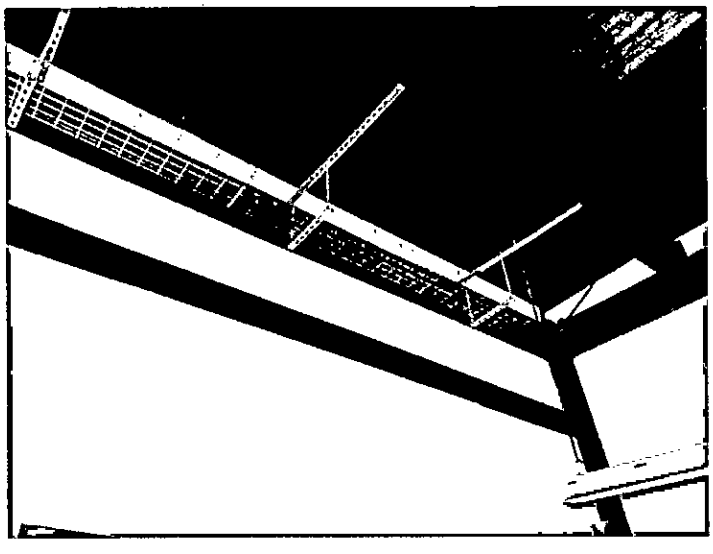
electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

ASCENSOR CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL CEO

SE REALIZA VISITA TÉCNICA EN ASCENSOR DEL CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIO DAÑOS EN LOS RELEVOS Y TEMPORIZADOR DEL TABLERO DE CONTROL, POR LO QUE PROCEDIMOS A DESMONTARLOS PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO



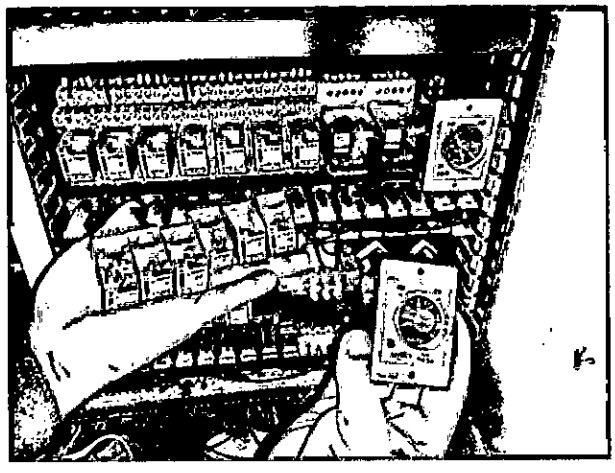








electricos_ayg@yahoo.com
3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

SE REALIZA EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE RELEVOS Y TEMPORIZADOR EN TABLERO DE CONTROL

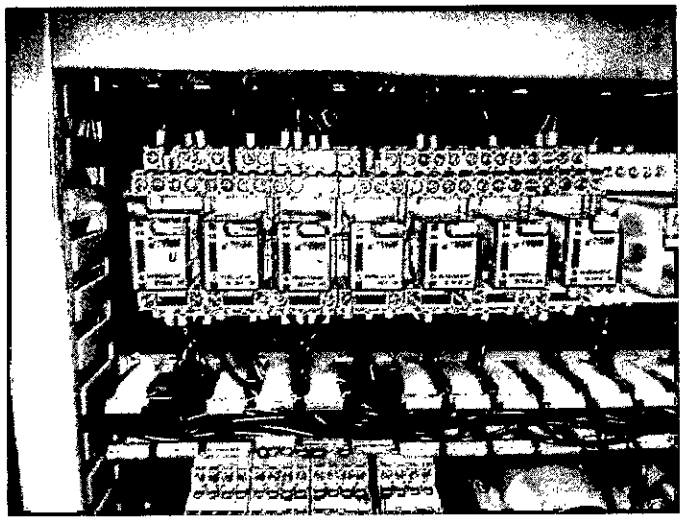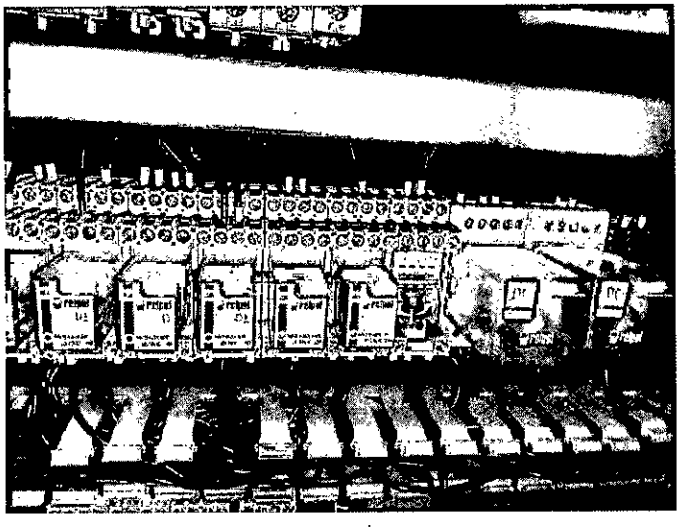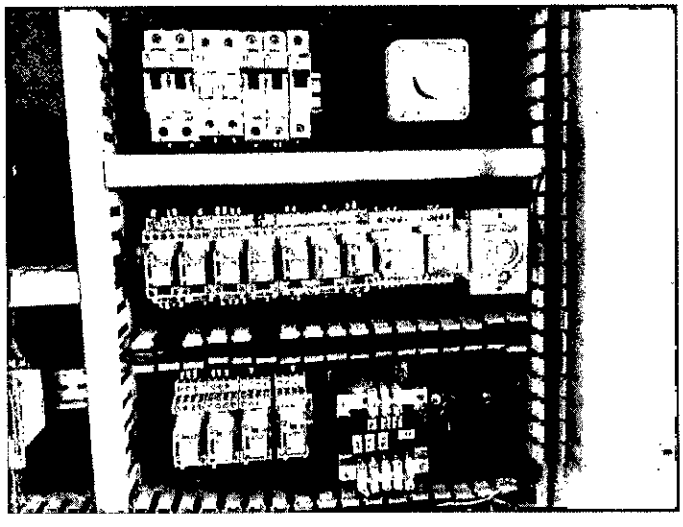electricos_ayg@yahoo.com 3108164426

A&G
Servicios e Ingenieria S.A.S.

FUNZA, SEPTIEMBRE DE 2023
ING. MAURICIO SUAREZ
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5301008 de 2023

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA.

ACTA PARCIAL 01

BOMBAS DE PRESION

COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO CALLE 15 CRA 6TA

ITEM CONTRATO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU
2	DESMONTE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp (incluye DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A TALLER DE MANTENIMIENTO DE CONTRATISTA.	UND	2	$ 675.004,00	$ 1.350.008,00	$ 1.755.010,40
3	DESMONTE Y MONTAJE DE VALVULAS, CHEQUES Y/ O REGISTROS.	UND	1	$ 367.804,00	$ 367.804,00	$ 478.145,20
5	DESMONTE Y MONTAJE DE RODAMIENTO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	UND	2	$ 155.586,00	$ 311.172,00	$ 404.523,60
7	DESMONTE Y MONTAJE DE BOBINADO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	UND	2	$ 736.399,00	$ 1.472.798,00	$ 1.914.637,40
9	DESMONTE Y MONTAJE DE SELLO MECANICO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	UND	2	$ 360.002,00	$ 720.004,00	$ 936.005,20
11	DESMONTE Y MONTAJE DE EMPAQUETADURA PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	UND	2	$ 101.942,00	$ 203.884,00	$ 265.049,20
12	DESMONTE Y MONTAJE DE MANOMETROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS, PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 7.5Hp	UND	1	$ 100.876,00	$ 100.876,00	$ 131.138,80
14	MONTAJE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	UND	2	$ 856.580,00	$ 1.713.160,00	$ 2.227.108,00
17	MANTENIMIENTO A TANQUE HIDROACUMULADOR incluye: Verificación de membrana, Calibración de presión y Limpieza y ajuste al sistema de presión	UND	1	$ 393.067,00	$ 393.067,00	$ 510.987,10
18	CAMBIO DE CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	2	$ 632.808,00	$ 1.265.616,00	$ 1.645.300,80
75	SERVICIO DE DESINUNDACION DE CUARTO DE RED CONTRAINCENDIOS Y/O CUARTO BOMBAS RED DE PRESION	UND	1	$ 1.696.817,00	$ 1.696.817,00	$ 2.205.862,10
222	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL PARA CUARTO DE BOMBAS (BOMBAS Centrifugas de 2HP A 7.5Hp)	UND	1	$ 419.970,00	$ 419.970,00	$ 545.961,00
				SUBTOTAL	$ 10.015.176,00	
				AIU 30%	$ 3.004.552,80	
				TOTAL	$ 13.019.728,80	

RED REGULADA VOZ Y DATOS

PLAZA NARANJA

ITEM CONTRATO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU
131	INSTALACION DE ORGANIZADOR 1U. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 164.056,00	$ 164.056,00	$ 213.272,80
133	INSTALACION DE TROQUELES LOGICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	23	$ 39.667,00	$ 912.341,00	$ 1.186.043,30
134	INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	23	$ 39.667,00	$ 912.341,00	$ 1.186.043,30
136	CABLE UTP CAT 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	915	$ 6.114,00	$ 5.594.310,00	$ 7.272.603,00
137	INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	UN	25	$ 18.182,00	$ 454.550,00	$ 590.915,00
138	INSTALACION DE KEYSTONE JACK. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	50	$ 31.812,00	$ 1.590.600,00	$ 2.067.7[illegible]
139	INSTALACION DE CANALETA 12*5 CALIBRE 20 SEGUN NORMA, INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA	ML	46	$ 102.832,00	$ 4.730.272,00	$ 6.149.353,60
142	UPS ONLINE 10 KVA 9KW, BIFÁSICA. VOLTAJE PERMITIDO POR EL RECTIFICADOR 208 VAC - 15% + 33%. VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120/110VAC. FACTOR DE POTENCIA >0,99. REGULACIÓN DE VOLTAJE +/ - 1% LÍNEA-NEUTRO +/- 2% LÍNEA-LÍNEA . PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA Y SOBRECARGA DE BATERÍAS. TIEMPO DE AUTONOMÍA 15 MINUTOS A FULL CARGA. TIEMPO DE CARGA 5 HORAS AL 90% DESPUÉS DE UNA DESCARGA TOTAL. INDICADORES LED (BYPASS, FALLA, BATERÍA, NORMAL), DISPLAY LCD (CAPACIDAD DE LA BATERÍA, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA,MEDICIONES, ESTADO,CONFIGURACIÓN,CONTROL,HISTORIA DE EVENTOS, AUTONOMÍA). INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 24.904.670,00	$ 24.904.670,00	$ 32.376.071,00
147	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS	UND	47	$ 32.589,00	$ 1.531.683,00	$ 1.991.187,90
148	CERTIFICACION DE PUNTO VOZ Y DATOS	UND	47	$ 76.370,00	$ 3.589.390,00	$ 4.666.207,00
150	INSTALACION TOMAS RED REGULADA COLOR NARANJA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	23	$ 67.760,00	$ 1.558.480,00	$ 2.026.024,00
151	CABLE PAR TRENZADO 3X12 LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	330	$ 17.325,00	$ 5.717.250,00	$ 7.432.42
153	PACH PANEL CATEGORIA 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 2.004.367,00	$ 2.004.367,00	$ 2.605.677,10
158	BY PASS PARA UPS 10KVA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 7.189.300,00	$ 7.189.300,00	$ 9.346.090,00
161	PATCH CORD RACK 1 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	27	$ 39.929,00	$ 1.078.083,00	$ 1.401.507,90
162	PATCH CORD USUARIO PATCH AZUL. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	27	$ 50.628,00	$ 1.366.956,00	$ 1.777.042,80
163	ESCALERILLA CABLEOFIL 30X10. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	ML	15	$ 97.729,00	$ 1.465.935,00	$ 1.905.715,50
170	ACCESS POINT UNIFI UAP -AC - BANDA DUAL. INCLUYE INSTALACION	UND	2	$ 2.781.914,00	$ 5.563.828,00	$ 7.232.976,40
171	CAJAS, PLASTICAS, GALVANIZADAS Y/O RADWELL, LA QUE APLIQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	23	$ 36.258,00	$ 833.934,00	$ 1.084.114,20

172	SWITCH ADMINISTRABLE 48 PUERTOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 4.354.050,00	$ 4.354.050,00	$ 5.660.265,00
181	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	6	$ 25.285,00	$ 151.710,00	$ 197.223,00
188	CAMBIO DE TOMACORRIENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	23	$ 18.001,00	$ 414.023,00	$ 538.229,90
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RACK DE COMUNICACIONES 24/48 PUNTOS DE RED ,PEINADO Y MARQUILLADO DE PUNTOS	UND	1	$ 1 643 491,00	$ 1.643.491,00	$ 2.136.538,30
246	Mantenimiento a circuito de red regulada, voz y datos existentes, incluye revision y adecuacion de jacks, pach panel, pacht cord.	UND	26	$ 127.500,00	$ 3.315.000,00	$ 4.309.500,00

SEDE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA NUEVA						
ITEM CONTRATO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU
130	INSTALACION CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 581.365,00	$ 581.365,00	$ 755.774,50
131	INSTALACION DE ORGANIZADOR 1U. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	2	$ 164.056,00	$ 328.112,00	$ 426.545,60
132	INSTALACION DE BANDEJA DESLIZABLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 421.868,00	$ 421.868,00	$ 548.428,40
133	INSTALACION DE TROQUELES LOGICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	24	$ 39.667,00	$ 952.008,00	$ 1.237.610,40
134	INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	24	$ 39.667,00	$ 952.008,00	$ 1.237.610,40
136	CABLE UTP CAT 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	572	$ 6.114,00	$ 3.497.208,00	$ 4.546.370,40
137	INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	UN	24	$ 18.182,00	$ 436.368,00	$ 567.278,40
138	INSTALACION DE KEYSTONE JACK. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	24	$ 31.812,00	$ 763.488,00	$ 992.534,40
139	INSTALACION DE CANALETA 12*5 CALIBRE 20 SEGUN NORMA, INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA	ML	48	$ 102.832,00	$ 4.935.936,00	$ 6.416.716,80
140	GABINETE TIPO RACK . INCLUYE PUERTA REFORZADA REF. PB-3890R CON VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 3.508.539,00	$ 3.508.539,00	$ 4.561.100,70
142	UPS ONLINE 10 KVA 9KW, BIFÁSICA. VOLTAJE PERMITIDO POR EL RECTIFICADOR 208 VAC - 15% + 33%. VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120/110VAC. FACTOR DE POTENCIA >0,99. REGULACIÓN DE VOLTAJE +/ - 1% LÍNEA-NEUTRO +/- 2% LÍNEA-LÍNEA . PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA Y SOBRECARGA DE BATERÍAS. TIEMPO DE AUTONOMÍA 15 MINUTOS A FULL CARGA. TIEMPO DE CARGA 5 HORAS AL 90% DESPUÉS DE UNA DESCARGA TOTAL. INDICADORES LED (BYPASS, FALLA, BATERÍA, NORMAL), DISPLAY LCD (CAPACIDAD DE LA BATERÍA, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA,MEDICIONES, ESTADO,CONFIGURACIÓN,CONTROL,HISTORIA DE EVENTOS, AUTONOMÍA). INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 24.904.670,00	$ 24.904.670,00	$ 32.376.071,00
146	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA: INCLUYE CABLE CU #2 HASTA 5M, 1 VARILLA COPPERWELD 2,44 X 5/8, SOLDADURA CADWELL Y CAJA DE INSPECCION 30X30. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	GLOBAL	1	$ 1.196.647,00	$ 1.196.647,00	$ 1.555.641,10
147	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS	UND	24	$ 32.589,00	$ 782.136,00	$ 1.016.776,80
148	CERTIFICACION DE PUNTO VOZ Y DATOS	UND	24	$ 76.370,00	$ 1.832.880,00	$ 2.382.744,00
150	INSTALACION TOMAS RED REGULADA COLOR NARANJA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	24	$ 67.760,00	$ 1.626.240,00	$ 2.114.112,00
151	CABLE PAR TRENZADO 3X12 LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	240	$ 17.325,00	$ 4.158.000,00	$ 5.405.400,00
153	PACH PANEL CATEGORIA 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 2.004.367,00	$ 2.004.367,00	$ 2.605.677,10
158	BY PASS PARA UPS 10KVA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 7.189.300,00	$ 7.189.300,00	$ 9.346.090,00
161	PATCH CORD RACK 1 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	24	$ 39.929,00	$ 958.296,00	$ 1.245.784,80
162	PATCH CORD USUARIO PATCH AZUL. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	24	$ 50.628,00	$ 1.215.072,00	$ 1.579.593,60
163	ESCALERILLA CABLEOFIL 30X10. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	ML	36	$ 97.729,00	$ 3.518.244,00	$ 4.573.717,20
164	JACK CATEGORIA 6A AMP METALICOS BLINDADOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	24	$ 60.186,00	$ 1.444.464,00	$ 1.877.803,20
168	ACOMETIDA CONEXIÓN UPS CABLE ENTRADA Y SALIDA CON BORNAS X 4MTS, DUCTO Y/O CORAZA METALICA	UND	1	$ 832.167,00	$ 832.167,00	$ 1.081.817,10
170	ACCESS POINT UNIFI UAP -AC - BANDA DUAL. INCLUYE INSTALACION	UND	1	$ 2.781.914,00	$ 2.781.914,00	$ 3.616.488,20
171	CAJAS, PLASTICAS, GALVANIZADAS Y/O RADWELL, LA QUE APLIQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	24	$ 36.258,00	$ 870.192,00	$ 1.131.249,60

175	CONSTRUCCION PARCIAL DE CABLE CU 4#8 + 1#10. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	30	$ 55.431,00	$ 1.662.930,00	$ 2.161.809,00
181	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	6	$ 25.285,00	$ 151.710,00	$ 197.223,00
182	BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A/3X80A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 353.761,00	$ 353.761,00	$ 459.889,30
188	CAMBIO DE TOMACORRIENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	24	$ 18.001,00	$ 432.024,00	$ 561.631,20
190	INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 624.412,00	$ 624.412,00	$ 811.735,60
198	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL HASTA 9KVA, INCLUYE SUMINISTRO CABLE HASTA 20METROS, DUCTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE FIJACION, PARCIAL DESDE CAJA DE MEDIDOR A TABLERO HASTA 6 METROS, PUESTA A TIERRA Y MANO DE OBRA	GLB	1	$ 12.667.431,00	$ 12.667.431,00	$ 16.467.660,30
				SUBTOTAL	$ 172.978.427,00	
				AIU 30%	$ 51.893.528,10	
				TOTAL	$ 224.871.955,10	

ELECTRICIDAD

ADECUACION DE ACOMETIDA

ITEM CONTRATO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU
198	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL HASTA 9KVA, INCLUYE SUMINISTRO CABLE HASTA 20METROS, DUCTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE FIJACION, PARCIAL DESDE CAJA DE MEDIDOR A TABLERO HASTA 6 METROS, PUESTA A TIERRA Y MANO DE OBRA	GLB	1	$ 12.667.431,00	$ 12.667.431,00	$ 16.467.660,30
				SUBTOTAL	$ 12.667.431,00	
				AIU 30%	$ 3.800.229,30	
				TOTAL	$ 16.467.660,30	

ASCENSOR

CENTRO DE ENLACE OPERACIONAL CEO

ITEM CONTRATO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU
87	RELEVO AUXILIAR DE ARRANQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	8	$ 144.244,00	$ 1.153.952,00	$ 1.500.137,60
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	UND	1	$ 910.410,00	$ 910.410,00	$ 1.183.533,00
				SUBTOTAL	$ 2.064.362,00	
				AIU 30%	$ 619.308,60	
				TOTAL	$ 2.683.670,60	

TOTAL CONSOLIDADO 01 2023	$ 257.043.014,80

Son: Doscientos cincuenta y siete millones cuarenta y tres mil catorce pesos con cincuenta centavos

RODRIGO ACOSTA GARZON
A&G SERVICIOS E INGENIERIA S.AS.
NIT. 900.067.776-1

172	SWITCH ADMINISTRABLE 48 PUERTOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 4.354.050,00	$ 4.354.050,00	$ 5.660.265,00

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL **INFORME DE SUPERVISIÓN**	FUNZA ciudad líder	11-FR-83 Versión: 00 Fecha: 2023-03-06

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: __X___ Final: _____	Fecha de elaboración: 15/09/2023
Periodo del informe	Desde: 25 de Agosto de 2023	Hasta: 11 de Septiembre de 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) Secretaría de Infraestructura	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) Construcción y mantenimiento de infraestructura de equipamientos públicos en el municipio de Funza Cundinamarca.
Nombre el programa: Acceso a soluciones de vivienda.	Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
307	**Mantener y/o adecuar 18.750 m2 de equipamientos.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Obra pública		
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5301008		
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES		
Fecha de suscripción del contrato:	24 DE AGOSTO DE 2023		
Fecha de acta de inicio:	25 DE AGOSTO DE 2023		
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Prórrogas del contrato*:	**Fecha:**	**Tiempo de la prórroga:**	**Nueva fecha de terminación:**
Suspensión*:	**Fecha:**	**Tiempo de la suspensión:**	**Nueva fecha de terminación:**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha:**	**Tiempo de la ampliación:**	**Nueva fecha de terminación:**
Valor inicial del contrato:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($520.000.000,00)		
Adiciones del contrato*:	**Fecha:**	**Valor de la adición:**	
Valor final del contrato:			

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
2	DESMONTE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp (incluye DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A TALLER DE MANTENIMIENTO DE CONTRATISTA.	2	UND	$675.004,00	$ 202.501,20	$877.505,20	$1.755.010,40
3	DESMONTE Y MONTAJEDE VALVULAS, CHEQUES Y/ O REGISTROS.	1	UND	$367.804,00	$ 110.341,20	$478.145,20	$478.145,20
5	DESMONTE Y MONTAJE DE RODAMIENTO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	2	UND	$155.586,00	$46.675,80	$202.261,80	$ 404.523,60
7	DESMONTE Y MONTAJE DE BOBINADO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	2	UND	$736.399,00	$ 220.919,70	$957.318,70	$1.914.637,40

9	DESMONTE Y MONTAJE DE SELLO MECANICO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	2	UND	$360.002,00	$ 108.000,60	$468.002,60	$936.005,20
11	DESMONTE Y MONTAJE DE EMPAQUETADURA PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	2	UND	$101.942,00	$30.582,60	$132.524,60	$265.049,20
12	DESMONTE Y MONTAJE DE MANOMETROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS, PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 7.5Hp	1	UND	$100.876,00	$30.262,80	$131.138,80	$131.138,80
14	MONTAJE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	2	UND	$856.580,00	$ 256.974,00	$1.113.554,00	$2.227.108,00
17	MANTENIMIENTO A TANQUE HIDROACUMULADOR incluye: Verificación de membrana, Calibración de presión y Limpieza y ajuste al sistema de presión	1	UND	$393.067,00	$ 117.920,10	$510.987,10	$510.987,10
18	CAMBIO DE CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$632.808,00	$ 189.842,40	$822.650,40	$1.645.300,80
75	SERVICIO DE DESINUNDACION DE CUARTO DE RED CONTRAINCENDIOS Y/O CUARTO BOMBAS RED DE PRESION	1	UND	$1.696.817,00	$ 509.045,10	$2.205.862,10	$2.205.862,10
87	RELEVO AUXILIAR DE ARRANQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	8	UND	$144.244,00	$43.273,20	$187.517,20	$1.500.137,60
130	INSTALACION CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UN	$581.365,00	$ 174.409,50	$755.774,50	$755.774,50
131	INSTALACION DE ORGANIZADOR 1U. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	3	UN	$164.056,00	$49.216,80	$213.272,80	$639.818,40
132	INSTALACION DE BANDEJA DESLIZABLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UN	$421.868,00	$ 126.560,40	$548.428,40	$548.428,40
133	INSTALACION DE TROQUELES LOGICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UN	$39.667,00	$11.900,10	$51.567,10	$2.423.653,70
134	INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UN	$39.667,00	$11.900,10	$51.567,10	$2.423.653,70
136	CABLE UTP CAT 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1487	ML	$ 6.114,00	$1.834,20	$ 7.948,20	$11.818.973,40
137	INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	49	UN	$18.182,00	$5.454,60	$23.636,60	$1.158.193,40
138	INSTALACION DE KEYSTONE JACK. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	74	UN	$31.812,00	$9.543,60	$41.355,60	$3.060.314,40
139	INSTALACION DE CANALETA 12*5 CALIBRE 20 SEGUN NORMA, INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA	94	ML	$102.832,00	$30.849,60	$133.681,60	$12.566.070,40
140	GABINETE TIPO RACK . INCLUYE PUERTA REFORZADA REF. PB- 3890R CON VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UN	$3.508.539,00	$1.052.561,70	$4.561.100,70	$4.561.100,70

142	UPS ONLINE 10 KVA 9KW, BIFÁSICA. VOLTAJE PERMITIDO POR EL RECTIFICADOR 208 VAC - 15% + 33%. VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120/110VAC. FACTOR DE POTENCIA >0,99. REGULACIÓN DE VOLTAJE +/ - 1% LÍNEA-NEUTRO +/- 2% LÍNEA-LÍNEA. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA Y SOBRECARGA DE BATERÍAS. TIEMPO DE AUTONOMÍA 15MINUTOS A FULL CARGA. TIEMPO DE CARGA 5 HORAS AL 90% DESPUÉS DE UNA DESCARGA TOTAL. INDICADORES LED (BYPASS, FALLA, BATERÍA, NORMAL), DISPLAY LCD (CAPACIDAD DE LA BATERÍA, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA, MEDICIONES, ESTADO, CONFIGURACIÓN, CONTROL, HISTORIA DE EVENTOS, AUTONOMÍA). INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	2	UN	$24.904.670,00	$7.471.401,00	$32.376.071,00	$64.752.142,00
146	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA: INCLUYE CABLE CU #2 HASTA 5M, 1 VARILLA COPPERWELD 2,44 X 5/8, SOLDADURA CADWELL Y CAJA DE INSPECCION 30X30. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	GLOBAL	$ 1.196.647,00	$ 358.994,10	$1.555.641,10	$1.555.641,10
147	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS	71	UND	$32.589,00	$9.776,70	$42.365,70	$3.007.964,70
148	CERTIFICACION DE PUNTO VOZ Y DATOS	71	UND	$ 76.370,00	$22.911,00	$99.281,00	$7.048.951,00
150	INSTALACION TOMAS RED REGULADA COLOR NARANJA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UND	$67.760,00	$20.328,00	$88.088,00	$4.140.136,00
151	CABLE PAR TRENZADO 3X12 LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	570	ML	$17.325,00	$5.197,50	$22.522,50	$12.837.825,00
153	PACH PANEL CATEGORIA 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$2.004.367,00	$ 601.310,10	$2.605.677,10	$5.211.354,20
158	BY PASS PARA UPS 10KVA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$7.189.300,00	$2.156.790,00	$9.346.090,00	$18.692.180,00
161	PATCH CORD RACK 1 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	51	UND	$39.929,00	$11.978,70	$51.907,70	$2.647.292,70
162	PATCH CORD USUARIO PATCH AZUL. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	51	UND	$50.628,00	$15.188,40	$65.816,40	$3.356.636,40
163	ESCALERILLA CABLEOFIL 30X10. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	51	ML	$97.729,00	$29.318,70	$127.047,70	$6.479.432,70
164	JACK CATEGORIA 6A AMP METALICOS BLINDADOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	24	UND	$60.186,00	$18.055,80	$78.241,80	$1.877.803,20
168	ACOMETIDA CONEXIÓN UPS CABLE ENTRADA Y SALIDACON BORNAS X 4MTS, DUCTO Y/O CORAZA METALICA	1	UND	$ 832.167,00	$ 249.650,10	$1.081.817,10	$1.081.817,10
170	ACCESS POINT UNIFI UAP -AC - BANDA DUAL. INCLUYE INSTALACION	3	UND	$ 2.781.914,00	$ 834.574,20	$3.616.488,20	$10.849.464,60
171	CAJAS, PLASTICAS, GALVANIZADAS Y/O RADWELL, LA QUE APLIQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UND	$36.258,00	$10.877,40	$47.135,40	$2.215.363,80
172	SWITCH ADMINISTRABLE 48 PUERTOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$4.354.050,00	$1.306.215,00	$5.660.265,00	$11.320.530,00
175	CONSTRUCCION PARCIAL DE CABLE CU 4#8 + 1#10. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	30	ML	$55.431,00	$16.629,30	$72.060,30	$2.161.809,00
181	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	12	UND	$25.285,00	$7.585,50	$32.870,50	$394.446,00
182	BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A/3X80A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UND	$ 353.761,00	$ 106.128,30	$459.889,30	$459.889,30
188	CAMBIO DE TOMACORRIENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UND	$18.001,00	$5.400,30	$23.401,30	$1.099.861,10
190	INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UND	$ 624.412,00	$ 187.323,60	$811.735,60	$811.735,60

198	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL HASTA 9KVA, INCLUYE SUMINISTRO CABLE HASTA 20METROS, DUCTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE FIJACION, PARCIAL DESDE CAJA DE MEDIDOR A TABLERO HASTA 6 METROS, PUESTA A TIERRA Y MANO DE OBRA	2	GLB	$12.667.431,00	$3.800.229,30	$16.467.660,30	$32.935.320,60
222	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL PARA CUARTO DE BOMBAS (BOMBAS Centrifugas de 2HP A 7.5Hp)	1	UND	$419.970,00	$ 125.991,00	$545.961,00	$545.961,00
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	1	UND	$ 910.410,00	$ 273.123,00	$1.183.533,00	$1.183.533,00
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RACK DE COMUNICACIONES 24/48 PUNTOS DE RED ,PEINADO Y MARQUILLADO DE PUNTOS	1	UND	$ 1.643.491,00	$ 493.047,30	$2.136.538,30	$2.136.538,30
246	Mantenimiento a circuito de red regulada, voz y datos existentes, incluye revisión y adecuación de jacks, patch panel, patch cord.	26	UND	$ 127.500,00	$38.250,00	$165.750,00	$4.309.500,00
							$257.043.014,80

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	11 de Septiembre de 2023
Soportes del informe:	Registro fotográfico y memorias de cálculo
Observaciones sobre el informe del contratista:	

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI__X___ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$520.000.000,00		
VALOR ADICIONADO:			
VALOR ACTUAL CONTRATO			
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$257.043.014,80	50,6%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$257.043.014,80	50,6%
SALDO POR EJECUTAR		$262.956.985,20	49,4%

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($257.043.014,80)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI__X___ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL **INFORME DE SUPERVISIÓN**	FUNZA ciudad líder	11-FR-83 Versión: 00 Fecha: 2023-03-06

ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

Soporte de la verificación: Planilla ___X___ Certificación expedida por Representante legal o revisor fiscal ___X____

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Daño o falla en el equipo y/o maquinaria	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Cierre indefinido de los centros de acopio de material eléctrico sobrante de la obra	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Robo del equipo y/o maquinaria	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Enfermedad, sea por Covid-19 u otro tipo de enfermedad de alguno de los miembros del equipo de trabajo del contratista	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Incapacidad de los técnicos, superior a 5 días	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	NO MATERIALIZADO	NO APLICA

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
CUMPLIMIENTO	01	07	2024	X		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	01	01	2026	X		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01	01	2027	X		

(Firma y nombre del supervisor)
(nombre de la dependencia)

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	JUAN PABLO RODRIGUEZ LOPEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 3		11/09/2023
*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.				

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SECRETARÍA JURÍDICA GESTIÓN CONTRACTUAL **INFORME DE SUPERVISIÓN**	FUNZA ciudad líder	11-FR-83 Versión: 00 Fecha: 2023-03-06

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: __X___ Final: _____	Fecha de elaboración: 15/09/2023
Periodo del informe	Desde: 25 de Agosto de 2023	Hasta: 11 de Septiembre de 2023

Contrato celebrado con recursos de Inversión ____X_____ Funcionamiento _____

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable)	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos)
Secretaría de Infraestructura	Construcción y mantenimiento de infraestructura de equipamientos públicos en el municipio de Funza Cundinamarca.
Nombre el programa: Acceso a soluciones de vivienda.	Nombre del subprograma: N/A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
307	**Mantener y/o adecuar 18.750 m2 de equipamientos.**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Obra pública
No. Contrato:	CO1.PCCNTR.5301008
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción del contrato:	24 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de acta de inicio:	25 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Prórrogas del contrato*:	**Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A**
Valor inicial del contrato:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($520.000.000,00)
Adiciones del contrato*:	**Fecha: N/A Valor de la adición: N/A**
Valor final del contrato:	**N/A**

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	AIU	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
2	DESMONTE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp (incluye DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A TALLER DE MANTENIMIENTO DE CONTRATISTA.	2	UND	$675.004,00	$ 202.501,20	$877.505,20	$1.755.010,40
3	DESMONTE Y MONTAJEDE VALVULAS, CHEQUES Y/ O REGISTROS.	1	UND	$367.804,00	$ 110.341,20	$478.145,20	$478.145,20
5	DESMONTE Y MONTAJE DE RODAMIENTO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	2	UND	$155.586,00	$46.675,80	$202.261,80	$ 404.523,60
7	DESMONTE Y MONTAJE DE BOBINADO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	2	UND	$736.399,00	$ 220.919,70	$957.318,70	$1.914.637,40
9	DESMONTE Y MONTAJE DE SELLO MECANICO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	2	UND	$360.002,00	$ 108.000,60	$468.002,60	$936.005,20
11	DESMONTE Y MONTAJE DE EMPAQUETADURA PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	2	UND	$101.942,00	$30.582,60	$132.524,60	$265.049,20

12	DESMONTE Y MONTAJE DE MANOMETROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS, PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 7.5Hp	1	UND	$100.876,00	$30.262,80	$131.138,80	$131.138,80
14	MONTAJE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	2	UND	$856.580,00	$ 256.974,00	$1.113.554,00	$2.227.108,00
17	MANTENIMIENTO A TANQUE HIDROACUMULADOR incluye: Verificación de membrana, Calibración de presión y Limpieza y ajuste al sistema de presión	1	UND	$393.067,00	$ 117.920,10	$510.987,10	$510.987,10
18	CAMBIO DE CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$632.808,00	$ 189.842,40	$822.650,40	$1.645.300,80
75	SERVICIO DE DESINUNDACION DE CUARTO DE RED CONTRAINCENDIOS Y/O CUARTO BOMBAS RED DE PRESION	1	UND	$1.696.817,00	$ 509.045,10	$2.205.862,10	$2.205.862,10
87	RELEVO AUXILIAR DE ARRANQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	8	UND	$144.244,00	$43.273,20	$187.517,20	$1.500.137,60
130	INSTALACION CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UN	$581.365,00	$ 174.409,50	$755.774,50	$755.774,50
131	INSTALACION DE ORGANIZADOR 1U. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	3	UN	$164.056,00	$49.216,80	$213.272,80	$639.818,40
132	INSTALACION DE BANDEJA DESLIZABLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UN	$421.868,00	$ 126.560,40	$548.428,40	$548.428,40
133	INSTALACION DE TROQUELES LOGICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UN	$39.667,00	$11.900,10	$51.567,10	$2.423.653,70
134	INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UN	$39.667,00	$11.900,10	$51.567,10	$2.423.653,70
136	CABLE UTP CAT 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1487	ML	$ 6.114,00	$1.834,20	$ 7.948,20	$11.818.973,40
137	INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	49	UN	$18.182,00	$5.454,60	$23.636,60	$1.158.193,40
138	INSTALACION DE KEYSTONE JACK. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	74	UN	$31.812,00	$9.543,60	$41.355,60	$3.060.314,40
139	INSTALACION DE CANALETA 12*5 CALIBRE 20 SEGUN NORMA, INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA	94	ML	$102.832,00	$30.849,60	$133.681,60	$12.566.070,40
140	GABINETE TIPO RACK . INCLUYE PUERTA REFORZADA REF. PB- 3890R CON VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UN	$3.508.539,00	$1.052.561,70	$4.561.100,70	$4.561.100,70
142	UPS ONLINE 10 KVA 9KW, BIFÁSICA. VOLTAJE PERMITIDO POR EL RECTIFICADOR 208 VAC - 15% + 33%. VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120/110VAC. FACTOR DE POTENCIA >0,99. REGULACIÓN DE VOLTAJE +/ - 1% LÍNEA-NEUTRO +/- 2% LÍNEA-LÍNEA. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA Y SOBRECARGA DE BATERÍAS. TIEMPO DE AUTONOMÍA 15MINUTOS A FULL CARGA. TIEMPO DE CARGA 5 HORAS AL 90% DESPUÉS DE UNA DESCARGA TOTAL. INDICADORES LED (BYPASS, FALLA, BATERÍA, NORMAL), DISPLAY LCD (CAPACIDAD DE LA BATERÍA, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA, MEDICIONES, ESTADO, CONFIGURACIÓN, CONTROL, HISTORIA DE EVENTOS, AUTONOMÍA). INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	2	UN	$24.904.670,00	$7.471.401,00	$32.376.071,00	$64.752.142,00
146	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA: INCLUYE CABLE CU #2 HASTA 5M, 1 VARILLA COPPERWELD 2,44 X 5/8, SOLDADURA CADWELL Y CAJA DE INSPECCION 30X30. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	GLOBAL	$ 1.196.647,00	$ 358.994,10	$1.555.641,10	$1.555.641,10
147	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS	71	UND	$32.589,00	$9.776,70	$42.365,70	$3.007.964,70
148	CERTIFICACION DE PUNTO VOZ Y DATOS	71	UND	$ 76.370,00	$22.911,00	$99.281,00	$7.048.951,00

150	INSTALACION TOMAS RED REGULADA COLOR NARANJA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UND	$67.760,00	$20.328,00	$88.088,00	$4.140.136,00
151	CABLE PAR TRENZADO 3X12 LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	570	ML	$17.325,00	$5.197,50	$22.522,50	$12.837.825,00
153	PACH PANEL CATEGORIA 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$2.004.367,00	$ 601.310,10	$2.605.677,10	$5.211.354,20
158	BY PASS PARA UPS 10KVA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$7.189.300,00	$2.156.790,00	$9.346.090,00	$18.692.180,00
161	PATCH CORD RACK 1 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	51	UND	$39.929,00	$11.978,70	$51.907,70	$2.647.292,70
162	PATCH CORD USUARIO PATCH AZUL. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	51	UND	$50.628,00	$15.188,40	$65.816,40	$3.356.636,40
163	ESCALERILLA CABLEOFIL 30X10. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	51	ML	$97.729,00	$29.318,70	$127.047,70	$6.479.432,70
164	JACK CATEGORIA 6A AMP METALICOS BLINDADOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	24	UND	$60.186,00	$18.055,80	$78.241,80	$1.877.803,20
168	ACOMETIDA CONEXIÓN UPS CABLE ENTRADA Y SALIDACON BORNAS X 4MTS, DUCTO Y/O CORAZA METALICA	1	UND	$ 832.167,00	$ 249.650,10	$1.081.817,10	$1.081.817,10
170	ACCESS POINT UNIFI UAP -AC - BANDA DUAL. INCLUYE INSTALACION	3	UND	$ 2.781.914,00	$ 834.574,20	$3.616.488,20	$10.849.464,60
171	CAJAS, PLASTICAS, GALVANIZADAS Y/O RADWELL, LA QUE APLIQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UND	$36.258,00	$10.877,40	$47.135,40	$2.215.363,80
172	SWITCH ADMINISTRABLE 48 PUERTOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	2	UND	$4.354.050,00	$1.306.215,00	$5.660.265,00	$11.320.530,00
175	CONSTRUCCION PARCIAL DE CABLE CU 4#8 + 1#10. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	30	ML	$55.431,00	$16.629,30	$72.060,30	$2.161.809,00
181	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	12	UND	$25.285,00	$7.585,50	$32.870,50	$394.446,00
182	BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A/3X80A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UND	$ 353.761,00	$ 106.128,30	$459.889,30	$459.889,30
188	CAMBIO DE TOMACORRIENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	47	UND	$18.001,00	$5.400,30	$23.401,30	$1.099.861,10
190	INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	1	UND	$ 624.412,00	$ 187.323,60	$811.735,60	$811.735,60
198	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL HASTA 9KVA, INCLUYE SUMINISTRO CABLE HASTA 20METROS, DUCTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE FIJACION, PARCIAL DESDE CAJA DE MEDIDOR A TABLERO HASTA 6 METROS, PUESTA A TIERRA Y MANO DE OBRA	2	GLB	$12.667.431,00	$3.800.229,30	$16.467.660,30	$32.935.320,60
222	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL PARA CUARTO DE BOMBAS (BOMBAS Centrifugas de 2HP A 7.5Hp)	1	UND	$419.970,00	$ 125.991,00	$545.961,00	$545.961,00
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	1	UND	$ 910.410,00	$ 273.123,00	$1.183.533,00	$1.183.533,00
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RACK DE COMUNICACIONES 24/48 PUNTOS DE RED ,PEINADO Y MARQUILLADO DE PUNTOS	1	UND	$ 1.643.491,00	$ 493.047,30	$2.136.538,30	$2.136.538,30
246	Mantenimiento a circuito de red regulada, voz y datos existentes, incluye revisión y adecuación de jacks, patch panel, patch cord.	26	UND	$ 127.500,00	$38.250,00	$165.750,00	$4.309.500,00
							$257.043.014,80

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	11 de Septiembre de 2023
Soportes del informe:	Registro fotográfico y memorias de cálculo
Observaciones sobre el informe del contratista:	El informe presentado por el contratista cumple con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI __X___ NO_____

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$520.000.000,00		
VALOR ADICIONADO:			
VALOR ACTUAL CONTRATO	$520.000.000,00		
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		$257.043.014,80	49,43%
VALOR TOTAL EJECUTADO		$257.043.014,80	49,43%
SALDO POR EJECUTAR		$262.956.985,20	50,57%

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($257.043.014,80)

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI__X___ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X____

Soporte de la verificación: Planilla ___X___ Certificación expedida por ___X____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Daño o falla en el equipo y/o maquinaria	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Cierre indefinido de los centros de acopio de material eléctrico sobrante de la obra	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Robo del equipo y/o maquinaria	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Enfermedad, sea por Covid-19 u otro tipo de enfermedad de alguno de los miembros del equipo de trabajo del contratista	NO MATERIALIZADO	NO APLICA
Incapacidad de los técnicos, superior a 5 días	NO MATERIALIZADO	NO APLICA

Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	NO MATERIALIZADO	NO APLICA

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
CUMPLIMIENTO	30	06	2024	X		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	31	12	2025	X		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31	12	2026	X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31	12	2023	X		

(Firma y nombre del supervisor)
(nombre de la dependencia)

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

	NOMBRE	CARGO / VINCULACION	FIRMA	FECHA
Revisó	JUAN PABLO RODRIGUEZ LOPEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 3		15/09/2023
*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.				

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE FUNZA CUNINAMARCA

CERTIFICA QUE

A&G SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S. con Nit. 900.067.776-1 a la fecha ha cumplido a satisfacción con la ejecución del contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNINAMARCA**", correspondiente al periodo comprendido del **25 de agosto de 2023 al 11 de septiembre de 2023.**

Que se emitió la factura de venta **No JA 1123** con fecha del 15 de septiembre de 2023 con un valor total incluido el AIU de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($257.043.014,80)**, de los cuales **CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($51.103.114,60)** corresponden a suministro, **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($146.622.281,40)** corresponden a servicios y **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($59.317.618,80)** corresponden a AIU.

Cuadro 1 (Corresponde a ítems contractuales que incluyen material y servicio)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unit Material	Sub Total Material	Vr Unit Material + Servicio	Sub Total Material + Servicio	Sub total incluido AIU 30%
18	CAMBIO DE CONTACTOR PARA BOMBAS DE SUCCION. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	2	$ 189.842,40	$ 379.684,80	$ 632.808,00	$ 1.265.616,00	$ 1.645.300,80
87	RELEVO AUXILIAR DE ARRANQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	8	$ 43.273,20	$ 346.185,60	$ 144.244,00	$ 1.153.952,00	$ 1.500.137,60
130	INSTALACION CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MULTITOMA TIERRA AISLADA 12 SALIDAS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 174.409,50	$ 174.409,50	$ 581.365,00	$ 581.365,00	$ 755.774,50
131	INSTALACION DE ORGANIZADOR 1U. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	3	$ 49.216,80	$ 147.650,40	$ 164.056,00	$ 492.168,00	$ 639.818,40
132	INSTALACION DE BANDEJA DESLIZABLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 126.560,40	$ 126.560,40	$ 421.868,00	$ 421.868,00	$ 548.428,40

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

133	INSTALACION DE TROQUELES LOGICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	47	$ 11.900,10	$ 559.304,70	$ 39.667,00	$ 1.864.349,00	$ 2.423.653,70
134	INSTALACION DE TROQUELES ELECTRICOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	47	$ 11.900,10	$ 559.304,70	$ 39.667,00	$ 1.864.349,00	$ 2.423.653,70
136	CABLE UTP CAT 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	14 87	$ 1.834,20	$ 2.727.455,40	$ 6.114,00	$ 9.091.518,00	$ 11.818.973,40
137	INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	UN	49	$ 5.454,60	$ 267.275,40	$ 18.182,00	$ 890.918,00	$ 1.158.193,40
138	INSTALACION DE KEYSTONE JACK. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	74	$ 9.543,60	$ 706.226,40	$ 31.812,00	$ 2.354.088,00	$ 3.060.314,40
139	INSTALACION DE CANALETA 12*5 CALIBRE 20 SEGUN NORMA, INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA	ML	94	$ 30.849,60	$ 2.899.862,40	$ 102.832,00	$ 9.666.208,00	$ 12.566.070,40
140	GABINETE TIPO RACK . INCLUYE PUERTA REFORZADA REF. PB-3890R CON VIDRIO LAMINADO 3+3 Y CHAPA DE SEGURIDAD PARA CUARTO ELÉCTRICO. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 1.052.561,70	$ 1.052.561,70	$ 3.508.539,00	$ 3.508.539,00	$ 4.561.100,70
142	UPS ONLINE 10 KVA 9KW, BIFÁSICA. VOLTAJE PERMITIDO POR EL RECTIFICADOR 208 VAC - 15% + 33%. VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120/110VAC. FACTOR DE POTENCIA >0,99. REGULACIÓN DE VOLTAJE +/ - 1% LÍNEA-NEUTRO +/- 2% LÍNEA-LÍNEA . PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA Y SOBRECARGA DE BATERÍAS. TIEMPO DE AUTONOMÍA 15 MINUTOS A FULL CARGA. TIEMPO DE CARGA 5 HORAS AL 90% DESPUÉS DE UNA DESCARGA TOTAL. INDICADORES LED (BYPASS, FALLA, BATERÍA, NORMAL), DISPLAY LCD (CAPACIDAD DE LA BATERÍA, CORRIENTE DE CARGA Y DESCARGA,MEDICIONES, ESTADO,CONFIGURACIÓN,CONTROL,HISTORIA DE EVENTOS, AUTONOMÍA). INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	2	$ 7.471.401,00	$ 16.188.035,50	$ 24.904.670,00	$ 49.809.340,00	$ 64.752.142,00
146	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA: INCLUYE CABLE CU #2 HASTA 5M, 1 VARILLA COPPERWELD 2,44 X 5/8, SOLDADURA CADWELL Y CAJA DE INSPECCION 30X30.	GLB	1	$ 358.994,10	$ 358.994,10	$ 1.196.647,00	$ 1.196.647,00	$ 1.555.641,10

contactenos@funza-cundina .gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

	INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA							
150	INSTALACION TOMAS RED REGULADA COLOR NARANJA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	47	$ 20.328,00	$ 955.416,00	$ 67.760,00	$ 3.184.720,00	$ 4.140.136,00
151	CABLE PAR TRENZADO 3X12 LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	570	$ 5.197,50	$ 2.962.575,00	$ 17.325,00	$ 9.875.250,00	$ 12.837.825,00
153	PACH PANEL CATEGORIA 6A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	2	$ 601.310,10	$ 1.202.620,20	$ 2.004.367,00	$ 4.008.734,00	$ 5.211.354,20
158	BY PASS PARA UPS 10KVA. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	2	$ 2.156.790,00	$ 4.313.580,00	$ 7.189.300,00	$ 14.378.600,00	$ 18.692.180,00
161	PATCH CORD RACK 1 MTS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	51	$ 11.978,70	$ 610.913,70	$ 39.929,00	$ 2.036.379,00	$ 2.647.292,70
162	PATCH CORD USUARIO PATCH AZUL. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	51	$ 15.188,40	$ 774.608,40	$ 50.628,00	$ 2.582.028,00	$ 3.356.636,40
163	ESCALERILLA CABLEOFIL 30X10. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.	ML	51	$ 29.318,70	$ 1.495.253,70	$ 97.729,00	$ 4.984.179,00	$ 6.479.432,70
164	JACK CATEGORIA 6A AMP METALICOS BLINDADOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	24	$ 18.055,80	$ 433.339,20	$ 60.186,00	$ 1.444.464,00	$ 1.877.803,20
171	CAJAS, PLASTICAS, GALVANIZADAS Y/O RADWELL, LA QUE APLIQUE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	47	$ 10.877,40	$ 511.237,80	$ 36.258,00	$ 1.704.126,00	$ 2.215.363,80
172	SWITCH ADMINISTRABLE 48 PUERTOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	2	$ 1.306.215,00	$ 2.612.430,00	$ 4.354.050,00	$ 8.708.100,00	$ 11.320.530,00
175	CONSTRUCCION PARCIAL DE CABLE CU 4#8 + 1#10. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	ML	30	$ 16.629,30	$ 498.879,00	$ 55.431,00	$ 1.662.930,00	$ 2.161.809,00
181	BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 20A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	12	$ 7.585,50	$ 91.026,00	$ 25.285,00	$ 303.420,00	$ 394.446,00
182	BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A/3X80A. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 106.128,30	$ 106.128,30	$ 353.761,00	$ 353.761,00	$ 459.889,30
188	CAMBIO DE TOMACORRIENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	47	$ 5.400,30	$ 253.814,10	$ 18.001,00	$ 846.047,00	$ 1.099.861,10
190	INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS. INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA	UN	1	$ 187.323,60	$ 187.323,60	$ 624.412,00	$ 624.412,00	$ 811.735,60
198	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL HASTA 9KVA, INCLUYE SUMINISTRO CABLE HASTA 20METROS, DUCTERIA SEGÚN NORMA, ACCESORIOS DE FIJACION, PARCIAL DESDE CAJA DE MEDIDOR A TABLERO	GLB	2	$ 3.800.229,30	$ 7.600.458,60	$ 12.667.431,00	$ 25.334.862,00	$ 32.935.320,60

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

	HASTA 6 METROS, PUESTA A TIERRA Y MANO DE OBRA							

SUB TOTAL MATERIAL	$	51.103.114,60
SUB TOTAL SERVICIO	$	115.089.822,40
AIU 30% (MATERIAL + SERVICIO)	$	49.857.881,10
TOTAL (MATERIAL + SERVICIO + AIU)	$	216.050.818,10

* Cuadro resumen para actividades contractuales que incluyen suministro y servicio.

Cuadro 2 (Corresponde a ítems contractuales que incluyen servicio únicamente)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU
2	DESMONTE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp (incluye DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A TALLER DE MANTENIMIENTO DE CONTRATISTA.	UN	2	$675.004,00	$1.350.008,00	$1.755.010,40
3	DESMONTE Y MONTAJEDE VALVULAS, CHEQUES Y/ O REGISTROS.	UN	1	$367.804,00	$ 367.804,00	$ 478.145,20
5	DESMONTE Y MONTAJE DE RODAMIENTO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	UN	2	$155.586,00	$ 311.172,00	$ 404.523,60
7	DESMONTE Y MONTAJE DE BOBINADO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	UN	2	$736.399,00	$1.472.798,00	$1.914.637,40
9	DESMONTE Y MONTAJE DE SELLO MECANICO PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	UN	2	$360.002,00	$ 720.004,00	$ 936.005,20
11	DESMONTE Y MONTAJE DE EMPAQUETADURA PARA BOMBA CENTRIFUGA de 7.5Hp	UN	2	$101.942,00	$ 203.884,00	$ 265.049,20
12	DESMONTE Y MONTAJE DE MANOMETROS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE APARATOS, PARA BOMBA CENTRIFUGA de 2HP A 7.5Hp	UN	1	$100.876,00	$ 100.876,00	$ 131.138,80
14	MONTAJE DE BOMBA CENTRIFUGA DE 7.5Hp	UN	2	$856.580,00	$1.713.160,00	$2.227.108,00
17	MANTENIMIENTO A TANQUE HIDROACUMULADOR incluye: Verificación de membrana, Calibración de presión y Limpieza y ajuste al sistema de presión	UN	1	$393.067,00	$ 393.067,00	$ 510.987,10
75	SERVICIO DE DESINUNACION DE CUARTO DE RED CONTRAINCENDIOS Y/O CUARTO BOMBAS RED DE PRESION	UN	1	$ 1.696.817,00	$1.696.817,00	$2.205.862,10

147	MARQUILLADO E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS	UN	71	$32.589,00	$2.313.819,00	$3.007.964,70
148	CERTIFICACION DE PUNTO VOZ Y DATOS	UN	71	$76.370,00	$5.422.270,00	$7.048.951,00
168	ACOMETIDA CONEXIÓN UPS CABLE ENTRADA Y SALIDACON BORNAS X 4MTS, DUCTO Y/O CORAZA METALICA	UN	1	$832.167,00	$ 832.167,00	$1.081.817,10
170	ACCESS POINT UNIFI UAP -AC - BANDA DUAL. INCLUYE INSTALACION	UN	3	$ 2.781.914,00	$8.345.742,00	$10.849.464,60
222	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL PARA CUARTO DE BOMBAS (BOMBAS Centrifugas de 2HP A 7.5Hp)	UN	1	$419.970,00	$ 419.970,00	$ 545.961,00
239	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL: VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO, DE SEGURIDAD Y PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. INCLUYE A CONTROL DE MANIOBRA, MAQUINA Y CUARTO DE MAQUINAS, FOSO Y POZO, CABINA Y HALL, PARA LOGRAR OBTENER LA CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR ES INDISPENSABLE PRESENTAR UNA MINUTA DE MANTENIMIENTOS MENSUALES COMO REQUISITO INDISPENSABLE	UN	1	$910.410,00	$ 910.410,00	$1.183.533,00
244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RACK DE COMUNICACIONES 24/48 PUNTOS DE RED ,PEINADO Y MARQUILLADO DE PUNTOS	UN	1	$ 1.643.491,00	$1.643.491,00	$2.136.538,30
246	MANTENIMIENTO A CIRCUITO DE RED REGULADA, VOZ Y DATOS EXISTENTES, INCLUYE REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE JACKS, PACH PANEL, PACH CORD.	UN	26	$127.500,00	$3.315.000,00	$4.309.500,00

SUB TOTAL SERVICIO	$	31.532.459,00
AIU 30%	$	9.459.737,70
TOTAL (SERVICIO + AIU)	$	40.992.196,70

* Cuadro resumen para actividades contractuales que incluyen servicio UNICAMENTE.

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet
CO-SC-CER116470
CO-ST-CER753753
CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

Cuadro resumen general:

SUB TOTAL MATERIAL (Cuadro 1)	$	51.103.114,60
SUB TOTAL SERVICIO (Cuadro 1 y 2)	$	146.622.281,40
AIU 30%	$	59.317.618,80
TOTAL 1er PAGO	$	257.043.014,80

Se expide en Funza Cundinamarca a los **QUINCE (15)** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **DOS MIL VEINTITRES (2023)**

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Juan Pablo Rodríguez López – Técnico Administrativo Grado 3

C.P. 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza
Tel. +57(1) 823 40 70 / 823 40 71 / 823 40 72 / 823 40 73 Fax. +57(1) 825 76 20

contactenos@funza-cundina a.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

Aplicativo por la Integridad pública — Declaro · Público · Controlo

Función Pública

Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019

Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios (Ley 2013 de 2019)

Consulte aquí el registro de información sobre bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios realizado por las personas naturales o jurídicas según indica la Ley 2013 de 2019.

¿Cómo puedo consultar las declaraciones?

- Para consultar las declaraciones de una persona específica (declarante)
- Para consultar todas las declaraciones de una entidad
- Para consultar las declaraciones por periodo

¿Qué información encontraré en los resultados?

En los resultados de su busqueda encontrará la siguiente información: **Declarante:** nombre o razón social y número de documento de identidad de quien declara; **Entidad:** sobre la cual el declarante registra sus posibles conflictos de intereses; **Cargo/Contratista:** cargo del declarante en la entidad señalada, o si es contratista en ella; **Tipo de publicación:** si la declaración es de Ingreso, Retiro, Periódica u Otra (Ley 2013 de 2019); **Declaración No.:** número y versión de la declaración, y versión que corrige/modifica; **Fecha de publicación:** fecha en la cual el declarante publicó la declaración y **Estado declaración:** Finalizado o En revisión.

El estado Finalizado indica que el sujeto obligado seleccionó su Entidad y Cargo de las listas disponibles en el sistema; En revisión indica que la Entidad o el Cargo fueron diligenciados por el sujeto obligado y el Departamento Administrativo de la Función Pública verificará la información consignada para precisar su validez legal antes de marcar el registro con estado Finalizado.

Realice una consulta

Tipo de persona: JURÍDICA

Razón social:

NIT: 90006777

Nombre entidad:

Fecha de publicación: dd/mm/yyyy hasta dd/mm/yyyy

Buscar | Limpiar búsqueda | Ir a Módulo de reporte de información

RECUERDE QUE: En virtud del principio de buena fe, se presume que la información consignada por los sujetos obligados por la Ley 2013 de 2019 es verídica y, por ende, es de uso legal hasta tanto se desvirtúe con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente.

Si tiene alguna duda o presenta algún inconveniente, escríbanos a: **soporteaplicativointegridad@funcionpublica.gov.co** indicando su requerimiento, nombre, tipo y número de documento y teléfono de contacto.

protección de reCAPTCHA

Resultados de la búsqueda

Declarante	Descargar	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo de publicación	Declaración No.	Fecha de publicación	Estado declaración
AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS NIT-NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - 900067776	Declaración Ley 2013 de 2019	ALCALDIA DE FUNZA	CONTRATISTA	INGRESO	1281391-01 Declaración Inicial	2023-09-18 17:31	FINALIZADO
AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS NIT-NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - 900067776	Declaración Ley 2013 de 2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONTRATISTA	INGRESO	547849-02 Corrección de 547849-01	2022-06-23 07:58	FINALIZADO
AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS NIT-NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - 900067776	Declaración Ley 2013 de 2019	AYG SERVICIOS E INGENIERIA SAS	CONTRATISTA	INGRESO	547849-01 Declaración Inicial	2022-05-16 17:21	EN REVISION

ORDEN DE PAGO No COM-202304826

Nit: 899999433-5

miércoles, 20 de septiembre del 2023

			EQUIPAMIENTOS.)	
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. FUENTE: 51005(R.B. RP PLUSVALIA) META: 307 (MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.)	205,939,900.40
TOTAL PRESUPUESTO				**257,043,014.80**

DERLY JOHANNA ARANGUREN FLOREZ
Elaboró

AREA CONTABLE

Modificó

	ALCALDIA DE FUNZA	Código:	ALCALDIA DE FUNZA
FUNZA ciudad líder	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 2	

ORDEN DE PAGO No COM-202304826

Nit: 899999433-5

miércoles, 20 de septiembre del 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS **Nit/C.C.** 900067776 **DV** 1

DIRECCION C 15 4A 49 IN 5 **Teléfono** 8257916

DESCRIPCION CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023 - MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN YO CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 1/PARCIAL DEL 25 AGO AL 11 SEP)

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51111501	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	205,939,900.40	0.00
24010301	Cuenta Puente Almacen	0.00	0.00	31,250,087.20	0.00
16350701	REDES LINEAS Y CABLES	0.00	0.00	19,853,027.20	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	218,743,714.80
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	257,043,014.80	2.00	0.00	3,598,600.00
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	257,043,014.80	2.00	0.00	1,542,300.00
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	257,043,014.80	5.00	0.00	12,852,000.00
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	257,043,014.80	0.10	0.00	257,000.00
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	257,043,014.80	0.10	0.00	257,000.00
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	257,043,014.80	0.20	0.00	514,100.00
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	257,043,014.80	0.60	0.00	1,542,300.00
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	257,043,014.80	1.60	0.00	4,112,700.00
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	257,043,014.80	0.40	0.00	1,028,200.00
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	257,043,014.80	0.30	0.00	771,100.00
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	257,043,014.80	0.60	0.00	1,542,000.00
24360506	SERVICIOS 4%	257,043,014.80	4.00	0.00	10,282,000.00
			SUMAS IGUALES	**257,043,014.80**	**257,043,014.80**
VALOR TOTAL DESCUENTOS	**38,299,300.00**		**Valor a Girar**		**218,743,714.80**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. FUENTE: 51005(R.B. RP PLUSVALIA) META: 307 (MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.)	31,250,087.20
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.54611.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. FUENTE: 51005(R.B. RP PLUSVALIA) META: 307 (MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE	19,853,027.20

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005081

Nit: 899999433-5

jueves, 21 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202304826	21-sept.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS **CC o NIT** 900067776 **DV** 1

DIRECCION C 15 4A 49 IN 5 **TELEFONO** 8257916

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N 1181037 **VALOR PAGO** 218,743,714.80

DESCRIPCION	CONTRATO No: CO1.PCCNTR.5301008 DE 2023 - MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN YO CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. (CUENTA 1/PARCIAL DEL 25 AGO AL 11 SEP)
SON	DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 80 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100558		BCO BTA CTA CTE NO 011-12271-0 FONDO COMUN	00.00	218,743,714.80
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.005.40.4001.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	187,493,627.60	00.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.005.40.4001.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	00.00	00.00
24010101 900067776 001	2.3.2.02.02.005.40.4001.307	BIENES Y SERVICIOS A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS	31,250,087.20	00.00

Elaboró: LORENAM

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023005081

Nit: 899999433-5

jueves, 21 de septiembre de 2023

SUMAS IGUALES	218,743,714.80	218,743,714.80

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.546 11.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. . FUENTE: 51005-R.B. RP PLUSVALIA	205,939,900.40
Meta : 307	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.			
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.546 11.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. . FUENTE: 51005-R.B. RP PLUSVALIA	19,853,027.20
Meta : 307	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.			
2023001035	2023002029	2.3.2.02.02.005.40.4001.307.546 11.51005	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS. . FUENTE: 51005-R.B. RP PLUSVALIA	31,250,087.20
Meta : 307	MANTENER Y/O ADECUAR 18.750 M2 DE EQUIPAMIENTOS.			

TOTAL PRESUPUESTO	257,043,014.80

4. DESCUENTOS PRACTICADOS — COM-202304826

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24360506	SERVICIOS 4%	00.00	10,282,000.00	Fuent	257,043,015	4
41058503	INDUSTRIA Y COMERCIO 6 X 1000	00.00	1,542,000.00	I.C.A.	257,043,015	0.6
13058811	Estampilla pro-electrificación rural	00.00	771,100.00	ESTA	257,043,015	0.3
13110109	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 20%	00.00	1,028,200.00	TASA	257,043,015	0.4
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 80%	00.00	4,112,700.00	TASA	257,043,015	2
24072210	Estampilla pro-cultura - programas y proyectos de inversion	00.00	1,542,300.00	ESTA	257,043,015	0.6
24072209	Estampilla pro-cultura - fondos territoriales 20%	00.00	514,100.00	ESTA	257,043,015	0.1
24072208	Estampilla pro-cultura - seguridad social de gestores de cultura 10%	00.00	257,000.00	ESTA	257,043,015	0.1
24072207	Estampilla pro-cultura - bibliotecas publicas 10%	00.00	257,000.00	ESTA	257,043,015	0.05
41106101	CONTRIBUCION 5% SEG.CIUDADANA	00.00	12,852,000.00	CONT	257,043,015	5
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,542,300.00	30% -	257,043,015	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	3,598,600.00	70%–	257,043,015	2

Aprobó:

LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO
Resolucion No. 269 de abril 11 de 2023

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 3945278

Elaboró: LORENAM
