INTERVENTORÍA AL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORESGANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO, BOLÍVAR

INFORME DE INTERVENTORÍA No.10
CONTRATO 2258 DE 2022

FECHA DEL INFORME:	AGOSTO 31 DE 2023
PERIODO DE INFORME:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3696 DE 2022
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

UNIÓN TEMPORAL ACCIONES INTEGRALES
NIT No. 901.641.746-4

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN 5

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL CONTRATO 6

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7

1.3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7

1.4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 8

2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 9

2.1. PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 9

2.2. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 9

2.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA 9

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y 11

3.1. ASPECTO LEGAL 11

3.2. ASPECTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORÍANo. 3696 DE 2022 12

3.3. ASPECTO FINANCIERO CONTRATO No. 2258 DEL 2022INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 14

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 15

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO 23

3.5.1 ACTIVIDADES CON METAS DE CUMPLIMIENTO HASTA EL PERÍODO REPORTADO ... 26

CONCLUSIONES 81

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DEL ZODES MAGDALENA MEDIO 7

LISTADO DE TABLAS.

TABLA 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7
TABLA 2. INFORMACIÓN CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 8
TABLA 3. PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 9
TABLA 4. EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA 9
TABLA 5. EQUIPO DEL CONTRATISTA 9
TABLA 6. ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
TABLA 7. ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO 2258 DE 2022 11
TABLA 8. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3696 DE 2022 12
TABLA 9. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 2258 DE 2022 14
TABLA 10. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 15
TABLA 11. ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PERIODO SEGÚN POA 23
TABLA 12. OBLIGACIONES DE ÍNDOLE AMBIENTAL SEGÚN POA 37
TABLA 13. EJECUCIÓN SEGÚN POA 38

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El original del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente según se indica a continuación:

DEPENDENCIA	Nº DE COPIAS
Gobernación de Bolívar – Secretaría de Agricultura	Original
Biblioteca del Proyecto	1
Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para realizar sus modificaciones pertinentes.	

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo modificado		Fecha de Modificación	Observaciones
				Versión original

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TÍTULO DOCUMENTO		INFORME DE DIAGNÓSTICO		
REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	Nombre	Equipo de interventoría		
	Firma			
	Fecha			
RESPONSABLE DE REVISIÓN	Nombre	Director de interventoría		
	Firma			
	Fecha			
RESPONSABLE DE APROBACIÓN	Nombre	Director de interventoría		
	Firma			
	Fecha			

INTRODUCCIÓN

Uno de los pilares del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP; es la Reforma Rural Integral. Esta reforma busca sentar las bases para la "transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para población rural".Es por esto que desde el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales (Artículo 1 del Decreto 893 de 2017), en su punto 4 de las consideraciones del Decreto 893 de 2017, indica que "la implementación del PDET, implica disponer efectivamente de se convierte en un instrumento para que los habitantes del campo, las comunidades, los grupos étnicos, y los demás actores involucrado en la construcción de paz, junto con al Gobierno Nacional y las autoridades públicas territoriales construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades". El cual contara con un instrumento para su implementación denominado Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR). Así como también señala que los PDET tendrán una cobertura de 16 subregiones y 170 municipios, en las cuales se encuentra la subregión Sur de Bolívar o ZODES Magdalena Medio del Departamento de Bolívar (Artículo 3 del Decreto 893 de 2017).

En respuesta a la necesidad de los pequeños ganaderos afectados por el conflicto armado, La Gobernación del Departamento de Bolívar, ejecuta el proyecto denominado "Implementación De Modelos Productivos Sostenibles Para Pequeños Productores Ganaderos del Zodes Magdalena Medio, Bolívar". Este proyecto busca beneficiar a 600 familias y se enmarca en el Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR Subregión Sur de Bolívar, Pilar 6: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria, título de iniciativa: "Implementar proyectos productivos agropecuarios integrales a productores de cultivos lícitos y no lícitos (que se encuentren en proceso de sustitución) en la subregión del Sur de Bolívar", código: 1313160173108 y cuya estrategia es: Proyectos productivos integrales.

El presente informe corresponde al acumulado a corte del periodo 01 al 31 de agosto de 2023, la interventoría hizo seguimiento a las actividades programadas en el POA para ejecutar por el operador.

En el mes de agosto el operador desarrolló escuelas de campos, visitas de asistencia técnica #5 y apoyo psicosocial #4. Otra actividad de este periodo fue la visita del Comité de Seguimiento al proveedor encargado del suministro de los semovientes, donde se observó lotes de animales con las características requeridas en el proyecto.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL CONTRATO

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desde la gobernación del departamento de Bolívar, se ejecuta el proyecto denominado "Implementación De Modelos Productivos Sostenibles Para Pequeños Productores Ganaderos del Zodes Magdalena Medio, Bolívar". Este proyecto busca beneficiar a 600 familias ubicadas en los 6 municipios que componen el Zodes Magdalena Medio en el departamento de Bolívar.

Para el desarrollo del proyecto se establecieron dos componentes principales:

A. Componente Desarrollo Tecnológico, con el cual se busca implementar un modelo participativo de alternativas sostenibles que integren las variables como alimentación, nutrición, reproducción y mejoramiento del pie de cría, como parámetros indispensables para aumentar los rendimientos y productividad del hato. La integración de estas variables se realizará de la siguiente forma:

Alimentación –Nutrición: Establecimiento de 6 parcelas demostrativas donde se implementarán sistemas silvopastoriles y sistemas de producción y conservación de forraje integrando al pequeño productor a través de escuelas de campo y el suministro de insumos y herramientas para la réplica de estos sistemas.

Mejoramiento del pie de cría: consiste en entregar a cada productor 4 novillas aptas para reproducción y 1 torete, teniendo un total de 3.000 semovientes con características fenotípicas de cruces mejorados de mayor rendimiento productivos.
Reproducción: Consiste en la transferencia del método IATF, como técnica alternativa de reproducción.

Asistencia técnica: Procesos de capacitación y seguimiento a través de visitas prediales.


B. Componente Transferencia Tecnológica, con el que se busca fortalecer del nivel de apropiación técnico-social de los pequeños productores ganaderos del sur del departamento de Bolívar, a través de las siguientes actividades:

- 72 talleres de crecimiento personal para 30 PPG de cada municipio.
- 48 talleres organizacionales para 30 PPG de cada municipio.
- 18 talleres de producción bovina para 30 PPG de cada municipio.
- 3 talleres de cárnicos para 5 PPG de cada municipio.
- 3 talleres de lácteos para 5 PPG de cada municipio.
- Acompañamiento Socio-Empresarial.
- Implementación de una estrategia de Visibilidad y Difusión.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

EL proyecto se ejecuta en la Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) “Magdalena Medio” en el departamento de Bolívar, el cual comprende los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.

Ilustración 1. Localización del ZODES Magdalena Medio.

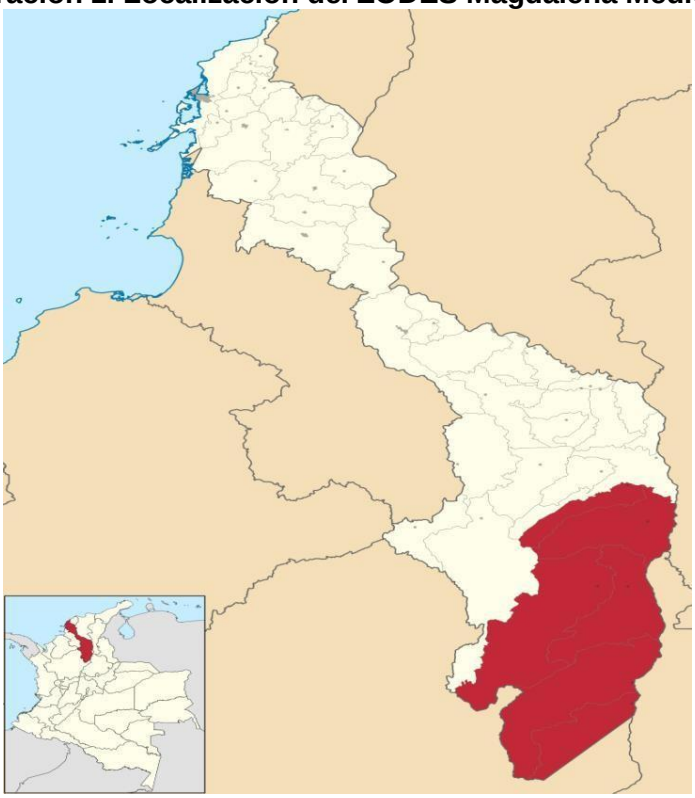

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Bol%C3%ADvar

1.3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Información Del Contrato De Interventoría

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ACCIONES INTEGRALES NIT No. 901.641.746-4
OBJETO DEL CONTRATO	El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES y ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS AGROPECUARIOS DE 600

	PRODUCTORES".
VALOR CONTRACTUAL	MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($1.532.349.315,00)
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 322 Y 1366 DEL 21 DE ABRIL DE 2022 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR VALOR DE $16.534.388.234,00 Y $13.457.998.783,00 RESPECTIVAMENTE.
FECHA DE CONTRATO	10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL DE ENTREGA	17 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

Tabla 2. Información Contrato Objeto de Interventoría

NO. CONTRATO	CONTRATO DE N° 2258 DEL 2022
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO – CORSOC NIT. 800179753-9
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE SISTEMAS AGROPECUARIOS DE 600 PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL SUR DE BOLÍVAR, IMPLEMENTANDO DESARROLLOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES GENÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA EN EL SUR DE BOLÍVAR, INCLUYENDO APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO
VALOR CONTRACTUAL	QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($15.710.792.646,00) M/CTE
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 322 DEL 21 DE ABRIL DE 2022 POR VALOR DE $16.534.388.234,00
FECHA DE CONTRATO	01 DE AGOSTO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL DE ENTREGA	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBSERVACIONES:	SE RECIBEN LAS ACTIVIDADES REPORTADAS EN EL INFORME PARA EL PERIODO.

2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.1. PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Tabla 3. Personal De La Entidad Contratante

NOMBRE	CARGO
ADRIANA TRUCCO DE LA HOZ	Supervisor del proyecto
	Supervisor designado por la Gobernación de Bolívar

2.2. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Tabla 4. Equipo De La Interventoría

NOMBRE COMPLETO	CARGO	DISP.
WILLIAM DE JESÚS PACHECO HUERTAS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	100%
EMPERATRIZ LIBERNAL GUERRERO	PROFESIONAL SOCIAL	100%
CARLOS JULIO GONZÁLEZ GAMBOA	PROFESIONAL TÉCNICO	100%
PEDRO ALEXANDER GARNICA URIBE	PROFESIONAL TÉCNICO	100%
ANA MARÍA PENAGOS ARRIETA	ABOGADA	40%
ZARITTFE DEL CASTILLO SALOMÓN	PROFESIONAL TÉCNICO	100%
LESDY LUZ RENDÓN BLANCO	PROFESIONAL TÉCNICO	100%
ÁLVARO JOSÉ FLÓREZ ÁLVAREZ	PROFESIONAL TÉCNICO	100%
DIEGO ARMANDO HERRERA NARVÁEZ	PROFESIONAL TÉCNICO	100%

El Equipo que se indica en la tabla precedente, corresponde al total de profesionales requeridos por la interventoría.

2.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Tabla 5. Equipo Del Contratista

EQUIPO TÉCNICO

CARGO	NOMBRE
COORDINADOR TÉCNICO	DIOVANNY ALFARO
COORDINADOR SOCIO-EMPRESARIAL	SANDY ROMÁN
PROFESIONAL PECUARIO	SAMIR SIBAJA
PROFESIONAL PECUARIO	ROBERT JIMÉNEZ
PROFESIONAL PECUARIO	OSCAR VELASCO

PROFESIONAL PECUARIO	LUIS NEGRETE C
PROFESIONAL PECUARIO	JOSÉ DAVID PINZÓN
PROFESIONAL PECUARIO	FERNEY ROCHA
PROFESIONAL SOCIAL	JORGE PÉREZ MARTÍNEZ
PROFESIONAL SOCIAL	YOLIT CAMPUZANO ESTRADA
PROFESIONAL SOCIAL	LEIDY GÓMEZ PARAMO
PROFESIONAL SOCIAL	MAIRA TORRES MARTÍNEZ
PROFESIONAL SOCIAL	YORELIS VILLAMIZAR ANAYA
PROFESIONAL SOCIAL	LINDA PÉREZ ARRIETA
TÉCNICO AGROPECUARIO	JAIME ALFONSO
TÉCNICO AGROPECUARIO	ALDAIR AVENDAÑO
TÉCNICO AGROPECUARIO	YENFRI RODRÍGUEZ
TÉCNICO AGROPECUARIO	KELLY ALCOCER
TÉCNICO AGROPECUARIO	JHON ESTRADA
TÉCNICO AGROPECUARIO	ALBA BERMÚDEZ

El Equipo de agrónomos finalizaron su contratación en el mes de julio de 2023, por lo tanto no se reportan en el presente informe.

EQUIPO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE PROYECTO	MIGUEL CAUSIL PÉREZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CARLOS MARIO MENDOZA ACOSTA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	JORGE EDUARDO ROSADO ALMANZA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ERIKA DIAZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIANA PATRICIA GUEVARA HERNÁNDEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DAYANA FRANCO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ANDREA CORCHO CALLEJAS
PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	NEYLA PALOMO
PROFESIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	JAIRO GUZMÁN
PROFESIONAL EN SISTEMAS	KATY CLARETH ARIAS RODRÍGUEZ
CONTADOR	OLGA PATRICIA CAVADIA BERRIO
SECRETARIA	DIANA ÁLVAREZ NEGRETE
PROFESIONAL ESPECIALIZADA	MARÍA ALEJANDRA TOBIO MAZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA	LAURA ARGEL BUELVAS
LOGISTA	JADER LUIS TIRADO PÉREZ
LOGISTA	FREDYS GONZÁLEZ HERRERA
LOGISTA	TAYLOR ACOSTA
SERVICIOS VARIOS	CÁNDIDO ARIAS

TALLERES CRECIMIENTO PERSONAL	
TALLERISTA	CESAR CHAMORRO
TALLERISTA	FABIAN PÉREZ
TALLERES ORGANIZACIONAL	
TALLERISTA	CRISTIAN HERNÁNDEZ
TALLERISTA	FLOR MEDINA
SUMINISTRO PAPELERÍA	PAPELERÍA ORANGE

A la fecha de corte del informe, el operador reporta contratación de equipos descritos en la tabla 5.

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO

3.1. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3696 DE 2022

Tabla 6. Estado de las garantías del contrato de interventoría

AMPAROS	%	CUANTÍA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	15	$229,852,397.25	18/11/2022	20/03/2024
PAGO DE SALARIOS	5	$153,234,931.50	18/11/2022	18/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	15	$229,852,397.25	18/11/2022	18/11/2023

Pólizas de seguro de cumplimiento, pago salarios y calidad del servicio a favor de la entidad estatal No. 75-44-101124634, expedida el veintiuno (21) de diciembre de 2022 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. (Ver Anexo No. 1).

AMPAROS	%	CUANTÍA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10% del valor de la pérdida.	$200.000.000	18/11/2022	18/11/2023

Póliza de seguro de predios, labores y operaciones a favor de la entidad estatal No. **75-40-101046363**, expedida el veintiuno (21) de diciembre de 2022 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. (Ver Anexo No. 1.1).

GARANTÍAS CONTRATO No. 2258 DEL 2022

Tabla 7. Estado de las garantías del contrato 2258 de 2022

AMPAROS	%	CUANTÍA	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	15	2.356.618.897,00	21/11/2022	21/11/2023
PAGO DE SALARIOS	10	1.571.079.265,00	21/11/2022	21/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10	1.571.079.265,00	21/11/2022	21/05/2024
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	15	2.356.618.897,00	21/11/2022	21/05/2024

Pólizas de seguro de cumplimiento a favor de la entidad estatal No. 3403377–2, expedidas el veintiséis (26) de diciembre de 2022 por la compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. (Ver Anexo No. 2).

3.2. ASPECTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3696 DE 2022

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

El contrato cuenta con dos certificados de disponibilidad presupuestal, el No.322 del 21 de abril de 2022 por valor de $16.534.388.234,00 del presupuesto de la vigencia fiscal 2021 y el No.1366 del 8 de noviembre de 2021 por valor $13.457.998.783,00 del presupuesto de la vigencia fiscal 2021.

Para 2023 los registros presupuestales fueron actualizados a la vigencia 2023 mediante registro presupuestal No. 2532 del 24 de marzo de 2023, por un valor de $717,480,322.00 y registro presupuestal No. 2533 del 24 de marzo de 2023, por un valor de $814,868,993.00. La suma de los anteriores corresponde a un valor de $1.532.349.315,00 respaldando el 100% del valor del contrato 3696 de 2022.

MANEJO DEL ANTICIPO

Según la CLÁUSULA SEXTA del contrato No. 3696 de 2022 suscrito por el departamento de Bolívar y la UNIÓN TEMPORAL ACCIONES INTEGRALES “Por políticas de la gobernación del departamento de Bolívar, en el presente contrato no se pactó anticipo”.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO 3696 DE 2022

Tabla 8. Estado del contrato de interventoría 3696 de 2022

VALOR DEL CONTRATO	$1.532.349.315,00
VALOR ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N.A.
VALOR EJECUTADO	$896.070.563
% EJECUTADO	58,48%
VALOR PAGADO	$ 376.122.104,58
% PAGADO	25,00%
SALDO	$ 1.156.227.210,42
OBSERVACIONES:	Los valores ejecutados corresponden a los valores causados, facturados y/o pagados en el periodo del informe.

El valor causado se discrimina de la siguiente forma:

- Rubro R01: GASTOS DE PERSONAL. $694.577.670
- Rubro R02: GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. $53.366.881
- Rubro R03: GASTOS LEGALES. $35.772.738
- TRANSPORTE $70.500.000
- IMPUESTOS. $41.853.274

En el Anexo No. 3, Informes financieros del Contrato 3696 se describe las ejecuciones presupuestales del contrato durante el periodo, así como las certificaciones de paz y salvo en los aportes de seguridad social.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRATO 3696 DE 2022

Durante el periodo reportado, el equipo de interventoría desarrolló las actividades administrativas relacionadas a continuación.

El área financiera de la interventoría revisó el informe financiero del ejecutor y emitió informe sobre la ejecución presupuestal presentada por el operador, haciendo observaciones sobre los soportes de la gestión documental del personal adscrito al operador.

3.3. ASPECTO FINANCIERO CONTRATO No. 2258 DEL 2022

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

El contrato cuenta con certificado disponibilidad presupuestal No.1366 del 8 denoviembre del presupuesto de la vigencia fiscal 2021.

MANEJO DEL ANTICIPO

Según la CLÁUSULA QUINTA del contrato No. 2258 de 2022 suscrito por el Departamento de Bolívar y la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, “Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratistaanticipo y/o pago anticipado”.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO

Tabla 9. Estado financiero del contrato 2258 de 2022 a corte de agosto 31 de 2023

VALOR DEL CONTRATO	$15.710.792.646,00
VALOR ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N.A.
VALOR EJECUTADO	$7.206.072.789
% EJECUTADO	45,87%
VALOR PAGADO	$2.356.618.896,90
% PAGADO	15%
SALDO	$13.354.173.750,00
OBSERVACIÓN:	La validación por parte de la interventoría y detalle del avance financiero del contrato se encuentra consignado en el Anexo No. 4. Informe financiero (rev. INT.), Contrato 2258-agosto)

Para el período según revisión de esta interventoría, valida ejecución presupuestal acumulada por valor de $7.206.072.789 discriminados así:

Implementación de sistema silvopastoriles $130.348.830

Implementación de sistema de producción y conservación de forrajes $968.746.161

Mejoramiento de pie de cría. $3.184.999.991

Asistencia Técnica. $540.500.000

Talleres de crecimiento personal. $293.400.000

Talleres organizacionales. $195.600.000

Talleres de producción bovina. $73.350.000

Talleres cárnicos. $24.636.000

Talleres Lácteos. $12.985.232

Acompañamiento socio-empresarial. $254.066.666

Estrategia de Visibilidad: $65.740.000

Administración $1.461.699.909

Lo anterior, evidencia avance del 45,87% $7.206.072.789/$15.710.792.646) en la ejecución presupuestal con corte a agosto 31 de 2023. Ver Anexo No. 4. Informe financiero (rev. INT.), Contrato 2258- agosto).

3.4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

Presentación informes mensuales: El contratista ha cumplido con la entrega de informes; sin embargo, no ha entregado los informes en las fechas pactadas, esta interventoría le ha llamado la atención varias veces mediante correo electrónico recordándole las entregas de informes oportunamente. (Anexo No. 5).

COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Mensualmente se realiza el comité de seguimiento al proyecto en la gobernación de Bolívar. El director del proyecto presenta informe con corte al respectivo, haciendo énfasis en las actividades desarrolladas en el periodo. Igualmente, presenta propuestas las cuales son analizadas en el seno del Comité y se toman las decisiones respectivas. En estos comités la interventoría presenta observaciones al operador que han sido recopiladas por sus profesionales de campo, el operador da las respectivas explicaciones y hace los correctivos del caso. (Anexo No. 6 actas de seguimiento del proyecto).

El día 30 de agosto se realizó el comité de seguimiento No. 11 en la gobernación de Bolívar. El director del proyecto presentó informe con corteal mes de agosto.

MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL CONTRATO

A continuación, se relaciona cuadro resumen con los movimientos realizados en el contrato durante el período reportado (1 al 31 de agosto de 2023).

Tabla 10. Verificación del Cumplimiento de Obligaciones

OBLIGACIONES GENERALES	Cumple (SI, NO, N.A)	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTODE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI	Contrato y pólizas vigentes. Ver Anexo No. 2	Pólizas cumplen Criterios de amparos, y valores. El contratista actualizó la vigencia de la póliza de acuerdo con la fecha de firma de acta de inicio del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI	Contrato y pólizas vigentes. Ver Anexo No. 2.	Presenta cumplimiento documental requerido en proceso de contratación.
3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato, su alcance u obligaciones.	NA en el período reportado		Sin reportes o requerimientos a la fecha.
4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	NA en el período reportado		Sin hallazgos a lafecha.
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidadofrecido.	SI		Presenta cumplimiento de acuerdo con las Condiciones generales del contrato.
6. Identificar las oportunidades e implementar medidas para promover el empleo local durante la ejecución delcontrato.	SI	Informe de selección de personal.	El contratista trabaja con personal de la región y fue contratado para trabajar en el proyecto.
7. Dar cabal cumplimiento alpacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI	Carta presentación oferta y pacto de transparencia.	

8. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer ocelebrar el contrato.	SI	En reuniones de Comité de seguimiento, el contratista ha informado sobre hechos de orden público.	Reporta que se vienen presentando alteraciones de orden público que afectan la normal ejecución del proyecto, las cuales han reportado en los informes.
9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar laejecución del Contrato.	SI	En reuniones de Comité de seguimiento, el contratista ha informado sobre hechos de orden público.	Reportan que se vienen presentando alteraciones de orden público queafectan la normal ejecución del proyecto, las cuales han reportado en los informes.
10. Durante la ejecución del contrato deberá observarlas leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuadode los elementos de protección personal (EPP).	SI	Matriz de riesgos.	En el momento oportuno presentó Matriz de riesgos.
11. Informar periódicamente la composición del capitalsocial de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedadextranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI	Acta conformación.	En el momento oportuno suscribió Acta de conformación.
12. Cumplir con susobligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI	Informes Técnicosy Financiero del periodo.	El contratista mensualmente presenta informes de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y ambientales.

13. Informar a más tardar eltercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio deinvestigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,accionistas o integrantes del Contratista.	NA en el período reportado		Sin reportes y novedades a la fecha
14. El contratista se compromete a mantener vigente los protocolos de bioseguridad en asocio conla ARL, a fin de mantener elcontrol efectivo de la propagación de la pandemia COVID-19 dentrode las actividades que se ejecuten, costos que asume el contratista en su propuesta.	SI		Cumple con protocolos de bioseguridad.
15. Presentar los informes con los elementos y periodicidad que exige el Sistema General de Regalías – OCAD PAZ para las labores de vigilancia y control de los proyectos en ejecución.	NO	Informe del Periododel contratista	La presentación de informes no se ajusta a las fechaspactados.
16. Todas las demás que sean consideradas de interés común dentro de la disponibilidad de las partes y del objetivo del presente contrato	SI		Cumplimiento generalidades objeto contrato
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	**CUMPLE (SI, NO, N.A.)**	**EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1. Diseñar y adoptar herramientas y mecanismos, que conduzcan a mejorar los niveles tecnológicos actualmente utilizados por los pequeños productores ganaderos en su actividad comercial y agropecuaria.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a talleres de capacitación y actas de entregas de Kit de BPO.	Ha desarrollado talleres de capacitación a los beneficiarios en temas técnicos y socioempresariales.

2. Implementar un modelo de alternativo sostenible que integren parámetros como alimentación, nutrición, reproducción y mejoramiento del pie de cría bovino.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a talleres de capacitaciones técnicas. Anexos presentados en informes.	Ha desarrollado actividades de Implementación de parcelas demostrativas para producción de alimentos y desarrolló talleres de producción bovina.
3. Diseñar estrategias que permitan a los pequeños productores su capacidad financiera a través de la adopción de tecnologías, financiadas con losrecursos dispuestos por la Gobernación de Bolívar, para el efecto.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a talleres de capacitaciones y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	El operador desarrolló talleres socioempresariales de crecimiento personal y organizacionales.
4. Diseñar una estrategia, encaminada a mejorar losniveles de asociatividad yespecialización de la cadena, mediante transferencia de tecnologías en procesos de formación, técnica, social, empresarial y agroindustrial.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a talleres de capacitaciones y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	El operador desarrolló talleres de Creación o fortalecimiento legal de organizaciones, de fortalecimiento empresarial y organizacional. En lo técnico los beneficiarios fueron capacitados en producción bovina, procesamiento de productos cárnicos y lácteos.
5. Diseñar una estrategia encaminada a formalizar la comercialización de productos originados en los hatos ganaderos incentivando la Implementación de acuerdos comerciales, para fortalecer y solidificar la economía de los pequeños productores ganaderos.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a talleres de capacitaciones y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	Los beneficiarios fueron capacitados procesamiento de productos cárnicos y lácteos para que procesen los productos originados en sus hatos.

6. Adoptar una estrategia para que el sistema de actividad productiva de agroforestería pecuaria seala opción más idónea desde el punto de vista de la sustentabilidad y rentabilidad, en el desarrollo y crecimiento económico de los hatos, garantizando quese eleve la productividad y la rentabilidad de las empresas pecuarias. Esto principalmente en lautilización de innovaciones en la alimentación y el manejo del ganado, mediante los diferentes tipos de sistemas agroecológicos.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a ECAs y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	El operador ha desarrollado actividades de Implementación de parcelas demostrativas con sistemas silvopastoriles para producción de alimentos, talleres de producción bovina. Estas competencias han sido transferidas a los pequeños productores a través de ECAs.
7. Garantizar una alimentación y nutrición integral adecuada para los animales, que sea amigable con el medio ambiente, de alta calidad y variedad de forrajes, teniendo una influencia directa sobre la producción de carne (proteína/Kg. /día) y leche (% proteína, %grasa, % sólidos totales, sólidos no grasos), es decir, se contribuirá con la generación de productos demejor calidad, que beneficien al pequeño productor por su valor agregado.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a ECAs y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	Los productores han iniciado cultivos de maíz y sorgo para alimentación de los animales, producción de forrajes e iniciaron implementación de sistemas silvopastoriles.
8. Diseñar estrategias e implementar herramientas encaminadas a: • Incremento del pie de cría.	SI		Está aún pendiente el inicio de las entregas de animales.

• Mejorar los rendimientos delos productos de los hatos > 3,5 litros de leche/día y Destete a los 8-9 meses con 180 kg de pesos aproximadamente. • Consolidar organizaciones por municipio (6 total), que agruparán 600 pequeños productores ganaderos. • Capacitar a los destinatarios del proyecto en técnicas modernas y sostenibles de producción y cadenas de valor deproductos y subproductos agrícolas y pecuarios, asícomo en el uso herramientas modernaspara el manejo del hato ganadero. • Determinar otras alternativas de negocio a favor de los pequeños productores, como seria la producción de los derivados de la leche, entre otros. • Lograr el establecimiento y usos de sistemas silvopastoriles. • Establecer técnicas de producción y conservación de ensilaje con alto contenido proteico. • Establecer técnicas de producción de productos cárnicos y lácteos empoderados y creación dedos industrias regionales.		Listados de asistencia de beneficiarios a ECAs y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	Los beneficiarios fueron capacitados en talleres de crecimiento personal, organizacionales y producción bovina. Igualmente adquirieron competencias en procesamiento de productos cárnicos y derivados de la leche. Están implementado sistemas silvopastoriles y producción de alimentos mediante ensilaje.
9. Implementar el Sistema de Silvopastoriles y cultivos para la producción de ensilaje, de acuerdo con las condiciones dadas en el punto 5.2.1 del documento técnico	SI		El operador inició y están en proceso productivo 6 parcelas silvopastoriles y la siembra de cultivos para ensilaje; igualmente, los PPG harán lo propio en sus parcelas.

10.Desarrollar actuaciones administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la información producida y recibida durante el desarrollo del proyecto, tanto en formato físico comodigital, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, de acuerdo con las condiciones señaladas en elpunto 5.1.6., del documento técnico.	NA		Por el nivel de ejecución física financiera, y corte de cronograma actividades
11. Documentar todo el proyecto organizando un archivo con las evidencias de cada una de las actividades y todos los informes presentados alcontratante y a las entidades de control que lo requieran.	SI	Drive del proyecto	
12. Desarrollar procesos formativos que contribuyan a propagar el conocimiento de buenas prácticas en la producción de las actividades económicas desarrolladas en los hatos, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el documento técnico del proyecto.	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a ECAs y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	El operador desarrolló talleres de Producción bovina y ECAs a los productores.
13. Abarcar la implementación de sistemas multiestratos con arreglos de gramíneas y árboles nativos y los forrajes como alternativas alimenticias, como a continuación se describe	SI	Listados de asistencia de beneficiarios a ECAs y registros fotográficos. Anexos presentados en informes.	Implementación de cultivos en con estas características en parcelas demostrativas y lotes de beneficiarios.
14. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) deltotal del personal. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	SI	Anexos de selección y vinculación de personal incluidos en informes.	El operador, en lo que va de ejecución del proyecto, ha cumplido con esta obligación.

15. Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados, de acuerdo con el Anexo No. Técnico, elPliego de Condiciones ydemás documentos del proceso.	SI	Actas de entregas firmadas por los beneficiarios	En las entregas de bienes y servicios (anexas a informes anteriores) al corte de este informe, han cumplido con esta obligación.
16. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombianopara el cumplimiento del contrato.	SI	Anexos de selección y vinculación de personal incluidos en informes.	El 100% del personal Seleccionado por elcontratista es colombiano.

3.5. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

En el Plan Operativo Anual-POA que se adjunta (Anexo No. 7) están programadas las actividades que debía desarrollar el operador a la fecha de corte de este informe (agosto 31 de 2023).

En el siguiente cuadro se observan las obligaciones programadas hasta la fecha de corte de este informe.

Tabla 11. Actividades Programadas a corte del Periodo agosto según POA

FASE	ACTIVIDADES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actividades Preliminares	Apropiación por parte del contratista del proyecto a ejecutar - realizar reunión de apropiación	1	21-nov-22	21-nov-22
	Realizar la contratación de personal	26	21-nov-22	25-nov-22
	Realizar la transferencia conceptual al equipo Equipo Tecnico y Social	1	29-nov-22	30-nov-22
	Elaboración de POA del proyecto	1	21-nov-22	22-nov-22
	Reunión de socialización del proyecto	1	23-nov-22	25-nov-22
	Caracterizacion de los Beneficiarios	600	1-nov-22	30-dic-22
	Proceso de selección de potenciales participantes para los Talleres	1	15-dic-22	30-dic-22

FASE	ACTIVIDADES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actividades Nucleares	**SISTEMA SILVOPASTORIL**			
	Selección participativa de lotes	6	1-ene-23	31-ene-23
	Alistamiento y/o cercamiento perimetral	6	1-feb-23	28-feb-23
	Adecuación Del Terreno	6	1-mar-23	31-mar-23
	Identificación De Características Fisicoquímica Del Suelo	6	1-mar-23	31-mar-23
	Trazado	6	1-mar-23	31-mar-23
	Adquisición material vegetal (árboles)	3174	1-abr-23	30-abr-23
	Ahoyado y Siembra	6	1-abr-23	30-abr-23
	Fertilización	6	1-abr-23	30-ago-23
	Control De Malezas	6	1-abr-23	30-ago-23
	Control De Plagas Y Enfermedades	6	1-may-23	31-jul-23
	Adecuación de reservorio de agua	6	1-may-23	30-may-23
	Escuelas de campos	18	1-abr-23	30-ago-23
	ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE SORGO DULCE PARA PRODUCCION DE ENSILAJE			
	Selección participativa de lotes	3	1-ene-23	31-ene-23
	Siembra	3	1-abr-23	30-abr-23
	Fertilización	3	1-abr-23	30-jun-23
	Manejo Integrado de Plagas	3	1-may-23	30-jun-23
	Control de malezas	3	1-abr-23	30-jun-23
	Corte para Ensilaje	3	1-jul-23	31-jul-23
	ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ FORRAJERO PARA PRODUCCION DE ENSILAJE			
	Selección participativa de lotes	3	1-ene-23	31-ene-23
	Siembra	3	1-abr-23	30-abr-23
	Fertilización	3	1-abr-23	30-jun-23
	Manejo Integrado de Plagas	3	1-may-23	30-jun-23
	Control de malezas	3	1-abr-23	30-abr-23
	Corte para Ensilaje	3	1-jul-23	31-jul-23
	Escuelas de campos	18	1-mar-23	30-ago-23
	Suministro de Kit de Insumos y Herramientas por Product	600	1-mar-23	30-abr-23
	MEJORAMIENTO DEL PIE DE CRIA			
	Conformacion de Comité de supervisión y seguimiento	1	1-abr-23	30-abr-23
	Verificacion Documental de proveedores	1	1-abr-23	30-abr-23
	Visita tecnica a proveedores	2	1-ene-23	30-may-23
	Entrega de Novilllas	2400	1-may-23	30-sep-23
	Entrega de Toretes	600	1-may-23	30-jun-23
	Trasporte de Semovientes	200	1-may-23	30-sep-23
	Entrega de Herramientas BPO	600	1-dic-22	30-abr-22

FASE	ACTIVIDADES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actividades Nucleares	**SINCRONIZACION DE CELOS E INSEMINACION**			
	Confinamiento de cabezas	90	1-jun-23	31-ago-23
	Aplicación participativa de hormonas	90	1-jul-23	31/06/2023
	Entrenamiento en inducción del celo, inseminación y verficación de la preñez.	6	1-jul-23	31/06/2023
	Inseminacion participativa artificial	90	1-jul-23	31-ago-23
	ASISTENCIA TECNICA			
	Visitas Asistenciales	7	1-nov-22	31-oct-23
	TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL			
	Taller de facilitación	12	1-ene-23	31-ene-23
	Taller de liderazgo y desarrollo de equipo	12	1-feb-23	28-feb-23
	Taller de creatividad e innovación	12	1-mar-23	31-mar-23
	Taller de relaciones de género con equidad	12	1-abr-23	30-abr-23
	Taller de Pensamiento, acción y aprendizaje estratégico	12	1-may-23	31-may-23
	Taller de formulación monitoreo y evaluación de proyectos	12	1-jun-23	30-jun-23
	Graduación	1	1-jul-23	31-jul-23
	TALLERES ORGANIZACIONALES			
	Taller fortalecimiento de capacidades empresariales	12	1-mar-23	31-mar-23
	Taller organizaciones comunitarias	12	1-abr-23	30-abr-23
	Taller consolidación legal de organizaciones	12	1-may-23	31-may-23
	Taller de Creación o fortalecimiento legal de organizaciones de Pequeños Productores Ganaderos PPG	12	1-jun-23	30-jun-23
	Graduación	1	1-jul-23	31-jul-23
	TALLERES DE PRODUCCION BOVINA			
	Sesión 1. Manejo sanitario, alimentación y nutrición	6	1-ene-23	31-ene-23
	Sesión 2. Mejora genética e infraestructura ganadera	6	1-feb-23	28-feb-23
	Sesión 3.Buenas prácticas ganaderas y conservación y aprovechamiento de forrajes	6	1-mar-23	31-mar-23
	Graduación	1	1-jul-23	31-jul-23
	TALLERES CARNICOS			
	Sesión 1. Buenas prácticas en aspectos higiénico-sanitarios, conservación de la carne y procesos de elaboración de productos	1	1-jul-23	31-jul-23
	Sesión 2. Elaboración de chorizo, butifarra, hamburguesa, y carne molida aliñada entre otros.	1	1-jul-23	31-jul-23
	Sesión 3. Aprovechamiento de la carne para casos específicos, como lo es el sacrificio de emergencia de una res accidentada	1	1-jul-23	31-jul-23
	TALERES LACTEOS			
	Sesión 1. Buenas prácticas de ordeño y manipulación y control de calidad de la leche.	1	1-jul-23	31-jul-23
	Sesión 2. Elaboración de queso.	1	1-jul-23	31-jul-23
	Sesión 3. Elaboración de yogurt y suero costeño.	1	1-jul-23	31-jul-23
	ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL			
	Asistencia social y apoyo psicosocial	5	1-dic-22	31-oct-23
	ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD Y DIFUSION			
	Materiales de difusión	1	1-dic-22	31-dic-22

FASE	ACTIVIDADES	META	FECHA INICIO	FECHA FIN
Actividades Administrativas	**SEGUIMIENTO**			
	Reunion con equipo de interventoria	12	21-nov-22	20-nov-23
	Seguimiento actividades del POA	12	21-nov-22	20-nov-23
	Presentación informes mensuales	12	21-nov-22	20-nov-23
	Base de datos de productores	12	21-nov-22	20-nov-23
	CIERRE			
	Informe de cierre del proyecto	1	1-nov-23	20-nov-23
	Actividad de Cierre del proyecto	1	15-nov-23	20-nov-23
	GESTION DOCUMENTAL			
	Conformar y actualizar el expediente físico y digital por proyecto	12	21-nov-22	20-nov-23

3.5.1 ACTIVIDADES CON METAS DE CUMPLIMIENTO HASTA EL PERÍODO REPORTADO

En el marco de la Interventoría al contrato 2258 de 2022, la UT Acciones Integrales ha hecho seguimiento a las actividades del operador en el desarrollo del proyecto denominado “implementación de modelos productivos sostenibles para pequeños productores” (600 pequeños productores de los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Morales y Simití).

En ese sentido a continuación, se describen las acciones adelantadas por la Interventoría desde el inicio del proyecto hasta el corte a 31 de agosto de 2023. Se toma como referencia las actividades y metas contempladas en el Plan Operativo Anual -POA-.

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Apropiación por parte del contratista del proyecto a ejecutar - realizar reunión de apropiación.

Esta interventoría destaca que el contratista cumplió y ejecutó la Reunión de Apropiación, contemplada en el bloque de actividades preliminares. La reunión contó con la asistencia y participación de actores claves en la implementación del proyecto y ejecución del contrato, según consta en el acta de reunión y lista de asistencia. (Ver anexo 8).

Realizar contratación del personal.

Esta interventoría verifica que el contratista cumplió con la actividad contemplada en el bloque preliminar de desarrollar un proceso de selección y contratación de personal (Anexos 9).

Realizar la transferencia conceptual al equipo técnico y social.

Según los registros documentados aportados por el contratista y acompañamiento de esta interventoría, se puede verificar el cumplimiento de las actividades de transferencia conceptual a todo el equipo de trabajo seleccionado y contratado. Adicionalmente se realizó la reunión de socialización regional del proyecto, entre actores claves e involucrados (Anexo 10).





Registro fotográfico. Seguimiento de la interventoría a jornada de transferencia conceptual al equipo técnico y social - San Pablo

Elaboración del POA del proyecto.

El contratista elaboró y socializó el Plan Operativo Anualizado POA-vigente, el cual fue aprobado por esta interventoría, por lo tanto, se verifica el cumplimiento con la actividad por parte del contratista. Ver anexo 7.

Reunión de socialización del proyecto.

Se verificó por esta interventoría el cumplimiento del contratista con la actividad denominada reunión de socialización interinstitucional, a la cual asistieron y participaron autoridades territoriales, representantes de las organizaciones potencialmente beneficiarias. Las evidencias están compiladas en acta de reunión y lista de asistencia y participantes. Ver anexo 11.





Registro fotográfico. Seguimiento de la interventoría a jornada de socialización del proyecto – Alcaldía de Morales.



Registro fotográfico. Seguimiento de la interventoría a jornada de socialización del proyecto – Alcaldía de Santa Rosa

Caracterización de los Beneficiarios.

Se evidencia el cumplimiento de la actividad. El contratista diseñó y estandarizó el formato con variables y criterios de selección y caracterización de beneficiarios.

Con base en los listados de potenciales beneficiarios suministrados por la gobernación de Bolívar, informe del contratista, acercamiento, acompañamiento al equipo técnico del contratista y visitas a los predios, la interventoría analizó el cumplimiento de esta actividad programada en el POA. En la caracterización el operador tomó información del núcleo familiar, de la explotación pecuaria y las condiciones técnicas a desarrollar en la UPA con el fin de conformar una base de datos y diagnóstico inicial de cada productor.

La zonificación por municipio, veredas y número de beneficiarios caracterizados por el operador se resume de la siguiente forma: San Pablo 100, Cantagallo 100, Santa Rosa 100, Simití 100, Arenal 100 y Morales 100. (Ver Anexo 12. Beneficiarios del proyecto).

Proceso de selección de potenciales participantes para los talleres

En el POA esta actividad se denomina “Proceso de selección de potenciales participantes para los Talleres”, según el seguimiento de la interventoría a esta actividad, el contratista en el periodo reportado hizo preselección de participantes a los talleres. Durante el proceso, la interventoría hizo recomendaciones al operador sobre esta actividad, atendiendo los protocolos establecidos en el documento técnico. Esta interventoría verificó el cumplimiento de esta actividad por parte del contratista. (Anexos 13).


B. SISTEMA SILVOPASTORIL

Selección participativa de lotes

La interventoría constató el cumplimiento de esta actividad, cumplieron con el proceso de selección participativa de los lotes dónde se establecerán las parcelas demostrativas, parcelas que comprenden los sistemas silvopastoriles y cultivos forrajeros. Hubo 18 predios postulados y seleccionaron 6, uno por cada municipio. (Anexo 14).

En el municipio de Morales se presentó una novedad, el señor Jhony Salazar Badillo, esta persona se encontraba en proceso de verificación de documentos para la vinculación efectiva al proyecto y el proceso de selección de lote estaba sujeto a dicha verificación. Pues bien, una vez realizada este proceso se halló que efectivamente sobrepasa el número de animales permitido como límite en el proyecto, lo que llevó a lugar a realizar un nuevo proceso de selección de lotes, que para tal caso fue escogido la finca Villa Moralba, de propiedad de la señora María Castro Orellano (Ver informe de Selección de finca). (Anexo 14.1).

Registro fotográfico. Seguimiento de la interventoría a selección de lotes (Simití, Bolívar) – Finca Wady Lobo

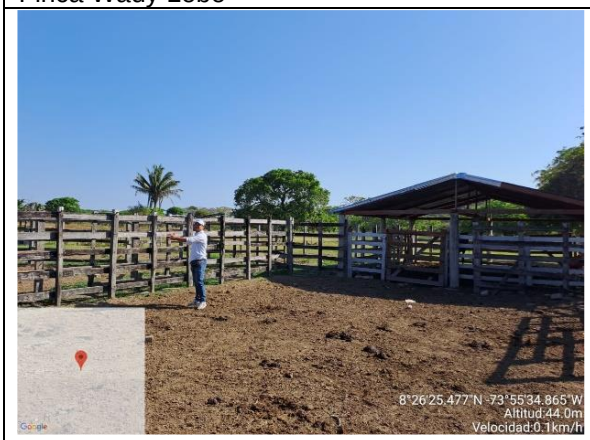







Registro fotográfico. Seguimiento de la interventoría a selección de lotes (Morales, Bolívar) – Finca Álvaro Pérez









Adecuación Del Terreno

La interventoría verifica en el área que las adecuaciones de los terrenos de los Sistemas Silvopastoriles -SSP- se han llevado a cabo según lo planificado en el POA, dando lugar a la continuidad de las demás actividades subsiguientes a esta actividad. Se determina que esta actividad ha sido superada.

Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de adecuación y trazado de terreno realizada por el operador en el municipio Arenal – Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de adecuación y trazado de terreno realizada por el operador en el municipio, Simití – Bolívar.
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de adecuación y trazado de terreno realizada por el operador en el municipio Morales – Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de adecuación y trazado de terreno realizada por el operador en el municipio, San Pablo - Bolívar
	

Identificación De Características Fisicoquímica Del Suelo

El contratista realizó la actividad aplicando la bitácora técnica elaborada para las tomas de muestras para los análisis de suelo que serán utilizados en la identificación de las características fisicoquímicas de los suelos de los terrenos escogidos para el uso de cultivos en las parcelas demostrativas, la actividad inició con la fase de muestreo. Esta interventoría verificó la entrega de los resultados de los análisis. (Ver Anexo 15).

Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de Identificación de características fisicoquímicas del suelo realizada por el operador en el municipio, Simití – Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de Identificación de características fisicoquímicas del suelo realizada por el operador en el municipio, Cantagallo – Bolívar.





Trazado

Con la adecuación del terreno de las parcelas el operador hizo los trazados del terreno, realizó la demarcación del contorno de los lotes, actividad cumplida.

Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de trazado de lote para silvicultura municipio de Santa Rosa, Simití y Morales, febrero de 2023.







Adquisición material vegetal (árboles)

El operador cumplió con esta actividad, la interventoría hizo seguimiento al proceso, 529 unidades por municipio para sembrar en las 6 parcelas demostrativas, las plántulas fueron adquiridas en un vivero formalmente constituido con NIT. 078759667-4.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de adquisición del material vegetal en el municipio de Cantagallo - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad de adquisición del material vegetal en el municipio de Arenal - Bolívar

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad adquisición del material vegetal en el municipio de Morales - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad Acompañamiento a la adquisición del material vegetal en el municipio de San Pablo - Bolívar
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad adquisición del material vegetal en el municipio de Santa Rosa - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la actividad adquisición del material vegetal en el municipio de Simití - Bolívar

Ahoyado y Siembra

Se verificó el cumplimiento del proceso de ahoyado, en el cual se cumplió con las recomendaciones técnicas para la actividad, tales como dimensión del hueco, profundidad y distancias y el arreglo de franja. En el hueco introdujeron un retenedor para mantener la planta y evitar es estrés hídrico. Observar registro fotográfico del proceso.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al ahoyado y siembra en el municipio de Cantagallo - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al ahoyado y siembra en el municipio de Arenal - Bolívar
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al ahoyado y siembra en el municipio de Morales - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al ahoyado y siembra en el municipio de San Pablo - Bolívar

En cada parcela demostrativa sembraron proporcionalmente media hectárea de maíz y sorgo. La siembra la hicieron en las últimas semanas del mes de abril en cada una de las parcelas. Las variedades sembradas fueron sorgo JJT-18 Corpoica y maíz variedad 109-ICA, sembraron 4,25 Kg. De sorgo y 11,5 Kg de maíz.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría actividad de siembra en el municipio de Morales - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría actividad de siembra en el municipio de Arenal - Bolívar
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría actividad de siembra en el municipio de Santa Rosa - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría actividad de siembra en el municipio de Simití - Bolívar

Fertilización

Esta actividad fue desarrollada en el periodo programado, el operador justifica que el cultivo no cumplía con el periodo recomendado desde la siembra y por falta de lluvias que humedeciera el terreno que permita impregnar el fertilizante. No obstante, la interventoría recomendó hacer la fertilización en la primera quincena del mes de mayo.

Durante el mes de agosto, esta actividad la mantuvieron en curso mediante la asesoría técnica del proyecto. El equipo proporcionó instrucciones específicas para la aplicación de fertilizantes en las especies que se sembraron como parte de la implementación del sistema silvopastoril. Esta tarea la llevan a cabo en cada parcela demostrativa a lo largo de su ciclo productivo. A través de visita de la interventoría se evidencia que la supervivencia de las especies vegetativas sembradas en el sistema silvopastoril ha sido efectivo en un 90% pese a que su crecimiento es lento debido a las condiciones ambientales de los predios donde han sido establecidos.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de las plantas del sistema silvopastoril en el municipio de Morales-Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de las plantas del sistema silvopastoril en el municipio de Morales-Bolívar.

Control De Malezas

Esta actividad es una parte integral del proceso de establecimiento del sistema silvopastorily su ejecución debe adaptarse según las necesidades del cultivo en relación con sus labores culturales. La interventoría a través del seguimiento indica que la actividad se ha llevado acabo con éxito.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al control de maleza en el municipio de Cantagallo - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al control de maleza en el municipio de Santa Rosa – Bolívar

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al control de maleza en el municipio de Morales - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al control de maleza en el municipio de San Pablo - Bolívar

Control De Plagas Y Enfermedades

La interventoría ha hecho seguimiento al manejo de las 6 parcelas demostrativas, después de la siembra el operador realizó visitas técnicas periódicas para la identificación de potenciales brotes de plagas y enfermedades. En el periodo reportado el operador cumplió con las actividades programadas.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al control de plagas y enfermedades en la parcela demostrativa del municipio de Morales.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al control de plagas y enfermedades en la parcela demostrativa del municipio de Cantagallo.

Adecuación de reservorio de agua

Esta interventoría a través de visita a campo confirma que en cada lote elegido como parcela demostrativa se cuenta con reservorios propios de las fincas, los cuales deben ser adecuados para garantizar el suministro de agua a las plantas y animales. En el municipio de San Pablo el operador adecuó el reservorio con maquina amarilla. Para los restantes municipios, el operador propuso en Comité de seguimiento cambiar horas de maquina por accesorios para habilitar el abastecimiento de agua a las plantas y animales, empleado los reservorios existentes en las parcelas. En consecuencia, la interventoría

avala el cumplimiento de la actividad.

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la adecuación de reservorio en la parcela demostrativa del municipio de San Pablo. Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al abastecimiento de agua en la parcela demostrativa del municipio de Santa Rosa del Sur. Bolívar.
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al abastecimiento de agua en la parcela demostrativa del municipio de Simití. Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al abastecimiento de agua en la parcela demostrativa del municipio de Arenal. Bolívar

Escuelas de campos

El operador llevó a cabo en los municipios ZODES las ECAS, eventos supervisados por esta interventoría. En las Escuelas de campos denominada implementación de modelos productivos sostenibles para pequeños productores, les hablaron a los productores sobre la siembra del cultivo de maíz, sorgo y sistema silvopastoril, recapitularon temas ya tratados en otras ECAS, también les despejaron dudas sobre los requerimientos nutricionales y fertilización edáfica y foliar de los cultivos y los sistemas silvopastoriles, a su vez los profesionales técnicos encargados de los talleres les enseñaron a los beneficiarios sobre la preparación y aplicación de bioles, foliares, orgánicos con productos del agro como: ají, ajo, compostaje y caldo de ceniza, entre otras, los

profesionales también ilustraron a los beneficiarios del proyecto acerca de la importancia del mejoramiento genético bovino en la región, dando a conocer las razas de mejor desarrollo en adaptación y producción en el trópico. De esta forma concluyó el ciclo de formación de ECAS en los municipios. Esta interventoría determina que la actividad fue realizada con éxito.

La escuela de campos para el establecimiento de los cultivos de sorgo y maíz dulce, para la producción forrajera la efectuaron con éxito, de igual forma y metodología implementada en los sistemas silvopastoriles, por secciones y subgrupos otorgando la oportunidad a la totalidad de los beneficiarios del proyecto de cada municipio. Los temas que abordaron en estas ECAS fueron:

Establecimiento del cultivo del maíz
Importancia del cultivo de maíz.
Importancia del ensilaje de maíz.
Selección y preparación del terreno.
Alistamiento y cercamiento perimetral.
Trazado
Siembra

Establecimiento del cultivo de sorgo
Importancia del cultivo de maíz.
Importancia del ensilaje de maíz.
Selección y preparación del terreno.
Alistamiento y cercamiento perimetral.
Trazado.

Siembra
Los profesionales a cargo de la entrega del conocimiento en las distintas escuelas transmitieron de una forma idónea y técnica la información y fue recibida por los beneficiarios con gran aceptación, manifestando que desconocían muchos de las ilustraciones que aquí se les dio a conocer, esperan poder replicar este aprendizaje en sus predios y que los demás miembros de sus comunidades puedan aprender y aplicar las mismas acciones de mejora en producción de forrajes en sus terrenos.

En agosto desarrollaron las ECAs como parte integral del proceso de establecimiento del sistema silvopastoril y su ejecución se adaptó según las necesidades del cultivo en relación con sus labores culturales. La interventoría a través del seguimiento indica que la actividad se ha llevado a cabo con éxito.

Se realizó la actividad en los municipios con todos beneficiarios donde realizaron las prácticas de ensilaje, instalaron una pica pasto con la cual picaron las matas de maíz completa con mazorca y todo, los beneficiarios tuvieron la oportunidad de intervenir y llenar una bolsa de silo para hacer más personalizado el proceso. (Ver anexo 16)

La asistencia fue la siguiente:

San Pablo: 100 asistentes
Arenal: 100 asistentes
Cantagallo: 100 asistentes
Morales: 100 asistentes
Santa Rosa: 100 asistentes
Simití: 100 asistentes





Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a ECA- ensilaje en la parcela demostrativa del municipio de Morales. Bolívar.





Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a ECA- ensilaje en la parcela demostrativa del municipio de Arenal. Bolívar.









Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a ECA- ensilaje en la parcela demostrativa del municipio de Santa Rosa del Sur. Bolívar.





Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de ECA en el municipio de Santa rosa-Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de parcela demostrativa en el municipio de Cantagallo-Bolívar.
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de ECA en el municipio de San Pablo-Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de ECA en el municipio de Simití-Bolívar.
	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de ECA en el municipio de Arenal-Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría al desarrollo de ECA en el municipio de Morales Pablo-Bolívar.

C. ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE SORGO DULCE Y MAÍZ PARA PRODUCCIÓN DE ENSILAJE

En cada parcela establecieron media hectárea de sorgo y media de maíz.

Fertilización, manejo integral de plagas y Control de malezas

Estas actividades fueron realizadas por el operador de acuerdo con la programación del POA. La fertilización para el cultivo de sorgo se realizó a la vez que se hizo la preparación del suelo, en el laboreo y volteo del suelo aplicó el fertilizante usando productos a base de N, P, K y elementos menores.

Las actividades concernientes al manejo integrado de plagas han realizado visitas

técnicas para la identificación y evaluación de plagas, estas evaluaciones las hacen semanalmente, de manera que hacen recorridos en zigzag con el fin de identificar presencia de insectos o plagas. Si en las revisiones encuentran insectos hacen las aplicaciones.

En cuanto a control de malezas, se observa desarrollo mínimo de los arvenses por lo que el control de malezas que han realizado sectorial.

	
Seguimiento de la interventoría al control de plagas parcela demostrativa en el municipio de Cantagallo. Bolívar.	Seguimiento de la interventoría al control de malezas en la parcela demostrativa del municipio de Santa Rosa. Bolívar.
	
Seguimiento de la interventoría al control de malezas en la parcela demostrativa del municipio de Simití. Bolívar.	Estado maíz forrajero con control de malezas en la parcela demostrativa del municipio de Morales. Bolívar.



Estado cultivo forrajero con control de plagas y malezas en la parcela demostrativa del municipio de Arenal. Bolívar.

Corte para Ensilaje

Escuelas de campos

La Escuela de Campo los técnicos del operador la realizaron para el establecimiento del cultivo de maíz forrajero, las llevaron a cabo en comunión con otros temas, en esta escuela se compartió por parte de los técnicos del proyecto el conocimiento del tratamiento y manejo de bioles y fertilizantes necesarios en este cultivo; la capacitación fue realizada con éxito.

En agosto, esta interventoría manifiesta que a través de las visitas a las parcelas demostrativas y algunos predios de cada municipio el nacimiento y desarrollo del cultivo del maíz forrajero ha sido ineficiente, según los beneficiarios, las condiciones medioambientales no lo han favorecido, sin embargo, se destaca que en las zonas de vegas es decir zonas bajas donde se ha sembrado el crecimiento es eficaz. Tal como se evidencia en las fotos que se expondrán en el registro fotográfico.



Seguimiento de la interventoría a Cultivo de maíz, Parcela demostrativa municipio de Morales – Bolívar.



Seguimiento de la interventoría a desarrollo de ECA en el municipio de San Pablo-Bolívar.

	
Seguimiento de la interventoría al control de malezas en la parcela demostrativa del municipio de Simití. Bolívar.	Estado maíz forrajero con control de malezas y plagas en la parcela demostrativa del municipio de San Pablo. Bolívar.

Suministro de Kit de Insumos y Herramientas por Productor

Aunque esta actividad estaba programada en el POA para realizarse entre el mes de febrero y abril, solo se realizó en el mes objeto del presente informe, cabe aclarar que en municipio de Santa Rosa del Sur se entregó en el mes de julio, pero en Morales y Arenalla entrega se llevó a cabo el 4 y el 11 de agosto respectivamente.

	
Seguimiento de la interventoría al Suministro de Kit de Insumos y Herramientas a los productores de los municipios del proyecto. Bolívar.	

D. MEJORAMIENTO DEL PIE DE CRIA

Conformación de Comité de supervisión y seguimiento

Una vez completada la base social, en el mes de abril finalmente fue seleccionado el representante de los beneficiarios al Comité de supervisión y seguimiento. Fue elegido titular y suplente a los señores Erick Pacheco Escanio (Arenal) y Alfredo Heredia Jula (Santa Rosa), respectivamente. En el anexo 12 se adjuntan las actas de selección del beneficiario por cada municipio y el acta de selección del beneficiario titular y un suplente con asiento en el Comité de supervisión y seguimiento. El Comité de supervisión y seguimiento está formalizado. Ver anexo 17.

Entrega de novillas

Las actividades correspondientes a este Ítem, Entrega de novillas, Entrega de toretes y Transporte de semovientes el operador no las ha hecho a pesar de que vienen programadas entregas de animales desde el mes de mayo en el Plan Operativo Anual-POA. Ya se ha manifestado por parte de esta interventoría al operador la preocupación del atraso en las entregas de los animales. El contratista-operador manifiesta que está en proceso de selección y adquisición de los animales.

E. SINCRONIZACION DE CELOS E INSEMINACION

Las actividades de este Ítem dependen de la disponibilidad de los animales, por tal razón el Confinamiento de cabezas, Aplicación participativa de hormonas, Entrenamiento en inducción del celo, inseminación y verificación de la preñez y la Inseminación participativa artificial no han podido desarrollarla. El atraso obedece a la no entrega de los semovientes.

Las actividades Verificación Documental de proveedores el operador la ha desarrollado, de hecho, al comienzo del mes de agosto los integrantes del Comité de supervisión y seguimiento realizó visita de inspección de animales a dos fincas de este proveedor.

	
Miembros del Comité de Supervisión y Seguimiento (Gobernación, Productores, Operador e Interventoría) en visita a las fincas Mekata y Liberia para supervisión de bovinos. Agosto 8 de 2023, departamento de Córdoba.	Muestra representativa de machos con rango etario correspondiente a las edades establecidas en el proyecto revisadas por Comité de Supervisión y Seguimiento en las fincas Mekata y Liberia. Agosto 8 de 2023, departamento de Córdoba.
	
Muestra representativa de novillas con rango etario correspondiente a las edades establecidas en el proyecto revisadas por Comité de Supervisión y Seguimiento en las fincas Mekata y Liberia. Agosto 8 de 2023, departamento de Córdoba.	Muestra representativa de machos con rango etario correspondiente a las edades establecidas en el proyecto revisadas por Comité de Supervisión y Seguimiento en las fincas Mekata y Liberia. Agosto 8 de 2023, departamento de Córdoba.

Entrega de Herramientas BPO

Según seguimiento y verificación, esta interventoría avala la entrega de los kits de herramientas de BPO; Este kit debe de ser utilizado en cada una de las actividades relacionadas con el ordeño, buscando de esta manera una mejor inocuidad en esta labor, teniendo en cuenta que con estos insumos se mejorará la higiene en el producto (leche) que luego va a ser consumido por el ser humano. El operador entregó (anexo 18): 1

cantina metálica, 1 balde ordeño, 1 colador y un filtro a cada uno de los beneficiarios. Según documento técnico del proyecto aprobado, se debía entregar: 1 cantina metálica, 1 balde ordeño, 2 coladores para cantinas y 3 filtros para colador, las cantidades de los coladores y filtros fueron modificadas según justificación consignadas en acta de seguimiento No. 3, de enero 16 de 2023.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la entrega de kit BPO en el municipio de Cantagallo - Bolívar</td><td>Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la entrega la entrega de kit BPO en el municipio de Arenal - Bolívar</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la entrega de kit BPO en el municipio de Morales - Bolívar</td><td>Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la entrega de kit BPO en el municipio de San Pablo- Bolívar</td></tr>
</table>

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la entrega de kit BPO en el municipio de Arenal – Bolívar.	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a la entrega de kit BPO en el municipio de Arenal – Bolívar.

F. ASISTENCIA TECNICA

Visitas Asistenciales

La interventoría a través del seguimiento al contratista evidencia que esta actividad ha sido cumplida en 4 de las 7 rondas de visitas que contempla el proyecto en todo el horizonte, la cuarta se realizó en el mes de julio. La cobertura total promedio de visitas a beneficiarios ha sido de un 94%. Es de anotar que esta actividad se ha visto influenciado por situaciones de orden público en las zonas rurales donde se encuentran los beneficiarios. Anexo No. 19 - Fichas de Asistencia Técnica-visita No. 4.


Durante el mes de agosto, las visitas técnicas continúan según lo establecido y acordado en el Plan Operativo Anual (POA) por el contratista, realizaron la visita 5. Los técnicos se rotan por los predios y proporcionan las indicaciones necesarias a los beneficiarios seleccionados para su aplicación en sus hatos. La interventoría ha estado presente durante algunas de estas visitas y también ha realizado algunas visitas de supervisión independientes. Esta actividad ha sido ejecutada con éxito.

Además, en el mes de agosto la interventoría acompaño visitas a beneficiarios en los municipios de Santa Rosa del Sur y Morales con la compañía de delegados de las diferentes administraciones municipales, delegados del DNP y delegados de la gobernación de Bolívar en aras de verificar lo expuesto por los técnicos de la ejecución y el cumplimiento de lo planteado en el POA. Por su parte la Interventoría realizó encuestas sobre la satisfacción de los beneficiarios en la ejecución del proyecto objeto de esta interventoría.







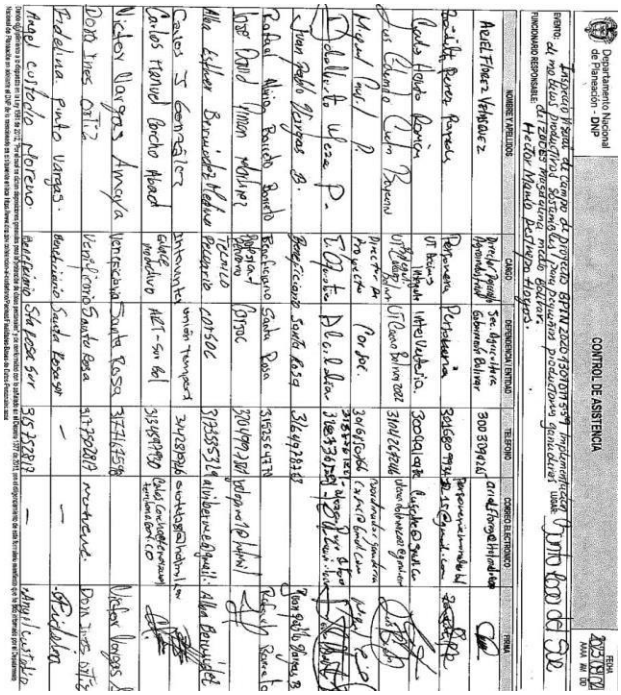

Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

egistro fotográfico visita a predios de delegación de las Alcaldías, DNP, gobernación de Bolívar e Interventoría.

El número de visitas (ronda 5) se discrimina a continuación.

Municipio	Visitas	Soportes*	Observaciones
Simití	100	Récor de visita y registro fotográfico.	1. No aparece beneficiario en

			registro fotográfico (57) 2. Se repiten registros fotográficos (1) 3. Otra persona diferente al beneficiario en el registro fotográfico (1)
Santa Rosa	100	Récor de visita y registro fotográfico.	1. No hay registro fotográfico (1) 2. No aparece beneficiario en registro fotográfico (4) 3. Otra persona diferente al beneficiario en el registro fotográfico (2)
San Pablo	100	Récor de visita y registro fotográfico.	1. No aparece beneficiario en registro fotográfico (23). 2. Beneficiario no firma (1)
Morales	100	Récor de visita y registro fotográfico.	1. Se repiten registros fotográficos (1) 2. No hay formato de registro de visitas (5) 3. Otra persona diferente al beneficiario en el registro fotográfico (8) 4. Dos registros de visitas al mismo beneficiario (1) 5. No hay registro fotográfico (3) 6. Beneficiario no firma (3). 7. No aparece beneficiario en registro fotográfico (1)
Cantagallo	100	Récor de visita y registro fotográfico.	
Arenal	100	Récor de visita y registro fotográfico.	1. Otra persona diferente al beneficiario en el registro fotográfico (16)

			2. Beneficiario no firma (1) 3. No concuerda el nombre del documento con el nombre del beneficiario en los registros (1) 4. Se repiten los registros de visita (1)

* Ver anexo No. 19.1 - Soportes de quinta visita de Asistencia Técnica



Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a visitas de asistencia técnica en el municipio de Cantagallo - Bolívar



Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a visitas de asistencia técnica en el municipio de Arenal - Bolívar



Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a visitas de asistencia técnica en el municipio de San Pablo - Bolívar

	
Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a visita de asistencia técnica en el municipio de Santa Rosa - Bolívar	Registro fotográfico del seguimiento de la interventoría a visitas de asistencia técnica en el municipio de Simití – Bolívar

TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL

Taller de facilitación

Esta actividad fue cumplida en el periodo reportado. La interventoría confirma realización de talleres con el cumplimiento de las exigencias para los mismos. (Anexo 19).





Fotografía 1 y 2. Seguimiento interventoría a Taller De Facilitación No.1 (Simiti y Arenal, Bolivar)





Fotografía 3 y 4. Seguimiento interventoría a Taller De Facilitación No.1 (San Pablo y Santa Rosa del Sur, Bolivar)





Fotografía 5 y 6. Actividad. Taller De Facilitación No.1 (Cantagallo, Bolivar)

Taller de liderazgo y desarrollo de equipo

Esta actividad fue cumplida 100,00% (12/12) al periodo reportado. La interventoría hizo seguimiento al proceso y confirma realización de talleres con el cumplimiento de las exigencias para los mismos-documento técnico del proyecto. (Anexo 21).

Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a taller de Liderazgo y Desarrollo de Equipo, realizado por el operador en el municipio de San Pablo.




Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a taller de Liderazgo y Desarrollo de Equipo, realizado por el operador en el municipio de Simití.







Fotografía 5 y 6. Actividad. Taller de liderazgo (Simití, febrero de 2023).

Taller de creatividad e innovación

Este taller fue dictado por el operador a conformidad en los municipios beneficiados por el proyecto, con participación en número de beneficiarios mínima de 32, lo cual cumple con lo exigido para esta actividad, se busca que quienes participen en estosejercicios sean replicadores con los demás beneficiarios y comunidad en general. Actividad ejecutada. Ver Anexo 22. Listados de asistencia taller Creatividad e Innovación.

Durante el desarrollo se observó apoyo de una tallerista en el caso del municipio de San Pablo, buena acogida por parte de los productores pese a las condiciones climáticas para el traslado de los beneficiarios.





Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a taller Creatividad e Innovación en el municipio de San Pablo.





Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a taller Creatividad e Innovación en el municipio de Cantagallo.

Taller de relaciones de género con equidad

La interventoría verificó a través de acompañamiento y soportes presentados por el contratista la realización de los talleres de relaciones de género con equidad, buscando consideración del enfoque de género en los grupos de trabajo para mejorar el desempeño de su aplicación. Ver anexo 23.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acompañamiento al taller de relaciones de género municipio de Cantagallo - Bolívar</td><td>Acompañamiento al taller de relaciones de género municipio de Arenal - Bolívar</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Acompañamiento al taller de relaciones de género municipio de Morales - Bolívar</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acompañamiento al taller de relaciones de género municipio de Santa Rosa - Bolívar</td><td>Acompañamiento al taller de relaciones de género municipio de Simití - Bolívar</td></tr>
</table>

Taller de Pensamiento, acción y aprendizaje estratégico

La interventoría verificó a través de seguimiento y soportes presentados por el contratista la realización del taller Pensamiento, acción y aprendizaje, en dos sesiones el cual busca reconocer la importancia de la aplicación del pensamiento, la acción y el aprendizaje estratégico en la propia vida y en beneficio de la comunidad. (Ver anexo 24).

La participación fue la siguiente:

Municipio	Participantes	Soportes	Observaciones
Simití	34	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Santa Rosa	35	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
San Pablo	36	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Morales	30	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Cantagallo	30	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Arenal	37	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	

Registro fotográfico.



Seguimiento de interventoría a taller de Pensamiento, Acción y AprendizajeEstratégico en el municipio de Simití - Bolívar - Bolívar



Seguimiento de interventoría a encuentro N°5: Pensamiento, Acción y AprendizajeEstratégico. Cantagallo, Bolívar.

	
Seguimiento de interventoría a encuentro N°5: Pensamiento, Acción y AprendizajeEstratégico. Santa Rosa del Sur, Bolívar.	Seguimiento de interventoría a encuentro N°5: Pensamiento, Acción y AprendizajeEstratégico. Morales, Bolívar.
	
Seguimiento de interventoría a encuentro N°5: Pensamiento, Acción y AprendizajeEstratégico. Arenal, Bolívar.	Seguimiento de interventoría a encuentro N°5: Pensamiento, Acción y AprendizajeEstratégico. San Pablo, Bolívar.

Taller de formulación monitoreo y evaluación de proyectos

La interventoría verificó a través de seguimiento y soportes presentados por el contratista la realización del taller Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos en dos sesiones, cuyo objeto fue que los participantes reconocieran los elementos que se consideran necesarios para preparar, monitorear y evaluar proyectos y utilizar el marco lógico como instrumento de conceptualización y diseño. Ver anexo 25.

La metodología utilizada por los talleristas fue el trabajo mediante ejercicios vivenciales, dinámicas, presentaciones conceptuales, trabajo individual, grupal y en plenarias, y por medio de la retroalimentación de las experiencias personales.

La participación fue la siguiente:

Municipio	Participantes	Soportes	Observaciones

Simití	32	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Santa Rosa	41	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
San Pablo	39	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Morales	30	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Cantagallo	25	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	
Arenal	36	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y memorias del taller.	

Registro fotográfico.



Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. San Pablo - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Cantagallo - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Simití - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Arenal - Bolívar.

	
Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Morales - Bolívar	Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Santa Rosa - Bolívar

Graduación talleres crecimiento personal

Esta interventoría manifiesta que los grados concernientes a los talleres de crecimiento personal se llevaron a cabo en los seis municipios del proyecto. En cada uno de estos hubo participación del equipo directivo del contratista, técnicos, sociales, interventoría, invitados de las alcaldías y representantes lideres de víctimas; además de la entrega de los diplomas los beneficiarios recibieron un compartir (almuerzo) por parte del contratista. Actividad realizada con éxito. Seguidamente se relaciona los participantes por municipio y registro fotográfico. Ver anexo 26.

Municipio	Participantes	Soportes*
Simití	34	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Santa Rosa	41	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
San Pablo	35	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Morales	31	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Cantagallo	31	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Arenal	38	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico

* Ver anexo No. 26

Registro fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres de Crecimiento Personal. San Pablo - Bolívar.</td><td>Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres de Crecimiento Personal. Cantagallo - Bolívar.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres de Crecimiento Personal. Simití - Bolívar.</td><td>Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres de Crecimiento Personal. Arenal - Bolívar.</td></tr>
</table>

	
Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres de Crecimiento Personal - Bolívar	Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres de Crecimiento Personal. Santa Rosa - Bolívar

G. TALLERES ORGANIZACIONALES

Taller fortalecimiento de capacidades empresariales

Esta interventoría hizo seguimiento a la Realización en los 6 municipios del ZODES Magdalena Medio los talleres sobre fortalecimiento de las capacidades empresariales. En estos espacios participaron los productores que han demostrado un interés en prepararse en el tema relacionado. El taller le apuntó a la formación participativa de los productores a nivel asociativo y empresarial para implementar el Plan de Fortalecimiento Organizacional. Anexo No. 27.

	
Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a Taller Organizacional: Fortalecimiento de capacidades empresariales, Morales, Bolívar.	Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a Taller fortalecimiento de capacidades empresariales, San Pablo, Bolívar.



Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a Taller fortalecimiento de capacidades empresariales, Casa de la cultura. Arenal- Bolívar.

Taller organizaciones comunitarias

La interventoría verificó a través de acompañamiento y soportes presentados por el contratista la realización de los talleres de organizaciones comunitarias, que tenía por objeto generar capacidades en los participantes para elaborar planes de acción que incidan en el mejoramiento del desempeño funcional y empresarial de las organizaciones ganaderas de los 6 municipios. Ver anexo 28.

La participación fue la siguiente:

Municipio	Participantes	Soportes	Observaciones
Simití	30	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Santa Rosa	31	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
San Pablo	40	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Morales	30	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Cantagallo	32	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Arenal	36	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones

Registro fotográfico.

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Acompañamiento al taller organizaciones comunitarias en el municipio de Arenal - Bolívar</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acompañamiento al taller organizaciones comunitarias en el municipio de Santa Rosa - Bolívar</td><td>Acompañamiento al taller organizaciones comunitarias en el municipio de Simití - Bolívar</td></tr>
</table>

Taller consolidación legal de organizaciones

La interventoría verificó a través de seguimiento y soportes presentados por el contratista la realización del taller Consolidación Legal de organizaciones, en dos sesiones que tenía por objeto consolidar las organizaciones de Pequeños Productores Ganaderos, una (1) en cada municipio del proyecto, que permita mejorar la gestión de los Pequeños Productores Ganaderos y el fortalecimiento del sector ganadero en sus comunidades y en el Zodes Magdalena Medio. Ver anexo 29.

La participación fue la siguiente:

Municipio	Participantes	Soportes	Observaciones
Simití	34	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones

Santa Rosa	31	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
San Pablo	36	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Morales	31	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Cantagallo	35	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Arenal	35	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones

Registro fotográfico.



Seguimiento de interventoría a encuentro No. 3 Consolidación Legal deOrganizaciones. Arenal, Bolívar.



Seguimiento de interventoría a encuentro No. 3 Consolidación Legal deOrganizaciones. Morales, Bolívar.



Seguimiento de interventoría a encuentro No. 3 Consolidación Legal deOrganizaciones. Simití, Bolívar.



Seguimiento de interventoría a encuentro No. 3 Consolidación Legal deOrganizaciones. Santa Rosa, Bolívar.

	
Seguimiento de interventoría a encuentro No. 3 Consolidación Legal deOrganizaciones. Cantagallo, Bolívar.	Seguimiento de interventoría a encuentro No. 3 Consolidación Legal deOrganizaciones. San Pablo, Bolívar.

Taller de Creación o fortalecimiento legal de organizaciones de Pequeños Productores Ganaderos PPG

Durante el mes de junio la interventoría verificó a través de seguimiento y soportes presentados por el contratista la realización del taller Creación o Fortalecimiento Legal de Organizaciones en dos sesiones, que tenía por objeto crear o fortalecer en cada uno de los seis municipios asociaciones de PPG, basadas en la afinidad de sus sistemas de producción, su vocación, sus fortalezas y debilidades con los requisitos mínimos legales exigidos. Ver anexo 30.

La participación fue la siguiente:

Municipio	Participantes	Soportes	Observaciones
Simití	32	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Santa Rosa	41	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
San Pablo	39	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Morales	30	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Cantagallo	25	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones
Arenal	36	Protocolo, listado de asistencia, evaluación y relatoría del taller.	Dos sesiones

Registro fotográfico.



Seguimiento de interventoría a taller de Fortalecimiento Legal de Organizaciones. Santa Rosa - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Fortalecimiento Legal de Organizaciones. Morales - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Fortalecimiento Legal de Organizaciones. Simití - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Fortalecimiento Legal de Organizaciones. Cantagallo - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Fortalecimiento Legal de Organizaciones. San Pablo - Bolívar.

Graduación

Esta interventoría hace constar que los grados concernientes a los talleres organizacionales se llevaron a cabo en los seis municipios del proyecto. En cada uno de estos hubo participación del equipo directivo del contratista, técnicos, sociales, interventoría, invitados de las alcaldías y representantes lideres de víctimas; además de la entrega de los diplomas

los beneficiarios recibieron un compartir (almuerzo) por parte del contratista. Actividad realizada con éxito. Seguidamente se relaciona los participantes por municipio y registro fotográfico.

La participación fue la siguiente:

Municipio	Participantes	Soportes*
Simití	32	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Santa Rosa	33	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
San Pablo	34	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Morales	31	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Cantagallo	34	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Arenal	36	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico

* Ver anexo No. 31

Registro fotográfico.



Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres Organizacionales. Santa Rosa - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres Organizacionales. Morales - Bolívar.

	
Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres Organizacionales. Simití - Bolívar.	Seguimiento de interventoría a graduación de pequeños productores en talleres Organizacionales. Cantagallo - Bolívar.
	
Seguimiento de interventoría graduación de pequeños productores en talleres Organizacionales. San Pablo - Bolívar.	Seguimiento de interventoría graduación de pequeños productores en talleres Organizacionales. Arenal - Bolívar.

H. TALLERES DE PRODUCCIÓN BOVINA

Sesión 1. Manejo sanitario, alimentación y nutrición
Con esta actividad se inician los talleres de producción bovina. La actividad fue cumplida 100,00% (6/6) en el periodo reportado. Los talleres se adelantaron cumpliendo con todas las exigencias para los mismos. (Anexo 32-soportes del taller).

Sesión 2. Mejora genética e infraestructura ganadera
La actividad fue cumplida 100,00% (6/6) en el periodo reportado. Los talleres se adelantaron cumpliendo con todas las exigencias para los mismos. (Anexo 33-soportes del taller).

Sesión 3. Buenas prácticas ganaderas y conservación y aprovechamiento de forrajes

La interventoría realizó acompañamiento al desarrollo de esta actividad, la cual contó con la presencia de profesional y técnico contratista, con una persona tallerista encargada de exponer el tema a los participantes. Anexo No. 34 – Soportes taller de producción bovina-BPG-Aprovechamiento y conservación de forrajes.

La actividad fue cumplida 100,00% (6/6) en el periodo reportado. Los talleres se adelantaron cumpliendo con todaslas exigencias para los mismos.



Fotografías. Seguimiento de interventoría a Taller De Producción Bovina (Santa Rosa del Sur y San Pablo, Bolivar)



Fotografías. Seguimiento de interventoría a Taller De Producción Bovina (Cantagallo y Simiti, Bolivar)

Graduación

Esta interventoría hace constar que los grados concernientes a los talleres de producción bovina se llevaron a cabo en los seis municipios del proyecto. En cada uno de estos hubo participación del equipo directivo del contratista, técnicos, sociales, interventoría, invitados, de las alcaldías y representantes lideres de víctimas; además de la entrega de los diplomas los beneficiarios recibieron un compartir (almuerzo) por parte del contratista. Actividad realizada con éxito. Seguidamente se relaciona los participantes por municipio y registro fotográfico.

Municipio	Participantes	Soportes*
Simití	38	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Santa Rosa	36	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
San Pablo	31	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Morales	33	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Cantagallo	33	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico
Arenal	30	Listado de Asistencia, Protocolo, diplomas, registro fotográfico

*Ver anexo No. 35

Registro fotográfico.



Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. San Pablo - Bolívar.



Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Cantagallo - Bolívar.

	
Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Simití - Bolívar.	Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Arenal - Bolívar.
	
Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Morales - Bolívar	Seguimiento de interventoría a taller de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Santa Rosa - Bolívar

I. TALLERES CÁRNICOS

El taller de cárnicos se llevó a cabo los días 27 y 28 de julio en la facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, los productores previamente seleccionados fueron trasladados en buses desde sus municipios al departamento de Córdoba, sede de la Universidad.

La capacitación estuvo a cargo de ingenieros de alimentos y personal operativo de la universidad, el taller contó con los protocolos de seguridad e indicaciones adecuadas de manejo y movilización dentro de las plantas de procesos del ente educativo.

Los pequeños productores fueron capacitados en los siguientes aspectos:

Sesión 1. Buenas prácticas en aspectos higiénico-sanitarios, conservación de la carne y procesos de elaboración de productos.

Sesión 2. Elaboración de chorizo, butifarra, hamburguesa, y carne molida aliñada entre

otros.

Sesión 3. Aprovechamiento de la carne para casos específicos, como lo es el sacrificio de emergencia de una res accidentada.

Seguidamente se presenta resumen de los participantes

Municipio	Participantes	Soportes*
Simití	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Santa Rosa	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
San Pablo	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Morales	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Cantagallo	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Arenal	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.

*Ver anexo No. 36





J. TALLERES LÁCTEOS

El taller de Lácteos se llevó a cabo los días 27 y 28 de julio en la facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, los productores previamente seleccionados fueron trasladados en buses desde sus municipios al departamento de Córdoba, sede de la Universidad.

La capacitación estuvo a cargo de ingenieros de alimentos y personal operativo de la universidad, el taller contó con los protocolos de seguridad e indicaciones adecuadas de manejo y movilización dentro de las plantas de procesos del ente educativo.

Los pequeños productores fueron capacitados en los siguientes aspectos:

Sesión 1. Buenas prácticas de ordeño y manipulación y control de calidad de la leche.

Sesión 2. Elaboración de queso.

Sesión 3. Elaboración de yogurt y suero costeño.

Municipio	Participantes	Soportes*
Simití	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Santa Rosa	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.

San Pablo	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Morales	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Cantagallo	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.
Arenal	15	Listado de Asistencia, protocolo, relatoría y registro fotográfico.

***Ver anexo No. 37

Registro fotográfico









K. ACOMPAÑAMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL

Asistencia social y apoyo psicosocial

La interventoría hizo seguimiento a la Realización en los 6 municipios del ZODES Magdalena Medio los talleres sobre asistencia social y apoyo psicológico. En estos espacios participaron los productores que han demostrado un interés en prepararse en el tema relacionado. Los profesionales han realizado 3 de las 5 rondas de visitas a los productores. Anexo No. 38 - Récor de visita y registro fotográfico Visita Asistencia Social y Apoyo Psicosocial.

En el mes de agosto terminaron de ejecutar la ronda 4 de visitas de asistencia social y apoyo psicosocial. Referente a los soportes, se observa lo siguiente:

Cantagallo: 100 visitas realizadas, con sus respectivos registros completos
Morales: la carpeta está vacía, no hay registros de visitas
San Pablo: solamente hay 1 registro de visita en la carpeta
Simití: solamente hay 10 registros de visitas en la carpeta
Faltan las carpetas con los registros de visitas de los municipios de **Arenal y Santa Rosa**.

	
Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a visita de Asistencia Social y Apoyo Psicosocial realizada por el operador en el municipio de Cantagallo – Bolívar.	Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a visita de Asistencia Social y Apoyo Psicosocial realizada por el operador en el municipio de, San Pablo - Bolívar

	
Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a visita de Asistencia Social y Apoyo Psicosocial realizada por el operador en el municipio de Simití - Bolívar	Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a visita de Asistencia Social y Apoyo Psicosocial realizada por el operador en el municipio de Rosa - Bolívar
	
Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a visita de Asistencia Social y Apoyo Psicosocial realizada por el operador en el municipio de Morales - Bolívar	Registro fotográfico de seguimiento del equipo de interventoría a visita de Asistencia Social y Apoyo Psicosocial realizada por el operador en el municipio de Arenal – Bolívar.

Registro fotográfico

	
Seguimiento de interventoría a Asistencia social y apoyo psicosocial. Productor Aldomar Pabuena Peña. Nueva Esperanza. Arenal, Bolívar.	Seguimiento de interventoría a Asistencia social y apoyo psicosocial, productor Wilmer Florián Hernández. Vereda Las Pailas. Morales, Bolívar.
	
Seguimiento de interventoría a Asistencia social y apoyo psicosocial. Productor Pablo José Para López Corregimiento Los Canelos, Vereda La Esperanza. Santa Rosa del Sur, Bolívar.	Seguimiento de interventoría a Asistencia social y apoyo psicosocial, productor Omaldo Rivera de la vereda Las Palmeras. Simití, Bolívar.
	
Seguimiento de interventoría a Asistencia social y apoyo psicosocial, productora Ana F. Hoyos. Vereda La Y, Cañabraval Bajo, San Pablo, Bolívar.	Seguimiento de interventoría a Asistencia social y apoyo psicosocial, Productor Julio Cesar Beltrán, vereda Cedro Bajo. Cantagallo, Bolívar.

L. ESTRATEGIA DE VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN

La interventoría a través de acompañamiento al contratista evidencia el cumplimiento de esta actividad, la estrategia de visibilidad y difusión con los distintivos asociados como herramientas o prendas de promoción e identificación del proyecto se encuentra cumplida.

Se recomendó al contratista subir al drive del proyecto el Documento Estrategia de Visibilidad.

M. SEGUIMIENTO

Reunión con equipo de interventoría

Mensualmente se realiza el comité de seguimiento al proyecto en la gobernación de Bolívar. El director del proyecto presenta informe con corte al respectivo, haciendo énfasis en las actividades desarrolladas en el periodo. Igualmente, presenta propuestas las cuales son analizadas en el seno del Comité y se toman las decisiones respectivas. En estos comités la interventoría presenta observaciones al operador que han sido recopiladas por sus profesionales de campo, el operador da las respectivas explicaciones y hace los correctivos del caso. (Anexo No. 6 actas de seguimiento del proyecto).

Conformar y actualizar el expediente físico del proyecto

Por medio de soportes almacenados en físico y digitalmente a través de una nube, permiten constatar que el contratista cuenta con el expediente del proyecto. El expediente contiene actas, carpetas con las actividades desarrolladas mes a mes, base de datos inicial, documentos contractuales, información de los profesionales e informes financieros del proyecto.

Esta interventoría continúa haciendo observaciones al operador para mejorar la organización de los expedientes físicos y digitales con los que cuenta. Caracterizaciones, récord de visita, registro fotográfico y otros soportes del proceso.

Seguimiento actividades del POA

En el proceso de revisión y seguimiento de las actividades del POA a corte de julio, se observa que programado a esta fecha debía estar ejecutado el 85%, mientras que lo ejecutado validado por interventoría corresponde al 67%, presentando un déficit de 18 puntos; preocupa a esta interventoría que la diferencia entre lo programado y ejecutado, cada periodo se amplía más, fruto de no haber iniciado con las entregas de semovientes. Ver anexo 7.

CONCLUSIONES

- El contratista ha dado cumplimiento del POA en un 67% del 85% programado en la ejecución de las actividades generales y especificas contenidas en el contrato en referencia, teniendo en cuenta la reprogramación de actividades del POA, lo cual genera una alerta sobre el cumplimiento de metas del proyecto, por lo cual esta interventoría le ha llama la atención al operador. Se ha solicitados el cronograma de entregas al contratista para poner al día las actividades que

muestran retraso y poder cumplir con los tiempos contractuales.

- El concepto de los beneficiarios sobre el proyecto es en términos generales bueno, teniendo en cuenta que aún está pendiente la entrega de semovientes. La interventoría hace sondeos para medir la conformidad de los beneficiarios. Dentro de las manifestaciones enuncian:

1. Manifiestan las condiciones climáticas atípicas (lluvias).
2. Piden que el ganado lo den en una sola entrega.
3. Dicen que el proyecto es beneficioso para las familias víctimas del conflicto armado y esperan que se hagan más proyectos como estos.
4. Otros piensan que el proyecto les mejoró el nivel de vida, sobre todo a las mujeres.

Registro fotográfico de visitas de profesionales de la interventoría a beneficiarios para conocer el grado de satisfacción que tieenen sobre el proyecto.

















NOMBRE DEL INTERVENTOR

FIRMA DEL INTERVENTOR

UNIÓN TEMPORAL ACCIONES INTEGRALES
NIT No. 901.641.746-4

WILLIAM PACHECO HUERTAS
Director Interventoría
