
Pantallazo matriz de seguimiento para proyectos asignados evidenciando columnas (AM:AT) % avance físico, técnico, SPI, CPI, CV(t)

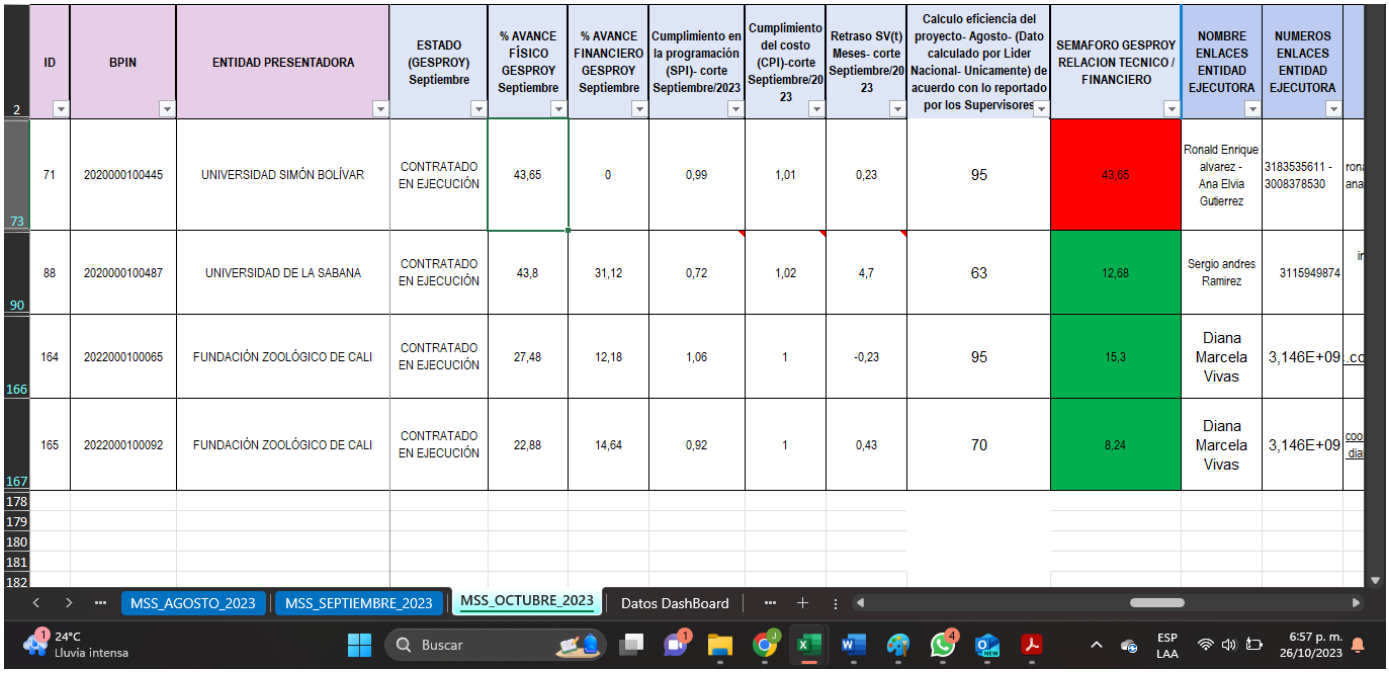

	ID	BPIN	ENTIDAD PRESENTADORA	ESTADO (GESPROY) Septiembre	% AVANCE FÍSICO GESPROY Septiembre	% AVANCE FINANCIERO GESPROY Septiembre	Cumplimiento en la programación (SPI)- corte Septiembre/2023	Cumplimiento del costo (CPI)-corte Septiembre/2023	Retraso SV(t) Meses- corte Septiembre/2023	Calculo eficiencia del proyecto- Agosto- (Dato calculado por Lider Nacional- Unicamente) de acuerdo con lo reportado por los Supervisores	SEMAFORO GESPROY RELACION TECNICO / FINANCIERO	NOMBRE ENLACES ENTIDAD EJECUTORA	NUMEROS ENLACES ENTIDAD EJECUTORA	
2														
73	71	2020000100445	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	43,65	0	0,99	1,01	0,23	95	43,65	Ronald Enrique alvarez - Ana Elvia Gutierrez	3183535611 - 3008378530	rona ana
90	88	2020000100487	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	43,8	31,12	0,72	1,02	4,7	63	12,68	Sergio andres Ramirez	3115949874	ir
166	164	2022000100065	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	27,48	12,18	1,06	1	-0,23	95	15,3	Diana Marcela Vivas	3,146E+09	co
167	165	2022000100092	FUNDACIÓN ZOOLÓGICO DE CALI	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	22,88	14,64	0,92	1	0,43	70	8,24	Diana Marcela Vivas	3,146E+09	coo dia
178														
179														
180														
181														
182														

MSS_AGOSTO_2023 | MSS_SEPTIEMBRE_2023 | MSS_OCTUBRE_2023 | Datos DashBoard

24°C Lluvia intensa | Buscar | ESP LAA | 6:57 p. m. 26/10/2023
