
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN**	**305 días**	**lun 10/10/22**	**jue 10/08/23**
2	Firma del Acta de Inicio	1 día	lun 10/10/22	lun 10/10/22
3	Recopilación de Información Secundaria (EOT, Información Disponible en Entidades Oficiales, Cartografías Básica y Temática, Registro de Eventos, etc)	47 días	mar 11/10/22	sáb 26/11/22
4	Definición de los Métodos de Evaluación de las Amenazas por Movimientos en Masa a Niveles Urbano (Esc 1:5.000) y Rural (Esc 1:25.000)	10 días	lun 21/11/22	mié 30/11/22
5	Selección de los Métodos de Evaluación de la Amenaza por Inundación a Niveles Urbano y Rural (Esc 1:5.000 y 1:25.000, respectivamente)	10 días	lun 21/11/22	mié 30/11/22
6	Definición de los Métodos de Evaluación de la Amenaza por Torrencialidad (Esc 1:2.000 para el Área Urbana y Esc 1:25.000 para el Área Rural)	10 días	lun 21/11/22	mié 30/11/22
7	Planteamiento y Selección de los Métodos de Evaluación de la Amenaza por Incendios Forestales en Niveles Urbano (Esc 1:5.000) y Rural (1:25.000)	10 días	sáb 26/11/22	lun 5/12/22
8	**GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA BÁSICA**	**63 días**	**mar 22/11/22**	**lun 23/01/23**
9	Generación de la Cartografía para el Análisis de las Amenazas en el Área Rural a Partir de la Información Secundaria (Igac, Esc 1:25.000)	15 días	mar 22/11/22	mar 6/12/22
10	Levantamiento y Generación de Cartografía Básica para la Evaluación de Amenazas en el Área Urbana a Escala 1:5.000 (Levantamiento con Tecnología Lidar)	25 días	lun 28/11/22	jue 22/12/22
11	Levantamiento Topográfico Detallado de los Cuerpos de Agua en el Área Urbana para el Análisis de la Amenaza por Torrencialidad (Levantamiento con Estación a Escala 1:2.000)	40 días	sáb 3/12/22	mié 11/01/23
12	Modelo de Elevación Digital del Terreno	30 días	dom 25/12/22	lun 23/01/23
13	**ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO (CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA, CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA A NIVEL ELEMENTOS O SUBUNIDADES)**	**101 días**	**lun 14/11/22**	**mié 22/02/23**
14	**ESTUDIO GEOLÓGICO**	**96 días**	**lun 14/11/22**	**vie 17/02/23**
15	Revisión de cartografía e información geológica secundarias	15 días	lun 14/11/22	lun 28/11/22
16	Levantamiento de Información de Campo	25 días	mié 4/01/23	sáb 28/01/23
17	Elaboración de la Cartografía de Geología a Nivel de Unidades Geológicas Superficiales para la Evaluación de las Amenazas en el Área Rural (Esc 1:25.000)	35 días	mié 4/01/23	mar 7/02/23
18	Generación de Cartografía Geológica a Nivel de Unidades de Geología para Ingeniería para el Área Urbana (Escala 1:5.000)	45 días	mié 4/01/23	vie 17/02/23
19	**ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO**	**90 días**	**vie 25/11/22**	**mié 22/02/23**
20	**INVENTARIO DE PROCESOS MORFODINÁMICOS**	**65 días**	**vie 25/11/22**	**sáb 28/01/23**
21	Catálogo	12 días	vie 25/11/22	mar 6/12/22
22	Inventario Geomorfológico	15 días	mié 30/11/22	mié 14/12/22
23	Revisión de Eventos Históricos	5 días	lun 5/12/22	vie 9/12/22
24	Fotointerpretación	30 días	lun 5/12/22	mar 3/01/23
25	Levantamiento de Información de Campo	25 días	mié 4/01/23	sáb 28/01/23
26	Inventario de Procesos Morfodinámicos	25 días	mié 4/01/23	sáb 28/01/23
27	**GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA GEOMORFOLÓGICA**	**50 días**	**mié 4/01/23**	**mié 22/02/23**
28	Geomorfología para la Zona Rural a Nivel de Subunidades Geomorfológicas (Esc 1:25.000)	45 días	mié 4/01/23	vie 17/02/23
29	Geomorfología para el Área Urbana a Nivel de Elementos Geomorfológicos (Esc 1:5.000)	50 días	mié 4/01/23	mié 22/02/23
30	**ESTUDIO DE COBERTURA Y USOS DEL SUELO**	**60 días**	**mié 1/02/23**	**sáb 1/04/23**
31	Generación de la Cartografía de Cobertura y Usos del Suelo a Escala 1:25.0	30 días	mié 1/02/23	jue 2/03/23
32	Elaboración de la Cartografía de Cobertura y Usos del Suelo a Escala 1:5.00	30 días	vie 3/03/23	sáb 1/04/23
33	**ESTUDIO HIDROLÓGICO**	**40 días**	**lun 2/01/23**	**vie 10/02/23**
34	Análisis de la Información Hidroclimatológica Proveniente de Fuentes Secundarias	25 días	lun 2/01/23	jue 26/01/23
35	Estimación del Régimen Hidrológico para la Evaluación a Niveles Rural y Urbano	30 días	jue 12/01/23	vie 10/02/23
36	**MOVIMIENTOS EN MASA**	**149 días**	**mar 10/01/23**	**mié 7/06/23**
37	Exploración Directa (Perforación con Alternancia de Avances por Percusión y Rotación)	45 días	mar 10/01/23	jue 23/02/23
38	Exploración Indirecta (Tomografías Eléctricas)	25 días	mié 25/01/23	sáb 18/02/23
39	Ensayos de Laboratorio	60 días	sáb 4/02/23	mar 4/04/23
40	Estudio y Análisis Geotécnico (Caracterización Geomecánica)	30 días	lun 6/03/23	mar 4/04/23
41	Estructuración de Modelos Geológico - Geotécnicos de las Áreas Urbanas (Esc 1:5.000)	20 días	jue 16/03/23	mar 4/04/23
42	Evaluación y Zonificación de la Amenaza por M.M. a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	40 días	sáb 18/02/23	mié 29/03/23
43	Evaluación y Zonificación de la Amenaza por M.M. a Nivel Urbano (Esc 1:5.000)	40 días	jue 30/03/23	lun 8/05/23
44	Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad y el Riesgo por Movimientos en Masa	20 días	mar 9/05/23	dom 28/05/23
45	Planteamiento de las Medidas no Estructurales de Mitigación del Riesgo por M.M.	10 días	lun 29/05/23	mié 7/06/23
46	**INUNDACIÓN**	**82 días**	**sáb 11/02/23**	**mié 3/05/23**
47	Análisis Histórico de los Eventos de Inundación	10 días	sáb 11/02/23	lun 20/02/23
48	Evaluación y Zonificación de la Amenaza por Inundación a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	25 días	jue 23/02/23	dom 19/03/23
49	Evaluación y Zonificación de la Amenaza por Inundación a Nivel Urbano (1:5.000)	25 días	lun 20/03/23	jue 13/04/23
50	Evaluación de la Condición de Vunerabilidad y Riesgo por Inundación	10 días	vie 14/04/23	dom 23/04/23
51	Planteamiento de las Medidas de Mitigación del Riesgo por Inundaciones	10 días	lun 24/04/23	mié 3/05/23
52	**AVENIDAS TORRENCIALES**	**80 días**	**jue 4/05/23**	**sáb 22/07/23**
53	Análisis Histórico de los Eventos de Torrencialidad	10 días	jue 4/05/23	sáb 13/05/23
54	Evaluación y Zonificación de la Amenaza por Avenidas Torrenciales a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	25 días	dom 14/05/23	mié 7/06/23
55	Evaluación y Zonificación de la Amenaza por Avenidas Torrenciales a Nivel Urbano (1:2.000)	25 días	jue 8/06/23	dom 2/07/23
56	Evaluación de la Condición de Vulnerabilidad y Riesgo por Torrencialidad	10 días	lun 3/07/23	mié 12/07/23
57	Planteamiento de las Medidas de Mitigación del Riesgo por Avenidas Torrenciales	10 días	jue 13/07/23	sáb 22/07/23
58	**INCENDIOS FORESTALES**	**152 días**	**mié 1/03/23**	**dom 30/07/23**
59	Análisis del Registro Histórico de Eventos	15 días	mié 1/03/23	mié 15/03/23
60	Estudio Climatológico del Municipio	25 días	mié 1/03/23	sáb 25/03/23
61	Análisis de Susceptibilidad de la Cobertura Vegetal a los Incendios	20 días	dom 2/04/23	vie 21/04/23
62	Evaluación de la Condición de Amenaza por Incendios Forestales a Nivel Rural (Esc 1:25.000)	35 días	sáb 22/04/23	vie 26/05/23
63	Evaluación de la Condición de Amenaza por Incendios Forestales a Nivel Urbano (Esc 1:5.000)	35 días	sáb 27/05/23	vie 30/06/23
64	Evaluación y Zonificación de la Vulnerabilidad y el Riesgo por Incendios Forestales	20 días	sáb 1/07/23	jue 20/07/23
65	Planteamiento de las Medidas de Mitigación del Riesgo por Incendios Forestales	10 días	vie 21/07/23	dom 30/07/23
66	**INFORMES**	**241 días**	**mar 13/12/22**	**jue 10/08/23**
67	Informe de Avance I	10 días	mar 13/12/22	jue 22/12/22
68	Informe de Avance II	10 días	mié 8/03/23	vie 17/03/23
69	Informe de Avance III	10 días	jue 1/06/23	sáb 10/06/23
70	Informe Final	11 días	lun 31/07/23	jue 10/08/23
71	**REUNIÓN QUINCENAL DE SEGUIMIENTO**	**253 días**	**vie 18/11/22**	**vie 28/07/23**
72	Reunión Quincenal de Seguimiento 1	1 día	vie 18/11/22	vie 18/11/22
73	Reunión Quincenal de Seguimiento 2	1 día	vie 2/12/22	vie 2/12/22
74	Reunión Quincenal de Seguimiento 3	1 día	vie 16/12/22	vie 16/12/22
75	Reunión Quincenal de Seguimiento 4	1 día	jue 29/12/22	jue 29/12/22
76	Reunión Quincenal de Seguimiento 5	1 día	vie 13/01/23	vie 13/01/23
77	Reunión Quincenal de Seguimiento 6	1 día	vie 27/01/23	vie 27/01/23
78	Reunión Quincenal de Seguimiento 7	1 día	vie 10/02/23	vie 10/02/23
79	Reunión Quincenal de Seguimiento 8	1 día	vie 24/02/23	vie 24/02/23
80	Reunión Quincenal de Seguimiento 9	1 día	vie 10/03/23	vie 10/03/23
81	Reunión Quincenal de Seguimiento 10	1 día	vie 24/03/23	vie 24/03/23
82	Reunión Quincenal de Seguimiento 11	1 día	vie 7/04/23	vie 7/04/23
83	Reunión Quincenal de Seguimiento 12	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
84	Reunión Quincenal de Seguimiento 13	1 día	vie 5/05/23	vie 5/05/23
85	Reunión Quincenal de Seguimiento 14	1 día	vie 19/05/23	vie 19/05/23
86	Reunión Quincenal de Seguimiento 15	1 día	vie 2/06/23	vie 2/06/23
87	Reunión Quincenal de Seguimiento 16	1 día	vie 16/06/23	vie 16/06/23
88	Reunión Quincenal de Seguimiento 17	1 día	vie 30/06/23	vie 30/06/23
89	Reunión Quincenal de Seguimiento 18	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23
90	Reunión Quincenal de Seguimiento 19	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23

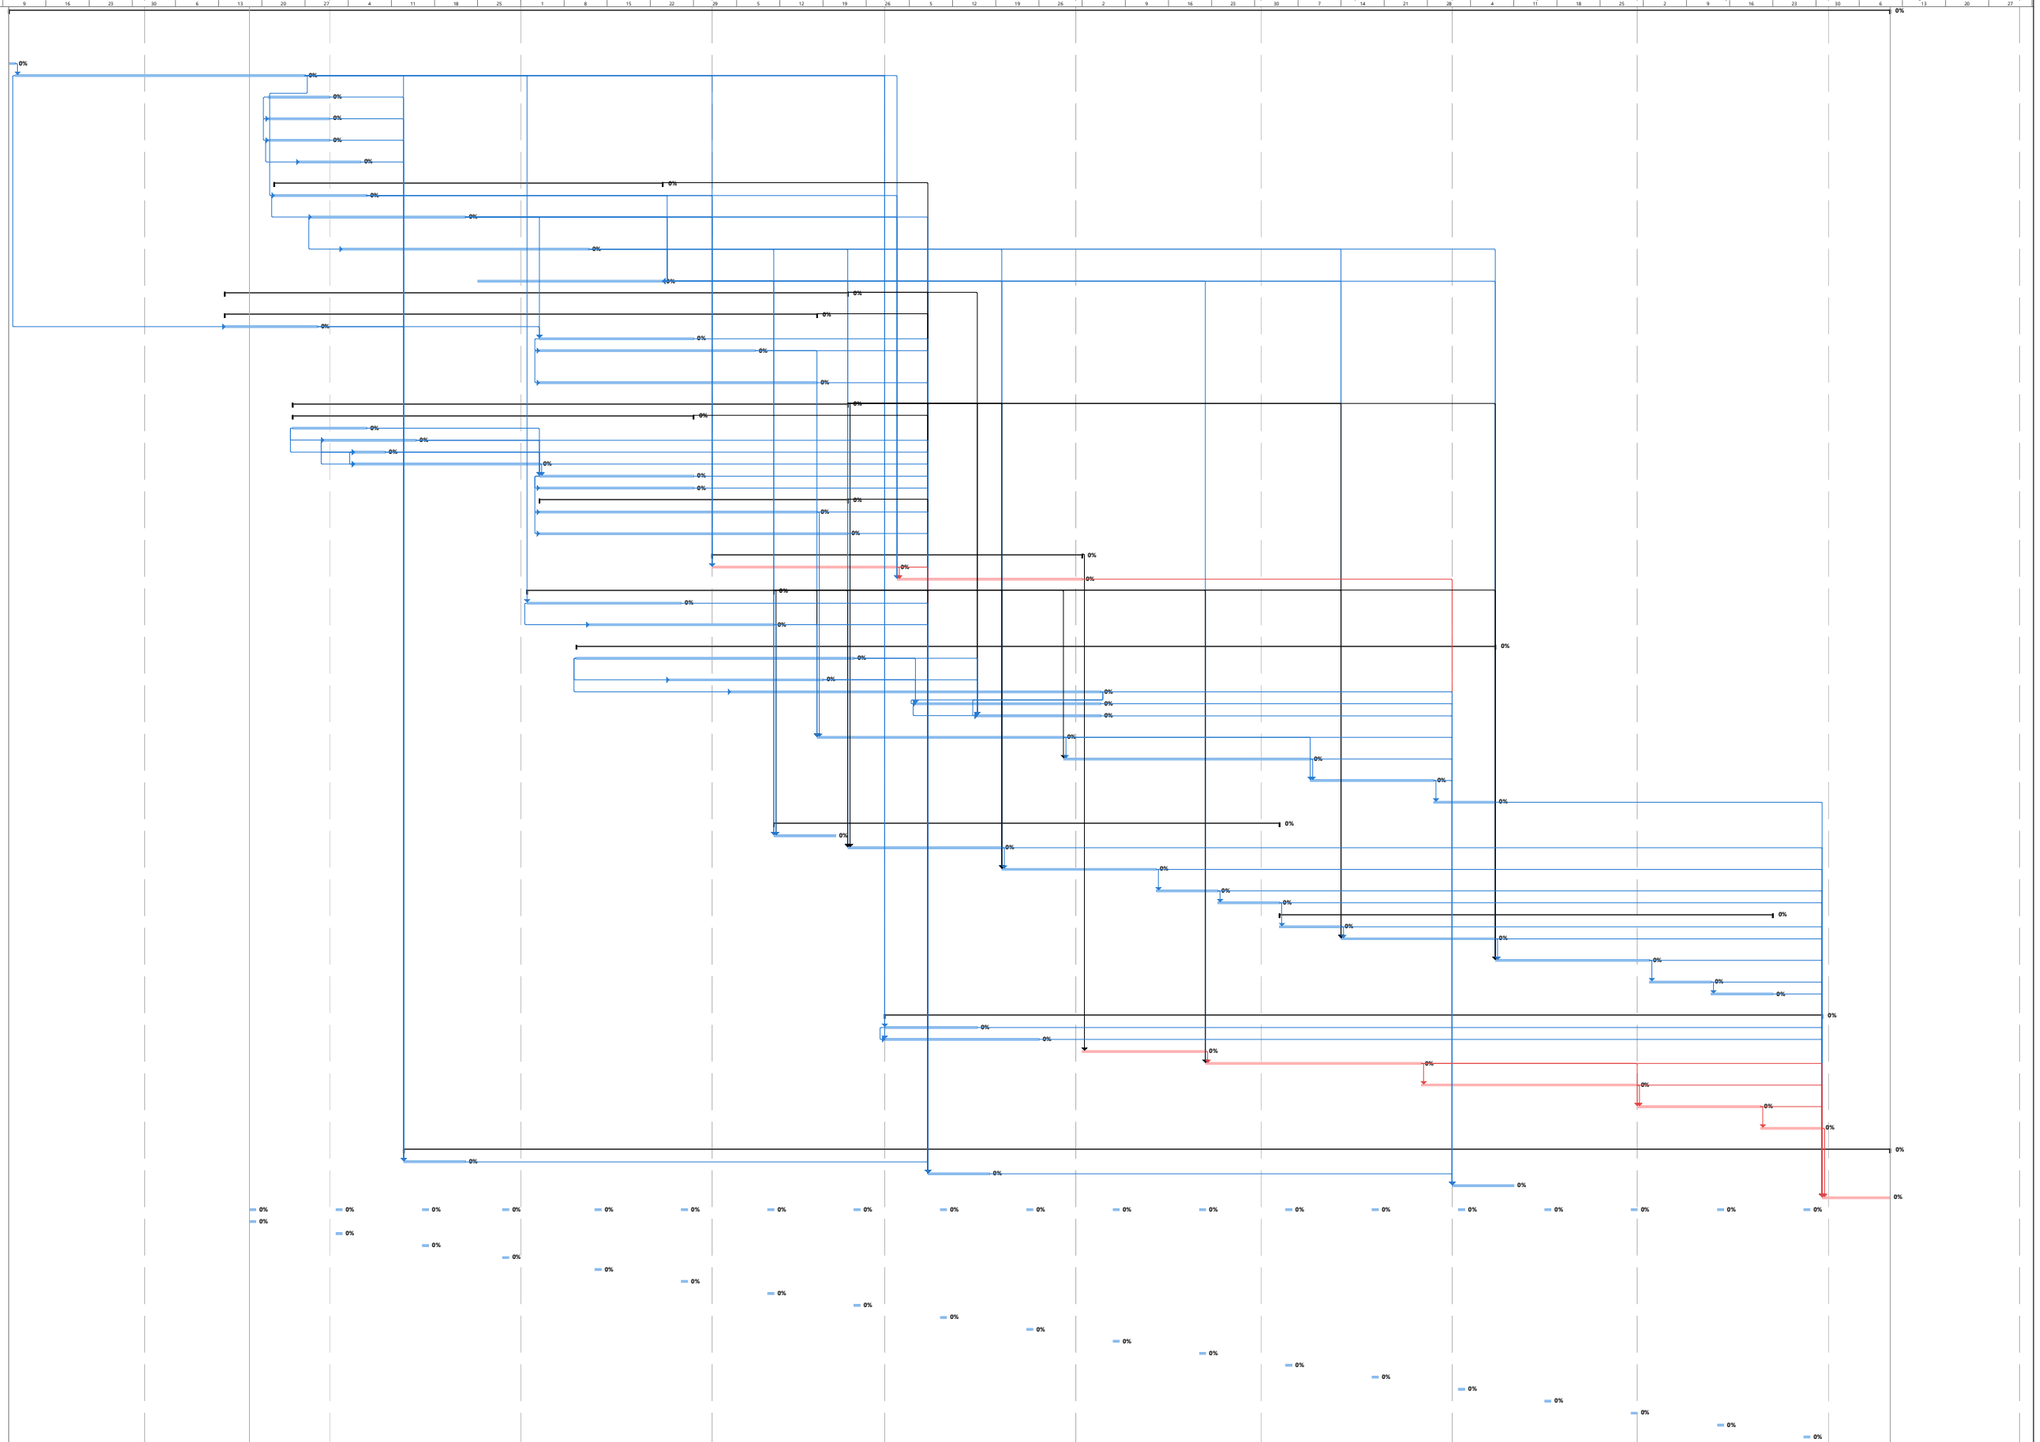

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · Solo al comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite
