INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO UNO Nº 1
CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA
CONTRATO NÚMERO: 494SA2023

Valor: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS MLC ($135.659.020) incluido IVA y demás retenciones a que haya lugar.

Plazo: TRES (3) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023

OBJETO DEL CONVENIO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES Y EMPAQUES DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÒLIDOS PGIRS VIGENCIA 2021 2027.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Actividad Nº1: Elaboración de cronograma de actividades de todo el periodo del contrato, donde se especifique la programación fecha a fecha de las acciones a realizar, durante la ejecución del contrato.

***Actividad Nº2*:** Realizar 111 recorridos para el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos diferenciada de acuerdo a las demandas de la población campesina y neo rural (realizar 2111 actividades ecológicas y de educación ambiental con la comunidad rural frente al manejo adecuado de los residuos sólidos)

OBJETIVO ESPECÍFICO
Realizar recorrido por 6 rutas establecidas las cuales abarcan cada una de las veredas del municipio con el fin hacer una clasificación y disposición de los residuos generados por los habitantes.

META
Realizar recorridos por cada una de las rutas, con una frecuencia semanal las cuales tienen un cubrimiento de un 75% de las veredas. Los recorridos son realizados por las vías principales de cada vereda.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de las actividades se elaboró un cronograma de actividades el cual fue aprobado por las partes.

Esta actividad se realizó en cada una de las veredas según las rutas establecidas, los recorridos se hicieron con una frecuencia semanal de la siguiente manera:

Ruta 1: ALPES, YARUMOS, MONTAÑITA, SANTA CRUZ, ALTO DEL MERCADO.
Ruta 2: RECODO, SAN BOSCO, SAN JOSÉ, GAVIRIA, CHOCHO MAYO, LA PEÑA, SALTO ARRIBA, SALTO ABAJO.
Ruta 3: EL PORVENIR, POZO, EL ROSARIO, LA INMACULADA, MILAGROSA, **Ruta 4:** CIMARRONAS, CASCAJO ABAJO, CASCAJO ARRIBA, LAS MERCEDES, EL CHAGUALO.
Ruta 5: LA ESMERALDA, LA ESPERANZA, CAMPO ALEGRE.
Ruta 6: LLANADAS, LA ASUNCION, EL SOCORRO, LA PRIMAVERA, EL RECREO.

En cada uno de los recorridos se logró hacer la recolección de los residuos que son dejados por la comunidad en campo abierto aportando a la protección ambiental. Para este mes se realizaron 34 recorridos, por las rutas establecidas las cuales conforman las 34 veredas del municipio. Para este mes se realizaron 34 recorridos ya que la semana vacacional llegan a las veredas mucho flujo de personas y por ende aumenta la problemática ambiental con la separación de los residuos generados. En algunas de las veredas a pesar de los procesos de educación ambiental que se vienen adelantando, se han presentado dificultades por la mala disposición final de los residuos ya que los sacan mezclados o en días no autorizados para cada vereda, lo cual ocasiona focos de contaminación.

Para este mes la cantidad de residuos recolectados fue de **142.350 Kg**. Dichos residuos son dispuestos en el relleno sanitario del municipio.


Es de resaltar que durante los recorridos algunas personas realizan el aprovechamiento del material orgánico como fertilizante de suelos en sus fincas y los residuos inorgánicos aprovechables son entregados en las rutas destinadas para estos residuos, los cuales son entregados a los recicladores del municipio.

Evidencias de la actividad







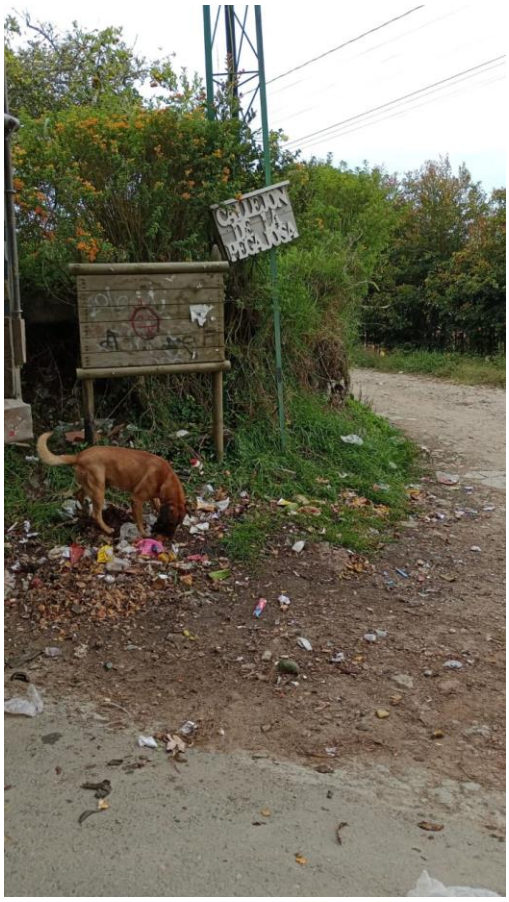


***Actividad Nº3*:** Registrar y entregar mensualmente a la Secretaría de Agricultura y Ambiente la cantidad de residuos recolectados y recuperados en cada una de las rutas establecidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Hacer la disposición adecuada de los residuos sólidos.

META
Realizar la disposición en el Parque Ambiental Los Saltos, cada mes, de acuerdo con lo establecido con la Empresa de Servicios Públicos ESPA.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Se realizó la disposición final en el sitio autorizado

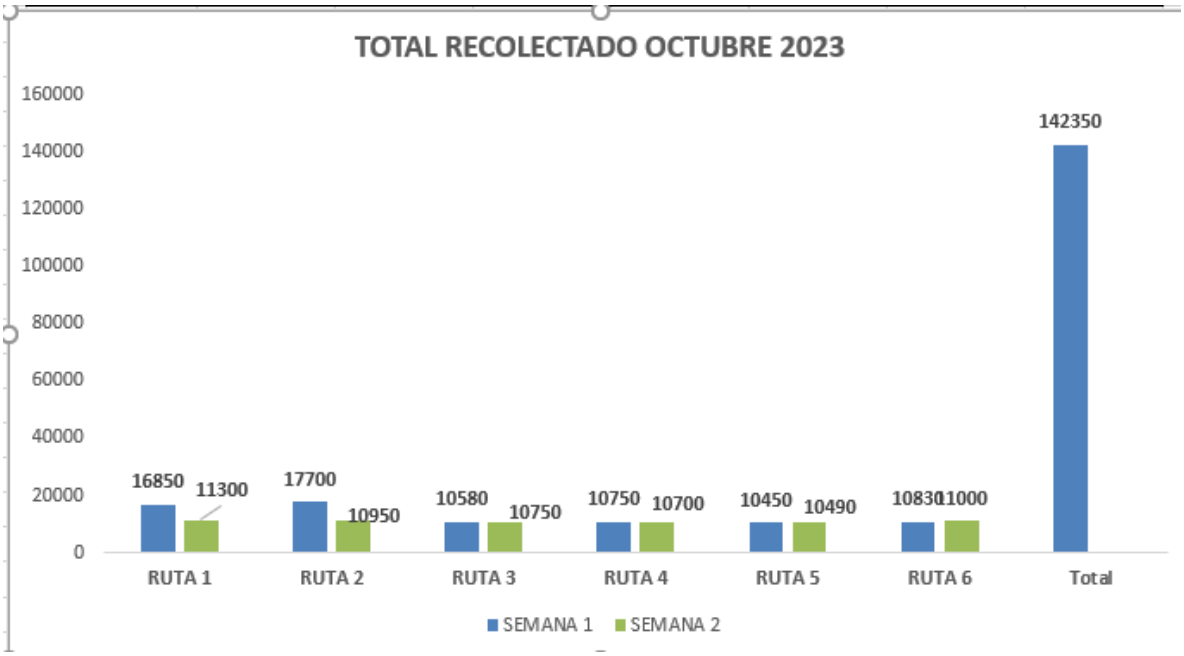

***Actividad Nº 4*:** Realizar una (1) intervención de control y mantenimiento a 13 puntos críticos que se encuentran identificados en diferentes sectores del área rural del municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Realizar seguimiento a los puntos identificados como críticos y realizar actividades que conlleven a promover la cultura ambiental.

META
Recuperar 13 puntos que son críticos por la mala disposición final de los residuos.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

En concordancia con la propuesta de "Mantenimiento, control y sensibilización de los puntos críticos" frente a la mala disposición de los residuos sólidos, mezclados con residuos orgánicos o de manejo especial (RCD), se inicia el proceso en cuatro de los trece puntos propuestos para este período. (Y se interviene uno más que no está descrito en las jornadas). Los puntos han sido:

San José

Sobre la vía Marinilla- El Peñol, se encuentra ubicada la vereda San José. Por ser un corredor turístico, y una zona en la que las familias de ciertos callejones deben sacar los residuos hasta la vía principal, este lugar tiene épocas de contaminación como días festivos o en épocas de vacaciones, donde aumenta el turista, el veraneante y disponen sus residuos cualquier día en el lugar. Par este mes se realiza la intervención con la limpieza del lugar y la sensibilización puerta a puerta el día 11 de octubre, miércoles correspondiente a la semana de receso escolar, esto con el fin de que la educación ambiental fuera llevada a más personas. En la limpieza estuvo el equipo de la Asociación y el carro nos recogió los residuos después de haber hecho la ruta que correspondía al día.



- **Chocho Mayo, las partidas**

  Durante el mes de octubre, se realiza un proceso de intervención en la vereda Chocho mayo en la entrada para la escuela. En este lugar, dada la inadecuada disposición de los residuos sólidos, se realiza el proceso el día 17 de octubre, en el que se hace la limpieza del lugar, se desinstala en punto ecológico que el municipio había instalado anteriormente y se instalan jardineras. En el proceso, además, nos acompañó la comunidad del sector, un reciclador de la y la Secretaría de Agricultura y Ambiente (Jessica Restrepo). La jornada se realizó en la mañana, y al pasar la Ruta de Recolección, el lugar quedo totalmente limpio.

Adicionalmente se realiza un proceso de sensibilización puerta a puerta con las fincas aledañas, informándoles sobre las rutas que dispone La Asociación y el municipio.



Santa Cruz- entrada al acueducto- Cuchilla de Los Cedros

La comunidad de la vereda Santa Cruz, la Junta, y vecinos del sector aunaron esfuerzos y realizaron luna jornada de limpieza y recuperación del punto crítico en la entrada del acueducto multiveredal del Alto del Mercado. Instalaron jardineras y le solicitaron a la Asociación que en la ruta se pudieran llevar todos los elementos y residuos allí organizados. Cabe señalar que en una ocasión anterior la Asociación había hecho la limpieza, pero la comunidad se apropió y organizó de manera satisfactoria el lugar. Esta intervención se realizó entre el mes de septiembre y octubre del año lectivo.



Santa Cruz, partidas entre Montañita, Chocho Mayo y Santa Cruz

Dada la ubicación de este lugar y ser un punto de encuentro entre tres veredas, el manejo y control del sitio ha sido complejo. Se ha limpiado y organizado muchas veces, se han instalado vallas informativas con las rutas, mensajes de cuidado y jardineras y el lugar en pocos días se vuelve a ver contaminado. En el proceso de educación ambiental las comunidades manifiestan su inconformidad, pues dicen que la llegada de tanta nueva población neorrural o veraneante les ha agudizado problemáticas ambientales (acueducto y mala disposición de residuos), por lo que, de manera conjunta para el mes de noviembre, se planea una jornada de sensibilización un fin de semana para llegar a dicha población.

En lo que respecta a la intervención del punto, el lunes 23 de octubre realizamos junto a la Secretaría de Agricultura la limpieza e instalación de jardineras, dejando el lugar en óptimas condiciones.



***Actividad Nª 5*:** Realización de difusión a la comunidad de campañas de educación ambiental de manera eficiente por diferentes medios de comunicación, así:

- Realizar 700 cuñas radiales por la emisora local del municipio informando a la población sobre las rutas y fechas de recolección y fomentando la cultura ambiental en la zona rural
- Realizar 65 publicaciones tipo post e historia en las redes sociales fomentando la cultura ambiental, durante la ejecución del contrato (incluye diseño, programación y publicación).
- Realizar 17 videos educativos para fomentar la cultura ambiental y publicación en las diferentes redes sociales (incluye edición y publicación)

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fomentar la educación ambiental, implementado diferentes estrategias para la difusión que permitan generar cultura y cuidado con los recursos naturales.

META

Fomentar la educación ambiental, implementado diferentes estrategias para la difusión que permitan generar cultura y cuidado con los recursos naturales.


ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Por la emisora local Coredi se pasaron 234 cuñas radiales informando a la comunidad los días establecidos para cada actividad, adicionalmente se fomenta la cultura ambiental pasando diferentes mensajes relacionados con la separación de los residuos buscando generar conciencia en las personas.


Adicionalmente, por las redes sociales se comparte diferentes notas y videos donde se invita ala comunidad sobre la importancia de hacer una buena separación y disposición final de los residuos que generan en sus hogares.

PUBLICACIONES – INSTAGRAM

REELS

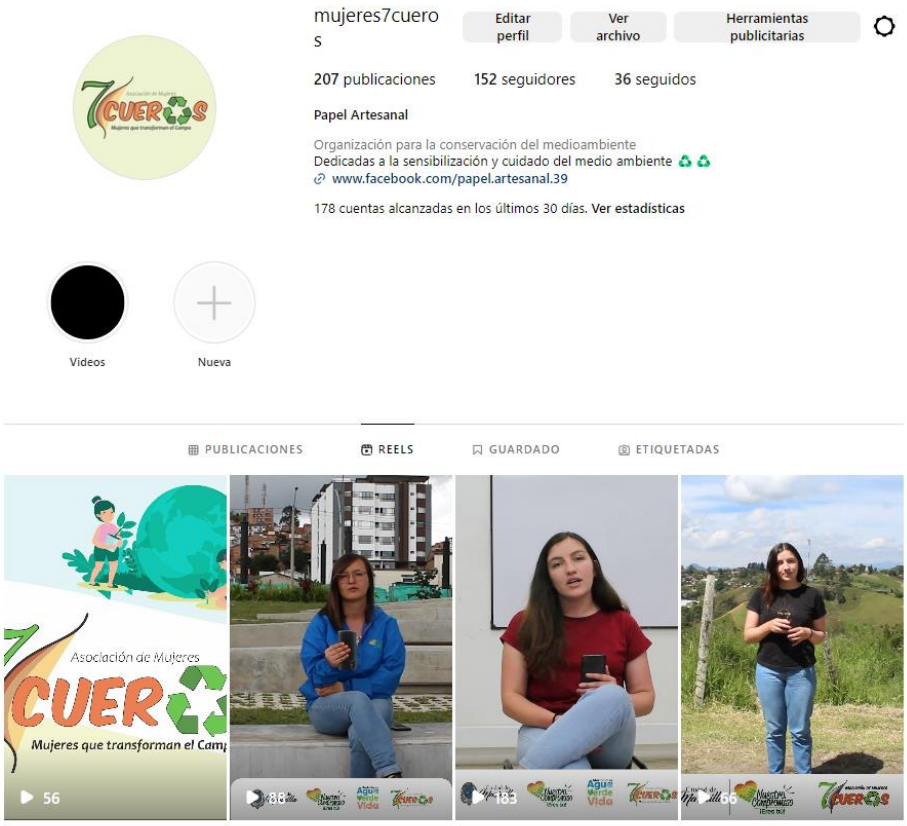


PUBLICACIONES

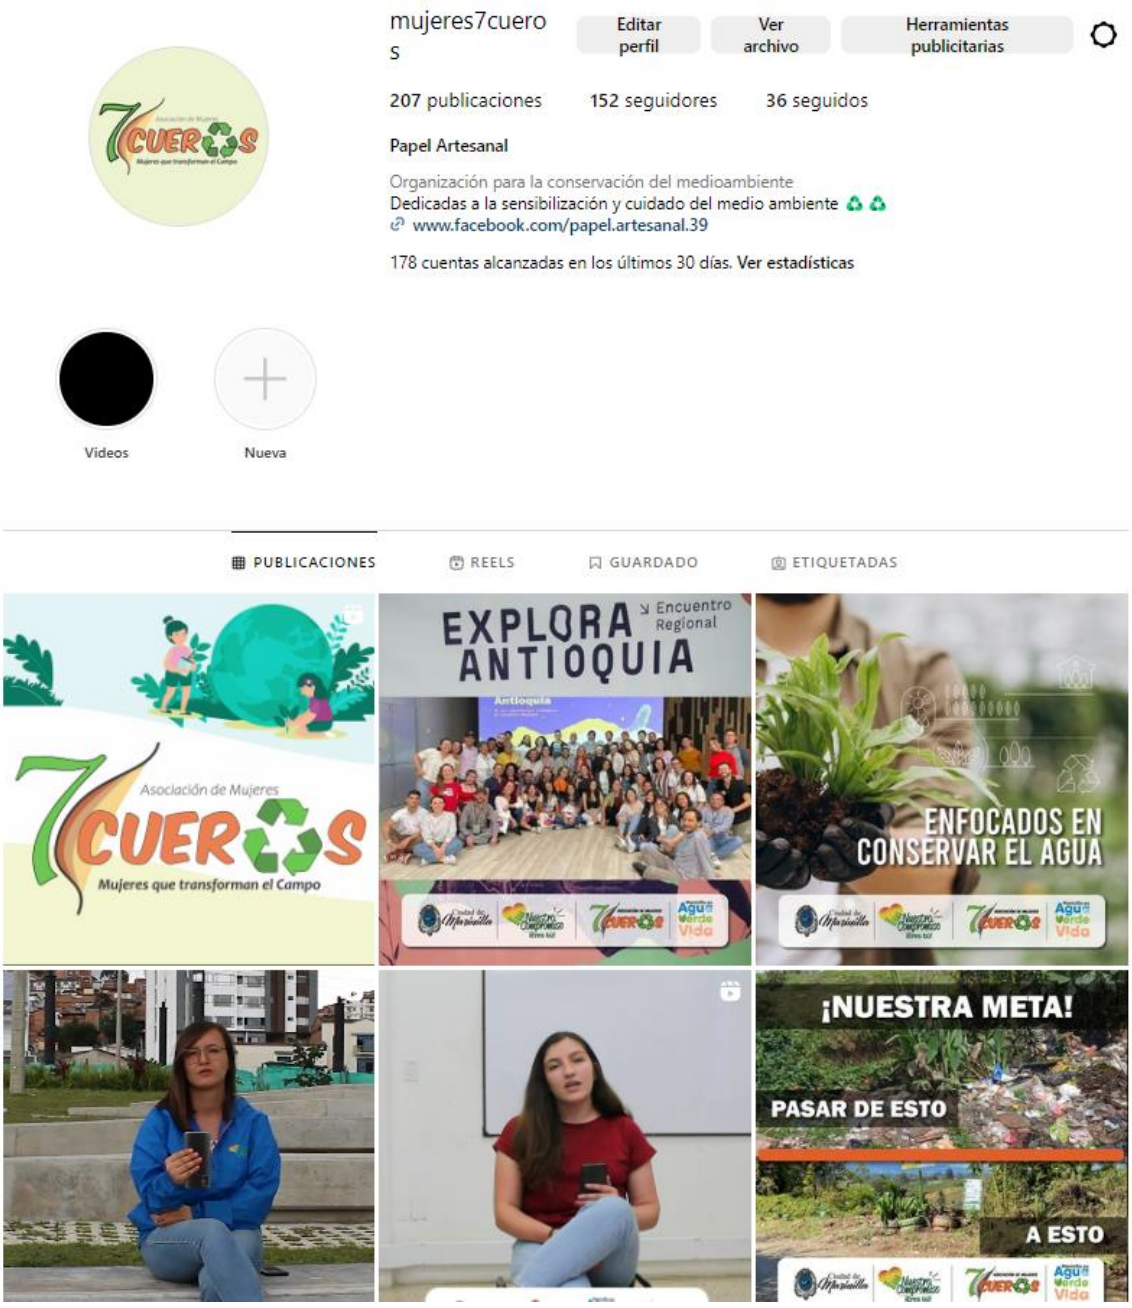


STORIES




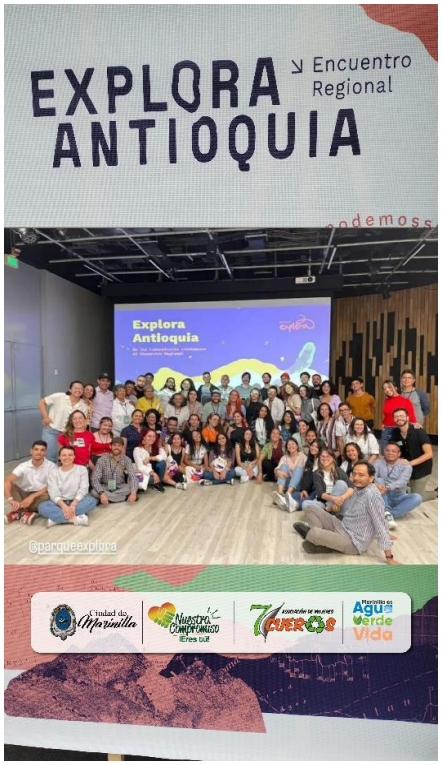

PUBLICACIONES – FACEBOOK

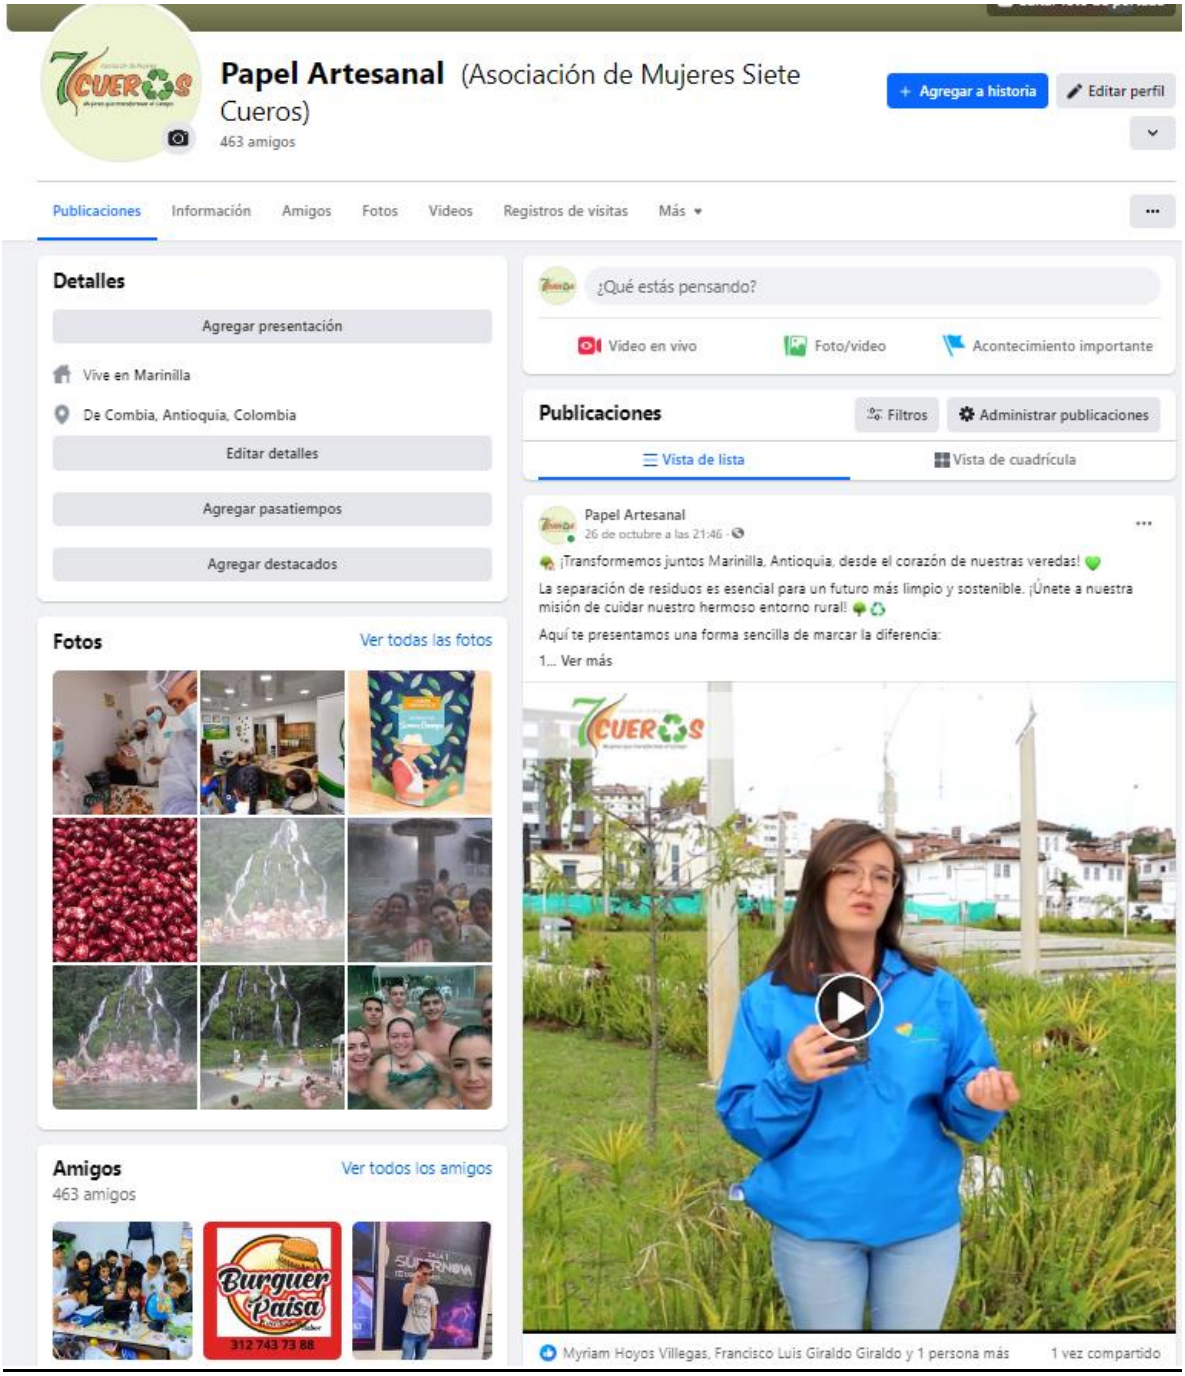


Papel Artesanal (Asociación de Mujeres Siete Cueros)
463 amigos
+ Agregar a historia
Editar perfil
Publicaciones
Información
Amigos
Fotos
Videos
Registros de visitas
Más
Detalles
Agregar presentación
Vive en Marinilla
De Combia, Antioquia, Colombia
Editar detalles
Agregar pasatiempos
Agregar destacados
Fotos
Ver todas las fotos
Amigos
Ver todos los amigos
463 amigos
¿Qué estás pensando?
Video en vivo
Foto/video
Acontecimiento importante
Publicaciones
Filtros
Administrar publicaciones
Vista de lista
Vista de cuadrícula
Papel Artesanal
26 de octubre a las 21:46
¡Transformemos juntos Marinilla, Antioquia, desde el corazón de nuestras veredas!
La separación de residuos es esencial para un futuro más limpio y sostenible. ¡Únete a nuestra misión de cuidar nuestro hermoso entorno rural!
Aquí te presentamos una forma sencilla de marcar la diferencia:
1... Ver más
Myriam Hoyos Villegas, Francisco Luis Giraldo Giraldo y 1 persona más
1 vez compartido

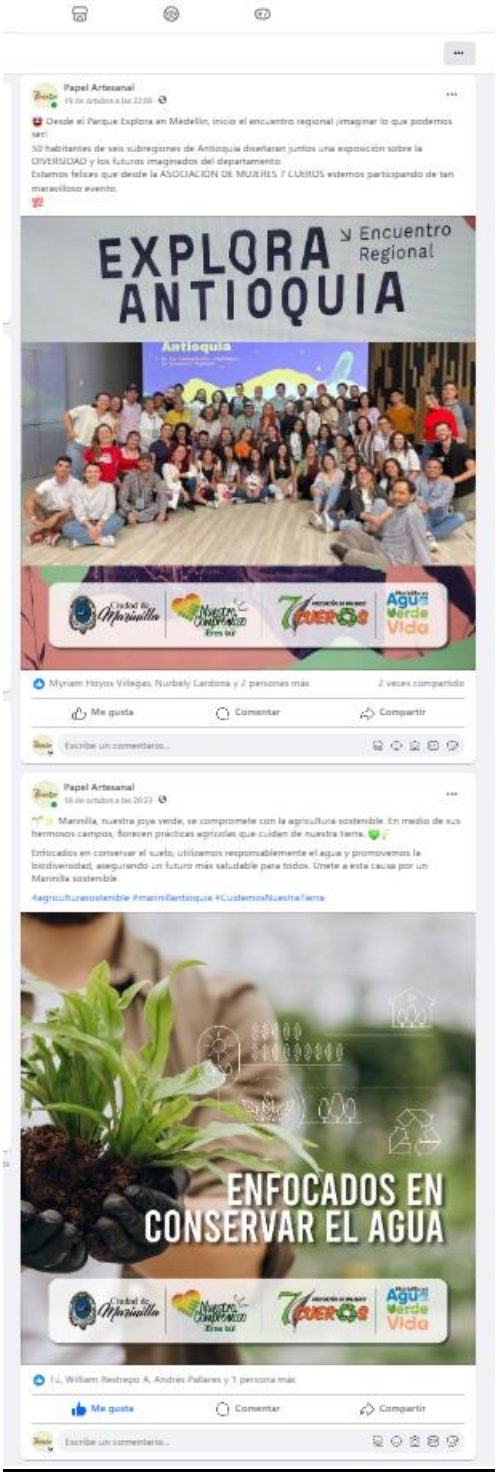
Papel Artesanal
EXPLORA ANTIOQUIA
Encuentro Regional
Antioquia
Me gusta
Comentar
Compartir
Papel Artesanal
ENFOCADOS EN CONSERVAR EL AGUA
Me gusta
Comentar
Compartir

LINKS DE VIDEOS

https://www.instagram.com/mujeres7cueros/ /// INSTAGRAM

https://www.facebook.com/papel.artesanal.39 /// FACEBOOOK

***Actividad Nº6*:** Realizar 12 jornadas de reciclatones por las 34 veredas enmarcados en la campaña "Mi vereda más limpia" para aprovechar los residuos sólidos inorgánicos del municipio de Marinilla de manera eficiente.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Realizar recorridos por cada una de las veredas del municipio para la clasificación y aprovechamiento del material reciclable.

META
Fortalecer el proceso de aprovechamiento de los residuos reciclables para ser recolectados y aprovechados por la Asociación de Recicladores del Municipio.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Esta actividad se desarrolla en las 34 veredas del municipio en donde se recolecta el material que se puede reutilizar y de esta manera contribuir a la protección del medio ambiente y disminuir los residuos que se disponen en el Parque Ambiental Los Saltos.

Ruta 1 y 2: ALPES, YARUMOS, MONTAÑITA, SANTA CRUZ, ALTO DE MERCADO, EL RECODO, SAN BOSCO, SAN JOSE, GAVIRIA, CHOCHO MAYO, LA PEÑA, SALTO ARRIBA, SALTO ABAJO.

Ruta 3 y 6: PORVENIR, POZO, EL ROSARIO, LA INMACULADA, MILAGROSA, LLANADAS, LA ASUNCION, EL SOCORRO, LA PRIMAVERA, EL RECREO.

Ruta 4 y 5: CIMARRONAS, CASCAJO ABAJO, CASCAJO ARRIBA, LAS MERCEDES, EL CHAGUALO, LA ESMERALDA, LA ESPERANZA, CAMPO ALEGRE.


El total recolectado en este mes fue de **3.210** Kg equivalentes a **3.2 toneladas,** las cuales son entregadas a la corporación de recicladores del municipio CORPOGESTAR. Con el desarrollo de esta actividad estamos contribuyendo al cuidado del ambiente, alargando la vida útil del relleno sanitario, mejorando las condiciones de vida de los recicladores de oficio y dando un nuevo uso a estos residuos reincorporándolos en la cadena productiva.

Evidencias de la actividad







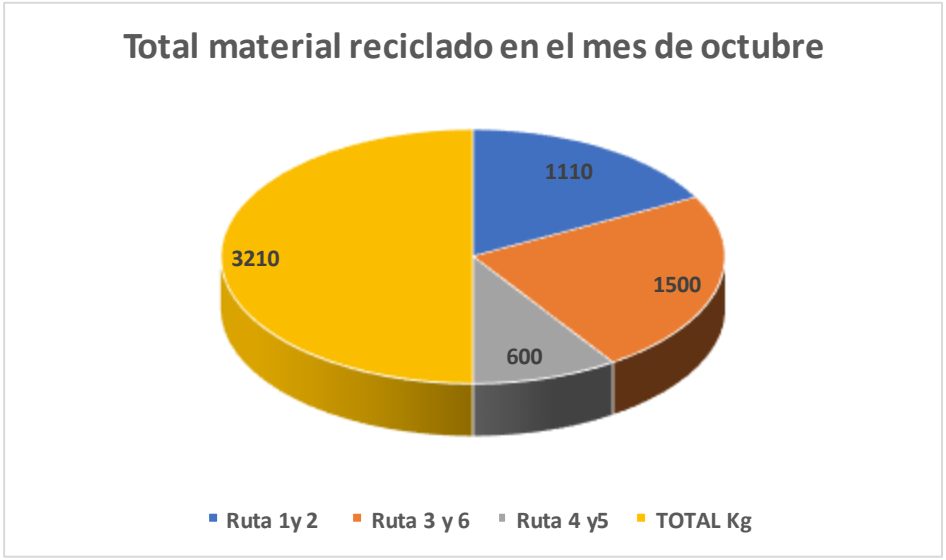

***Actividad Nº7*:** Fomentar el reciclaje en las 34 veredas con que cuenta el municipio para fortalecer la campaña "Mi Vereda Más Limpia" a través de 70 talleres teórico – prácticos y acompañamiento en la estrategia de dicha campaña, para la realización de las actividades derivadas de los talleres. Se debe evidenciar mediante listados de asistencia y registros fotográficos.

- Realizar 70 talleres teórico- prácticos con los diferentes grupos de las veredas del Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Fomentar la educación ambiental, implementado diferentes estrategias para la difusión que permitan generar cultura y cuidado con los recursos naturales.

META

Realizar 70 talleres teórico- prácticos con los diferentes grupos de las veredas del Municipio y fomentar la cultura ambiental.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

En cumplimiento con las actividades de educación ambiental propuestas en el MIRS rural, durante el mes de octubre se realizaron treinta y dos (32) talleres en las veredas del municipio en las que la Asociación desarrolla las actividades de recolección de residuos. Cada taller dura aproximadamente una hora, y la población impactada ha sido variada, desde los grupos de la tercera edad, las Juntas de Acción Comunal, los colegios donde se ha trabajado con los grados superiores, los grupos de COREDI, y los grupos en general que nos brinden el espacio en algunos de sus encuentros. La metodología usada será descrita a continuación.

Temáticas	**Educación ambiental** **Enfoques principales:** - **Disposición de residuos.** - **Información rutas de recolección**
Propósitos:	- Realizar la sensibilización acerca del adecuado manejo de residuos sólidos acorde a las rutas y disposiciones que realiza el municipio por medio de la Asociación. Reciclaje, empaques de agroquímicos. - Dialogar acerca de las problemáticas presentes en las veredas frente a los residuos y su disposición. - Buscar de manera conjunta estrategias para fomentar procesos de limpieza en las veredas, en relación a los puntos críticos y lugares que tienen focos de contaminación.

Descripción:	**Momentos del taller** - Apertura por medio de actividades lógicas para que los participantes se conecten con el espacio. - Presentación de los participantes - Ambientación, juego de pesca, ¿sabemos separar?, ¿conocemos los distintos tipos de residuos? - Presentación diapositivas: PGIRS- Zona urbana y zona rural Actividades realizadas por Siete Cueros Recolección semanal de residuos inservibles Jornadas de reciclaje, Impacto a CORPOGESTAR. Recolección de Empaques de agroquímicos, proyectos de envaradera o madera plástica. Sensibilización ciudadana y escolar. Recuperación de puntos críticos. - Relleno sanitario. - Cifras de recolección. - "Conversemos sobre nuestra vereda" **Generalidades.** Para este período la propuesta es realizar 70 talleres con los grupos organizados de las veredas, la mitad de ellos de manera teórica tal como se expone en la descripción del espacio, y la otra mitad se propone realizar un ejercicio práctico en el que se logre materializar los procesos de sensibilización. Sin embrago dadas las particularidades de los grupos hemos realizado algunas modificaciones, con el fin de adaptarnos a los espacios que los distintos líderes nos autorizan. Por ejemplo, con algunos grupos de la tercera edad, hemos unificado los talleres teórico-prácticos en un mismo espacio, dado que en esta temporada del año son muchas las actividades que tienen programadas, es por ello que con ellas el taller dura alrededor de hora y media y gracias al apoyo de la ESPA y su donación de abono orgánico podemos conversar un poco frente al proceso de compostaje. Las abuelas se llevan algunas plántulas aromáticas junto al abono para fortalecer sus huertas o sus procesos productivos. Con los estudiantes de bachillerato, buscamos resaltar el ejercicio teórico con distintas actividades de memoria o participación en las que la temática abordada se amplía a asuntos medio ambientales y ecosistémicos. Por último, con los grupos de las Juntas de Acción Comunal el diálogo se ha tejido alrededor de las problemáticas en cada vereda frente al manejo de residuos, resultando como principales causas de la agudización de puntos críticos lo siguiente: - Veraneantes. - Población fluctuante en las veredas que desconocen los procesos de separación. - Falta de conciencia social y medioambiental. - Ampliar las rutas de recolección por parte de la Asociación o el municipio. (Por ejemplo, la jornada de Desencártese que se realiza en la zona urbana, para los residuos de gran volumen)

Los talleres realizados durante el mes de octubre fueron los siguientes:

Talleres:

#	Fecha	Vereda	# asistentes	Grupo
1	2 de octubre	Vive digital	9	Docentes veredales
2	3 de octubre	La Primavera	16	Grado noveno
3	3 de octubre	La Primavera	23	Grado octavo
4	3 de octubre	La Primavera	16	Grado décimo
5	4 de octubre	La Inmaculada	6	Padres de Familia
6	5 de octubre	La Esperanza	8	JAC
7	6 de octubre	Pozo	8	Padres de familia.
8	6 de octubre	La Milagrosa	12	JAC
9	7 de octubre	San José	20	Comunidad en general
10	9 de octubre	San Bosco	17	Tercera edad
11	9 de octubre	Chocho mayo	9	Comunidad general
12	10 de octubre	San José	19	Comunidad general, puerta a puerta- Recuperación punto crítico
13	10 de octubre	Alto del Mercado	10	Comunidad general
14	11 de octubre	Campo Alegre	14	Comunidad en general
15	11 de octubre	Esperanza	8	Comunidad/ puerta a puerta
16	11 de octubre	La Primavera	25	Granja del adulto mayor.
17	12 de octubre	Punto vive digital	11	Profes C.E.R
18	12 de octubre	La Milagrosa	15	Tercera Edad
19	13 de octubre	Alto del Mercado	12	Tercera edad
20	13 de octubre	Cimarronas	17	Tercera Edad

21	13 de octubre	La Esmeralda	10	Comunidad general
22	17 de octubre	Partidas Chocho mayo	15	Sensibilización de punto crítico
23	18 de octubre	Cascajo Abajo- 1	10	COREDI
24	18 de octubre	Cascajo -2	20	COREDI
25	19 de octubre	Cimarronas	9	Comunidad general
26	20 de octubre	La Asunción	28	COREDI
27	20 de octubre	Llanadas	12	COREDI
28	23 de octubre	Montañita	17	COREDI
29	23 de octubre	Yarumos	20	COREDI
30	24 de octubre	Gaviria	17	Tercera Edad
31	24 de octubre	Gaviria	14	COREDI
32	25 de octubre	Alpes	20	COREDI












Todos los lunes
recolección de
residuos inservibles

Actividad Nº8: Disponer en el Parque Ambiental Los Saltos 70 toneladas de inservibles, con el respectivo soporte entregado por la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla - ESPA

Esta actividad se desarrolla en conjunto con la 1.

***Actividad Nº9*:** Presentar informe de las actividades según el requerimiento del supervisor del municipio de forma mensual, dando cumplimiento con el objeto del contrato; los informes deberán ajustarse a las obligaciones específicas del contrato, para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago. Dicho informe deberá presentarse teniendo en cuenta los formatos del SIGEM.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Realizar acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto**.**

META
Acompañamiento en cada una de las actividades y apoyo administrativo, para el buen desarrollo del proyecto.

En las siguientes gráficas se relaciona en consolidado de las actividades donde se entrega un avance de ejecución del 100.0%.

- Apoyo en el seguimiento del cronograma de actividades.
- Apoyo en los mensajes ambientales para diferente publicidad del proyecto.
- Apoyo en la articulación con a las entidades para el trabajo articulado (Secretaria de Agricultura y Ambiente, Campo Limpio, Asociación de Recicladores CORPOGESTAR, secretaría de educación del municipio).
- Apoyo en las campañas en los Centros Educativos RURALES
- Apoyo en trámites contractuales y entrega de informe con las respectivas evidencias.

CONSOLIDADO RECOLECTADO DURANTE EL AÑO


Tabla 1: *Total material reciclable recolectado y entregado a la corporación Corpogestar*



Tabla 2: *Total residuos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario.*



***Tabla 3**: Total empaques de agroquímicos recolectados*

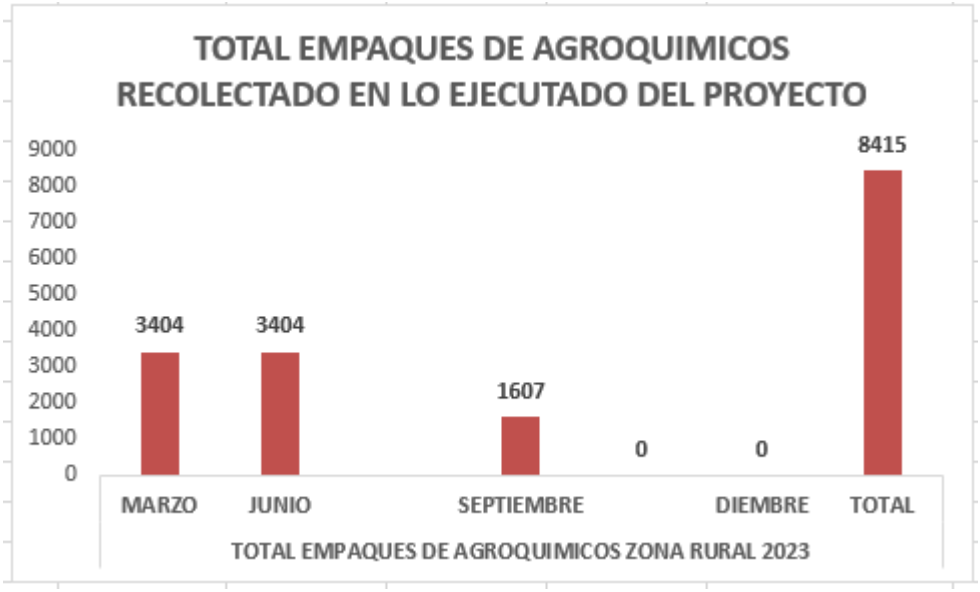

Informe financiero y valor a cobrar en este informe

ACTIVIDAD	Unidad	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE MUNICIPIO	PAGO 1		% POR ACTIVIDAD
vicio de recolección y transporte de residuos sólidos diferenciada de acuerdo con las demandas de la población campesina y neo rural	Número de días requeridos	111	$ 410.987	$ 45.619.557	$ 45.619.557	34	$ 13.973.558	30,6%
	Mano de Obra	333	$ 71.229	$ 23.719.257	$ 23.719.257	102	$ 7.265.358	30,6%
Disposición final en relleno	Tonelada	70	$ 146.999	$ 10.289.930	$ 10.289.930	23	$ 3.380.977	32,9%
ecuperación, mantenimiento, control y vigilancia de tos críticos y capacitación puerta a puerta en dichos puntos	Puntos	13	$ 280.772	$ 3.650.036	$ 3.650.036	4	$ 1.123.088	30,8%
alización de difusión a la comunidad de campañas de ucación ambiental de manera eficiente por diferentes medios de comunicación.	Cuñas radiales	700	$ 16.994	$ 11.895.800	$ 11.895.800	234	$ 3.976.596	33,4%
	Realizar 3 publicaciones tipo post e historia en las redes sociales fomentndo la cultura ambiental, cada semana. (Incluye diseño, programación y publicación).	65	$ 49.950	$ 3.246.750	$ 3.246.750	22	$ 1.098.900	33,8%
	Realizar video educativo para fomentar la cultura ambiental y publicacion en las diferentes redes sociales. (Incluye edición, programación y publicación)	17	$ 281.550	$ 4.786.350	$ 4.786.350	6	$ 1.689.300	35,3%
nada de reciclatones por las 34 veredas " Mi vereda más limpia" para aprovechar los residuos sólidos ánicos del municipio de Marinilla de manera eficiente	Número de días requeridos	12	$ 410.987	$ 4.931.844	$ 4.931.844	4	$ 1.643.948	33,3%
	Mano de Obra	24	$ 71.229	$ 1.709.496	$ 1.709.496	8	$ 569.832	33,3%
vidades de fomento del reciclaje en las 34 veredas el unicipio para fortalecer la campaña "Mi Vereda Más Limpia	Talleres teórico- prácticos	70	$ 319.000	$ 22.330.000	$ 22.330.000	33	$ 10.527.000	47,1%
compañamiento administrativo en la ejecución del proyecto	Meses	3	$ 1.160.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	1	$ 1.160.000	33,3%
TOTAL APORTE MUNICIPIO					$ 135.659.020	PAGO 1	$ 46.408.557	34,2%

Hacen parte de este informe

- Certificado de la publicación de las cuñas radiales
- Copia de las cantidades dispuestas en el relleno
- Certificado de parafiscales y planilla de seguridad social
- Factura
