
Plan prospectivo y de internacionalización

Información del Contrato

Informe N°	PROPUESTA PRORROGA O SUSPENSION
Desde	23 de octubre de 2023
Hasta	21 de diciembre de 2023
Número del Contrato	2006 del 01 de Julio de 2022
Fecha contractual de inicio:	07 de julio de 2022
Fecha contractual de terminación:	21 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido (semanas):	67 semanas

VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL

Avance Gráfico del Proyecto

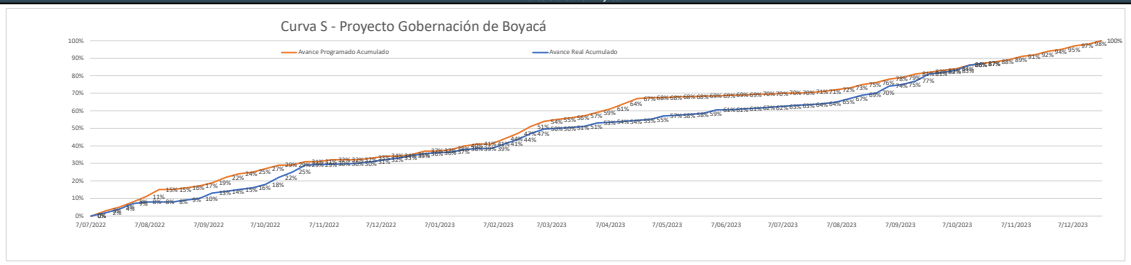

Actividades del proyecto atrasadas

EDT	ACTIVIDAD ATRASADA				CAUSAS DE ATRASO	

Actividades en Ejecución

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programado completado	% Real completado	Desviación
1	**CONSULTORÍA ESTRATÉGICA**	**378 días**	**jue 7/07/22**	**jue 21/12/23**	**100%**	**87%**	**-13%**
1.1	**PRESUPUESTO_EJECUCIÓN**	**8 días**	**jue 7/07/22**	**lun 18/07/22**	**100%**	**100%**	0%
1.1.1	Elaboración Presupuesto inicial	3 días	jue 7/07/22	lun 11/07/22	100%	100%	0%
1.1.2	Revisión gerencia - Presupuesto	3 días	mar 12/07/22	jue 14/07/22	100%	100%	0%
1.1.3	Inclusión Observaciones gerencia	1 día	vie 15/07/22	vie 15/07/22	100%	100%	0%
1.1.4	Aprobación Presupuesto	1 día	lun 18/07/22	lun 18/07/22	100%	100%	0%
1.2	**ACTIVIDADES DE INICIO**	**13 días**	**jue 7/07/22**	**mar 26/07/22**	**100%**	**100%**	0%
1.2.1	Firma acta de inicio	0 días	jue 7/07/22	jue 7/07/22	100%	100%	0%
1.2.2	Reunión de inicio (presencial Gob. Boyacá)	2 días	mié 13/07/22	jue 14/07/22	100%	100%	0%
1.2.3	Conformación Comité Técnico	5 días	mar 19/07/22	mar 26/07/22	100%	100%	0%
1.3	**ABASTECIMIENTO**	**12 días**	**lun 11/07/22**	**mié 27/07/22**	**100%**	**100%**	0%
1.3.1	Generación de TDR	6 días	lun 11/07/22	lun 18/07/22	100%	100%	0%
1.3.2	Solicitud de documentación	2 días	mar 19/07/22	jue 21/07/22	100%	100%	0%
1.3.3	Revisión y aprobación documentación	2 días	vie 22/07/22	lun 25/07/22	100%	100%	0%
1.3.4	Contratos	2 días	mar 26/07/22	mié 27/07/22	100%	100%	0%
1.4	**CONTRATACIÓN_PERSONAL**	**12 días**	**jue 28/07/22**	**vie 12/08/22**	**100%**	**100%**	0%
1.4.1	Solicitud de documentación a profesionales	5 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	100%	100%	0%
1.4.2	Revisión de documentos por parte de HSE	3 días	jue 4/08/22	lun 8/08/22	100%	100%	0%
1.4.3	Elaboración y firma de contratos	3 días	mar 9/08/22	jue 11/08/22	100%	100%	0%
1.4.4	Inducción HSEQ para contratistas que ingresan a campo por parte de VEA	1 día	vie 12/08/22	vie 12/08/22	100%	100%	0%
1.5	**FASE PLAN PROSPECTIVA**	**332 días**	**vie 15/07/22**	**vie 27/10/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.1	**Producto 1 - Estado del Arte**	**79 días**	**lun 8/08/22**	**mar 29/11/22**	**100%**	**100%**	0%
1.5.1.1	Recopilación información secundaria para identificar las condiciones económicas, sociales, ambientales, culturales, administrativas y políticas	15 días	lun 8/08/22	lun 29/08/22	100%	100%	0%
1.5.1.2	Identificación actores representativos (estado, sectores productivos, academia, sociedad civil)	10 días	mar 6/09/22	lun 19/09/22	100%	100%	0%
1.5.1.3	Elaboración y ajustes documento borrador	64 días	mar 30/08/22	lun 28/11/22	100%	100%	0%
1.5.1.4	Entrega Producto 1	0 días	mar 29/11/22	mar 29/11/22	100%	100%	0%
1.5.2	**Producto 2 -Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva**	**95 días**	**vie 15/07/22**	**mar 29/11/22**	**100%**	**100%**	0%
1.5.2.1	Recopilación información secundaria para identificar las tecnologías que pueden facilitar generación bienestar y prosperidad	20 días	vie 15/07/22	vie 12/08/22	100%	100%	0%
1.5.2.2	Identificación estrategias y focos de conocimiento que a través de CTeI potencialicen el derpartamento	20 días	vie 15/07/22	vie 12/08/22	100%	100%	0%
1.5.2.3	Identificación escalas de formación ciudadana - comunitaria acordes con potencialidades del territorio	10 días	lun 3/10/22	vie 14/10/22	100%	100%	0%
1.5.2.4	Elaboración y ajustes documento borrador	59 días	mar 6/09/22	lun 28/11/22	100%	100%	0%
1.5.2.5	Entrega Producto 2	1 día	mar 29/11/22	mar 29/11/22	100%	100%	0%
1.5.3	**Facturación 1_25%**	**1 día**	**vie 9/12/22**	**vie 9/12/22**	**100%**	**100%**	0%
1.5.3.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.2	Generación hoja de entrada	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.4	Generación factura	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.3.5	Radicación factura	1 día	vie 9/12/22	vie 9/12/22	100%	100%	0%
1.5.4	**Producto 3 - Escenarios futuros de Boyacá 2040**	**136 días**	**lun 21/11/22**	**lun 29/05/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.4.1	Diseño serie de conversatorios para determinación escenarios y apuesta construcción del futuro Boyacá 2040, y definición estrategias	10 días	lun 21/11/22	vie 2/12/22	100%	100%	0%
1.5.4.2	Planeación Conversatorios 1 y 2 (convocatoria + logística)	30 días	lun 5/12/22	vie 13/01/23	100%	100%	0%
1.5.4.3	Realización Conversatorio 1 - Identificación Factores de Cambio	0 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	100%	100%	0%
1.5.4.4	Realización Conversatorio 2 - Priorización Factores de Cambio	0 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23	100%	100%	0%
1.5.4.5	Planeación Conversatorio 3 (convocatoria + logística)	24 días	mié 18/01/23	lun 20/02/23	100%	100%	0%
1.5.4.6	Realización Conversatorio 3 - Focus Group con actores sociales	0 días	mar 21/02/23	mar 21/02/23	100%	100%	0%
1.5.4.7	Planeación Conversatorios 4 y 5 (convocatoria expertos + logística)	26 días	mié 22/02/23	mié 29/03/23	100%	100%	0%
1.5.4.8	Realización Conversatorio 4 - Identificación Factores que Explican Modelo de Desarrollo	1 día	jue 30/03/23	jue 30/03/23	100%	100%	0%
1.5.4.9	Realización Conversatorio 5 - Escenarios y riesgos para Boyacá 2040	1 día	jue 30/03/23	jue 30/03/23	100%	100%	0%
1.5.4.10	Elaboración y ajuste documento borrador	41 días	vie 31/03/23	vie 26/05/23	100%	100%	0%
1.5.4.11	Entrega Producto 3	0 días	lun 29/05/23	lun 29/05/23	100%	100%	0%
1.5.5	**Facturación 2_25%**	**1 día**	**mar 16/05/23**	**mar 16/05/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.5.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.2	Generación hoja de entrada	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.4	Generación factura	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.5.5	Radicación factura	1 día	mar 16/05/23	mar 16/05/23	100%	100%	0%
1.5.6	**Producto 4 - Resultados de conversatorios**	**58 días**	**jue 2/02/23**	**lun 24/04/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.6.1	Documentación conversatorios	41 días	jue 2/02/23	jue 30/03/23	100%	100%	0%
1.5.6.2	Elaboración y ajuste documento borrador	16 días	vie 31/03/23	vie 21/04/23	100%	100%	0%
1.5.6.3	Entrega Producto 4	0 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	100%	100%	0%
1.5.7	**Producto 5 - Documento Prospectivo**	**107 días**	**mié 31/05/23**	**vie 27/10/23**	**100%**	**100%**	0%
1.5.7.1	Diseño foro de divulgación	75 días	mié 31/05/23	mar 12/09/23	100%	100%	0%
1.5.7.2	Planeación Foro de divulgación (convocatoria y logística)	32 días	mié 13/09/23	jue 26/10/23	100%	100%	0%
1.5.7.3	Realización Foro de divulgación "Lectura de Boyacá con los lentes del futuro"	0 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23	100%	100%	0%
1.5.7.4	Entrega Producto 5 - documento Prospectivo: "Informe de escenarios y estrategias" y "Documento final"	97 días	mié 31/05/23	jue 12/10/23	100%	100%	0%
1.6	**FASE PLAN INTERNACIONALIZACIÓN**	**124 días**	**lun 3/07/23**	**jue 21/12/23**	100%	63%	-37%
1.6.1	**Tarea 1 - Mapa de ruta de transformación productiva**	**55 días**	**lun 3/07/23**	**lun 18/09/23**	**100%**	**100%**	0%
1.6.1.1	Tomar los insumos del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, para construir en detalle un mapa de ruta de sofisticación de las actividades económicas motoras y estratégicas para Boyacá	50 días	lun 3/07/23	vie 8/09/23	**100%**	**100%**	0%
1.6.1.2	Identificación hitos clave que deben guiar la evolución del proceso de internacionalización	50 días	lun 3/07/23	vie 8/09/23	100%	100%	0%
1.6.1.3	Interacción con actores sociales	15 días	lun 10/07/23	vie 28/07/23	100%	100%	0%
1.6.1.4	Aplicación de índice de sofisticación de productos para un grupo selectivo de productos y/o servicios que hacen parte del mapa de ruta.	45 días	lun 17/07/23	vie 15/09/23	100%	100%	0%
1.6.1.5	Análisis socio cultural de Boyacá en el contexto internacional	45 días	lun 17/07/23	vie 15/09/23	100%	100%	0%
1.6.1.6	Entrega Informe 1	0 días	lun 18/09/23	lun 18/09/23	100%	100%	0%
1.6.2	**Facturación 3_25%**	**4 días**	**lun 18/09/23**	**jue 21/09/23**	100%	0%	-100%
1.6.2.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	3 días	lun 18/09/23	mié 20/09/23	**100%**	**0%**	-100%
1.6.2.2	Generación hoja de entrada	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	100%	0%	-100%
1.6.2.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	100%	0%	-100%
1.6.2.4	Generación factura	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	100%	0%	-100%
1.6.2.5	Radicación factura	1 día	jue 21/09/23	jue 21/09/23	100%	0%	-100%
1.6.3	**Tarea 2 - Aliados y buenas prácticas internacionales**	**39 días**	**lun 18/09/23**	**vie 10/11/23**	100%	23%	-77%
1.6.3.1	Identificar un conjunto clave de potenciales aliados para acceso a fuentes de financiación local e internacional	15 días	lun 18/09/23	vie 6/10/23	**100%**	**50%**	-50%
1.6.3.2	Identificar un conjunto clave de IES, centros de I+D+i y en general instituciones locales e internacionales que producen conocimiento de frontera	15 días	lun 18/09/23	vie 6/10/23	100%	20%	-80%
1.6.3.3	Identificar un conjunto clave de potenciales socios de negocios en relación al mapa de ruta elaborado en la tarea 1	15 días	lun 18/09/23	vie 6/10/23	100%	20%	-80%


Semana	Programado	Ejecutado	Desviación	Observación
1	0%	0%	0%	
2	3%	2%	-1%	
3	5%	4%	-1%	
4	8%	7%	-1%	
5	11%	8%	-3%	
6	15%	8%	-7%	
7	15%	8%	-7%	
8	16%	9%	-7%	
9	17%	10%	-7%	
10	19%	13%	-6%	
11	**22%**	14%	-8%	
12	24%	15%	-9%	
13	25%	16%	-9%	
14	27%	18%	-9%	
15	29%	22%	-7%	
16	29%	25%	-4%	
17	31%	29%	-2%	
18	31%	29%	-2%	
19	32%	30%	-3%	
20	32%	30%	-2%	
21	32%	30%	-2%	
22	33%	31%	-2%	
23	34%	32%	-2%	
24	34%	33%	-1%	
25	35%	35%	-1%	
26	37%	36%	-2%	
27	37%	36%	-1%	
28	38%	37%	-2%	
29	40%	38%	-2%	
30	41%	39%	-3%	
31	41%	39%	-3%	
32	44%	41%	-3%	
33	47%	44%	-4%	
34	51%	47%	-4%	
35	54%	50%	-5%	
36	55%	50%	-5%	
37	56%	51%	-6%	
38	57%	51%	-6%	
39	59%	53%	-6%	
40	61%	54%	-8%	
41	64%	54%	-10%	
42	67%	55%	-13%	
43	68%	55%	-13%	
44	68%	57%	-11%	
45	68%	58%	-11%	
46	68%	58%	-10%	
47	69%	59%	-10%	
48	69%	61%	-8%	
49	69%	61%	-9%	
50	69%	61%	-8%	
51	70%	62%	-8%	
52	70%	62%	-8%	
53	70%	63%	-8%	
54	70%	63%	-7%	
55	71%	64%	-7%	
56	71%	64%	-7%	
57	72%	65%	-7%	
58	73%	67%	-6%	
59	75%	69%	-6%	
60	76%	70%	-6%	
61	78%	74%	-4%	
62	79%	75%	-4%	
63	81%	77%	-4%	
64	82%	81%	-1%	
65	83%	82%	-1%	
66	84%	83%	-1%	
67	86%	86%	0%	
68	87%	87%	0%	
69	88%			
70	89%			
71	91%			
72	92%			
73	94%			
74	95%			
75	97%			
76	98%			
77	100%			

Plan prospectivo y de internacionalización

Información del Contrato

Informe N°	PROPUESTA PRORROGA O SUSPENSION
Desde	23 de octubre de 2023
Hasta	21 de diciembre de 2023
Número del Contrato	2006 del 01 de Julio de 2022
Fecha contractual de inicio:	07 de julio de 2022
Fecha contractual de terminación:	21 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido (semanas):	67 semanas

Avance Gráfico del Proyecto

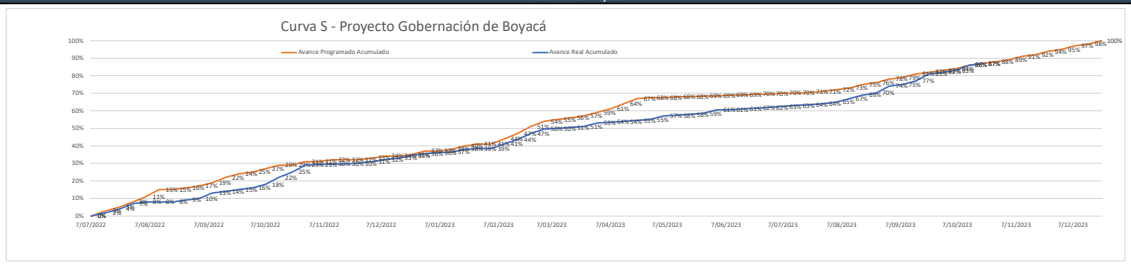

Actividades del proyecto atrasadas

EDT	ACTIVIDAD ATRASADA				CAUSAS DE ATRASO	

Actividades en Ejecución

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% Programado completado	% Real completado	Desviación
1.6.3.4	Elaborar una guía de recomendaciones de acceso con los conjuntos de actores identificados	24 días	lun 9/10/23	jue 9/11/23	100%	10%	-90%
1.6.3.5	Entrega Informe 2	0 días	vie 10/11/23	vie 10/11/23	100%	0%	-100%
1.6.4	**Tarea 3 - Estudio de mercado para diversificar oferta exportable**	**30 días**	**vie 13/10/23**	**vie 24/11/23**	**100%**	**0%**	-100%
1.6.4.1	Elección de tres actividades económicas prioritarias entre motoras y estratégicas de las identificadas en el mapa de ruta elaborado en la tarea 1	10 días	vie 13/10/23	jue 26/10/23	100%	0%	-100%
1.6.4.2	Análisis espacial-global que oriente proceso de desarrollo de capacidades empresariales que puedan dar forma o fortalecer las constitución de cluster de innovación para las tres actividades económicas priorizadas	10 días	vie 27/10/23	jue 9/11/23	100%	0%	-100%
1.6.4.3	Identificar clústeres en el entorno global que pueden ser potenciales competidores para las tres actividades económicas prorizadas	6 días	vie 10/11/23	vie 17/11/23	100%	0%	-100%
1.6.4.4	Interacción con la Secretaría de Desarrollo Empresarial	6 días	vie 27/10/23	vie 3/11/23	100%	0%	-100%
1.6.4.5	Desarrollar una serie de estrategias para implementar en el programa "Boyacá Exporta"	14 días	lun 6/11/23	jue 23/11/23	100%	0%	-100%
1.6.4.6	Entrega Informe 3	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	100%	0%	-100%
1.6.5	**Tarea 4 - Proyectos prioritarios y de alto impacto para mejoramiento de competitividad de Boyacá**	**15 días**	**vie 24/11/23**	**jue 14/12/23**	100%	0%	-100%
1.6.5.1	Elaboración de perfil de plan de acción en forma de mapa de ruta para las tres actividades económicas priorizadas	3 días	vie 24/11/23	mar 28/11/23	**100%**	**0%**	-100%
1.6.5.2	Elaboración de perfil de proyectos que guíen la puesta en marcha del plan de acción	3 días	vie 24/11/23	mar 28/11/23	100%	0%	-100%
1.6.5.3	Proceso de agregación de capacidades institucionales al mapa elaborado en la tarea 1	6 días	mié 29/11/23	mié 6/12/23	100%	0%	-100%
1.6.5.4	Analizar las principales ventajas para el departamento al adherirse a organizaciones de cooperación internacional e identificar proyectos de alto impacto que puedan ser apoyados por estas organizaciones	6 días	mié 29/11/23	mié 6/12/23	100%	0%	-100%
1.6.5.5	Entrega Documento Final	0 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	100%	0%	-100%
1.6.5.6	Ajustes Documento Final	10 días	vie 8/12/23	jue 21/12/23	100%	0%	-100%
2	**COMITÉ TÉCNICO**	**314 días**	**mar 16/08/22**	**mar 31/10/23**	100%	0%	-100%
2.1	Reunión 1 - Apertura	0 días	mar 16/08/22	mar 16/08/22	100%	100%	0%
2.2	Reunión 2 - Seguimiento avance	0 días	mié 9/11/22	mié 9/11/22	100%	100%	0%
2.3	Reunión 3 - Seguimiento avance	0 días	jue 9/03/23	jue 9/03/23	100%	100%	0%
2.4	Reunión 4 - Seguimiento avance	0 días	mié 5/07/23	mié 5/07/23	100%	0%	-100%
2.5	Reunión 5 - Seguimiento avance	0 días	mar 5/09/23	mar 5/09/23	100%	0%	-100%
2.6	Reunión 6 - Balance actividades y productos	0 días	mar 31/10/23	mar 31/10/23	100%	0%	-100%
3	**FINALIZACIÓN CONSULTORÍA**	**11 días**	**jue 7/12/23**	**jue 21/12/23**	100%	0%	-100%
3.1	Formalización terminación actividades	0 días	jue 7/12/23	jue 7/12/23	**100%**	**0%**	-100%
3.2	Trámite liquidación contrato	10 días	jue 7/12/23	mié 20/12/23	100%	0%	-100%
3.3	**Facturación 4_25%**	**1 día**	**jue 21/12/23**	**jue 21/12/23**	100%	0%	-100%
3.3.1	Aprobación por parte del cliente para radicar factura	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	**100%**	**0%**	-100%
3.3.2	Generación hoja de entrada	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	100%	0%	-100%
3.3.3	Aprobación hoja de entrada	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	100%	0%	-100%
3.3.4	Generación factura	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	100%	0%	-100%
3.3.5	Radicación factura	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	100%	0%	-100%

Semana	Programado	Ejecutado	Desviación	Observación
