REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

RESUMEN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA OPERATIVO - INFORME # 7 ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DELCONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CI 4600015402

"Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño"

PERIODO DEL INFORME:

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

MEDELLÍN, OCTUBRE 2023

TABLA DE CONTENIDO

DESARROLLO DEL INFORME 3
1. Componente de ejecución técnica y administrativa 3
2. Seguimiento de productos e indicadores 8
3. Componente de ejecución financiera 16

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Curva S de las actividades conforme a los estudios previos. 15

LISTA DE TABLAS

Tabla 2 Matriz SPI del proyecto 8
Tabla 3. Ejecución financiera octubre 17

DESARROLLO DEL INFORME

1. Componente de ejecución técnica y administrativa

En el marco del **CI 4600015402** "Implementación de Sistemas Silvopastoriles para el fortalecimiento del distrito eco ganadero del Bajo Cauca Antioqueño", se presenta el resumen de las actividades de carácter administrativo y técnico realizadas durante el periodo relacionado en este informe:

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES		Ejecutado
Actividades	**Descripción actividad**	**Avance Actividad Ejecutado**
Actividad 1	**Realizar actividades de aprestamiento y tramites contractuales (contratación de personal, consolidación de información de posibles productores beneficiarios)**	**96.82%**
• Se ha avanzado el 90% en la contratación del talento humano con un total de 38 personas, está en trámite la vinculación de cuatro (4) extensionistas, para apoyar las labores de implementación de sistemas silvopastoriles • Para la consolidación de información se tuvo en cuenta un enfoque diferencial en la caracterización de los beneficiarios, lo anterior se encuentra direccionado a identificar el grupo poblacional, su rango de edad y sexo para comprender las particularidades sociales de la zona en la que se realiza la implementación. Para este informe ya se ha recopilado la información de los 100 predios participantes. • Las reuniones con las Alcaldías Municipales de los cinco municipios del Bajo Cauca, para la socialización del proyecto en cada municipio, se desarrollaron en un 100% en el periodo correspondiente al informe número 1.		
Actividad 2	**Elaboración de presentaciones, piezas comunicacionales del proyecto para la socialización presencial con los municipios, asociaciones de productores ganaderos y productores ganaderos preseleccionados**	**95%**
• Se han elaborado nueve (9) de las diez (10) piezas gráficas, así como presentaciones a partir de la información generada en el proyecto para un total del 90%. • Las reuniones para la socialización del proyecto con los actores relevantes para la ejecución del proyecto ya se realizaron en su totalidad.		
Actividad 3	**Selección, priorización y suscripción de cartas de compromiso con productores ganaderos que serán objeto de intervención**	**100%**

- Se ha verificado el tipo de tenencia del 99% de los predios caracterizados. En los municipios de Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza ya se cuenta con el 100% de certificados requeridos. Se encuentra pendiente un certificado de sana posesión de la finca La Niña del Tigre de Caucasia, el cual se encuentra en trámite con la Alcaldía Municipal.
- La suscripción de las cartas de compromiso con los productores ya ha sido realizada y relacionada en el informe N°3.

Actividad 4	**Diseñar protocolos, mecanismos y aplicaciones de gestión y captura de datos e información de campo.**	**90%**

- Los protocolos para la captura de datos e información se han realizado en un 80%.
- Las capacitaciones a los asistentes técnicos y gestores de datos para el manejo de formatos ya se realizaron en un 100%.

Actividad 5	**Elaborar rutas de campo inicial y concertación plan de visitas a partir de la ubicación geográfica de los productores seleccionados por municipio para llevar a cabo el ejercicio de caracterización productiva, empresarial, ambiental y social de cada predio a intervenir**	**100%**

- Se realizaron todas las llamadas para concertar con cada productor una fecha y hora estimada de visita de productores por municipio.
- Se elaboró esquema general de visitas para la concertación con cada productor.
- Se socializó a cada productor el plan de visitas en cada predio (caracterización de la finca y acta de compromisos, caracterización de pasturas, caracterización SSP)

Actividad 6	**Implementar una caracterización in-situ de los sistemas productivos de los beneficiarios priorizados**	**100%**

- Se ha verificado cada uno de los predios por municipio en los sistemas de información como la UPRA, SIPRA y POTA con el fin de identificar su vocación productiva. Los certificados de uso de suelo ya se gestionaron en un 100%.
- Se realizaron visitas en fincas para la determinación de la línea base productiva, económica y caracterización forrajera en todas las fincas en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre.
- Se realizaron sobrevuelos de cada una de las fincas para la identificación de las áreas a intervenir.
- El cálculo de parámetros económicos insumo para el manejo eficiente de cada unidad productiva en pro de la sostenibilidad y competitividad, se realizado en un 98%.
- Se ha realizado la caracterización y diagnóstico de cada unidad productiva beneficiaria con la respectiva georreferenciación del predio (coordenadas de ubicación XY).

Actividad 7	**Diseñar detalladamente las intervenciones a realizar en cada predio, a partir de los criterios técnicos del ejecutor, las características del predio a nivel productivo y ambiental.**	**100%**

- Se ha realizó el diseño detallado de cada sistema silvopastoril conforme al área útil, las características topográficas y las dimensiones del terreno.
- Se ha hecho la selección de especies de árboles y pastos más aptos para las condiciones de la oferta ambiental de la región (suelos, clima y sistema ganadero predominante)

Actividad 8	**Concertación del área a intervenir con productores y formación inicial sobre la intervención a realizar mediante los sistemas silvopastoriles, manejo y orientaciones generales (protocolo del manejo).**	**100%**

- Se realizaron las visitas de campo para la concertación del área a intervenir con cada productor y se entregaron los kits de herramientas básicas.
- Se consolidaron observaciones y elementos del proceso de concertación para incorporar en el diseño detallado de cada sistema silvopastoril por medio de actas firmadas por cada productor.

Actividad 9	**Instalación de cerca eléctrica en las áreas que se intervendrán con sistemas silvopastoriles en cada uno de los predios.**	**72%**

- Se ha realizado el diagnóstico de la cerca eléctrica en cada predio.
- Se han entregado 88 equipos básicos de cerca eléctrica y se encuentra en proceso la caracterización con el diseño o mejora de estos equipos. El avance de esta tarea se encuentra en un 44%.

Actividad 10	**Realización de análisis de suelo, foliares y bromatológicos de las pasturas**	**69%**

- Se realizó la toma de muestras para análisis de suelos y de pasturas en el 99% de los predios. En el municipio de Zaragoza se encuentra pendiente la toma de muestras en el predio Las Florez por motivo de quema controlada en la zona de intervención.
- Se han realizado pruebas de caracterización nutricional forrajera o foliar por parte del laboratorio correspondientes al 36% de las muestras.
- Se han realizado análisis bromatológicos de pastos por parte del laboratorio correspondientes al 97% de las muestras.
- Se han realizado análisis de suelo completo (elementos mayores y menores) por parte del laboratorio correspondientes al 45% de las muestras.
- La entrega del informe con el análisis de los resultados obtenidos por parte del experto temático en pasturas Alejandro Ortiz Acevedo, se encuentra en proceso.

Actividad 11	**Establecimiento de modelos productivos sostenibles basados en silvopastoreo en cada predio priorizado.**	**1%**

A través de los operadores se ha realizado el trazo de diecisiete (17) predios, el aislamiento con cerca eléctrica en cinco (5), la limpieza de lotes a sembrar se ha hecho en siete (7), el plateo en diecisiete (17), el ahoyado en tres (3), la aplicación de insumos y la siembra se ha ejecutado en una (1) finca. La siembra de la hectárea de pastura se ha realizado en un (1) predio.

Las actividades técnicas para el establecimiento de los modelos silvopastoriles se encuentran en ejecución por parte del operador ARRAYAN SOLUCIONES S.A.S en la zona 1 (Caucasia, Cáceres y 10 predios de Nechí) y CONSERPRADOS S.A.S en la zona 2 (Zaragoza, El Bagre y 10 predios de Nechí).

Actividad 12	**Elaboración de Plan de Manejo Silvopastoril**	**0%**

No se han consolidado los documentos para la determinación de la información técnica, la generación de recomendaciones ambientales y el plan de manejo silvopastoril para su respectiva impresión y entrega.

Actividad 13	**Implementar in-situ en fincas priorizadas la metodología SF6 y cámara cerrada reconocidos por el IPCC, para el monitoreo de las emisiones de GEI del ganado (CH4 y N2O).**	**39%**

- Se ha consolidado información a partir de visitas técnicas asociadas a las emisiones de metano entérico producidas por el ganado y el óxido nitroso por deposición de heces y orina, en tres (3) de los seis (6) predios participantes en el componente, mediante la entrega de formatos diseñados para tal fin, para un avance del 66% de esta tarea.
- La determinación de la Línea Base de las emisiones de GEI (emisiones de metano entérico producidas por el ganado en su proceso digestivo y las emisiones de óxido nitroso por deposición de heces y orina durante el pastoreo) se ha realizado en tres (3) de los seis (6) predios participantes en el componente, mediante informes, para un avance del 50% de esta tarea.
- La consolidación del documento de análisis de laboratorio de las seis (6) fincas se encuentra en desarrollo por parte de los profesionales encargados.

Actividad 14	**Realizar la medición de la captura de carbono en varios de los sistemas productivos objetivo de establecimiento de SSP, en las mismas seis fincas priorizadas para las cuantificaciones de los GEI.**	**50%**

- Se ha consolidado la información a partir de visitas técnicas asociadas a la captura de carbono en los sistemas productivos en los seis (6) predios participantes en el componente, mediante la entrega de formatos diseñados para tal fin, para un avance del 100% de esta tarea.
- La determinación de la línea base de la captura de carbono en los sistemas productivos objeto estudio se ha realizado en tres (3) de los seis (6) predios participantes en el componente, mediante informes, para un avance del 50% de esta tarea.
- La consolidación del documento de análisis de laboratorio de las seis (6) fincas se encuentra en desarrollo por parte de los profesionales encargados

Actividad 15	**Realizar análisis de las relaciones suelo-pasto-animal en sistemas ganaderos, análisis de costo beneficio y un balance de GEI**	**0%**

El informe de análisis de las relaciones suelo-pasto-animal en sistemas ganaderos se encuentra en desarrollo por parte de los expertos temáticos.

Actividad 16	**Estructurar un plan de trabajo para fortalecer las capacidades de gestión productiva y empresarial intervenidas, basado en procesos de extensión agropecuaria**	**59%**

- Se han evaluado los informes y registros que se entregan por parte de los profesionales de campo a la dirección del componente de Gestión Empresarial, esta tarea tiene un avance de 98%.
- Se ha revisado la tabulación de la información y validez de los datos técnico-económicos reportados por gestión de datos en un 78%, se realizará el aforo general de cada predio para culminar esta tarea.
- La elaboración de informes de indicadores técnicos y económicos por finca se encuentra en proceso por parte de Gestión de Datos.

Actividad 17	**Fortalecer capacidades de actores productivos para el desarrollo de la ganadería sostenible a partir del extensionismo agropecuario.**	**0%**

- Se encuentra en proceso la organización de la logística de las capacitaciones (convocatorias, locación, alimentación, prácticas de campo, temáticas) en cada uno de los municipios participantes.
- No se han realizado las capacitaciones en cada municipio, se encuentra en proceso la programación de las mismas, en concertación con las Alcaldías Municipales.

Actividad 18	**Implementar una estrategia transmedia para comunicación y diseminación de las prácticas y conocimientos apropiados por las comunidades de productores ganaderos**	**100%**

- Se realizó concertación de los temas de divulgación, con los directores del proyecto y los expertos temáticos.
- Se desarrolló la programación de la frecuencia de los microprogramas y cronograma.
- Se realizaron los veinte (20) microprogramas estipulados en el cronograma operativo.

Actividad 19	**Implementar jornadas de presentación de resultados municipales y cierre del proyecto.**	**25%**

- Se han programado las jornadas de presentación de resultados para cada uno de los municipios impactados y la Mesa Regional de Ganadería Sostenible Antioquia.
- La convocatoria y organización logística de jornadas de presentación de resultados municipales se encuentra en trámite con el apoyo de las Alcaldías y la Red Vida Viveros.
- La programación de jornadas de presentación de socializaciones de cierre del proyecto en cada uno de los municipios y en la Mesa Regional de Ganadería Sostenible Antioquia, se encuentra en proceso.

	62.93%	**TOTAL EJECUTADO**

2. Seguimiento de productos e indicadores

A continuación, se presenta la matriz SPI (Seguimiento de Productos e Indicadores) del proyecto:

Nota: La diferencia entre lo planeado y lo ejecutado se calcula con el porcentaje de avance de la actividad ejecutada.

Tabla 1 Matriz SPI del proyecto

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES					Planeado			Ejecutado			Balance
Actividades	Descripción actividad	Aporte al Proyecto (%)	Meses de Duración	Meses de Avance de la Actividad	Estado actividad (Planeada)	Avance Actividad Planeado	Avance Proyecto Planeado	Estado actividad (ejecutado)	Avance Actividad Ejecutado	Avance Proyecto Ejecutado	Diferencia entre lo planeado y lo ejecutado
Actividad 1	**Realizar actividades de aprestamiento y tramites contractuales (contratación de personal, consolidación de información de posibles productores beneficiarios)**	**5,26%**	**4,00**	**4,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**En Ejecución**	**96,82%**	**5,10%**	**3,18%**
Tarea 1	Realizar trámites correspondientes a la contratación de personal	1,75%	20,00	20,00	Finalizada	100,00%	1,75%	En Ejecución	90%	1,59%	9,53%
Tarea 2	Consolidar información secundaria disponible de posibles beneficiarios y articulación con los municipios y asociaciones de productores ganaderos.	1,75%	2,00	2,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Tarea 3	Realizar reuniones virtuales y/o presenciales con las administraciones municipales de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre.	1,75%	1,00	1,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%

Actividad 2	**Elaboración de presentaciones, piezas comunicacionales del proyecto para la socialización presencial con los municipios, asociaciones de productores ganaderos y productores ganaderos preseleccionados**	**5,26%**	**30,00**	**23,00**	**En Ejecución**	**76,67%**	**4,04%**	**En Ejecución**	**95%**	**5,00%**	**-13,33%**
Tarea 1	Elaborar piezas gráficas y presentaciones a partir de información del proyecto (objetivos, metas, público objetivo, etc.). Se realizarán dos piezas por municipio y manual de imagen del proyecto (membretes, presentaciones base power point)	2,63%	27,00	23,00	En Ejecución	85,19%	2,24%	En Ejecución	90%	2,37%	-4,31%
Tarea 2	Realizar socializaciones con el grupo de actores de interés del proyecto (municipios, asociaciones productores, actores relevantes de la zona, etc.) (1 socialización por municipio)	2,63%	30,00	23,00	En Ejecución	76,67%	2,02%	Finalizada	100%	2,63%	-23,33%
Actividad 3	**Selección, priorización y suscripción de cartas de compromiso con productores ganaderos que serán objeto de intervención**	**5,26%**	**18,00**	**18,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**En Ejecución**	**100%**	**5,25%**	0,33%
Tarea 1	Verificación de información consolidada de cada productor, análisis de tipo de tenencia y priorización a partir de criterios a definir	1,75%	18,00	18,00	Finalizada	100,00%	1,75%	En Ejecución	99%	1,74%	1,00%
Tarea 2	Elaboración de cartas de compromiso conforme a los productores priorizados	1,75%	11,00	11,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Tarea 3	Gestionar la suscripción de las cartas de compromiso con cada uno de los productores priorizados	1,75%	14,00	14,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Actividad 4	**Diseñar protocolos, mecanismos y aplicaciones de gestión y captura de datos e información de campo.**	**5,26%**	**20,00**	**20,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**En Ejecución**	**90%**	**4,74%**	10,00%
Tarea 1	Diseño de protocolos, mecanismos y aplicación de gestión y captura de datos	2,63%	4,00	4,00	Finalizada	80,00%	2,11%	En Ejecución	80%	2,11%	0,00%
Tarea 2	Capacitación de asistentes técnicos y gestor de datos en el manejo de protocolos, formatos, formularios y	2,63%	17,00	17,00	Finalizada	100,00%	2,63%	Finalizada	100%	2,63%	0,00%

	aplicaciones a utilizar en la gestión de la información y conocimiento										
Actividad 5	**Elaborar rutas de campo inicial y concertación plan de visitas a partir de la ubicación geográfica de los productores seleccionados por municipio para llevar a cabo el ejercicio de caracterización productiva, empresarial, ambiental y social de cada predio a intervenir**	**5,26%**	**5,00**	**5,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**Finalizada**	**100%**	**5,26%**	**0,00%**
Tarea 1	Realizar llamadas para concertar con cada productor una fecha y hora estimada de visita de productores por municipio	1,75%	17,00	17,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Tarea 2	Elaborar esquema general de visitas para la concertación con cada productor	1,75%	1,00	1,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Tarea 3	Explicar en finca con cada productor el plan de visitas (caracterización de la finca y acta de compromisos, caracterización de pasturas, caracterización SSP)	1,75%	16,00	16,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Actividad 6	**Implementar una caracterización in-situ de los sistemas productivos de los beneficiarios priorizados**	**5,26%**	**26,00**	**21,00**	**En Ejecución**	**80,77%**	**4,25%**	**En Ejecución**	**100%**	**5,24%**	**-19,33%**
Tarea 1	Verificar cada uno de los predios por municipio en los sistemas de información como la UPRA, SIPRA y POTA con el fin de identificar su vocación productiva, restricciones	1,05%	14,00	14,00	Finalizada	100,00%	1,05%	Finalizada	100%	1,05%	0,00%
Tarea 2	Realizar visitas en fincas para la determinación de la línea base productiva, económica y caracterización forrajera de 100 fincas en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre (Visita 1. Profesionales de campo)	1,05%	16,00	16,00	Finalizada	100,00%	1,05%	Finalizada	100%	1,05%	0,00%
Tarea 3	Realizar sobrevuelos de cada una de las fincas para identificar posibles áreas a intervenir (Visita 1. Profesional SIG)	1,05%	24,00	19,00	En Ejecución	79,17%	0,83%	Finalizada	100%	1,05%	-20,83%

Tarea 4	Cálculo de parámetros económicos insumo para el manejo eficiente de cada unidad productiva para mejorar la sostenibilidad y competitividad	1,05%	21,00	17,00	En Ejecución	80,95%	0,85%	En Ejecución	98%	1,03%	-17,05%
Tarea 5	Elaborar documentos de diagnósticos y caracterización de cada unidad productiva beneficiaria con la respectiva georreferenciación del predio (coordenadas de ubicación XY)	1,05%	13,00	7,00	En Ejecución	53,85%	0,57%	Finalizada	100%	1,05%	-46,15%
Actividad 7	**Diseñar detalladamente las intervenciones a realizar en cada predio, a partir de los criterios técnicos del ejecutor, las características del predio a nivel productivo y ambiental.**	**5,26%**	**18,00**	**18,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**Finalizada**	**100%**	**5,26%**	**0,00%**
Tarea 1	Diseño detallado de cada sistema silvopastoril conforme al área útil, las características topográficas y las dimensiones del terreno, el diseño de densidad arbórea variará según cada caso.	2,63%	14,00	14,00	Finalizada	100,00%	2,63%	Finalizada	100%	2,63%	0,00%
Tarea 2	Selección de especies de árboles, arbustos y pastos, que sean más aptas a las condiciones de la oferta ambiental de la región (suelos, clima y sistema ganadero predominante)	2,63%	4,00	4,00	Finalizada	100,00%	2,63%	Finalizada	100%	2,63%	0,00%
Actividad 8	**Concertación del área a intervenir con productores y formación inicial sobre la intervención a realizar mediante los sistemas silvopastoriles, manejo y orientaciones generales (protocolo del manejo).**	**5,26%**	**10,00**	**10,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**Finalizada**	**100%**	**5,26%**	**0,00%**
Tarea 1	Realizar visitas de campo para la concertación del área a intervenir con cada productor y entrega de kits de herramientas básicas	2,63%	12,00	12,00	Finalizada	100,00%	2,63%	Finalizada	100%	2,63%	0,00%
Tarea 2	Consolidar observaciones y elementos del proceso de concertación para incorporar en el diseño detallado de cada sistema silvopastoril	2,63%	12,00	12,00	Finalizada	100,00%	2,63%	Finalizada	100%	2,63%	0,00%

Actividad 9	**Instalación de cerca eléctrica en las áreas que se intervendrán con sistemas silvopastoriles en cada uno de los predios.**	**5,26%**	**21,00**	**21,00**	**Finalizada**	**100,00%**	**5,26%**	**En Ejecución**	**72%**	**3,79%**	28,00%
Tarea 1	Realizar diagnóstico de la cerca eléctrica en cada predio	2,63%	4,00	4,00	Finalizada	100,00%	2,63%	Finalizada	100%	2,63%	0,00%
Tarea 2	Diseño o mejora del equipo básico de la cerca eléctrica	2,63%	15,00	15,00	Finalizada	100,00%	2,63%	En Ejecución	44%	1,16%	56,00%
Actividad 10	**Realización de análisis de suelo, foliares y bromatológicos de las pasturas**	**5,26%**	**19,00**	**17,00**	**En Ejecución**	**89,47%**	**4,71%**	**En Ejecución**	**69%**	**3,64%**	20,22%
Tarea 1	Toma de muestras para análisis de suelos y de pasturas	1,32%	19,00	17,00	En Ejecución	89,47%	1,18%	En Ejecución	99%	1,30%	9,53%
Tarea 2	Realizar pruebas de caracterización nutricional forrajera (foliares)	1,32%	19,00	17,00	En Ejecución	89,47%	1,18%	En Ejecución	36%	0,47%	53,47%
Tarea 3	Realizar análisis bromatológicos de pastos	1,32%	17,00	15,00	En Ejecución	88,24%	1,16%	En Ejecución	97%	1,28%	8,76%
Tarea 4	Realizar análisis de suelos completo (elementos mayores y menores)	1,32%	17,00	15,00	En Ejecución	88,24%	1,16%	En Ejecución	45%	0,59%	43,24%
Tarea 5	Entrega y análisis de resultados y análisis	1,32%	13,00	11,00	En Ejecución	84,62%	1,11%	Por Ejecutar	0%	0,00%	84,62%
Actividad 11	**Establecimiento de modelos productivos sostenibles basados en silvopastoreo en cada predio priorizado.**	**5,26%**	**12,00**	**9,00**	**En Ejecución**	**75,00%**	**3,95%**	**En Ejecución**	**1%**	**0,05%**	74,00%
Tarea 1	A través de operadores se realiza la Limpieza, hoyado, plateo, aplicación de insumos, la siembra y la resiembra (incluido el aislamiento)	5,26%	16,00	9,00	En Ejecución	56,25%	2,96%	En Ejecución	1%	0,05%	55,25%
Actividad 12	**Elaboración de Plan de Manejo Silvopastoril**	**5,26%**	**18,00**	**9,00**	**En Ejecución**	**50,00%**	**2,63%**	**Por Ejecutar**	**0%**	**0,00%**	50,00%
Tarea 1	Consolidar información técnica, productiva para que los productores beneficiarios mantengan y/o escalen los SSP establecidos	1,75%	12,00	9,00	En Ejecución	75,00%	1,32%	Por Ejecutar	0%	0,00%	75,00%
Tarea 2	Generar recomendaciones sobre el manejo ambiental de la finca en donde se establecieron SSP a partir de la caracterización realizada en la actividad 6 mediante sobrevuelo y observación visual	1,75%	12,00	9,00	En Ejecución	75,00%	1,32%	Por Ejecutar	0%	0,00%	75,00%

Tarea 3	Consolidar documentos de Planes de Manejo Silvopastoril, impresión y entrega	1,75%	12,00	3,00	En Ejecución	25,00%	0,44%	Por Ejecutar	0%	0,00%	25,00%
Actividad 13	**Implementar in-situ en fincas priorizadas la metodología SF6 y cámara cerrada reconocidos por el IPCC, para el monitoreo de las emisiones de GEI del ganado (CH4 y N2O).**	**5,26%**	**21,00**	**17,00**	**En Ejecución**	**80,95%**	**4,26%**	**En Ejecución**	**39%**	**2,04%**	**42,29%**
Tarea 1	Consolidar información a partir de visitas técnicas asociadas a las emisiones de metano entérico producidas por el ganado y el óxido nitroso por deposición de heces y orina	1,75%	23,00	17,00	En Ejecución	73,91%	1,30%	En Ejecución	66%	1,16%	7,91%
Tarea 2	Determinar la Línea Base (sistema ganadero sin intervenir), de las emisiones de GEI (emisiones de metano entérico producidas por el ganado en su proceso digestivo y las emisiones de óxido nitroso por deposición de heces y orina durante el pastoreo)	1,75%	23,00	17,00	En Ejecución	73,91%	1,30%	En Ejecución	50%	0,88%	23,91%
Tarea 3	Consolidar documento de análisis de laboratorio de las seis (6) fincas objeto estudio	1,75%	9,00	5,00	En Ejecución	55,56%	0,97%	Por Ejecutar	0%	0,00%	55,56%
Actividad 14	**Realizar la medición de la captura de carbono en varios de los sistemas productivos objetivo de establecimiento de SSP, en las mismas seis fincas priorizadas para las cuantificaciones de los GEI.**	**5,26%**	**19,00**	**17,00**	**En Ejecución**	**89,47%**	**4,71%**	**En Ejecución**	**50%**	**2,63%**	**39,47%**
Tarea 1	Consolidar información a partir de visitas técnicas asociadas a la captura de carbono en los sistemas productivos en seis fincas	1,75%	19,00	17,00	En Ejecución	89,47%	1,57%	Finalizada	100%	1,75%	10,53%
Tarea 2	Determinar línea base de la captura de carbono en los sistemas productivos objeto estudio	1,75%	19,00	17,00	En Ejecución	89,47%	1,57%	En Ejecución	50%	0,88%	39,47%
Tarea 3	Consolidar documento de análisis de laboratorio de las seis (6) fincas objeto estudio	1,75%	10,00	5,00	En Ejecución	50,00%	0,88%	Por Ejecutar	0%	0,00%	50,00%


Actividad 15	**Realizar análisis de las relaciones suelo-pasto-animal en sistemas ganaderos, análisis de costo beneficio y un balance de GEI**	**5,26%**	**10,00**	**5,00**	**En Ejecución**	**50,00%**	**2,63%**	**Por Ejecutar**	**0%**	**0,00%**	**50,00%**
Actividad 16	**Estructurar un plan de trabajo para fortalecer las capacidades de gestión productiva y empresarial intervenidas, basado en procesos de extensión agropecuaria**	**5,26%**	**26,00**	**17,00**	**En Ejecución**	**65,38%**	**3,44%**	**En Ejecución**	**59%**	**3,09%**	**6,72%**
Tarea 1	Evaluar los informes y registros que se entregan por parte de los profesionales de campo a la dirección del componente de Gestión Empresarial	1,75%	19,00	17,00	En Ejecución	89,47%	1,57%	**En Ejecución**	98%	1,72%	**8,53%**
Tarea 2	Revisar la tabulación de la información y validez de los datos técnico-económicos reportados por gestión de datos.	1,75%	19,00	17,00	En Ejecución	89,47%	1,57%	**En Ejecución**	78%	1,37%	11,47%
Tarea 3	Elaborar informes de indicadores técnicos y económicos por finca.	1,75%	22,00	13,00	En Ejecución	59,09%	1,04%	**Por Ejecutar**	0%	0,00%	**59,09%**
Actividad 17	**Fortalecer capacidades de actores productivos para el desarrollo de la ganadería sostenible a partir del extensionismo agropecuario.**	**5,26%**	**26,00**	**19,00**	**En Ejecución**	**73,08%**	**3,85%**	**Por Ejecutar**	**0%**	**0,00%**	**73,08%**
Tarea 1	Organizar la logística de las capacitaciones (convocatorias, locación, alimentación, prácticas de campo, temáticas)	2,63%	24,00	19,00	En Ejecución	79,17%	2,08%	**Por Ejecutar**	0%	0,00%	**79,17%**
Tarea 2	Desarrollo de capacitaciones	2,63%	24,00	17,00	En Ejecución	70,83%	1,86%	**Por Ejecutar**	0%	0,00%	**70,83%**
Actividad 18	**Implementar una estrategia transmedia para comunicación y diseminación de las prácticas y conocimientos apropiados por las comunidades de productores ganaderos**	**5,26%**	**30,00**	**21,00**	**En Ejecución**	**70,00%**	**3,68%**	**Finalizada**	**100%**	**5,26%**	**30,00%**
Tarea 1	Concertación de los temas de divulgación, con los directores del proyecto y los expertos temáticos	1,75%	4,00	4,00	Finalizada	100,00%	1,75%	**Finalizada**	100%	1,75%	**0,00%**

Tarea 2	Programación de la frecuencia de los microprogramas y cronograma elaborado	1,75%	2,00	2,00	Finalizada	100,00%	1,75%	Finalizada	100%	1,75%	0,00%
Tarea 3	Desarrollo de microprogramas	1,75%	27,00	17,00	En Ejecución	62,96%	1,10%	Finalizada	100%	1,75%	-37,04%
Actividad 19	**Implementar jornadas de presentación de resultados municipales y cierre del proyecto.**	**5,26%**	**6,00**	**0,00**	**Por Ejecutar**	**0,00%**	**0,00%**	**En Ejecución**	**25%**	**1,32%**	**-25,00%**
Tarea 1	Programar jornadas de presentación de resultados para cada uno de los municipios impactados y la Mesa Regional de Ganadería Sostenible Antioquia	1,32%	6,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	Finalizada	100%	1,32%	-100,00%
Tarea 2	Realizar convocatoria y organización logística de jornadas de presentación de resultados municipales	1,32%	2,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	Por Ejecutar	0%	0,00%	0,00%
Tarea 3	Implementar jornadas de presentación de socializaciones en cada uno de los municipios impactados	1,32%	3,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	Por Ejecutar	0%	0,00%	0,00%
Tarea 4	Implementar jornada de presentación de socialización en la Mesa Regional de Ganadería Sostenible Antioquia	1,32%	3,00	0,00	Por Ejecutar	0,00%	0,00%	Por Ejecutar	0%	0,00%	0,00%
				SPI	**PLANEADO**	**TOTAL PLANEADO**	**78,99%**	**TOTAL EJECUTADO**		**62,93%**	**-16,06%**

El avance en la ejecución técnica y administrativa del CI 4600015402 es del 62.93%, se presenta una diferencia del 16.06% con lo planeado en el cronograma operativo debido a retrasos en los procesos de contratación requeridos para el desarrollo de las actividades. Se vienen adelantando acciones para culminar esta meta y avanzar con las tareas e implementaciones en los 100 predios del Bajo Cauca.

A continuación, se presenta la curva S del proyecto de acuerdo con el cronograma de ejecución de las actividades descritas en los estudios previos del proyecto:

Ilustración 1. Curva S de las actividades conforme a los estudios previos.

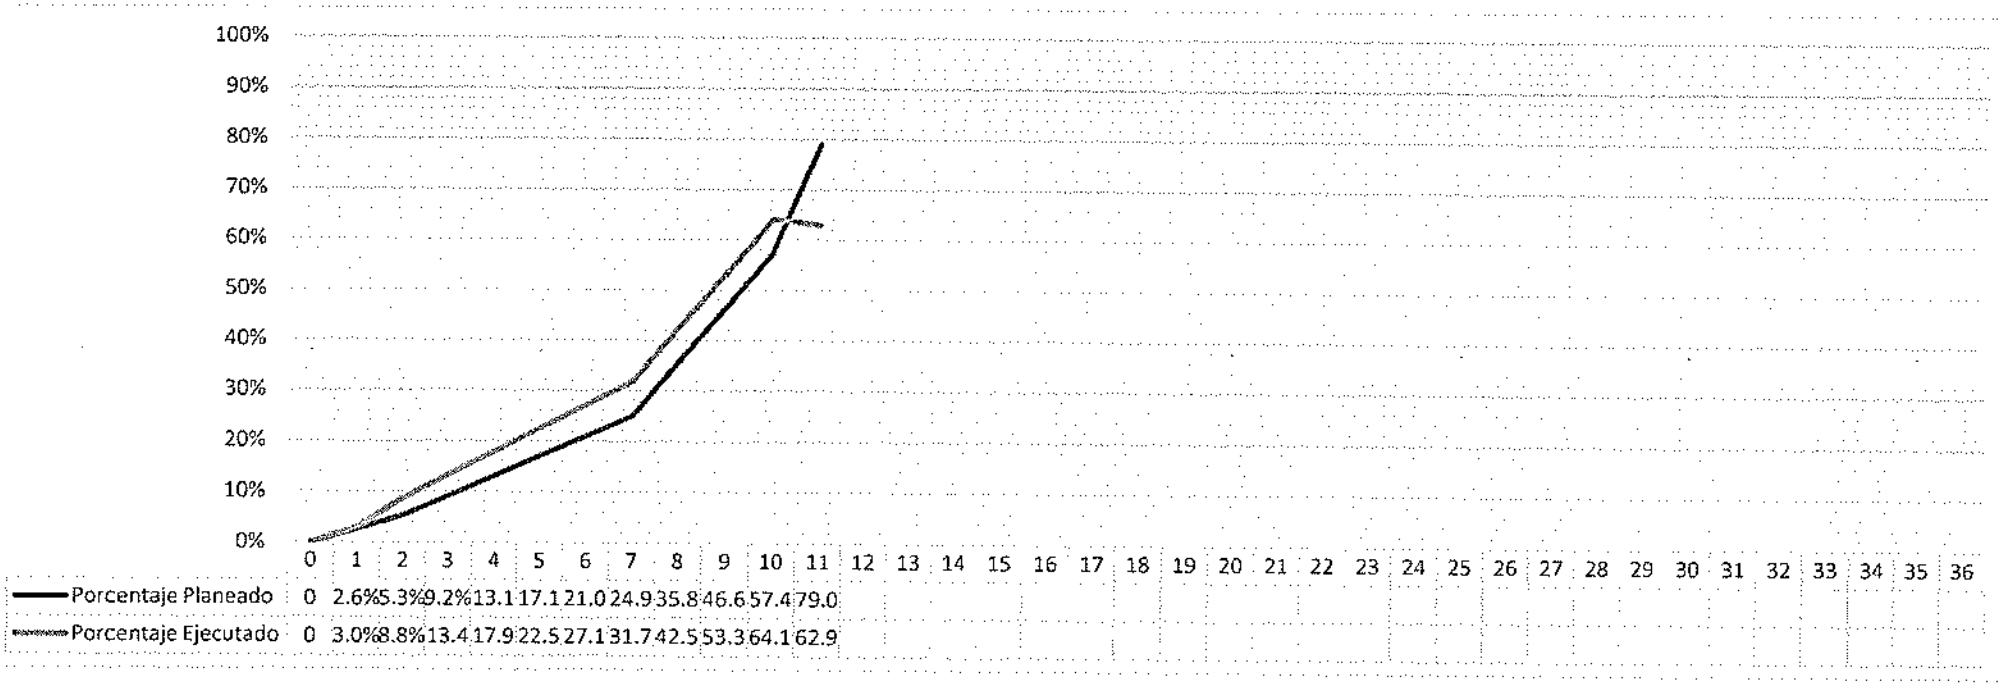

3. Componente de ejecución financiera

En el periodo reportado se causaron los siguientes pagos de talento humano, movilidad, servicios y consultorías y materiales e insumos, dando como resultado un porcentaje de ejecución financiera del 26.3 % del total de los recursos del contrato, correspondientes a $ 1.017.103.941 pesos.

Tabla 2. Ejecución financiera octubre

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CON CORTE AL 30 DE OCTUBRE 2023 CONTRATO C.I 4600015402						
DESCRIPCIÓN	**PRESUPUESTO**	**COMPROMETIDO**	**PPTO DISPONIBLE**	**PAGADO**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	**% PRESUPUESTO VS COMPROMETIDO**
COMPONENTE TALENTO HUMANO SILVOPASTORIL	$ 1.196.289.080	$ 1.202.891.321	-$ 6.602.241	$ 132.414.095	11%	101%
COMPONENTE MOVILIZACION SILVOPASTORIL	$ 246.400.000	$ 245.577.501	$ 822.499	$ 24.544.400	10%	100%
COMPONENTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 27.251.000	$ 24.999.995	$ 2.251.005	$ 1.379.950	5%	92%
COMPONENTE MATERIALES E INSUMOS	$ 1.011.200.129	$ 1.011.099.929	$ 100.200	$ 352.789.977	35%	100%
COMPONENTE SERVICIOS Y CONSULTORIAS	$ 1.379.464.645	$ 1.281.341.431	$ 98.123.214	$ 505.975.519	37%	93%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	**$ 3.860.604.854**	**$ 3.765.910.177**	**$ 94.694.677**	**$ 1.017.103.941**	**26,3%**	**98%**
ADMINISTRACIÓN HONORARIOS ANTES DE IVA	**$ 356.862.634**					
IVA (19%)	**$ 67.803.900**					
SUBTOTAL HONORARIOS (10%) IVA INCLUIDO	**$ 424.666.534**			$ 53.083.017	**12,5%**	
TOTAL DE RECURSOS	**$ 4.285.271.388**			$ 1.070.186.958	**38,8%**	

Tabla 21 Ejecución financiera acumulada al mes de octubre

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTRATO C.I 4600015402												
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	PPTO DISPONIBLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PAGADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% PRESUPUESTO VS COMPROMETIDO
COMPONENTE TALENTO HUMANO SILVOPASTORIL	$ 1.196.289.080	$ 1.146.731.430	$ 49.557.650	$ 127.117.107	$ 125.369.476	$ 142.538.285	$ 147.155.451	$ 154.586.017	$ 132.414.095	$ 829.180.431	69%	96%
COMPONENTE MOVILIZACION SILVOPASTORIL	$ 246.400.000	$ 202.069.166	$ 44.330.834	$ 10.200.370	$ 18.397.440	$ 22.793.296	$ 23.800.000	$ 21.895.810	$ 24.544.400	$ 121.631.316	49%	82%
COMPONENTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 27.251.000	$ 20.919.999	$ 6.331.001	$ 0	$ 0	$ 20.953.995	$ 0	$ 1.379.950	$ 1.379.950	$ 23.713.895	87%	77%
COMPONENTE MATERIALES E INSUMOS	$ 1.011.200.129	$ 22.569.825	$ 988.630.304	$ 0	$ 3.644.560	$ 7.990.585	$ 23.256.162	$ 116.402.428	$ 352.789.977	$ 504.083.712	50%	2%
COMPONENTE SERVICIOS Y CONSULTORIAS	$ 1.379.464.645	$ 403.701.101	$ 975.763.544	$ 60.000.005	$ 50.000.004	$ 19.840.312	$ 88.141.364	$ 60.381.306	$ 505.975.519	$ 784.338.510	57%	29%
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	**$ 3.860.604.854**	**$ 1.795.991.521**	**$ 2.064.613.333**	**$ 197.317.482**	**$ 197.411.480**	**$ 214.116.473**	**$ 282.352.977**	**$ 354.645.511**	**$ 1.017.103.941**	**$ 2.262.947.864**	**58,6%**	**47%**
ADMINISTRACIÓN HONORARIOS ANTES DE IVA	$ 356.862.634											
IVA (19%)	$ 67.803.900											
				14 DE ABRIL -15 DE MAYO	16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO	16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO	16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE			
SUBTOTAL HONORARIOS (10%) IVA INCLUIDO	$ 424.666.534			$ 53.083.317	$ 53.083.017	$ 53.083.017	$ 53.083.017	$ 53.083.017	$ 53.083.017	$ 318,498,402	75,0%	
TOTAL DE RECURSOS	$ 4.285.271.388			$ 250.400.799	$ 250.494.497	$ 267.199.490	$ 335.435.994	$ 407.728.528	$ 1.070.186.958	$ 2.634.529.283	60.2%	

Con todos los pagos causados relacionados en la tabla anterior, consolidados se logra un porcentaje de ejecución financiera para el mes de 58.6% y un porcentaje acumulado de ejecución de 60.2%.

Tabla 22. Presupuesto de recursos- ejecución hasta 30 de octubre de 2023

PRESUPUESTO RECURSOS A ADMINISTRAR	DESEMBOLSO	MESES	VALOR DESEMBOLSO	DESEMBOLSO ACUMULADOS	EJECUCIÓN MAYO		EJECUCIÓN JUNIO		EJECUCIÓN JULIO		EJECUCIÓN AGOSTO		EJECUCIÓN SEPTIEMBRE		EJECUCIÓN OCTUBRE		EJECUCIÓN NOVIEMBRE		EJECUCIÓN DICIEMBRE	
					VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
$ 3.860.604.854	1	ABRIL	$ 786.782.255,00		197.317.482	25%	197.411.480	25%	214.116.473	27%	177.935.820	23%								
	2	JULIO	$ 575.333.466,00	$ 1.362.115.721,00							104.416.157	18%	354.645.511	62%	116.271.798	20%				
	3	OCTUBRE	$ 970.000.000,00	$ 2.332.115.721,00											450.416.072	46%				
	4		$ 600.000.000,00	$ 2,932.115.721,00											370.000.000	62%				
	5		$ 500.000.000,00	$ 3,432.115,721,00											80.416.072	16%				
	6		$ 428.489.123,00	$ 3.860.604.844,00																

En la siguiente tabla se especifica por componente los pagos realizados y acumulados, entre la firma del acta de inicio y el 30 de octubre de 2023.

Tabla 23. Pagos realizados y acumulados hasta 30 de octubre de 2023

COMPONENTE TALENTO HUMANO C.I 4600015402				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 1.172.406.338
VALOR COMPROMETIDO				$ 1.202.891.321
DISPONILBE				-$ 30.484.983
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**

CPS-840-2023	ANGELICA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	$ 50.750.000	$ -	0%
CPS-841-2023	DANIEL FELIPE FLOREZ GIL	$ 38.160.000	$ -	0%
CPS-842-2023	LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO	$ 86.040.000	$ 10.800.000	13%
CPS-843-2023	NATALIA CRISTINA MESA DAVID	$ 39.833.334	$ 5.000.000	13%
CPS-848-2023	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 54.960.000	$ 7.200.000	13%
CPS-849-2023	AZUCENA CASTRO BELTRAN	$ 54.960.000	$ 7.200.000	13%
CPS-850-2023	NATHALIA VALENCIA OSORIO	$ 38.166.666	$ 3.666.666	10%
CPS-851-2023	ANGELICA MARIA CASTIBLANCO PINEDA	$ 36.640.000	$ 3.520.000	10%
CPS-852-2023	MONICA YANETH MARTINEZ AGUDELO	$ 38.166.666	$ 3.666.666	10%
CPS-853-2023	CESAR AUGUSTO SANTAMARIA GALLEGO	$ 40.456.666	$ 5.300.000	13%
CPS-854-2023	ASTRID ELENA TORRES SANCHEZ	$ 6.883.333	$ -	0%
CPS-855-2023	GLORIA AMPARO GARCIA	$ 18.602.243	$ 2.436.975	13%
CPS-856-2023	SOFIA ESTELA OVIEDO CERRO	$ 38.166.666	$ 3.666.674	10%
CPS-857-2023	LARRY ESTEBAN BEDOYA CAÑAS	$ 38.166.666	$ 5.000.000	13%
CPS-858-2023	LUIS GUILLERMO URIBE HINCAPE	$ 38.166.666	$ 5.000.000	13%
CPS-863-2023	DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ CASTRO	$ 36.833.333	$ 3.666.652	10%


CPS-864-2023	JHON JAIRO MONTOYA BUSTAMANTE	$ 15.206.724	$ -	0%
CPS-866-2023	ANDREA MORALES MORALES	$ 36.833.333	$ 5.000.000	14%
CPS-867-2023	NICOLAS RODRIGUEZ FRANCO	$ 36.833.333	$ 5.000.000	14%
CPS-868-2023	JAIME HERNAN GONZALEZ	$ 7.500.015	$ -	0%
CPS-869-2023	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GOMEZ	$ 36.833.333	$ 5.000.000	14%
CPS-870-2023	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO ORTEGON	$ 36.833.333	$ 5.000.000	14%
CPS-871-2023	DANIELA HERRERA VARGAS	$ 25.783.333	$ 2.566.652	10%
CPS-872-2023	DIANA CAROLINA SOLANO SUAREZ	$ 25.783.333	$ 2.566.652	10%
CPS-875-2023	LUZ OMAIRA SOTO MORENO	$ 2.000.000	$ -	0%
CPS-891-2023	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 7.200.000	$ 2.257.998	31%
CPS-897-2023	DANIELA COLORADO GRANDA	$ 28.166.667	$ 5.000.000	18%
CPS-898-2023	ASTRID ELENA TORRES SANCHEZ	$ 28.333.333	$ 5.000.000	18%
CPS-899-2023	PAOLA ANDREA POLANIA MADRID	$ 26.416.667	$ 5.000.000	19%
CPS-900-2023	LUISA FERNANDA HOYOS GUTIERREZ	$ 20.795.520	$ 3.899.160	19%
CPS-875-2023	SEBASTIAN LOPEZ HERNANDEZ	$ 7.833.349	$ -	0%
CPS-920-2023	JUNNIER FELIPE USUGA ESCOBAR	$ 32.000.000	$ -	0%

CPS-912-2023	HERNAN DARIO JARAMILLO HERNANDEZ	$ 21.333.333	$ 5.000.000	23%
CPS-921-2023	CARLOS MARIO PAREDES OTERO	$ 16.666.667	$ 5.000.000	30%
CPS-918-2023	MARTA LIGIA GOMEZ OROZCO	$ 16.666.667	$ 5.000.000	30%
CPS-919-2023	SANDRA MARCELA RODRIGUEZ VILLEGAS	$ 16.333.333	$ 5.000.000	31%
CPS-930-2023	ANGELICA MARIA CASTIBLANCO PINEDA	$ 10.365.267	$ -	
CPS-929-2023	SOFIA ESTELA OVIEDO CERRO	$ 10.365.267	$ -	
CPS-931-2023	DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ CASTRO	$ 10.365.267	$ -	
CPS-932-2023	NATHALIA VALENCIA OSORIO	$ 13.920.000	$ -	
CPS-933-2023	DIANA CAROLINA SOLANO SUAREZ	$ 9.666.667	$ -	
CPS-934-2023	DANIELA HERRERA VARGAS	$ 9.666.667	$ -	
CPS-935-2023	MONICA YANETH MARTINEZ AGUDELO	$ 13.533.333	$ -	
CPS-936-2023	SANTIAGO ROJAS ACEVEDO	$ 5.371.007	$ -	
CPS-937-2023	MARITZA LONDOÑO MONTOYA	$ 9.666.667	$ -	
CPS-938-2027	DANIEL ELEJALDE ARBELAEZ	$ 9.666.667	$ -	
TOTALES		**$ 1.202.891.321**	**$ 132.414.095**	**11%**
DISPONILBE		**-$ 30.484.983**		





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS

COMPONENTE MOVILIZACION 4600015402				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 243.620.774
VALOR COMPROMETIDO				$ 245.577.501
DISPONIBLE				-$ 1.956.727
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CPS-848-2023	ALEJANDRO ORTIZ ACEVEDO	$ 12.404.166	$ -	0%
CPS-866-2023	ANDREA MORALES MORALES	$ 11.050.000	$ 1.500.000	14%
CPS-863-2023	DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ CASTRO	$ 11.050.000	$ 1.500.000	14%
CPS-868-2023	JAIME HERNAN GONZALEZ	$ 1.800.000	$ -	0%
CPS-864-2023	JHON JAIRO MONTOYA BUSTAMANTE	$ 8.100.000	$ -	0%
CPS-870-2023	JOSE SEBASTIAN CHAPARRO ORTEGON	$ 16.575.000	$ 2.250.000	14%
CPS-857-2023	LARRY ESTEBAN BEDOYA CAÑAS	$ 17.175.000	$ 2.250.000	13%
CPS-858-2023	LUIS GUILLERMO URIBE HINCAPE	$ 17.175.000	$ 2.250.000	13%
CPS-867-2023	NICOLAS RODRIGUEZ FRANCO	$ 11.050.000	$ 1.500.000	14%
CPS-856-2023	SOFIA ESTELA OVIEDO CERRO	$ 14.312.500	$ 1.875.000	13%
CPS-851-2023	ANGELICA MARIA CASTIBLANCO PINEDA	$ 14.312.500	$ 1.875.000	13%
CPS-840-2023	ANGELICA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	$ 13.650.000	$ -	0%
CPS-842-2023	LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO	$ 16.730.000	$ 967.200	6%

CPS-854-2023	ASTRID ELENA TORRES SANCHEZ	$ 1.180.000	$ -	0%
CPS-900-2023	LUISA FERNANDA HOYOS GUTIERREZ	$ 11.250.000	$ 2.250.000	20%
OS-SILVOPASTORIL-4600015402-001-2023	TRANSPORTES HC SAS	$ 750.000	$ -	0%
OS-SILVOPASTORIL-4600015402-002-2023	REFRIGERIOS	$ 1.200.000	$ -	0%
CPS-899-2023	PAOLA ANDREA POLANIA MADRID	$ 9.250.000	$ 1.660.000	18%
CPS-897-2023	DANIELA COLORADO GRANDA	$ 5.000.000	$ -	0%
CPS-898-2023	ASTRID ELENA TORRES SANCHEZ	$ 7.750.000	$ -	0%
CPS-921-2023	CARLOS MARIO PAREDES OTERO	$ 7.000.000	$ 2.667.200	38%
CPS-919-2023	SANDRA MARCELA RODRIGUEZ VILLEGAS	$ 7.000.000	$ 2.000.000	29%
CPS-920-2023	JUNNIER FELIPE USUGA ESCOBAR	$ 7.000.000		0%
CPS-930-2023	ANGELICA MARIA CASTIBLANCO PINEDA	$ 5.026.667	$ -	
CPS-929-2023	SOFIA ESTELA OVIEDO CERRO	$ 5.026.667	$ -	
CPS-931-2023	DANIELA ALEXANDRA GONZALEZ CASTRO	$ 5.026.667	$ -	
CPS-937-2023	MARITZA LONDOÑO MONTOYA	$ 3.866.667	$ -	
CPS-938-2027	DANIEL ELEJALDE ARBELAEZ	$ 3.866.667	$ -	
CPS-899-2023 ADICION	POLANIA MADRID PAOLA ANDREA	$ 1.160.000	$ -	

CPS-866-2023	MORALES MORALES ANDREA	$ 1.160.000	$ -	
CPS-867-2023	RODRIGUEZ FRANCO NICOLAS	$ 1.160.000	$ -	
TOTALES		**$ 245.577.501**	**$ 24.544.400**	**10%**
DISPONIBLE			**-$ 1.956.727**	

COMPONENTE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4600015402				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 25.816.000
VALOR COMPROMETIDO				$ 24.999.995
DISPONIBLE				$ 816.005
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
OS-SILVO-003-2023	SANTIAGO GIRALDO ZULUAGA	$ 20.953.995	$ -	0%
ORDEN DE GASTO	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA	$ 4.046.000	$ 1.379.950	34%
TOTALES		**$ 24.999.995**	**$ 1.379.950**	**6%**
DISPONIBLE		**$ 816.005**		

COMPONENTE SERVICIOS - CONSULTORIAS				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 1.371.341.434
VALOR COMPROMETIDO				$ 1.281.341.431
DISPONIBLE				$ 90.000.003
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
CPS-873-2023	SEDE TV	$ 200.000.000	$ -	0%
CPS-893-2023	MYRIAM LOAIZA	$ 27.833.333	$ 10.000.000	36%

CPS-894-2023	JUANITA SERNA PAREJA	$ 20.000.000	$ 3.141.360	16%
CPS-892-2023	RUBEN DARIO HIGUERA PEDRAZA	$ 25.000.000	$ 5.000.000	20%
OS-SILVO-005-2023	SOFTWARE GERENCIA	$ 30.000.000	$ -	0%
CPS-908-2023	BIOFERTILIZAR S.A.S	$ 43.100.000	$ 25.860.000	60%
CONTRATO DE TRANSPORTE 056-2023	TRANSPORTES HC	$ 20.000.000	$ 19.200.000	96%
CR-075-2023	CONSERPRADOS S.A.S	$ 387.353.500	$ 196.023.180	51%
CR-074-2023	ARRAYAN SOLUCIONES S.A.S	$ 387.353.500	$ 195.270.540	50%
CS-115-2023	VIVERO NECHI	$ 12.000.000	$ -	0%
CPS-922-2023	AGROTEGAN SAS	$ 128.701.098	$ 51.480.439	40%
TOTALES		**$ 1.281.341.431**	**$ 505.975,519**	**39%**
DISPONIBLE		**$ 90.000.003**		

COMPONENTE MATERIALES E INSUMOS				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 1.047.420.308
VALOR COMPROMETIDO				$ 1.011.099.929
DISPONIBLE				$ 36.320.379
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**
OS-SILV-002-2023	PUBLICIDAD Y PRODUCCION	$ 5.260.600	$ -	0%
ORDEN DE GASTO	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA	$ 14.578.240	$ 1.822.280	13%

ORDEN DE GASTO	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA	$ 4.233.700	$ 1.379.950	33%
OS-SILV-004-2023	EL SEMILLERO	$ 2.731.000	$ -	0%
CS-115-2023	VIVERO NECHI	$ 174.617.750	$ 61.847.100	35%
ORDEN DE GASTO	BIOSOLIDOS	$ 68.667.600	$ 10.374.092	15%
OS-SILV-006-2023	AGROMUNDO CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	$ 12.310.574	$ -	0%
OS-SILV-007-2023	JORGE IGNACIO BETANCUR BETANCUR	$ 6.505.050	$ -	0%
CS-108-2023	DIGITAL SAS	$ 203.198.587	$ 203.198.587	100%
CS-109-2023	GESAM S.A.S	$ 247.226.560	$ 74.167.968	30%
CR-075-2023	CONSERPRADOS S.A.S	$ 112.705.634	$ -	0%
CR-074-2023	ARRAYAN SOLUCIONES S.A.S	$ 110.785.634	$ -	0%
CS-107-2023	SILVOTECNIA	$ 48.279.000	$ -	0%
TOTALES		**$ 1.011.099.929**	**$ 352.789.977**	**35%**
DISPONIBLE		**$ 36.320.379**		

HONORARIOS				
PRESUPUESTO INICIAL				$ 424.666.534
VALOR COMPROMETIDO				$ 424.666.534
DISPONIBLE				$ 0
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	**EJECUCIÓN FINANCIERA %**

	HONORARIOS	$ 424.666.534	$ 53.083.017	
TOTALES		**$ 424.666.534**	**$ 53.083.017**	**12%**
DISPONIBLE		**$ 0**		

Para constancia, se firma el presente informe.

Cordialmente,

LUIS ALBERTO SANCHEZ TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL SSP

CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA
SUPERVISOR RIA
