	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Informe con corte al mes de mayo de 2022. Este informe se realiza como entrega de la supervisión por vacaciones junio 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Fecha Suscripción del Contrato: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Este plazo fue modificado por la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

Prorrogas: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. Extiende el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Valor inicial (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar.

Valor modificado: Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. La primera adición fue por valor de $70.209.857.816, por lo tanto, el valor del contrato quedó por DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS $227.901.147.217.

Desembolsos: (Modificados por la cláusula cuarta de la Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022). La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en siete desembolsos[1] de la siguiente manera:

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530

Vigencia	Valor total vigencia	Desembolso 1	Desembolso 2	Desembolso 3
2020	$ 40.000.000.000	$ 30.000.000.000	$ 10.000.000.000	No aplica

[1] Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20212	$112.901.147.217	$ 15.000.000.000	$ 48.000.000.000	$ 49.901.147.217
2022	$ 75.000.000.000	$ 6.000.000.000	$ 13.000.000.000	$ 56.000.000.000

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO

Otrosí No. 1 del 13 de octubre de 2020: Primera modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁSULA PRIMERA** modificar el numeral 19, literal "a" de la Cláusula Segunda – Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: ***CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. ENCARGO FIDUCIARIO*** *(…)* *19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo*

Otrosí No. 2 del 3 de marzo de 2021- Segunda modificación
Las partes acuerdan en la **CLÁUSULA PRIMERA** modificar la **CLÁSULA SEXTA** en el literal A. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así: *"**En la vigencia 2021**, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: **a) Un tercer desembolso** por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **b) Un cuarto desembolso** por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **c) Un quinto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **d) Un sexto desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **e) Un séptimo desembolso** por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. **f) Un octavo desembolso** por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.".*

Otrosí No. 3 del 11 de agosto de 2021 – Tercera modificación
CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, la cual quedará así: (…) En la vigencia 2021. según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así: - a) Un tercer desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un cuarto desembolso por la suma de $48.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. (…)

2 Con la modificación No. 3 del 11 de agosto de 2021 al contrato, se paso de 6 desembolsos a 3 para la vigencia 2021. (Ya se había hecho el primer desembolso, por lo tanto, los 5 que estaban pendientes se convirtieron en dos)

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Otrosí No. 4 aprobado en secop el 25 de enero de 2022 – Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022

CLAUSULA PRIMERA: DE LA PRÓRROGA: Modificar La Clausula Séptima Plazo De Ejecución, la cual quedará así:
CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN: Adicionar el Contrato De Encargo Fiduciario De Administración y Pagos Nº 20200530, en la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($70.209.857.816) M/CTE
PARÁGRAFO:El valor correspondiente a la presente adición, se encuentra con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13422 de fecha 5 de enero de 2022 y fecha de operación de la adición al CDP del 12 y el 20 de enero de la misma vigencia.
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO: Modificar la cláusula quinta del Contrato De Encargo Fiduciario De Administración Y Pagos Nº 20200530, la cual quedará así:
CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y VALOR DEL CONTRATO: El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($227.901.147.217), correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022 (...) El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($975.779.083), excluido del IVA, (...)

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICAR LA FORMA DE DESEMBOLSOS: Modificar la Cláusula Sexta. Forma de Desembolso de los Recursos a Administrar y Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria, en el sentido de modificar, el valor del desembolso No. 6 y así mismo se adicionar los desembolsos No 7 y 8, la cual quedará así:
CLÁUSULA SEXTA- Forma de desembolso de los recursos a administrar y forma de pago de la comisión fiduciaria: a. forma de desembolso de los recursos a administrar:

VIGENCIA	DESEMBOLSO	VALOR	RECURSO
2020	1	$ 19.000.000.000	NACIÓN
		$ 11.000.000.000	DONACION
	2	$ 10.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 40.000.000.000	
2021	3	$ 15.000.000.000	NACIÓN
	4	$ 48.000.000.000	NACIÓN
	5	$ 49.901.147.217	NACIÓN
	TOTAL	$ 112.901.147.217	
2022	6	$ 6.000.000.000	NACIÓN
	7	$ 13.000.000.000	NACIÓN
	8	$ 56.000.000.000	NACIÓN
	TOTAL	$ 75.000.000.000	

(…) En la vigencia 2022 por valor total de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000.000) solicitados así: a) Un sexto desembolso por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000), previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que de muestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.
Un séptimo desembolso por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000), el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente y
Un octavo desembolso por valor de CINCUENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($56.000.000.000) el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la vigencia 2022, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.(…)

Supervisión (clausula vigésima):

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE.

TABLA 3: INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre actual	Designación	Contacto
1) Supervisión técnica – Adriana Ibarra Oyaga	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, recibido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59	2543300 Ext: 5738 Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
2) Supervisión financiera – Gisella Torres Arenas	Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de septiembre de 2020, recibido por esta supervisión mediante correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 18:59.	2543300 Ext: 5639 gisella.torres@minagricultura.gov.co

Equipo Fiduagraria

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es el siguiente:

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO	CORREO
MAURICIO ORDOÑEZ	Vicepresidente administrativo de Negocios y Operaciones	5802020 ext 9000	mordonez@fiduagraria.gov.co
EDGARD LORDUY	Jefe administración de negocios	3153442200	elorduy@fiduagraria.gov.co
ALFONSO SUÁREZ	Abogado Senior	3173001041	helsuarez@fiduagraria.gov.co
ALEJANDRO BRAY	Abogado Junior	3006318623	mbray@fiduagraria.gov.co
CARLOS ARÉVALO	Coordinador financiero	3043718657	caarevalo@fiduagraria.gov.co
JOSÉ RADA	Ejecutivo de negocios fiduciarios	3134243551	jrada@fiduagraria.gov.co

También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co

INFORMES DE FIDUCIA:

- *Informes de gestión*

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 "Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…"

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN DE FIDUCIA

No.	Radicado fiducia	Fecha radicado fiducia	Radicado Ministerio	periodo	Recibido por la supervisión	Observaciones
1	02-009722-06112020	6-nov-2020	Sin rad	Oct-2020	Correo del EIP 27-nov-2020	
2	02-01-0835-10122020	10-dic-2020	Sin rad	Nov-2020	Correo del EIP 14-dic-2020	
3	VNO-247	Sin fecha	Sin rad	Dic-2020	Correo del EIP 31-ene-2021	
4	02-001287-10022021	10-feb-2021	Sin rad	Ene-2021	Coreo del EIP 2-mar-2021	
5	02-002241-09032021	9-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo	
6	02-002575-17032021	17-mar-2021	Sin rad	Revisoría fiscal a dic 2020	Correo de Fiduagraria 17-mar-2021	Contiene • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 16 de febrero 2021. • Estado Situación Financiero a diciembre 2020 debidamente firmados. • Estado de Resultados Integrales a diciembre 2020, debidamente firmados. • Notas complementarias a los Estados Financieros a diciembre del 2020.
7	02-002814-26032021	26-mar-2021	Sin rad	Feb-2021	Correo de Fiduagraria 26-mar-2021	Alcance informe de gestión febrero 2021
8	VNO-3584 02-003129-09042021	9-abr-2021	Sin rad	Marzo 2021	Correo de Fiduagraria 9-abr-2021	
9	VNO-4704 02-004083-10052021	10-may-2021	Sin rad	Abril 2021	Correo de Fiduagraria 10-may-2021	
10	VNO-5879 02-005208-10062021	10-jun-2021	Sin rad	May 2021	Correo de Fiduagraria 10-jun-2021	
11	VNO-7057 02-006196-09072021	9-jul-2021	Sin rad	Jun 2021	Correo de Fiduagraria 9-jun-2021	Informan que de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión el anexo de los contratos derivados se encuentra en revisión y será enviando antes del 20 de julio 2021.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

12	VNO-8123 02-007244-100822021	10-agos-2021	Sin rad	Jul 2021	Correo de Fiduagraria 10-ago-2021	
13	VNO-10841 02-009229-08102021	8-oct-2021	Sin rad	Ago 2021	Correo de Fiduagraria 9-ago-2021	Se recibió un alcance al informe mediante correo electrónico el 21 de octubre de 2021
14	VNO-11817 02-010145-09112021	9-nov-2021	Sin rad	Oct 2021	Correo de Fiduagraria 10-nov-2021	
15	VNO-12891 02-010984-10122021	10-dic-2021	Sin rad	Nov 2021	Correo de Fiduagraria 10-dic-2021	
16	VNO-726 02-000071-07012022	7-ene-2022	Sin rad	Dic 2021	Correo de Fiduagraria 7-ene-2022	
17	VNO-2304	9-feb-2022	Sin rad	Ene 2022	Correo de Fiduagraria 10-feb-2022	
18	VNO-3746 02-001682-09032022	9-mar-2022	Sin rad	Feb 2022	Correo de Fiduagraria 10-mar-2022	
19	VNO-6269	Sin fecha	Sinrad	Mar 2022	Correo de Fiduagraria 10-abr-2022	
20	VNO-7744 02-003212-10052022	10-may-2022	Sin rad	Abril 2022	Correo de Fiduagraria 10-may-2022	Mediante correo del 23 de mayo de 2022, se recibió alcance al informe de corte abril 2022 mediante el número VNO-8185 02-003619-23052022
21	VNO-9542 02-004169-100622022	10-jun-2022	Sin rad	May 2022	Correo de Fiduagraria 10-jun-2022	

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la supervisión.

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP:

TABLA 6: INFORMES DEL EIP DESEMBOLSO

memorando remisión del EIP a la supervisión	Periodo	Fecha informe	Fecha recibida por	Medio de recibido por supervisión	Descripción

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

			supervisión		
Sin memo	Corte 24-oct-2020	24-sep-2020	1-oct-2020	Correo electrónico	Primer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para primer desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 13-oct-2020	13-oct-2020	13-oct-2020	Correo electrónico	Subsanación Primer informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para primer desembolso vigencia 2020
20202360070533 sin fecha	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	30-nov-2020	Correo electrónico - Orfeo	Segundo informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
Sin memo	Corte 30-nov-2020	30-nov-2020	14-dic-2020	Correo electrónico	Segundo informe de ejecución técnica y financiera Subsanado. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020.
20212360020503 4-mar-2021	Corte 31-ene-2021	3-mar-2021	4-mar-2021	Correo electrónico	Tercer informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20212360228631 15-oct-2021	Corte 30-sept-2021	15-oct--2021	19-oct-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera. Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073 3-nov-201	Corte 30-sept-2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Cuarto informe de ejecución técnica y financiera subsanado Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
20212360087073	Corte 30 de sept 2021	15-oct-2021	3-nov-2021	Correo electrónico	Alcance al cuarto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para cuarto desembolso del contrato (segundo de la vigencia 2021).
Sin memo	Corte 30-nov-2021	6-dic-2021	10-dic-2021	Correo electrónico	Quinto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para quinto desembolso del contrato (tercero de la vigencia 2021).
20212360101953	Corte 31 dic-21	11-ene-2022	11-ene-2022	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20224600116143	Corte-31-dic-21	11-ene-2022	12-ene-2022 6:21 pm	Correo electrónico	Sexto informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para trámite de primera adición y prórroga y cuarta modificación al contrato
20222360123443	Corte 31 -ene-2022	11-feb-2022	14-feb-2022	Correo electrónico (por Orfeo se recibió el 15 de febrero de 2022)	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20222360125683	Corte 31-ene-2022	11-feb-2022	17-feb-2022	Correo electrónico	Séptimo informe de ejecución técnica y financiera Se presenta para sexto desembolso del contrato (primero de la vigencia 2022)

Tramites

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan gestiones mediante memorandos, oficios y/o correos. A continuación, se relacionan los tramites realizados mediante oficios y memorandos

TABLA 7: GESTIONES MEDIANTE MEMORANDOS

Memorando No.	Fecha	Descripción
20204600065823	9-nov-2020	Solicitud Contrato 20200530 Fiduagraria. Se envió memorando al EIP con solicitudes iniciales del contrato.
20202360070533	Sin fecha	Segundo informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 30 de noviembre de 2020. Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020
20214600011983	4-feb-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual
20212360020503	4-mar-2021	Tercer informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 31 de enero de 2021. Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 2021).
20214600025683	25-mar-2021	Consulta supervisión derivados dirigido a la coordinadora del grupo de contratación. El memorando fue enviado por correo el 25 de marzo de 2021 al Director para su revisión, observaciones y firma. El 16 de abril se recibe memorando firmado por el Director y se envía al grupo de contratación.
20212360038093	10-may2021	Respuesta informe de auditoría Control Interno – Alianzas. Firmado por la Coordinadora del EIP
20213500039823	18-may-2021	Contestación petición acerca de supervisión contratos derivados Memorando #20214600025683. El grupo de contratos informa que se puede conformar equipo de apoyo a la supervisión.
20212360114401	28-may-2021	Respuesta a solicitud memorando 20211800035763, Plan de Acción PAAP. Firmado por la Coordinadora del EIP
20214600050363	23-jun-2021	Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530 para el expediente contractual
20212360055113	12-jul-2021	Memorando del EIP al director y supervisión cuyo asunto es: "Solicitud modificación contrato de encargo fiduciario de administración y pagos 20200530 suscrito entre Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y FIDUAGRARIA".

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

20214600057933	21-jul-2021	Memorando de la supervisión al grupo de contratación, cuyo asunto es "Solicitud trámite tercera modificación contrato 20200530"

TABLA 8: GESTIONES MEDIANTE OFICIOS

Oficio No.	Fecha	Descripción
20204600241201	30-nov-2020	Oficio a Fiduagraria. Recomendaciones y solicitudes en el marco del Contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
02-0000559-07012021	7-ene-2021	Respuesta de fiduagraria a oficio 20204600241201 recomendaciones y solicitudes en el marco del contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
VNO-5483 02-005026-04062021	4-jun-2021	Oficio de Fiduagraria. Solicitud concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas
20214600139561	29-jun-2021	Respuesta a Fiduagraria del radicado 20213130170202 mediante el cual solicita concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. Contiene anexo acta de reunión realizada con grupo de gestión documental y biblioteca y otros del 16 de junio de 2021

Reuniones de gestión y/o seguimiento

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan reuniones de seguimiento y de gestión para facilitar el desarrollo del contrato. A continuación, se mencionan reuniones realizadas

TABLA 9: REUNIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Fecha	Descripción	Asistentes	Lugar	Soporte
5-oct-2020	Contrato Fiduagraria alianzas productivas.	Supervisión EIP	Presencial	Correo
30-oct-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo
5-nov-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Esta reunión se realizó con el objetivo de revisar temas financieros de las vigencias futuras. La reunión se realizó de manera presencial. Adriana Ibarra y Andres Leon asistieron de manera virtual por teams.	Supervisión EIP Director	Presencial Teams	Correo
17-nov-2020	Informes alianzas 20160992 y 20200530. Aclaración requisitos elaboración informe finan 20160992 y requisitos informes mensuales 20200530	Supervisión EIP	Teams	Correo

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

19-nov-2020	Aclaración inquietudes memo. Esta reunión se realizó con el objetivo de aclarar dudas respecto al memorando 20204600065823 enviado al EIP.	Supervisión EIP	Teams	Correo
27-nov-2020	Proceso apertura de patrimonios autónomos.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
14-dic-2020	Cierre Alianzas Productivas	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Correo
16-dic-2020	Reunión de seguimiento contrato 20200530. Agenda del día 1. Personal mínimo encargo fiduciario y PA. 2. Cronograma de ejecución 2020. 3. Ejemplo instructivo SARLAFT constitución de PA. 4. Procesos de contratación y 5. manuales operativos.	Supervisión EIP Fiduagraria Direccion	Teams	Grabación
21-dic-2020	Revisión oficio lineamiento y solicitudes iniciales. Esta reunión se realizó con la fiduciaria con el fin de aclarar dudas relacionadas con el oficio 20204600241201 que se envió a la Fiduciaria. Asistió en representación del EIP Maria Cristina Castillo.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Grabación, correo.
14-ene-21	Reunión Fiduagraria -PAAP.	Supervisión EIP Fiduagraria	Teams	Correo
2-mar-2021	Revisión solicitud de segunda modificación del contrato.	Supervisión EIP	Teams	Correo
3-mar-2021	Revisión informe preliminar tercer desembolso EIP	Supervisión EIP	Teams	Correo
17-mar-2021	Revisión proceso supervisión - definición acciones de mejora. EIP y supervisión.	Supervisión EIP	presencial	Correo
16-abr-2021	Reunión respuesta supervisoras CGR	Supervisión EIP	Teams	Correo
11-may-2021	Reunión articulación supervisión del contrato 20200530 y supervisión contratos Operadores Regionales	Supervisión 20200530 Supervisión OR	Teams	Correo Ayuda de memoria
18- may 2021	Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas	Supervisión	Teams	Correo

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

		EIP Grupo calidad DCPyGI		Mapa de riesgos
18- may 2021	Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas	Supervisión EIP	Teams	Correo Mapa de riesgos
21-may-2021	Revisión memorando respuesta del grupo de contratación relacionada con el alcance a la contratación derivada. Considerando la respuesta dada por contratos se solicitó programación de reunión con el Director con el fin de plantear las ideas frente al equipo de apoyo. La reunión se encuentra pendiente de asignar.	Supervisión 20200530 Supervisión OR	Teams	Correo Ayuda de memoria
16-jun-2021	Reunión realizada como respuesta al oficio de Fiduagraria VNO-548 02-005026-04062021 del 4-jun-2021, mediante el cual solicitan concepto archivo contratación derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas Se concluyo que *"… Fiduagraria puede manejar la tabla de retención documental – TRD que usa internamente, sin embargo, desde el Proyecto Apoyo a Alianzas productivas se enviará a la misma, los lineamientos remitidos por El Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Contratación para el manejo del archivo"*	Grupo de gestión documental y biblioteca Subdirección administrativa Grupo de contratación Equipo implementador del proyecto - EIP Supervisión Dirección de Capacidades Productivas Fiduagraria	Teams	Acta
2-jul-2021	Comité de seguimiento NO. 1 entre la Fiduciara, EIP y supervisión, en el que se presentaron los avances del convenio a junio 2021. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-	Fiduagraria EIP Supervisión	Teams	Acta Grabacion teams

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d			
	Comité de seguimiento NO. 2 entre la Fiduciaria, EIP y supervisión, en el que se presentaron los avances del convenio a junio 2021.	Fiduagraria EIP Supervisión	Teams	Acta Grabacion teams
30-sep-2021	Comité de seguimiento NO. 3 entre la Fiduciaria, EIP y supervisión, en el que se presentaron los avances del convenio a junio 2021.	Fiduagraria EIP Supervisión	Teams	Acta Grabacion teams
10-nov-2021	Reunión entre la Fiduciaria, EIP y supervisión con la asistencia del director de capacidades, con el fin de presentar los contratos aprobados pro fidagraria Vs los contratos solicitados por el EIP. Se observó un atraso en la aprobación de contratos. La fiduciaria se comprometió a contratar más personal para atender las solicitudes.	Fiduagraria EIP Supervisión Director Capacidades	Teams	Grabacion teams
19-nov-2021	Reunión entre la Fiduciaria, EIP y supervisión con la asistencia del director de capacidades, con el fin de presentar los contratos aprobados pro fiduagraria Vs los contratos solicitados por el EIP. Se observó un atraso en la aprobación de contrato. La fiduciaria informó que contrato las personas prometidas, sin embargo, se siguen presentando documentos sin el lleno de requisitos, por lo cual el número de devoluciones es muy alto y no se puede proceder a aprobar los contratos. Se acordó realizar reunión la siguiente semana para hacer seguimiento y encontrar nuevas estrategias de solución.	Fiduagraria EIP Supervisión Director Capacidades	Teams	Grabacion teams Listado de asistencia

Revisión informe de fiducia

Se recibe informe de fiducia mediante correo electrónico del 10 de junio de 2022 con los siguientes anexos:

1. 0. Informe mensual mayo EF 394517 f.pdf
2. 1. Flujo de Caja a corte mayo de 2022.pdf
3. 2. Saldos a corte mayo 2022.pdf
4. 3. Instrucción pagos instruidos mayo 2022.pdf

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

5. 4. Instrucción Pagos realizados mayo 2022.pdf
6. 5. Relación de obligaciones de la fiduciaria.pdf
7. 5 y 6 relación contratos vigencia 2020,2021,2022 mayo 2022.xlxs
8. 7. Ejecución presupuestal POA 2020.pdf
9. 7. Ejecución Presupuestal corte mayo 2022 POA 2021.pdf
10. 7. Ejecución Presupuestal corte mayo 2022 POA 2022.pdf
11. 8. Balance general por naturaleza a corte mayo de 2022.pdf
12. 9. Extracto cuenta ahorros 031 00001428 mayo 2022.pdf
13. 10. Gestión de riesgos a mayo 2022.pdf

Contratos derivados:

Se revisa el anexo en Excel "5 y 6 relación contratos vigencia 2020,2021,2022 mayo 2022.xlxs" que contiene los contratos derivados realizados durante el contrato 2020

El 31 de mayo de 2022 se realizó reunión con la fiduciaria en la que se revisó el archivo en excel que envían anexo al informe de gestión mensual, específicamente la hoja de ejecución de la contratación de los patrimonios autónomos y se acuerda que la fiduciaria:
- Incluirá columna con clasificación de las fases a las que pertenecen cada una de las alianzas
- Incluirá columna con nombre corto, regional y departamento
- Revisará las alianzas fase uno, dado que hay 176 y son 177.
- Incluir fecha de contratos faltantes (manejar siempre en fecha el formato día-mes-año)

La supervisión del MADR solicitará Excel de ejecución consolidada del IM enviando correo a Carlos Arevalo.
A continuación, se presenta el análisis de la revisión realizada por la supervisión.

Contratos derivados encargo año 2020:

Los contratos de la vigencia 2020 se realizaron entre octubre y diciembre de 2020, los cuales suman un total de 219 contratos, 218 terminados de los cuales 14 no tuvieron ningún pago, y uno anulado.

De estos 219 contratos 2 pertenecen a las órdenes de compra 62782 y 59809 y uno a la mínima cuantía 20200626
En los anteriores de supervisión se informó el detalle de estos contratos

El detalle de la información de los contratos se encuentra en el anexo "12. Reporte de contratos vigencia 2020 – Junio 2021.pdf" del informe de fiducia.

Contratos derivados encargo año 2021

Durante el año 2021 se realizaron 80 contratos en total, uno anulado correspondiente al contrato No. 31, 67 terminados y 11 actualmente en ejecución así:

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Tercero	Fecha de suscripción	Fecha de Inicio	Fecha Terminación con modificacion	Objeto del Contrato
PJ: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H RL: HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA	14/04/2021	19/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Orinoquia, conformada por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada de conformidad con los líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
PJ: CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS MARGINALES SEMILLAS DE LOS ANDES RL: FRANCY JOHANNA VILLAMIL MANRIQUE	14/04/2021	21/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP en la región Caribe II, conformada por los departamentos de Sucre, Guajira, Magdalena y Córdoba de conformidad con los lineamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
PJ: PRODESARROLLO LIMITADA RL: EURIPIDES MARRUGO ESPINOSA	14/04/2021	19/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Caribe I, conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y San Andrés Islas y Providencia de conformidad con los líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
PJ: GRUPO IS COLOMBIA SAS RL: CARLOS JULIO GÓMEZ MORENO	16/04/2021	21/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Eje Cafetero y Antioquia, conformada por los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda de conformidad con los lineamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
PJ: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO DE COLOMBIA - SIGLA: FUNTECOL PN: JOSE GREGORIO MEZA ALVAREZ	14/04/2021	28/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Pacifica, conformada por los departamentos de Cauca, Choco, Nariño y Valle del Cauca de conformidad con los líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
PJ: FUNDACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES-FUNPROSCOM RL: FAVIO JOSE ROMERO RAMIREZ	14/04/2021	21/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Central, conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y Bogotá de conformidad con los lineamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas
PJ: CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO PN: MARCO AURELIO URIBE GUERRERO	14/04/2021	19/04/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Santanderes, conformada por los departamentos de Santander y Norte de Santander de conformidad con los líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
PJ: ASOCIACION PARA LA REINGENIERIA RURAL - REDVITAL PN: WILLIAM ALBERTO ACUÑA OCHOA	19/04/2021	6/05/2021	31/12/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en la región Amazonia, conformada por los departamentos de Amazonas, Caqueta, Guainia, Guaviare, Putumayo y Vaupes de conformidad con los líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas
P.J. : SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA. - TELECAFE LTDA R.L. RAMIREZ LEON MARIA TERESA	21/11/2021	02/12/2021	31/05/2022	Prestar el servicio de operación logística integral para la realización de eventos de socialización y divulgación del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas - PAAP a nivel nacional según lo requiera el Equipo Implementador del Proyecto.
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	6/12/2021	14/12/2021	30/06/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, para fortalecer el nivel de conocimiento y competencias de las organizaciones productoras; implementar las estrategias Socio-empresarial, Ambiental, Financiera, Fortalecimiento Técnico Productivo y Agro-negocios e incidir en el mejoramiento de las condiciones productivas y competitivas de las alianzas productivas de la Zona Norte (CARIBE 1, CARIBE 2, EJE CAFETERO Y SANTANDERES).
FUNDACIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO RURAL	6/12/2021	10/12/2021	30/06/2022	Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, para fortalecer el nivel de conocimiento y competencias de las organizaciones productoras; implementar las estrategias Socio-empresarial, Ambiental , Financiera, Fortalecimiento Técnico Productivo y Agro-negocios e incidir en el mejoramiento de las condiciones productivas y competitivas de las alianzas productivas de la Zona Sur (AMAZONIA, CENTRAL, ORINOQUIA, PACIFICO).

El detalle de los contratos se encuentra en el anexo "Reporte de contratos vigencia 2021 junio 2021.pdf" que se encuentra en el informe de fiducia.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Contratos derivados encargo año 2022


Durante el año 2022 se han realizado 95 contratos en total, cuatro anulados, 86 en ejecución y 5 que actualmentes están firmados para iniciar ejecución.

Los 4 contratos anulados son:

Tercero	No.Contrato
NELSON VILLAMIZAR GOMEZ	43
JESSICA ECHEVERRY RODRIGUEZ	58
JOHANNA MATEUS DIAZ	80
DIANA MATEUS	86

Los 5 contratos firmados son:

Tercero	No.Contrato
JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ	37
ANA LUISA MOLINA MEZA	66
EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	69
HENRY VALENCIA SALAMANCA	70
MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	75



Actualmente hay 86 contratos en ejecución, 8 de los cuales corresponden a las OGR así:

No. Contrato	Tercero	Fecha de suscripción	Fecha de Inicio	Fecha Terminación con modificación
044	PJ: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA ES S C H RL: HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA	14/04/2021	19/04/2021	31/07/2022
045	PJ: CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS MARGINALES SEMILLAS DE LOS ANDES RL: FRANCY JOHANNA VILLAMIL MANRIQUE	14/04/2021	21/04/2021	31/07/2022
046	PJ: PRODESARROLLO LIMITADA RL: EURIPIDES MARRUGO ESPINOSA	14/04/2021	19/04/2021	31/07/2022
047	PJ: GRUPO IS COLOMBIA SAS RL: CARLOS JULIO GÓMEZ MORENO	16/04/2021	21/04/2021	31/07/2022
048	PJ: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO DE COLOMBIA - SIGLA: FUNTECOL PN: JOSE GREGORIO MEZA ALVAREZ	14/04/2021	28/04/2021	31/07/2022
049	PJ: FUNDACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES- FUNPROSCOM RL: FAVIO JOSE ROMERO RAMIREZ	14/04/2021	21/04/2021	31/07/2022

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

050	PJ: CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO PN: MARCO AURELIO URIBE GUERRERO	14/04/2021	19/04/2021	31/07/2022
051	PJ: ASOCIACION PARA LA REINGENIERIA RURAL - REDVITAL PN: WILLIAM ALBERTO ACUÑA OCHOA	19/04/2021	6/05/2021	31/07/2022

Los otros 78 contratos corresponden a los siguientes contratistas:

Tercero	No.Contrato
ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	1
YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA	2
ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	3
NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	4
ARMANDO SOLORZANO SALAS	5
MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	6
EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL	7
ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL	8
IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	9
JACOB ARMERO DAJOME	10
JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	11
JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA	12
LOREN NATALY BENAVIDES MANTILLA	13
ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	14
OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	15
OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	16
PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	17
RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	18
SANDRO ROPERO BELTRAN	19
WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	20
WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	21
YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	22
ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	23
ANGEL MARIA GUERRERO	24
DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	25
ANAMARIA PATIÑO SALGADO	26
CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA	27
CLAUDIA CRISTINA MORA ORTIZ	28
EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE	29
ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	30
ELINA ISABEL FONSECA YANCI	31
HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	32
ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO	33
JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	34
AMAURY RAMIREZ CASTRO	35
JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	36

Tercero	No.Contrato
JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	36
LINA MARIA PINZON RODRIGUEZ	38
MARIA CAMILA MEDINA GALLEGO	39
MARIA ELENA UNIGARRO LOPEZ	40
MARIO NOGUERA ORTIZ	41
MIRIAM PANTOJA OTERO	42
OSCAR DARIO MONTUFAR HOYOS	44
PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	45
SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	46
SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN	47
SILOE DE SOUZA LIMA ZAMBRANO	48
SULDERIS INES PERTUZ LOBO	49
VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	50
YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	51
ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	52
HARLEY LILIANA ORTIZ SALAZAR	53
RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	54
DALIA LUCIA DIAZ DELGADO	55
DAVID FRANCISCO PEREZ PRADOS	56
FERNEY MARINO CAMPO RIVERA	57
JOHANNA MATEUS DIAZ	59
MAURICIO ANTONIO HOYOS ECHAVARRIA	60
MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	61
NATALIA ESTEFANIA SAGANOME GUTIERREZ	62
RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	63
SAMUEL EDUARDO ESCAF HADDAD	64
SHIRLEY MARBEL CARRILLO BARRIOS	65
ANTONIO ADAT MERCADO BARBOSA	67
CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	68
JORGE HUMBERTO MENDEZ CHACON	71
JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	72
KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	73
LISSETTE PATRICIA GUEVARA RIAÑO	74
RODOLFO RENGIFO VALENCIA	76
JAVIER ERNESTO NIÑO GOMEZ	77
HENRY ALVIS ZABALA	78
WILLIAM THOMAS LEONES	79
MARCO ANTONIO CAZARAN MOSQUERA	81
YORLENIS MERITH HENRIQUEZ VENERA	82
MARIE ELENA PAEZ	83
JUAN CAMILO ORTIZ BARAJAS	84
YHONNY RIVERA GARCIA	85
JORGE ALEJANDRO LEON VALENCIA	87

Instrucciones de contratación derivada

En el cuerpo del informe, se observa que durante el mes de mayo de 2022 la fiduciaria reporta que se realizó una modificación al contrato de Telecafe. A continuación, se presenta el cuadro presentado por la fiduciaria:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				


No. Contrato	Tercero	Identificación	Fecha de suscripción	Fecha de Inicio	Fecha Terminación con modificacion	PERFIL	Valor Inicial Contrato y adiciones	ESTADO
076	P.J. : SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA. - TELECAFE LTDA R.L. RAMIREZ LEON MARIA TERESA	890807724-8	21/11/2021	02/12/2021	31/05/2022	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 350.000.000	EJECUCIÓN

Contratos fiduciarios y contratación derivada

A corte de mayo 2022 para el POA 2020 se han suscrito y girado recursos a 177[3] contratos fiduciarios de patrimonios autónomos, es decir que se cuenta con el 100% de la meta cumplida. Para el POA 2021 se han suscrito 460 contratos fiduciarios de patrimonios autónomos, a los cuales se les tramitaron giros. El detalle se observa en el anexo "Pagos Instruidos mes mayo 2021.pdf" y anexo "4. Instrucción Pagos realizados mayo 2022.pdf, que se encuentran en el informe de fiducia.

Los patrimonios autónomos han presentado un total de 671 contratos derivados. Estos contratos en su mayoría corresponden a operadores locales, seguidos por asistencia técnica y plan social como se observa a continuación:

RUBRO	Count of CONTRATO N°
08-01 OPERADOR LOCAL	360
04-01 ASISTENCIA TÉCNICA	129
08-03 PLAN SOCIAL	128
03-01 INSUMOS	28
08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	18
02-03 OTRAS INVERSIONES	2
03-03 MATERIAL VEGETAL	1
03-05 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1
03-10 SERVICIOS	1
03-13 OTRAS INVERSIONES	1
OTRAS FUENTES/ALCALDÍA 08-03 PLAN SOCIAL	1
OTRAS FUENTES/GOBERNACIÓN	1
Total	**671**

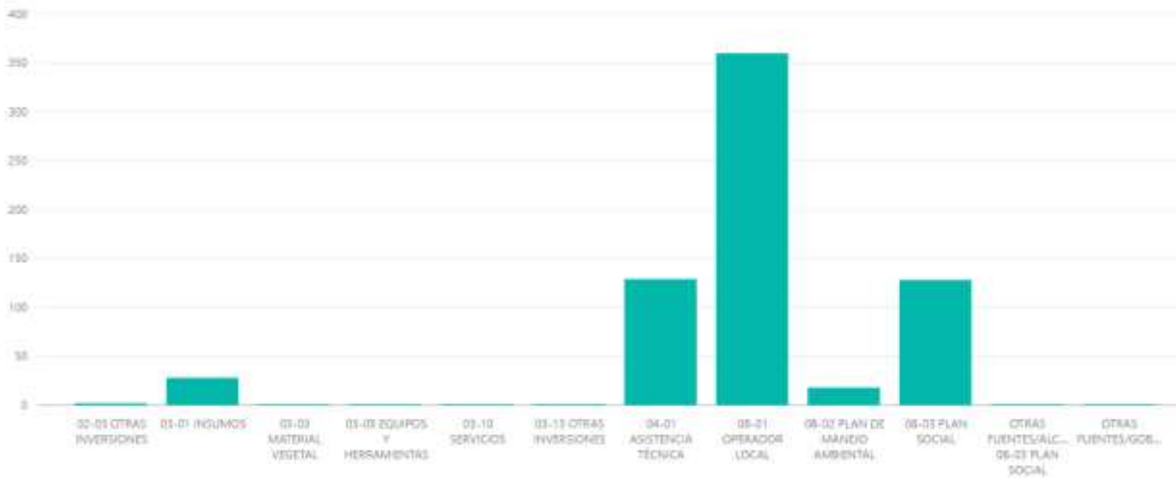

Las alianzas Fase 1 cofinanciadas con recursos 2020 han realizado 488 contratos derivados, los cuales comenzaron a firmarse desde mayo de 2021 hasta la fecha, así:

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

RUBRO	Count of CONTRATO Nº
08-01 OPERADOR LOCAL	177
04-01 ASISTENCIA TÉCNICA	129
08-03 PLAN SOCIAL	128
03-01 INSUMOS	28
08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	18
02-03 OTRAS INVERSIONES	2
03-03 MATERIAL VEGETAL	1
03-05 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1
03-10 SERVICIOS	1
03-13 OTRAS INVERSIONES	1
OTRAS FUENTES/ALCALDÍA 08-03 PLAN SOCIAL	1
OTRAS FUENTES/GOBERNACIÓN	1
Total	**488**

Year	Month	Count of CONTRATO Nº
2021	May	25
2021	June	74
2021	July	4
2021	August	47
2021	September	37
2021	October	72
2021	November	16
2021	December	17
2022	February	11
2022	March	41
2022	April	62
2022	May	82
Total		**488**

Las alianzas Fase 1 cofinanciadas con recursos 2020 han realizado 183 contratos derivados, los cuales comenzaron a firmarse desde febrero de 2022 hasta la fecha, así:

RUBRO	Count of CONTRATO Nº
08-01 OPERADOR LOCAL	183
Total	**183**

Year	Month	Count of CONTRATO Nº
2021	June	1
2022	February	5
2022	March	33
2022	April	62
2022	May	82
Total		**183**

Nota: hay un contrato registrado con fecha de junio 2021 de la Asociación De Campesinos Amor A Mi Tierra, que debe revisarse dado que la fecha esta errada, considerando que los giros a estos patrimonios iniciaron en diciembre de 2021.

Gestión de riesgos

En el informe de la fiduciaria se incluye el anexo de gestión de riesgos, en el que se mencionan 4 tipos de riesgos que se pueden presentar en la administración de recursos del contrato 20200530. A fecha de corte de este informe no se ha materializado ningún riesgo.

A continuación, se presentan los riesgos presentados por la fiduciaria y las medidas de control identificadas

TABLA: TIPOS DE RIESGOS CONTRATO

Tipo de riesgo	Medidas de control identificadas por la supervisión
De liquidez	1. FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad de este.
De mercado y crédito	1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera 2. baja exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) administrados por la entidad
Operacional	1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo Operativo "SARO", enfocado en disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputaciones.

[3] Se firmaron 178 contratos fiduciarios pero la alianza Asomudepas presentó liquidación anticipada, por lo cual quedaron 177 patrimonios con la vigencia 2020

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Externo	1. LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, procedimientos y controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información en condiciones de seguridad y calidad

Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

El 16 de junio de 2021se recibió mediante correo electrónico (anexo) la versión final del mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos (anexo) aprobado el 19 de mayo de 2021 por el director de capacidades productivas y generación de ingresos.
Al revisar el documento, se identifican 4 riesgos asociados al proyecto de apoyo a alianzas productivas, a los cuales se les ha realizado seguimiento en reuniones conjuntas entre el EIP y la supervisión. A la fecha se han realizado 4 reuniones así: el 14-sep-2021, 13dic2021, 15feb2022 y 4abr2022. A continuación, se menciona el seguimiento realizado en abril de 2022:

TABLA 10: RESUMEN MAPA DE RIESGOS

Riesgo	Descripción del Control	Seguimiento 4 de abril de 2022
Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la continuidad en la puesta en marcha de los programas de alianzas debido a demoras en la contratación del equipo nacional de implementación del proyecto (EIP) y los operadores regionales por parte del MinAgricultura	Director(a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos debe generar y mantener la estructura operativa permanente de un Equipo Implementador del Proyecto-EIP y los Operadores Regionales-OR, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución de las alianzas y hacerle seguimiento a la misma.	No se materializó el riesgo. Durante el mes de enero 2022 se realizó la contratación del EIP y se mantuvo el contrato de los Operadores Regionales - OR contando con el personal requerido para el desarrollo del proyecto.
Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en las fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por parte de los proyectos susceptibles a ser cofinanciados debido a demoras para la estructuración de las preinversiones por parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces	El Equipo Implementador del Proyecto (EIP) realizará el seguimiento a la estructuración de las preinversiones, para mitigar los posibles riesgos que esta actividad genere.	No se ha materializo el riesgo. El Equipo Implementador del Proyecto para las fases I y II realizo el seguimiento a la estructuración de las preinversiones a cargo de las 8 OR, con lo cual se cumplieron las metas. Para la fase III, correspondiente a la convocatoria 2022, aun no se llega a la etapa de preinversiones.
Posibilidad de afectación económica por retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizaran las gestiones y los trámites necesarios para el giro oportuno de los recursos	No se ha materializado el riesgo. Para la vigencia 2022 se ha realizado un giro, correspondiente al sexto desembolso del contrato, el cual se realizó de manera oportuna.
Posibilidad de afectación económica del PAAP por cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la reglamentación vigente del PAAP.	El equipo implementador del proyecto en conjunto con los supervisores de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, realizarán el seguimiento y control de los proyectos	No se ha materializo el riesgo. Se ha realizó el seguimiento y control de los proyectos de alianzas.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

I. ENCARGO FIDUCIARIO

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs (2020, 2021 y 2022).

Los Poas están compuestos por diferentes actividades denominadas "concepto gasto elegible" las cuales se ejecutan dentro del encargo fiduciario, sin embargo, la actividad del incentivo modular realmente se ejecuta en los patrimonios autónomos, para lo cual se realiza el giro de los recursos desde el encargo fiduciario a los respectivos fideicomisos.

POA 2020: El POA 2020 está compuesto por 8 actividades, las cuales se encuentran ejecutadas. Los recursos de la actividad del incentivo modular, durante el 2021 fueron girados del encargo fiduciario a los 177 patrimonios autónomos, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2021: El POA 2021 está compuesto por 10 actividades de las cuales 4 se encuentran ejecutadas y 6 aún están en ejecución. Los recursos de la actividad del incentivo modular están siendo girados a los 478 patrimonios autónomos programado, a corte de este informe se ha girado a 460 alianzas, por lo tanto, dado que estos recursos ahora se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de la ejecución del IM se verá reflejado allí.

POA 2022: Los recursos de la actividad del incentivo modular aun no son girados a los patrimonios autónomos, según cronograma el giro de recursos a las alianzas fase III se realizará entre septiembre y octubre de 2022, por lo tanto, dado que estos recursos aún no se encuentran en los patrimonios autónomos, el avance de esta actividad solo se observará en el encargo fiduciario.

El avance del encargo fiduciario se presenta en los POAs 2020, 2021 y 2022. EL avance de los patrimonios autónomos se presentará en el siguiente capitulo.

Avance POA 2020

COMPONENTES	CONCEPTO GASTO ELEGIBLE (CGE)	Actividades	Peso porcentual CGE	avance actividad	Avance porcentual CGE
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Preinversiones	Estructuración Preinversiones	5,9%	100%	5,3%
		Presentación de resultados ante la Comisión Intersectorial		100%	0,6%
	Seguimiento y monitoreo	Visitas de inducción Alianzas 2020	0,5%	100%	0%
	Apertura del registro verificación de perfiles		0,0%		0%
	SUBTOTAL		**6%**		**6%**
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	Legalización Convenios	90%	100%	36%
		Constitución Patrimonios		100%	4%
		Giro Patrimonios		100%	49%
		Contratación Operadores Locales alianzas 2020		100%	0%
	SUBTOTAL		**90%**		90%
	Contratación EIP	Divulgación Convocatoria	2,2%	100%	0%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)		Cierre Convocatoria		100%	0%
		Acompañamiento transversal al PAAP		100%	2%
	Costos fiduciaria	Pago Costos fiduciaria	0,4%	92%	0%
	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	Pago Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	0,9%	82,5%	0,8%
	Materiales y suministros	Legalización Contrato proveedoor	0,1%	100%	0%
		Entrega de materiales y suministros al MADR		100%	0%
	SUBTOTAL		**4%**		**3,5%**
TOTAL			**100%**		**99,8%**

Las actividades del POA 2020 dentro del encargo se ejecutaron y su descripción se ha realizado en informes anteriores. Actualmente de este POA se encuentran en ejecución 177 patrimonios autónomos de los cuales se dará cuenta en el capítulo de patrimonios autónomos.

Avance POA 2021

I. PREPARACIÓN ALIANZAS PRODUCTIVAS - PREINVERSIÓN

Este es el primer componente del POA y para la realización de las actividades que lo componen, entre el 14 y el 16 de abril de 2021 se contrataron 8 operadores regionales4, con recursos de las vigencias 2021 y 2022. Todos los contratos de los OR tienen como fecha de terminación el 31 de julio de 2022, fecha inicial (actual) de terminación el contrato 20200530.

El pago a estos operadores regionales se realiza por tres conceptos: seguimiento y monitoreo, verificación de perfiles y preinversiones

1. **Apertura de registro y verificación de perfiles: 754.676.000 (100%)**

Como se dijo antes esta actividad es realizada por los ocho operadores regionales contratados Prodesarrollo, semllas de los andes, Corpoagro, fundación Star cop humanity, Funproscom, Funtecol, Grupo IS Colombia SAS Red vital. En el respectivo contrato, en el numeral 2.2. forma de pago, quedó establecido como se realizarían los pagos

- Un pago equivalente al 40% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del plan de ruta de la verificación de perfiles.
- Un pago equivalente al 60% del valor unitario del total del número de alianzas en verificación de perfiles asignados, contra la entrega del informe respectivo y matriz del resultado de la verificación de los perfiles.

4 Según lo establecido en el Manual de Alianzas Productivas V4 los operadores regionales son: *"Persona jurídica, pública o privada, o equipo de profesionales bajo la supervisión del EIP que hace parte del esquema institucional del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas que adelanta la ejecución de las siguientes actividades: Divulgación, verificación de perfiles de alianzas, elaboración de los estudios de preinversión y monitoreo y seguimiento a las alianzas que se implementen en sus regiones de influencia, de conformidad con la metodología y el marco orientador del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas".*

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Por lo anterior se realizaron dos sesiones de las comisiones intersectoriales nacionales, la sesión No. 76 del 24 de junio de 2021 en la que se aprobaron 105 perfiles de las regionales Amazonia, Pacifico, Santander y central y la No. 77 del 28 de junio de 2021 en las que se aprobaron 116 perfiles de las regionales Orinoquía, Eje Cafetero, Caribe 1 y Caribe 2 para un total de 221 alianzas aprobadas en CIN.

Así mismo, se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales No. 4, lo que corresponde a una por cada regional del proyecto, para un total de 327 alianzas aprobadas en CIN.

Ahora bien, de los 598 perfiles preseleccionados, 50 tuvieron puntajes menores a 65 puntos por lo tanto no cumplieron con los requisitos mínimos, por lo tanto, no califican para ser aprobados.

Considerando que esta actividad se cumplió, se puede decir que el avance técnico es el 100%

A continuación, se presenta el detalle de la revisión realizada por la supervisión:

Para verificar el cumplimiento de esta actividad, nos remitimos a las actas de CIN y CIR correspondientes a las comisiones Nacionales No. 76 y 77 y a las comisiones intersectoriales Regionales en sus sesiones No. 4, en las que se presentaron un total de 598 alianzas y se aprobaron un total de 548 alianzas de las cuales 221 fueron aprobadas en CIN y 327 fueron aprobadas en CIR, según se presenta a continuación.


Presentación resultados evaluación CIR/CIN	AMAZONIA	CARIBE 1	CARIBE 2	CENTRAL	EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	LLANOS Y ORINOQUIA	PACIFICO	SANTANDERES	**Total**
CIN	22	26	32	36	32	26	30	17	**221**
CIR	32	39	45	56	48	39	47	21	**327**
CIR NO APROBADO	6	7	3	7	7	6	10	4	**50**
Total	**60**	**72**	**80**	**99**	**87**	**71**	**87**	**42**	**598**

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los perfiles no aprobados y los aprobados según CIN 76 o 77 y CIR 4:

No. COMISIÓN	AMAZONIA	CARIBE 1	CARIBE 2	CENTRAL	EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	LLANOS Y ORINOQUIA	PACIFICO	SANTANDERES	**Total**
CIR NO APROBADO	6	7	3	7	7	6	10	4	**50**
77		26	32		32	26			**116**
76	22			36			30	17	**105**
4	32	39	45	56	48	39	47	21	**327**
Total	**60**	**72**	**80**	**99**	**87**	**71**	**87**	**42**	**598**

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el manual de alianzas y lo acordado en el acta CIN No. 75, respecto a la aprobación de los porcentajes de perfiles de alianzas, se observa que el 59,67% corresponde a las alianzas aprobadas en CIR y el 40,33% fueron aprobadas en actas de CIN.

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				



La aprobación de perfiles se realizó entre el 22 de junio al 28 de junio de 2021. A continuación, se presenta la aprobación por regional y por departamento:

Tabla: Distribución por regional


REGIÓN	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CIR NO APROBADO	**Total**
AMAZONIA		32	22			6	**60**
CARIBE 1				39	26	7	**72**
CARIBE 2				45	32	3	**80**
CENTRAL	56		36			7	**99**
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA			48		32	7	**87**
LLANOS Y ORINOQUIA			39		26	6	**71**
PACIFICO			30		47	10	**87**
SANTANDERES		21	17			4	**42**
Total	**56**	**53**	**192**	**84**	**163**	**50**	**598**

La región con más alianzas es la región central con 99 y la región con menos alianzas es la región Santanderes con 42.

Imagen: Distribución por departamento

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

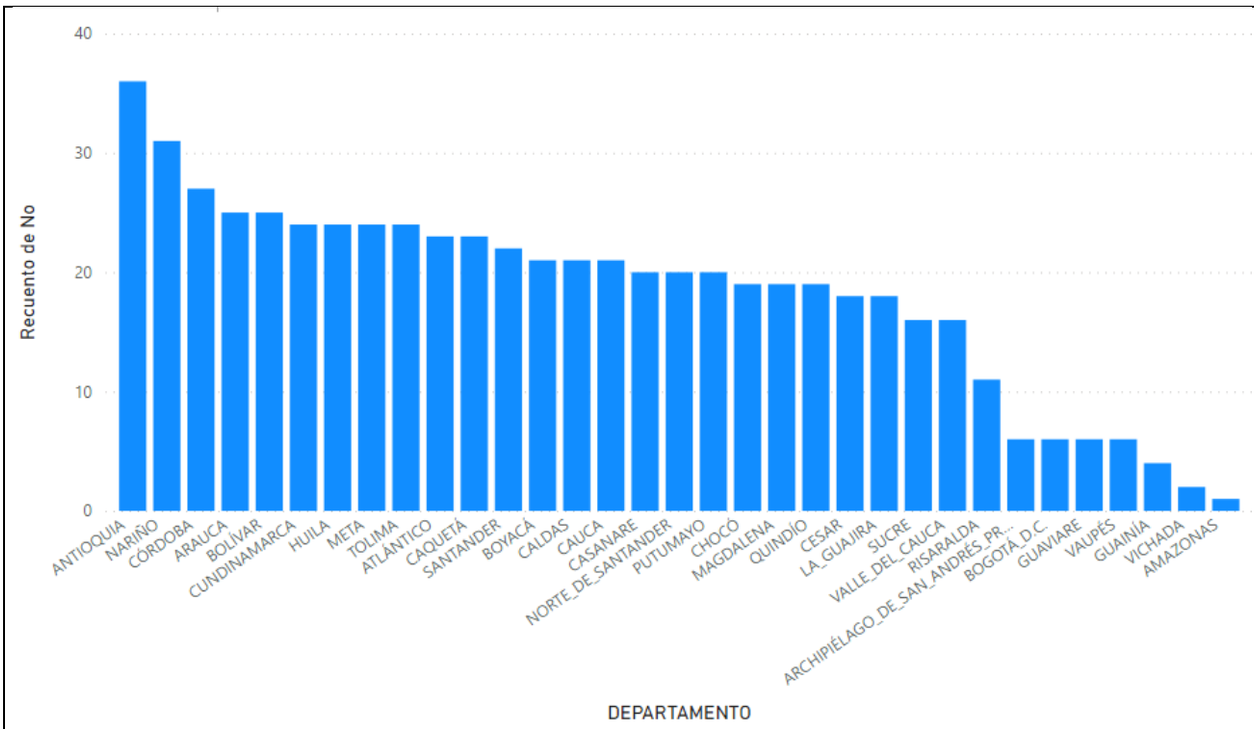

El Departamento con más alianzas es Antioquia con 36 y el departamento con menos alianzas es amazonas con 1.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Perfiles aprobados por departamento

DEPARTAMENTO	Recuento de No
ANTIOQUIA	33
CÓRDOBA	27
NARIÑO	26
BOLÍVAR	25
HUILA	24
TOLIMA	24
ARAUCA	23
META	22
CUNDINAMARCA	21
SANTANDER	21
CALDAS	20
CAUCA	20
PUTUMAYO	20
ATLÁNTICO	18
BOYACÁ	18
CAQUETÁ	18
CASANARE	18
MAGDALENA	18
LA_GUAJIRA	17
NORTE_DE_SANTANDER	17
QUINDÍO	17
CESAR	16
CHOCÓ	16
SUCRE	15
VALLE_DEL_CAUCA	15
RISARALDA	10
ARCHIPIÉLAGO_DE_SAN_ANDRÉS_PROVIDENCIA_Y_SANTA_CATALINA	6
VAUPÉS	6
BOGOTÁ_D.C.	5
GUAVIARE	5
GUAINÍA	4
VICHADA	2
AMAZONAS	1
Total	**548**

Nota: Todos los perfiles que fueron aprobados tienen un puntaje de 65 o más, cumpliendo con los términos de referencia.

Perfiles no aprobados por departamento

DEPARTAMENTO	Re
ATLÁNTICO	5
CAQUETÁ	5
NARIÑO	5
ANTIOQUIA	3
BOYACÁ	3
CHOCÓ	3
CUNDINAMARCA	3
NORTE_DE_SANTANDER	3
ARAUCA	2
CASANARE	2
CESAR	2
META	2
QUINDÍO	2
BOGOTÁ_D.C.	1
CALDAS	1
CAUCA	1
GUAVIARE	1
LA_GUAJIRA	1
MAGDALENA	1
RISARALDA	1
SANTANDER	1
SUCRE	1
VALLE_DEL_CAUCA	1
Total	**50**

Considerando que se recibieron los perfiles verificados y se pagaron a los operadores regionales según lo acordado, esta actividad tiene un cumplimiento del 100%

1. **Preinversiones:**

Actividad	Descripción			
Estructuración Preinversiones 2021	Una vez fueron aprobados los perfiles en las respectivas comisiones, los operadores regionales procedieron a realizar	486	486	100%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

	los respectivos estudios de preinversion apoyados en visitas a campo. Como resultado de esta verificación, los OP entregaron al EIP los documentos elaborados de los estudios de las preinversiones realizadas.			
Presentación de resultados de preinversiones 2021 ante la Comisión Intersectorial	Para verificar el cumplimiento de actividad, nos remitimos a las actas de CIN y CIR correspondientes a las comisiones Nacionales No. 78 y 79 y a las comisiones intersectoriales Regionales en sus sesiones No. 5 (8 actas) y sesiones No. 6 (3 actas), en las que se presentaron un total de 548 preinversiones de alianzas y se aprobaron un total de 494 de las cuales 478 son susceptibles de cofinanciación.	486	486	100%

Considerando que se recibieron las preinversiones esta actividad tiene un cumplimiento técnico del 100%,

2. Seguimiento y monitoreo:

Esta actividad contempla el seguimiento y monitoreo de las alianzas financiadas con recursos 2020 y 2021 asi:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	Avance
Visitas de inducción alianzas 2021	Las visitas de inducción son la primera actividad de seguimiento y monitoreo.	478 visitas	478[5]	100%
Monitoreo y ejecución alianzas 2020	Estas alianzas tuvieron visita de inducción durante el 2020, para este año se hace seguimiento y seguimiento a las 177 alianzas del 2020. Se calcularon 9 monitoreos por alianza[6] para un total de 1593, sin embargo, este número puede variar. Monitoreo y seguimiento se refiere a las visitas a territorio (diferentes a la de inducción) y las demás actividades de seguimiento que realiza la OR como: alimentar el SIG con actualización de las metas del POA, revisar los informes del OL, cargar los informes del OR, cargar actas de CDA, estar pendiente de contrataciones, entre otras.	1593 monitoreos	1208 *	76%
Monitoreo y ejecución alianzas 2021	Una vez realizada la visita de inducción a estas alianzas, esta pendiente definir metas de monitoreo según financiación de recursos con esta vigencia.	3346	470	14%

[5] De estos 468, se han pagado 71 visitas correspondientes a la regional pacífico.

[6] En la práctica por lo general este número es mayor, sin embargo, para efectos de cálculo, se está teniendo en cuenta el número de monitoreos efectivamente cobrados por la OR

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. Incentivo modular: $88.400.000 (69%)

El avance de esta actividad se mide mediante el avance de las siguientes actividades:

Actividad	Descripción	Meta	Avance	% avance
Legalización Convenios	Los operadores regionales apoyaron la gestión para la suscripción de los Convenios de Alianza, y las enviaron firmados al EIP para su perfeccionamiento por la gerencia del Proyecto. - Contrato de Fiducia Mercantil, una vez recolectados los documentos correspondientes, el Operador Regional archivará una copia y enviará los originales a la Fiduciaria, diligenciará la lista de chequeo y la enviará firmada al EIP. A diciembre 31 de 2021 se habían legalizado 474 convenio, estaban pendientes 4 por tema documental. A la fecha todos los convenios se encuentran firmado	478	478	100%
Constitución Patrimonios	Para la constitución de los patrimonios autónomos, los OP apoyaron la firma de los Contratos de Fiducia Mercantil y enviaron los originales a la Fiduciaria, diligenciaron la lista de chequeo y la enviaron firmada al EIP.	478	460	96%
Giro Patrimonios	Una vez de cumplen los requisitos para legalización, el EIP emite autorización de giro del Incentivo Modular a Fiducia, para cada uno de los patrimonios autónomo. COn corte a matuo de 2022, la fiduciaria reporta "… se tramitarion giros de recursos a 460 convenio de a	478	460	96%
Contratación Operadores Locales alianzas 2021		478	183	38%

Nota: un mayor detalle de estas actividades se encuentra en el excel de avance POAs

Una vez surtido todo el proceso previo para la constitución de los patrimonios autónomos y finalmente el giro del incentivo modular IM, en diciembre de 2021 se inició el giro del IM a las alianzas 2021, sin embargo, hay 4 asociaciones en proceso de formalización y actualización de documentos.

Como se ha mencionado con recursos de esta vigencia se pretenden cofinanciar 478 alianzas, de las cuales 456 han firmado contratos y se han constituido 222 patrimonio autónomos los cuales cuentan con apertura de cuenta y giros del IM. A continuación, se presenta el proceso que siguen las alianzas para lograr el giro del IM

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Patrimonios autónomos

Desde el informe de septiembre 2021 realizado para el segundo desembolso de esta vigencia, se reporta el avance técnico de los patrimonios autónomos de acuerdo a la revisión del informe del EIP, los soportes documentales y del SIG.

El avance de los patrimonios, de acuerdo al informe del EIP, se mide en 6 indicadores que el EIP describe de la siguiente manera:

- **Avance Técnico de Ejecución (promedio de los 5 componentes POA):** Se refiere al promedio de la columna % avance del POA para cada uno de los indicadores proyectados en los 5 componentes. Es decir, indica el nivel de avance técnico reportado por los operadores locales en el POA, teniendo como base las metas proyectadas. La ruta: Consultar POA> seleccionar Alianzas>Componentes> Columna % avance para cada uno de los indicadores. El promedio de % de avance de las columnas de indicadores por componente y luego el promedio de los 5 componentes.
- **N° de visitas realizadas vs visitas proyectadas:** Relaciona el nivel de cumplimiento de las visitas realizadas frente a las visitas de monitoreo proyectadas al mes de corte del reporte. El cálculo es la división de las visitas que aparecen como realizadas, con fecha real en el sistema, sobre la proyección del Plan de Monitoreo/programación de visitas a realizar. Las visitas que deben hacerse en territorio – no todos los meses se hacen visitas in situ – son bimensuales, trimestrales etc de acuerdo con las necesidades, lo que puede afectar el resultado del indicador. Las regiones que no están en este promedio de tiempo, dadas las dificultades de la contratación derivada, no ha sido factible hacerles visitas en territorio.
- **N° visitas realizadas reportadas:** Representan las visitas que aparecen como realizadas, con fecha real en el sistema.
- **Informe de Monitoreo reportados vs visitas:** Hace referencia al nivel de proyección de los informes de monitoreo sobre las visitas realizadas. Los informes de monitoreo solo se proyectan cuando se lleva a cabo una visita.
- **% de Ejecución Incentivo Modular:** Se refiere a la ejecución del incentivo modular reportada por los operadores locales en el POA del Sistema General de Información (se exporta el Excel de ejecución financiera del módulo de reportes por regional).

Patrimonios autónomos recurso 2020 (convocatoria fase I)

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Para la vigencia 2020 se legalizaron 178 alianzas, de las cuales una (ASOMODEPAS) solicitó liquidación anticipada y se encuentra en trámite de liquidación, por lo tanto y hasta que no se liquidé, se incluirá en el reporte general.

A continuación, se presenta el avance de los patrimonios autónomos según los siguientes indicadores:

DEPARTAMENTOS	ALIANZAS	AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN % (% DE LOS 5 COMPONENTES DEL POA)	No. VISITAS REALIZADAS VS VISITAS PROYECTADAS - 01/11/21 %	VISITAS REALIZADAS REPORTADAS - 01/11/21	% de ejecución incentivo modular	Actas CDA Cargadas	Documentos Cargados
Reg. Amozanía	**20**	**15,18%**	**59,44%**	**27**	**7,35%**	**94**	**275**
AMAZONAS	2	2,56%	100%	2	0%	4	17
CAQUETA	3	50,15%	66,67%	5	33,33%	15	43
GUAINIA	1	0,00%	33,33%	1	0%	3	9
GUAVIARE	5	15,49%	56,67%	6	6,48%	22	65
PUTUMAYO	8	18,72%	50%	12	4,26%	46	128
VAUPES	1	4,16%	50%	1	0%	4	13
Reg. Caribe 2	**31**	**17,14%**	**100%**	**62**	**6,28%**	**171**	**483**
CORDOBA	9	14,64%	100%	18	15,06%	48	142
LA GUAJIRA	7	23,44%	100%	14	5,18%	36	110
MAGDALENA	7	17,20%	100%	14	1,42%	35	101
SUCRE	8	13,29%	100%	16	3,46%	52	130
Reg. Centro	**22**	**17,09%**	**77,08%**	**67**	**0,50%**	**101**	**474**
BOYACÁ	7	10,06%	88,33%	25	0%	32	126
CUNDINAMARCA	2	24,49%	100%	9	0%	14	51
HUILA	6	7,54%	50%	12	2%	25	124
TOLIMA	7	26,28%	70%	21	0%	30	173
Reg. Eje Cafetero y Antioquia	**27**	**16,29%**	**82,44%**	**45**	**3%**	**130**	**419**
ANTIOQUIA	7	13,85%	90,48%	14	0%	34	122
CALDAS	7	21,75%	100%	14	9,27%	20	94
QUINDIO	6	7,00%	91,67%	10	0%	33	90
RISARALDA	7	22,57%	47,62%	7	2,74%	43	113
Reg. Llanos y Orinoquia.	**21**	**39,23%**	**100%**	**62**	**17,27%**	**93**	**376**
ARAUCA	9	33,24%	100%	27	2,02%	45	171
CASANARE	6	44,37%	100%	17	9,27%	26	105
META	5	44,74%	100%	15	4,28%	18	83
VICHADA	1	34,56%	100%	3	53,50%	4	17
Reg. Pacífico	**26**	**11,19%**	**82,14%**	**21**	**3,76%**	**27**	**152**
CAUCA	7	8,71%	28,57%	2	0%	9	46
CHOCÓ	7	5,71%	100%	7	0%	6	32
NARIÑO	7	17,71%	100%	7	15,05%	7	43
VALLE DEL CAUCA	5	12,60%	100%	5	0%	5	31
Reg. Santanderes	**13**	**20,67%**	**94,84%**	**29**	**4.03%**	**81**	**237**
NORTE DE SANTANDER	7	21,00%	95,24%	16	7,14%	47	135

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

SANTANDER	6	20,33%	94,44%	13	0,91%	34	102
Región. Caribe 1.	**18**	**21,70%**	**86,67%**	**49**	**6,72%**	**79**	**277**
ATLANTICO	7	16,50%	100%	22	8,07%	39	131
BOLIVAR	3	28,74%	66,67%	6	0%	13	34
CESAR	5	24,01%	100%	15	0%	21	77
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3	17,55%	80%	6	18,82%	6	35
Total general	**178**	**19,8%**	**84%**	**362**	**5%**	**776**	**2693**

Análisis:

De todos los indicadores del cuadro anterior, el que esta supervisión considera más importante corresponde al AVANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN %, dado que este refleja el avance de los 5 componentes del POA de cada alianza, siendo el POA el instrumento que guía la ejecución del proyecto.

Se realizó comparación del avance reportado por departamento en septiembre 2021 con el de octubre 2021, y se calculó en incremento porcentual, así:

Desempeño total POA				
Departamento	**Conteo Alianzas**	**sep2021**	**oct2021**	**Incremento porcentual**
AMAZONAS	2	3%	3%	2,2%
ANTIOQUIA	7	9%	14%	57,5%
ARAUCA	9	31%	33%	6,8%
ATLANTICO	7	14%	17%	20,3%
BOLIVAR	3	23%	29%	23,4%
BOYACÁ	7	9%	10%	13,8%
CALDAS	7	19%	22%	12,9%
CAQUETA	3	50%	53%	4,7%
CASANARE	6	38%	44%	17,6%
CAUCA	7	7%	9%	29,8%
CESAR	5	21%	24%	12,2%
CHOCÓ	7	4%	6%	29,0%
CORDOBA	9	9%	15%	63,3%
CUNDINAMARCA	2	21%	24%	16,9%
GUAINIA	1	0%	0%	0,0%
GUAVIARE	5	16%	15%	-0,8%
HUILA	6	7%	8%	16,0%
LA GUAJIRA	7	23%	23%	0,0%
MAGDALENA	7	17%	17%	0,0%
META	5	39%	45%	13,9%
NARIÑO	7	16%	18%	7,8%

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	FINAL	AVANCE X	FECHA:	115/jun/2021
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

NTE DE SANTANDER	7	18%	21%	14,0%
PUTUMAYO	8	19%	19%	0,1%
QUINDIO	6	5%	7%	40,6%
RISARALDA	7	18%	23%	23,8%
SAN ANDRES Y PROV	3	16%	18%	7,5%
SANTANDER	6	18%	20%	14,0%
SUCRE	8	10%	13%	39,2%
TOLIMA	7	22%	26%	19,6%
VALLE DEL CAUCA	5	12%	13%	8,6%
VAUPES	1	4%	4%	0,0%
VICHADA	1	32%	33%	3,6%
Total general	**178**	**17%**	**19%**	14,7%

Se calculo el crecimiento con el fin de determinar si están avanzando las alianzas. Los departamentos que más avanzaron con respecto al porcentaje del mes anterior son Córdoba (63%), Antioquia (57,7%), Quindío (40,6%) y sucre (39,2%), los departamentos que no crecieron son La guajira, Magdalena y Vaupés, Guaviare decreció en un (0,8%). Guainía no reporta inicio de ejecución.

El avance técnico de los patrimonios a nivel nacional se estima en un 19%. Creció del 17% al 19%, por lo tanto, el crecimiento fue del 14,7%.

Desempeño total POA			
Región	**Conteo ALIANZA**	**sep2021**	**oct2021**
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	20	19%	20%
Reg. Caribe 2 (Magdal,Gua,SanAndr y Cesa).	31	14%	17%
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	22	13%	16%
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	27	13%	17%
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	21	35%	39%
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	26	10%	11%
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	13	18%	21%
Región. Caribe 1. (Atl, Bol, Cord y Suc).	18	18%	21%
Total general	**178**	**17%**	**19%**

A nivel regional, la región más avanzada en ejecución técnica del POA es llanos y Orinoquia con un 39%, y la más bajita es la región pacifico con un 11%. Las demás regiones presentan un avance entre el 16% y el 21% muy cercanas al promedio nacional del 19%

2. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Informe de gestión mensual correspondiente al mes de mayo de 2021:

Este informe es presentando por parte de la Fiduciaria dando cumplimiento a la circular básica jurídica CE 029 de 2014, circulara externa 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de encargo fiduciario.

Plazo de ejecución 31 de julio de 2022.

Teniendo en cuenta la revisión y verificación efectuada la situación del contrato tanto para la vigencia 2020, como 2021 es la siguiente:

En el mes de mayo se registraron ingresos por valor de $8.837.250.52, que corresponden a los rendimientos financieros generados durante el mes de mayo.

El saldo en cuenta de acuerdo con extracto bancario y a la certificación enviada por la Fiducia a 31 de mayo de 2021 asciende a la suma de $13.077.407.109.07

Se registran cuenta por pagar por valor de $109.061.430.86.

A continuación, se presenta el informe de ejecución para el mes de mayo de 2021 de acuerdo con los componentes del POA aprobado 2020:

POA

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	DEVOLUCION AL TESORO	SALDO
PREINVERSION	2.362.200.000,00	2.334.199.968,00	2.287.633.294,00	2.600.032,00	71.966.674,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	193.600.000,00	191.760.000,00	178.500.000,00	1.840.000,00	13.260.000,00
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	0,00	0,00	0,00		
INCENTIVO MODULAR	35.960.000.000,00	32.965.913.618,00	32.865.953.618,00	2.994.086.382,00	99.960.000,00
CONTRATACION EIP	899.263.068,00	897.320.526,00	803.669.591,00	1.942.541,84	93.650.935,16
COSTO FIDUCIARIO	171.263.567,00	88.401.661,00	155.624.865,00		15.638.702,00
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	373.673.365,00	206.126.893,00	28.050.976,00	167.546.472,00	178.075.917,00
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	40.000.000,00	26.855.069,16	26.855.069,16	13.144.930,84	-
TOTAL	40.000.000.000	36.710.577.735,16	36.346.287.413,16	3.181.160.358,68	472.552.228,16

La ejecución de recursos con respecto al valor girado menos los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional corresponden a un 98.71%.

A continuación, se presenta el informe de ejecución para el mes de mayo de 2021 de acuerdo con los componentes del POA aprobado 2021:

POA 2021

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

RUBRO - COMPONENTE	P/PUESTADO	EJECUTADO	SALDO
APERTURA DEL REGISTRO VERIFICACION PERFILES	754.825.500,00	36.345.600,00	791.171.100,00
PREINVERSION	6.174.740.000,00	0,00	6.174.740.000,00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	1.370.466.667,00	7.412.632.818,00
INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	0,00	88.400.000.000,00
ESTRATEGIAS	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
CONTRATACION EIP	4.400.000.000,00	1.082.192.658,00	3.317.807.342,00
EVALUACION	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00
AUDITORIA	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
SISTEMA DE MONITOREO	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
COSTO FIDUCIARIO	483.396.329,40	3.283.946,00	480.112.383,40
COMISIONES EIP, INTERVENTORIAS, OTROS , TIQUETES	1.445.085.902,40	10.686.547,00	1.434.399.355,40
MATERIALES, COMUNICACIONES, TRANSPORTE	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
TOTAL	112.901.147.216,80	2.502.975.418,00	110.470.862.998,80

La ejecución del POA 2021 corresponde a apertura de registro verificación de perfiles, seguimiento y monitoreo, los contratos suscritos para el EIP, pago de comisiones y comisiones EIP interventoría tiquetes y otros, la ejecución de recursos de acuerdo con los recursos girados como tercer desembolso, primero de la vigencia 2021, corresponde a un 16.68% y con respecto al valor total de POA 2021 a un 2.21%. La baja ejecución se soporta en el hecho que se está en trámite de aprobación de todo lo relacionado con el incentivo modular.

Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA DEL ENCARGO

	ACUMULADO VIGENCIA 2020	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO VIGENCIA 2021
SALDO INICIAL		19.478.375.377,00	16.061.943.878,44	14.820.259.618,81	
INGRESOS	30.049.620.244,48	15.009.495.239,74	11.286.614,14	8.837.250,52	55.125.310.518,56
SALDO ANTERIOR					
APORTES VIGENCIA 2020	30.000.000.000,00				40.000.000.000,00
APORTES VIGENCIA 2021		15.000.000.000			15.000.000.000,00
TRASLADO DE CUENTA O ENTRE CUENTAS					
RENDIMIENTOS GENERADO	49.488.766,48	9.391.400,73	9.462.614,14	8.837.250,52	117.539.520,84

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

REINTEGRO GASTOS BANCARIOS MES ANTERIOR	131.478,00	65.739,00	-		935.897,71
REINTEGRO CONTRATISTAS MAYOR VALOR PAGADO		38.100,01	1.824.000,00		6.835.100,01
EGRESOS	1.053.712.587,05	18.425.926.738,28	1.252.970.873,77	1.751.689.760,26	42.047.903.409,49
INCENTIVO MODULAR 2020	0	14.635.109.984,00	868.814.000,00	-	32.865.953.618,00
RESTITUCION DE APORTES MADR - DTN		3.181.160.358,68		-	3.181.160.358,68
GASTOS BANCARIOS	378.966	493.095,58	133.540,04	149.265,12	2.097.639,49
PAGO DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y NACIONALES	11.579.000	24.905.280,00	25.651.000,00	19.192.000,00	251.006.603,00
GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0				
PAGO DE RENDIMIENTOS A LA DTN	30.689.119,05	19.732.516,02	9.391.400,73	9.462.614,14	108.702.270,32
PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2020	1.011.065.502	83.721.851,00	29.570.544,00	9.886.000,00	3.121.305.887,00
PAGOS DE CONTRATACION DERIVADA Y RUBROS 2021		396.799.363,00	319.356.922,00	1.642.546.198,00	2.358.702.483,00
PAGOS COMISION FIDUCIA		84.004.290,00	53.467,00	70.453.683,00	158.908.811,00
REINTEGRO A FIDUCIA GASTOS BANCOS NOV 2020 PAGADO BANCOLOMBIA				-	65.739,00
SALDO FINAL	28.995.907.657,43	16.061.943.878,46	14.820.259.618,81	13.077.407.109,07	13.077.407.109,07

Los rendimientos financieros causados en el mes de mayo corresponden a un valor de $5.328.022 estos se registran mes vencido.

Se recibieron en el mes de mayo por medio de correo electrónico, 158 informes de Fideicomisos con sus correspondientes códigos los cuales contiene: flujo de caja, saldo en cuenta, relación de obligaciones contractuales con su estado, ejecución POA, balance y extracto bancario, los cuales se encuentran en revisión.

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

GISELA TORRES ARENAS
Supervisora Financiera Contrato 20200530

ADRIANA IBARRA OYAGA
Supervisora Técnica Contrato 20200530

Lista de anexos

Anexo A: acta reunión 16 de junio de 2021 tema archivo
Anexo B: Acta comité de seguimiento No. 1
Anexo C: mapa de riesgos DCPyGI
Anexo D: correo electrónico mapa de riesgos

Lista ilustraciones

Ilustración 1: imagen proyectada por la fiduciaria de los tapabocas comprados en la mínima cuantía ... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 2: estudio previo mínima cuantía ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 3: tapabocas anexo técnico listado "materiales de oficina" ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 4: tapabocas anexo técnico listado "materiales POP" ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 5: material POP del "formato oferta ECONÓMICA" presentado por el contratista ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 6: material POP del archivo "cotizaciones" presentado por el contratista ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Lista de tablas

Tabla 1: desembolsos contrato 20200530 1
Tabla 2: descripción otro síes contrato 2
Tabla 3: Información supervisión del contrato 4
Tabla 4: Información equipo fiduagraria 4
Tabla 5: Informes de gestión de fiducia 5
Tabla 6: certificaciones de saldo fiducia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 7: Informes de pagos de fiducia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 8: informes del eip 6
Tabla 9: Gestiones mediante memorandos 8
Tabla 10: Gestiones mediante oficios 9
Tabla 11: reuniones de gestión y seguimiento 9
Tabla 12: obligaciones fiduciaria secop ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 13: contratos con fecha de suscripción y estado ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 14: contratos del 2020 realizados por mes ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 15: estado contratos 2020 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 16: contratos 2020 por componente ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 17: contratos publicados en secop y tienda virtual ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 18: contratos no publicados en secop ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 19: contratos sin información de fechas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 20: contratos con estado terminad sin fechas de inicio y terminación en reporte de fiducia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 21: COMPARACIÓN fechas de inicio contratos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 22: contratos con FECHA de inicio mayor en reporte fiducia que en secop ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 23: contratos con FECHA de inicio menor en reporte fiducia que en secop ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 24: COMPARACIÓN fechas de terminación contratos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 25: contratos con fecha de terminación mayor en reporte fiducia que en secop ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 26: contratos con fecha de terminación menor en reporte fiducia que en secop ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**115/jun/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Tabla 27: Calculo días entre fecha de inicio y fecha de publicación en secop.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 28: top 10 No. de DÍAS con mayor cantidad de contratos.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 29: fechas de publicación de los contratos en secop .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 30: cantidad de contratos publicados por mes .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 31: DURACIÓN contratos según clausula.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 32: diferencia de los DÍAS descritos en la minuta y calculo según fecha fiducia .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 33: diferencia de los DÍAS descritos en la minuta y calculo según fecha fiducia (incluye fecha de terminación) .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 34: contratos de la vigencia 2020 terminado en 2021 con cláusula de DURACIÓN de 2 meses .. **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 35: contratos con cláusula de terminación 31dic2020.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 36: contratos con cláusula de terminación inicial 31dic2020 que terminaron en 2021.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 37: COMPARACIÓN valores contratos fiducia vs secop.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 38: contratos con valor en fiducia mayor que en secop .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 39: contratos con valor en fiducia menor que en secop .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 40: INFORMACIÓN contratos mínima cuantía y órdenes de compra .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 41: cotización encontrada en secop mínima CUANTÍAS con RELACIÓN a los MATERIALES POP ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 42: elementos similares cotización mínima cuantía con orden de compra 67782 ...**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 43: documentos enviado por eip.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 44: INFORMACIÓN códigos de las naciones unidas .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 45: INFORMACIÓN especificaciones TÉCNICAS.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 46: contratos 2021 .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 47: contratos 2021 por mes.....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 48: estado contratos .....**¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 49: instrucciones contratación derivada recibidas por la fiduciaria.....17
Tabla 50: tipos de riesgos contrato.....18
Tabla 51: resumen mapa de riesgos 19

Anexo D: correo electrónico mapa de riesgos



RV: Mapa de riesgos 2021 Proceso CPI

Claudia Milena Fuquen Giraldo

Responder | Responder a todos | Reenviar

Buenas Tardes para todas y todos

Adjunto nos permitimos remitir el Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos para su publicación y divulgación.

Cordialmente,

Claudia Fuquen

De: Ian Carlos Yance Hernandez
Enviado: miércoles, 16 de junio de 2021 11:48
Para: Claudia Milena Fuquen Giraldo; Sergio Enrique Ramirez Payares
Cc: Katherine Garcia Fajardo; David Camilo Fonseca Fuentes
Asunto: RE: Mapa de riesgos 2021 Proceso CPI

Buenas, se adjuntan documentos firmados por el director, para fines pertinentes.
Saludos.
