CONSORCIO TIG

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.2

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CO1.PCCNTR.4155718

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).

PERIODO: DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE MARZO DE 2023



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.2

PERIODO: DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE MARZO DE 2023

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08).”

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.4155718

"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. C01.PCCNTR.2749287


CONSORCIO TIG

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077645

CONSORCIO MIA GP

BOGOTA D.C

VERSIÓN	CONTROL DE CAMBIOS
1	Documento Inicial

PRESENTÓ	APROBÓ
	
ING. BETTY BENAVIDES RESIDENTE DE OBRA	ING. PAMELA BELTRÁN DIRECTOR DE OBRA

CODIGO	FECHA
TIG-FO-001	19-03-2023

1. Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 7
1.1.1. Localización y ubicación de territorios 7
1.1.2. Asignación de sedes 8
2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO 9
2.1. Ubicación sedes primera etapa 9
3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL 10
3.1. Información del contrato de interventoría 10
3.2. Información del contrato de obra 11
3.3 Relación de Correspondencia 12
3.4 Actividades de reunión 12
3.5 Informes Semanales 12
4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO 13
4.1 Avance físico 13
4.2 Estado de ejecución de los frentes 13
4.3 Control de hitos 14
4.4 Avance financiero 14
5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL 16
5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra 16
5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de obra 16
5. CONCLUSIONES 17
2. ANEXOS 18
ANEXO 1. INFORME BÁSICO 18
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO 18
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista 18
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia 18
Anexo 1.1.3. Actas de reunión 18
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría 18
ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO 18
ANEXO 1.3. INFORME SST 18

ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL 18

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de las metas definidas en el plan de desarrollo **"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C"**, programa línea estratégica: 4 -inclusión educativa para la equidad, proyecto estratégico: ambientes de aprendizaje para la Vida, se incluyó oportunamente la intervención de obras menores y adecuaciones del cien por ciento de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos, buscando conservar y mejorar los espacios de los colegios ofreciendo espacios dignos de convivencia y que ofrezca las mejores condiciones para una verdadera educación de calidad, para las cuales también se hace necesario contratar el seguimiento, vigilancia y control de las actividades de obra por parte, de un tercero con las calidades técnicas, jurídicas y financieras del caso.

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervención de obra pública mediante actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la ejecución de obras menores, se hace necesario contratar una interventoría especializada dada la diversidad de actividades, frentes de trabajo y áreas técnicas involucradas en el desarrollo del mismo, situación para las que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el respectivo seguimiento al proyecto en mención.

Para el grupo No. 8 se asignan 17 sedes a intervenir en mejoramientos que se encuentran en la localidad de Rafael Uribe Uribe, de los cuales, se tiene un diagnóstico inicial por parte de la secretaría de educación y a medida que se realicen las visitas con los contratistas de obra e interventoría, se va a hacer la priorización respectiva de las actividades para cada sede. En vista que durante el periodo se suscribió una adición de recursos para el contrato de obra, el alcance se amplió con 8 sedes más, es decir, completando así 25 unidades.

El presente informe mensual No.2, comprende la recopilación de la información correspondiente al desarrollo del contrato de obra CO1.PCCNTR.4077645 durante el periodo del 20 de febrero de 2023 al 19 de marzo de 2023.

1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente contrato de interventoría No. C01.PCCNTR.2749287 tiene por objeto: ***"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 08)."***

Para el reconocimiento total del proyecto, se ha realizado en conjunto de todas las partes interesadas (SED, contratista, interventoría y personal administrativo de las sedes escolares), una serie de recorridos para identificación de necesidades prioritarias en atenciones integrales de adecuaciones y mejoramientos en: cubiertas, batería de baños, carpintería metálica, acabados generales, canchas deportivas y zonas exteriores.

1.1.1. Localización y ubicación de territorios

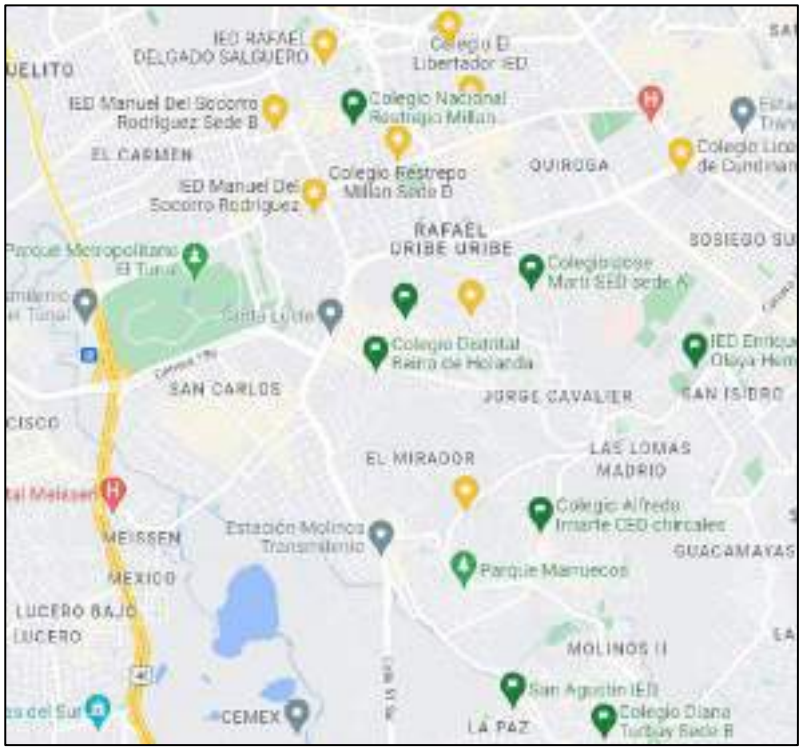


Imagen 1. Localización de las 17 sedes del grupo 8.

Las 17 sedes del grupo 8 se encuentran ubicadas dentro de la localidad de Rafael Uribe Uribe; esto, conforme al alcance inicial del contrato de obra, así como las 8 adicionales asignadas a través de la suscripción del otrosí No.1.

1.1.2. Asignación de sedes

Adjudicación de contrato de interventoría No C01.PCCNTR.2749287 y adjudicación de contrato de obra No. No. CO1.PCCNTR.4077645 de territorio oriente ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, del Grupo No 8. Se hará intervención a 17 sedes que serán abarcadas inicialmente por etapas, según la programación de obra.

Grupo	Sedes	Localidad
8	17	Rafael Uribe Uribe

Por otra parte y con base en la adición No.1 de recursos realizada al contrato de obra, se incluyeron 8 sedes adicionales, así:

Grupo	Sedes adicionales	Localidad
8	8	Rafael Uribe Uribe

2. DESCRIPCION PRIMERA ETAPA, VISITA DIAGNÓSTICO

En esta etapa preliminar se realizó la visita de los primeros ocho (8) colegios asignados para la misma se encuentran a continuación:

2.1. Ubicación sedes primera etapa

Colegio	Sede	Dirección
Colegio Alexander Fleming	B – Antonio Ricaurte	Diagonal 45 Bis sur No. 13F-03
Colegio Alfredo Iriarte	A – Chircales	Transversal 5J No.48F-69 sur
Colegio Diana Turbay	B – Diana Turbay II	Calle 28 sur No. 48-51
Colegio Enrique Olaya Herrera	A – Enrique Olaya Herrera	Carrera 10 No.31-29 sur
Colegio José Martí	A – Luis López de Mesa	Diagonal 32ª sur No.14A-97
Colegio Reino de Holanda	A – Reino de Holanda	Transversal 16D No.46-35 sur
Colegio Restrepo Millán	B – Isabel II de Inglaterra	Calle 40 sur 23-25
Colegio San Agustín	A – San Agustín	Calle 50A sur No.5C-40

El resto de sedes se programarán a medida que se vayan realizando las visitas y se vayan definiendo los presupuestos y con ello los alcances. Adicional a ello, se deberá contemplar las 8 sedes adicionales que fueron incluidas dentro del proyecto, con ocasión al otrosí No.1.

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA LEGAL

Territorio oriente: Grupo No. 8

Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 – Consorcio TIG

El presupuesto para la presente contratación de interventoría asciende a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($878.587.938) incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 371.557.799).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.250.145.727).

Territorio oriente: Grupo No 8

Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 - CONSORCIO MIA GP

En contrato de obra se asigna una suma de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($11.941.262.150) incluido A.I.U. y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

Adicional a lo anterior, se suscribió una modificación No.1 al contrato, con lo cual se incluyó dentro del alcance 8 sedes, arrojando como valor complementario a la inicial, la suma de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.050.000.000).

Con esto, el valor total de interventoría asciende a DIECISÉISMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($16.991.262.150).

3.1. Información del contrato de interventoría

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	No. CO1.PCCNTR.4155718

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO TIG
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE ENERO DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	DOCE (12) MESES
VALOR INICIAL:	$ 878.587.938
VALOR ADICIONES:	$ 371.557.799
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 1.250.145.727
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	N/A

3.2. Información del contrato de obra

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077645
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas*):	ONCE (11) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	19 DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150
VALOR ADICIONES:	$ 5.050.000.000
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	$ 16.991.262.150

CONTRATO DE:	OBRA
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones*):	N/A

3.3 Relación de Correspondencia

Para el Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 se presenta en el Anexo 1.1.2. El listado relacionando la correspondencia entre contratista e interventoría.

3.4 Actividades de reunión

A la fecha se han ejecutado actas de reunión como soporte del control realizado por esta interventoría para lo cual se adjuntan copia de estos documentos en el Anexo 1.1.3

ACTAS DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO		
FECHA	**#ACTA**	**DESCRIPCIÓN**
07/03/2023		Acta de reunión
10/03/2023		Acta de reunión
10/03/2023		Acta de reunión
23/03/2023		Acta de reunión
21/03/2023		Acta de reunión
27/03/2023		Acta de reunión

3.5 Informes Semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el momento de corte del presente informe mensual, los cuales se adjuntan en el anexo 1.1.5.

Is No.	Fecha de inicio	Fecha de corte
6	20/02/2023	26/02/2023
7	27/02/2023	05/03/2023
8	06/03/2022	12/03/2023
9	13/03/2023	19/03/2023

4. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

4.1 Avance físico

Durante el presente periodo se presenta un avance físico programado de 0,57% y ejecutado de 1,70% del valor de la Fase I, dando con ello una variación positiva de 1,13%.

4.2 Estado de ejecución de los frentes

Los frentes en los que se ejecutaron actividades durante el presente periodo mensual, se relacionan a continuación, así como su respectivo estado a la fecha de corte:

Colegio José Martí: Se continúa con el desmonte de la cubierta existente, adecuación de la estructura metálica e instalación de la nueva teja. La última semana del periodo se suspendieron actividades, a causa de las constantes lluvias en la zona.

Colegio Restrepo Millán sede C: Toma de muestras de suelo para la atención de emergencias.

Colegio San Agustín sede A: Se continúa con la instalación de estructura metálica y cubierta a un ritmo lento. La última semana del periodo se suspendieron actividades, a causa de las constantes lluvias en la zona.

Colegio Diana Turbay: Se continúa con la demolición de alistado de pisos, mampostería, retiro de luminarias, ventanas y aparatos sanitarios. El desarrollo de las actividades tuvo una demora, en vista que se requería una definición por parte de la SED que representó alrededor de 3 semanas. En la semana 8 se llevó a cabo reunión en el sitio para entrega del concepto estructural y se acuerda realizar visita con el Arq Alejandro Herrera con el fin de aprobar las modificaciones correspondientes a las observaciones del especialista estructural.

Colegio Enrique Olaya Herrera: Se continúa con las demoliciones de pisos y retiro de ventanas. Se procede con la instalación de las ventanas, instalación de cubierta y avance en redes eléctricas. La última semana del periodo se suspendieron actividades, a causa de las constantes lluvias en la zona.

Colegio San Agustín: Se lleva a cabo la atención de la emergencia, con la ejecución de las actividades que pertinentes.

Colegio Reino de Holanda: Se inicia el desarrollo de actividades preliminares como cerramiento. Se procede con el retiro de cubierta, adecuación de la estructura metálica e instalación del nuevo tejado en los salones de 3 piso. La última semana del periodo se suspendieron actividades, a causa de las constantes lluvias en la zona.

Colegio Liceo Femenino: Se inician actividades en este frente cumpliendo el compromiso adquirido con la SED, con demoliciones de mesones y pisos.

4.3 Control de hitos


Con base en la programación presentada por parte del contratista de obra y verificando el estado de los frentes en obra, se cuenta con la siguiente información al respecto:

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	20/01/2023	20/01/2023	0
2	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	21/01/2023		no iniciado
3	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE A, LOS CHIRCALES	21/01/2023	3/03/2023	-41
4	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	21/01/2023	10/02/2023	-20
5	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	21/01/2023	21/02/2023	-31
6	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	21/01/2023	15/02/2023	-25
7	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLANDA	21/01/2023	21/02/2023	-31
8	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA	21/01/2023	15/02/2023	-25
9	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	21/01/2023	10/02/2023	-20
10	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR			no iniciado
11	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B,MANUEL MURILLO TORO			no iniciado
12	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO			no iniciado
13	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	27/02/2023	27/02/2023	0
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ			No iniciado
15	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B, REPUBLICA DE ISRAEL			No iniciado
16	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ			No iniciado
17	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRAL			No iniciado
18	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO			No iniciado
30	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			No iniciado

4.4 Avance financiero

Durante el presente periodo se presenta un avance financiero programado de $ 772.769.136 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE) y ejecutado de $ 1.481.910.632,00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE).

Periodo	Acumulado Mensual	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
MES 1	$ 772.769.136	$ 1.481.910.632,00

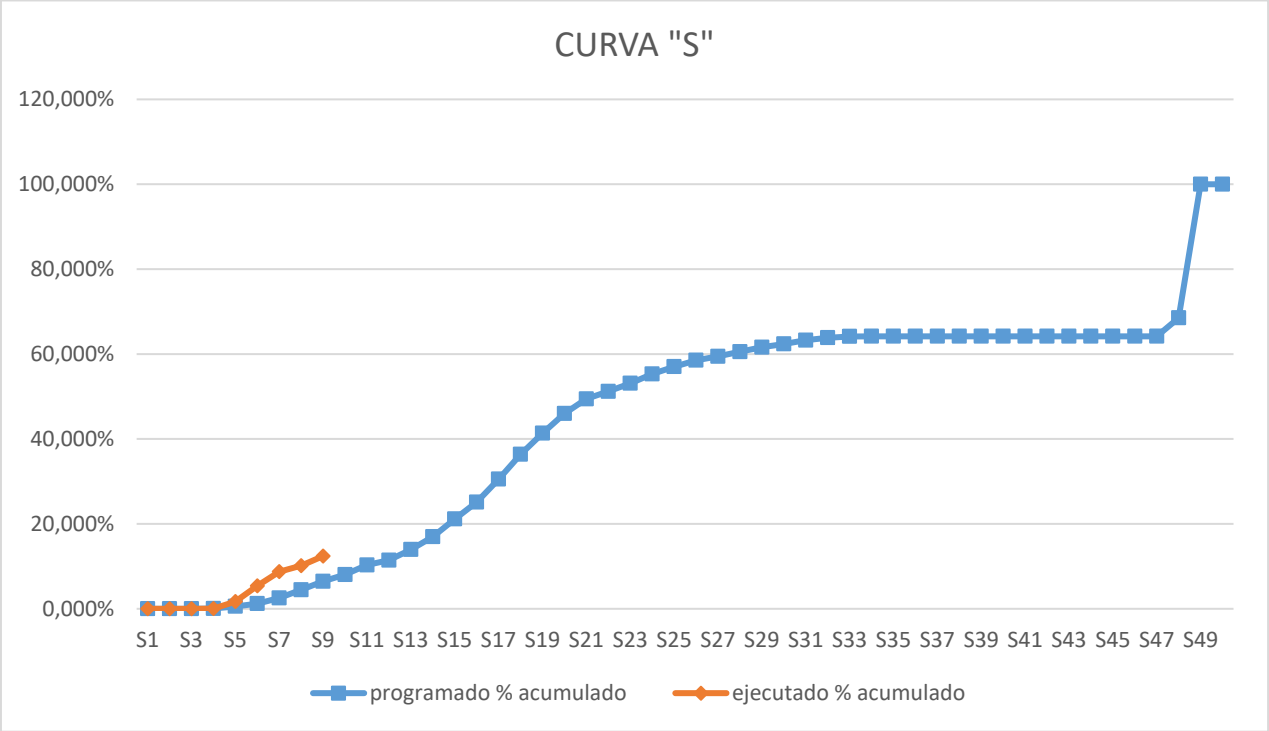
CURVA "S"
120,000%
100,000%
80,000%
60,000%
40,000%
20,000%
0,000%
S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 S19 S21 S23 S25 S27 S29 S31 S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49
programado % acumulado
ejecutado % acumulado

5. INFORMACIÓN LEGAL Y PRESUPUESTAL

5.1 Contrato de obra – Control actas parciales de obra

En cuanto comportamiento financiero en el periodo correspondiente al presente informe no se han efectuado actas de cobro parcial. El procedimiento de control de pagos parciales del contrato de obra se refleja mediante acta de recibo parcial y balance presupuestal:

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES					
Acta No	Fecha	Valor Total	Amortización anticipo	Valor pagado	% pagado
No.1	19/02/2023	$ 203.058.871	$ 0.00	$ 203.058.871	1,70%

5.2 Contrato de interventoría – Control actas parciales de obra

Durante la fecha de ejecución del presente informe no se realizaron desembolsos a la interventoría.

CONTROL DE PAGOS DE ACTAS PARCIALES				
Acta No	Fecha	Valor Total	% pagado	Concepto
No.1	19/02/2023	14.189.195	1,61%	Avance contrato de obra

5. CONCLUSIONES

- Se ha venido llevando a cabo en campo la toma de medidas para organización de los presupuestos, lo cual permita realizar una delimitación adecuada de los alcances, conforme a los montos agotables que están asignados de manera estimativa para cada frente y bajo las indicaciones de la SED.

- El contratista de obra continúa sin venir correspondiendo de manera diligente con la gestión administrativa que le corresponde, ya que presenta demoras en la entrega de fichas, presupuestos y cronogramas.

- Han venido surgiendo unas actividades no previstas, de las cuales se han venido proponiendo los APU’s no previstos con sus debidos soportes.

- Se analiza la posibilidad de realizar una adición de recursos al contrato de obra y de interventoría, con el fin de incluir unas sedes adicionales para el alcance.

- Con la adición de recursos otorgados a los contratos de obra y de interventoría, se debe proceder con la visita de las 8 nuevas sedes, con el fin de aterrizar el presupuesto correspondiente.

2. ANEXOS

ANEXO 1. INFORME BÁSICO
ANEXO 1.1. INFORME ADMINISTRATIVO
Anexo 1.1.1. Control de personal contratista
Anexo 1.1.2. Relación de correspondencia
Anexo 1.1.3. Actas de reunión
Anexo 1.1.4. Control de personal de interventoría
Anexo 1.1.5. Informes semanales
Anexo 1.1.6. Pólizas Contrato de obra
Anexo 1.1.7. Pólizas Contrato de interventoría

ANEXO 1.2. INFORME TÉCNICO
Anexo 1.2.1. Soportes control de calidad
Anexo 1.2.2 Bitácora de obra
Anexo 1.2.3 Registro fotográfico

ANEXO 1.3. INFORME SST

ANEXO 1.4. INFORME AMBIENTAL

ANEXO 1. INFORME BASICO

ANEXO 1.1 INFORME ADMINISTRATIVO

Anexo 1.1.1. Control de personal de contratista

CONSORCIO TIG

CONTROL DE PERSONAL

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación

TIPO DE CONTRATO	OBRA				
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645				
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"				
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP				
INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG				
INFORME MENSUAL	**2**	**Periodo**	20/02/2023	**al**	19/03/2023

FECHA | 20 | 3 | 2023

DÍA DOMINGOS Y FESTIVOS	
PERSONAL QUE ASISTE	**X**
PERSONAL QUE NO ASISTE	**N**
PERSONAL RETIRADO	**R**
PERSONAL INGRESADO	**IN**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESDE		**20 febrero, 2023**									**HASTA**												**mar-23**									
DIA		**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**			
PERFIL		**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**			
Director de obra		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Residentes de obra		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Asesor Estructural		X	X	X	X	X																										
Asesor Ambiental					X	X						X	X						X	X						X	X					
Técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo		X			X	X	X					X	X	X					X	X	X					X	X					
Asesor en Redes Eléctricas																																
Asesor Hidrosanitario																																
Profesional de costos				X	X						X	X	X					X	X	X				X	X							
Inspectores de obra		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					
Maestro de obra		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X					

FIRMA: PAMELA BELTRÁN

NOMBRE: PAMELA BELTRÁN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 1.1.2. Relación Correspondencia

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
17/02/2023	TIG-MEM-048	REITERACIÓN DE PRECIO SUGERIDO E INCONSISTENCIAS EN JUSTIFICACIÓN ITEM NP001	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
20/02/2023	TIG-MEM-049	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
20/02/2023	TIG-MEM-050	SOLICITUD PRESENTACIÓN INFORMES MENSUALES COMPONENTES SST Y AMBIENTAL	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
20/02/2023	TIG-MEM-051	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
20/02/2023	TIG-MEM-052	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
21/02/2023	TIG-MEM-053	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
24/02/2023	TIG-MEM-054	RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_053 PISO VINILICO	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
24/02/2023	TIG-MEM-055	CONSOLIDADO DE ACTAS DE REUNIÓN A LA FECHA	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
27/02/2023	TIG-MEM-056	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
28/02/2023	TIG-MEM-057	APROBACIÓN HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
28/02/2023	TIG-MEM-058	APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
28/02/2023	TIG-MEM-059	APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
28/02/2023	TIG-MEM-060	RESPUESTA A CORREO: Llamado de atención Interventoria por NO radicación de Actas	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
1/03/2023	TIG-MEM-061	ENTREGA CORRECCIONES A MEMORIAS DEL ACTA PARCIAL No.1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
1/03/2023	TIG-MEM-062	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
1/03/2023	TIG-MEM-063	OBSERVACIONES FICHAS TÉCNICAS POR SEDE	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
1/03/2023	TIG-MEM-064	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
2/03/2023	TIG-MEM-065	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.1 SST	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
2/03/2023	TIG-MEM-066	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
2/03/2023	TIG-MEM-067	REVISION SUBSANACION CONCEPTO TECNICO ESTRUCTURAL CERCHAS DE CUBIERTA DE AULAS COLEGIO JOSE MARTI SEDE A. RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_032	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
3/03/2023	TIG-MEM-068	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
3/03/2023	TIG-MEM-069	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL Oficio 2023_RUU_MGP_071 No. 1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
3/03/2023	TIG-MEM-070	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
3/03/2023	TIG-MEM-071	PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B.	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
3/03/2023	TIG-MEM-072	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

CONSORCIO TIG

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
6/03/2023	TIG-MEM-073	ENTREGABLES PENDIENTES	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
7/03/2023	TIG-MEM-074	RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_072	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
7/03/2023	N/a	respuesta al oficio 2023_RUU_MGP_073	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
8/03/2023	TIG-MEM-075	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
8/03/2023	TIG-MEM-076	RESPUESTA INFORME ESTRUCTURAL COLEGIO DISTRITAL DINAA TUBAY SEDE B CONTESTACION OFICIO 2023_RUU_MGP_048	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
8/03/2023	TIG-MEM-077	RESPUESTA CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL CERCHAS DE CUBIERTA COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A - CONTESTACION OFICIO 2023_RUU_MGP_050	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
9/03/2023	TIG-MEM-078	PROPUESTA BAÑOS SAN AGUSTIN SEDE A	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
9/03/2023	TIG-MEM-079	SEGUNDA OBSERVACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
9/03/2023	TIG-MEM-080	APROBACIÓN INFORME MENSUAL SST No. 1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
9/03/2023	TIG-MEM-081	RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_PMG_074	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
9/03/2023	TIG-MEM-082	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No.1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
10/03/2023	TIG-MEM-083	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
10/03/2023	TIG-MEM-084	SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
10/03/2023	TIG-MEM-085	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
13/03/2023	TIG-MEM-086	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
13/03/2023	TIG-MEM-087	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
13/03/2023	TIG-MEM-088	TIG-MEM-088-RESPUESTA A COMUNICADO 2023_RUU_MGP_082_EMERGENCIA CAFAM SANTA LUCÍA	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
13/03/2023	TIG-MEM-089	PENDIENTES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
15/03/2023	TIG-MEM-090	APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	CONSORCIO MIA GP MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
16/03/2023	TIG-MEM-091	AVAL SOLICITUD DE ADICIÒN PRESUPUESTAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077645	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora de interventoría	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente

Nombre:

PAMELA BELTRÁN

PAMELA BELTRÁN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Código	Vigencia
FMI022-1	12/1/2021

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-048

Bogotá, D.C, febrero 17 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_047 REITERACIÓN DE PRECIO SUGERIDO E INCONSISTENCIAS EN JUSTIFICACIÓN ITEM NP001.

Respetados señores:

De acuerdo al comunicado 2023_RUU_MGP_047 esta interventoría reitera por medio del presente oficio la cantidad sugerida en cuanto al rendimiento del ítem NP 001, el cual se recomienda que se establezca de 0.30 para un valor de la mano de obra de $62.754, dando un costo necesario para la ejecución de la actividad de $ 256.618,5.

De igual manera se emite una alerta de inconsistencia en las justificaciones presentadas acorde a la ficha técnica “Teja sin traslapo para fachada acceso Grado 40” pagina 08. En la cual la ficha técnica menciona la geometría recomendada para cielo raso y en fachadas para longitudes no mayores a 3.00 m, y en la justificación el pantallazo presenta otro texto.

CONSORCIO TIG

Se solicita ser congruentes con la trazabilidad de la información emitida con anterioridad, ya que se está generando reprocesos e incumplimientos con los tiempos establecidos en el pliego de condiciones en mención al literal G.23 APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO.

Sin otro particular quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Pamela Beltrán. Directora de interventoría
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-049

Bogotá, D.C, febrero 20 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes el día 17 de febrero de 2023. Se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Yeison Manuel Romero Florentino	1.068.136.877	Ayudante de obra	José Martí
2	María Ángela Tarazona Sáenz	60.448.725	Inspectora SISO	José Martí

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **60.448.725**

TARAZONA SAENZ
APELLIDOS

MARIA ANGELA
NOMBRES

Angela Tarazona S.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1984**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-OCT-2003 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2500100-00941858-F-0060448725-20171003 **0057**707524A 2 9910110369

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 9392

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 17/02/2023 HORA:10:26	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**
NOMBRES: MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ	DOCUMENTO: 60448725 EDAD: 38 GENERO: F
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: INSPECTORA SISO Tel: 3102024764 -

009392

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	Si
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

Angela Tarazona



LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 60448725**	**9331**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **60.448.725**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	207	17/02/2023	CC 60448725	TARAZONA SAENZ MARIA	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

EBC4D45B04D28773DE021FFFD1B5A4CD Certificado impreso el día 2/16/2023 10:36:19 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

MARIA ANGELA
TARAZONA SAENZ
60448725

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Bogotá DC. 16 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 16 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 60448725
Nombres y Apellidos	MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	16/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	16/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al(la) señor(a) MARIA ANGELA TARAZONA SAENZ identificado con CC 60448725 con fecha de ingreso 09 de febrero de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 16 días del mes de febrero de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1998**

SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

09-MAR-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VA

INDICE DERECHO

P-1500150-00895221-M-1068136877-20170408 0054863911A 1 48137944

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.068.136.877**
ROMERO FLORENTINO
APELLIDOS

YEISON MANUEL
NOMBRES

Yeison Romero.
FIRMA

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 9383

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 17/02/2023 HORA:8:33		**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: YEISON MANUEL ROMERO FLORENTINO		DOCUMENTO: 1068136877	EDAD: 24 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI		Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCION	Tel: 3193321242 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

Yeison Romero



LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 1068136877**	**6898**

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 15/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	206	16/02/2023	CC 1068136877	ROMERO FLORENTINO YEISON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

2A6BEAB8862EF6694C93666E0551C7A5 Certificado impreso el día 2/15/2023 4:49:22 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

YEISON MANUEL
ROMERO FLORENTINO
1068136877
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Bogotá DC. 15 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 15 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 1068136877
Nombres y Apellidos	YEISON MANUEL ROMERO FLORENTINO
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	15/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	15/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 15/02/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5397611	15/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1068136877	YEISON MANUEL ROMERO FLORENTINO	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-02-15

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-050

Bogotá, D.C, febrero 20 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD PRESENTACION INFORMES MENSUALES COMPONENTES SST Y AMBIENTAL

Respetados señores:

De acuerdo a los pliegos de condiciones, según cláusula 7.5.6.2.6, ítem “Informe Ambiental” – página 108; numeral e, ítem “Componente SST de la gestión contratista de obra” del documento ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, página 17, deberá entregar lo siguiente:

COMPONENTE AMBIENTAL

Informe mensual donde debe incluir:

- Resumen de actividades de gestión ambiental realizadas
- Resumen de actividades de obra realizadas ene l periodo
- Cuadro de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales
- Registro fotográfico de las actividades ambientales más relevantes de obra
- Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA con sus respectivos soportes.
- Verificación y seguimiento a protección de sumideros aledaños (si aplica)
- Seguimiento y gestión de permisos ambientales (si aplica)
- Formato diligenciado de los sistemas ahorradores de agua y energía instalados en el periodo

CONSORCIO TIG

COMPONENTE SST

- Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo
- Listado de maquinaria y equipos utilizados durante todo el periodo del contrato
- Listado de vehículos
- Reporte de las actividades y estadística de accidentalidad (Recordar que el reporte estadístico es mes calendario)
- Certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios (contratista y subcontratista)
- Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en cumplimiento del PSST.

La entrega de lo antes mencionado, deberá ser los veintiocho (28) días de cada mes, con sus respectivos soportes.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Elaboró: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
Revisó y aprobó: Pamela Beltrán – Directora de Interventoría
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-051

Bogotá, D.C, febrero 20 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes el día 20 de febrero de 2023. Se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Leonardo medina Patiño	1.023.000.436	Oficial obra	San Agustín-Restrepo Millán
2	Luis Fernando Coronado	80.369.941	Oficial obra	San Agustín-Restrepo Millán

CONSORCIO TIG

3	Marco Antonio Patiño Walteros	79.051.816	Oficial obra	San Agustín-Restrepo Millán

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.023.000.436
MEDINA PATIÑO
APELLIDOS
LEONARDO
NOMBRES
Leonardo Medina
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1994
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
10-DIC-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

P-1500150-00427739-M-1023000436-20130308 0032500094A 1 39736651

Escaneado con CamScanner

SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA SAS

NIt. 900157744 - 0
Dirección: Cll 27 SUR No 19 - 19
Tel: 4087000-4072406-6264247-3183832985-3115117029. NIT 900157744

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Control ○ | Periódico ○ Reubicación ○ | Retiro ○ Ingreso al SVE ○ | Post incapacidad ○ Trabajo en alturas ○ | Caso ocupacional ○



DATOS DEL PACIENTE

Fecha 28/03/2022 11:18:00 Empresa . PROCASA CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS 901531834-2

Nombre LEONARDO MEDINA PATIÑO

Cargo OFICIAL DE OBRA Doc. Identidad CC 1023000436

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

1 EXAMEN DE INGRESO OCUPACIONAL	2	3
4	5	6
7	8	9

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACIÓN
Apto para el cargo	⊗	○	○	○
Aplazado	○	○	○	○
Apto con restricciones	○	○	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○	○	○
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido	○	○	○	○
Apto para participar en la brigada	○	○	○	○
Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista	○	○	○	○

EXAMEN PERIÓDICO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones	○	○
Requiere restricciones de actividades	○	○
Requiere reubicación laboral temporal	○	○
Requiere reubicación laboral permanente	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○
Apto para trabajar en espacios confinados	○	○
Apto para trabajar en alturas	○	○

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Sospecha de enfermedad Profesional	○	○
Secuelas de Accidentes de Trabajo	○	○
Enfermedad Común	○	○

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

REMISIÓN	SI	NO	ARL	SI	NO	EPS	SI	NO
	○	⊗		○	⊗		○	⊗

Vladimir A. Vega R.
Especialista Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
Resolución 5614 / 2018

VLADIMIR ALBERTO VEGA RODRIGUEZ
Especialidad: MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
CC: 72344909 RM: 5614 DE 26/04/2018

Trabajador: LEONARDO MEDINA PATIÑO
CC 1023000436
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Escaneado con CamScanner

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 80.369.941

CORONADO MIRANDA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

Luis Fernando

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1969**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-1500150-01139052-M-0080369941-20200531 **0070**7079 90A 1 9912317225

IPS EN SALUD

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100136158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 8110

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 21/11/2022 HORA:10:11	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: LUIS FERNANDO CORONADO MIRANDA	DOCUMENTO: 80369941	EDAD: 53 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: OFICIAL DE CONSTRUCCION	Tel: 3208077642 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatologia	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	**SI**	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	Si
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	Si	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mi en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta. AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

Dra. Gloria L. Vega
Especialista Seguridad y Salud en el Trabajo
Medico Familiar y Ultrasonido
C. de Buenos Aires Arg. [illegible]
RM: 11362

Luis Fernando

LICENCIA No. 250425 Medico Especialista en Salud Ocupacional	Firma Trabajador C.C. No 80369941	6013

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 79.051.816

PATIÑO WALTEROS

APELLIDOS

MARCO ANTONIO

NOMBRES

Marco Antonio Patiño Walteros

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAY-1967**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.72
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-AGO-1986 ENGATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



I500150-01121656-M-0079051816-20191223 **0069440781A 1** **9911166963**

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 8448

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 21/12/2022 HORA:9:50	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: MARCO ANTONIO PATIÑO WALTEROS	DOCUMENTO: 79051816	EDAD: 55 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: GUARDA DE SEGURIDAD	Tel: 3106294659 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso y Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	**SI**	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	Si	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

Marco Antonio P. W.



LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 79051816**	**2808**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-052

Bogotá, D.C, febrero 21 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes el día 20 de febrero de 2023. Se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Johan Estiven Leyton Rozo	1.233.692.117	ayudante instalación de cubierta	San Agustín

Sin otro particular, atentamente.

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

HOJA DE VIDA



PRIMER APELLIDO :	ROZO
SEGUNDO APELLIDO :	LEYTON
NOMBRES :	JOHAN ESTIVEN
CEDULA DE CIUDADANIA :	1.233.692.117 DE BOGOTÁ
SEXO :	MASCULINO
LUGAR DE NACIMIENTO :	BOGOTÁ
FECHA DE NACIMIENTO :	SEPTIEMBRE 10 DE 1998
DIRECCION :	CALLE 24 No. 13 - 63
TELEFONO :	311 876 24 53
NACIONALIDAD :	COLOMBIANA
ESTADO CIVIL :	SOLTERO

INFORMACION ACADEMICA

TITULO :	BACHILLER
INSTITUCION :	INSTITUTO JHOAN KEPLER
CIUDAD :	BOGOTÁ

INFORMACION LABORAL

JEFE INMEDIATO :	FREDY ROZO
TIEMPO DE SERVICIO :	4 AÑOS
CARGO :	AYUDANTE DE INSTALACION
MOTIVO DEL RETIRO :	VOLUNTARIO

INFORMACION FAMILIAR

NOMBRE	PROFESION	PARENEZCO	DIRECCION Y TELEFONO
DUVAN ANDRES ROZO	INDEPENDIENTE	HERMANO	312 552 84 73

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	OCUPACION	DIRECCION / TELEFONO
SARAY GONZALEZ	INDEPENDIENTE	301 326 93 24

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.233.692.117
ROMO LEYTON

APELLIDOS
JOHAN ESTIVEN

FIRMA





FECHA DE EXPEDICIÓN 10-SEP-2020
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE EXPEDICIÓN

1.65 O- M
ESTATURA G.S. (RH) SEXO

10-OCT-2039 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO



SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S

NIT: 830.116.322-5
LIC.SST Res 14930 de 28-12-2018 de S.C.C.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA 15-feb.-2023 **HORA** 09:01:13
EMPRESA ESTRUKTEC SAS **NIT** 901.614.035-1
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Johan Estiven Rozo Leyton
Edad 24 años 5 meses 5 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1233692117
Cargo AYUDANTE DE CONSTRUCCION

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Aptitud Especifica:
☑ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO. SE RECOMIENDA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL DE ACUERDO A LA LABOR QUE DESEMPEÑE
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO. SE RECOMIENDA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL DE ACUERDO A LA LABOR QUE DESEMPEÑE

LABORATORIO: GLICEMIA NORMAL COLESTEROL NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1. / Uso de EPP acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5./ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 4272 de 2021. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.
No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 06 de mayo del 2020.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS
MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma
Nombre: JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
RM: SST3508-19-07-22 Lic.SO:

Trabajador

Firma
Nombre: Johan Estiven Rozo Leyton
CC N°: 1233692117

Huella

Calle 27 Sur No. 14-43 Teléfono: 300 294 85 55 PBX: 209 21 83 - 361 76 12 - 407 35 50
EMAIL: servisaludagenda@gmail.com, servisaluddelolaya@gmail.com

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: Autorizo a Servisalud ocupacional IPS., a realizar en mí, el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es) registrado(s) en este documento. **Servisalud ocupacional IPS.,** me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) opcional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, limitaciones, los riesgos y consecuencias del examen y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de pruebas.

Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizara(n) el (los) exámenes. Fui informado de las medidas que tomara SERVISALUD OCUPACIONAL IPS., para asegurar la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este (os) examen (es) están completas y son verídicas. Autorizo a SERVISALUD OCUPACIONAL IPS., para que suministre a las entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en la legislación vigente.

AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a SERVISALUD OCUPACIONAL IPS, la recolección, almacenamiento de datos y que sean usados, circulados y en general tratados, con la finalidad de desarrollar nuestro objeto social, el cual es el servicio de salud ocupacional, la realización de exámenes de laboratorio, igualmente para la identificación de las personas y para la suscripción de contratos.

Con el objetivo de verificar la autenticidad de la identidad de los usuarios y con la finalidad de garantizar la seguridad de la identidad, evitar suplantaciones, fraudes y para efectos de carácter probatorio, SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S, realizará la recolección de la firma digitalizada, fotografía digitalizada y la huella dactilar digitalizada, los cuales están clasificados como datos sensibles, que son almacenados en la historia clínica y por lo tanto no se almacenarán en bases de datos que serán tratadas por EL RESPONSABLE, garantizando así el derecho a la intimidad y confidencialidad.

Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Trabajador:

Firma: Julian Ros

Nombre: Julian Esteven Ros Lopez

CC No. 1233692117



Famisanar

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9009733186

9009733186

No. de Radicado: 25652552

Fecha de radicación: 14 02 2023

Diligencie los formularios que se encuentran dentro del formulario los campos de diligenciamiento obligatorio

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite de afiliación: B. Traslado de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliado: A. Cotizante - Cabeza de Familia [X]
3. Régimen: A. Contributivo [X]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X]
Código (asignado por la EPS):

II. AFILIADO - III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ROZO	LEYTON	JOHAN	ESTIVEN

7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número de identificación de identidad: 1233692117
9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]
10. Fecha de nacimiento: 10 09 1998

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia: 0
12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]
13. Pueblo Indígena: 0
14. Grupo de población especial: 00 LÍNEA DE RIESGO PROVEEDORES SURAMERICANA
15. Parentesco: 00 NO APLICA
16. Ingresos mensuales en salarios mínimos: 0
17. Ingresos mensuales en pesos: $1.160.000
18. Residencia: CALLE 24 13 63
Zona: Urbana [X] Rural [ ]
Teléfono: 3118762463
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente inclusive)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]
23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino / Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
01						
02						
03						
04						
05						

	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono de un familiar	33. Tipo de la UPC del afiliado adicional (si aplica) ver (*1*)
01							
02							
03							
04							
05							

Relación de la EPS Anterior

	34. Nombre de la EPS	Código de la EPS (asignado por la SNS)
1	CAFAM CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
2		
3		
4		
5		

VI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Razón social o nombre	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de documento de identificación	38. Tipo de cotizante (asignado por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NIT	901614035	

39. Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 1 73B 32	3883253	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

VII. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Actualización de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización de documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reincorporación en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o actividad económica para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o cambio de empleador para cotizar [ ] 11. Traslado a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Disminución de una unidad económica para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Ubicación de una unidad económica para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Traslado a Mayor Régimen [ ] 15. Traslado a Menor Régimen [ ] 16. Cambio Régimen [ ] 17. Reporte de fallecimiento [ ] 18. Reporte de inicio de protección al cesante [ ] 19. Reporte de la pérdida de la calidad de cesante [ ] 20. Reporte de la pérdida de Pensionado [ ]

VIII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha de novedad
				14 02 2023

43. EPS anterior: NINGUNA
44. Motivo de traslado: Código
45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

IX. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de veracidad y autenticidad de los beneficiarios o afiliados adicionales	X
47. Declaración de no tener obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción	
48. Declaración de existencia de relaciones de hecho mayor a dos (2) años que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios	
49. Declaración de no cotización del cónyuge, compañero de hecho, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud	
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales	X
51. Autorización para que la EPS consulte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y otras entidades públicas que así lo requieran	X
52. Autorización para que la EPS consulte los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013	X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto	X

X. FIRMAS

54. Firma(s) cotizante o cabeza de familia autorizado	55. Firma(s) beneficiario o afiliado adicional o de otro responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

XI. ANEXOS

56. Anexo: copia del documento de identidad: Cantidad: Total:

57. Copia del certificado de nacimiento o de matrimonio o de unión marital de hecho	
58. Copia del registro civil de nacimiento o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital	
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare terminación de la unión marital	
60. Copia del certificado de estudios o acta de entrega del mismo	
61. Copia de la orden judicial o de acto administrativo de custodia	
62. Copia del documento en que conste la patente de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración juramentada ante la autoridad competente	
63. Copia de la autorización de trabajo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	
65. Copia de acta administrativa o de providencia de las autoridades competentes en la que conste la tenencia del beneficiario o se ordene la afiliación del mismo	

XII. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Departamento: Código del municipio	Código del departamento	67. Caso del SISBÉN: Número de la Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de realización	69. Fecha de validación

70. Nombre del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES
		CARGO: OPERADOR DE PLANTA AUXILIAR

71. Firma del funcionario

Recuerde que en el firma del formulario, el afiliado manifiesta y responde de la información registrada y de la documentación contenida en el registro. (Si diligenciado)

INTERNET

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9009733186

9009733186

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

ARL | sura

Medellín, 14 de febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUKTEC SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de novedad	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	0030000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1053682117	ROZO LEYTON JOHAN ESTIVEN	15/02/2023		0021201	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/02/2023 12:29:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.85.109.47, 152.230.104.1, 172.16.42.67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) señor(a) JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON identificado(a) con CC No. 1233692117, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, a través de ESTRUKTEC SAS con NIT 9016140351:

- Fecha de afiliación a la Caja: 14/02/2023.
- Fecha de ingreso a la empresa: 14/02/2023.

JOSÉ LEONARDO GONZÁLEZ VEGA
Jefe de Sección Afiliación y Postulación

Bogotá D.C. 14/02/2023

VIGILADO SuperSubsidio

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:

JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON

Identificado con Cédula de ciudadanía
N° 1233692117

Registrado por la empresa ESTRUKTEC SAS , con NIT 901614035-1, dicha afiliada a la ARL SURA , empresa representada por FRANNKYN ROOSEVELTH MENDEZ VARON

Cursó y aprobó la acción de formación en
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
Con una intensidad de 8 horas

Realizado del (16) del mes de febrero de 2023 al (16) del mes de febrero de 2023 en la ciudad de Bogotá.

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (16) del mes de febrero de 2023

Dayan Stephanie Sanchez Perez
C.C. 1.000.619.268
Entrenador TSA
Licencia SO N° 5103

Yeritza Zulen Romero Avila
C.C. 1030646887
Representante Legal
JRD CONSULTORES SAS

JRD-RD2054

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2019220000000041782 del 03 de Octubre de 2019 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad # 30-539-1 emitida por CELAC con aval de ONAC 18-CPR-002, licencia en salud ocupacional LIC. SST N° 5409 DE 31/05/2019 que autoriza a la empresa JRD CONSULTORES SASubicada en Bogotá D.C en Av. Boyacá 73 A - 90, con NIT 900975732-1. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021.

VERIFICACIÓN
3046191742-8050567
WWW.ALTURASJRD.COM

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.233.692.117**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-053

Bogotá, D.C, febrero 22 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes el día 20 de febrero de 2023. Se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jairo Antonio Sánchez Benavides	79.451.618	ayudante	José Marti sede A
2	Brayan Alexis Lopera Arévalo	1.033.766.735	Ayudante de obra	Reino de Holanda

CONSORCIO TIG

3	Héctor Mario Riveros Castañeda	1.023.932.376	Ayudante de obra	Reino de Holanda
4	Juan Carlos Campos Salas	1.094.979.136	Ayudante de obra	Reino de Holanda
5	Francisco Guerra Contreras	1.049.935.905	Ayudante	Diana Turbay
6	Osvaldo Sanchez Barreto	80.368.036	Ayudante	Olaya Herrera

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.935.905
GUERRA CONTRERAS
APELLIDOS
FRANCISCO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1998
MARIA LA BAJA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
25-AGO-2016 MARIA LA BAJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-0504000-01227097-M-1049935905-20210413 0074051574A 1 9915907642

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1049935905
Nombre:	FRANCISCO GUERRA CONTRERAS
Fecha Ingreso:	22/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/2/2023 10:11:58 AM

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GUERRA CONTRERAS FRANCISCO** identificado(a) con **CC** número **1.049.935.905** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 30 de junio de 2018 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 21 de febrero de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023022110261

Famisanar

9009759275
9009759275

25693796

20 02 2023

GUERRA CONTRERAS FRANCISCO

CC 1049935905 X 10 05 1998

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

$1.160.000

CASTAÑO CONSTRUCCION NT 901402105 MANIZALES CALDAS
CRA 23CB 67 56 3218565198

X X

20 02 2023

Francisco Guerra Contreras

Marcela Sofia Osorio

CARGO: AYUDANTE DE ALBAÑILERIA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

25-ABR-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-01094751-M-1023932376-20190823 **0067**504543A 1 1545590029

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.023.932.376**

RIVEROS CASTAÑEDA

APELLIDOS

MARIO HECTOR

NOMBRES

Mario H. Riveros C.

FIRMA



Powered by CamScanner

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti Salud y en la de tus Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-04**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**				
NOMBRE DEL PACIENTE:	**RIVEROS CASTAÑEDA MARIO HECTOR**						
IDENTIFICACION:	**1023932376**	**RH:**	**B+**	**EDAD:**	**29**	**GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1994-04-17**	**TELEFONO DE CONTACTO:**					

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O COSNTRUCCIONES**	**NIT:**	**9014021059**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	X	Triglicéridos	X	Colesterol	X	Otros:	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA						
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A		
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A		
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A		

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: RIVEROS CASTAÑEDA MARIO HECTOR**	
	DOCUMENTO: 1023932376	

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1023932376
Nombre:	HECTOR MARIO RIVEROS CASTAÑEDA
Fecha Ingreso:	17/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	16/2/2023 10:19:46 AM

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARIO HECTOR RIVEROS CASTAÑEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.932.376**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

N0 ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Empresa NIT. 901402105-9
Representante Legal
LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO

ARL AXA COLPATRIA
Empresa administradora de riesgos laborales

Hace constar que:

MARIO HECTOR RIVEROS CASTAÑEDA

Con Cedula de Ciudadanía No. **1023932376**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 Horas.

Realizado los días 15 al 17 de febrero del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 17 de Febrero de 2023

ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

WILLIAM ARLEY VEGA S.
Entrenador TSA- 20812286
Licencia en SO -5484

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

Powered by CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009808319	16|02|20|23

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RIVEROS (Primer apellido)	CASTAÑEDA (Segundo apellido)	MARIO (Primer nombre)	HECTOR (Segundo nombre)

7.Tipo documento de identidad	8.Número del documento de identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1023932376	Femenino ☐ Masculino ☒	17|04|1994

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo FNH Condicion TP		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1160038

18.Residencia			
CR 4C 55 A SUR 69 Dirección	Telefono fijo	3102832682 Telefono celular	MARIOHECTOR@GMAIL.COM Correo electronico
BOGOTA Municipio/Distrito	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
31				
32				
33				
34				
35				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
31					
32					
33					
34					
35					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
31							
32							
33							
34							
35							

32. Datos de residencia					
	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
31						
32						
33						
34						
35						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS SANTA LUCIA - UODCPO SANTA LUCIA	VSLUCIA - UODCPOSLUC
S	-	-
S	-	-
S	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de Identificación	37. Numero de documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 Dirección	3214134351 Telefono	LMCASTANOC@GMAIL.COM Correo electrónico	MANIZALES Municipio/distrito	CALDAS Departamento

No de Radicacion
4009808319

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		17/02/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo prevista en la ley 1581 de 2012 y el Decr etc 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Mario Hector Rivero Castañeda	Marcela Serna Ospina
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		
☐	☐	☐	☐	☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor JAIRO ANTONIO SANCHEZ BENAVIDES identificado con CC 79451618 con fecha de ingreso 20 de febrero de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 20 días del mes de febrero de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAIRO ANTONIO SANCHEZ BENAVIDES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.451.618**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 20/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	213	21/02/2023	CC 79451618	SANCHEZ BENAVIDES JAIRO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

ADC9B8FF32BA43F36178D8019CEB44F4

Certificado impreso el día 2/20/2023 2:10:22 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

JAIRO ANTONIO
SANCHEZ BENAVIDES
79451618

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VASQUEZ
13240346

Bogotá DC. 20 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 20 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 79451618
Nombres y Apellidos	JAIRO ANTONIO SANCHEZ BENAVIDES
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	20/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	20/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en tu Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-16**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:	**CAMPOS SALAS JUAN CARLOS**		
IDENTIFICACION:	**1094979136**	**RH:** **O+** **EDAD:** **39** **GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1984-08-06**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O CONSTRUCCIONES**	**NIT:**	**9014021059**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**AYUDANTE**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Trigliceridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: CAMPOS SALAS JUAN CARLOS**	
	DOCUMENTO: 1094979136	

N0 ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Empresa NIT. 901402105-9
Representante Legal
LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO

ARL AXA COLPATRIA
Empresa administradora de riesgos laborales

Hace constar que:

JUAN CARLOS CAMPOS SALAS

Con Cedula de Ciudadanía No. **1094979136**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 Horas.

Realizado los días 15 al 17 de febrero del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 17 de Febrero de 2023

ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

WILLIAM ARLEY VEGA S.
Entrenador TSA- 20812286
Licencia en SO -5484

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

Powered by CamScanner

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CAMPOS SALAS JUAN CARLOS** identificado(a) con **CC** número **1.094.979.136** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 31 de mayo de 2018 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de febrero de 2023.

Cordialmente,



Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202302160819

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 16/02/2023, el empleador CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS identificado con NIT número 901402105 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5430344	16/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1094979136	JUANCARLOS CAMPOS SALAS	1160000	AYUDANTE DE OBRA	2023-02-16

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT

Número de documento: 901402105

Número Afiliación: 9001382

Razón social: CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA

Número de Documento 1094979136

Nombre: JUAN CARLOS CAMPOS SALAS

Fecha Ingreso: 16/02/2023

Salario básico: 1,160,000

Nit empresa en misión: 0

Código Sucursal: SUCURSAL 1

Centro de trabajo: CTRAB 005

Tasa: 6.960

Fecha hora transacción: 15/02/2023 03:13:26 p.m.

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	80368036
Nombre:	OSVALDO SANCHEZ BARRETO
Fecha Ingreso:	22/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/2/2023 10:18:49 AM

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

OSVALDO SANCHEZ BARRETO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.368.036**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 21 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009834829	2|1|0|2|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite: A. Afiliacion ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion: A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen: A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS): 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
SANCHEZ (Primer apellido)	BARRETO (Segundo apellido)	OSVALDO (Primer nombre)	(Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	80366036	Femenino ☐ Masculino ☒	2[illegible]

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo [illegible]	Condicion TP		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia			
CL 74 SUR 16 24 (Dirección)	Telefono fijo	3118707856 (Telefono celular)	OSVALDOSANCHEZ@GMAIL.COM (Correo electronico)
BOGOTA (Municipio/Distrito)	zona: Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
		Tipo			Condición	
		F	N	M	T	P
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS SANTA LUCIA - UOD CPO SANTA LUCIA	VSLUCIA - UODCPOSLUC
D	-	-
E	-	-
D	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 (Dirección)	3115146648 (Teléfono)	LMCASTANOC@GMAIL.COM (Correo electrónico)	MANIZALES (Municipio/distrito)	CALDAS (Departamento)

No de Radicacion
4009834829

8. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [X] 14. Traslado: [X] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	42. Fecha D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
EPS003	1	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. [ ] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.

48. [ ] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49. [ ] Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50. [X] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales

51. [X] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran

52. [X] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

53. [ ] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Osvaldo Sanchez Barreto	Marcela Sepúlveda Osorio

IX. ANEXOS

56. [ ] Anexo Copia del documento de identidad: CN. [ ] RC. [ ] TI [ ] CC. [ ] PA. [ ] CE. [ ] CD. [ ] SC. [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [0]

57. [ ] Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

58. [ ] Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

59. [ ] Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para cuo declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

60. [ ] Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

61. [ ] Copia orden judicial o acto administrativo de custodia

62. [ ] Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

63. [ ] Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

64. [ ] Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

65. [ ] Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
SANCHEZ	**BARRETO**	**OSVALDO**	

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
80368036	**X**	**1964 09 28**	**X**	**2023 02 21**

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? **X**
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? **X**
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? **X**
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? **X**
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? **X**

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.

"Yo, OSVALDO SANCHEZ BARRETO identificado con el documento de identidad número: 80368036, **X** autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante: Osvaldo Sanchez Barreto

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea gratuita de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no es a medias debe ser total SaludTotal EPS

Huella digital
(en caso de no saber firmar)



FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1964

CACHIPAY
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-NOV-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00203217-M-0080068036 20091214 0019014784A 1 1210103582



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.368.036

APELLIDOS SANCHEZ BARRETO

NOMBRES OSVALDO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **18-JUL-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-AGO-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-1500150-01213712-M-1033766735-20210210 **0073**369360A 1 9914625411

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.033.766.735

LOPERA AREVALO

APELLIDOS

BRAYAN ALEXIS

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti Salud y en la de tus Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-04**			**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**		
NOMBRE DEL PACIENTE:	**LOPERA AREVALO BRAYAN ALEXIS**						
IDENTIFICACION:	**1033766735**	**RH:**	**O+**	**EDAD:**	**29**	**GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1994-07-18**			**TELEFONO DE CONTACTO:**			

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O COSNTRUCCIONES**	**NIT:**	**9014021059**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	X	Trigliceridos	X	Colesterol	X	Otros:	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA						
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A		
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A		
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A		

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: LOPERA AREVALO BRAYAN ALEXIS**	
	DOCUMENTO: 1033766735	

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **LOPERA AREVALO BRAYAN ALEXIS** identificado(a) con **CC** número **1.033.766.735** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de abril de 2013 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 16 de febrero de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023021610011

N0 ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Empresa NIT. 901402105-9
Representante Legal
LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO

ARL AXA COLPATRIA
Empresa administradora de riesgos laborales

Hace constar que:

BRAYAN ALEXIS LOPERA AREVALO

Con Cedula de Ciudadanía No.**1033766735**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 Horas.

Realizado los días 15 al 17 de febrero del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 17 de Febrero de 2023

ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

WILLIAM ARLEY VEGA S.
Entrenador TSA- 20812286
Licencia en SO -5484

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

Powered by CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud
Te entiende. Te atiende

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedad [ ]	A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: Lopera	Segundo apellido: Arevalo	Primer nombre: Brayan	Segundo nombre: Alexis
7. Tipo documento de identidad: CC	8. Número de documento de identidad: 1.033.166.455	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 18 01 1994

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
Axa Colpatria	Proteccion	1.160000

18. Residencia: Dirección	Teléfono	Teléfono celular	Correo electrónico
Cl 49 B Sur 91-56		3225898660	

Municipio/Distrito	Zona: Urbana / Rural	Localidad/Comuna	Departamento
Bogotá	Urbana [ ] Rural [ ]		Cundinamarca

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres completos: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
0		
0		
0		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
Customo Construccion Consciente SAS	NIT	901.462.105	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Cr 74-70 02	3218565198	marce_1393@hotmail.com	Medellin	Caldas

Powered by CamScanner

capitalsalud

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

- 1. Modificación datos básicos de identificación
- 2. Corrección de los datos básicos de identificación
- 3. Actualización del documento de identidad
- 4. Actualización y corrección datos complementarios
- 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  - Código
- 6. Reinscripción en la EPS
- 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando
- 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- 13. Movilidad
  - A. Régimen Contributivo
  - B. Régimen Subsidiado
- 14. Traslado
  - A. Mismo Régimen
  - B. Diferente Régimen
- 15. Reporte de fallecimiento
- 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- 18. Reporte de la calidad de pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	62. Edad: 16 02 2003

63. EPS anterior	64. Motivo de traslado: Código	65. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva Institucional o de Oficio
Brayan Alexis Loaiza Arevalo	Marcela Zeno Osorio

IX. ANEXOS

56. Copia documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad									

- 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1033766735
Nombre:	BRAYAN AREVALO LOPERA AREVALO
Fecha Ingreso:	17/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	16/2/2023 10:23:06 AM

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-054

Bogotá, D.C, febrero 24 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_053 PISO VINILICO

Respetados señores:

Dando respuesta a su comunicado, se envía un diseño en piso homogéneo tipo Taralay, el cual, como se observa en las imágenes, viene en franjas de diferentes colores y dimensiones, las cuales, vendrán sujetas al espacio en el cual va a ser instalado.



CONSORCIO TIG

También se manifiesta que, en la sede, se encuentran niños de primera infancia, y también podrá ser instalado ese tipo de piso en el área de los pasillos.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-055

Bogotá, D.C, febrero 24 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: CONSOLIDADO DE ACTAS DE REUNIÓN GRUPO 8

Respetados señores:

Por medio del presente adjunto encontrarán las actas de reunión correspondientes al grupo No. 8 que se llevaron a cabo a partir del mes de octubre de 2022 con el contratista de obra CONSORCIO MIA GP, y Secretaria de educación por cada colegio.

Agradecemos la confirmación de la recepción de las actas y si tiene algún comentario o corrección que deba hacerse quedamos atentos.

cordialmente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Pamela Beltrán Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

ACTAS DE REUNIÓN OCTUBRE DE 2022

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

COLEGIO REINO DE HOLANDA - SEDE A.

Código		Fecha	09/10/2022	Inicio		Fin		Lugar	Reunión
Proyecto	REINO DE HOLANDA - SEDE A.					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos		Revisar listado	
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

SE REALIZA VISITA PRELIMINAR CONSORCIO HIA-GP, FUNCIONARIOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN. (ARD) CON EL FIN DE REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR.
DURANTE EL RECORRIDO SE IDENTIFICÓ LAS SIGUIENTES ÁREAS PARA ELECCIÓN DE INFORME Y PRESUPUESTO. (INFORME PRELIMINAR).

BLOQUE A - TIPO EXPERIMENTAL

- REPOSICIÓN DE CUBIERTAS
- MEJORAMIENTO BAÑOS PRIMER Y TERCER NIVEL
- REPOSICIÓN DE VENTANERÍA
- IMPERMEABILIZACIÓN MACH EN CONCRETO. - REVISIÓN VIGA CANAL
- INSTALACIONES ELECTRICAS (SECTORES CAMBIO DE CUBIERTA)
- CAMBIO DOMO - SECTORES DETERIORADOS.
- POSIBILIDAD DE INTERVENCIÓN PINTURA DE FACHADA.

CONSORCIO HIA GP
CONTRATISTA.

CONSORCIO HIA-GP.
CONTRATISTA DE OBRA.

RICARDO FLOREZ C
DOCENTE - SED

Abigail Forero B.
SED

SIG-F-005
V.1

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RE001	Fecha		Inicio	1:00	Fin		Lugar	
Proyecto		I.E.D JOSÉ MARTÍ - SEDE A				Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- SE REALIZA VISITA PRELIMINAR POR PARTE DEL CONTRATISTA HIA - GP. FUNCIONARIO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ING. MANUEL TORRES. PARA RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON CARGO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO - AÑO 2022.

  LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SERÁN LAS SIGUIENTES: ESPECIFICAMENTE "BLOQUE A"

  - REPOSICIÓN DE CUBIERTAS
  - DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A NIVEL DE CUBIERTA.
  - RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.
  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS NUEVAS.
  - REPOSICIÓN VENTANERÍA
  - CAMBIO CUBIERTA DE CANALÓN.
  - CUBIERTA AULA SERIGRAFÍA.

- <<Observaciones>>

  LO NECESARIO PARA REALIZAR EL INFORME PRELIMINAR Y PRESUPUESTO INICIAL PARA INTERVENCIÓN

CONTRATISTA - EF Teresita Argoty.	CONTRATO HIA - GP Luisa Prados.	APOYO TÉCNICO DCEC - SED

SIG-IF-005
V.1

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código	XXX-RED01	Fecha	07-10-22	Inicio	12:00	Fin		Lugar	
Proyecto	IEP SIMÓN TORRES - SEDE B.					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- SE REALIZA VISITA PRELIMINAR POR PARTE DEL CONTRATISTA MIA - GP, FUNCIONARIO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ING ALVARO TORRES. PARA RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR CON EL CARGO AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO - AÑO 2022.

  LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SERÁN LAS SIGUIENTES:

  - REPOSICIÓN DE CUBIERTAS. = 100%
  - REPOSICIÓN DE VENTANERÍA - 100%
  - MEJORAMIENTO DE BAÑOS NIÑOS - NIÑAS.
  - EN COCINETA SE DEBE ADECUAR SITIO DE ALMACENAMIENTO
  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS A NIVEL DE CUBIERTA
  - PISOS EN CORREDOR OCCIDENTAL Y SEGUNDO PISO CORREDOR ORIENTAL
  - PISOS DE PRIMER CORREDOR ORIENTAL
  - PINTURA GENERAL (INTERIOR - EXTERIOR) - PINTURA FACHADA.
  - MANTENIMIENTO ADUCCIÓN PPAL.

- <<Observaciones>>
  LO ANTERIOR PARA REALIZAR EL INFORME PRELIMINAR Y PRESUPUESTO INICIAL PARA INTERVENCIÓN.

Teresita Angarita
Consorcio Mia GP
Contratista

Contratista -

ALVARO TORRES G.
DOCENTE - SED

SIG4F-005
V.1

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO TIG

ACTAS DE REUNIÓN NOVIEMBRE DE 2022

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Colegio Restrepo Millán Sede B

Código	XXX-RE001	Fecha	16 - 11 - 2022	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- Dentro del programa de mejoramiento 2022 se realizo visita preliminar con contratista consorcio HMGP y consorcio TIG para determinar las intervenciones a realizar en las instalaciones:

- Bloque administrativo: cambio de cielo raso
- Cambio de cubierta y toda la parte eléctrica, luminarias
- Cambio de canales y/o verificación de las mismas
- Cambio de instalaciones eléctricas
- Cambiar muchas de libros por ventanas
- Desmonte de rejilla sala de sistemas y reinstalación de las mismas
- Cambio de muros calados por ventanería con ventilación.

* Cubierta tipo sandwinch con teja traslúcida.
* Todas estas actividades se verificaron de acuerdo al presupuesto en donde se realizará una nueva visita para socializar las actividades a realizar y la programación de estas.

- La institución debe garantizar los espacios a intervenir.
- Revisión de filtraciones en el domo central (policarbonato).

- <<Observaciones>>

Manuel Castillo Garcia Docente. 3115822900 mcastillos@educacionbogota.edu.co

Juan Carlos C. Consorcio Mejor GP

Consorcio TIG

SED- DICRE

Página 1 de 1

SIG-IF-005
V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Colegio Alexander Fleming

Código	XXX-RE001	Fecha	16/11/2022	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- Dentro del programa de mejoramiento 2022 se realizo visita preliminar con contratista Consorcio MIACP y consorcio TIG para determinar las intervenciones a realizar en las instalaciones:
  - Reparación de cancha múltiple pendiente procedimiento.
  - Pintura de muro en las canchas
  - Pintura de cancha múltiple y mantenimiento mobiliario.
  - lavado de fachadas exteriores y lo interno de la cancha. (incluye ventaneria y alfajias).
  - Mantenimiento de viga canal o impermeabilización placa plana sala de profesores.
  - Pintura exterior sala de profesores
  - Limpieza de alfajia y bordillo de terraza.
  - Migracion a iluminación LED** en aulas. y sala de profesores y baños (verificacion).
  - Queda pendiente la posibilidad de una persiana perimetral en el patio central)

** Todas estas actividades se verificarán de acuerdo al presupuesto en donde se realizará una nueva visita para socializar las actividades a realizar y la programación de estas.

- <<Observaciones>>

+ la institucion debe garantizar los espacios a intervenir.

Ing Hilda Tibaquirá
Página 1 de 1

Ricardo Fonseca L.
Ingeniero

Fleming Diaz
Coordinador Sedes
3107692355

Fernando Bohórquez
Residente Intervención

Juan Camilo
CONSORCIO MIACP

SIG-IF-005
V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Colegio Alfredo Iriarte Sede A.

Código	XXX-RE001	Fecha	18-11-2022	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	16	Elaborado por						Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- Dentro del programa de mejoramiento 2022 se realiza visita preliminar con contratista Consorcio HIA GP y Consorcio TIG. para determinar las intervenciones a realizar en las instalaciones:

  - Mantenimiento de cubiertas inclinadas
  - Impermeabilización de cubiertas planas
  - Impermeabilización de viga canales
  - Cambio de puertas en baños en acero inoxidables (6 baterías)
  - Reparación de enchape en baños
  - Cambio de iluminación en baños
  - Pintura epóxica mate color a definir. en baños
  - Queda pendiente impermeabilización cubierta transitable en biblioteca.

  → Todas estas actividades se verificarán de acuerdo al presupuesto en donde se realizará una nueva visita para socializar las actividades a realizar y la programación de estas

- <<Observaciones>>

Acta de Reunión Colegio Alfredo Iriarte Sede A

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes									
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

- La institución debe garantizar los espacios a intervenir.

Claudia Marcela Herrera B.
3017460849
cmherrerab@educacionbogota.edu.co

Ruben Fonseca
Docente SED

Hugo Tellez
SED. DACLE

Ruben Cortés
Residente Interventoría
Consorcio TIQ.

Juan Camilo Castañeda
Consorcio MIA GP

Diana Carolina Pimiento
Consorcio MIA GP.

Hugo Tellez Higuera López
Consorcio MIA GP.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Colegio Enrique Olaya Herrera

Código	XXX-RE001	Fecha	16/11/2022	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- Dentro del programa de mejoramiento 2022 se realiza visita preliminar con contratista consorcio MAGP y consorcio TIG para determinar las intervenciones a realizar en las instalaciones
  - Mantenimiento de cubiertas para bachillerato y pintura.
  - Mantenimiento (est.) viga canal prescolar.
  - Nivelación de plazoleta, losetas en concreto y dilataciones en ladrillo (revisar drenaje).
  - Cambio de cubierta de asbesto en prescolar.
  - Cambio de piso vinilo, persianas, ventanas, puertas e iluminación prescolar.
  - Cambio de divisiones en baños, incluir divisiones en orinales
  - Cambio de cielo raso en baños bachillerato (revisar filtraciones)
  - Limpieza y reinstalación de boquillas.
  - Lavado de muros en baños (retiro de grafiti y contemplar pintura).
  - Pulida de pisos en baños
  - Pulida de mesones baños
  - Cambio de piso (Bachillerato piso 1) Bloque B. alrededor porteria vehicular.

- <<Observaciones>>

Acta de Reunión Colegio Enrique Olaya Herrera

Código		Fecha	16/11/2022	Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes									
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

- Cambio de mesones y espejo (Piso 1 alcoba 1 cuarto de aseo), cambio de puertas cambio de piso en granito y cambio de enchape parcial.
- Queda pendiente por revisar el baño inhabilitado piso 2, se contemplaran las mismas actividades de los otros baños.

* Todas estas actividades se verificaran de acuerdo al presupuesto en donde se realizará una nueva visita para socializar las actividades a realizar y la programación de estas.

- La institución debe garantizar los espacios a intervenir.

Patricia Beltran
Residente Interventoría
Consorcio TIG.

Claudia Romero
Rectora (e)

Alvaro Fonseca A.
Dicke - SCO.

Juan Camilo Cardenas
Consorcio MIA GP

Juan Felipe Miguez
Consorcio MIA GP.

Arq. Hector Tibaquira
SED DICKE

DCNA
Diana Carolina Pimiento
Consorcio MIA GP.

Magaly Martinez.
Apoyo Almacen.
jmartinezc@educacionbogota.edu.co

Cel: 3112272040

CONSORCIO TIG

ACTAS DE REUNIÓN ENERO DE 2023

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Enero 12/23	Inicio	9:00 am	Fin		Lugar	Interventoría.
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	Enero 12/23	Elaborado por	Pamela Beltrán					Próxima Reunión	

1. Revisión presupuesto. Colegio José Marti – Luis López de Mesa.
- Por sugerencia de supervisión, se incluye el cambio de pisos. y su respectiva demolición.
- El NP propuesto se incluye en el ítem existente y queda sujeto a aprobación y revisión por parte de interventoría.
- Se hace revisión total del presupuesto. dando como un costo inicial de: $ 2 373.453 570,00

2. Colegio Restrepo Millán – Isabel II de Inglaterra.
- Se debe tener en cuenta que la estructura metálica existente para la cubierta está anclada a la mampostería y al momento de la intervención se va a afectar.
- Se hace revisión total del presupuesto dando como resultado, un presupuesto inicial de: $ 915'808.537,00

3. Colegio Diana Turbay Viva Colombia Sede C.
- La interventoría recomienda hacer una evaluación y diagnósitico estructural de la fisura que se presenta en el piso del edificio 3. (aula 20).
- Para los adoquines del patio, se recomienda hacer el cambio completo de las piezas, por el estado actual del área.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Enero 12/23	Inicio	9:00 am	Fin		Lugar	Interventoría
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	12/23/enero	Elaborado por	Pamela Beltrán					Próxima Reunión	

- Cambio de mesón en policuarzo. y no en granito.
- Consultar altura de mesones para baños
- Se hace revisión total del presupuesto, dando como resultado, un presupuesto inicial de: $ 1.164' 429. 694.

4. Colegio San Agustín.
- No hay un ítem contractual para la demolición del baños comido existente
- Cambio de mesón de granito por mesón en policuarzo.
- Confirmar con supervisión los baños adicionales a intervenir.
- Se hace revisión total del presupuesto, dando como resultado, un presupuesto inicial de: $ 1.129 '957. 229

5. Colegio Enrique Olaya Herrera.
- Ítem 12.20 Revisar si se cambia solo enchape o se instalan divisiones modulares.
- Cambio de mesón en policuarzo
- Se le solicita al contratista, el diseño hidráulico para el área de la plazoleta central.
- El contratista propone instalar concreto estampado para reemplazar las líneas de adoquín en la plazoleta central.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Enero 12/23	Inicio	9:00 am	Fin		Lugar	Interventoría
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	Enero 12/23	Elaborado por	Pamela Beltrán					Próxima Reunión	

- El contratista manifiesta que no hará reinstalación de boquilla en las baterías debido a las postventas que se puedan generar por la ausencia de adherencia en los elementos.
- Se hace revisión total del presupuesto, dando como resultado, un presupuesto inicial de: $897.193.913

6. Colegio Reino de Holanda
- Se realizará cambio total del domo.
- No se hará intervención de los baños piso 2 (profesores), según acta inicial de recorrido.
- Se hace la revisión total del presupuesto, dando como resultado un presupuesto inicial de: $ 848' 208.392

7. Colegio Alexander Fleming.
- Para la cancha, se deje presentar el diseño por parte del contratista, de acuerdo con esto, la interventoría aprobará o no la ejecución de esta actividad.
- 2.3.13 Alfajía en concreto → ítem a revisar con supervisión.

8. Colegio Alfredo Iriarte.
- Para los baños, se intervendrán enchapes y se hará cambio de puertas.

Se ajustarán los presupuestos por parte del contratista y se hará una nueva entrega a la interventoría mañana 13/01/2023.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	12 Enero/23	Inicio	9:00	Fin		Lugar	Interventoría
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	Enero/12/23	Elaborado por	Pamela Beltrán					Próxima Reunión	

NOMBRE: Alvaro Mauricio Cornejo Galicia
CARGO: Residente de Interventoría. Consorcio TIG.

NOMBRE: Yesenia Arenas Arias
CARGO: Residente Obra Consorcio MIABP.

NOMBRE: Luis Felipe Roque
CARGO: Res. obra Consorcio MYA GP

NOMBRE: Pamela Beltrán
CARGO: Directora Interventoría Consorcio TIG.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	30/01/2023	Inicio	2:30 pm.	Fin		Lugar	Interventoría.
Proyecto						Asunto	Revisión ítems no previstos		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

- Se inicua la reunion con la revisión de APU's y los ítems no contractuales; para lo cual, el contratista se compromete a corregir los APU's y argumentar los ítem no previstos.
- Se organizo la actividad de socialización y actas de veandad para el día miércoles 01 de febero, de esta manera, iniciat el lunes 06 de febero de 2023.
- Respecto a los informes estructurales, se iniciará con la entrega el día de hoy 30 de enero de 2023, con el colegio José Martí.
- El contratista debe hacer entrega de la documentación del personal SST siguiendo las observaciones del profesional.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	30/01/2023	**Inicio**	2:30 pm.	**Fin**		**Lugar**	Interventoría
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

LOISA FERNANDA PROMOS Q.
NOMBRE: LOISA FERNANDA PROMOS Q.
CARGO: DEPARTAMENTO TÉCNICO MIA - GP

Juan Camilo Castaneda
NOMBRE:
CARGO: Arquitecto

Luis Miguel Castaño C.
NOMBRE: Luis Miguel Castaño C.
CARGO: Ing. MIA - GP.

Betty Arnedy Benavides
NOMBRE: Betty Arnedy Benavides
CARGO: Residente de interventoría.

Pamela Beltran
NOMBRE: Pamela Beltran
CARGO: practica interventoría.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

CONSORCIO TIG

ACTAS DE REUNIÓN FEBRERO DE 2023

Carrera 47A No. 93-41 Barrio la Castellana, Bogotá, D.C.
E-mail: consorciotig@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Febero 2/2023	Inicio	10:00	Fin		Lugar	CED
Proyecto	Mejoramientos 2022					Asunto	DEFINICION ALCANCES INTERVENCIONES		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	Feb 02	2023	Elaborado por	Romelo Beltran.				Próxima Reunión	

La reunión tiene como objetivo establecer los alcances, presupuestos y cronogramas para cada una de las sedes.

- San Agustin

Cubiertas → Zona primaria

Baños → 6 baterias de baños primaria más pre-escolar:. Baterias de pre-escolar depende presupuesto

Se deben adicionar las puertas y las ventanas para cada una de las baterias sanitarias.

- Diana Turbay Sede B.

Cubiertas
Ventaneria
Ases
Futura

Adicionar puerta de salones y la puerta principal.

- Alfredo Iriarte Sede A.

Mantenimiento de cubiertas, impermeabilización placas planas.

Incluir cambio de puertas y ventaneria módulo superior en aluminio, para ventilación de los baños.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Febrero 2/2023	Inicio	10:00	Fin		Lugar	SED
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

- José Martí

Se debe ajustar el presupuesto para disminuir el valor debido al valor que sobrepasa el valor inicial. Recomendación: se debe medir en campo para comprobar medidas. Cubierta del comedor.

- Enrique Olaya Herrera.

* Mantenimiento de cubiertas, placa patio central, zona pre-escolar

- Alexander Flemming.

Está pendiente la revisión por parte del especialista estructural de la interventoría del informe enviada por parte del contratista.

- Reino de Holanda.

* Queda pendiente la propuesta de los ítems no pactados para (la) el ajuste de presupuestos.

- Restrepo Millán Sede B

Cambio de cubiertas y ventanería. Incluye domos

Incluir cambio de pisos, pintura y puertas.

Se solicita una reunión con la especialista ambiental de la SED y contratista e interventoría.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

NOMBRE: Betty Arnedy Benavidez M.
CARGO: Residente interventoria.

NOMBRE:
CARGO: GESTOR TERRITORIAL DOCENTE/ED

NOMBRE: Alvaro Fernando G.
CARGO: Docente-ED

NOMBRE: Luis Miguel Castaño
CARGO: ING CIVIL OBRA

NOMBRE: Jorge Fernando Pedraza C.
CARGO: Profesional Mu-EP.

NOMBRE: Yesenia Acosta Argoty
CARGO: Proy y Presupuestos.

NOMBRE: Yesenia Acosta
CARGO: Apoyo Profesional Ing.

NOMBRE: Alvaro Fernando Gonzalez García
CARGO: Interventoria

NOMBRE: Pamela Beltrán
CARGO: Dll. Inventario.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	07/02/2023	Inicio	11:15	Fin		Lugar	SED
Proyecto	Mejoramientos grupo 8 2023					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	09/02/2023	Elaborado por	Pamela Beltrán					Próxima Reunión	

A los comités de obra se debe asistir únicamente con el personal aprobado en los pliegos.

Respecto al NP1 - Teja termoacústica, el arq Hugo Tibaquirá refiere que al momento de la firma del contrato, se aceptó el valor de ítem y la forma de pago por m2.

- Se aclara que frente que no tiene cronograma, no puede iniciar.
- La entidad está en la disposición de recibir propuestas en caso que no esté de acuerdo con los diseños o conceptos.
- Se está a la espera de los conceptos estructurales por parte del contratista para su revisión y su respectiva aprobación por parte de la interventoría. y la remisión a la supervisión.
- Por ser un contrato de mejoramiento, no es requerimiento que se cumpla la norma sismo - resistente, pero se harán evaluaciones para que en casos extremos, como reforzamientos, si se debe hacer todo lo posible por cumplirla.
- Por parte de la secretaría, se hará la gestión para iniciar actividades el día lunes 13 de febrero.
- Se solicita por parte de la entidad, se solucione en obra la mayor parte de las cosas, con el fin de dar celeridad a las obras.
- Reunión 9:00 am viernes 10 de febrero en el colegio Reino de Holanda para hacer mesa de trabajo y dar inicio a las obras en esa sede.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	09/02/2023	Inicio		Fin		Lugar	SED
Proyecto	Mejoramiento grupo 6 2023					Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	09/02/2023	Elaborado por	Pamela Beltrán					Próxima Reunión	

- Se deben hacer actas de menores y mayores para ir llevando un control financiero del contrato.
- Se harán ajustes en los alcances de los frentes para no generar expectativas.
- Se definirá por parte de la entidad, ¿cuál será el cambio de cubierta del colegio José Martí.
- Se debe tener coherencia en el seguimiento financiero, físico y con el cronograma.
- Fecha de corte 20 de cada mes, según fechas enviadas en el memorando.
- Se debe radicar el NP para autorización de la entidad.
- Presentar documentación para la adición presentada pa la entidad.
- Enviar listado de personal para el ingreso a la sedes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración			Elaborado por					Próxima Reunión	

NOMBRE: Alvaro H. Cocunubo Garcia
CARGO: Residente Interventoría.

NOMBRE: Teresita Argoty C.
CARGO: Ing. y Residentes Obra. Asesoría Mig GP.

NOMBRE: Juan Camilo Cristancho
CARGO: Arquitecto

NOMBRE: Jorge Fernando Perdomo
CARGO: Ing. Técnico de Obra

NOMBRE: Luis Miguel Castaño.
CARGO: EDI - OBRA

NOMBRE: Betty Arnelly Bermudez M.
CARGO: Residente de interventoría.

NOMBRE: Miguel Fernando B.
CARGO: Gestor Territorial. SED

NOMBRE: Pamela Beltrán
CARGO: Directiva de Obra

NOMBRE: Hugo Tarazona
CARGO: SED. DACEEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	3/FEB/23	Inicio		Fin		Lugar	SED IED RESTREPO MILLAN SEDE C
Proyecto						Asunto	Atención Emergencia		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	3/FEB/23	Elaborado por	Alvaro Coronado.					Próxima Reunión	

- Por solicitud de la Sra Rectora. Maria Castellanos atiende visita en la sede C del colegio Restrepo Millan. Atendiendo lo requerido en el contrato 1077645 Grupo 8. (Mejoramientos y Mant.)
- Se evidencia desprendimiento del recubrimiento en concreto lanzado, fisuras de distintos tipos y sentido de falla (posible), como asentación y colmatación de los hastiales, empozamientos y filtración de agua.
- Por parte de la SED. se iniciara gestión en la EEAB Para determinar y corregir las posibles causas de la filtración continua de agua a través del Talud.
- Por parte del contratista de obra junto al acompañamiento de la interventoría se hara la propuesta de intervención. en donde debe determinar las posibles afectaciones o daños en la viga de cubierta o en el sistema estructural de la fachada Oriental del Colegio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	9/FEB/23	Inicio		Fin		Lugar	IED RESTREPO MILLAN SEDE (C)
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	9/FEB/23	Elaborado por	Alvaro Coronado					Próxima Reunión	

NOMBRE: Alvaro H. Coronado Garcia.
CARGO: Residente Interventoria.

NOMBRE:
CARGO: GESTOR TERRITORIAL DCCEE/SED

NOMBRE: IDEDY QUIROGA
CARGO: Asesor. Geotecnia SED

Pamela Beltran

NOMBRE: Pamela Beltrán
CARGO: Directora de Interventoría

NOMBRE: Alvaro Torres G.
CARGO: DCCEE-SED

NOMBRE: Melquisedec Montoya
CARGO: Aux. Administrativa

NOMBRE: lizeth Sanabria P.
CARGO: Coordinadora.

NOMBRE: Yeisson Avendo A.
CARGO: Apoyo por Consorcio Mira 6P

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	10/Feb/23	Inicio		Fin		Lugar	IED SAN AGUSTÍN SEDE A
Proyecto	Mantenimientos Grupo 8					Asunto	Atención Emergencia.		
Asistentes	Residentes (Contratista-Interventoría) Almacen IED					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	10/Feb/23	Elaborado por	Alvaro Coronado.					Próxima Reunión	

- Se atiende la solicitud realizada por el señor Rector de la institución San Agustín Sede A. en cuanto a la emergencia reportada en el bloque de Bachillerato.
- Realizado el recorrido para la verificación de la situación presentada se observa: i) Evidencia de rotura de tubería o sello hidraulico en accesorios, filtración de agua y escurrimiento en 1er y 2do piso respectivamente.
  ii) Es evidente el daño de la red de suministro en mínimo dos sitios distintos.
- Se requiere que la intervención se realice sin afectar la población estudiantil (Aproximadamente 1600 estudiantes por jornada), considerando que se debe suspender el suministro de toda la institución.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	10/FEB/23	Inicio		Fin		Lugar	IED SAN AGOSTIN SEDE A
Proyecto	Mantenimientos Grupo 8					Asunto	Atención emergencia.		
Asistentes	Residentes (Contratista - Interventoría) - Almacen IED					Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		10/FEB/23	Elaborado por	Alvaro Coronado				Próxima Reunión	

NOMBRE: Yesenia Arenas Ariza
CARGO: Ing Residente de Obras.

NOMBRE: Alvaro Hernán Coronado Q.
CARGO: Residente Interventoría.

NOMBRE: Miguel Armando Molina
CARGO: Almacenista.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	14/02/2023	Inicio	15:00	Fin		Lugar	IED. Reino de Holanda
Proyecto						Asunto	Definir alcance y fecha de inicio.		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

Se realiza ranión en el colegio Reino de Holanda, se hace la solicitud por parte de la señora rectora, se intervengan las canchas del patio central.

- Se hará cambio de cubierta, incluyendo el cambio de instalaciones eléctricas, intervención integral de los baños del bloque A.
- Se hace la solicitud por parte del arq Hugo Tibaquirá, que se habiliten los salones por áreas (4-5 salones), para mostar avance en obra y de esta manera, disminución de tiempos de ejecución.
- Se debe demarcar toda el área de intervención para evitar inconvenientes con la comunidad estudiantil.
- Se hace la solicitud por parte de la señora rectora, se alquile una sede y por de esta manera, se desocupe toda la sede y de esta manera evitar inconvenientes con la comunidad educativa.
- Por parte de la secretaría, se buscará hacer gestión para buscar un inmueble para hacer el traslado total del colegio.
- Propuesta de parte del apoyo a la suspensión, intervenir 4 aulas (1 mes) y luego las 5 aulas restantes, y se continua bajando hasta llegar al piso 1.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTOS 202__

Fecha		Inicio		Fin		Localidad	Rafael Uribe Uribe
I.E.D./Localidad	Restrepo Millan Sede B					Gestor Territorial	Ing Alvaro Franco
Supervisión	Arq. Alexander Osorio					Apoyo a la supervisión	Hugo Tibaquira.
Fecha de Elaboración	13/FEBRERO/23		Elaborado por	Alvaro Coronado		Próxima Reunión	

Desarrollo Reunión-Alcance Intervenciones I.E.D.

El día 13 del mes de FEBRERO del año 2023 se reúne el/la Señor(a) Rector(a) Karina Castelblanco de la I.E.D. Restrepo Millan, el gestor territorial Alvaro Franco, apoyo a la supervisión Hugo Tibaquira y el equipo de interventoría Alvaro Coronado y contratista Juan Camilo Castancho que forman parte del contrato N. CO1. PCCNTR 4077645 /22 de mejoramientos 2022, con el fin de socializar las intervenciones que se realizarán en las instalaciones locativas con el alcance técnico que se evidencia en la ficha de diagnóstico técnico. De acuerdo con las intervenciones socializadas para esta I.E.D., el tiempo de ejecución de estas actividades de obra se tienen proyectadas desde 20/FEBRERO/2023 hasta 15/JUNIO/2023 sin contemplar los imprevistos técnicos que puedan surgir durante la ejecución de obra. Se anexa a la presente acta, la ficha de diagnostico que da cuenta de las necesidades de infraestructura a atender por medio del presente contrato de mejoramientos.

Firman:

Karina Castelblanco
Rectora
Constructora Nuevos Rumbos.
DCCEE - SED.

Hugo Tibaquira SED/DCCEE

Juan Camilo Castancho
Consorcio MIA 6P

Alvaro Franco
DCCEE - SED

Supervisión Contratista
SED/DCCEE

V.1

SIG-IF-005

ACG
Alvaro Coronado
Residente Interventoría

Alexander Osorio
Director Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTOS 202__

Fecha	13/02/23	Inicio		Fin		Localidad	Rafael Uribe Uribe
I.E.D./Localidad	Diana Turbay Sede B					Gestor Territorial	ING. ÁLVARO FORERO
Supervisión	ARQ. ALEXANDER OSORIO					Apoyo a la supervisión	ARQ HUGO TIBAQUICÁ
Fecha de Elaboración	13/FEBRERO/23	Elaborado por	Alvaro Cocinado			Próxima Reunión	POR DEFINIR

Desarrollo Reunión-Alcance Intervenciones I.E.D.

El día 13 del mes de FEBRERO del año 2023 se reúne el/la Señor(a) Rector(a) Maryory García R. de la I.E.D. Diana Turbay, el gestor territorial Alvaro Forero, apoyo a la supervisión Hugo Tibaquira y el equipo de interventoría Alvaro Cocinado y contratista Luis Miguel Cortazar que forman parte del contrato N.CO1.PCCNTR.4077693/22 de mejoramientos 2022, con el fin de socializar las intervenciones que se realizarán en las instalaciones locativas con el alcance técnico que se evidencia en la ficha de diagnóstico técnico. De acuerdo con las intervenciones socializadas para esta I.E.D., el tiempo de ejecución de estas actividades de obra se tienen proyectadas desde 10/FEBRERO/2023 hasta 5/JUNIO/2023 sin contemplar los imprevistos técnicos que puedan surgir durante la ejecución de obra. Se anexa a la presente acta, la ficha de diagnostico que da cuenta de las necesidades de infraestructura a atender por medio del presente contrato de mejoramientos.

Firman:

Arq. Hugo Tibaquira Supervisor
Leonardo Contador
Gestor Territorial
DCCEE/SED

Residente Interventoría
Rector Diana Turbay

Alvaro Forero G
Gestor
DCCEE-SED
Cocinado
DCCEE-SED.

AFCG
Alvaro Cocinado
Residente Interventoría

Ramon Bolivar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTOS 202_

Fecha	13/02/23	Inicio	11:00 a.m.	Fin	12:00 p.m	Localidad	Rafael Uribe Uribe
I.E.D./Localidad	COLEGIO SAN AGUSTÍN (IED)					Gestor Territorial	ING. ÁLVARO FORERO
Supervisión	ARQ. ALEXANDER OSORIO					Apoyo a la supervisión	ARQ HUGO TIBAQUIRÁ
Fecha de Elaboración	13/02/2023	Elaborado por	Alvaro Coronado			Próxima Reunión	POR DEFINIR

Desarrollo Reunión-Alcance Intervenciones I.E.D.

El día 13 del mes de FEBRERO del año 2023 se reúne el/la Señor(a) Rector(a) Marco Gutierrez de la I.E.D. San Agustín Sede, el gestor territorial Alvaro Forero, apoyo a la supervisión Hugo Tibaquirá y el equipo de interventoría Alvaro Coronado y contratista Yeseania Arenas que forman parte del contrato N. CO1.PCCNTR.4077645/22 de mejoramientos 2022, con el fin de socializar las intervenciones que se realizarán en las instalaciones locativas con el alcance técnico que se evidencia en la ficha de diagnóstico técnico. De acuerdo con las intervenciones socializadas para esta I.E.D., el tiempo de ejecución de estas actividades de obra se tienen proyectadas desde 13 de Febrero de 2023 hasta 12 de Junio de 2023 sin contemplar los imprevistos técnicos que puedan surgir durante la ejecución de obra. Se anexa a la presente acta, la ficha de diagnostico que da cuenta de las necesidades de infraestructura a atender por medio del presente contrato de mejoramientos.

Firman:

Marco T. Gutiérrez C.
Coordinador Sede
IDCCEE - SED

Alvaro Coronado
Residente Interventoría

Alvaro Forero C.
IDCCEE - SED

Yeseania Arenas - Contratista.

Alvaro Coronado
Residente Interventoría

Alvaro Forero C.
Gestor Territorial
IDCCEE - SED

Director Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

- Cerrando alcances, se debe incluir en el presupuesto cambio de puertas, apertura de vanos, pulida, destronque y brillada de pisos, por último, incluir la pintura de las salones.
- Igualmente se revisará la adecuación del área libre del costado nororiental.
- Esto se evaluará de acuerdo al presupuesto disponible.

Se Realizará una reunión de avance 15 días después del inicio de las intervenciones.

- Se llegó al acuerdo con la señora rectora que se hará entrega de los espacios, el día 20 de febrero de 2023.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaborado por						Próxima Reunión	

NOMBRE: Luis M. Castro
CARGO: Residente de obra.

NOMBRE: Gestora

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Miguel Formagué B.
CARGO: Gestor territorial SED.

NOMBRE:
CARGO: Apoyo supervisión.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO: GESTOR TERRITORIAL DCCEE/SED

NOMBRE: Coralia Mena
CARGO: P. Social DCCEE-SED.

NOMBRE: Luz Stella Fonseca
CARGO: Almacenista
Col. Reino de Holanda
316-7343779
lsfonseca@educacionbogota.edu.co

Pamela Beltrán
Pamela Beltrán
Directora Interventoría.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTOS 2023

Fecha Feb 17		Inicio		Fin		Localidad	Rafael Uribe Uribe
I.E.D./Localidad	I.e.d. Enrique Olaya Herrera					Gestor Territorial	Álvaro Forero
Supervisión	Alexander Osorio					Apoyo a la supervisión	Hugo Tibaquirá
Fecha de Elaboración	Feb 17/2023		Elaborado por	Pamela Beltrán		Próxima Reunión	

Desarrollo Reunión-Alcance Intervenciones I.E.D.

El día 17 del mes de febrero del año 2023 se reúne el/la Señor(a) Rector(a) Edgar Rivera de la I.E.D. Enrique Olaya Herrera, el gestor territorial Álvaro Forero, apoyo a la supervisión Hugo Tibaquirá y el equipo de interventoría consorcio TIG. y contratista consorcio MIA GP que forman parte del contrato N. CCOL-RRC-NTR-4077645-22 de mejoramientos 2022, con el fin de socializar las intervenciones que se realizarán en las instalaciones locativas con el alcance técnico que se evidencia en la ficha de diagnóstico técnico. De acuerdo con las intervenciones socializadas para esta I.E.D., el tiempo de ejecución de estas actividades de obra se tienen proyectadas desde 20 de febrero de 2023 hasta 20 junio de 2023 sin contemplar los imprevistos técnicos que puedan surgir durante la ejecución de obra. Se anexa a la presente acta, la ficha de diagnostico que da cuenta de las necesidades de infraestructura a atender por medio del presente contrato de mejoramientos.

Firman:

Rector IED

Residente Interventoría Consorcio TIG

Pamela Beltrán
Directora Interventoría
Residente Obra MIA GP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTOS 2023

Fecha	Feb 17/2023	**Inicio**		**Fin**		**Localidad**	Rafael Uribe Uribe
I.E.D./Localidad	I.E.D Alfredo Iriarte					**Gestor Territorial**	
Supervisión	Alexander Osono.					**Apoyo a la supervisión**	Arq. Hugo Tibaquirá
Fecha de Elaboración	17/02/2023	**Elaborado por**	Pamela Beltrán			**Próxima Reunión**	

Desarrollo Reunión-Alcance Intervenciones I.E.D.

El día 17 del mes de febrero del año 2023 se reúne el/la Señor(a) Rector(a) Ángel María Moreno de la I.E.D. Alfredo Iriarte, el gestor territorial Álvaro Fajero, apoyo a la supervisión Hugo Tibaquirá y el equipo de interventoría Consorcio TIG y contratista Consorcio MIA GP que forman parte del contrato N. C001. PCC. NTR. 4077695-22 de mejoramientos 2022, con el fin de socializar las intervenciones que se realizarán en las instalaciones locativas con el alcance técnico que se evidencia en la ficha de diagnóstico técnico. De acuerdo con las intervenciones socializadas para esta I.E.D., el tiempo de ejecución de estas actividades de obra se tienen proyectadas desde 27 de febrero de 2023 hasta 05 de mayo de 2023 sin contemplar los imprevistos técnicos que puedan surgir durante la ejecución de obra. Se anexa a la presente acta, la ficha de diagnostico que da cuenta de las necesidades de infraestructura a atender por medio del presente contrato de mejoramientos.

Firman:

Residente Interventoría Consorcio TIG.

Residente Obra PIAGP

ÁLVARO FAJERO C.
DCCE-SED

Pamela Beltrán
Dir Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Feb 17/2023	Inicio		Fin		Lugar	I.E.D. Alfredo Iriarte.
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	17/02/2023	Elaborado por						Próxima Reunión	

-- El dia de hoy se socializaron los alcances de los mantenimientos al señor rector, se contemplarán la instalaciones de protecciones para lluvia en los accesos estudiantiles y no se ejecutará la cubierta de la terraza de la biblioteca. Se revisará la posibilidad de instalar la cubierta en la salida auxiliar sur y la salida hacia el parque, también se contemplará la cubierta en el patio central sobre el talud.

Pamela Beltrán
Director interventoría

Rector I.E.D.

ÁLVARO TORRES
DCDEC-SED

Residente Interventoría Consorcio

Maga Arquitecta.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21/02	Inicio	11:00am	Fin	1:50pm	Lugar	Liceo femenino de Cundinamarca Morales
Asunto	Revisión Instalaciones						
Asistentes	Interventoría, Contratista, Equipo BF				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	01/03/2023

Desarrollo de la Agenda

- Inicia recorrido por Secretaría Académica, se establece que debe estar habilitada para el 6 de marzo las estancias (Sala de banda de música, Coordinación y habilitación de espacio de biblioteca)
- Se define subsanar goteras presentes en la biblioteca, cambio de cielo raso en PVC
- Se comprometen a entregar el cronograma definitivo el 22 de febrero

Lab Biología
- Se define demolición de mesones en laboratorios y cambio de pisos y enchapes
- Se requiere definición de mobiliario para establecer puntos de gas y hidráulicos
- Se solicita el cambio de cielo raso en PVC, cambio de iluminación

Lab Física
- Se conserva cielo raso, mesón
- Se solicita cambio de piso, pintura y enchapes
- Se requiere impermeabilización de marcos de fachada

Lab Química
- Se requiere demolición de mesones
- Se solicita instalación de ducha, reemplazo de extractores y pantallas para ventanas
- Se solicita al colegio colaboración con suspensión de puntos de gas
- Se requiere cambio de pisos, cielo raso e iluminación
- Instalación de puerta media con bandeja metálica
- Se define fecha de inicio el día lunes 27 de febrero
- Se requiere enchape de muros (Altura por definir)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación


ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21/02	Inicio	11:00 am	Fin	1:56 pm	Lugar	Liceo Femenino
Asunto	Revisión de Instalaciones						
Asistentes	Interventoría, Contratistas, y Grp BI					Asistentes Externos	<
Fecha de Elaboración			Elaborado por				Próxima Reunión


Desarrollo de la Agenda

Artes Visuales

- Se requee la creación de un cuarto oscuro, con roseta y mesón de trabajo perimetral con puerta de total abertura y piso vinilo para todo el salón

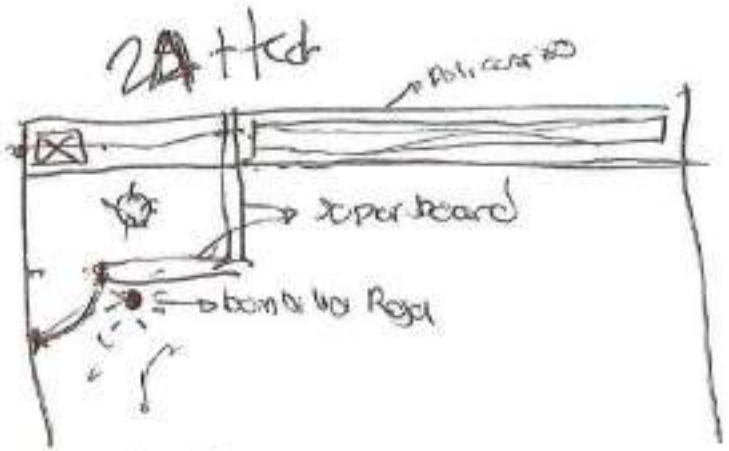





Aula de Musica

- cambio de pisos de laminación y pintura

Aula de Tecnologia #1

- Cambiar modulos de ventana por persianas en aluminio para mejorar ventilación de orientación horizontal a 50 cm del techo

Aula de Informatica

- Demolición de tarima e instalación de 8 luminarias, e instalación de ventanas en aluminio de corredera.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	21/02	**Inicio**	11:00 am	**Fin**	1:56 pm	**Lugar**	Liceo Femenino
Proyecto						**Asunto**	Revisión Instalaciones		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	01/03/2023

NOMBRE: Alexander Osorio P.
CARGO: Supervisor Contrato

NOMBRE: Oscar Castaneda
CARGO: Arq Obra

NOMBRE:
CARGO: Arq Contratista

NOMBRE: Hilda Rodriguez
CARGO: Apoyo Supervisión Grupo B

NOMBRE: Valentina Osma
CARGO: Grupo B contratista

NOMBRE: Alexandra G.
CARGO: Rep. Rectora

NOMBRE: Erick Ariza Bonilla
CARGO: Rector Liceo

NOMBRE: Alexander Bernal
CARGO: Profesional Especializado

NOMBRE: Juan Rocha
CARGO: Instalador Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	Feb 22/2023	Inicio	11:20	Fin		Lugar	I.E.D. Palermo Sur.
Proyecto	MEJORAMIENTOS 2022					Asunto	VISITA TÉCNICA		
Asistentes	VER LISTA ANEXA					Asistentes Externos	VER LISTA ANEXA		
Fecha de Elaboración	22/02/23	Elaborado por						Próxima Reunión	por definir

- Se realiza recorrido para definir alcance, junto con el señor rector, contratista de obra, Supervisión e Interventoría. Se hace la propuesta por parte de la supervisión de cambiar 3 aulas actuales e instalar aulas modulares.

- Queda como compromiso por parte del contratista, entregar el presupuesto para presentárselo al señor rector y para estimar el tiempo aproximado de ejecución, esto con el fin de que el espacio sea entregado para su intervención.

Leonardo Castañeda
Gestión Territorial
DCLEE/SED
Loc. R.U.U.

PABLO CASTILLO L.
RECTOR PALERMO SUR IED

Carolina Rojas Bello.
Prof. Social DCEE

Juan Camilo Castañeda
Arquitecto Contratista
Consorcio MIP 69

Pamela Beltrán
Pamela Beltrán
Consorcio TIG.

Erick Ramirez
Insp SST Inter
Consorcio TIG

HCG
Residente Interventoría
Consorcio TIG

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	22-feb-23	Inicio	12:05	Fin		Lugar	I.E.D Mameyes Molinos
Proyecto	Helpamientos 2022					Asunto			
Asistentes	Ver lista anexa					Asistentes Externos	Ver lista anexa.		
Fecha de Elaboración	22/02/23	Elaborado por	Pamela Beltrán.					Próxima Reunión	Por definir.

- Se realiza recorrido por las áreas a intervenir con el señor rector, el contratista de obra, la supervisión y la interventoría.
- las actividades a realizar en esta sede serán: mantenimiento de la impermeabilización de las cubiertas, adecuación de la tarima del patio central, adecuación del ingreso del edificio de bachillerato (B).

- Queda como compromiso por parte del contratista, presentar el presupuesto y el cronograma de la sede, de esta manera, presentárselo al señor rector y coordinar el inicio de las actividades.

Luis Eduardo Hurtado
Rector

Erick Steven Ramirez
Insp SST Interventoría
Consorcio G TIG

Juan Camilo Castrillo
Profesional
Consorcio TIG

Pamela Beltrán
Pamela Beltrán
Consorcio TIG.

Ricardo Interventoría
Consorcio TIG

Cristian Camilo Rodríguez Cortés
Gestión Territorial
DCCEE/SED

Jhon Rodas Cardona
Consorcio TIG

Cristian Ruiz.
Prof Social.
DCCEE-SED.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-056

Bogotá, D.C, febrero 27 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Ayudante	Reino Holanda
2	Gina Katerine casas Castillo	1069754573	Inspectora SST	Reino Holanda

CONSORCIO TIG

3	Edgar Moreno Reyes	1005195748	Ayudante	Reino Holanda
4	Frannkyn Roosevelth Mendez	1024484580	Ayudante	Reino Holanda
6	Jhohan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Ayudante	Reino Holanda
7	Ubaldo Antonio Márquez Márquez	7038443	Ayudante	Enrique Olaya
8	Eduardo José Zoteranis Reira	5620985	Ayudante	Enrique Olaya
9	Nelson Felipe Guanipa Díaz	26730363	Ayudante	Enrique Olaya
10	Alexis Yesquén Peña	1.004.711.690	Oficial de construcción	San Agustín

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.024.484.580
MENDEZ VARON

APELLIDOS
FRANNKYN ROOSEVELTH

NOMBRES

Franky Mendez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1988
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

11-OCT-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01170223-M-1024484580-20201014 0072060537A 1 8500779516

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

JRD CONSULTORES
900975732-1

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:

FRANNKYN ROOSEVELTH MENDEZ VARON

Identificado con Cédula de ciudadanía
Nº 1024484580

Registrado por la empresa ESTRUKTEC SAS , con NIT 901614035-1, dicha afiliada a la ARL SURA , empresa representada por FRANNKYN ROOSEVELTH MENDEZ VARON, con documento 1024484580

Cursó y aprobó la acción de formación en
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO
Con una intensidad de 8 horas

Realizado del (23) del mes de septiembre de 2022 al (23) del mes de septiembre de 2022 en la ciudad de Bogotá.

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (23) del mes de septiembre de 2022

Dayan Stephanie Sanchez Perez
C.C. 1.000.619.268
Entrenador TSA
Licencia SO Nº 5103

Yeritza Zulien Romero Ávila
C.C. 1030646887
Representante Legal
JRD CONSULTORES SAS

JRD-DO361

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2019220000000041782 del 09 de octubre de 2019 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad # 30-539-1 emitida por CELAC con aval de ONAC 18-CPR-002, licencia en salud ocupacional código 30.35359-1 LIC. SST N° 5409 DE 31/05/2019 que autoriza a la empresa JRD CONSULTORES SAS ubicada en Bogotá D.C en Av. Boyaca 73 A - 90. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021

VERIFICACIÓN
3046191742-8050587
WWW.ALTURASJRD.COM
AV. BOYACA 73 A 90

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA 19-abr.-2022 **HORA** 07:57:19
EMPRESA ESTRUKTEC SAS NIT 901.614.035-1
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Frankin Rooselvelth Mendez Varon
Edad 33 años 7 meses
Documento de Identificación: CC Número: 1024484580
Cargo INSTALADOR

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

Aptitud Especifica:
☑ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria:Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Uso protección auditiva- Ingresar P.V.E.R

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA

LABORATORIO: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1. / Uso de EPP acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5 / Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

12/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. 13/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS
MEDICO: NORMAL OSTEOMUSCULAR: NORMAL / REMISION A EPS? SI, VALORACION POR NUTRICION Y MEDICINA GENERAL.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma Henry Orozco Solano
Nombre HENRY OROZCO SOLANO
RM 72254756 Lic SO

Trabajador

Firma
Nombre: Frankin Rooselvelth Mendez Varon
CC N° 1024484580

Huella

Medellín, 31 de agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUKTEC SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1024484580	MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH	01/09/2022		160S5895	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/08/2022 14:28:27 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.62.137.118, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9009139877
9009139877

No. de Radicación: 24482929

Fecha de Radicación: 01 09 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: MENDEZ	Segundo Apellido: VARON	Primer Nombre: FRANNKYN	Segundo Nombre: ROOSEVELTH

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1024484580	Femenino [ ] Masculino [X]	D 19 D M 09 M A A 1988 A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$1.000.000	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna / Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
B1				D D M M A A A A
B2				D D M M A A A A
B3				D D M M A A A A
B4				D D M M A A A A
B5				D D M M A A A A

Datos complementarios	
29. Parentesco	30. Etnia

31. Discapacidad					32. Datos de residencia				33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P	Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NT	901614035	

39. Ubicación				
CLL 1 73B 32	3223671120		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D 01 D M 09 M A 2022 A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: OPERADOR DE PLANTA AUXILIAR
71. Firma del funcionario		

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH** identificado(a) con **CC** número **1.024.484.580** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 25 de octubre de 2006 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 01 de septiembre de 2022.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202209010932

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 05:58:59 PM horas del 07/10/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1024484580**
Apellidos y Nombres: **MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS	CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.500	0		0		0	0	0	0	15.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.600	0		0		0	0	0	0	216.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	680.600	0	0	0	0	0	0		680.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.900	0	0	0	0	0	0		61.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	485.000				485.000	0	0	485.000			4.850	485.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	69.700	0	0	69.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	278.500	278.500
Pensión	3	1.113.700	1.113.700
Riesgos Laborales	1	485.000	485.000
CCF	1	69.700	69.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.946.900	1.946.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS		CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000125786	TAFUR RAMIREZ MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
2	CC	1005195748	MORENO REYES EDGAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
3	CC	1012446051	RODRIGUEZ CHAVEZ JERLY MARLEY	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
4	CC	1024484580	MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033789009	REALPE PULIDO CRISTIAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
6	CC	1069724034	URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
7	CC	1069754573	CASAS CASTILLO GINA KATERINE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
8	CC	79245524	RODRIGUEZ CONTRERAS JOHN JAIRO	1	0			S	X																25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCION TEMPORAL

MIGRACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 7038443

COL

MARQUEZ MARQUEZ
APELLIDOS

UBALDO ANTONIO
NOMBRES

VEN
NACIONALIDAD

M
SEXO

147106753
DNI Nro

28-01-1979
FECHA DE NACIMIENTO

19-07-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO





VISIBLES

Ubaldo

FIRMA

Powered by CamScanner

E2201195

INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL7038443<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7901287M3105308VENE2201195<<<4
MARQUEZ<MARQUEZ<<UBALDO<ANTONI

Powered by CamScanner

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti Salud y en la de tus Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-20**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:	**MARQUEZ MARQUEZ UBALDO NTONIO**		
IDENTIFICACION:	**7038443**	**RH:** **O+** **EDAD:** **43** **GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1979-01-28**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS**	**NIT:**	**901402105**
ESCOLARIDAD:	**PRIMARIA**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Trigliceridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: MARQUEZ MARQUEZ UBALDO NTONIO**	
	DOCUMENTO: 7038443	

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti Salud y en la de tus Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-20**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:	**MARQUEZ MARQUEZ UBALDO NTONIO**		
IDENTIFICACION:	**7038443**	**RH:** **O+** **EDAD:** **43** **GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1979-01-28**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS**	**NIT:**	**901402105**
ESCOLARIDAD:	**PRIMARIA**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia [X] Trigliceridos [X] Colesterol [X] Otros: [X]

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar: NINGUNA

Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]
Apto para el cargo	SI [X]	NO [ ]	N/A [ ]

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: MARQUEZ MARQUEZ UBALDO NTONIO**	
	DOCUMENTO: 7038443	

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009834339	2|1|0|2|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación [X] B.Reporte de Novedades [ ]	A. Individual -Cotizante Cabeza de familia [X] -Beneficiario afiliado adicional [ ] B. Institucional [ ] B. Colectivo [ ] B. De oficio [ ]	A.Contributivo [X] B.Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	**5. Tipo de cotizante** A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	**Codigo** (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
MARQUEZ (Primer apellido)	MARQUEZ (Segundo apellido)	UBALDO (Primer nombre)	ANTONIO (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
PT	7038443	Femenino [ ] Masculino [X]	08/01/1967

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo [ ] Condicion [ ]		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 74 SUR 16 24		3118707856	UBALDOMARQUEZ@GMAIL.COM
Municipio/Distrito	**zona** Urbana [X] Rural [ ]	**Localidad / comuna**	**Departamento**
BOGOTA			BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente optativo

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo** Femenino [ ] Masculino [ ]	**23. Fecha de nacimiento**

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS 20 DE JULIO - JOD DENTOLASER 20 DE JULIO	VS20JULI - DENTO20JUL
S	-	-
S	-	-
S	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CR 23 B 67 56	3215465408	LMCASTANOC@GMAIL.COM	MANIZALES	CALDAS

No de Radicacion
4009834339

6. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo (Femenino ☐ Masculino ☐)	Fecha de nacimiento	42. Fecha (D D M M A A A A)
☐				

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código: ☐	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieren
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Ubaldo Antonio Marquez M.	Marcela Serna Osorio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 Total: 1
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acta administrativa de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consta la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
MARQUEZ	MARQUEZ	UBALDO	ANTONIO

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
7038443		1979 01 28	X	2023 02 21

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? X
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? X
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? X
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? X
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? X

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.

"Yo: UBALDO ANTONIO MARQUEZ MARQUEZ identificado con el documento de identidad número: 7038443, X autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante: Ubaldo Antonio Marquez M.

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea gratuita de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no es a medias debe ser total SaludTotal EPS

Huella digital
(en caso de no saber firmar)

F309-RVA V1.0-2013

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	7038443
Nombre:	UBALDO ANTONIO MARQUEZ MARQUEZ
Fecha Ingreso:	22/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	21/2/2023 10:23:24 AM

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARQUEZ MARQUEZ UBALDO ANTONIO** identificado(a) con **PT** número **7.038.443** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 23 de febrero de 2023 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 24 de febrero de 2023.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202302240819

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
1.069.724.034
URIBE VALBUENA
CRISTIAN CAMILO
CARRERA 90 A # 45-A 05 SUR
CASA 157
316 529 39 09
15-JUL-1988
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
1.64
A+
M
23-JUL-2008 FUSAGASUGA


PRETAL SAS
PREVENCIÓN TÉCNICA EN ALTURAS S.A.S.
NIT. 901.309.746-2
LICENCIA SST N° 8665 DEL 10 OCTUBRE DE 2019
APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
CERTIFICACIÓN NTC 6072:2014
CÓDIGO DE ACREDITACIÓN CELAC15-CPR-002
www.pretalsas.com.co
Av Calle 57 R sur 76 A 95
CELAC
NTC 6072


CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
OTORGADO A
CRISTIAN CAMILO URIBE VALBUENA
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1069724034
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 20 HORAS
ENTRENADOR TSA
Licencia S.O. Resolucion 5795 de 26 Mayo de 2017

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

NIT. 830.136.123-5
LIC.SST Res 1451 de 28-11-2018 de 10 a 20

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA 19-abr.-2022 **HORA** 07:46:04
EMPRESA ESTRUKTEC SAS NIT 901.614.035-1
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Cristian Camilo Uribe Valbuena
Edad 33 años 9 meses 4 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1069724034
Cargo INSTALADOR

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

Aptitud Especifica:
☑ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Uso protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, *SE SUGUIERE ELEMENTOS DE* PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA

LABORATORIO GLICEMIA NORMAL COLESTEROL NORMAL TRIGLICERIDOS NORMAL

Otras Recomendaciones: 1. / Uso de EPP acordes a alturas 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos 5 / Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

12/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. 13/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS
MEDICO NORMAL OSTEOMUSCULAR NORMAL / REMISION A EPS? NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudieran influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta."
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma Henry Orozco Solano
Nombre HENRY OROZCO SOLANO
RM 72264756 Lic SO

Trabajador

Firma Cristian C. Uribe
Nombre Cristian Camilo Uribe Valbuena
CC N° 1069724034



porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN CAMILO URIBE VALBUENA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.069.724.034**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 31 de Agosto del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9009101364

9009101364

No. de Radicado: 24417939

Fecha de Radicación: 19 08 2022

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. TIPO DE TRAMITE

1. Tipo de tramite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: +Cotizante o cabeza de Familia [X] +Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. Sin ofrma [ ]

3. Regimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Codigo (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	URIBE	VALBUENA	CRISTIAN	CAMILO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: D 15 M 07 A 1988
CC	1069724034		

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo / Cantidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
				SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia: Departamento	Teléfono fijo	Teléfono celular
$1.000.000			

Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Municipio / Distrito	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente unitario/a)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento: D M A	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
01							
02							
03							
04							
05							

	31. Discapacidad: Tipo	Cantidad	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional a registrar por la EPS
01								
02								
03								
04								
05								

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS a registrar por la EPS
1		
2		
3		
4		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Razón o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NT	901614035	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono fijo	Ciudad / Distrito	Departamento
CLL 1 73B 32	3223671120	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización de documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la vinculación en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reincorporación en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de suspensión temporal o actualización de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o cambio de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del inicio de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento: D M A	42. Fecha novedad: 08 08 2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependientes económicos de los beneficiarios o afiliados adicionales [ ]

47. Declaración de no cotización de afiliados al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción [ ]

48. Declaración de existencia de soporte de fuerza mayor o caso fortuito que impidió la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios [ ]

49. Declaración de no afiliación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud [ ]

50. Autorización para que la EPS solicite y descargue datos y copia de la misma clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales [ ]

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de su afiliación o del retiro de novedades a bases de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por ley tengan la siguiente [ ]

52. Autorización para que la EPS consulte los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 [ ]

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto [ ]

VIII. FIRMAS

54. Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario [ ] 55. Firma del representante, apoderado o persona responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio [ ]

IX. ANEXOS

56. Número copia del documento de identidad: CC [ ] TI [ ] CE [ ] RC [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad [ ] Folios [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente [ ]

58. Copia del registro civil de nacimiento o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare el unión marital [ ]

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, nulidad o judicial que declare la separación de cuerpos y disolución pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la cesación de la unión marital [ ]

60. Copia del certificado de defunción o acta de entrega del menor [ ]

61. Copia de la orden pública o del acto administrativo de custodia [ ]

62. Copia del documento en que conste la petición de la pareja porteadad o el certificado de defunción de fallecimiento o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres [ ]

63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud [ ]

64. Certificación de ampliación a esa entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]

65. Copia del acta administrativa o convivencia de los autoridades competentes en la que conste la solidad de beneficiario o no conste la afiliación no oficio [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación: D M A	69. Fecha de validación: D M A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

ARL | sura

Medellín, 31 de Agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ESTRUKTEC SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1069724034	URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO	05/08/2022		1539432!	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C1024484580222434427 1

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/08/2022 12:17:51
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.62.137.118, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:26:48 PM horas del 07/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1069724034**

Apellidos y Nombres: **URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS	CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.500	0		0		0	0	0	0	15.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.600	0		0		0	0	0	0	216.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	680.600	0	0	0	0	0	0		680.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.900	0	0	0	0	0	0		61.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	485.000				485.000	0	0	485.000			4.850	485.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	69.700	0	0	69.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	278.500	278.500
Pensión	3	1.113.700	1.113.700
Riesgos Laborales	1	485.000	485.000
CCF	1	69.700	69.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.946.900	1.946.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS		CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000125786	TAFUR RAMIREZ MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
2	CC	1005195748	MORENO REYES EDGAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
3	CC	1012446051	RODRIGUEZ CHAVEZ JERLY MARLEY	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
4	CC	1024484580	MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033789009	REALPE PULIDO CRISTIAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
6	CC	1069724034	URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
7	CC	1069754573	CASAS CASTILLO GINA KATERINE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
8	CC	79245524	RODRIGUEZ CONTRERAS JOHN JAIRO	1	0			S	X																25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.005.195.748

MORENO REYES

APELLIDOS

EDGAR

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1988

BOLIVAR
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

25-OCT-2006 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00263905-M-1005195748-20100907 0023765610A 1 1190850743

EPS = Famisanar

FP = Protección

Código de validación: REE8124

AMH

GRUPO EMPRESARIAL
NIT. 901400371-2

Certificado de Capacitación y Entrenamiento

EDGAR MORENO REYES

CC: 1.005.195.748

Asistió y Aprobó el Curso de:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO AVANZADO

Con una intensidad horaria de 20 horas, según Resolución de Salud Ocupacional 6956 del 28 de Septiembre de 2020 de la Secretaria de Salud del Meta y aprobación al registro de proveedores 08SE2021220000000005725 del Ministerio del Trabajo, y Certificación No. 30.383-1 Expedido por CELAC. 18-CPR-002 de acuerdo al titulo II, capitulo II Articulo 9 de La Resolución 1409 de 2012 y 1178 del 2017 del Ministerio de Trabajo.

Realizado en Villavicencio, del 4 al 5 de abril de 2022
Se Expide en la ciudad de Villavicencio el día 5 de abril de 2022

Jorge Enrique Granados Vargas
Director Operativo

Rossmy Javier Suarez Lozano
Resolución No. 4895 de 2018
Entrenador TSA. 5112019

CELAC
NTC 6072
30.383-1

322 736 8099 Carrera 198 # 18-08 amhgrupoempresarial@gmail.com www.amhgrupoempresarial.com

Escaneado con CamScanner

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S.

NO. 830.136.321-5
LIC. 521 Res 14910 de 28-11-2013 de 3 días

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA 24-may.-2022 **HORA** 07:46:34
EMPRESA ESTRUKTEC SAS NIT. 901.614.035-1
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Edgar Moreno Reyes
Edad 33 años 7 meses 12 días
Documento de Identificación: CC Número: 1005195748
Cargo: OFICIAL DE INSTALACIONES

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

Aptitud Especifica:
☑ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO. SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO. SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA

LABORATORIO: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: NORMAL TRIGLICERIDOS: ANORMAL

Otras Recomendaciones: 1. / Uso de EPP acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos 5 / Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas

12/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. 13/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: NORMAL. / AUDIOMETRIA: NORMAL / REMISION A EPS? SI, VALORACION POR NUTRICION Y MEDICINA GENERAL.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma: Henry Orozco Solano
Nombre: HENRY OROZCO SOLANO
RM: 72254756 Lic SO:

Trabajador

Firma:
Nombre: Edgar Moreno Reyes
CC N°: 1005195748

Huella

Medellín, 31 de Agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ESTRUKTEC SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1005195748	MORENO REYES EDGAR	08/08/2022		18017712	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10244845802224341211

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/08/2022 11:26:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.62.137.118, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9009101358
9009101358

No. de Radicación: 24417932

Fecha de Radicación: 19 08 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
MORENO	REYES	EDGAR	

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1005195748	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A: 12 10 1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia: Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
$1.000.000			

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia

	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NT	901614035	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CLL 1 73B 32	3223671120		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D: 08 M M: 08 A A A A: 2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	[ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	[ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	[ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	[ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	[ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	[ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	[ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.	[ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	[ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	[ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	[ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	[ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	[ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	[ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	[ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	[ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.	[ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: OPERADOR DE PLANTA AUXILIAR

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

VIGILADO Supersalud

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDGAR MORENO REYES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.005.195.748**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 31 de Agosto del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR


COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) señor(a) EDGAR MORENO REYES identificado(a) con CC No. 1005195748, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, a través de ESTRUKTEC SAS con NIT 9016140351:

- Fecha de afiliación a la Caja: 08/08/2022.
- Fecha de ingreso a la empresa: 08/08/2022.

En su grupo familiar figura(n) el(los) siguiente(s) registro(s) JULIAN MATEO MORENO LEON



JOSÉ LEONARDO GONZÁLEZ VEGA
Jefe de Sección Afiliación y Postulación

Bogotá D.C. 08/08/2022

VIGILADO SuperSubsidio

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:01:55 PM horas del 07/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1005195748**

Apellidos y Nombres: **MORENO REYES EDGAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS	CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.500	0		0		0	0	0	0	15.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.600	0		0		0	0	0	0	216.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	680.600	0	0	0	0	0	0		680.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.900	0	0	0	0	0	0		61.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	485.000				485.000	0	0	485.000			4.850	485.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	69.700	0	0	69.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	278.500	278.500
Pensión	3	1.113.700	1.113.700
Riesgos Laborales	1	485.000	485.000
CCF	1	69.700	69.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.946.900	1.946.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS		CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000125786	TAFUR RAMIREZ MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
2	CC	1005195748	MORENO REYES EDGAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
3	CC	1012446051	RODRIGUEZ CHAVEZ JERLY MARLEY	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
4	CC	1024484580	MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033789009	REALPE PULIDO CRISTIAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
6	CC	1069724034	URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
7	CC	1069754573	CASAS CASTILLO GINA KATERINE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
8	CC	79245524	RODRIGUEZ CONTRERAS JOHN JAIRO	1	0			S	X																25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CEDULA DE IDENTIDAD

V 12.077.613

176

APELLIDOS ZOTERANIS RIERA

NOMBRES EDUARDO JOSE

Gustavo Vizcaino
Director

FIRMA TITULAR



21/01/1974 F. NACIMIENTO

SOLTERO EDO CIVIL

12/11/2019 F. EXPEDICION

11/2029 F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 5620985

ZOTERANIS RIERA
APELLIDOS

EDUARDO JOSE
NOMBRES

VEN NACIONALIDAD

M SEXO

12077613
DNI Nro.

21-01-1974
FECHA DE NACIMIENTO

02-07-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO



VISIBLES

Eduardo Zoteranis

FIRMA

Powered by CamScanner

E0389113



INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL5620985<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7401215M3105308VENE0389113<<<7
ZOTERANIS<RIERA<<EDUARDO<JOSE<

Powered by CamScanner

N0 ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Empresa NIT. 901402105-9
Representante Legal
GERMAN DARIO CASTAÑO MUÑOZ

ARL AXA COLPATRIA
Empresa administradora de riesgos laborales

Hace constar que:

EDUARDO JOSE ZOTERANIS RIERA

Con Cedula de Ciudadanía No.**5620985**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 Horas.

Realizado los días 12 al 14 de febrero del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 14 de Febrero de 2023

ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

MAURICIO MORALES GUTIERREZ
LSST N0670/2022-1590-35774
2022/07/07-2022/07/10
Licencia en SO -25-2478

CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti Salud y en la de tus Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-04**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**		
NOMBRE DEL PACIENTE:	**ZOTERANIS RIERA EDUARDO JOSE**				
IDENTIFICACION:	**5620985**	**RH:**		**EDAD:** **49**	**GENERO:** **M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1974-01-21**	**TELEFONO DE CONTACTO:**			

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS**	**NIT:**	**9014021059**
ESCOLARIDAD:	**PRIMARIA**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	X	Trigliceridos	X	Colesterol	X	Otros:	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA						
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A		
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A		
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A		

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: ZOTERANIS RIERA EDUARDO JOSE**	
	DOCUMENTO: 5620985	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901402105	9	CASTANO CONSTRUCCIONES CONSCIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CR 23 B 67 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8909333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1906767481	9446678395	E	2023/02/02	2023/02/08	BANCO ITAU	6	$3,967,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VILLAVICENCIO (5 Afiliados)						**$992,002**	**$159,000**			**$992,002**	**$40,000**			**$992,002**	**$40,000**			**$992,002**	**$69,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (5 Afiliados)						**$992,002**	**$159,000**			**$992,002**	**$40,000**			**$992,002**	**$40,000**			**$992,002**	**$69,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						**$992,002**	**$159,000**			**$992,002**	**$40,000**			**$992,002**	**$40,000**			**$992,002**	**$69,200**		**$0**	**$0**
1	CC	86086393	ACHAGUA EIBERTH	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
2	CC	1006828056	CUFIF BAQUERO VICTOR ANDRES	230201	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
3	CC	86074582	LESMES GARZON DEYBIER ALFONSO	230301	7	$373,334	$59,800	CCFC55	7	$373,334	$15,000	CCF34	7	$373,334	$15,000	14-4	7	$373,334	$26,000	7	$0	$0
4	CC	96195555	MOSQUERA TORRES JORGE ARLEY	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
5	CC	1121877606	PALACIO GARCIA LUIS HERNANDO	230301	7	$270,667	$43,400	CCFC55	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUNDIMARCA (11 Afiliados)						**$9,782,668**	**$1,565,300**			**$9,782,668**	**$391,500**			**$9,782,668**	**$391,500**			**$9,782,668**	**$681,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)						**$9,782,668**	**$1,565,300**			**$9,782,668**	**$391,500**			**$9,782,668**	**$391,500**			**$9,782,668**	**$681,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)						**$9,782,668**	**$1,565,300**			**$9,782,668**	**$391,500**			**$9,782,668**	**$391,500**			**$9,782,668**	**$681,400**		**$0**	**$0**
6	CC	1123990917	BAENA IPUANA WILSON DAVID	230301	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF26	25	$966,667	$38,700	14-4	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
7	CC	79461540	CARDENAS ROMERO MANUEL ANTONIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	79604157	CORTES GUTIERREZ PABLO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1126243885	GAMEZ BRITO ARNOLDO ELIAS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF26	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	PT	6196881	GONZALEZ NEUDO JOSE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1023925768	MICHELY MARTINEZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	19490651	MICHELY MEDINA JOSE ELIAS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	PT	5463867	MOLINA VELASCO MOISES FRANCISCO	230201	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF26	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
14	PT	5633482	PADRON WILLIAM ANTONIO	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1002423449	RANGEL MIRANDA YESIT	230301	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF26	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$43,100	16	$0	$0
16	PE	976767020101993	SECO AGUILAR JOSE IGNACIO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF26	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BUGA (8 Afiliados)						**$1,933,336**	**$310,000**			**$1,933,336**	**$77,900**			**$1,933,336**	**$77,900**			**$1,933,336**	**$135,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: BUGA (8 Afiliados)						**$1,933,336**	**$310,000**			**$1,933,336**	**$77,900**			**$1,933,336**	**$77,900**			**$1,933,336**	**$135,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA Depto: VALLE (8 Afiliados)						**$1,933,336**	**$310,000**			**$1,933,336**	**$77,900**			**$1,933,336**	**$77,900**			**$1,933,336**	**$135,000**		**$0**	**$0**
17	CC	1114456752	ALZATE SIERRA DIEGO FERNANDO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
18	CC	1114060352	BAQUERO IDROBO LUIS GABRIEL	25-14	7	$270,667	$43,400	ESSC18	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
19	CC	1116157988	CARDONA CEBALLOS VICTOR ALFONSO	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC18	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
20	CC	1193036386	CIFUENTES OCAMPO JHOVANNY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS018	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	CC	1007696675	GARCIA PESCADOR WAN DERLEY	230301	7	$270,667	$43,400	EPS018	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
22	CC	1148955913	RENGIFO PEÑA CARLOS ALBERTO	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
23	CC	1006227786	TORRES BLANDON DILAN ANDRES	230301	7	$270,667	$43,400	ESSC18	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
24	CC	94471805	VALVERDE MAURICIO ALEXANDER	231001	7	$270,667	$43,400	EPS018	7	$270,667	$10,900	CCF57	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	$18,900	7	$0	$0
Total	**Afiliados(24)**					**$12,708,006**	**$2,034,300**			**$12,708,006**	**$509,400**			**$12,708,006**	**$509,400**			**$12,708,006**	**$885,600**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901402105	9	CASTANO CONSTRUCCIONES CONSCIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CR 23 B 67 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8909333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1906767481	9446678395	E	2023/02/02	2023/02/08	BANCO ITAU	6	$3,967,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$2,034,300	$14,600	$0	$2,048,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$43,400	$400	$0	$43,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$420,800	$3,000	$0	$423,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$586,300	$4,200	$0	$590,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$983,800	$7,000	$0	$990,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$885,600	$6,300	$0	$891,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$885,600	$6,300	$0	$891,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$509,400	$3,700	$0	$513,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$40,000	$300	$0	$40,300
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	11	$391,500	$2,800	$0	$394,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$77,900	$600	$0	$78,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				24	$509,400	$4,100	$0	$513,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$27,500	$200	$0	$27,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,600	$100	$0	$1,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$400	$0	$46,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$32,700	$300	$0	$33,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$400	$0	$46,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$94,400	$700	$0	$95,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$21,800	$200	$0	$22,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$23,400	$200	$0	$23,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$111,500	$800	$0	$112,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$103,700	$800	$0	$104,500
TOTAL				**24**	**$3,938,700**	**$28,700**	**$0**	**$3,967,400**



Gina Katerine Casas Castillo

C.C. 1.069.754.573 de fusagasuga
Fecha de Nacimiento: *04 de marzo de 1996*
Lugar de Nacimiento: *fusagasuga*
Dirección: *Vrda Subia Alta La Union*
Celular: 3012373392
E-mail:*ginakastillo@hotmail.com*

Perfil

Soy una persona responsable, dinámica, con aspiraciones, deseos de superación y metas basadas en el logro de objetivos; aprendo con rapidez y me intereso por cumplir de manera adecuada con la puntualidad, honestidad y responsabilidad en las distintas actividades que realizo.

Dispuesta a cumplir con las distintas funciones, obligaciones y normas laborales que tengan establecidas, me presento con gran entusiasmo a vuestra entidad, y así formar parte del cumplimiento de metas planteadas en vuestra misión.

Experiencia Laboral

DROGUERIA GALES
ENERO2017 – JUNIO 2017
DICIEMBRE 22 – ENERO 09 2021
Jefe Inmediato: *OSCAR JIMENEZ*
Dirección: *SAN RAIMUNDO*
Cargo: *AUXILIAR DE ENFERMERIA.*
Celular: *3212252483*

CASAS CONSTRUCCIONES
NIT.901.245.894-8
ENERO 2020-- NOVIEMBRE 2020
Jefe Inmediato: *WILSON CASAS*
Dirección: CR 10 VDA LLANO AGUIRRE CA FRANCISCO MEJIA (ANTIOQUIA)
Cargo: *PRACTICAS SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*
Celular: *3107451817*

MGC.
ENERO 2021-- PRESENTE
Jefe Inmediato: *MIGEL GARAY*
Dirección: *MOSQUERA-CUNDINAMARCA*
Cargo: *INSPECTORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO*
Celular: *3136296823*

Formación Académica

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL DE SUBIA
Bachiller Académico
2012

ESCUELA DE SALUD TERESA DE CALCUTA
Técnico laboral en auxiliar de enfermería
2014

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
Administración en salud ocupacional
2020

Referencias Personales

Nombre: *Julieth Quintero Barrera*
Cargo: *ENfermera*
Dirección: *Cra 73G No 40-66*
Telefono: *3202343676*

Nombre: *Luis carlos Castillo Diaz*
Profesión *Docente*
Dirección: *Subia Alta La Union*
Telefono: *3118401613*

Nombre: *Olga castillo*
Profesión *Ama de casa*
Dirección: *Subia alta la union*
Telefono: *3014415814*

Gina Katerine Casas Castillo
c.c. 1.069.754.573 Cel: 3012373392


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.069.754.573
CASAS CASTILLO
APELLIDOS
GINA KATERINE
NOMBRES
GINA KATERINE CASAS CASTILLO
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1996
FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
13-MAR-2014 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
F-1509400-00573094-F-1069754573-20140514
0038593959A 2
42307612

INDUSTRIAL SOLUTIONS SAS

CERTIFICADO

DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS

Resolución De Aprobación Ministerio De Trabajo
No 08SE2020220100000030639 del 24 de Septiembre del 2020
Certificación 18-CPR-002 emitida por ONAC

CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072

INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS

NIT 901076598

HACE CONSTAR QUE:

GINA KATERINE CASAS CASTILLO

Identificado Con Cedula de Ciudadanía

N° 1069754573

Curso y aprobó la acción de Formación en :

ACTUALIZACION COORDINADOR DE TRABAJO DE ALTURAS

Según lo establecido en la resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021

Con una intensidad de 16 HORAS

Realizado los días 26 y 27 de Agosto del 2022

En testimonio de lo anterior se firma en Bogotá D.C. a los (27) días del mes de agosto de 2022

EDISON E. BOLIVAR
Representante Legal
INDUSTRIAL SOLUTIONS IS SAS

IS-AC019

RAFAEL NORBERTO VELANDIA GOMEZ
Entrenador Trabajo en Alturas
LICENCIA S.O 1423 de 06/02/2010

VERIFICACION

3503596962 - 7924338
validaciondecertificados2513@gmail.com
www.industrialsolutionsis.com
CALLE 35 A SUR # 72N-56

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CERTIFICADO



CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

OTORGADO A

GINA KATERINE CASAS CASTILLO

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1060754573

QUIEN CURSO Y APROBÓ SATISFACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO

REALIZADO DESDE EL DÍA 19 DEL MES DE ABRIL HASTA EL DÍA 24 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CON UNA INTENSIDAD DE 20 HORAS

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EL [illegible]
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Jenny Paola Parada Galindo
Representante Legal

MIGUEL ANGEL BUITRAGO
ENTRENADOR TSA
Licencia S.O. Resolucion 5795 de 26 Mayo de 2017

SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA 18-abr.-2022 **HORA** 07:52:24
EMPRESA ESTRUKTEC SAS NIT. 901 614 035-1
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Gina Katerine Casas Castillo
Edad 26 años 1 mes 14 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1069754573
Cargo INSPECTORA SST

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria:Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Uso protección auditiva

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO . SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO , SE SUGUIERE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL CONTROL SEGUN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA EMPRESA

LABORATORIO: GLICEMIA: NORMAL COLESTEROL: ANORMAL TRIGLICERIDOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1 / Uso de EPP acordes a alturas. 2 / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos 5 / Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 1409 de 2012. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

12/ No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. 13/ Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 8 de mayo del 2020

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:
MEDICO: NORMAL OSTEOMUSCULAR: NORMAL / REMISION A EPS? SI, VALORACION POR NUTRICION Y MEDICINA GENERAL

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudieran influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma Henry Orozco Solano
Nombre: HENRY OROZCO SOLANO
RM: 72264756 Lic.SO:

Trabajador

Firma Gina Casas Castillo
Nombre: Gina Katerine Casas Castillo
CC N°: 1069754573



Medellín, 31 de Agosto de 2022

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ESTRUKTEC SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1069754573	CASAS CASTILLO GINA KATERINE	08/08/2022		3422236O	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10244845802224340840

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/08/2022 11:20:40 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.62.137.118, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9009101354
9009101354

No. de Radicación: 24417927

Fecha de Radicación: 19 08 2022

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: CASAS	Segundo Apellido: CASTILLO	Primer Nombre: GINA	Segundo Nombre: KATERINE

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1069754573	Femenino [X] Masculino [ ]	D D: 04 M M: 03 A A A A: 1996

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$1.000.000	Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna / Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia

	31. Discapacidad					32. Datos de residencia					33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P	Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NT	901614035	

39. Ubicación				
CLL 1 73B 32	3223671120		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D: 08 M M: 08 A A A A: 2022

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: [CN] [RC] [TI] [CC] [PA] [CE] [CD] [SC] Total [ ]
Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: OPERADOR DE PLANTA AUXILIAR

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

VIGILADO Supersalud

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CASAS CASTILLO GINA KATERINE** identificado(a) con **CC** número **1.069.754.573** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de agosto de 2014 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 31 de agosto de 2022.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2022083111232

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR


COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) señor(a) GINA KATERINE CASAS CASTILLO identificado(a) con CC No. 1069754573, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, a través de ESTRUKTEC SAS con NIT 9016140351:

- Fecha de afiliación a la Caja: 08/08/2022.
- Fecha de ingreso a la empresa: 08/08/2022.

En su grupo familiar figura(n) el(los) siguiente(s) registro(s) ABBY CHARLOTTE HERNANDEZ CASAS



JOSÉ LEONARDO GONZÁLEZ VEGA
Jefe de Sección Afiliación y Postulación

Bogotá D.C. 08/08/2022

VIGILADO SuperSubsidio

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:02:46 PM horas del 07/10/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1069754573**

Apellidos y Nombres: **CASAS CASTILLO GINA KATERINE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCIÓN No. 7062 de 11/02/2021

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y,

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) GINA KATERINE CASAS CASTILLO, identificado(a) con CC 1069754573, ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural.

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspección, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a GINA KATERINE CASAS CASTILLO, Identificado(a) con CC 1069754573, como ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL .

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- Educación
- Capacitación
- Diseño, Administración y Ejecución del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seguridad industrial
- Higiene industrial
- Investigación del accidente de trabajo

- Profesional en seguridad y salud en el trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolución a GINA KATERINE CASAS CASTILLO informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 11/02/2021



DORA DUARTE PRADA

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Código de verificación: 6W2mLa2oc7

Elaboró: ypgonzalez

Revisó: cevillanueva

Aprobó: dduarte

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

GINA KATERINE CASAS CASTILLO

Con Cedula de Ciudadania No. 1069754573

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Santa Marta, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
EDUARDO JUNIOR ROBLES PANETTA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

EDUARDO JUNIOR ROBLES PANETTA
Subdirector
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
REGIONAL MAGDALENA

04065143 - 12/11/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95290O2011963CC1069754573C.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS	CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.500	0		0		0	0	0	0	15.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.600	0		0		0	0	0	0	216.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	680.600	0	0	0	0	0	0		680.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.900	0	0	0	0	0	0		61.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	485.000				485.000	0	0	485.000			4.850	485.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	69.700	0	0	69.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	278.500	278.500
Pensión	3	1.113.700	1.113.700
Riesgos Laborales	1	485.000	485.000
CCF	1	69.700	69.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.946.900	1.946.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS		CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000125786	TAFUR RAMIREZ MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
2	CC	1005195748	MORENO REYES EDGAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
3	CC	1012446051	RODRIGUEZ CHAVEZ JERLY MARLEY	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
4	CC	1024484580	MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033789009	REALPE PULIDO CRISTIAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
6	CC	1069724034	URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
7	CC	1069754573	CASAS CASTILLO GINA KATERINE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
8	CC	79245524	RODRIGUEZ CONTRERAS JOHN JAIRO	1	0			S	X																25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

HOJA DE VIDA



PRIMER APELLIDO :	ROZO
SEGUNDO APELLIDO :	LEYTON
NOMBRES :	JOHAN ESTIVEN
CEDULA DE CIUDADANIA :	1.233.692.117 DE BOGOTÁ
SEXO :	MASCULINO
LUGAR DE NACIMIENTO :	BOGOTÁ
FECHA DE NACIMIENTO :	SEPTIEMBRE 10 DE 1998
DIRECCION :	CALLE 24 No. 13 - 63
TELEFONO :	311 876 24 53
NACIONALIDAD :	COLOMBIANA
ESTADO CIVIL :	SOLTERO

INFORMACION ACADEMICA

TITULO :	BACHILLER
INSTITUCION :	INSTITUTO JHOAN KEPLER
CIUDAD :	BOGOTÁ

INFORMACION LABORAL

JEFE INMEDIATO :	FREDY ROZO
TIEMPO DE SERVICIO :	4 AÑOS
CARGO :	AYUDANTE DE INSTALACION
MOTIVO DEL RETIRO :	VOLUNTARIO

INFORMACION FAMILIAR

NOMBRE	PROFESION	PARENEZCO	DIRECCION Y TELEFONO
DUVAN ANDRES ROZO	INDEPENDIENTE	HERMANO	312 552 84 73

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	OCUPACION	DIRECCION / TELEFONO
SARAY GONZALEZ	INDEPENDIENTE	301 326 93 24

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.233.692.117
ROJAS LEYTON

APELLIDOS
JOHAN ESTIVEN

FIRMA





FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN 10-SEP-2030
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

ESTATURA 1.65 G.S. (RH) O+ SEXO M

10-OCT-2014 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



SERVISALUD
OCUPACIONAL IPS S.A.S

NIT: 830.116.322-5
LIC.SST Res 14930 de 28-12-2018 de S. de S.

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL



FECHA 15-feb.-2023 **HORA** 09:01:13
EMPRESA ESTRUKTEC SAS **NIT** 901.614.035-1
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Johan Estiven Rozo Leyton
Edad 24 años 5 meses 5 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1233692117
Cargo AYUDANTE DE CONSTRUCCION

APTO PARA LABORAR EN ALTURAS Y EN EL CARGO ASIGNADO

Aptitud Especifica:
☑ Trabajos de altura

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO. SE RECOMIENDA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL DE ACUERDO A LA LABOR QUE DESEMPEÑE
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES DEL CARGO. SE RECOMIENDA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION VISUAL DE ACUERDO A LA LABOR QUE DESEMPEÑE

LABORATORIO: GLICEMIA NORMAL COLESTEROL NORMAL TRIGLICERIDOS NORMAL

Otras Recomendaciones: 1. / Uso de EPP acordes a alturas. 2. / Mantener un peso adecuado corporal para trabajo en alturas. 3/ Autocuidado en actividad. 4 / Uso de elementos de seguridad acordes y verificar estado de elementos.5./ Realizar entrenamiento y capacitación en trabajo seguro en alturas según resolución 4272 de 2021. 6/ Mantener vacunación de adultos. 7/ No consumo de licor ni ninguna sustancia que altere el sistema nervioso central 8/ Mantener un sueño reparador de 8 horas como mínimo. 9/ Uso de protector solar. 10/ Inspeccionar las herramientas periódicamente antes de utilizarlas registre e informe. 11. / Conocer la técnica adecuada para realizar acceso por cuerdas y asistir a las capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.
No se detectó ninguno de los diagnósticos listados como comorbilidades. Tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones de los protocolos del ministerio de salud para el entorno laborar y grupos riesgos COVID-19 según circular 030 del 06 de mayo del 2020.
AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS
MEDICO: Normal. OSTEOMUSCULAR: Normal.
REMISION A EPS?: NO.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma
Nombre: JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
RM: SST3508-19-07-22 Lic.SO:

Trabajador

Firma
Nombre: Johan Estiven Rozo Leyton
CC N°: 1233692117

Huella

Calle 27 Sur No. 14-43 Teléfono: 300 294 85 55 PBX: 209 21 83 - 361 76 12 - 407 35 50
EMAIL: servisaludagencia@gmail.com, servisaluddelolaya@gmail.com

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: Autorizo a Servisalud ocupacional IPS., a realizar en mí, el examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional (es) registrado(s) en este documento. **Servisalud ocupacional IPS.,** me ha explicado la naturaleza y propósito del exámen médico y/o paraclínico(s) opcional(es). He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, limitaciones, los riesgos y consecuencias del examen y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de pruebas.

Entiendo que la realización de estas pruebas es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que realizara(n) el (los) exámenes. Fui informado de las medidas que tomara SERVISALUD OCUPACIONAL IPS., para asegurar la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este (os) examen (es) están completas y son verídicas. Autorizo a SERVISALUD OCUPACIONAL IPS., para que suministre a las entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en la legislación vigente.

AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a SERVISALUD OCUPACIONAL IPS, la recolección, almacenamiento de datos y que sean usados, circulados y en general tratados, con la finalidad de desarrollar nuestro objeto social, el cual es el servicio de salud ocupacional, la realización de exámenes de laboratorio, igualmente para la identificación de las personas y para la suscripción de contratos.

Con el objetivo de verificar la autenticidad de la identidad de los usuarios y con la finalidad de garantizar la seguridad de la identidad, evitar suplantaciones, fraudes y para efectos de carácter probatorio, SERVISALUD OCUPACIONAL IPS S.A.S, realizará la recolección de la firma digitalizada, fotografía digitalizada y la huella dactilar digitalizada, los cuales están clasificados como datos sensibles, que son almacenados en la historia clínica y por lo tanto no se almacenarán en bases de datos que serán tratadas por EL RESPONSABLE, garantizando así el derecho a la intimidad y confidencialidad.

Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Trabajador:

Firma: Julian Ros

Nombre: Julian Esteven Ros Lopez

CC No. 1233692117



Famisanar

NIT 830.003.564-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

9009733186

9009733186

No. de Radicado: 25652552

Fecha de radicación: 14 02 2023

Diligencie los formularios que se encuentran dentro del formulario los campos de diligenciamiento obligatorio

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite de afiliación: B. Traslado de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliado: A. Cotizante - Cabeza de Familia [X]
3. Régimen: A. Contributivo [X]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X]
Código (asignado por la EPS):

II. AFILIADO - III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
ROZO	LEYTON	JOHAN	ESTIVEN

7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número de identificación de identidad: 1233692117
9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]
10. Fecha de nacimiento: 10 09 1998

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia: 0
12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]
13. Pueblo Indígena: 0
14. Grupo de población especial: 00 LÍNEA DE RIESGO PROVEEDORES SURAMERICANA
15. Parentesco: 00 NO APLICA
16. Ingresos mensuales en salarios mínimos: 0
17. Ingresos mensuales en pesos: $1.160.000
18. Residencia: CALLE 24 13 63
Zona: Urbana [X] Rural [ ]
Teléfono: 3118762463
Ciudad: BOGOTA
Departamento: DISTRITO CAPITAL

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente inclusive)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]
23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino / Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
01						
02						
03						
04						
05						

	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono de un familiar	33. Tipo de la UPC del afiliado adicional (si aplica) ver (*1*)
01							
02							
03							
04							
05							

Relación de la EPS Anterior

	34. Nombre de la EPS	Código de la EPS (asignado por la SNS)
1	CAFAM CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
2		
3		
4		
5		

VI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Razón social o nombre	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de documento de identificación	38. Tipo de cotizante (asignado por la EPS)
ESTRUKTEC SAS	NIT	901614035	

39. Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CLL 1 73B 32	3883253	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

VII. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Actualización de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización de documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reincorporación en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o actividad económica para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o cambio de empleador para cotizar [ ] 11. Traslado a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Disminución de una unidad económica para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Ubicación de una unidad económica para realizar afiliaciones colectivas [ ] 14. Traslado a Mayor Régimen [ ] 15. Traslado a Menor Régimen [ ] 16. Cambio Régimen [ ] 17. Reporte de fallecimiento [ ] 18. Reporte de inicio de protección al cesante [ ] 19. Reporte de la pérdida de la calidad de cesante [ ] 20. Reporte de la pérdida de Pensionado [ ]

VIII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha de novedad
				14 02 2023

43. EPS anterior: NINGUNA
44. Motivo de traslado: Código
45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

IX. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de veracidad y autenticidad de los beneficiarios o afiliados adicionales	X
47. Declaración de no tener obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción	
48. Declaración de existencia de relaciones de hecho mayor a dos (2) años que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios	
49. Declaración de no cotización del cónyuge, compañero de hecho, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud	
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales	X
51. Autorización para que la EPS consulte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y otras entidades públicas que así lo requieran	X
52. Autorización para que la EPS consulte los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013	X
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto	X

X. FIRMAS

54. Firma(s) cotizante o cabeza de familia autorizado	55. Firma(s) beneficiario o afiliado adicional o de otro responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

XI. ANEXOS

56. Anexo: copia del documento de identidad: Cantidad: Total:

57. Copia del certificado de nacimiento o de matrimonio o de unión marital de hecho	
58. Copia del registro civil de nacimiento o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital	
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare terminación de la unión marital	
60. Copia del certificado de estudios o acta de entrega del mismo	
61. Copia de la orden judicial o de acto administrativo de custodia	
62. Copia del documento en que conste la patente de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración juramentada ante el cotizante sobre la ausencia de los mismos	
63. Copia de la autorización de trabajo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	
65. Copia de acta administrativa o de providencia de las autoridades competentes en la que conste la tenencia del beneficiario o se otorgue la atención de niños	

XII. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Departamento: Código del municipio	Código del departamento	67. Caso del SISBÉN: Número de la Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de realización	69. Fecha de validación

70. Nombre del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	OBSERVACIONES
		CARGO: OPERADOR DE PLANTA AUXILIAR

71. Firma del funcionario

Recuerde que en el firma del formulario, el afiliado manifiesta y responde de la información registrada y de la documentación presentada en el Capítulo IX (Autorizaciones).

INTERNET

Famisanar

NIT 830.003.564-7

9009733186

9009733186

CUESTIONARIO ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

ARL | sura

Medellín, 14 de febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESTRUKTEC SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de ocupación	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1233692117	ROZO LEYTON JOHAN ESTIVEN	15/02/2023		5021201	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/02/2023 12:20:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.85.109.47, 152.230.104.1, 172.16.42.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colsubsidio
Con todo lo que te mereces

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

COLSUBSIDIO

HACE CONSTAR:

Que el(la) señor(a) JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON identificado(a) con CC No. 1233692117, se encuentra afiliado(a) a esta Caja de Compensación Familiar, a través de ESTRUKTEC SAS con NIT 9016140351:

- Fecha de afiliación a la Caja: 14/02/2023.
- Fecha de ingreso a la empresa: 14/02/2023.

JOSÉ LEONARDO GONZÁLEZ VEGA
Jefe de Sección Afiliación y Postulación

Bogotá D.C. 14/02/2023

VIGILADO SuperSubsidio

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:

JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON

Identificado con Cédula de ciudadanía
N° 1233692117

Registrado por la empresa ESTRUKTEC SAS , con NIT 901614035-1, dicha afiliada a la ARL SURA , empresa representada por FRANNKYN ROOSEVELTH MENDEZ VARON

Cursó y aprobó la acción de formación en
TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
Con una intensidad de 8 horas

Realizado del (16) del mes de febrero de 2023 al (16) del mes de febrero de 2023 en la ciudad de Bogotá.

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (16) del mes de febrero de 2023

Dayan Stephanie Sanchez Perez
C.C. 1.000.619.268
Entrenador TSA
Licencia SO N° 5103

Yeritza Zulen Romero Avila
C.C. 1030646887
Representante Legal
JRD CONSULTORES SAS

JRD-RD2054

De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE2019220000000041782 del 01 de Octubre de 2019 emitida por el ministerio de trabajo, con certificación de calidad # 30-539-1 emitida por CELAC con aval de ONAC 18-CPR-002, licencia en salud ocupacional LIC. SST N° 5409 DE 31/05/2019 que autoriza a la empresa JRD CONSULTORES SASubicada en Bogotá D.C en Av. Boyacá 73 A - 90, con NIT 900975732-1. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021.

VERIFICACIÓN
3046191742-8050567
WWW.ALTURASJRD.COM

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JOHAN ESTIVEN ROZO LEYTON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.233.692.117**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS	CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.500	0		0		0	0	0	0	15.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	216.600	0		0		0	0	0	0	216.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	680.600	0	0	0	0	0	0		680.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	61.900	0	0	0	0	0	0		61.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	485.000				485.000	0	0	485.000			4.850	485.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	69.700	0	0	69.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	278.500	278.500
Pensión	3	1.113.700	1.113.700
Riesgos Laborales	1	485.000	485.000
CCF	1	69.700	69.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.946.900	1.946.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901614035-1	ESTRUKTEC SAS		CALLE 6 A 69 68	3223671120	frankinmendezvaron@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65324401	$1.946.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000125786	TAFUR RAMIREZ MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
2	CC	1005195748	MORENO REYES EDGAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
3	CC	1012446051	RODRIGUEZ CHAVEZ JERLY MARLEY	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
4	CC	1024484580	MENDEZ VARON FRANNKYN ROOSEVELTH	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
5	CC	1033789009	REALPE PULIDO CRISTIAN ALEXIS	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS005	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0
6	CC	1069724034	URIBE VALBUENA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
7	CC	1069754573	CASAS CASTILLO GINA KATERINE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	11.600	0	0	0	0	0
8	CC	79245524	RODRIGUEZ CONTRERAS JOHN JAIRO	1	0			S	X																25-14	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	5	27.000	CCF22	386.667	3.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


CEDULA DE IDENTIDAD
V 26.730.363
Director
GUANIPA DIAZ
NELSON FELIPE
Nelson
21-03-97 SOLTERO
21-07-09-07-2018
VENEZOLANO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
Migración Colombia
MIGRACIÓN
PRE-REGISTRO
DF4814061
GUANIPA DIAZ
NELSON FELIPE
VENEZOLANA
M
CARIRUBANA

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) NELSON FELIPE GUANIPA DIAZ identificado(a) con PT No. 7129348, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 24 de febrero del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Gerente de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	225	25/02/2023	PT 7129348	GUANIPA DIAZ NELSON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

BCF4B429F624BA04DBAA6BA788B45A10 Certificado impreso el día 2/24/2023 11:04:54 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

NELSON FELIPE
GUANIPA DIAZ
7129348
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIAR
13240346

Bogotá DC. 24 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 24 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	PPT 7129348
Nombres y Apellidos	NELSON FELIPE GUANIPA DIAZ
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	24/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	24/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

El aportante JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR identificado con CC 13240346 inscribio al señor NELSON FELIPE GUANIPA DIAZ identificado con PPT 7129348 con fecha de ingreso 24 de febrero de 2023.

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 24 días del mes de febrero de 2023.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención Servicios de Salud (601) 4441234.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-CAR 12786260



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.004.711.690
YESQUEN PEÑA
APELLIDOS
ALEXIS
NOMBRES
ALEXIS VIVAS QUI
FIRMA

EPS NUEVA EPS

Fondo de Pencion PORVENIR

Selular 312 5460132



FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1990
MOSQUERA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
15-MAY-2008 MOSQUERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Escaneado con CamScanner

052022-3330
CONSECUTIVO

1Alturas s.a.s
Nit 901.161844 - 8
Lic. SST. No.5162/2018
cursodealturas.co

certifica que:

ALEXIS YESQUEN PEÑA

Identificado con la Cedula de Ciudadanía **No.: 1004711690**

Asistió y Aprobó el programa de formación complementaria para trabajo seguro en alturas en cumplimiento a las Resoluciones 1409 de 2012 y 1178 de 2017.
Certificación NTC. 6072 de 2014 No. CO18.01588 de Bureau Veritas.
Acreditado ONAC 09-CPR-008
Bajo la autorización del Ministerio de Trabajo:
No. COR08SE2018220000000034868

Nivel **REENTRENAMIENTO TSA.**
Con Una Intensidad de 20 Horas. Del 5 de May. al 6 de May. de 2022

Por lo cual se le otorga la presente Certificación de
Capacitación y Entrenamiento para Trabajo Seguro en Alturas

Dado en Bogotá, D.C. A los (6) días del mes de Mayo de (2022)

Luis Alfredo Torres Torres
Director de Operaciones

Camilo Heberto Usme Pinilla
Lic SST No. 5208/noviembre 2020
Entrenador

MINTRABAJO

Certificación NTC. 6072 de 2014 No. CO21.01747 de Bureau Veritas. Acreditado ONAC 09-CPR-008

La autenticidad de este certificado puede ser verificada en 1alturas.com.co o en Cel: 317 447 1167 Pbx:(+57 1) 402 9771

DRA. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MÉDICA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA - FUAA
BOGOTA D.C. NIT. 23555999-8
Dirección: Carrera 21 No. 23 – 26 sur
Barrio Olaya - Teléfono: 272 7690



Nro. 5324

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 30/03/2022 HORA:8:54	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: ALEXIS YESQUEN PEA	DOCUMENTO: 1004711690	EDAD: 32 GENERO: M
Empresa: DE UNION TEMPORAL MO 2021	Cargo: OFICIAL DE CONSTRUCION	Tel: 3125460132 -

CONCEPTO MÉDICO LABORAL:

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso y Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 1409 del 23 de julio del 2012

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES LABORALES:	**ENFERMEDAD PROFESIONAL:**
NIEGA	NIEGA
ANTECEDENTES PERSONALES:	**ANTECEDENTES FAMILIARES:**
HOSPITALARIOS: NO REFIERE QUIRURGICOS: NO REFIERE PSIQUIATRICOS: NO REFIERE FARMACOLOGICOS: NO REFIERE OFTALMOLOGICOS: NO REFIERE OTROS : NO REFIERE	DIABETES: MAMÁ HIPERTENSION: NO REFIERE TIROIDES: NO REFIERE CANCER: NO REFIERE ASMA: NO REFIERE OTROS : NO REFIERE
PARACLINICOS:	**EXAMEN FISICO:**
OSTEOMUSCULAR NORMAL VISIOMETRIA NORMAL	PESO: 76 KG ESTATURA: 169 CMS IMC: 26,60 SOBREPESO FC: 73 MIN FR: 20 MIN TA: 120/74 TEMPERATURA: 36.8 °C

RECOMENDACIONES

Dieta baja en grasa y carbohidratos,utilizar los elementos de protección personal hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. el trabajador refiere no presentar enfermedades cardiovasculares, hta, diabetes, evc, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, enfermedad pulmonar crónica o aguda , epoc, condiciones de riesgo para adquirir covid-19.(resolución externa 100-0009 de 2020) decreto 830 de 2020.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

LICENCIA No. 250425 Medica Especialista en Salud Ocupacional	Firma Trabajador C.C. No	6898

CARRERA 21 # 23 – 26 SUR / SEGUNDO PISO / BARRIO OLAYA TEL: 2727690

Escaneado con CamScanner

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-057

Bogotá, D.C, febrero 28 de 2022

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

Referencia: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN HOJA DE VIDA INSPECTOR DE OBRA RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_057

Respetados señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento de los pliegos de condiciones en cuanto al personal de obra, enviamos aprobación correspondiente al cambio de profesional Inspector de obra en reemplazo de la Ingeniera civil Eugenia del pilar Rojas Puerto se aprueba a la arquitecta Valentina Osorio Giraldo para ocupar el cargo como inspectora de obra.

CARGO	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES	PROFESIÓN	No. Tarjeta Profesional
Reemplazo Inspector No. 4	Técnico o tecnólogo profesional en Construcción	Dos (2) años de experiencia como inspector en construcción en contratos de MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	100%	VALENTINA OSORIO GIRALDO	ARQUITECTA	A23282017-1094944405

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3218500440
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: Hoja de vida inspectora de obra

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.094.944.405
OSORIO GIRALDO
APELLIDOS
VALENTINA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1994
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

B-
G.S. RH

F
SEXO

20-SEP-2012 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2600100-01024834-F-1094944405-20180724 0062013040A 1 9905110345

Scanned with CamScanner

En nombre de la República de Colombia y
por autorización del Ministerio de Educación,

La Universidad La Gran Colombia

Personería Jurídica No. 47 de 1953 del Ministerio de Justicia

en virtud a que:

Valentina Osorio Giraldo

CC. 1094944405 Armenia

ha terminado satisfactoriamente los estudios correspondientes
al Programa Universitario de

Arquitectura

y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la Ley y
los Estatutos Universitarios, le confiere el título de:

Arquitecta

En testimonio, le expide el presente Diploma, firmado y refrendado con
el sello mayor de la Universidad, en Armenia, República de Colombia,
el día 12 del mes de Diciembre del año 2017

Rector Delegatario

El Decano

Secretario(a) General

Firma del Titular

Anotado al folio No. 087 del Libro No. 18
Armenia, a Dic. 12 del año 2017

No. 0001321

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E501429

CERTIFICA

Que la Arquitecta VALENTINA OSORIO GIRALDO con cédula de ciudadanía No. 1094944405 de Armenia, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A23282017-1094944405, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 28 del 12 de Diciembre de 2017 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 6 dias del mes de Septiembre de 2022 .

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación y1IyGuh

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la señora **VALENTINA OSORIO GIRALDO**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.094.944.405 de Armenia**,** laboro para mí como **INSPECTORA DE OBRA**, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	256 de 2017
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, ZONA CENTRO (Grupo 9).
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de Octubre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN :	28 de Junio de 2019
VALOR DEL CONTRATO :	$13.269.971.487
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA :	3.806 M2
CUMPLIMIENTO :	Excelente
Actividades Ejecutadas :	PRELIMINARES, CIMENTACION, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA, MAMPOSTERIA, INSTALCIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCEDIOS, RED GAS, INSTALCIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO, REDES EXTERIORES, PAÑETES, PISOS Y ENCHAPES, ACABADOS, CUBIERTAS, PISOS, ASEO Y LIMPIEZA.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ
C.C 13.459.838 CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCAR 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El **CONSORCIO MG 2021** identificado con NIT No. 901.511.981-1, certifica que la señora **VALENTINA OSORIO GIRALDO**, identificado con C.C. 1.094.944.405 de Manizales, se desempeñó como **INSPECTOR DE OBRA** , en el siguiente proyecto:

NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR 2732419 DE 2021
OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - A MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIACIÓN:	6 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 13.269.852.079
ÁREA TOTAL INTERVENIDA :	5.297 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	REPLANTEO, EXCAVACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EQUIPOS ESPECIALES, REDES DE VENTILACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, GAVIONES, PARQUEADERO EN ASFALTO, SENDEROS PEATONALES EN ADOQUÍN, MAMPOSTERÍA, PISOS Y ACABADOS, CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA, VENTANERIA, SEÑALIZACIÓN
CUMPLIMIENTO :	Excelente
FRENTES DE OBRA	Cundinamarca, Meta y Boyacá

La presente certificación se expide a petición del interesado en Bogotá D.C. a los Nueve (9) días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ LÓPEZ
C.C. 13.459.838 CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 8 No.12-21 Oficina 1001 Bogotá - Telefax: 313 3876020
E-mail: consorciomg2021@gmail.com

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-058

Bogotá, D.C, febrero 28 de 2022

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

Referencia: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_055


Respetados señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento de los pliegos de condiciones en cuanto al personal de obra, enviamos aprobación correspondiente al cambio de profesional Residente de obra en reemplazo del Ingeniero civil Carlos Alfonso Cujia Manjarrez se aprueba al arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRÍGUEZ MUÑOZ para ocupar el cargo como residente de obra del grupo 8.

CARGO	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES	PROFESIÓN	No. Tarjeta Profesional
Reemplazo Residente de obra No. 2	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	"Cinco (5) años de experiencia como residente de obra de obra en contratos de MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REPARACIONESLOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DEEDIFICACIONES."	100%	LEONAROD MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ	ARQUITECTO	A25012003-79715893

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3218500440
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: Hoja de vida inspectora de obra

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79715893

RODRIGUEZ MUÑOZ
APELLIDOS

LEONARDO MAURICIO
NOMBRES

Mauricio Rodríguez M.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-DIC-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500113-43065642-M-0079715893-20020103 03073 02002B 01 101834390

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

El Presidente del Consejo
Certifica

1. Que en cumplimiento de la ley 435 de 1998 el Arquitecto **LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ, identificado** con cédula de ciudadanía No. **79.715.893 de Bogotá** D.C., presentó solicitud de Matrícula Profesional de **Arquitecto** ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, acreditando para el efecto su grado profesional, otorgado por la **Universidad La Gran Colombia** el día **21 de Marzo de 2002**.

2. Que, estudiada la solicitud, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares mediante la resolución No. **01 del 3 de Febrero de 2003**, matriculó al Arquitecto **LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ**, en el Registro Nacional de Arquitectos, bajo el número:

A25012003-79715893

Este certificado se expide en Bogotá D.C., el día 7 de Febrero de 2003.

Presidente

Juramento
Juro conocer, acatar, cumplir y hacer cumplir la Ley 435 de 1998, y el código de ética.



Arquitecto

Matrícula Profesional
A25012003-79715893

Carrera 6 No. 26 – 85 Piso 2, Tels. 3502700 - 3502702 – 3502704
Fax. 3804201 administracion@arquitecturacolombia.org.co
Bogotá D.C.- COLOMBIA

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E526485

CERTIFICA

Que el Arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ con cédula de ciudadanía No. 79715893 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25012003-79715893, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 1 del 3 de Febrero de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 dias del mes de Diciembre de 2022.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación EXJKfnA

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

La República de Colombia

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Personería Jurídica No. 47 de 1953 del Ministerio de Justicia

teniendo en cuenta que

Leonardo Mauricio Rodríguez Muñoz

c.c. Nº 79.715.303 de Bogotá, D.C.

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el título profesional de

Arquitecto

En testimonio, le expide el presente **Diploma**, firmado y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, D. C. el 21 de Marzo del año 2002.

El Rector

Secretario General

El Decano

Registrado bajo el Nº 1205

Anotado al Folio Nº 140 del Libro Nº 5

Firma del Titular

Bogotá, D.C., a 9 de Abril del 2002

ACTA DE GRADO No. 217

En la ciudad de Bogotá el día 7 de diciembre de 2012, se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Señor Teniente Coronel RICHARD GONZALEZ VERA, en el cual la Escuela de Ingenieros Militares, previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

A **LEONARDO MAURICIO RODRÍGUEZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº79.715.893 de Bogotá, quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y las normas legales y le otorgó el Diploma que lo acredita como tal.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá a los 7 días del mes de diciembre de 2012.

Firmada por

TC RICHARD GONZALEZ VERA Director	MY ABRAHAM RUIZ VASQUEZ Secretario General	CT LEONARDO CARDENAS ORTEGA Inspector de Estudios

Es fiel copia tomada del original en lo pertinente.

Secretario General

Ing. Olaguer Agudelo
C.C. 3.169.341 Sesquile

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo OLAGUER AGUDELO PRIETO, certifico que el arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.715.893 de Bogotá D.C., y Matricula profesional No. A25012003 – 79715893, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA, con una dedicación del 100%, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	21150005 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL AREA DE URGENCIAS Y ARCHIVO CENTRAL DEL HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS ESES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA.
FECHA DE INICIACIÓN:	27 de Julio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN :	10 de Julio de 2017
VALOR TOTAL CONTRATO:	$4.780.429.719
AREA TOTAL INTERVENIDA :	2.126 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTLACIONES HIDROSANITARIAS, EQUIPOS ESPECIALES, PISOS, ENCHAPES, PINTURAS, CUBIERTAS, ACABADOS EN GENERAL,
CUMPLIMIENTO :	Excelente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de 2017.

Atentamente,



ING. OLAGUER AGUDELO PRIETO
CC.3.169.341 SESQUILE
MP. 70202-128472 TLM

Carrera 4 No.10-12 Of. .03 Ibagué – Tolima
Cel. 310.2224514 / proyectosciviles2015@outlook.com

Ing. Olaguer Agudelo
C.C. 3.169.341 Sesquile


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo OLAGUER AGUDELO PRIETO, certifico que el Arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ con cedula de ciudadanía No. 79.715893 de Bogotá D.C., y matricula profesional No. A25012003 – 79715893, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA, con una dedicación del 100%, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	1417 DE 2010
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO GARCIA DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de Enero de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN :	14 de Abril de 2013
VALOR TOTAL CONTRATO:	$3.000.000.000
AREA CUBIERTA :	1.302 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA :	3.552 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	PRELIMINARES, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN CERRAMIENTO), CIMENTACIÓN, OBRA CIVIL (ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPE DE MUROS, MESONES EN CONCRETO), ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICA, PISOS Y ENCHAPES, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS), INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, BAÑOS (APARATOS SANITARIOS, GRITERÍAS PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS, DISPENSADORES DE PAPEL, JABONERAS), VIDRIOS Y ESPEJOS, CUBIERTAS, ASEO.
CUMPLIMIENTO :	Excelente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Cinco (05) días del mes de Noviembrede 2017.

Atentamente,



ING. OLAGUER AGUDELO PRIETO
CC.3.169.341 SESQUILE
MP. 70202-128472 TLM

Carrera 4 No.10-12 Of. .03 Ibagué – Tolima
Cel. 310.2224514 / proyectosciviles2015@outlook.com

CONSORCIO GIRARDOT AG

NIT 900.191.295-9

CERTIFICACION

La suscrita **MARTHA LUCIA AYCARDI PACHECO**, identificada con Cédula de ciudadanía No 60.306.611 de Cúcuta, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio **GIRARDOT AG**, del contrato 164 de 2007 cuyo objeto es Elaboración del Diseño Arquitectónico, Estudios Técnicos Complementarios y la Ejecución de las obras necesarias para la Construcción de los Despachos Judiciales de Girardot (Cundinamarca).

Hago constar que el Arquitecto **LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.715.893 de Bogotá D.C., y matricula profesional No. A25012003 – 79715893, se desempeño como **RESIDENTE DE OBRA,** del siguiente proyecto:

CONTRATO No	05 DE 2008
OBJETO	LA ELABORACION DEL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y LA CONSTRUCCION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.
UBICACIÓN	CARRERA 10 N 37-39
VALOR OBRA	$4.964.928.681
FECHA DE INICIACION	12 DE DICIEMBRE DE 2008
FECHA DE TERMINACION	02 DE ABRIL DE 2012
AREA DISEÑADA	
CONSTRUIDA CUBIERTA	4.800 m2
AREA INTERVENIDA	10.000 m2
NUMERO DE PISOS	4 PISOS Y SOBRECUBIERTA
CALIFICACION	BUENA

Se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Julio de 2012.

MARTHA LUCIA AYCARDI PACHECO
Representante Legal
CONSORCIO GIRARDOT AG

Copia a : Consecutivo/Coordinación/Archivo GG/Gestión Documental/DCC/KABS

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-059

Bogotá, D.C, febrero 28 de 2022

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

Referencia: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN CAMBIO DE PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_028

Respetados señores:

Por medio de la presente y en cumplimiento de los pliegos de condiciones en cuanto al personal de obra, enviamos aprobación correspondiente al cambio de profesional Residente de obra en reemplazo del Ingeniero civil Robinson Damián león Villegas se aprueba al arquitecto LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO para ocupar el cargo como residente de obra del grupo 8.

CARGO	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES	PROFESIÓN	No. Tarjeta Profesional
Reemplazo Residente de obra No. 1	Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura	"Cinco (5) años de experiencia como residente de obra de obra en contratos de MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REPARACIONESLOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES."	100%	LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO	INGENIERO CIVIL	17202-302796 CLD

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3218500440
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: Hoja de vida inspectora de obra


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.053.816.598
CASTAÑO CARBALLO
APELLIDOS
LUIS MIGUEL
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1992
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.92
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
16-FEB-2010 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-0900100-00755085-M-1053816598-20151010
0046900047A 1
4783611463

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



MATRÍCULA PROFESIONAL No.

17202-302796 CLD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 07/05/2015

LUIS MIGUEL
CASTAÑO CARBALLO
C.C. 1053816598
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

A

Luis Miguel Castaño Carballo

C.C. 1.053.816.598 de Manizales

El Notario Treinta y Siete de Bogotá D.C.
DA FE que, esta reproducción fotostática corresponde exactamente al documento original que tuvo a la vista.
30 SEP 2017
KATTY ROJAS G.
NOTARIA ENCARGADA
Bogotá D.C. - Colombia

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO, Y PREVIO AL JURAMENTO DE RIGOR, OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Manizales, a los 26 días del mes de marzo de 2015

DECANATURA DE FACULTAD | RECTORÍA | SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 3500, Folio 34 del Libro de Diplomas No. 5

DE LA SEDE DE Manizales FACULTAD DE Ingeniería y Arquitectura

0145581

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

FACULTAD DE

Ingeniería y Arquitectura

ACTA DE GRADO NÚMERO 3447

El consejo de Facultad en su sesión del día 27 de enero de 2015 - Acta No. 02

CONSIDERANDO QUE

Luis Miguel Castaño Carballo

C.C. 1.053.816.598 de Manizales

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número **145581** *consignado en el Registro No.* **3500, Folio 34 del Libro No. 5**
En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de **Manizales, a los 27 días del mes de enero de 2015**

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Luis Miguel Castaño Carballo

C.C. 1.053.816.598 de Manizales

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Vías y Transporte

EN LA CIUDAD DE Manizales, a los 31 días del mes de marzo de 2016

El Notario Treinta y Siete de Bogotá D.C.,
DA FE que, esta reproducción fotostática corresponde
exactamente al documento original que tuvo a la vista.
30 SEP 2017
KATTY ROJAS G.
NOTARIA ENCARGADA
Bogotá D.C. - Colombia

RECTORÍA

DECANATURA DE FACULTAD

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 1176, Folio 79 del Libro de Diplomas No. 2

DE LA SEDE DE Manizales FACULTAD DE Ingeniería y Arquitectura

43679

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

FACULTAD DE

Ingeniería y Arquitectura

ACTA DE GRADO NÚMERO 1175

El consejo de Facultad en su sesión del día 09 de febrero de 2016 - Acta No. 4

CONSIDERANDO QUE

Luis Miguel Castaño Carballo

C.C. 1.053.816.598 de Manizales

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Especialista en Vias y Transporte

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 43679 *consignado en el Registro No.* 1176, Folio 79 del Libro No. 2

En testimonio de la anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Manizales, a los 09 días del mes de febrero de 2016

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

Scanned by CamScanner

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BOGOTÁ D.C.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Consejo Superior y el Rector de la Universidad de los Andes
con las debidas autorizaciones legales y teniendo en cuenta que

Luis Miguel Castaño Carballo

C. C. 1.053.816.598

ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorgan, con los derechos y obligaciones correspondientes, el diploma de

Magíster en Ingeniería Civil

El Presidente del Consejo Superior	El Rector	La Decana de la Facultad	La Secretaria General

Bogotá D.C., 16 de abril de 2021
REGISTRADO: LIBRO 17 FOLIO 81

Fecha de Envio: 16-abril-2021
https://vericerti.uniandes.edu.co
Codigo de Verificacion: 7B8F2-66F83-0FFD9

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo 1964.
Reconocimiento personeria jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD: DECRETO 1297 DEL 30 DE MAYO DE 1964
RECONOCIMIENTO PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN No. 28 DEL 23 DE FEBRERO DE 1949 MINJUSTICIA
NIT 860.007.386-1

Expide copia de lo pertinente de la siguiente Acta de Grado:

Acta de Grado No. 216 Libro 17 -Folio 81 del 16 de abril de 2021

En Bogotá, a 16 de abril de 2021, se reunieron de manera virtual y con la autorización del Consejo de las Facultades de Administración, Arquitectura y Diseño, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Educación, Ingeniería, Medicina, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – Cider y Escuela de Gobierno, para otorgar el título correspondiente a los siguientes graduandos que cumplieron con los requisitos reglamentarios exigidos por la Universidad. Para constancia firma el doctor ALEJANDRO GAVIRIA URIBE, Rector de la Universidad; la doctora RAQUEL BERNAL SALAZAR, Vicerrectora Académica; la doctora VENETA STEFANOVA ANDONOVA ZULETA, Decana de la Facultad de Administración; el doctor RAFAEL HERNANDO BARRAGAN ROMERO, Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño; la doctora PATRICIA ZALAMEA FAJARDO, Decana de la Facultad de Artes y Humanidades; el doctor CARLOS DANIEL CADENA ORDOÑEZ, Decano de la Facultad de Ciencias; el doctor MAURICIO NIETO OLARTE, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales; la doctora ELEONORA LOZANO RODRIGUEZ, Decana de la Facultad de Derecho; la doctora MARCELA ESLAVA MEJIA, Decana de la Facultad de Economía; el doctor EDUARDO ESCALLON LARGACHA, Decano de la Facultad de Educación; la doctora RUBBY CASALLAS GUTIERREZ, Decana de la Facultad de Ingeniería; la doctora NATALIA MEJIA GAVIRIA, Decana de la Facultad de Medicina; la doctora NATHALIA FRANCO BORRERO, Directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo – Cider; la doctora MARIA MARGARITA ZULETA GONZALEZ, Directora de la Escuela de Gobierno; la doctora MARIA TERESA TOBON RUBIO, Secretaria General; la doctora CLAUDIA MARGARITA MEZA BOTERO, Directora de Admisiones y Registro y la doctora JUANA MARGARITA LOPERA DONCEL, Jefe de Registro.

"(…)*MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL*****

REGISTRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE LA EDUCACION SUPERIOR - SNIES – BAJO EL CODIGO 1578

87862. Luis Miguel Castaño Carballo C. C. 1.053.816.598 (…).

FIRMADA
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE - Rector
MARIA TERESA TOBON RUBIO - Secretaria General (…)"

CLAUDIA MARGARITA MEZA BOTERO
Directora
Oficina de Admisiones y Registro

Fecha de Envío: 2021-04-09
https://vericerti.uniandes.edu.co
Codigo Verificacion: B1610-0917A-34939

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD: DECRETO 1297 DEL 30 DE MAYO DE 1964
RECONOCIMIENTO PERSONERÍA JURÍDICA: RESOLUCIÓN 28 DEL 23 DE FEBRERO DE 1949 MINJUSTICIA
NIT. 860.007.386-1

C E R T I F I C A:

Que el señor LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.053.816.598, recibió el título de MAGÍSTER EN INGENIERÍA CIVIL el 16 de abril del año 2021, de acuerdo al acta 216 libro 17 folio 81 de la misma fecha. El estudiante cursó su programa de maestría con el énfasis en INGENIERÍA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN. ESTA CONSTANCIA SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO.

FIRMADO DIGITALMENTE POR:
JUANA MARGARITA LOPERA DONCEL
Jefe
Oficina de Registro

Bogotá, julio 21 de 2021
M.Peña

¿Qué es un Certificado Digital?

Es un método que asocia la identidad de una persona o empresa, con un mensaje o documento electrónico, para garantizar la autenticidad del emisor, el no repudio del origen y la integridad del contenido. Los documentos y las comunicaciones firmados digitalmente tienen el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. Si desea confirmación adicional, por favor escríbanos a verificaciones.ayr@uniandes.edu.co

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-921811

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1053816598, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-302796 desde el 07 de Mayo de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 535.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Agosto del año dos mil veintiuno (2021).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El **CONSORCIO MG 2021** identificado con NIT No. 901.511.981-1, certifica que el señor **LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO**, identificado con C.C. 1.053.816.598 de Manizales, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA** , en el siguiente proyecto:

NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR 2732419 DE 2021
OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - A MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIACIÓN:	6 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 13.269.852.079
ÁREA TOTAL INTERVENIDA :	5.297 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	REPLANTEO, EXCAVACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EQUIPOS ESPECIALES, REDES DE VENTILACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, GAVIONES, PARQUEADERO EN ASFALTO, SENDEROS PEATONALES EN ADOQUÍN, MAMPOSTERÍA, PISOS Y ACABADOS, CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA, VENTANERIA, SEÑALIZACIÓN
CUMPLIMIENTO :	Excelente
FRENTES DE OBRA	Cundinamarca, Meta y Boyacá

La presente certificación se expide a petición del interesado en Bogotá D.C. a los Nueve (9) días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ LÓPEZ
C.C. 13.459.838 CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 8 No.12-21 Oficina 1001 Bogotá - Telefax: 313 3876020
E-mail: consorciomg2021@gmail.com

AGOPLA SAS
NIT. 830.132.864-4

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el Ingeniero **LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO**, Identificado con C.C 1.049.626.361 de Bogotá y Matricula Profesional 117202-302796 CLD, se desempeñó como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	016 DE 2018
OBJETO:	EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACION ARQUITECTONICA Y ADECUACION DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCO).
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de Enero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN :	31 de diciembre de 2020
VALOR DEL CONTRATO :	$3.499.810.055
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA :	563,32 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA :	955,77 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, CIMENTACION, Y ESTRUCTURA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, MAMPOSTERIA Y PAÑETE, BASES Y PISOS, CARPINTERIA METALICA, APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS, PINTURA, VIDRIOS Y CERRADURAS, CUBIERTA, OBRAS EXTERIORES Y VARIOS, , ACABADOS, ASEO Y LIMPIEZA.
CUMPLIMIENTO :	Excelente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2021.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO MORENO MONTES
C.C. 79.954.245 BOGOTA
Representante Legal

Carrera 11B No.98-08 Oficina 402 Bogotá - Telefax: 4 45 75 54
E-mail: agoplasas@gmail.com

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el Ingeniero **LUIS MIGUEL CASTAÑO CARBALLO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.053.816.598 de Manizales y Matricula Profesional 17202-302796 CLD, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA**, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	256 de 2017
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, ZONA CENTRO (Grupo 9).
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de Enero de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN :	20 de Diciembre de 2018
VALOR DEL CONTRATO :	$13.269.971.487
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA :	3.806 M2
CUMPLIMIENTO :	Excelente
Actividades Ejecutadas :	PRELIMINARES, CIMENTACION, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA, MAMPOSTERIA, INSTALCIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCEDIOS, RED GAS, INSTALCIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO, REDES EXTERIORES, PAÑETES, PISOS Y ENCHAPES, ACABADOS, CUBIERTAS, PISOS, ASEO Y LIMPIEZA.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Veintiseis (26) días del mes de Diciembre de 2018.

Cordialmente,

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ
C.C 13.459.838 CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCAR 2017

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-060

Bogotá, D.C, marzo 01 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A CORREO: LLAMADO DE ATENCIÓN INTERVENTORIA POR NO RADICACIÓN DE ACTAS

Respetados señores:

En respuesta al llamado de atención por la no radicación de actas del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 4155718 y el contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 4077645, nos permitimos informar que se recibió una primera acta parcial preliminar hasta el día 23 de febrero por parte del contratista **CONSORCIO MIA GP** por un valor de $459.715.644 con sólo las memorias y sin la documentación correspondiente de acuerdo a lo plasmado por el procedimiento de actas parciales enviado por ustedes.

Es importante destacar que, debido a los tiempos el equipo de interventoría, no procedió de manera oportuna a la radicación de estas actas, ya que aún a la fecha del 24 de febrero se estaba en verificación de cantidades, y memorias del acta presentada, adicionalmente y como soporte de lo mencionado citamos el literal **G** del pliego de condiciones **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA CADA GRUPO** : Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, siguientes a la fecha de terminación del periodo o máximo los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

CONSORCIO TIG

Expresado lo anterior y en cumplimiento a los tiempos por parte de esta interventoría en cuanto a la revisión del acta parcial No. 1 se informa que el día 25 de febrero de 2022 se envió otra radicación del acta No. 1 mediante el oficio **2023_RUU_MGP_063** por un valor de $1.261.828.738 generando reprocesos tanto en los tiempos, como en verificación de cantidades a cobrar que aún no están ejecutadas. Sin embargo, una vez que se recibió esta documentación se procedió de inmediato a su revisión en los términos y plazos establecidos en los pliegos de condiciones y anexos técnicos. Por ende, se da la recomendación al contratista CONSORCIO MIA GP que la radicación de estos cortes de obra sea realizada los 20 de cada mes para agilizar y cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de radicación de actas parciales 2023 de la secretaria de educación.

Como interventoría nos comprometemos a trabajar con diligencia y responsabilidad en la gestión de las actas y demás documentación relacionada con los contratos de interventoría y obra, con el fin de evitar futuras situaciones similares. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

cordialmente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo: Correos de radicación de Acta No. 1 por parte del contratista CONSORCIO MIA GP

Gmail **CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>**

Acta Parcial No 1 Preliminar - Primera Revision

2 mensajes

ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 7:00
Para: CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>, HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>
Cc: OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>, castanoconstruccionesc@gmail.com, arq.juancristancho@gmail.com

Buen dia

Se envía el Acta de corte parcial de obra No 1 en su versión preliminar para revisión de las partes y para resolver inquietudes.

HUGO: Quisiera saber si en la columna K pongo los datos a costo directo, ya que el formato enviado está realizando la sumatoria a Costo directo y luego la multiplicación por el AIU o si los dejo en costo total como estan en la propuesta económica y modifico las fórmulas de las sumatorias de abajo.

INTERVENTORÍA: Por favor me regalan el Nit del consorcio, el teléfono según Rut, nombre y cédula de representante legal. Favor revisar únicamente cantidades, ya que el costo directo y total lo debo terminar de verificar y ver si mantengo las fórmulas o las modifico

- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO DIANA TURB…**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO DIANA TURB…**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO ENRIQUE OL…**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO ENRIQUE OL…**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO JOSE MARTI …**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO JOSE MARTI …**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO RESTREPO …**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO RESTREPO …**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO SAN AGUSTI…**
- **20230222 MEMORIAS ACTA 1 COLEGIO SAN AGUSTI…**

.

Les agradezco resolver mis inquietudes

Cordialmente,

Ing. Teresita Argoty
Consorcio Mia GP

ACTA OBRA MEJORAMIENTOS No 1.xlsm
1990K

CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 14:24
Para: ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com>

Cordial saludo,
Sres. CONSORCIO MIA GP

Adjuntamos lo requerido:

Nit: 901649890-3
Tel: 3112004626
RL: Edgar Alfredo Salazar Bernal
CC. 79.553.539

Atentamente,

--

Steven A. Camacho
Coordinador de proyectos
Cra 47A N° 93-41 / La Castellana
Bogotá D.C. – Colombia
Movil:+57 3214605592

[El texto citado está oculto]

Gmail **CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>**

Remisión Oficio 2022_RUU_MGP_063 - Acta de Pago Parcial No 1.

1 mensaje

ConsorcioMiaGPRU <consorciomiagpru2022@gmail.com> 25 de febrero de 2023, 7:35
Para: CONSORCIO TIG <consorciotig@gmail.com>
Cc: OBRAS MIA-GP <obrasmiagp@gmail.com>, HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS <htibaquira@educacionbogota.gov.co>, ALEXANDER OSORIO PAEZ <alosorio@educacionbogota.gov.co>, castanoconstruccionesc@gmail.com, arq.juancristancho@gmail.com, carceles2019@gmail.com

Buen día,

Se remite el oficio del asunto para sus fines pertinentes.

Cordialmente,

Mateo Luzardo Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Mia GP

3. ACTA OBRA MEJORAMIENTOS No 1.xlsm

4. Memorias Excel.rar

Documentos individuales.rar

063-2023_RUU-MGP - Acta de pago parcial No 1.pdf
15453K

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, marzo 01 de 2023

TIG-MEM-061

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ENTREGA CORRECCIONES A MEMORIAS DEL ACTA PARCIAL No.1

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones hechas en campo para las memorias de cálculo para el acta parcial No.1 entregadas el día 23 de febrero de 2023 vía correo electrónico.

Se les recuerda que los cortes de obra deben ser radicados de acuerdo al memorando de la supervisión los días 25 de cada mes, es decir que en esa fecha ya debe estar conciliado y aprobado el corte para radicación ante la entidad

Es por ello, que solicitamos que los 20 de cada mes se envíen memorias y documentos pertenecientes al corte parcial mensual, para que esta interventoría tenga el tiempo prudencial para la revisión y ustedes de hacer las subsanaciones a que haya a lugar

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			20	1,0	20,00
PASAN:				SUBTOTAL	20,00
				TOTAL	20,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

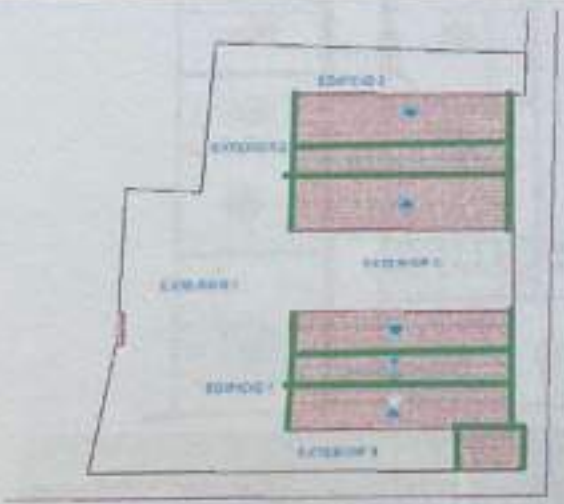

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
nsol en perfil= 33			25.00	2.00	50.00
ISAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

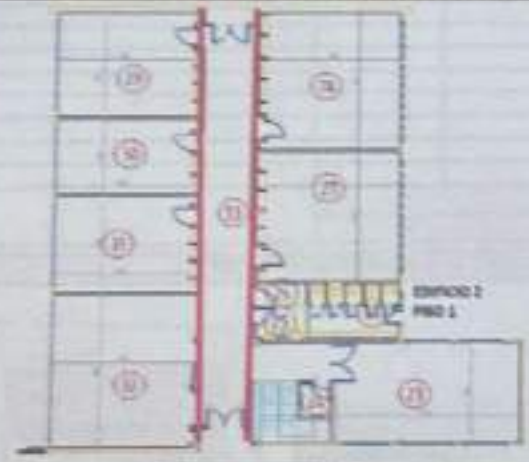









DESCRIPCION

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2					
ALA 3	227,34	8,76	24,03	6%	0,00
					227,34
PASAN:				SUBTOTAL	227,34
				TOTAL	227,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

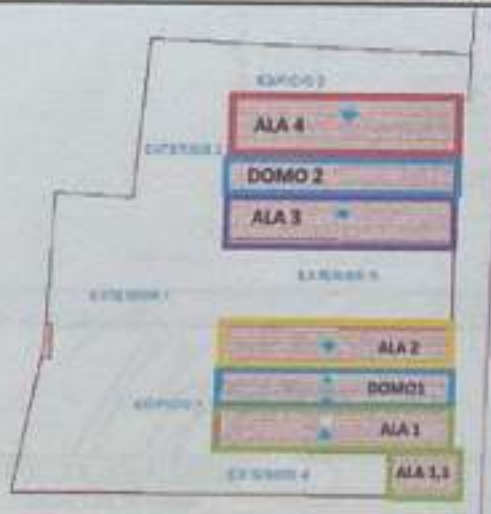



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP	CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
			30	1,0	30,00
PASAN:					
				SUBTOTAL	30,00
				TOTAL	30,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

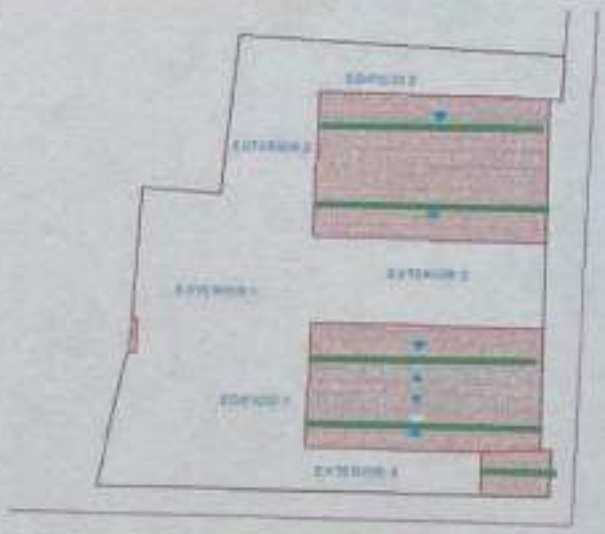

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1
	PREDIO:	SAN AGUSTIN SEDE A
	FECHA:	30 / 01 / 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077846
OBJETO CONTRATO:	MEJORAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PLANTELES FÍSICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.5.3	KG	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
REPLANTEO					
Reforzamiento estructura cubierta	17.15			20	343.00
		1.45	4.74		6.87
					6.87
					6.87
					6.87
					6.87
		2.45	31		
PAGUA				SUBTOTAL	1.029.00
				TOTAL	1029

→ esta instalada

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GALLERO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAOLA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Baterias sanitarias			8.00	3	24.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	24.00
				TOTAL	24

12

Evidencia

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIS
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.34	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3	43,76			1,00	43,76
				SUBTOTAL	43,76
PASAN:				TOTAL	43,76

2 + cobles

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA SELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	29	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑO MUJERES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	13.00
				TOTAL	13

5/5 → no realizó

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

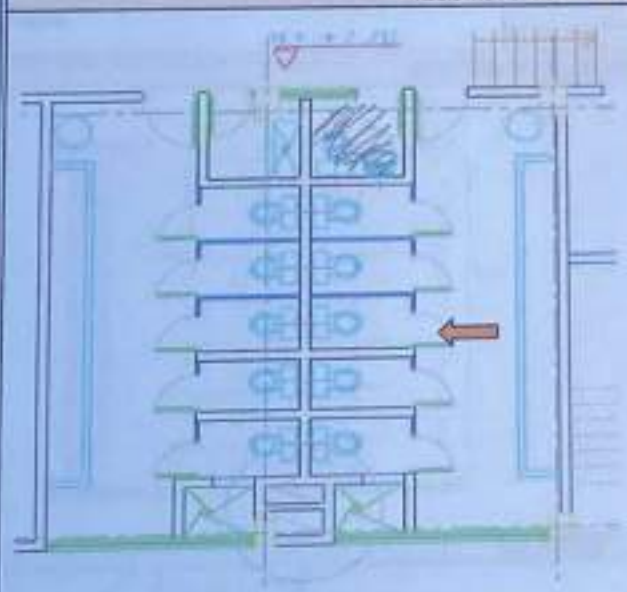





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0.00
BAÑOS HOMBRES PISO 3	1.30	1.75		4.00	9.10
BAÑO MUJERES PISO 3	1.30	1.75		5.00	11.38
PASAN:				SUBTOTAL	20.48
				TOTAL	20.48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

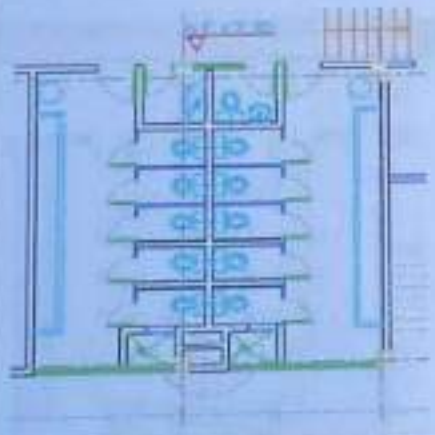

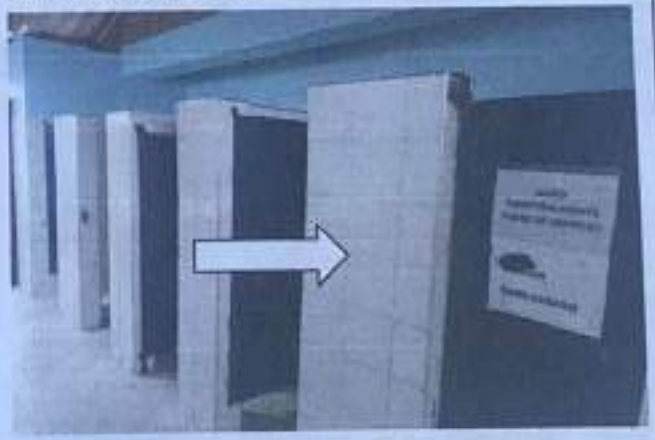

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TX3
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4777645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			256.00	1	256.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
PASAN					SUBTOTAL	256.00
					TOTAL	256

→ medidos

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

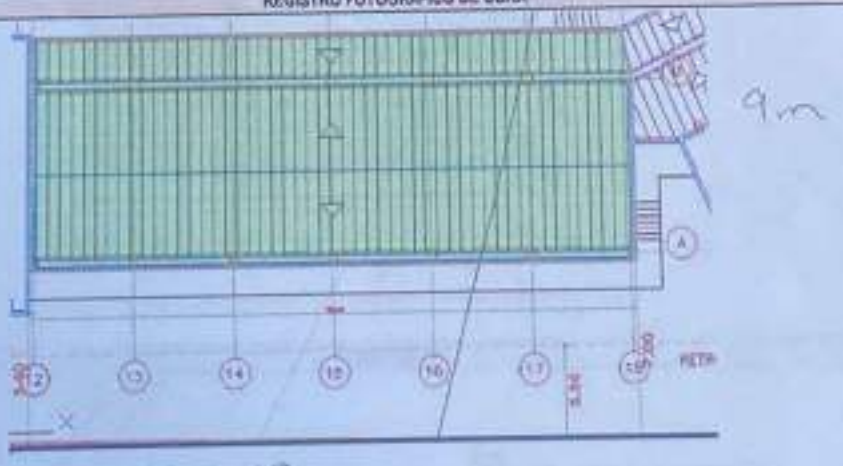

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 3

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Longitud 1	22.68			1	22.68
Longitud 2	6.76			1	6.76
PASAN:				SUBTOTAL	29.44
				TOTAL	29.44

23,68 + 4,57 + 1,42
→ NO cuadra

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

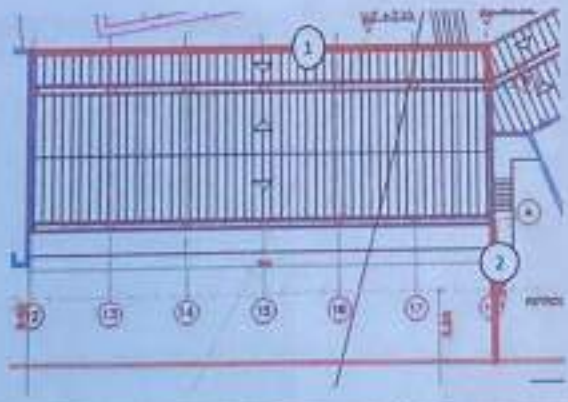

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4277645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.06 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS PISO 3	49.15			1	49.15
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	49.15
				TOTAL	49.15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

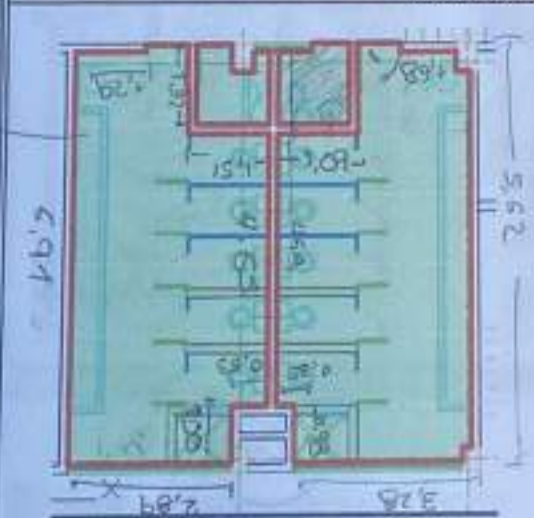





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA SELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	23	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3	36,64		1,75		64,65
BAÑO MUJERES PISO 3	36,64		1,75		64,65
BAÑOS PROFESORES PISO 3	4,2		1,75		7,35
PASAN:				SUBTOTAL	136,64
				TOTAL	136,64

medidos

(7,32+1,13)*7,75

Nose hizo

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

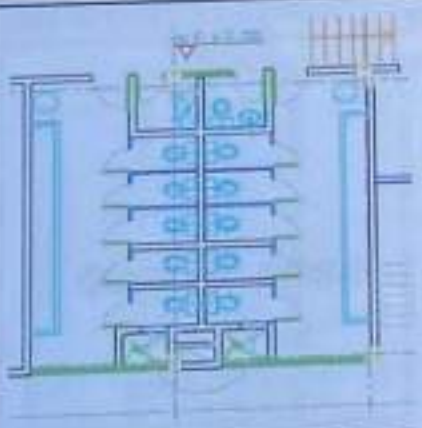



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.23	UN	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑO MUJERES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	13.00
				TOTAL	13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

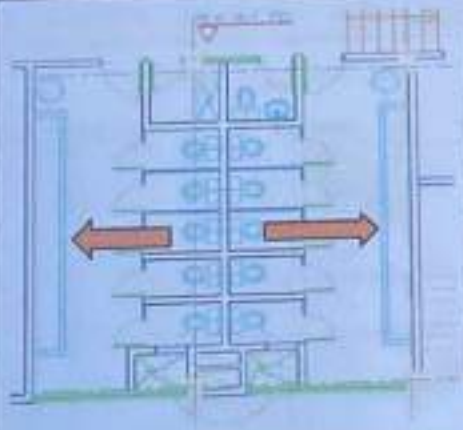





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CD1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			11.00	1	11.00
BAÑO MUJERES PISO 3			11.00	1	11.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			2.00	1	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	24.00
				TOTAL	24

ya se cobraron los sanitarios

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

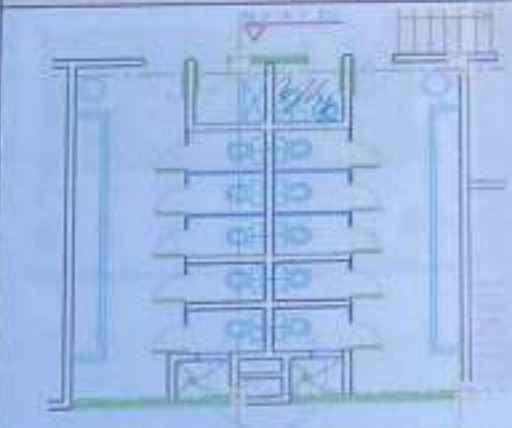



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	256.00			1	256.00
PASAN:					SUBTOTAL	256,00
					TOTAL	256

Medidas

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

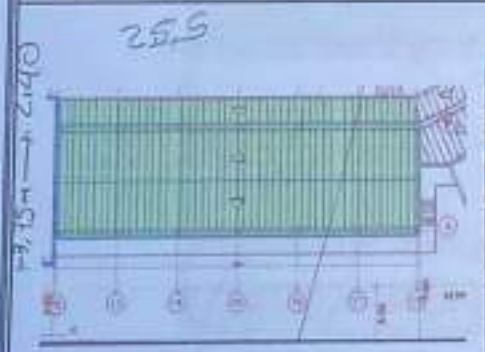



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TJG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077646
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3		1,20	1,80	2,00	4,32
PASAN:				SUBTOTAL	4,32
				TOTAL	4,32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

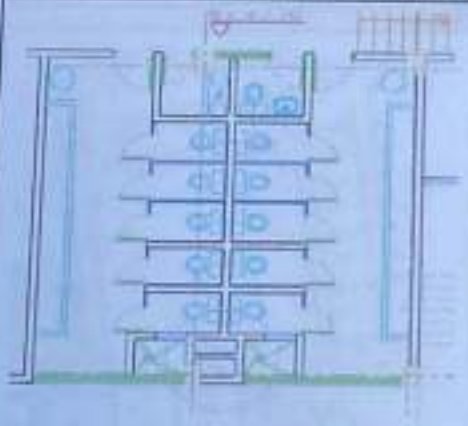



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			2.00	9	54.00
PSBE			1.00	15	15.00
Baterias sanitarias			8.00	3	24.00
					8.00
					11.00
					8.00
PASAN:				SUBTOTAL	96,00
				TOTAL	96

4
4
Bob 4
Bob 2
2
1
1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	26 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO T93
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077845
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
CANALES	AREA 1	24,00			2	48,00
		8,00			1	8,00
BAJANTES	AREA 1	13,20			5	66,00
PASAN:					SUBTOTAL	122,00
					TOTAL	122

Evidencia

X

No se hizo

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077846
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LONG.	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES			8.70	21	182.70
Transversal			28.00	16	448.00
longitudinal					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUBTOTAL	630,70
PASAN:				TOTAL	630,7

medidas Falta baños

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077845
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			256,00	1	256,00
					SUBTOTAL	256,00
PASAN:					TOTAL	256

Recibido

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

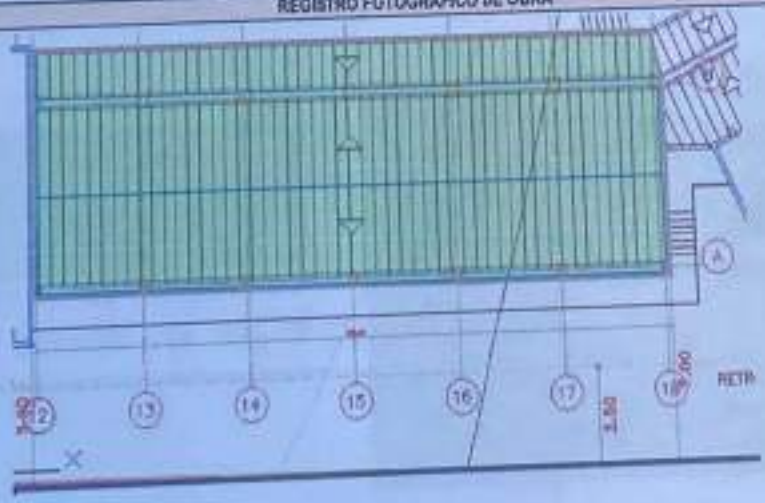

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	256.00			1	256.00

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.3	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	256.00			1	256.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.4	KG	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			5,00	1	5,00
BAÑO MUJERES PISO 3			5,00	1	5,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1,00	1	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	11,00
				kg/UN	26,1
				TOTAL	287,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

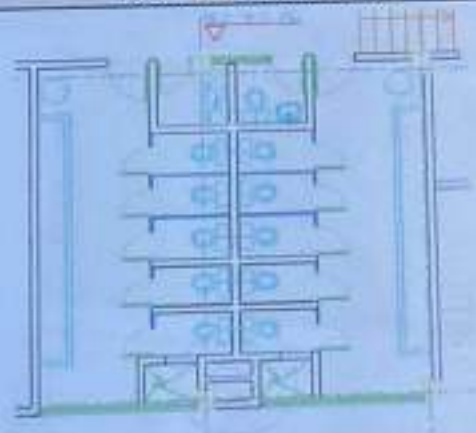

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CD1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
REPLANTEO COLEGIO COLOMBIA VIVA SEDE C	750.00				750.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
					0.00
CERRAMIENTO ACOPIO DE MATERIALES Y AREAS DE TRABAJO			150.00	1	150.00


→ medidas

OBSERVACION:

PASAN:

SUBTOTAL	150,00
TOTAL	150,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

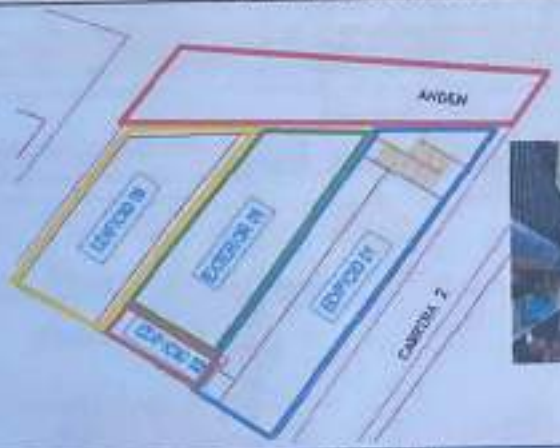



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TV3
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					
12	15,00	5,00	3,00	1,00	15,00
13	8,80	2,20	3,00	1,00	8,80
EDIFICIO 2 PISO 1					
23	49,93	7,85	6,36	1,00	49,93
24	4,74	2,37	2,00	1,00	4,74
25	15,23	3,50	4,35	1,00	15,23
26	7,45	2,45	2,76	1,00	7,45
27	38,14				38,14
EDIFICIO 3 PISO 1					
18	44,20	6,95	6,36	1,00	44,20
20	44,20	6,95	6,36	1,00	44,20
				SUBTOTAL	226,49
PASAN:				TOTAL	226,49

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCIÓN

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077643 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
	7.30	1.60	2.30	2.00	7.36
	5.00	2.10	3.85	1.00	8.09
12					
				SUBTOTAL	15.45
PASAN:				TOTAL	15.45

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TVG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
12	3.97	0.82	1.60	4.00	3.97
				SUBTOTAL	3.97
PASAN:				TOTAL	3.97

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	IDU - PROYECTO 4207641 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, Y EN SECRETARÍAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	5.11	1.90	1.82	1.00	5.11
	1.40	2.40	1.20	1.00	1.21
				SUBTOTAL	10.32
PASAN:				TOTAL	10.32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12 BAÑOS NIÑOS					
INODORO				4,00	4,00
LAVAMANOS				2,00	2,00
ORINAL				2,00	2,00
				SUBTOTAL	8,00
PASAN:				TOTAL	8,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.31	ML	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12 BAÑOS NIÑOS			50.00		50.00
PASAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

P.

medidas

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 2	-				0.00
18 Y 19	28.00			5%	31.32
EDIFICIO 3 PISO 2					0.00
23,24,25,26,27	134.00			8%	144.72
PASAN:				SUBTOTAL	176.04
				TOTAL	176.04

medidas

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12				6.00	6.00
13				4.00	4.00
EDIFICIO 3 PISO 1					
18				7.00	7.00
20				7.00	7.00
EDIFICIO 3 PISO 2					
23				7.00	7.00
24				7.00	7.00
25				5.00	5.00
26				15.00	15.00
27					
PASAN:				SUBTOTAL	67.00
				TOTAL	67.00

? No se hizo
No se hizo
No se hizo

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					0.00
EDIFICIO 2 PISO 1				2.00	2.00
12				2.00	2.00
13					
EDIFICIO 3 PISO 1				4.00	4.00
19				4.00	4.00
20					0.00
EDIFICIO 3 PISO 2				4.00	4.00
23				4.00	4.00
24				4.00	4.00
25				4.00	4.00
26				4.00	4.00
27					
				SUBTOTAL	33.00
PASAN:				TOTAL	33.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIC
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			[illegible]	1.00	[illegible]
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	28	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2				100	100.00
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	28	03	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			60	1.00	60.00
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

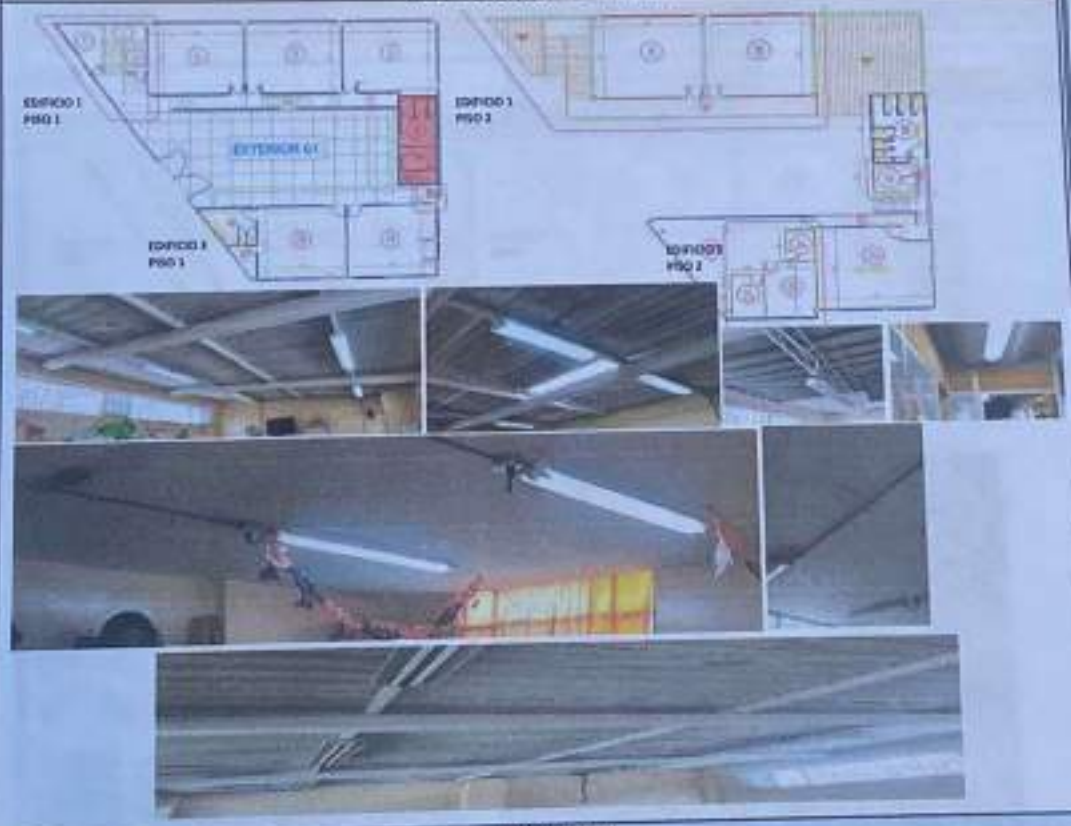

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-01	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	
EDIFICIO 2 PISO 2					
15 Y 16	28.00			8%	
EDIFICIO 3 PISO 2	138.20			8%	
21,24,25,26,27					
				SUBTOTAL	176,04
PASAN:				TOTAL	176,04

med. de

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1

FRENTE:

COLEGIO JOSE MARTI SEDE A
LUIS LOPEZ DE MESA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	CO1 PCONTR 4077045 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 9

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores	178,5	8,5	21	1	178,5

PASAN:	SUBTOTAL	178,50
	TOTAL	178,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Salad Progress
7,5 X 16

7,5 + 6,3 + (8+7)

+(7+7+5,5+3,5)

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	30	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			50	1.00	50.00
				SUB TOTAL	50.00
PASAN:				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL Edificio administrativos y profesores	178.5	8.5	21	1	178.5
				SUBTOTAL	178.50
PASAN:				TOTAL	178.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TXG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.407645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				30.00	30.00
PASAN				SUBTOTAL	30.00
				TOTAL	30.00

No hay evidencia → 20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			20	2,00	40,00
				SUBTOTAL	40,00
PASAN:				TOTAL	40,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	001PCONTR 4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
Aula profesores				11.00	11.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	11.00
				TOTAL	11.00

13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA AULA PROFESORES	178.50			1.428.00	1.428.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.428.00
				TOTAL	1.428.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	30	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO FIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAD EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
aula profesores			30.00		30.00
				SUBTOTAL	30.00
PASAN:				TOTAL	30.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CD3.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO AULA PROFESORES			120.00		120.00
				SUBTOTAL	120.00
PASAN:				TOTAL	120.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA SELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NO SE HA HACER

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OGORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1 PCONTR 4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	
			120.00		120.00
EDIFICIO AULA PROFESORES					
				SUBTOTAL	120.00
				TOTAL	120.00
PASAN:					

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NO SE HA HACE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIC
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.88	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W – HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA DE PROFESORES				5,00	5,00
PASAN:				SUBTOTAL	5,00
				TOTAL	5,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

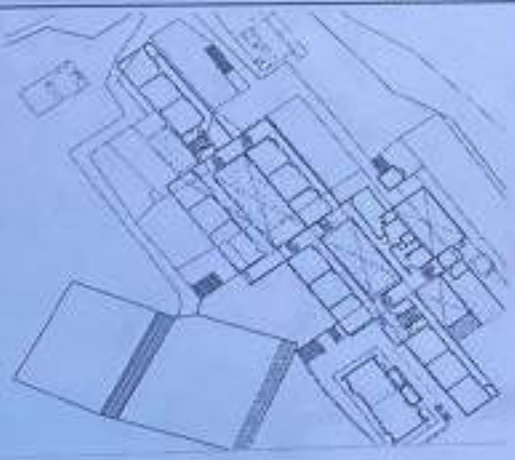



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	


INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA DE PROFESORES			40	1,0	40,00
PASAN:				SUBTOTAL:	40,00
				TOTAL	40,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

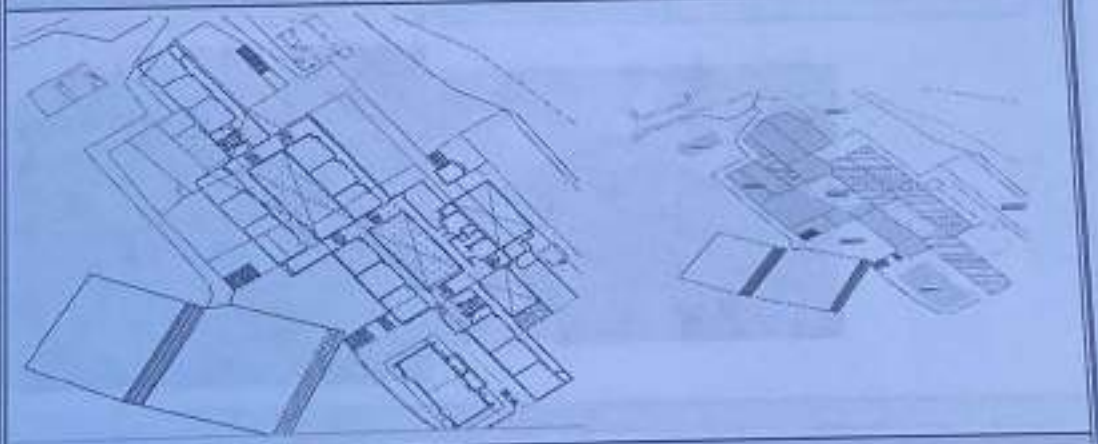

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA PROFESORES			20	2.00	40.00
PASAN:					
				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	40.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO CRUZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.05	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			6	~~2.0~~ 2	12.00
			5.5	1	
			7.2	1	
				SUBTOTAL	12.00
PASAN:				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TYG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL Edificio administrativos y otros usos	178,5	8,5	21	1	178,5
				SUBTOTAL	178,50
				TOTAL	178,5

PASAN:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	001 PCCNTR 4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			20	1.0	20.00
PASAN:				SUBTOTAL	20.00
				TOTAL	20.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
EDIFICIO 8 (PREESCOLAR)	CUBIERTA	16,19	8,7	140,12	1	140,12
	PISOS	15,33	9,2	140,74	1	140,74
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	280,86
					TOTAL	280,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



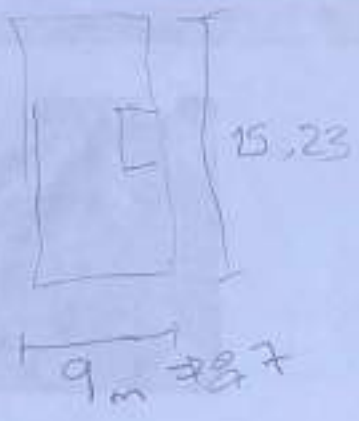

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OGORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4277845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PRESENCIAN	17.00	12		1	204.00
PASAN:				SUBTOTAL	204.00
				TOTAL	204

26m L x 2.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIS
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CDP_PCONTR_4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
CUBICACIONES						
EJE 5 A EJE 6	ALEATORIO SALON	7.50	3.30		2	49.50
						0.00
PASAR:					SUBTOTAL	49.50
					TOTAL	49.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA DEL TORO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



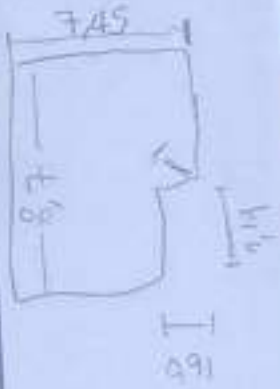

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077545 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTO	ANCHO	CANT-SATERIA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES	1.. T..				
EDIFICIO 6 - PREESCOLAR	2.50	0.3	2.00	1	7.50
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL:	7.50
				TOTAL:	7.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA:





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TSI
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077445 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUSO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTO	ANCHO	CANT-BATERIA	CANTIDAD	TOTAL
MODIFICACIONES					
EDIFICIO F - AULAS PREESCOLAR	1,40	0,50		2,00	1,40
	0,80	4,30		2,00	6,88
		4,2			8,28
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				SUBTOTAL	16,56
PASAN:				TOTAL	16,56

(-2(0,5x0,58)

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	
EDIFICACIONES						
PISO NO 0	PREESCOLAR	15,30	9,2		1	140,76
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					SUBTOTAL	140,76
PASAN:					TOTAL	140,76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	30	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIQ
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTRL4077043 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
CUBAS B - PANELADA			0,00	12	12,00
				SUBTOTAL	12,00
PASAN:				TOTAL	12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT. AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES			1,00	2	18,00
AULAS PREESCOLAR			4		
				SUBTOTAL	18,00
PASAN:				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077643 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.45	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS PREESCOLAR	78.00			2	156.00
				SUBTOTAL	156.00
PASAN:				TOTAL	156

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4017645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.51	M2	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS PREESCOLAR				4	4.00
				SUBTOTAL	4.00
PASAN:				TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma:
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO II - AULAS PREESCOLAR	15,38	9,2			140,76
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	140,76
				TOTAL	140,76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

10,12

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
					0,00
EDIFICIO 2	210,50	8,76	24,03	1	210,50
ALA 3	204,01	8,49	24,03	1	204,01
ALA 4	96,60	4,02	24,03	1	96,60
DOMO 2					

OBSERVACIÓN:

PASAN:

SUBTOTAL	511,12
TOTAL	511,12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

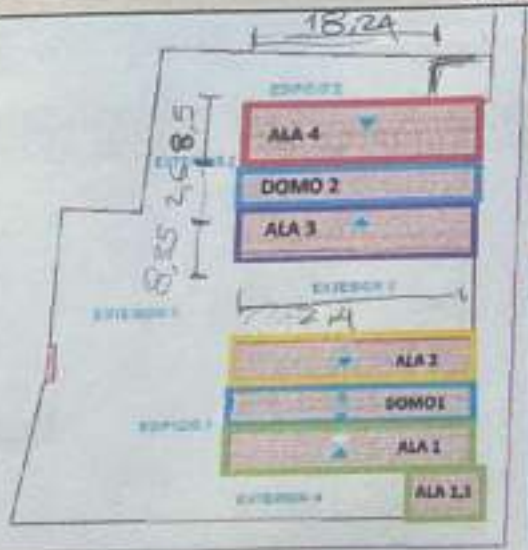









DESCRIPCION

Firma

ARO. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077945 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
Aislamiento zonas de intervención			50	1,00	50,00

OBSERVACION:	SUBTOTAL	50,00
PASAN:	TOTAL	50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

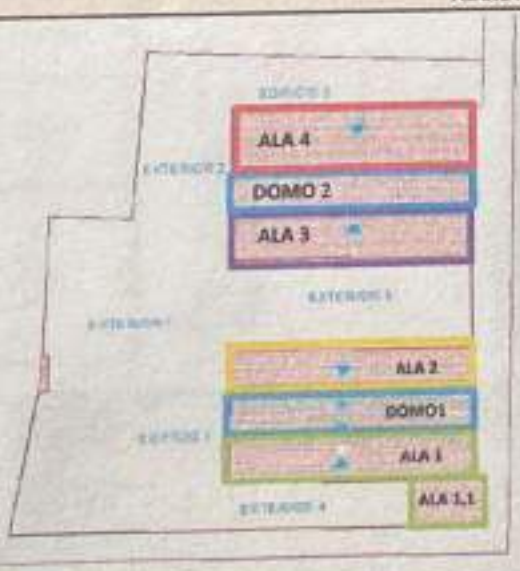



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CUANTIFICACION ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32					
CORREDOR 33	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
	72,78	3,00	24,26	1,00	72,78
		2,61	12	1	
		0,4	1,15	4	
PASAN:				SUBTOTAL	130,24
				TOTAL	130,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCIÓN

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

Firma

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIQ
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2	-				0,00
ALA 3	227,34	9,70	24,03	6%	227,34
		8,35			
PASAN:				SUBTOTAL	227,34
				TOTAL	227,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

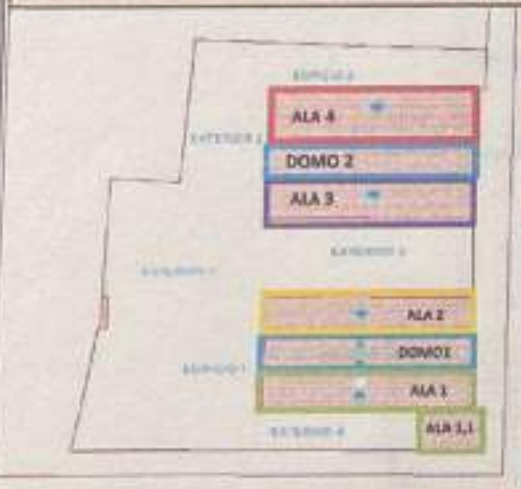









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			24		
Canal en pasillo 33			25.00	2.00	50.00
PASAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

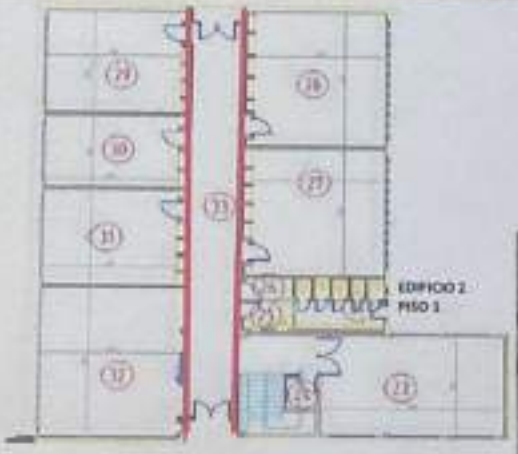













DESCRIPCION

JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS	227,34			2.500,74	2.500,74
PASAN:				SUBTOTAL	2.500,74
				TOTAL	2.500,74

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

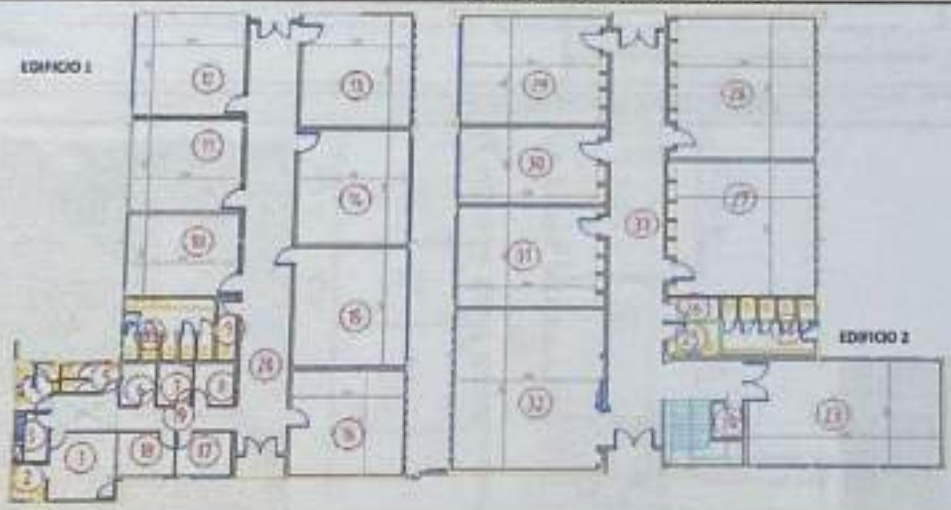

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	37,46	8,22	6,99	1,00	6,99
CORREDOR 33	72,76	3,00	24,25	1,00	24,25
PASAN:				SUBTOTAL	31,25
				TOTAL	31,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



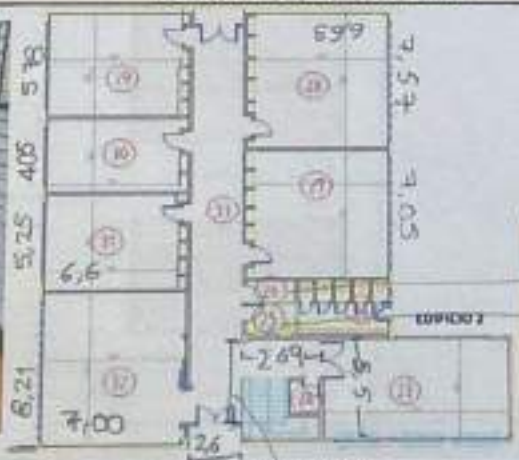



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	6,99
CORREDOR 33	72,78	3,00	24,26	1,00	24,26
VASAN:				SUBTOTAL	31,25
				TOTAL	31,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



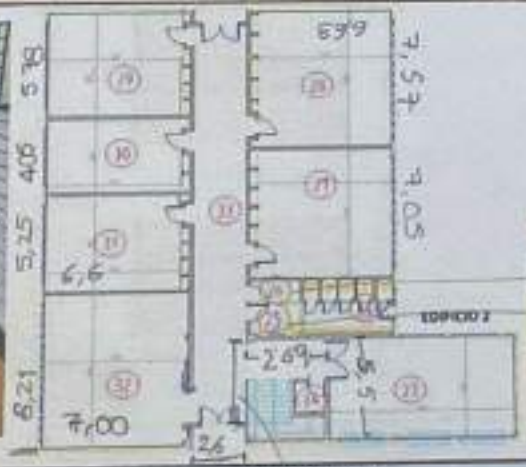



1,33 X 2,37

1,36 X 2,40

DESCRIPCION

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, marzo 01 de 2023

TIG-MEM-061

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ENTREGA CORRECCIONES A MEMORIAS DEL ACTA PARCIAL No.1

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones hechas en campo para las memorias de cálculo para el acta parcial No.1 entregadas el día 23 de febrero de 2023 vía correo electrónico.

Se les recuerda que los cortes de obra deben ser radicados de acuerdo al memorando de la supervisión los días 25 de cada mes, es decir que en esa fecha ya debe estar conciliado y aprobado el corte para radicación ante la entidad

Es por ello, que solicitamos que los 20 de cada mes se envíen memorias y documentos pertenecientes al corte parcial mensual, para que esta interventoría tenga el tiempo prudencial para la revisión y ustedes de hacer las subsanaciones a que haya a lugar

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			20	1,0	20,00
PASAN:				SUBTOTAL	20,00
				TOTAL	20,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

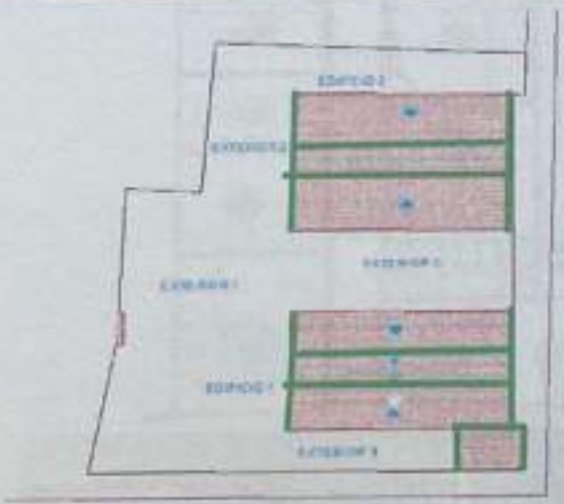

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
nsol en perfil= 33			25.00	2.00	50.00
ISAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

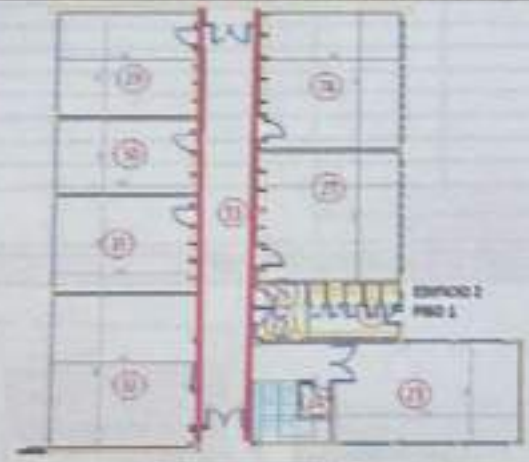









DESCRIPCION

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2					
ALA 3	227,34	8,76	24,03	6%	0,00
					227,34
PASAN:				SUBTOTAL	227,34
				TOTAL	227,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

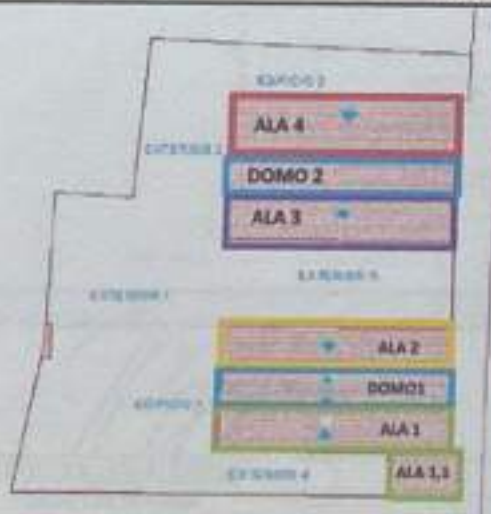



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP	CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
			30	1,0	30,00
PASAN:					
				SUBTOTAL	30,00
				TOTAL	30,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

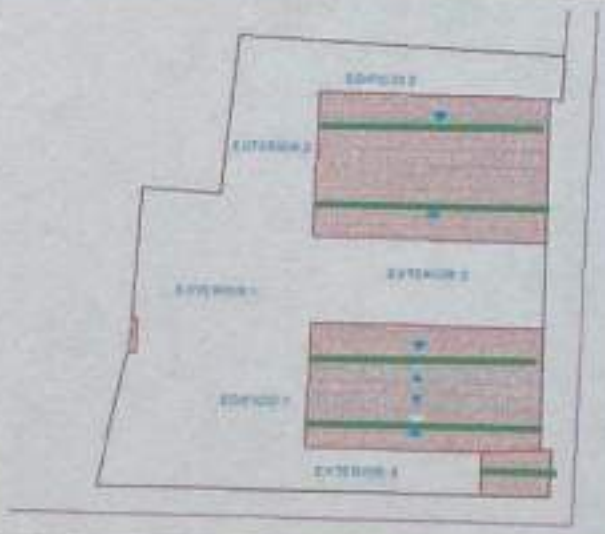

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1
	PREDIO:	SAN AGUSTIN SEDE A
	FECHA:	30 / 01 / 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077846
OBJETO CONTRATO:	MEJORAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PLANTELES FÍSICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.5.3	KG	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
REPLANTEO					
Reforzamiento estructura cubierta	17.15			20	343.00
		1.45	4.74		6.87
					6.87
					6.87
					6.87
					6.87
		2.45	31		
PAGUA				SUBTOTAL	1.029.00
				TOTAL	1029

→ esta instalada

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GALLERO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAOLA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
Baterias sanitarias			8.00	3	24.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	24.00
				TOTAL	24

12

Evidencia

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIS
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.34	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3	43,76			1,00	43,76
				SUBTOTAL	43,76
PASAN:				TOTAL	43,76

2 + cobles

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA SELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	29	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑO MUJERES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	13.00
				TOTAL	13

5/5 → no realizó

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

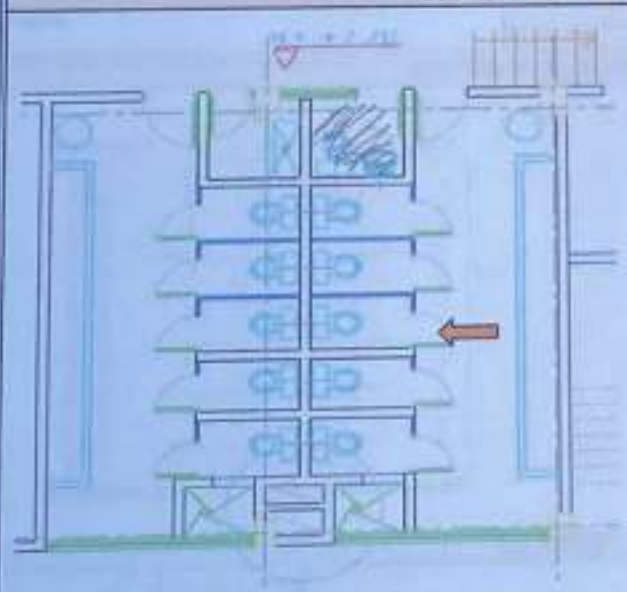





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0.00
BAÑOS HOMBRES PISO 3	1.30	1.75		4.00	9.10
BAÑO MUJERES PISO 3	1.30	1.75		5.00	11.38
PASAN:				SUBTOTAL	20.48
				TOTAL	20.48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

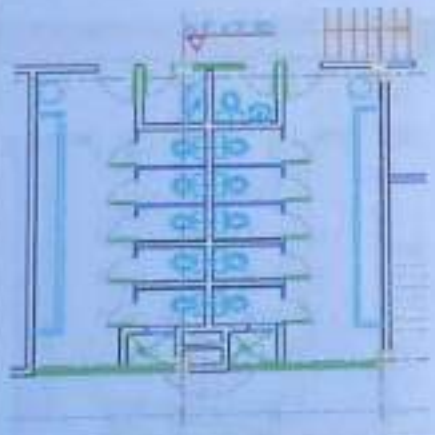

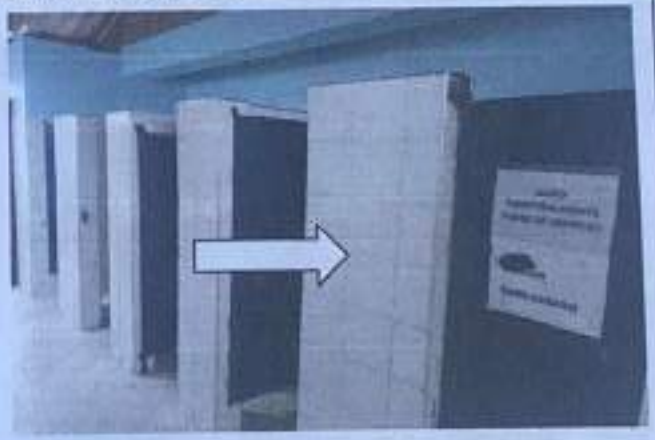

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TX3
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4777645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			256.00	1	256.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
PASAN					SUBTOTAL	256.00
					TOTAL	256

→ medidos

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

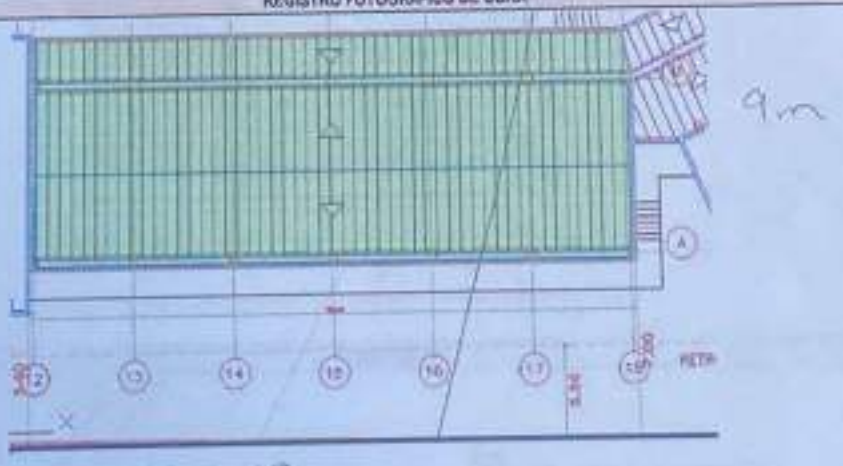

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 3

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Longitud 1	22.68			1	22.68
Longitud 2	6.76			1	6.76
PASAN:				SUBTOTAL	29.44
				TOTAL	29.44

23,68 + 4,57 + 1,42
→ NO cuadra

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

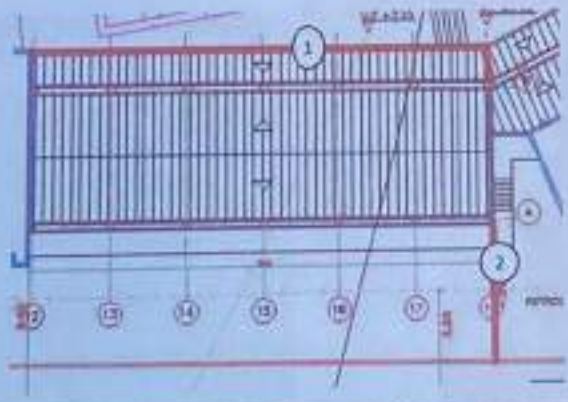

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4277645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.06 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS PISO 3	49.15			1	49.15
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	49.15
				TOTAL	49.15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

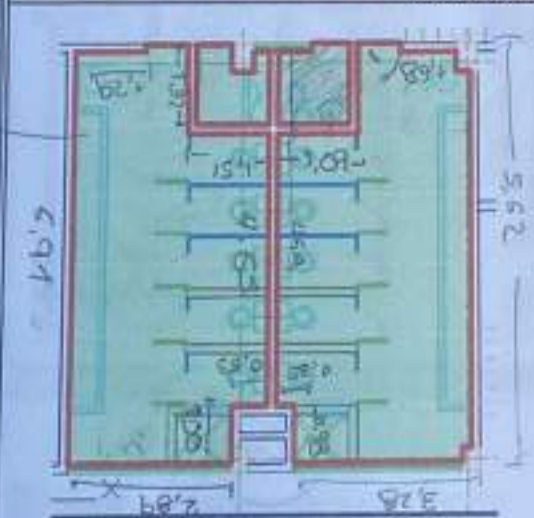





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA SELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	23	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3	36,64		1,75		64,65
BAÑO MUJERES PISO 3	36,64		1,75		64,65
BAÑOS PROFESORES PISO 3	4,2		1,75		7,35
PASAN:				SUBTOTAL	136,64
				TOTAL	136,64

medidos

(7,32+1,13)*7,75

Nose hizo

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

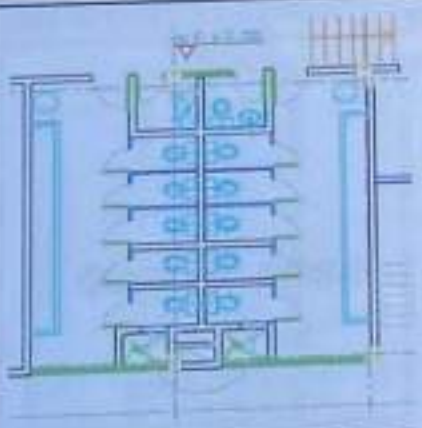



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.23	UN	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑO MUJERES PISO 3			6.00	1	6.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1.00	1	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	13.00
				TOTAL	13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

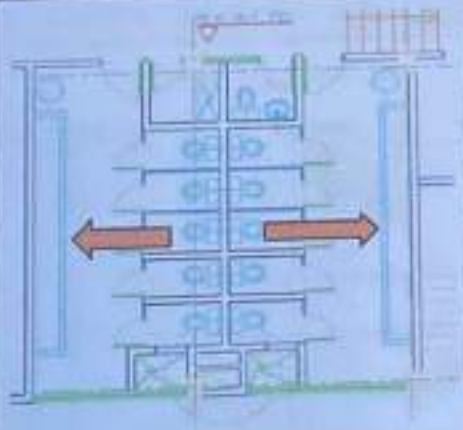





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CD1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			11.00	1	11.00
BAÑO MUJERES PISO 3			11.00	1	11.00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			2.00	1	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	24.00
				TOTAL	24

ya se cobraron los sanitarios

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

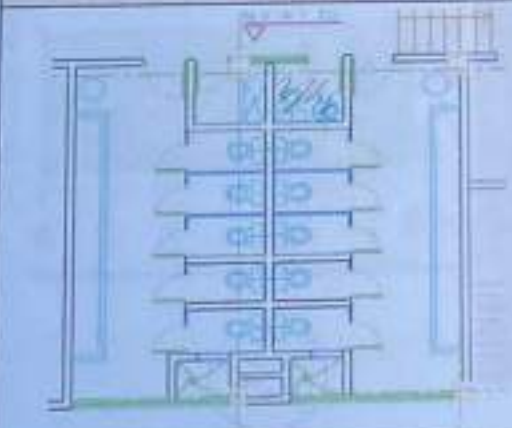



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	256.00			1	256.00
PASAN:					SUBTOTAL	256,00
					TOTAL	256

Medidas

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

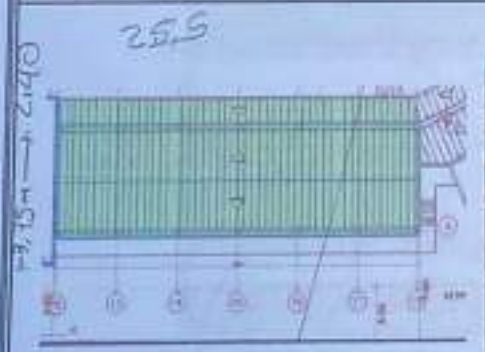



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TJG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077646
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.35	M2	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3		1,20	1,80	2,00	4,32
PASAN:				SUBTOTAL	4,32
				TOTAL	4,32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

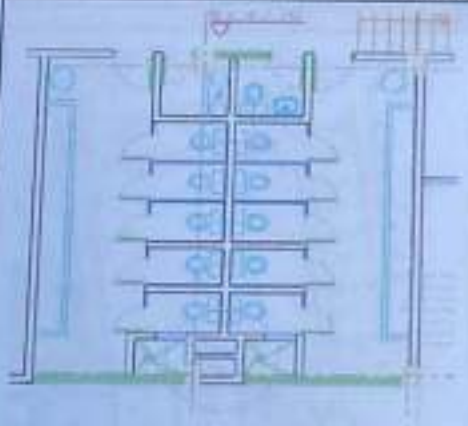



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Aulas			2.00	9	54.00
PSBE			1.00	15	15.00
Baterias sanitarias			8.00	3	24.00
					8.00
					11.00
					8.00
PASAN:				SUBTOTAL	96,00
				TOTAL	96

4
4
Bob 4
Bob 2
2
1
1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	26 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO T93
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077845
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
CANALES	AREA 1	24,00			2	48,00
		8,00			1	8,00
BAJANTES	AREA 1	13,20			5	66,00
PASAN:					SUBTOTAL	122,00
					TOTAL	122

Evidencia

X

No se hizo

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077846
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LONG.	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES			8.70	21	182.70
Transversal			28.00	16	448.00
longitudinal					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				SUBTOTAL	630,70
PASAN:				TOTAL	630,7

medidas Falta baños

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077845
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			256,00	1	256,00
					SUBTOTAL	256,00
PASAN:					TOTAL	256

Recibido

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

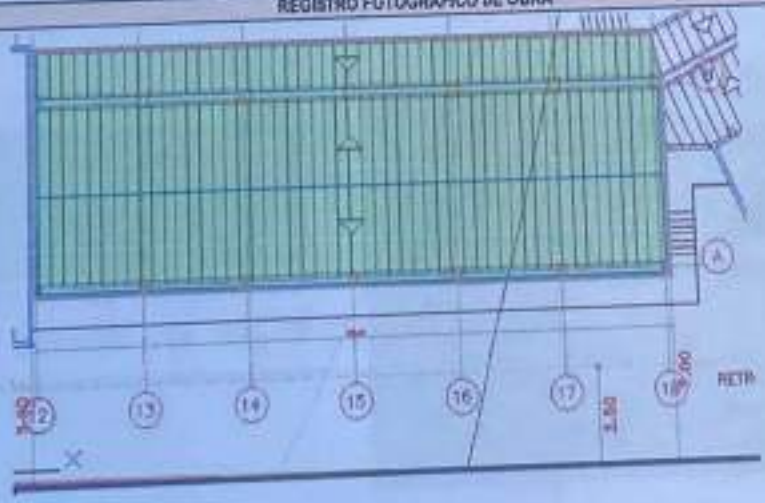

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	256.00			1	256.00

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.3	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	256.00			1	256.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	SAN AGUSTIN SEDE A	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.4	KG	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑOS HOMBRES PISO 3			5,00	1	5,00
BAÑO MUJERES PISO 3			5,00	1	5,00
BAÑOS PROFESORES PISO 3			1,00	1	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	11,00
				kg/UN	26,1
				TOTAL	287,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

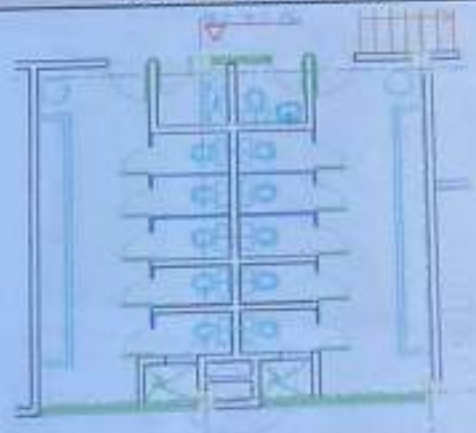

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CD1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
REPLANTEO COLEGIO COLOMBIA VIVA SEDE C	750.00				750.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
					0.00
CERRAMIENTO ACOPIO DE MATERIALES Y AREAS DE TRABAJO			150.00	1	150.00


→ medidas

OBSERVACION:

PASAN:

SUBTOTAL	150,00
TOTAL	150,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

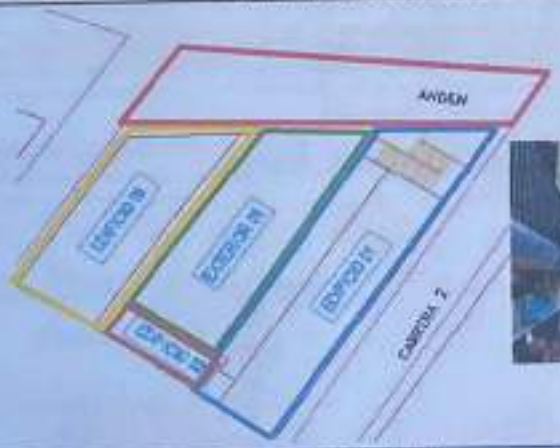



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TV3
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					
12	15,00	5,00	3,00	1,00	15,00
13	8,80	2,20	3,00	1,00	8,80
EDIFICIO 2 PISO 1					
23	49,93	7,85	6,36	1,00	49,93
24	4,74	2,37	2,00	1,00	4,74
25	15,23	3,50	4,35	1,00	15,23
26	7,45	2,45	2,76	1,00	7,45
27	38,14				38,14
EDIFICIO 3 PISO 1					
18	44,20	6,95	6,36	1,00	44,20
20	44,20	6,95	6,36	1,00	44,20
				SUBTOTAL	226,49
PASAN:				TOTAL	226,49

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCIÓN

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077643 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
	7.30	1.60	2.30	2.00	7.36
	5.00	2.10	3.85	1.00	8.09
12					
				SUBTOTAL	15.45
PASAN:				TOTAL	15.45

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TVG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
12	3.97	0.82	1.60	4.00	3.97
				SUBTOTAL	3.97
PASAN:				TOTAL	3.97

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	IDU - PROYECTO 4207641 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, Y EN SECRETARÍAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	5.11	1.90	1.82	1.00	5.11
	1.40	2.40	1.20	1.00	1.21
				SUBTOTAL	10.32
PASAN:				TOTAL	10.32

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12 BAÑOS NIÑOS					
INODORO				4,00	4,00
LAVAMANOS				2,00	2,00
ORINAL				2,00	2,00
				SUBTOTAL	8,00
PASAN:				TOTAL	8,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.31	ML	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12 BAÑOS NIÑOS			50.00		50.00
PASAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

P.

medidas

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 2	-				0.00
18 Y 19	28.00			5%	31.32
EDIFICIO 3 PISO 2					0.00
23,24,25,26,27	134.00			8%	144.72
PASAN:				SUBTOTAL	176.04
				TOTAL	176.04

medidas

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2 PISO 1					
12				6.00	6.00
13				4.00	4.00
EDIFICIO 3 PISO 1					
18				7.00	7.00
20				7.00	7.00
EDIFICIO 3 PISO 2					
23				7.00	7.00
24				7.00	7.00
25				5.00	5.00
26				15.00	15.00
27					
PASAN:				SUBTOTAL	67.00
				TOTAL	67.00

? No se hizo
No se hizo
No se hizo

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					0.00
EDIFICIO 2 PISO 1				2.00	2.00
12				2.00	2.00
13					
EDIFICIO 3 PISO 1				4.00	4.00
19				4.00	4.00
20					0.00
EDIFICIO 3 PISO 2				4.00	4.00
23				4.00	4.00
24				4.00	4.00
25				4.00	4.00
26				4.00	4.00
27					
				SUBTOTAL	33.00
PASAN:				TOTAL	33.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIC
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			[illegible]	1.00	[illegible]
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY			
	FECHA:	28	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2				100	100.00
PASAN:				SUBTOTAL	100.00
				TOTAL	100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	PARCIAL No 1			
	FRENTE:	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY		
	FECHA:	28	03	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			60	1.00	60.00
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

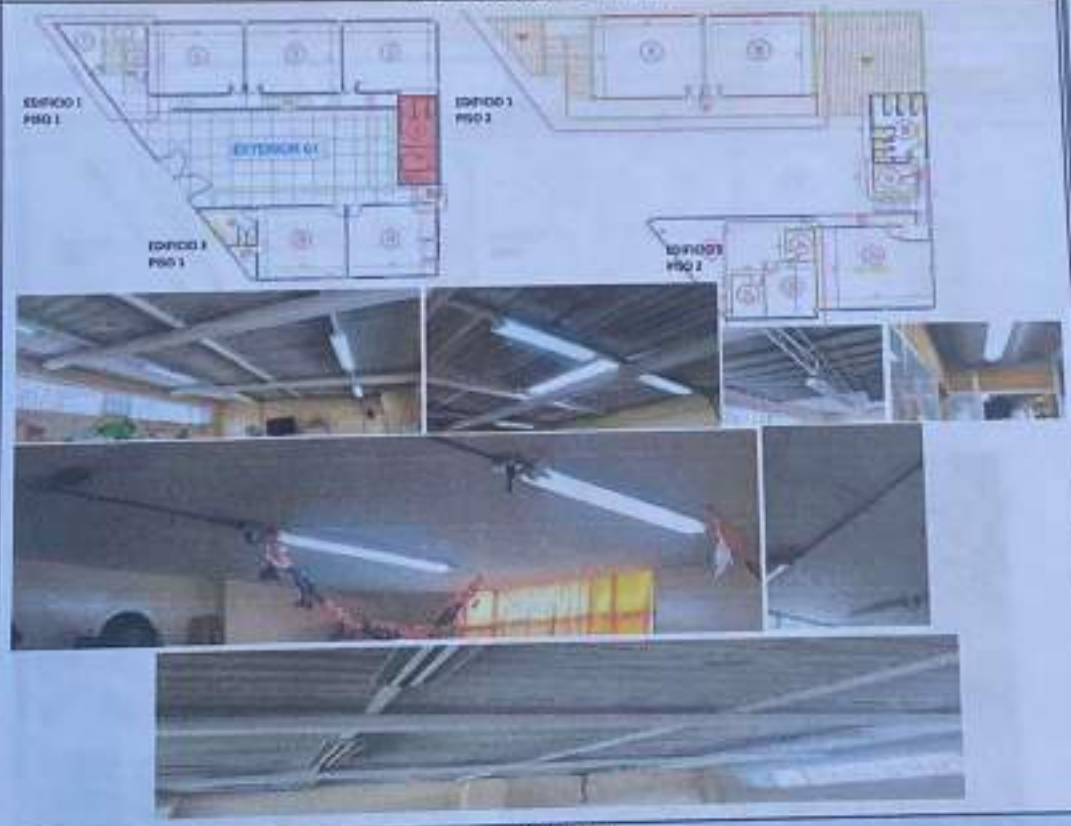

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE	COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-01	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	
EDIFICIO 2 PISO 2					
15 Y 16	28.00			8%	
EDIFICIO 3 PISO 2	138.20			8%	
21,24,25,26,27					
				SUBTOTAL	176,04
PASAN:				TOTAL	176,04

med. de

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1

FRENTE:

COLEGIO JOSE MARTI SEDE A
LUIS LOPEZ DE MESA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO	CO1 PCONTR 4077045 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 9

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores	178,5	8,5	21	1	178,5

PASAN:	SUBTOTAL	178,50
	TOTAL	178,50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Salad Progress
7,5 X 16

7,5 + 6,3 + (8+7)

+(7+7+5,5+3,5)

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	30	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			50	1.00	50.00
				SUB TOTAL	50.00
PASAN:				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL Edificio administrativos y profesores	178.5	8.5	21	1	178.5
				SUBTOTAL	178.50
PASAN:				TOTAL	178.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TXG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.407645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				30.00	30.00
PASAN				SUBTOTAL	30.00
				TOTAL	30.00

No hay evidencia → 20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			20	2,00	40,00
				SUBTOTAL	40,00
PASAN:				TOTAL	40,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	001PCONTR 4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
Aula profesores				11.00	11.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	11.00
				TOTAL	11.00

13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA AULA PROFESORES	178.50			1.428.00	1.428.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.428.00
				TOTAL	1.428.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	30	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO FIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAD EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
aula profesores			30.00		30.00
				SUBTOTAL	30.00
PASAN:				TOTAL	30.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CD3.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO AULA PROFESORES			120.00		120.00
				SUBTOTAL	120.00
PASAN:				TOTAL	120.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA SELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NO SE HA HACER

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OGORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1 PCONTR 4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	
			120.00		120.00
EDIFICIO AULA PROFESORES					
				SUBTOTAL	120.00
				TOTAL	120.00
PASAN:					

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NO SE HA HACE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIC
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO B

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.88	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W – HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA DE PROFESORES				5,00	5,00
PASAN:				SUBTOTAL	5,00
				TOTAL	5,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

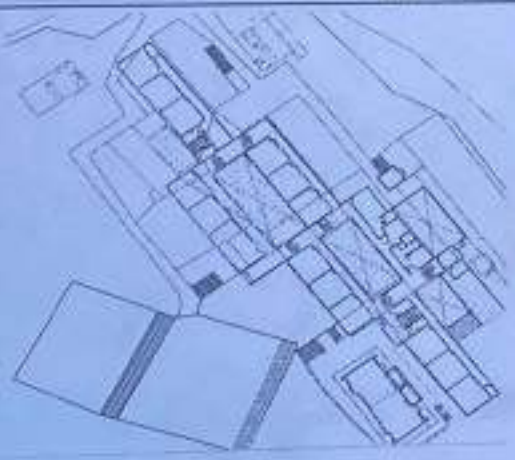



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	


INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN, A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA DE PROFESORES			40	1,0	40,00
PASAN:				SUBTOTAL:	40,00
				TOTAL	40,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

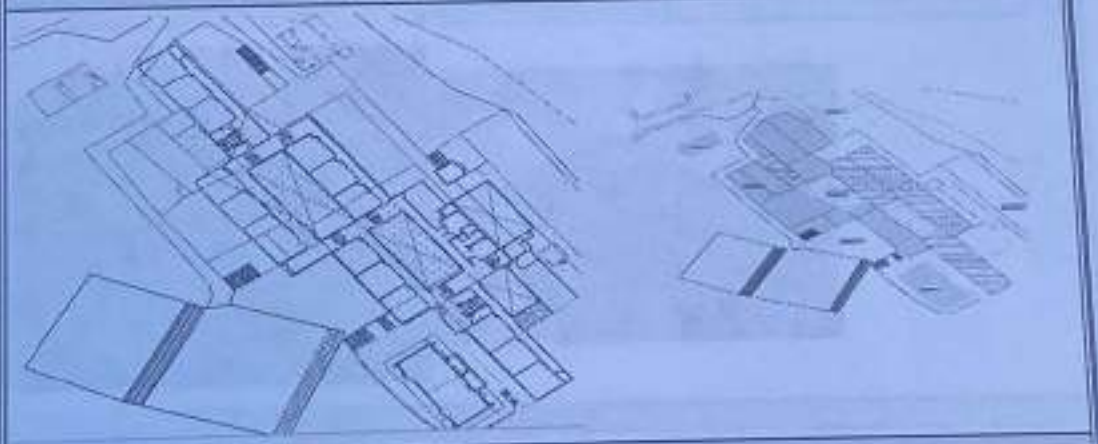

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
AULA PROFESORES			20	2.00	40.00
PASAN:					
				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	40.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO CRUZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.05	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			6	~~2.0~~ 2	12.00
			5.5	1	
			7.2	1	
				SUBTOTAL	12.00
PASAN:				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TYG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL Edificio administrativos y otros usos	178,5	8,5	21	1	178,5
				SUBTOTAL	178,50
				TOTAL	178,5

PASAN:

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A	
	FECHA:	20 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	001 PCCNTR 4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			20	1.0	20.00
PASAN:				SUBTOTAL	20.00
				TOTAL	20.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
EDIFICIO 8 (PREESCOLAR)	CUBIERTA	16,19	8,7	140,12	1	140,12
	PISOS	15,33	9,2	140,74	1	140,74
						0,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	280,86
					TOTAL	280,86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



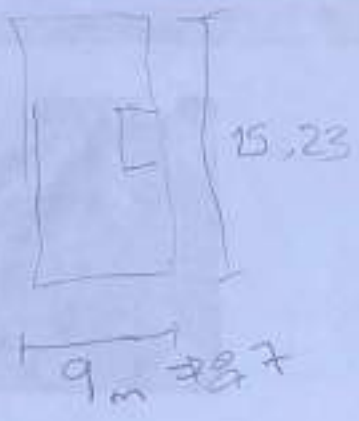

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OGORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4277845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PRESENCIAN	17.00	12		1	204.00
PASAN:				SUBTOTAL	204.00
				TOTAL	204

26m L x 2.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIS
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CDP_PCONTR_4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 6

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
CUBICACIONES						
EJE 5 A EJE 6	ALEATORIO SALON	7.50	3.30		2	49.50
						0.00
PASAR:					SUBTOTAL	49.50
					TOTAL	49.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA






DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA DEL TORO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



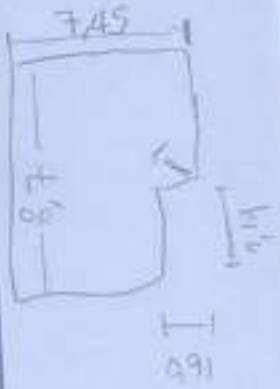

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077545 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 5

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTO	ANCHO	CANT-SATERIA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES	1.. T..				
EDIFICIO 6 - PREESCOLAR	2.50	0.3	2.00	1	7.50
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL:	7.50
				TOTAL:	7.50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA:





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TSI
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTR.4077445 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METALICAS - MADERA, INCLUSO REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTO	ANCHO	CANT-BATERIA	CANTIDAD	TOTAL
MODIFICACIONES					
EDIFICIO F - AULAS PREESCOLAR	1,40	0,50		2,00	1,40
	0,80	4,30		2,00	6,88
		4,2			8,28
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				SUBTOTAL	16,56
PASAN:				TOTAL	16,56

(-2(0,5x0,58)

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	
EDIFICACIONES						
PISO NO 0	PREESCOLAR	15,30	9,2		1	140,76
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					SUBTOTAL	140,76
PASAN:					TOTAL	140,76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	30	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIQ
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCONTRL4077043 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
CUBAS B - PANELADA			0,00	12	12,00
				SUBTOTAL	12,00
PASAN:				TOTAL	12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BASICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	CANT. POR AULA	CANT. AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES			1,00	2	18,00
AULAS PREESCOLAR			4		
				SUBTOTAL	18,00
PASAN:				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A		
	FECHA:	28	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077643 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.45	M	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS PREESCOLAR	78.00			2	156.00
				SUBTOTAL	156.00
PASAN:				TOTAL	156

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA:	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR:	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR:	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4017645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.51	M2	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS PREESCOLAR				4	4.00
				SUBTOTAL	4.00
PASAN:				TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma:
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1	
	FRENTE:	ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A	
	FECHA:	28 / 02 / 2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCONTR.4077845 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
EDIFICIO II - AULAS PREESCOLAR	15,38	9,2			140,76
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				SUBTOTAL	140,76
				TOTAL	140,76

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

10,12

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO


DESCRIPCION	DIMENSIONES				TOTAL
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	
					0,00
EDIFICIO 2	210,50	8,76	24,03	1	210,50
ALA 3	204,01	8,49	24,03	1	204,01
ALA 4	96,60	4,02	24,03	1	96,60
DOMO 2					

OBSERVACIÓN:

PASAN:

SUBTOTAL	511,12
TOTAL	511,12

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

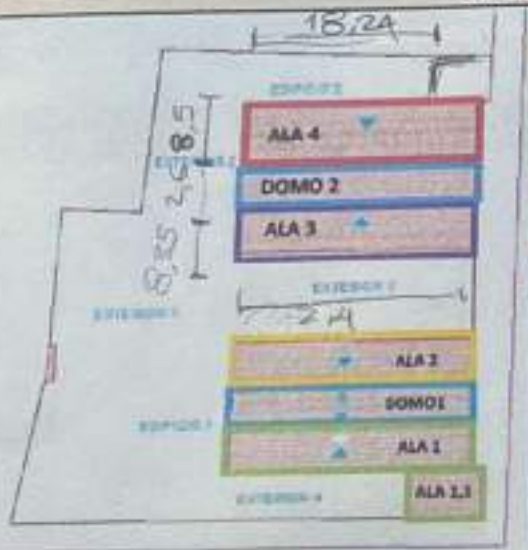









DESCRIPCION

Firma

ARO. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077945 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
Aislamiento zonas de intervención			50	1,00	50,00

OBSERVACION:	SUBTOTAL	50,00
PASAN:	TOTAL	50

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

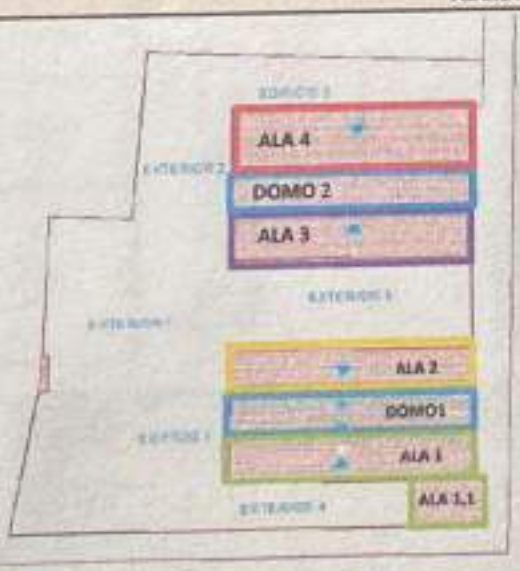



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CUANTIFICACION ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32					
CORREDOR 33	57,46	8,22	6,99	1,00	57,46
	72,78	3,00	24,26	1,00	72,78
		2,61	12	1	
		0,4	1,15	4	
PASAN:				SUBTOTAL	130,24
				TOTAL	130,24

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA











DESCRIPCIÓN

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

Firma

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIQ
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 2	-				0,00
ALA 3	227,34	9,70	24,03	6%	227,34
		8,35			
PASAN:				SUBTOTAL	227,34
				TOTAL	227,34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

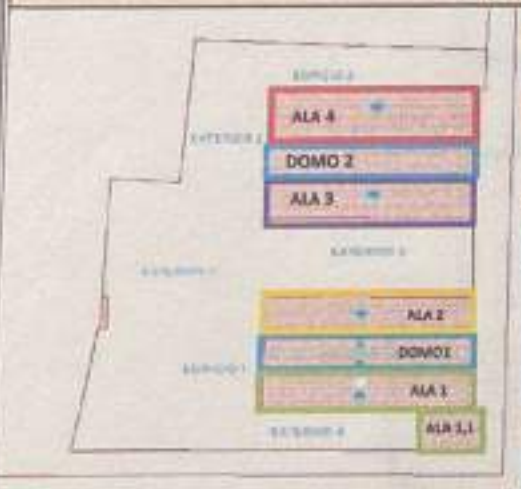









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2			24		
Canal en pasillo 33			25.00	2.00	50.00
PASAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

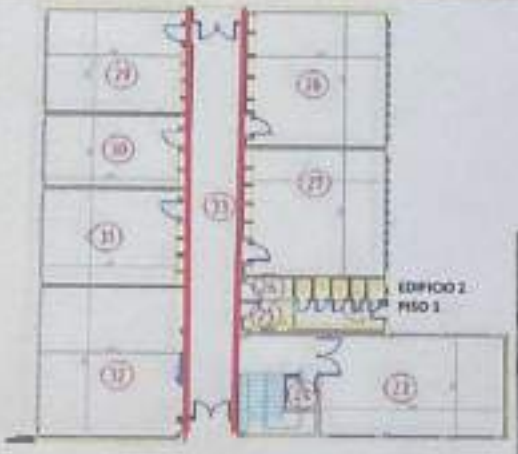













DESCRIPCION

JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1		
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA		
	FECHA:	20	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO II

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS	227,34			2.500,74	2.500,74
PASAN:				SUBTOTAL	2.500,74
				TOTAL	2.500,74

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

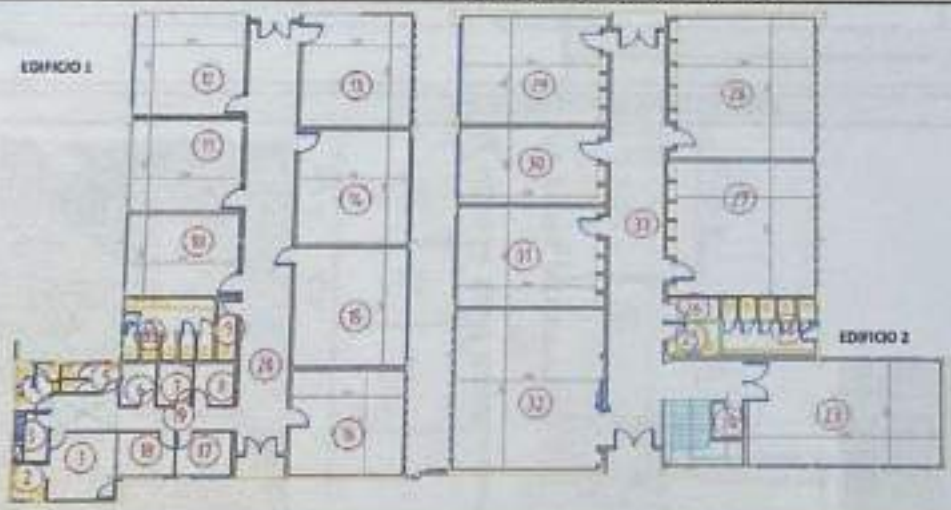

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	28	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	37,46	8,22	6,99	1,00	6,99
CORREDOR 33	72,76	3,00	24,25	1,00	24,25
PASAN:				SUBTOTAL	31,25
				TOTAL	31,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



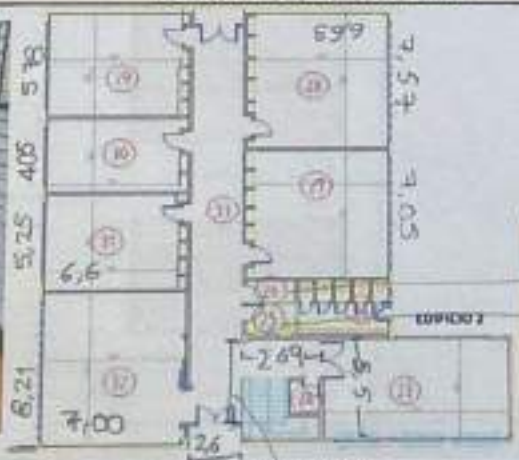



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN ACTA PARCIAL No 1			
	FRENTE:	RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA			
	FECHA:	20	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 2					
AULA 32	57,46	8,22	6,99	1,00	6,99
CORREDOR 33	72,78	3,00	24,26	1,00	24,26
VASAN:				SUBTOTAL	31,25
				TOTAL	31,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



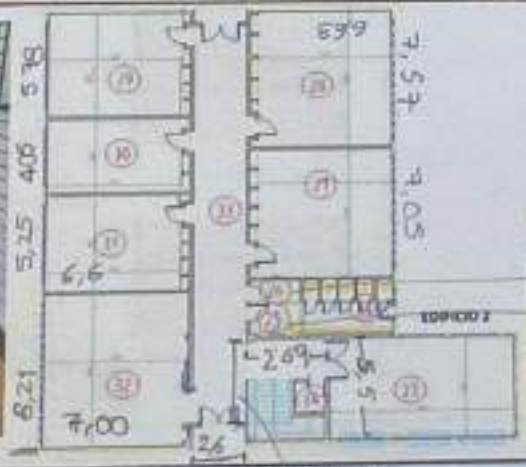



1,33 X 2,37

1,36 X 2,40

DESCRIPCION

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, marzo 01 de 2023

TIG-MEM-062

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.1

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones del informe mensual No.1

Observaciones generales:

1. El personal presentado debe ser el que se encuentra aprobado por esta interventoría
2. Se deben anexar las bitácoras de todos los frentes presentados en el informe.
3. Es claro para esta interventoría que cada frente tiene un personal distinto para la elaboración de los informes, por favor conservar el mismo formato para todo el documento.

-Colegio Restrepo Millán sede B:

1. Esta interventoría solicitó la suspensión de actividad de demolición de pisos dado que, no era un ítem aprobado en la sede. Después de la mesa de trabajo del 16 de febrero se concluye cambiar el piso del aula ya intervenida y en los pasillos internos de los dos bloques.

-Colegio San Agustín:

1. Se le recuerda al contratista que debe hacer las pruebas hidráulicas respectivas a la tubería nueva instalada con el fin de verificar la presencia de fugas y/o filtraciones.

Dadas las observaciones respectivas, se queda a la espera de las correcciones al informe para dar aprobación y su respectivo trámite ante la entidad.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, marzo 01 de 2023

TIG-MEM-063

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES FICHAS TÉCNICAS POR SEDE

Respetados señores:

Una vez revisadas las fichas técnicas, esta interventoría dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, manifestamos lo siguiente:

Observaciones generales:

1. El formato debe ser legible al momento de la impresión y entrega a los rectores de cada una de las sedes.
2. Las fichas deben actualizarse según los alcances definidos en los últimos recorridos y se deben especificar las actividades a ejecutar en cada uno de los espacios a intervenir.
3. Los tiempos de ejecución según lo acordado en mesas de trabajo, deben ser de máximo 4 meses por sede.
4. Deben venir con las firmas del personal aprobado.
5. Por favor incluir los frentes nuevos.

CONSORCIO TIG

Se solicita muy comedidamente se hagan las respectivas observaciones de carácter perentorio, para dar aprobación y su respectivo trámite ante la entidad.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-064

Bogotá, D.C, marzo 02 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Carolina Rojas	1121868899	Inspector SST	Enrique Olaya
2	Javier Castro	7630373	Ayudante	Restrepo Millán

3	Juan Carlos Martínez	79823372	Ayudante	Restrepo Millán
4	Eduardo José Zoteranis Reira	5620985	Ayudante	Enrique Olaya

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Elaboró: Steven Camacho Coordinador de interventoría
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 79.823.372
MARTINEZ CASTILLO

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES



Juan Martinez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1976
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

16-MAR-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01215155-M-0079623372-20210218 0073433569A 1 9914669907

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

Nro. 9291

FECHA : 10/02/2023 HORA:11:49		**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: JUAN CARLOS MARTINEZ CASTILLO		DOCUMENTO: 79823372	EDAD: 46 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI		Cargo: AYUDANTE DE COSNTRUCCION	Tel: 3173911138 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso y Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad







LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 79823372**	**9331**

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar

No. Radicación **28210835**

Fecha de Radicación								
1	2	0	2	2	0	2	3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Familiar adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
MARTINEZ	CASTILLO	JUAN	CARLOS
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	79823372	Femenino [ ] Masculino [X]	28/07/1976

III.DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F N M] Condición [T P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	003 / PORVENIR	1.160.000

18. Residencia			
CALLE 34 N 32 33	3133138066	3112660449	juancarlos76@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 2 0 2 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

Bogotá DC. 12 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 12 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 79823372
Nombres y Apellidos	JUAN CARLOS MARTINEZ CASTILLO
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	12/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	12/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 12/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	196	13/02/2023	CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

5D74761B3F229FF17323BD174234EC11 Certificado impreso el día 2/12/2023 5:39:06 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

JUAN CARLOS
MARTINEZ CASTILLO
79823372
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS MARTINEZ CASTILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.823.372**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 12 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS S

NIT 800.130.907-4

No. DE RADICACIÓN
0001421635

Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE

2. Tipo de Afiliado: A. Individual X | B. Colectivo | C. Institucional | D. Oficioso
Cotizante o Cabeza de Familia: Dentro del régimen de afiliación contributiva X
1. Régimen: A. Contributivo X | B. Subsidiado
1. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X | B. Contratante Familia | C. Beneficiario
3. Tipo de Usuario: A. Dependiente | B. Independiente X | C. Pensionado
Código

II. A. AFILIACIÓN

4. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

5. Apellidos	6. Nombres	7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
RODE	CAROLINA	CC	1.121 868 899	Femenino X Masculino	02 10 1990

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos generales

11. País	12. Nacionalidad	13. Puntaje SISBEN	14. Fecha de diligenciamiento
	Tipo: Condición:		

15. Administradora Régimen Anterior	16. Administradora de Pensiones	17. Semanas de cotización RAIS	18. Ingreso Base de Cotización
SURA	PORVENIR		1'160.000

19. Residencia: Dirección	20. Teléfono	21. Departamento	22. Municipio	23. Zona
CRA 26A # 10B 97	3117352795		VILLAVICENCIO	Urbana X Rural

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

24. Apellidos	25. Nombres	26. Tipo de documento de identidad	27. Número de documento de identidad	28. Sexo	29. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

30. Tipo de documento de identidad	31. Número de documento de identidad	32. Apellidos	33. Nombres	34. Sexo	35. Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

36. Parentesco	37. Otro	38. Discapacidad	39. Tipo de Discapacidad	40. Condición
01				
02				
03				
04				
05				

41. Nombre del Municipio de Residencia	42. Zona	43. Departamento	44. Teléfono	45. Número de la UPC a la cual el afiliado adicional se encuentra adscrito (a registrar por la EPS)
01				
02				
03				
04				
05				

RECIBIDO
PARA ESTUDIOS E.P.S.

Selección de la EPS Primaria

46. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

47. Razón Social o Apellidos y Nombres	48. Tipo de Documento de Identidad	49. Número de Identificación	50. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
RODE CAROLINA ROJAS	CC	1.121.868.899	

51. Dirección	52. Teléfono	53. Municipio	54. Departamento
CRA 26H # 10B 97	6661890	VILLAVICENCIO	META

ORIGINAL EPS
COPIA APORTANTE

M-PYGA-F001 v 2.0 2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL DE APTITUD LABORAL

DR. HERNAN EDUARDO MEDINA // ESPEC. SALUD OCUPACIONAL LICENCIA No. 1152/2012 SSH

1. INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA: 22 FEBRERO 2023 | CIUDAD: U/CIO | DPTO: MCTA

TIPO DE EXAMEN: INGRESO [X] | EGRESO [ ] | PERIODICO [ ] | POST-INCAPACIDAD [ ] | OTRO: [ ] | CUAL:

2. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: RODC CAROLINA ROJAS ULLOA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.127.868.899 | EDAD: 33 | SEXO: F X M

DIRECCION: CRA 26A # 10897 | CIUDAD: YCIO | TELEFONO:

CARGO: COORDINADOR HSE | EPS: SALUD TOTAL | GRUPO SANGUINEO: O+

3. EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

AUDIOMETRIA		C. HEMATICO		TGO		COPROLOGICO		P. SICOSENSOMETRICA	
VISIOMETRIA		PARCIAL DE ORINA		TGP		FROTIS FARINGEO		P. PSICOTECNICA	
ESPIROMETRIA		GLICEMIA		VDRL		KOH UÑAS		PERFIL LIPIDICO	
ELECTROCARDIOGRAMA		COLESTEROL		GRAVIDEZ		BACILOSCOPIA		VACUNA ANTITETANICA	
RX DE TORAX		TRIGLICERIDOS		PSA		COLINESTERASA		OTROS	
RX DE COLUMNA		CREATININA		ALCOHOLEMIA		HEMOCLASIFICACION			

4. CONCEPTO MEDICO LABORAL

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIODICO		EXAMEN DE RETIRO	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL PERFIL DEL CARGO	X	SATISFACTORIO		SATISFACTORIO	
PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL		SIGNOS Y SINTOMAS DE ENFERMEDAD GENERAL QUE DEBEN SER VALORADOS POR LA EPS		CON PATOLOGIA DE ORIGEN COMUN QUE DEBE SER VALORADA POR LA EPS	
APLAZADO POR PRESENTAR PATOLOGIA QUE REQUIERE SE TRATADA PARA SU CORRECCION		SE DEBEN REASIGNAR FUNCIONES, REUBICAR, ANALIZAR PUESTO DE TRABAJO		SECUELAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DEL CARGO		SIGNOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL QUE DEBEN SER VALORADOS POR LA EPS/ARL		SIGNOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL QUE DEBEN SER VALORADOS POR LA ARP	

5. OBSERVACIONES:

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	NA	APTO PARA CONDUCCION	SI	NO	NA	APTO PARA MANIPULAR CARGAS	SI	NO	NA
APTO ESPACIOS CONFINADOS	SI	NO	NA	APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS	SI	NO	NA	REQUIERE SER REUBICADO	SI	NO	NA

6. RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

SEGÚN IMC		MANEJO EPS/ARL		RECOMENDACIONES		INCLUIR EN SVE	
DIETA		CONTROL PYP POR EPS		CONTROL OCUPACIONAL	✓	AUDITIVO	
EJERCICIO REGULAR		REMISION A EPS		HIGIENE POSTURAL	✓	VISUAL	
VALORACION POR NUTRICION		REMISION A ARL		USO DE EPP APROPIADOS		RESPIRATORIO	
DESCARTAR ALTERACION METAB		SE PRESCRIBE TRATAMIENTO		AYUDAS ERGONOMICAS		ERGONOMICO	
		CONTINUAR MANEJO MEDICO		EVALUACION PTO TRABAJO		QUIMICO	
				MEDIDAS ANTI VARICES		CARDIOVASC	

RESOLUCION 2346/07 LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL Y LOS DOCUMENTOS, EXAMENES O VALORACIONES PARACLINICAS SON CONFIDENCIALES Y HACEN PARTE DE LA RESERVA PROFESIONAL

Dr. HERNAN E. MEDINA
MEDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
RES. 1152/2012

FIRMA MEDICO OCUPACIONAL

FIRMA Y CC. DEL TRABAJADOR

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 28/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901634703	**Cédula Usuario:**	CC 1020791796
Nombre:	CONSORCIO MIA GP				
Dirección:	CL 108 23 34				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	LUZARDOMATEO574@GMAIL.COM				
Teléfono:	3133138066		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 1020791796	MATEO LUZARDO VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	13	01/03/2023	CC 1121868899	ROJAS ULLOA RODE	5	6.960	**Independiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

E4A98177B6D8B2DFB44752671539B9D1 Certificado impreso el día 2/28/2023 1:55:57 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

RODE CAROLINA
ROJAS ULLOA
1121868899

CONSORCIO MIA GP
901634703

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

RODE CAROLINA ROJAS ULLOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.868.899**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14897854956

(415)7707212489984(8020) 000001489785495 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 6 8 8 9 9	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 6 8 8 9 9	2 0 0 8 1 0 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	ULLOA	RODE	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 26 A 10 B 97 BRR EL CENTAURO

42. Correo electrónico: rosa_rojas777@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 3 5 2 7 9 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 8 0 6 0 1	8 2 1 1	2 0 1 4 1 1 2 4	8 2 9 9			2 4 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 21 / 18 : 28: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS ULLOA RODE CAROLINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CEDULA DE IDENTIDAD

V 12.077.613

176

Gustavo Vizcaino
Director

APELLIDOS ZOTERANIS RIERA

NOMBRES EDUARDO JOSE

FIRMA TITULAR



21/01/1974 F. NACIMIENTO

SOLTERO EDO CIVIL

12/11/2019 F. EXPEDICION

11/2029 F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 5620985

ZOTERANIS RIERA

APELLIDOS

EDUARDO JOSE

NOMBRES

VEN M

NACIONALIDAD SEXO

12077613

DNI Nro.

21-01-1974

FECHA DE NACIMIENTO

02-07-2022 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031

FECHA DE VENCIMIENTO



Eduardo Zoteranis

VISIBLES

Powered by CamScanner

E0389113



INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL5620985<<5<<<<<<<<<<<<<<<
7401215M3105308VENE0389113<<<7
ZOTERANIS<RIERA<<EDUARDO<JOSE<

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT

Número de documento: 901402105

Número Afiliación: 9001382

Razón social: CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL

Número de Documento 5620985

Nombre: EDUARDO JOSE ZOTERANIS RIERA

Fecha Ingreso: 15/02/2023

Salario básico: 1,160,000

Nit empresa en misión: 0

Código Sucursal: SUCURSAL 1

Centro de trabajo: CTRAB 005

Tasa: 6.960

Fecha hora transacción: 14/02/2023 09:03:40 a.m.

Powered by CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009795854	1|5|0|2|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual ☐ -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	T

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
ZOTERANIS (Primer apellido)	RIERA (Segundo apellido)	EDUARDO (Primer nombre)	JOSE (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
PT	9620985	Femenino ☐ Masculino ☒	2|1|0|1|1|9|7|4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1160000

18.Residencia			
CL 33 CASA 8 30 (Dirección)	Telefono fijo	3053102800 (Telefono celular)	EDUARDOJOSE@GMAIL.COM (Correo electronico)
BOGOTA (Municipio/Distrito)	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS 20 DE JULIO - DSD DENTOLASER 20 DE JULIO	VS20JULI - DENTO20JUL
S	-	-
S	-	-
S	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 (Dirección)	3215486458 (Telefono)	LMCASTANOC@GMAIL.COM (Correo electrónico)	MANIZALES (Municipio/Distrito)	CALDAS (Departamento)

No de Radicacion
4009795854

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☒ 14. Traslado: ☒ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		15/02/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
EPS048	4	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Eduardo Jose Zaterans Riera	Marcela Sierra Osorio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1 Total: 1
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consista la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
ZOTERANIS	RIERA	EDUARDO	JOSE

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
5620985		1974 01 21	X	2023 02 15

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? X
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? X
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? X
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? X
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? X

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.

*Yo: EDUARDO JOSE ZOTERANIS RIERA identificado con el documento de identidad número: 5620985, X autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante: Eduardo José Zoteranis Riera

Huella digital
(en caso de no saber firmar)

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea gratuita de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no es a medias debe ser total SaludTotal EPS

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Tu Salud y en la de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-04**		**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**			
NOMBRE DEL PACIENTE:	**ZOTERANIS RIERA EDUARDO JOSE**						
IDENTIFICACION:	**5620985**	**RH:**		**EDAD:**	**49**	**GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1974-01-21**		**TELEFONO DE CONTACTO:**				

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS**	**NIT:**	**9014021059**
ESCOLARIDAD:	**PRIMARIA**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	Triglicéridos	Colesterol	Otros:
X	X	X	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA					
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A	
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A	
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A	

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: ZOTERANIS RIERA EDUARDO JOSE**	
	DOCUMENTO: 5620985	

N0 ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Empresa NIT. 901402105-9
Representante Legal
GERMAN DARIO CASTAÑO MUÑOZ

ARL AXA COLPATRIA
Empresa administradora de riesgos laborales

Hace constar que:

EDUARDO JOSE ZOTERANIS RIERA

Con Cedula de Ciudadanía No.**5620985**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 Horas.

Realizado los días 12 al 14 de febrero del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 14 de Febrero de 2023

ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

MAURICIO MORALES GUTIERREZ
LSST N0670/2022-1590-35774
2022/07/07-2022/07/10
Licencia en SO -25-2478

CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

FIRMA CLIENTE

Protección

Nit. 800.138.188-1

Pensión Obligatoria [X] Pensión Voluntaria [ ] Cesantías [ ]

Fecha de Solicitud: 01 (Año) 03 (Mes) 2023 (Día)

Nombre producto voluntario: _____

DATOS PERSONALES

Tipo de Vinculación: [X] Vinculación inicial [ ] Traslado de AFP - Pensión Familiar [ ] Traslado AFP [ ] Traslado de régimen [ ] Traslado de Régimen - Pensión Familiar

Código de verificación: 4 4 0 D 4 F 6 D 6 6

[ ] C.C. [ ] C.E. [ ] RCN [ ] T.I. [ ] Pasaporte [ ] Pasaporte Diplomático [ ] PEP [X] PT

Número documento de identidad: 5620985

Nombre completo: EDUARDO JOSE ZOTERANIS RIERA

ACEPTACIÓN SOLICITUD AFILIACIÓN ELECTRÓNICA

Hago constar que la selección del Régimen de ahorro individual con solidaridad lo he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. También declaro que previo al diligenciamiento de este formulario he recibido una asesoría clara, oportuna y adecuada, en virtud de lo cual manifiesto que de manera informada he elegido a PROTECCIÓN S.A para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica. Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que Protección S.A, me ha brindado información relacionada con el producto previo a la afiliación al Fondo de Cesantías. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica. Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que Protección S.A, me ha brindado la información de las condiciones del producto, de manera clara y previa a mi afiliación al Fondo de Pensiones Voluntarias. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica.

En tal sentido, y cuando resulte procedente de acuerdo con los términos y condiciones del producto respectivo, Protección elaborará el Perfil de Cliente que le permita realizar el Análisis de Conveniencia y proceder con el suministro de una Recomendación Profesional. Manifiesto igualmente, que en los eventos en que en mi calidad de Afiliado ejecute una decisión de inversión, contraria a la Recomendación Profesional suministrada por Protección, se entenderá que me he apartado de la misma, y tal ejecución servirá de constancia en los términos del artículo artículo 2.40.1.3.2. del Decreto 2555 de 2010.

Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Conozco y acepto las obligaciones que en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo quedaron expresas en el formulario de afiliación digital.

El afiliado tiene el derecho a retractarse de su decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le informe de la validación de la afiliación o del traslado por parte de la administradora seleccionada.

AFILIADO

Eduardo Jose Zoteranis Riera

Huella

Firma Afiliado / Firma del cliente / Representante del menor

Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada.

Firma y NIT empleador. (En el caso que sea Obligatoria)

Nombre completo Asesor Comercial: romulo alfredo sandoval hernandez

Número documento de Identidad: 1045703776

Firma representante Legal

Nombres y apellidos JUAN PABLO ARANGO BOTERO

INFORMACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO OPCIONAL

Dirección residencia (Apartamento, barrio, urbanización)			Departamento
Ciudad	Teléfono o Celular	Correo electrónico personal o laboral	
Dirección de Oficina	Ciudad o Municipio	Departamento	Teléfono Oficina
Autorizo el envío de información al celular Si ☐ No ☐	Autorizo el envío de correspondencia y notificaciones al correo electrónico Si ☐ No ☐	En caso de ser negativo seleccione el lugar para el envío de correspondencia física Residencia ☐ Empresa ☐	
Ocupación o cargo actual	Profesión	Integral Si ☐ No ☐	Salario mensual / Fecha ingreso empresa Año Mes Día
NIT	Razón Social		

INFORMACIÓN ADICIONAL PENSIÓN VOLUNTARIA

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Ahorro ☐ Corriente ☐	Número de cuenta Financiera

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 9568

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 27/02/2023 HORA:8:27	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**
NOMBRES: JAVIER ALFONSO CASTRO CARDENAS	DOCUMENTO: 7630373 EDAD: 42 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCION Tel: 3202850397 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso y Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad





LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 7630373**	**2808**

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 27/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	228	28/02/2023	CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CC8AD1982D96FC361CBCFB3A9879F573 Certificado impreso el día 2/27/2023 10:35:57 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

JAVIER ALFONSO
CASTRO CARDENAS
7630373
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Bogotá DC. 27 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 27 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 7630373
Nombres y Apellidos	JAVIER ALFONSO CASTRO CARDENAS
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	27/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	27/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar

No. Radicación 28210932

Fecha de Radicación								
2	7	0	2	2	0	2	3

RADICADO

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de Trámite	2.Tipo de Afiliación	3. Regimen
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza de Familia [X] Beneficiario o Cabeza adicional [ ] B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De oficio [ ]	C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5.Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	01

A. AFILIACIÓN

o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
CASTRO	CARDENAS	JAVIER	ALFONSO
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
PT	7630373	Femenino [ ] Masculino [X]	13/11/1980

III.DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
06	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		00

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	002 / PROTECCION	1.160.000

18. Residencia			
AVENIDA 23 N 23 12	3133138066	3112660449	javiercastro80@hotmail.com
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

54001 / CUCUTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]		54 / NORTE DE SANTANDER
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433 30600437
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	0 1

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar EPS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	2 7 0 2 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO** identificado(a) con **CC** número **7.630.373** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de abril de 2012 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 27 de febrero de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023022710364

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-065

Bogotá, D.C, marzo 02 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No.1 SST
RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_060

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones del informe mensual de obra SST No.1

- **COLEGIO ENRIQUE OLAYA**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían dos trabajadores por relacionar: LEYDER JOSE VIZCANIO Y WILMER FABIAN RIOS.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: José Elías Michelly y Manuel Antonio Cardenas. La del señor Manuel fue realizada el 21 de febrero, fecha por fuera del periodo que se está presentando este informe. Faltan los soportes de inducciones de: Luis Miguel Castaño, Valentina Osorio, Angela Tarazona, Leyder Jose Vizcanio y Wilmer Fabian Rios.

3. Capacitaciones: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

9. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.

10. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.

11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

12. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

13. Listado de vehículos

14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero

- **COLEGIO REINO HOLANDA**

1. Tabla de personal: Relacionan 6 personas. Los señores Juan Carlos Campos y Brayan Alexis Lopera, fueron autorizados para ingreso el día 21 de febrero, por el cual, no aplican dentro del periodo del presente informe. Según lo aprobado por nosotros, no relacionan los siguientes trabajadores.
2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores, con fechas que no coinciden con el periodo del presente informe.
3. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
4. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.
5. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.
6. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
7. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
8. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
9. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
10. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
11. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
12. Listado de vehículos
13. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
14. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
15. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

- **COLEGIO DIANA TURBAY**

1. Inducciones: solo dieron inducción a 3 trabajadores. Falta la inducción de 4 trabajadores. Brayan Andrés Marin, Angela Tarazona, Valentina Osorio, Luis Miguel Castaño.
2. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
3. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
4. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
5. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
6. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
7. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

8. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
9. Listado de vehículos
10. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
11. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
12. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

- **COLEGIO RESTREPO MILAN**

1. El personal reportado según el informe, son 4 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.
2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Anderson Mauricio Galindo Lozano y Luis Fernando Londoño. Faltan los soportes de inducciones de: YESENIA ARENAS, ANGELA TARAZONA, FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.
3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo áreas de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla y según en la observación del punto 1 y 2.
5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
10. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
11. Listado de vehículos
12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

- **COLEGIO JOSE MARTI**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían ocho trabajadores por

relacionar: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO. El señor Jairo Sánchez, ingresó a partir del día 21/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se esta presentando el informe.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Faltan los soportes de inducciones de: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO.
3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo área de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
4. Entrega EPP: solo adjuntaron soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.
5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
10. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
11. Listado de vehículos
12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

- **COLEGIO SAN AGUSTIN**

1. El personal reportado según el informe, son 6 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: NEIDER ANTONIO POLO DE LA HOZ, GLORIA ESTHER ALVAREZ OSORIO, JHONATAN LONDOÑO QUIÑONEZ, GINA KATERINE CASAS CASTILLO, VALENTINA OSORIO CRISTANCHO CARDENAS SAENZ, ROMAN ELIAS CONDE. El señor Johan Estiven Rozo, ingresó a partir del día 20/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se está presentando el informe.
2. Inducciones: No presentaron soportes de inducciones
3. Capacitaciones: No presentan soportes de capacitaciones.
4. Entrega EPP: No presentaron soportes de entrega de EPP
5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
6. No presentan soportes de ATS

CONSORCIO TIG

7. No presentan soportes de inspecciones.
8. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
9. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
10. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
12. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
13. Listado de vehículos
14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

Dadas las observaciones respectivas, se queda a la espera de las correcciones al informe para dar aprobación y su respectivo trámite ante la entidad en el menor tiempo posible.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-065

Bogotá, D.C, marzo 02 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No.1 SST

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones del informe mensual de obra SST No.1

- **COLEGIO ENRIQUE OLAYA**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían dos trabajadores por relacionar: LEYDER JOSE VIZCANIO Y WILMER FABIAN RIOS.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: José Elías Michelly y Manuel Antonio Cardenas. La del señor Manuel fue realizada el 21 de febrero, fecha por fuera del periodo que se está presentando este informe. Faltan los soportes de inducciones de: Luis Miguel Castaño, Valentina Osorio, Angela Tarazona, Leyder Jose Vizcanio y Wilmer Fabian Rios.

3. Capacitaciones: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

9. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.

10. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.

11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

12. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

13. Listado de vehículos

14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero

- **COLEGIO REINO HOLANDA**

1. Tabla de personal: Relacionan 6 personas. Los señores Juan Carlos Campos y Brayan Alexis Lopera, fueron autorizados para ingreso el día 21 de febrero, por el cual, no aplican dentro del periodo del presente informe. Según lo aprobado por nosotros, no relacionan los siguientes trabajadores.
2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores, con fechas que no coinciden con el periodo del presente informe.
3. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
4. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.
5. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.
6. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
7. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
8. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
9. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
10. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
11. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
12. Listado de vehículos
13. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
14. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
15. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

- **COLEGIO DIANA TURBAY**

1. Inducciones: solo dieron inducción a 3 trabajadores. Falta la inducción de 4 trabajadores. Brayan Andrés Marin, Angela Tarazona, Valentina Osorio, Luis Miguel Castaño.
2. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
3. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
4. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
5. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
6. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
7. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

8. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
9. Listado de vehículos
10. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
11. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
12. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

- **COLEGIO RESTREPO MILAN**

1. El personal reportado según el informe, son 4 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.
2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Anderson Mauricio Galindo Lozano y Luis Fernando Londoño. Faltan los soportes de inducciones de: YESENIA ARENAS, ANGELA TARAZONA, FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.
3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo áreas de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla y según en la observación del punto 1 y 2.
5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
10. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
11. Listado de vehículos
12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

- **COLEGIO JOSE MARTI**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían ocho trabajadores por

relacionar: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO. El señor Jairo Sánchez, ingresó a partir del día 21/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se esta presentando el informe.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Faltan los soportes de inducciones de: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO.
3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo área de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.
4. Entrega EPP: solo adjuntaron soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.
5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
10. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
11. Listado de vehículos
12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

- **COLEGIO SAN AGUSTIN**

1. El personal reportado según el informe, son 6 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: NEIDER ANTONIO POLO DE LA HOZ, GLORIA ESTHER ALVAREZ OSORIO, JHONATAN LONDOÑO QUIÑONEZ, GINA KATERINE CASAS CASTILLO, VALENTINA OSORIO CRISTANCHO CARDENAS SAENZ, ROMAN ELIAS CONDE. El señor Johan Estiven Rozo, ingresó a partir del día 20/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se está presentando el informe.
2. Inducciones: No presentaron soportes de inducciones
3. Capacitaciones: No presentan soportes de capacitaciones.
4. Entrega EPP: No presentaron soportes de entrega de EPP
5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.
6. No presentan soportes de ATS

CONSORCIO TIG

7. No presentan soportes de inspecciones.
8. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.
9. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.
10. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.
11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.
12. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.
13. Listado de vehículos
14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad
15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.
16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

Dadas las observaciones respectivas, se queda a la espera de las correcciones al informe para dar aprobación y su respectivo trámite ante la entidad en el menor tiempo posible.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Elaboró: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-066

Bogotá, D.C, marzo 02 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jhon Jairo Hincapié	79482086	Ayudante	José Martin
2	Neider Antonio Polo	1041890049	Ayudante	Restrepo Millán

3	Héctor Veloza Duitama	79726908	Ayudante	Alfredo Iriarte
4	Miguel Bulla	1033819936	Ayudante	Liceo Femenino

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8





CLL 69 i Sur 46 b 69

capital salud

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud EPS-S
Te entiendo. Te atiendo

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE (Use los marcadores que se encuentran anexos al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedad [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: Velo Zq	Segundo apellido: Duitama	Primer nombre: Hector	Segundo nombre:
7. Tipo documento de identidad: CC	8. Número de documento de identidad: 79 726.908	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 22 02 1978

III. DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
Alfa Colpatria	Porvenir	1.160000

18. Residencia			
Dirección: Cl 69 Sur 46 B 69	Teléfono: 3008757394	Ciudad/municipio:	Departamento:
Nombre/Centro Poblado: Bogotá	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Ciudad/municipio: Bogotá	Departamento:

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres completos			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Nº Manzana/Cuadra	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
Colono Construcción Consciente SAS	NIT	901 402 105	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
Cr 24 70-08	3218565198	mare_1393@hotmail.com	Manizales	Caldas

capitalsalud

Tu extiende. Te atiende

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección de los datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  - Código ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad
  - ☐ A. Régimen Contributivo
  - ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado
  - ☐ A. Mismo Régimen
  - ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad de pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento	42. Fecha: 28 02 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado. Código ☐	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- ☐ 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

Héctor Valoza Quintana	Marcela Serna Osorio
54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Copia documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ — Cantidad ☐ — Total ☐
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
- ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 28/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	230	01/03/2023	CC 79482086	HINCAPIE JOHN JAIRO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

17F16AD7D51F8D5A24F7EE07243AF92C Certificado impreso el día 2/28/2023 4:38:17 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

JAIRO
HINCAPIE JOHN
79482086
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

capitalsalud EPS-S
Te entiendo. Te atiendo

RADICADO 28 FEB 2023

FORMULARIO No.

Número de Radicación	Fecha de Radicación
2579-2502100	28 02 2023

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran al dorso del formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedad [ ]
2. Tipo de Afiliado: A. Individual [X] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

8. Datos básicos de identificación (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido: HINCAPIE	Segundo apellido:	Primer nombre: JOHN	Segundo nombre: JAIRO

7. Tipo documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79482 086	Femenino [ ] Masculino [X]	20 12 1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo F N M / Condición T P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingresos base de cotización - IBC
POSITIVA ARL	PROTECCION	1.160.000

18. Residencia				
Dirección: Calle 23 #94-19	Teléfono: 6792378	Teléfono celular: 3137642210	Correo electrónico:	
Municipio / Distrito: BOGOTA D.C.	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna: CIUDAD BOLIVAR	Departamento: BOGOTA D.C.	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres completos: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo F	Tipo I	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia: Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo con indicativo	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
A		
B		
D		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador a pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JORGE MARIN VILLA	CC	13190396	

39. Dirección				
CALLE 39A 70-190	5801793	[illegible]	LOS PATIOS (Municipio / Distrito)	N.S (Departamento)

Powered by CamScanner

RADICADO
2 8 MAY 2023

capitalsalud
EPS-S
Te entiendo. Te atiendo

FORMULARIO No.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de los datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
HINCAPIE		JOHN	JAILO

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CC	1998C086	Femenino [ ] Masculino [X]	20/11/1985	

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
Capital Salud Sub.	[ ]	Comfenalco - Protección

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al régimen contributivo, especial o de excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Copia documento de identidad — CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de vinculación
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
RONCADA	CONTRERAS	JONATHAN	HERNAN

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario
CC	80171927	

Observaciones

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Powered by CamScanner

Bogotá DC. 28 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 28 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 79482086
Nombres y Apellidos	JOHN JAIRO HINCAPIE
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	28/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	28/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **HINCAPIE JHON JAIRO** identificado(a) con **CC** número **79.482.086** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 30 de octubre de 1999 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023022816394

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 9601

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 01/03/2023 HORA:10:32	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**
NOMBRES: JOHN JAIRO HINCAPIE	DOCUMENTO: 79482086 EDAD: 54 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCION Tel: 3212965663 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	Si
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

JOHN JAIRO HINCAPIE



LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 79482086**	**6898**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.033.819.936

BULLA

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



Miguel Angel Bulla

FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1999**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

03-NOV-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01133297-M-1033819936-20200219 **00701**77933A 1 9911895415

Powered by CamScanner

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1033819936
Nombre:	MIGUEL ANGEL BULLA
Fecha Ingreso:	13/02/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/2/2023 6:22:28 PM

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/02/2023, el empleador CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS identificado con NIT número 901402105 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5412267	13/02/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1033819936	MIGUEL ANGEL BULLA	1160000	AYUDANTE DE OBRA	2023-02-10

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Febrero del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MIGUEL ANGEL BULLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.033.819.936**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti, Salud y en lo de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	**2023-02-04**	**EXAMEN:**	**INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA**
NOMBRE DEL PACIENTE:		**BULLA MIGUEL ANGEL**	
IDENTIFICACION:	**1033819936**	**RH:** **O+** **EDAD:** **23** **GENERO:**	**M**
FECHA DE NACIMIENTO:	**1999-10-20**	**TELEFONO DE CONTACTO:**	

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	**CASTAÃ'O CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS**	**NIT:**	**9014021059**
ESCOLARIDAD:	**BACHILLER**	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	**OFICIAL**

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	X	Trigliceridos	X	Colesterol	X	Otros:	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA						
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A		
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A		
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A		

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: BULLA MIGUEL ANGEL**	
	DOCUMENTO: 1033819936	

N0 ACREDITACION
18-CPR-002

Centro De Formación y Entrenamiento

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

PROVEDOR No.08SE2020220000000040245-202012-03

CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Empresa NIT. 901402105-9
Representante Legal
GERMAN DARIO CASTAÑO MUÑOZ

ARL AXA COLPATRIA
Empresa administradora de riesgos laborales

Hace constar que:

MIGUEL ANGEL BULLA

Con Cedula de Ciudadanía No. **1033819936**

CURSO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS

EN NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad de 32 Horas.

Realizado los días 12 al 14 de febrero del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C

En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC-6072

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 14 de Febrero de 2023


ALBA MERY ORTIZ
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

MAURICIO MORALES GUTIERREZ
LSST N0670/2022-1590-35774
2022/07/07-2022/07/10
Licencia en SO -25-2478

CELAC
Trabajo en Alturas
NTC 6072
No. 30.370-1

Aprobación. MT.
No. 08SE2020220000000040245
2020/12/03

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.vertickal@gmail.com/www.psmvertickal.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

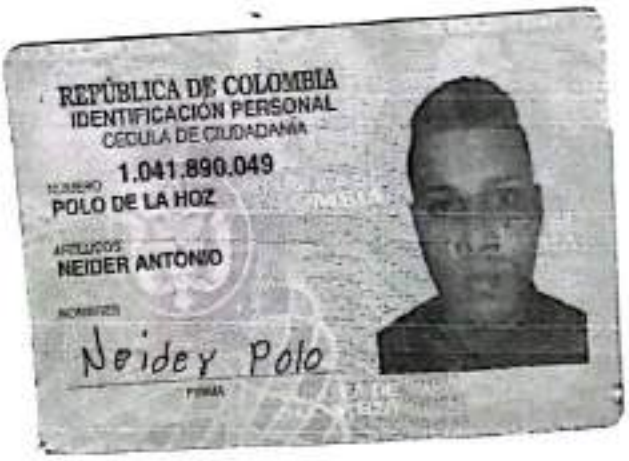
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.041.890.049
APELLIDOS
POLO DE LA HOZ
NOMBRES
NEIDER ANTONIO
Neider Polo
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-2002
PONEDERA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-SEP-2020 PONEDERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Escaneado con CamScanner

IPS EN SALUD

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

Nro. 6199

FECHA : 8/06/2022 HORA:11:18	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: NEIDER ANTONIO POLO DE LA HOZ	DOCUMENTO: 1041890049	EDAD: 19 GENERO: M
Empresa: UNION TEMPORAL MO 2021	Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCION	Tel: 3234176857 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 1409 del 23 de julio del 2012

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	SI	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	SI
Visiometria	SI	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Triglicéridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serología	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	NA	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	Si	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que he leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

Dra. Gloria M.
Médico Especialista

LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 1041890049**	**9331**

Escaneado con CamScanner

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

Bogotá, D.C, marzo 02 de 2023

TIG-MEM-067

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ENTREGA RESPUESTA INFORME ESTRUCTURAL COLEGIO JOSE MARTI

Respetados señores:

Se remiten a ustedes las observaciones hechas por el especialista estructural de la interventoría, para su revisión, subsanación y fines pertinentes.

Observaciones cubiertas aulas:

1. Para la propuesta de cambio de tejas de asbesto cemento por otra que no represente posible afectación a la salud no hay observación específica.
2. Se considera apropiada la evaluación de cargas presentada para la revisión de capacidad de las correas de cubierta, aunque faltó la evaluación de cargas provenientes de granizo, la cual se debe tener en cuenta también, así como su inclusión en las combinaciones de carga.
3. La no inclusión de las cargas debidas al sismo se considera apropiado, no solo porque las correas no constituyen elementos de resistencia sísmica, sino además porque es un elemento simplemente apoyado.
4. El elemento correa tipo celosía, se debe evaluar como simplemente apoyado, por lo que uno de los apoyos debe permitir el desplazamiento del apoyo en la dirección de la correa.

5. La propuesta de apoyo intermedio para las correas de 8.40m dejando luz libre de 4.20m, se considera apropiada y se acepta, ya que no solo reduce las exigencias de los elementos que componen la correa tipo celosía, sino que reduce las exigencias torsionales a las que se ve afectada esta estructura.
6. La instalación de los templetes con varilla de ½", disminuyendo la distancia sin arriostrar a 2m, también se considera apropiada siempre y cuando se emplee con la viga de apoyo intermedio, según se presenta en la imagen 30 del informe presentado.
7. La alternativa de reforzar la cuerda superior con ángulo de 2- 1/2"x1/4" se considera viable, pero es la de mayor costo y no disminuye la longitud de torsión del elemento, por lo que no resulta ser la más atractiva.

Observaciones cubierta de comedor:

1. Para la propuesta de cambio de cubierta de comedor por deterioro y la adecuación general del sistema de drenaje, no se presentan observaciones específicas.
2. El documento evaluado no presenta propuesta de intervención de elementos estructurales para la cubierta del comedor.

Observaciones cubierta de cancha:

1. Para la teja de la cubierta de cancha no se presentan observación específica.
2. El documento evaluado no presenta propuesta de intervención de elementos estructurales para la cubierta de cancha.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-068

Bogotá, D.C, marzo 03 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jonathan Alberto Zapata	80773320	Ayudante	José Marti

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.773.320
ZAPATA CARMONA
APELLIDOS
JONATHAN ALBERTO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1985
VILLA DEL ROSARIO
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
08-AGO-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
P-1500100-00949702-M-0080773320-20171026
00582

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 02/03/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	243	03/03/2023	CC 80773320	ZAPATA CARMONA JONATHAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

6B50678DE6CBCE0D810D444F97DF5AE5 Certificado impreso el día 3/2/2023 10:03:49 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

JONATHAN ALBERTO
ZAPATA CARMONA
80773320
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 02/03/2023, el empleador JOSE JOAQUIN YANEZ VILLAMIZAR identificado con NIT número 13240346 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5397720	02/03/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	80773320	JONATHAN ALBERTO ZAPATA CARMONA	1160000	OBRERO DE CONSTRUCCION	2023-03-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 02 días del mes de marzo del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Bogotá DC. 02 de marzo de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 02 de marzo de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 80773320
Nombres y Apellidos	JONATHAN ALBERTO ZAPATA CARMONA
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	02/03/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	02/03/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JONATHAN ALBERTO ZAPATA CARMONA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **80773320,** *no está afiliado/a* al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 02 de marzo de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-069

Bogotá, D.C, marzo 03 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1
RESPUESTA OFICIO 2023_RUU_MGP_071

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado y dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, se remiten observaciones del informe mensual ambiental de obra No.1

1. Corregir las fechas del periodo del informe (va hasta el 19 de febrero 2023)

2. En el numeral 7" Actividades técnicas desarrolladas en el periodo", hacer una mayor descripción de las actividades, los colegios donde se realizó demolición, los colegios donde se adecuaron las oficinas. Ampliar esta descripción, se puede apoyar con la descripción del informe técnico

3. Corregir el numeral 8.1.1 "Programa de gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)", la parte que menciona los anexos ya que solo se presentaron en el informe los anexos 1 y 2.
En este mismo numeral relacionar los formatos que se diligenciaron (Formato estimación de costos Rafael Uribe Uribe, Formato Informe de RCD IN SITU Rafael Uribe, Formato Seguimiento y aprovechamiento Rafael uribe Uribe)
Incluir el tema de manejo de residuos ordinarios en obra, puntos ecológicos, uso de código de colores, incluir registro fotográfico.
Describir sitios de acopio de RCD, señalización, demarcación.

4. En el numeral 8.1.2 “Programa de prevención sobre la contaminación de vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios públicos”, se explica que "se realizó un reconocimiento de campo donde se evidenció la necesidad de no cubrir los sumideros en los colegios visitados”, ampliar esta explicación. Colocar las fotográficas específicas a sumideros, e incluir todos los colegios intervenidos en el periodo.

5. En las conclusiones se menciona que “Se presentan los certificados de los materiales que se allegan a la interventoría”. Si se enviaron a interventoría y están dentro del periodo del informe 01, se deben mencionar en el cuerpo del informe

6. Incluir mayor número de fotos en el registro fotográfico y dentro del cuerpo del informe.

7. Incluir todos los indicadores ambientales referenciados en las 17 Programas del PMA y que apliquen al periodo del informe 01. En caso de no aplicar explicar el porqué.

8. Por cada programa del PMA presentado por el contratista, incluir un numeral en el informe y explicar las actividades realizadas, en caso de no aplicar explicar el porqué, se debe mostrar la gestión realizada, por ejemplo:

Programa 2: Cuales capacitaciones ambientales realizaron, qué temas se incluyeron en la inducción del personal
Programa 4: Manejo de sustancias químicas, se hizo el inventario, se publicaron las MSDS
Programa 5: Hubo instalación de puntos ecológicos, se capacito o dio charla en el tema, se gestionó programación de volquetas para retiro de RCD, como se organizó el sitio donde se acopio el residuo generado de la actividad de demolición, cuáles fueron los sitios definidos para el almacenamiento de Residuos, que gestión se hizo relacionado con el residuo que contienen asbesto
Programa 8: Se instaló el cerramiento, protección del material demolido o ubicación
Programa 9: Unidades sanitarias utilizadas por el personal (cuales fueron)
Programa 11: Cómo se protegieron los individuos arbóreos, en la sede del Colegio Olaya Herrera existe un IA
Programa 17: Cuáles compras verdes se realizaron

9. Que formatos de inspección relacionados con el componente ambiental utilizaron en el mes (listas de chequeo), describir cuales, escanearlas y presentarles en el informe.

10. Verificar y dar cumplimiento al contenido del informe de acuerdo al oficio TIG-MEM-050 enviado el 20 de febrero de 2023, donde se mencionan los temas mínimos del informe ambiental mensual, por lo tanto se solicita que se relacionen en este informe los numerales faltantes, y en caso de no aplicar algún numeral de los mencionados en este oficio se explique su razón.

CONSORCIO TIG

Dadas las observaciones respectivas, quedamos a la espera de las correcciones al informe para dar aprobación y su respectivo trámite ante la entidad en el menor tiempo posible.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó : Dalia Minerva Briceño Rodríguez CONSORCIO TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-070

Bogotá, D.C, marzo 03 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Yerimy Gabriel Gutiérrez	6971469	Ayudante	Enrique Iriarte

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

MEDIC EXPERT

Siempre Pensando en Ti, Salud y en lo de los Tuyos

DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR
MEDICO Y CIRUJANO, ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESOLUCION No 15-0425 DE 2019

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO LABORAL

INFORMACION GENERAL

FECHA Y LUGAR:	2023-02-22	**EXAMEN:**	INGRESO CON ENFASIS EN ALTURA		
NOMBRE DEL PACIENTE:	GUTIERREZ GUTIERREZ YERIMY GABRIEL				
IDENTIFICACION:	6971469	**RH:**		**EDAD:** 21	**GENERO:** M
FECHA DE NACIMIENTO:	2001-06-28	**TELEFONO DE CONTACTO:**			

INFORMACION LABORAL

EMPRESA EN MISION:	CASTAÃ‘O CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	**NIT:**	901402105
ESCOLARIDAD:	BACHILLER	**CARGO A DESEMPEÑAR:**	AYUDANTE

EXAMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	X	Visiometría	X
Audiometría	X	Optometría	
Osteomuscular	X	Espirometría	

Examenes de laboratorio:

Glicemia	X	Trigliceridos	X	Colesterol	X	Otros:	X

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

Presenta restricciones que le impida el desarrollo de la labor a realizar:	NINGUNA						
Apto para laborar en Alturas de acuerdo con la Resolucion 4272:	SI	X	NO		N/A		
Apto para laborar en Espacios Confinados:	SI	X	NO		N/A		
Apto para el cargo	SI	X	NO		N/A		

OBSERVACIONES

Capacitacion y certificacion para trabajo seguro en alturas (Res 4272).

RECOMENDACIONES

*	Realizar control por optomeria en su EPS.	*	Realizar valoracion por nutricion en su EPS.
*	Realizar pausas activas.		
*	Estilos de vida saludable		
*	Evitar posturas prolongadas.		
*	Ejercicio fisico.		
*	Uso de proteccion auditiva.		

INFORMACION ADICIONAL

Niega signos sintomas relacionados con el sindrome respiratorio (SARS-COVID19), niega morbilidades preexistentes que lo identifiquen como poblacion en riesgo para (SARS-COVID19) según circular 030 del 2.020

PROFESIONAL	PACIENTE	
FIRMA Y SELLO	**FIRMA:**	HUELLA
NOMBRE DEL MEDICO: DR. GLORIA LEONOR VEGA CORREDOR	**NOMBRE: GUTIERREZ GUTIERREZ YERIMY GABRIEL**	
	DOCUMENTO: 6971469	

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
EPS Por Ti Tu Bienestar

No. De Radicación	Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Tramite	2. Tipo de Afiliado	3. Régimen
A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐	A. Cotizante ☐ B. Beneficiario ☐ C. Independiente ☐ D. Pensionado ☐ E. Cotizante Estudiante ☐ F. Cotizante Trabajador Dependiente ☐ G. Beneficiario Estudiante ☐ H. Beneficiario Trabajador Dependiente ☐	A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código
A. Cotizante ☐ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

II. AFILIACIÓN

A. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

1. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Gutierrez	Segundo apellido: Gutierrez	Primer nombre: Yerimy	Segundo nombre: Gabriel

2. Tipo de documento de identidad	3. Número de documento de identidad	4. Sexo	5. Fecha de nacimiento
PPT	6971469	Masculino ☐ Femenino ☒	28 06 2001

B. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

6. Etnia	7. Ocupación	8. Nivel educativo	9. Grupo de población especial
	Tipo: I N U Código:		

10. Nombre del padre o del representante legal	11. Nombre de la madre	12. Ingreso base de cotización
Ana Gipatera	Protecoon	1.160.000

13. Residencia			
Dirección: CRA 72 23 Sur	Teléfono Fijo:	Teléfono celular: 3102024964	Correo electrónico:
Departamento: Bogota	Zona: Urbana ☐ Rural ☐	Localidad/Comuna:	Municipio: Bogotá

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

14. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

15. Tipo de documento de identidad	16. Número del documento de identidad	17. Sexo	18. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	19. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20.1				
20.2				
20.3				
20.4				
20.5				

	21. Tipo de documento de identidad	22. Número del documento de identidad	23. Sexo		24. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
20.1					
20.2					
20.3					
20.4					
20.5					

Datos complementarios

	25. Parentesco	26. Hijo	27. Discapacidad Tipo			28. Cotizante	
			A	B	C	A	B
20.1							
20.2							
20.3							
20.4							
20.5							

	29. Lugar de residencia					30. Valor de la UPC actualizado para el año en curso (lo registra por la EPS)
	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Territorio especial de salud	
20.1						
20.2						
20.3						
20.4						
20.5						

31. Nombre de la entidad administradora de Pensiones (AFP)	Código de la AFP (lo registra por la EPS)
A.	
B.	
C.	
D.	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

32. Nombre o razón social	33. Tipo de documento de identificación	34. Número del documento de identificación	35. Tipo de aportante o cotizante asignado (lo registra por la EPS)
Castano Construccion Graciente	NIT	901.402.105	

36. Ubicación				
Dirección: Cra 70-08	Teléfono: 3218665198	Correo electrónico: marce_1398@hotmail.com	Municipio/Distrito: Manizales	Observaciones: Caldas

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para cotizar.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Misma Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Traslado de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	4.2 Fecha
				03/03/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado. Código: [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no pertenencia del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante a cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación a del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante a cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular un mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Jaime Gabriel Gutierrez Gutierrez — 54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

Marcela Serna Osorio — 55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Total: [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que mantiene la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad del beneficiario o su ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

INFORMACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO OPCIONAL

Dirección residencia (Apartamento, barrio, urbanización)			Departamento
Ciudad	Teléfono o Celular	Correo electrónico personal o laboral	
Dirección de Oficina	Ciudad o Municipio	Departamento	Teléfono Oficina

Autorizo el envío de información al celular	Autorizo el envío de correspondencia y notificaciones al correo electrónico	En caso de ser negativo seleccione el lugar para el envío de correspondencia física
Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Residencia ☐ Empresa ☐

Ocupación o cargo actual	Profesión	Integral	Salario mensual	Fecha ingreso empresa
		Si ☐ No ☐		Año Mes Día

NIT	Razón Social

INFORMACIÓN ADICIONAL PENSIÓN VOLUNTARIA

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta Financiera
	Ahorro ☐ Corriente ☐	

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	6971469
Nombre:	YERIMY GABRIEL GUTIERREZ GUTIERREZ
Fecha Ingreso:	03/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	02/03/2023 10:00:49 a.m.

COOSALUD

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O NOVEDAD

COOSALUD EPS SA certifica que el día 02/03/2023, se radicó solicitud de trámite de afiliación y/o novedad ante esta EPS, relacionando los siguientes datos en el formulario adjunto:

• **No. RADICADO:**	32229791
• **RÉGIMEN:**	Contributivo
• **TIPO DE TRÁMITE:**	Movilidad al régimen contributivo
• **FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL:**	2023-03-03
• **TD AFILIADO:**	PT
• **NÚMERO DOCUMENTO AFILIADO:**	6971469
• **TD EMPLEADOR:**	NIT
• **NÚMERO DOCUMENTO EMPLEADOR:**	901402105
• **FONDO DE PENSIÓN:**	PROTECCION
• **IBC:**	$1.160.000,00
• **No. ADJUNTOS:**	2

OBSERVACIONES:

1. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, la afiliación y reporte de las novedades se realizará en el formulario físico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social directamente a las EPS, y éstas las reportarán a la Base de Datos de Afiliados del Sistema conforme a la normativa vigente. Decreto 780/2016.
2. El trámite y gestión del caso radicado se realizará dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha de expedición del presente documento. La respuesta será enviada al correo electrónico registrado en la plataforma de autogestión de empleadores.
3. Documento NO válido para prestación de servicios médicos y/o trámite de traslados entre EPS.

Cualquier inquietud con la información aquí contenida, puede comunicarse a través de las líneas 018000 515 611 ó #922.

La presente se expide a solicitud del interesado en Cartagena, a los 2 días del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,



CARLOS TORRES SALAZAR

Subdirector Nacional de Aseguramiento

COOSALUD EPS SA



FIRMA CLIENTE

Protección

Nit 830.138.188-1

Pensión Obligatoria [X] Pensión Voluntaria [ ] Cesantías [ ]

Nombre producto voluntario: _____

Fecha de Solicitud: 2023 (Año) 03 (Mes) 02 (Día)

DATOS PERSONALES

Tipo de Vinculación: [X] Vinculación inicial [ ] Traslado de AFP – Pensión Familiar [ ] Traslado AFP [ ] Traslado de régimen [ ] Traslado de Régimen – Pensión Familiar

Código de verificación: E A D 2 0 D 0 C 8 C

[ ] C.C. [ ] C.E. [ ] RCN [ ] T.I. [ ] Pasaporte [ ] Pasaporte Diplomático [ ] PEP [X] PT

Número documento de identidad: 6971469

Nombre completo: YERIMY GABRIEL GUTIERREZ GUTIERREZ

ACEPTACIÓN SOLICITUD AFILIACIÓN ELECTRÓNICA

Hago constar que la selección del Régimen de ahorro individual con solidaridad lo he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. También declaro que previo al diligenciamiento de este formulario he recibido una asesoría clara, oportuna y adecuada, en virtud de lo cual manifiesto que de manera informada he elegido a PROTECCIÓN S.A para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica. Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que Protección S.A, me ha brindado información relacionada con el producto previo a la afiliación al Fondo de Cesantías. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica. Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que Protección S.A, me ha brindado la información de las condiciones del producto, de manera clara y previa a mi afiliación al Fondo de Pensiones Voluntarias. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica.

En tal sentido, y cuando resulte procedente de acuerdo con los términos y condiciones del producto respectivo, Protección elaborará el Perfil de Cliente que le permita realizar el Análisis de Conveniencia y proceder con el suministro de una Recomendación Profesional. Manifiesto igualmente, que en los eventos en que en mi calidad de Afiliado ejecute una decisión de inversión, contraria a la Recomendación Profesional suministrada por Protección, se entenderá que me he apartado de la misma, y tal ejecución servirá de constancia en los términos del artículo artículo 2.40.1.3.2. del Decreto 2555 de 2010.

Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Conozco y acepto las obligaciones que en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo quedaron expresas en el formulario de afiliación digital.

El afiliado tiene el derecho a retractarse de su decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le informe de la validación de la afiliación o del traslado por parte de la administradora seleccionada.

AFILIADO

Yerimy Gabriel Gutierrez G



Huella

Firma Afiliado / Firma del cliente / Representante del menor

Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada.

Firma y NIT empleador. (En el caso que sea Obligatoria).

Nombre completo Asesor Comercial: romulo alfredo sandoval hernandez

Número documento de Identidad: 1045703778

Firma representante Legal

Nombres y apellidos JUAN PABLO ARANGO BOTERO

AFILIADO

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-071

Bogotá, D.C, marzo 03 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B.

Respetados señores:

Adjunto al presente comunicado se anexa la planimetría de la propuesta de diseño arquitectónico para la intervención de los baños del colegio Diana Turbay Sede B presentada por el contratista CONSORCIO MIA GP. Esto con el propósito de solicitar la aprobación por parte de la entidad.

Agradecemos su atención y esperamos una respuesta favorable de su parte.

cordialmente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado: 2023_RUU_MGP_067

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_067

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega propuesta baños colegio Diana Turbay Sede B.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se adjunta planimetría de propuesta de diseño arquitectónico de los baños a intervenir del colegio Diana Turbay Sede B, con el fin de recibir aprobación por parte de la entidad.


Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Planimetría
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

PLANTAS ARQUITECTONICAS Esc. 1:150

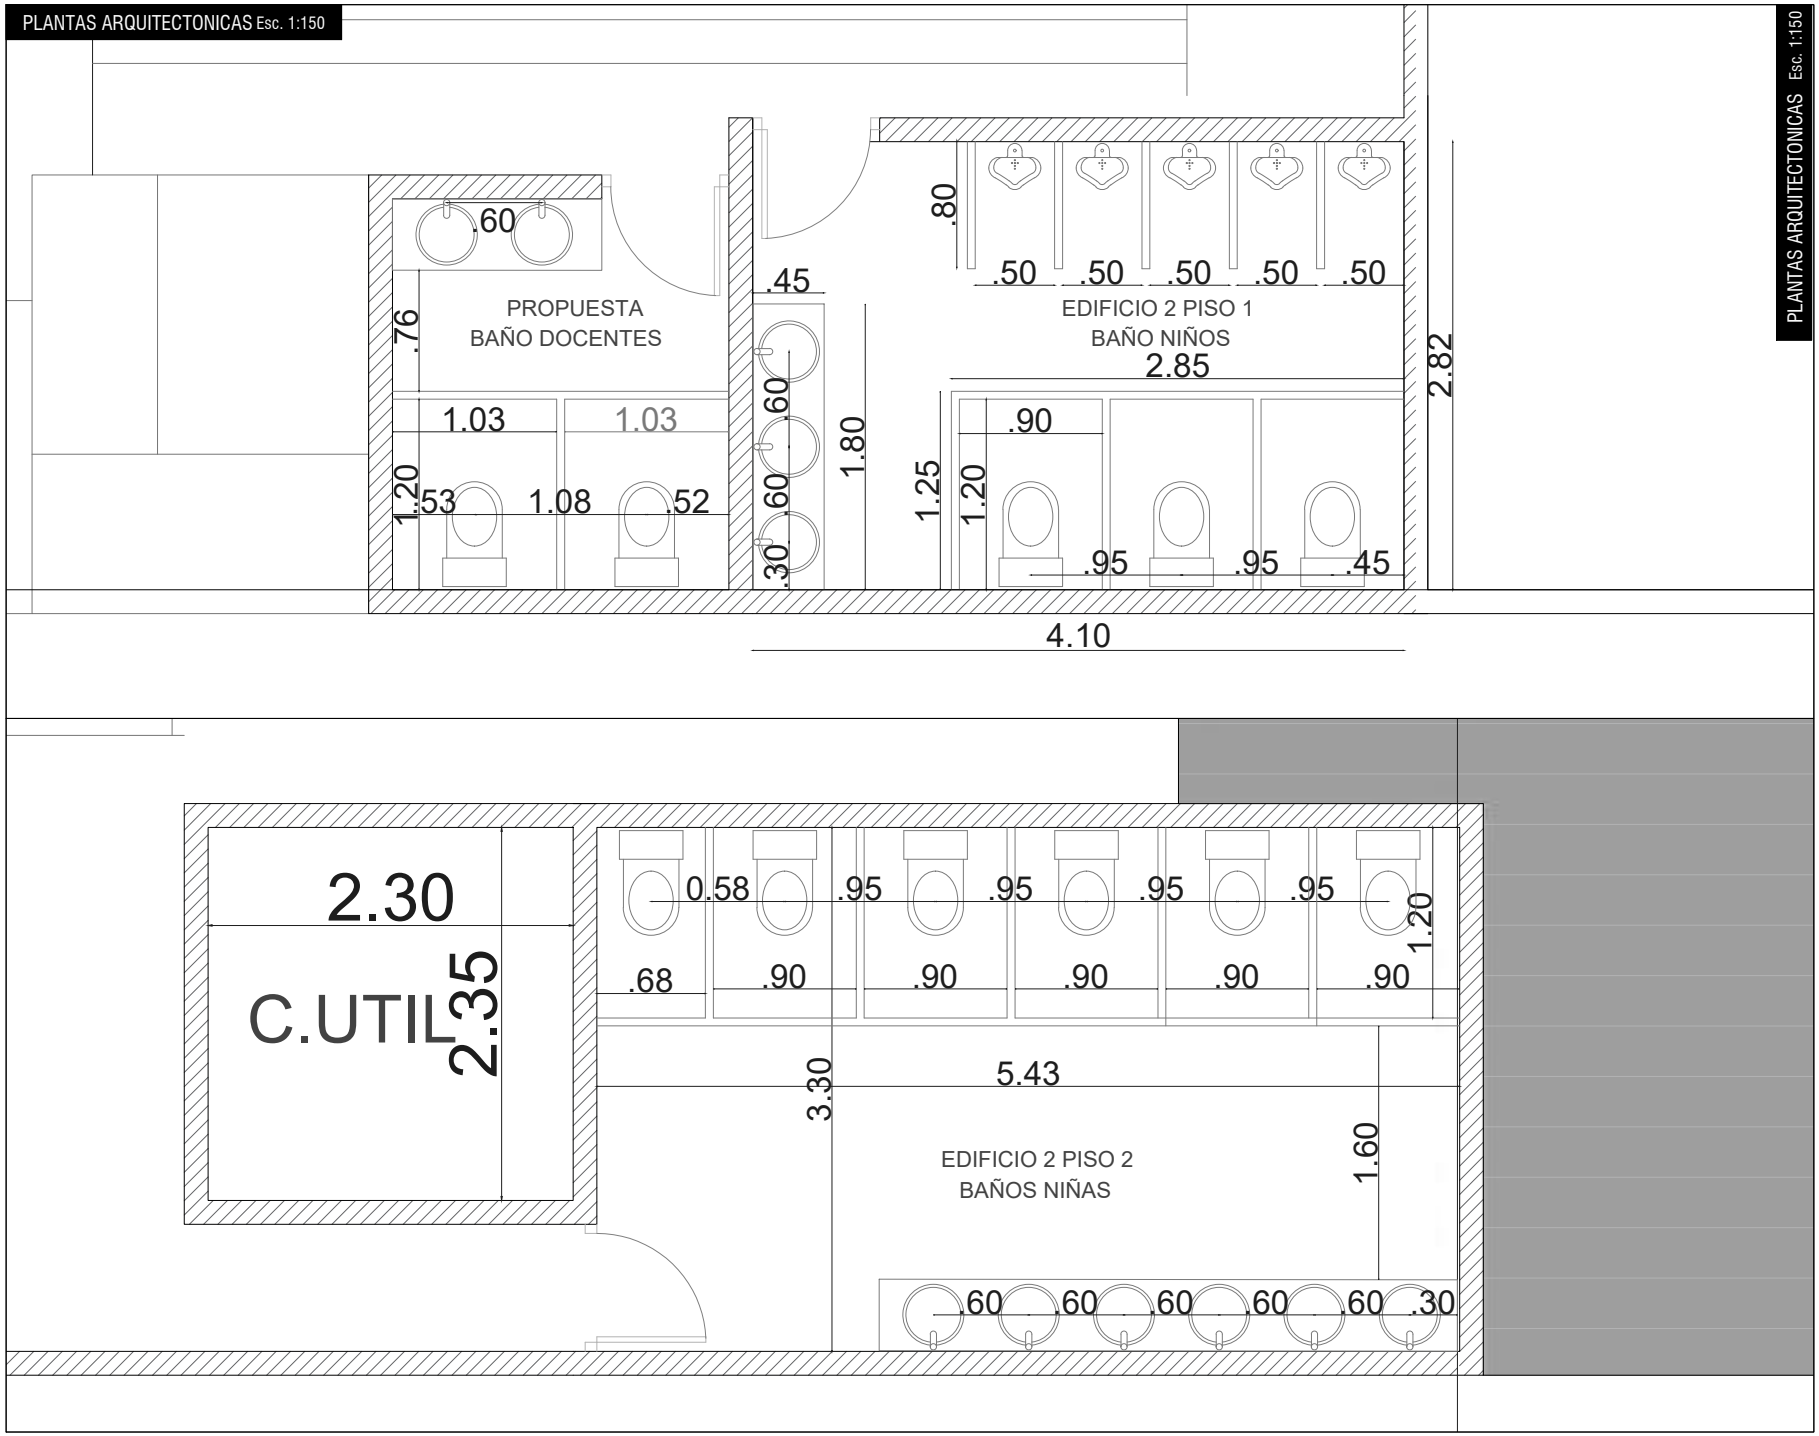

PLANTAS ARQUITECTONICAS Esc. 1:150

PROYECTO

COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B

BOGOTÁ,CUNDINAMARCA
ADECUACIÓN GENERAL

PROPIETARIO

Colegio Distrital Diana Turban Sede B

ARQUITECTA

Valentina Osorio Giraldo
M.P. A2328201 7-1094944405

CONTACTO

Valeosorio@hotmail.es
(+57) 300-785-87-06
Armenia, Quindío

NOTAS GENERALES

1.- LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO SISMICO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCIÓN SE ELABORARAN LOS DIFERENTES DISEÑOS PARTICULARES.
"EL RESPONSABLE(NO) DEL SUPERVISOR TÉCNICO EL VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS NOESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN EN LA EDIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CUENTA DE CONFORME AL CAMPO AL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO EN(NR)A.9.6.1 Y A.9.3 DE LA NSR-98). EL CONSTRUCTOR DEBE INFORMAR AL PROPIETARIO DE LOS COSTOS DE ASUMIR UN GRADO DE DESEMPEÑO MAYOR, Y EL DE QUE PUEDA TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.

2.- LAS SPECIMES ELECTRICOS, POR EL ARQUITECTO DEBEN REVISADOS POR EL DISEÑADOR ESTRUCTURAL, EL CONSTRUCTOR Y EL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OBRA, CUANDO CORRESPONDA CON EL ARQUITECTO DISEÑADOR. LAS SOLUCIONES PROPUESTAS A FIN DE CUMPLIR ESTA CONDICIÓN, EL CÁLCULO DEL REFUERZO Y DE LOS AISLADO DE LAS MAMPOSTERÍAS INTERNAS Y DE FACHADA, ASÍ COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES NO CONTINUOS, DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR EL PROFESIONAL CALCULISTA DE LA OBRA, O POR LOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

3. - LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTOS PLANOS DE ARQUITECTONICA Y DE CARÁCTER GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS SOBRE COMPONENTES EN LOS PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y EN LOS DE LOS DISEÑADORES TÉCNICOS. CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLOS Y LA DE ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE CON EL ARQUITECTO.

ARCHIVO

CBL_P-ARQUITECTONICOS.dwg

FECHA

Febrero 2023

CONTIENE

Planta Cubiertas

ESCALA

INDICADA

01 | 01

PLANO No

DIANATURBAY_
P-ARQ

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-072

Bogotá, D.C, marzo 06 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Antonio Velandia Rojas	79910581	Instalador de Ventanería	Reino de Holanda

CONSORCIO TIG


Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.910.581
NUMERO
VELANDIA ROJAS
APELLIDOS
ANTONIO
NOMBRES
FIRMA

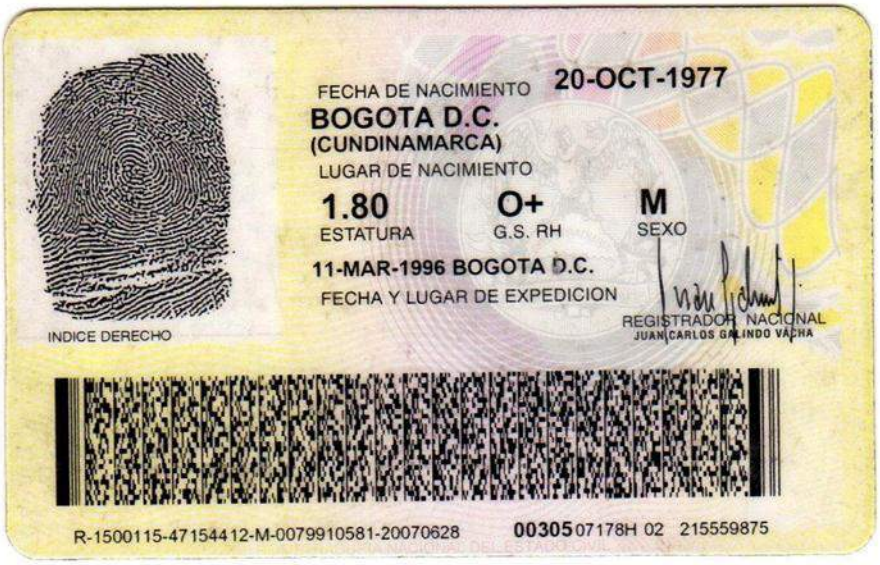
FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-MAR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
R-1500115-47154412-M-0079910581-20070628
00305 07178H 02 215559875

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900359581	4	VELDANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VELDANA	CRA 4 N 19 18 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7543965	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1921114048	9446329874	E	2023/02/17	2023/02/16	BANCOLOMBIA	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$185,600						$46,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$46,400						$46,400						$80,800				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$80,800				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$80,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COLSUBSIDIO	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$46,400						$46,400						$80,800				$0		$0		$0		$0	

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-073

Bogotá, D.C, marzo 06 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ENTREGABLES PENDIENTES

Respetados señores:

Queremos recordarles los pendientes de entrega que tienen respecto al contrato que están ejecutando, solicitando así que se pongan al día con la documentación a más tardar el 8 de marzo de 2023.

- Propuestas de diseño de distribución de ventanearías en los frentes de obra que aplique.
- Concepto de emergencia, del Colegio Restrepo Millán sede C "El Pesebre". Se aclarar que el estructural recomendó un muro del cual no se tiene respuesta o concepto.
- Inicio de actividades en todos los frentes (8 frentes) y permanencia del personal en los frentes de obra realizando las actividades que se pueden adelantar, por liberación de espacios y demás
- Cronograma para medición de obra y elaboración de memorias de cálculo.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-074

Bogotá, D.C, marzo 07 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_MGP_072 DEFINICIÓN DE PISO A INSTALAR

Respetados señores:


En respuesta al comunicado mencionado en el asunto, queremos informarles que después de haber llevado a cabo el comité técnico el día 3 de marzo, en colaboración con el Arq. Alejandro Herrera de la secretaria de educación, se definió el tipo de piso **Mini de LG Hausys** que se utilizará, esto con base en el esquema proporcionado por el arquitecto Alejandro H, que incluye los colores de pintura alternativa a instalar y diseño.

Asimismo, solicitamos que se incluya en el presupuesto la instalación de piso vinílico en todas las aulas, pasillos y áreas de baño, como también incluir en el alcance la adecuación de las baterías sanitarias existentes en la sede, y que se descarte la demolición de las celosías en los muros del edificio 1 y los nichos de libros en el edificio 2.

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de su respuesta. Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo. Bitácora comité

3-Marzo-2023

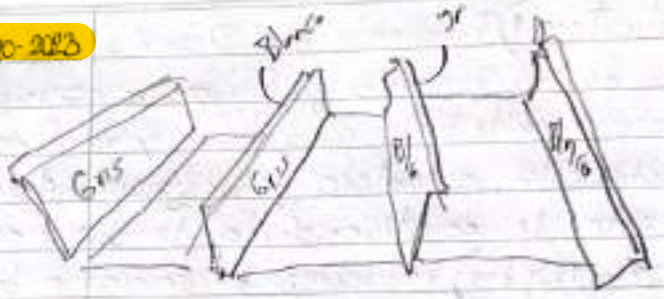

8	Azul	7-01
12	Beige	6-01
17	celeste	11-01
30	Beige	6-01
	Azul	7-01



CLIMA: Soleado

RECURSO HUMANO: Inspector obra, 3 Ayudantes obra, Maestro General

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta menor, Rodo Martillo

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con demolición de placa existente en aula 38 edificio 2. Se inicia retiro de escombros a botadero

OBSERVACIONES: Se realiza comité técnico de obra con presencia de interventoría, Supervisión de edificación Arq Alejandro Herrera quien define el diseño, colores y tipo de piso a instalar, así como se observa en los esquemas; se definen colores de pintura a instalar. Así mismo, Ste, Arq. Alejandro Herrera solicita incluir en presupuesto la instalación de piso vinílico en todas las aulas, pasillos, áreas de baño. así como incluir en el alcance la adecuación de baterías sanitarias existentes en la sede y descartar

la demolición de celosías en muros edificio 1 y nichos de libros en edificio 2. para instalar cortinas, ergo. no se instalarán las cortinas en pasillos.

AEG
Residente Interventoría
Consorcio TIG

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-075

Bogotá, D.C, marzo 08 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Erlin Barrios Ramos	1001897552	ayudante	Liceo Femenino
2	Miyer Alexander Gutierrez	1073713553	ayudante	Reino de Holanda

CONSORCIO TIG

3	Brayan Eduardo Rodriguez	1013679448	ayudante	Diana Turbay
4	Maycol Estiven Sandoval	1001283172	ayudante	Liceo Femenino

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.013.679.448
RODRIGUEZ MORALES
APELLIDOS
BRAYAN EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1997
SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-FEB-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009904630	0|6|0|3|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ A. Individual ☐ B. Institucional ☐ -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
RODRIGUEZ (Primer apellido)	MORALES (Segundo apellido)	BRAYAN (Primer nombre)	EDUARDO (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1013679448	Femenino ☐ Masculino ☒	1|9|0|1|1|9|9|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo [illegible] Condicion [illegible]		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1100000

18.Residencia			
CR 9 SUR N 18 A 36 **Dirección**	**Telefono fijo**	3112716791 **Telefono celular**	BRAYANCFY@GMAIL.COM **Correo electronico**
BOGOTA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	BOGOTA **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del conyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01			
02			
03			
04			
05			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
01				
02				
03				
04				
05				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
		Tipo			Condición	
		F	N	M	T	P
01						
02						
03						
04						
05						

32. Datos de residencia					
Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01					
02					
03					
04					
05					

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS OLAYA - ODONTOLASER OLAYA	VSOLAYA - DENTOOLAYA
0	-	-
0	-	-
0	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 36 Dirección	3143614315 Telefono	LMCASTANOC@GMAIL.COM Correo electronico	MANIZALES Municipio/Distrito	CALDAS Departamento

No de Radicacion
4009904630

II. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo (Femenino [ ] Masculino [ ])	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]				07/03/2020

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código: [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. [ ] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.

48. [ ] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49. [ ] Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50. [x] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51. [x] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran

52. [x] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

53. [ ] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Brayan Eduardo Rodriguez Morales	Marcelo Serna Osorio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. [ ] RC. [ ] TI. [ ] CC. [ ] PA. [ ] CE. [ ] CD. [ ] SC. [ ]
  Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [0]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor .
- [ ] 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud .
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		

70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ]		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de los demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

BRAYAN EDUARDO RODRIGUEZ MORALES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.013.679.448**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 6 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1013679448
Nombre:	BRAYAN EDUARDO RODRIGUEZ MORALES
Fecha Ingreso:	07/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	06/03/2023 08:03:49 a.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.073.713.553

GUTIERREZ SUAREZ
APELLIDOS

MIYER ALEXANDER
NOMBRES

Miyer Gutierrez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-DIC-1997

PASCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

16-ENE-2016 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-1524700-00940686-M 1073713553 20170627 0057440375A 1 9910149812

Scanned by TapScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009906500	0|6|0|3|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GUTIERREZ (Primer apellido)	SUAREZ (Segundo apellido)	MIYER (Primer nombre)	ALEXANDER (Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1073713553	Femenino ☐ Masculino ☒	10|1|2|1|9|9|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N H1 Condicion T F		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1160000

18.Residencia			
CR 21 D 48 Dirección	Telefono fijo	3114579166 Telefono celular	ALEXGUTIERREZ@GMAIL.COM Correo electronico
BOGOTA Municipio/Distrito	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo** Femenino ☐ Masculino ☐	**23. Fecha de nacimiento**

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo			Condición	
			F	N	M	T	F
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS OLAYA - DENTOLASER RESTREPO	VSOLAYA - DENTORESTR
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de Identificación	37. Numero de documento de identificacion	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901483165	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 Dirección	3214315481 Telefono	LMCASTANOC@GMAIL.COM Correo electronico	MANIZALES Municipio/distrito	CALDAS Departamento

No de Radicacion
4009906500

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		07/03/2020

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no información del cotizante,cabeza de familia,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Miguel Alexander Gutierrez S.	Marcela Serna Osorio

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☒ FA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ 2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 2
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la cual consta la calidad de beneficiario o se ordena la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido	Segundo apellido (o de casada)	Primer nombre	Segundo nombre
GUTIERREZ	**SUAREZ**	**MIYER**	**ALEXANDER**

No de identificación	Tipo de documento	Fecha de nacimiento	Sexo	Fecha diligenciamiento
1073713553	**X**	**1997 12 12**	**X**	**2023 03 08**

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? **X**
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? **X**
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? **X**
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? **X**
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? **X**

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.

"Yo: MIYER ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ identificado con el documento de identidad número: 1073713553 **X** autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante: Miyer alexander Gutierrez S.

www.saludtotal.com.co
Línea local en Bogotá 4854555
Línea gratuita de atención al cliente 018000114524
Síguenos en Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no es a medias debe ser total SaludTotal EPS

Huella digital
(en caso de no saber firmar)
F308-RVA V1.0-2013

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

MIYER ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.073.713.553**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 6 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1073713553
Nombre:	MIYER ALEXANDER GUTIERREZ SUAREZ
Fecha Ingreso:	07/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	6/3/2023 9:52:08 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.001.897.552
BARRIOS RAMOS

ERLIN

Erlin Barrios Ramos





FECHA DE NACIMIENTO 28-FEB-1997
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-OCT-2015 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500100-01262531-M-1001897552-20211103 0076005932A 1 9916503965

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1001897552
Nombre:	ERLIN BARRIOS RAMOS
Fecha Ingreso:	07/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	6/3/2023 9:56:25 AM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009906575	06/03/2023

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectivo ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
BARRIOS (Primer apellido)	RAMOS (Segundo apellido)	ERLIN (Primer nombre)	(Segundo nombre)
7.Tipo documento de identidad	**8.Número del documento de identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1001897552	Femenino ☐ Masculino ☒	28/02/1998

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo [ ]	Condicion [ ]		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia			
CR 162 B 134 23 (Dirección)	(Telefono fijo)	3223355812 (Telefono celular)	ERLINBARRIOS@HOTMAIL.COM (Correo electronico)
BOGOTA (Municipio/Distrito)	zona: Urbana ☒ Rural ☐	(Localidad / comuna)	BOGOTA (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del conyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condicion	
			P	N	M	T	P
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS SUBA - VS SUBA	VSSUBA - VSSUBA
S	-	-
S	-	-
S	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de Identificación	37. Numero de documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402105	01

39.Ubicación				
CR 23 B 57 56 (Dirección)	3214321435 (Telefono)	LMCASTANOC@GMAIL.COM (Correo electrónico)	MANIZALES (Municipio/distrito)	CALDAS (Departamento)

No de Radicacion
4009906575

9. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código: [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del tránsito de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo (Femenino [ ] Masculino [ ])	Fecha de nacimiento	42. Fecha (D/D/M/M/A/A/A/A)
[ ]				

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. [ ] Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. [ ] Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.

48. [ ] Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49. [ ] Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50. [x] Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51. [x] Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran

52. [x] Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

53. [ ] Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Edin Barrios Ramos	Marcela Serna Cooperativa

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. [ ] RC. [ ] TI. [ ] CC. [ ] PA. [ ] CE. [ ] CD. [ ] SC. [ ]
  Cantidad: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Total: [0]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declara la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración asistida por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ERLIN BARRIOS RAMOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.001.897.552**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 6 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.001.283.172
SANDOVAL RIVERA
APELLIDOS
MAYCOL ESTIVEN
NOMBRES
Maycol
FIRMA


14-JUL-2003
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
1.70
O+
M
13-AGO-2021 BOGOTA D.C.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MAYCOL ESTIVEN SANDOVAL RIVERA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.001.283.172**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 3 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud	**6l_783140**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 901402105 CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS
Afiliado	CC 1001283172 MAYCOL ESTIVEN SANDOVAL RIVERA
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,160,000
Cargo	OTRO
Sucursal	MANIZALES CR 23 B 67-56
Fecha de ingreso	06/03/2023
Fecha de radicación	07/03/2023 03:28:35 p.m.
Código de Transacción	154624474
Resultado del Reingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 04/2023

Fecha de generación 07/03/2023

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1001283172
Nombre:	MAYCOL ESTIVEN SANDOVAL RIVERA
Fecha Ingreso:	06/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	3/3/2023 12:20:40 PM

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-076

Bogotá, D.C, marzo 08 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA INFORME ESTRUCTURAL COLEGIO DISTRITAL DIANA TURBAY SEDE B CONTESTACIÓN OFICIO 2023_RUU_MGP_048

Respetados señores:

se presenta la revisión al concepto estructural correspondiente a la junta sísmica existente del colegio Distrital Diana Turbay sede B elaborado por el Ingeniero Alejandro Morales Farfán M.P 17202-289046

1. Documento recibido
Concepto técnico estructural Colegio Distrital Diana Turbay sede B, sobre posibles implicaciones generadas por las obras de mejoramiento contratadas sobre cambio de pisos, cambio de cubiertas y cambio de Ventanería.

2. Descripción general del documento recibido
En el documento relacionado se enumeran las obras de mejoramiento contratadas para las instalaciones del Colegio y se realiza una evaluación de las mismas para la posible afectación de una fisura presente en la edificación.

3. Observaciones y conclusiones

• El ingeniero Castaño establece en su concepto que las obras mencionadas y actualmente adelantadas en la edificación no son las causantes de la fisura existente y que esta fisura obedece a comportamientos normales y esperados por

la dilatación estructural existente en la edificación, con lo cual esta revisión se encuentra de acuerdo.

• En el concepto del Ing. Morales farfán resalta que la fisura se presenta en los elementos de acabado que no fueron dilatados en los puntos de unión de las dos edificaciones con sistema estructural de vigas y columnas construidos en etapas diferentes por lo que al tener movimientos independientes afectan a estos produciendo la fisura mencionada en su concepto, con lo que esta revisión se encuentra de acuerdo.

• Se considera apropiada y acertada la conclusión final presentada por el ingeniero Castaño donde establece que las intervenciones realizadas y relacionadas no afectan el comportamiento global de la estructura de la edificación ni compromete la seguridad de sus ocupantes.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Revisó y elaboró: Ing. Carlos Mayorga Vela Esp. estructural Mat. 25202-131425 CND
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-077

Bogotá, D.C, marzo 08 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL CERCHAS DE CUBIERTA COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A - CONTESTACION OFICIO 2023_RUU_MGP_050

Respetados señores:

Se presenta la revisión correspondiente al concepto técnico estructural sobre las cerchas de cubierta de aulas del Colegio San Agustín sede A, elaborado por el ingeniero Geovanny Alexander Castaño Castaño.

1. **Documento recibido**

Concepto técnico sobre cerchas de cubierta Colegio San Agustín Sede A, sobre cubierta de aulas.

2. **Descripción general del documento recibido**

En el documento relacionado se realiza reconocimiento de la estructura del colegio y revisión de elementos estructurales de cubierta de aulas resaltando deficiencias de estos elementos y proponiendo alternativas de solución a las posibles falencias encontradas.

3. **Observaciones cubiertas de aulas**

• Para la propuesta de cambio de tejas de asbesto cemento por otra que no represente posible afectación a la salud no hay observación específica.

• Se considera apropiada la evaluación de cargas presentada para la revisión de capacidad de las correas de cubierta.

• En la evaluación de las correas de cubierta no incluye cargas debidas al sismo, lo cual se considera apropiado, no solo porque las correas no constituyen elementos de resistencia sísmica, sino además porque es un elemento simplemente apoyado.

• En las consideraciones tenidas en cuenta en la evaluación del Ing. Castaño se resalta la separación entre correas correspondiente a 2m, lo cual se considera más alta de lo recomendado para el apoyo de las tejas de cubierta.

• La instalación del perfil intermedio entre correas se considera apropiado, ya que permite cumplir con las exigencias de separación entre apoyos de las diferentes fichas técnicas de las tejas y disminuye las exigencias directas aplicadas en las cerchas tipo celosía.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

Revisó y elaboró: Ing. Carlos Mayorga Vela Esp. estructural Mat. 25202-131425 CND
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-078

Bogotá, D.C, marzo 08 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO SAN AGUSTIN SEDE A

Respetados señores:

Adjunto al presente comunicado se anexa la planimetría de la propuesta de diseño arquitectónico para la intervención de los baños del colegio San Agustín sede A presentada por el contratista CONSORCIO MIA GP. Esto con el propósito de solicitar la aprobación por parte de la entidad.

Esta propuesta contempla los hallazgos por parte el Consorcio Mia GP en sitio como se expresa a continuación:

- Necesidad de implementar cielo raso en baños piso 3.
- Cambio de la especificación de piso contemplada inicialmente (baldosa de granito), por una especificación de menor espesor por la determinante de acabado de piso del pasillo
- La especificación de enchape de pared está por definir, ya que en el mercado actualmente no se encuentra con disponibilidad inmediata de material en gran cantidad y puede llegarse a demorar hasta un periodo mayor a 4 meses.

- La tubería que alimenta las baterías sanitarias actuales es de 1" y deriva a cada sanitario de tanque en 1/2", para realizar el cambio a sanitario de fluxómetro se debe realizar un cambio de la red principal, lo cual no fue contemplado de esta manera, por tal motivo se recomienda utilizar sanitarios de tanque ahorradores.


Agradecemos su atención.

cordialmente,




Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG


CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado: 2023_RUU_MGP_065

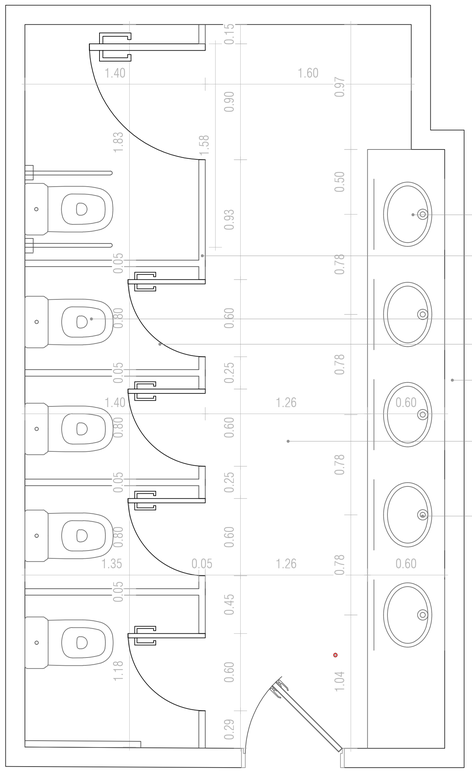


1 Baño mujeres
1 :20

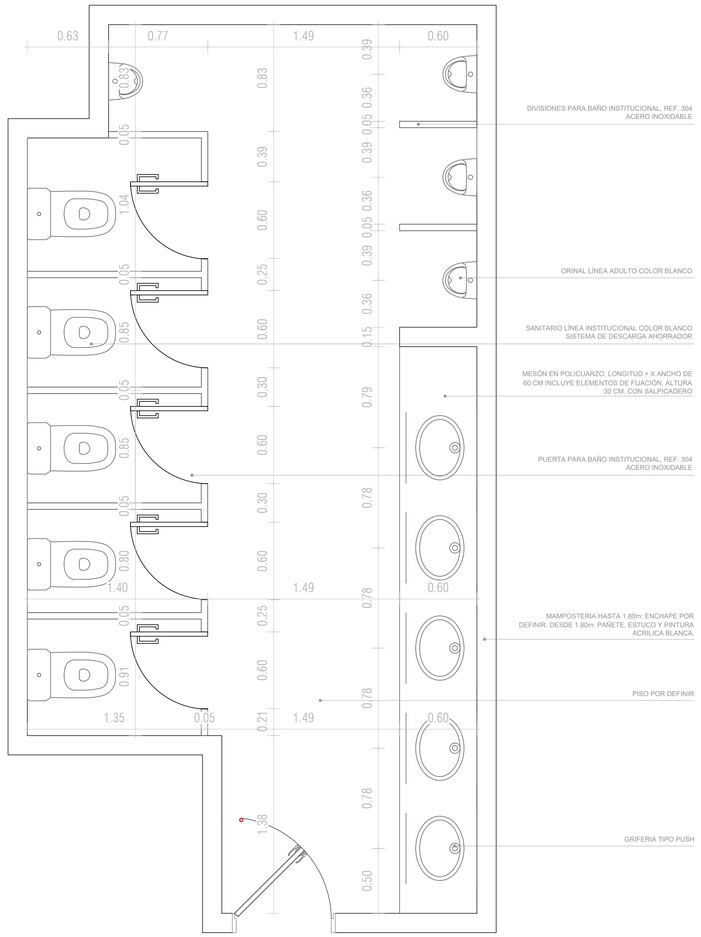


2 Baño hombres
1 : 20

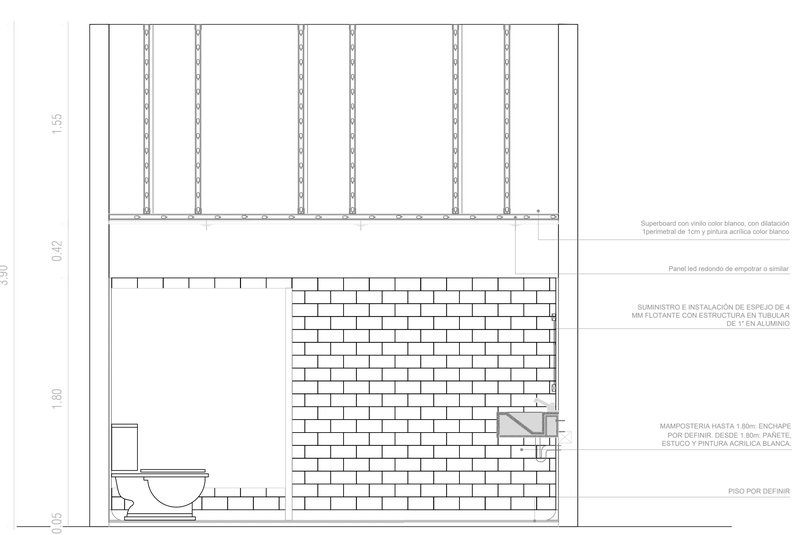

3 Corte
1 : 20

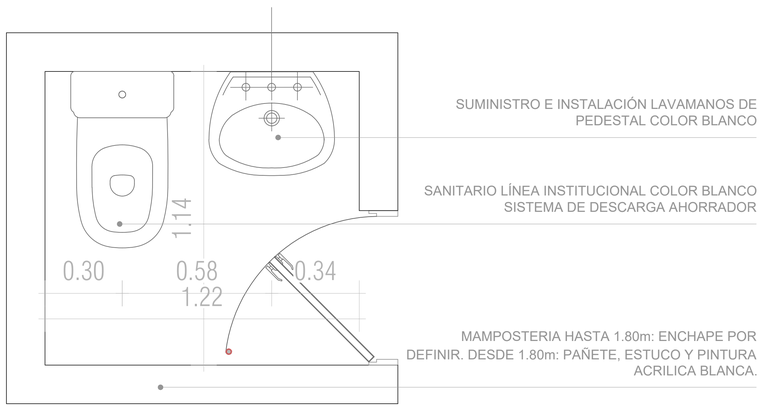

4 Baño profesores
1 : 10

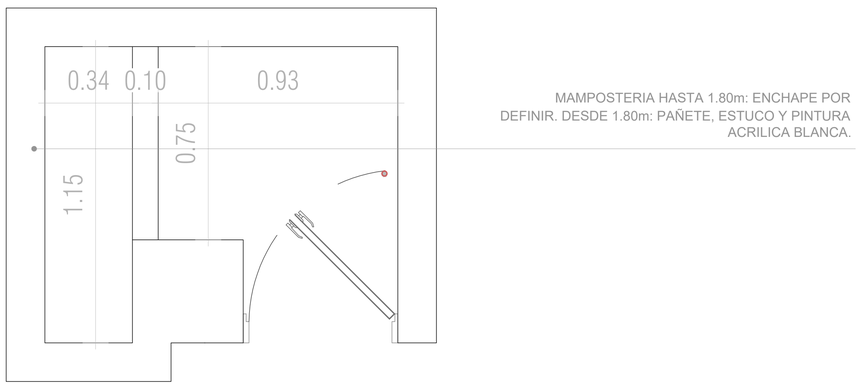

5 Cuarto aseo
1 : 10

BA01

PLANO No.

PROYECTO
SAN AGUSTIN SEDE A

Diseño propuesta baños

FECHA ULTIMA REVISION:
28/02/23

REVISIÓN: 1

PLANO No.

BA01

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-079

Bogotá, D.C, marzo 08 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SEGUNDA OBSERVACIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 1

Respetados señores:

se presenta observación de la segunda revisión del informe ambiental:

1) En el numeral 8.1.7. Programa de control de emisiones atmosféricas y ruido, incluir los documentos vigentes del vehículo AAI171 pin 4585, ya que se presentó documentación vencida (Licencia de conducción y Revisión tecnicomecanica).

Sin otro particular agradecemos dar cumplimiento a lo solicitado en un periodo no mayor al día 10 de marzo de 2023.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y elaboró: Ing. Dalia Minerva Briceño Rodríguez CONSORCIO TIG
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-080

Bogotá, D.C, marzo 09 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME MENSUAL SST No. 1

Respetados señores:

Por medio del presente oficio se da aprobación del informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) No. 1. Del contrato No. CO1-PCCNTR 4077645 garantizando el cumplimiento del Componente SST contenido en las Obligaciones administrativas de los documentos previos del contrato de obra dentro del periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero del 2023

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Aprobó: Ing. Katherine Guañarita CONSORCIO TIG
CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-081

Bogotá, D.C, marzo 10 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO 2023_RUU_PMG_074 EMERGENCIA DEL COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE C “EL PESEBRE”

Respetados señores:

Se extrae del contrato CO1.PCCNTR.4077645, específicamente de las condiciones pactadas en los estudios previos y los anexos técnicos del proceso de selección, el procedimiento para la atención de emergencias, en el cual se solicita:

1) La atención oportuna con carácter correctivo (aislamiento de la zona afectada)
2) Habilitar los espacios afectados
3) Atención en dos etapas
   i. Mitigación del riesgo inmediato
   ii. Ejecución de obras de mantenimiento correctivo, previa presentación de presupuestos, programación y plan de trabajo.

Con base en lo descrito la interventoría manifiesta que la emergencia no se ha atendido de forma adecuada por las siguientes evidencias:

1. La zona no se apuntaló, señaló de forma adecuada o aisló por parte del contratista de obra.
2. El contenido del comunicado 074 no corresponde a un "concepto" es una descripción de procedimiento con la propuesta de dos (2) alternativas.

3. Las propuestas entre otras cosas no promueven una solución, sino que remiten a la toma de decisiones sin soporte de cuál es la alternativa más conveniente o necesaria.
4. No hay planos de levantamiento, presupuestos de las alternativas, programación de las actividades de obra, ni plan de trabajo.
5. La emergencia se reportó el 10 de febrero del 2023 y a la fecha 9 de marzo del 2023 no ha sido atendida.

Para el consorcio TIG es alarmante dicha situación y solicita al contratista la presentación de:

1. Planos de levantamiento
2. Presupuestos de ejecución de cada alternativa
3. Programación de las actividades de obra
4. Registro fotográfico visita inicial versus estado actual de la zona afectada por la emergencia
5. Plan de trabajo y personal a cargo

Lo anterior a ser recibió por esta Interventoría en un plazo no mayor a tres (3) días calendario, es decir el día lunes 13 marzo de los corrientes.

Sin otro particular y en espera de lo solicitado, atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Ing. Pamela Beltrán
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-082

Bogotá, D.C, marzo 08 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA No.1

Respetados señores:

Debido a la premura por parte de la Secretaría de Educación y a la falta de eficacia del contratista para cumplir con los plazos establecidos en el Cronograma de Radicación de Actas Parciales 2023 y atender de manera oportuna las observaciones, remitimos y adjuntamos el Acta Parcial de Obra No. 1. Esta incluye algunas observaciones pendientes, tales como la falta del soporte de la escombrera o la disposición final de la teja en asbesto para el ítem 20.1.2 y la tabla de pesos correspondiente al ítem de estructura metálica.

Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de obra a interventoría
2. Oficio de solicitud de aprobación de interventoría a la SED
3. Acta parcial en Excel y PDF
4. Memorias de Calculo
5. Aportes parafiscales
6. FURC - hoja información de pagos
7. RUT CONSORCIO
8. Pre Factura No. MGP-01
9. Resolución de facturación DIAN

CONSORCIO TIG

10. Certificación Bancaria
11. Acta de autorización de pagos
12. Actualización de terceros (primera cuenta)

Esta documentación esta con sus respectivos soportes debidamente revisados, avalados y aprobados por esta Interventoría y por ello recomienda al Secretaria de educación tramitar el pago No. 1 correspondiente al periodo 20 DE ENERO DE 2023 HASTA 19 DE FEBRERO DE 2023.

Atentamente,

Pamela Beltrán

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Ing. Pamela Beltrán
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-083

Bogotá, D.C, marzo 09 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Neiron Polo De la de la Hoz	1001800488	ayudante	Restrepo Millán
2	Jose Alfredo Corena	1033811872	ayudante	Restrepo Millán

CONSORCIO TIG

3	William Mauricio Castro	1003805819	ayudante	Restrepo Millán

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 22/11/2022

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	101	23/11/2022	CC 1001800488	POLO DELAHOZ NEIRON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

09D082B339F4C9A95D7B0F908ED89854 Certificado impreso el día 11/22/2022 4:50:04 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

NEIRON ALBERTO
POLO DELAHOZ
1001800488
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Bogotá DC. 21 de noviembre de 2,022

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 21 de noviembre de 2022, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 1001800488
Nombres y Apellidos	NEIRON ALBERTO POLO DE LA HOZ
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	21/11/2022
Fecha de Ingreso a Compensar	21/11/2022
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1000000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

No. De Radicación	Fecha de Radicación
157910-21-11-2022	21 11 2022

I. DATOS DEL TRAMITE (Lea las instrucciones que se encuentran antes del formulario o en el de diligenciarlo)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliado: A. Individual [X] - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Estado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. Oficiales [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotización: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS)

II. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
POLO	DE LA HOZ	NEIRON	ALBERTO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento
CC	1001800488		29 05 2000

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo (F N M)	Condición (T P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización - IBC

18. Residencia

Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico

Municipio/Distrito	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres

	Primer apellido	Segundo apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo I	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de cotizante o pagador pensionado (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CALLE 3A 7B 140	5801473	obras.joyavi@gmail.com	LOS PATIOS	NDS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculaciones de una entidad autorizada afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del Trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
POLO	DE LA HOZ	NEIRON	ALBERTO

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[X]	1001800488	Femenino [ ] Masculino [X]	29 05 2000	D D M M A A A A

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
NEIRON ALBERTO POLO DE LA HOZ	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VASQUEZ

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [X] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ]
  Cantidad [ ] Total [1]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitida por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El Señor NEIRON ALBERTO POLO DE LA HOZ identificado con C.C No. 1.001.800.488, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 22 de noviembre del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.



Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

IPS EN SALUD

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 8517

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 04/01/2023 HORA:10:53	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: WILLIAM MAURICIO CASTRO VASQUEZ	DOCUMENTO: 1003805819	EDAD: 21 GENERO: M
Empresa: UNION TEMPORAL MO 2021	Cargo: AUXILIAR	Tel: 3026606406 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

***FINALIDAD DEL EXAMEN:* Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto**

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatologia	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Triglicéridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio fisico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mi en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión. Fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer ese por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lee este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

LICENCIA No. 250425 Medico Especialista en Salud Ocupacional	Firma Trabajador C.C. No 1003805819	6898

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.003.805.819

CASTRO VASQUEZ

APELLIDOS

WILLIAM MAURICIO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-2001

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-NOV-2019 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.033.811.872

CORENA JIMENEZ

APELLIDOS

JOSE ALFREDO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-NOV-1998**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

30-NOV-2016 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00084205-M-1033811872-20170218 0053755486A 2 46980578

MEDICINA LABORAL EL TREBOL IPS

CENTRO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
NIT. 901045839-4
Según resolución 2346 de 2007 y 4272 de 2021
Av. Cra 68 No 45-21 Zona Industrial
Linea telefónica 321-480-51-18 de 2pm a 4 pm
medilabeltrebol@gmail.com
confirma autenticidad en medicinalaboraleltrebolips.com
resoluciones en la página web CLAVE resoluciones 2022

CONCEPTO OCUPACIONAL			
POST INCAPACIDAD		INGRESO	X
ENFASIS CARDIOVASCULAR		EGRESO	
ESPACIOS CONFINADOS		PERIODICO	
PRE-OCUPACIONAL		REINTEGRO	
ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR		ALTURAS	X



DATOS DEL PACIENTE			
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2022			
NOMBRE: JOSE ALFREDO CORENA JIMENEZ		EDAD: 23 AÑOS	RH: B+
IDENTIFICADION: 1033811872	EPS: CAPITAL SALUD	ARL:	
EMPRESA: OBRAS JOYAVI	NIT:	CARGO: SOLDADOR	

ANTECEDENTES LABORALES: **ENFERMEDAD PROFESIONAL:**

ANTECEDENTES PERSONALES	ANTECEDENTES FAMILIARES
HOSPITALARIOS: NIEGA	DIABETES: NIEGA
QUIRURGICOS: NIEGA	HTA: NIEGA
PSIQUIATRICOS: NIEGA	HIPO-HIPER TIROIDISMO: NIEGA
FARMACOLOGICOS: NIEGA	CANCER: NIEGA
OFTALMOLOGICOS: NIEGA	ASMA: NIEGA
OTROS: NIEGA	OTROS:NIEGA

PARACLINICOS	EXAMEN FISICO
AUDIOMETRIA: NORMAL	T/A: 118/75 mmHg
OSTEOMUSCULAR: TONO MUSCULAR Y EQUILIBRIO: CONSERVADOS	FC: 73 min
VISIOMETRIA: NORMAL	FR: 21 min
PRUEBAS NEUROLOGICAS CLINICAS: SIN ALTERACIONES NEUROLOGICAS	PESO: 72 KG
DERMATOLOGIA: SIN LESIONES	ESTATURA: 1.67 Mts
PERFIL LIPIDICO-GLICEMIA: NORMAL	T°: 35.5°C
	OXIMETRIA: 95%

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL					
APTO PARA EL CARGO	SI		APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	
RESTRINGIDO		NO	REQUIERE RESTRICCIONES EN ACTIVIDADES		NO
CONDICIONAL		NO	SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO
APLAZADO		NO	APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	SI	

OBSERVACIONES: NINGUNA

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL:

utilizar los elementos de protección personal, usar protección visual durante la jornada laboral, seguir las recomendaciones estrictas de medicina ocupacional, hacer periódicamente los exámenes de valoración ocupacional. El paciente no manifiesta signos ni síntomas relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo (sars-cov2) / no presenta morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID 19 según circular 030 del 2020.

ALEXANDER NARVAEZ PAEZ
MD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA DEL TRABAJADOR EXAMINADO
CC. 1033811872



Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 5 pm - sábados de 7 am a 3 pm - Domingos y Festivos de 8am a 11am.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-10, 04:16:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61382667

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	71
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 457922	MACIAS RUBIO EDGAR	01	00		X														0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	SALUD TOTAL EPS	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 11257890	DIAZ CHINGATE JUAN LEONARDO	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 77.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 275.300
CC 11524197	ZAMUDIO CHACON LUIS OMAR	01	00		X														0	20	20	20	20	COLFONDOS	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 51924822	OSPINA AGUDELO ADRIANA MARIA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 73290321	BARRIOS CARMONA ORLANDO RAFAEL	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00	X															0	16	16	16	16	COLPENSIONES	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669374	CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79670475	BUITRAGO PINZON RAMIRO ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00	X															0	8	8	8	8	PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00	X															0	13	13	13	13	PORVENIR	$ 502.667	$ 80.500	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 502.667	$ 20.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.900
CC 79704668	VIVAS VEGA CARLOS ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79715893	RODRIGUEZ MUÑOZ LEONARDO MAURICIO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	COMPENSAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 79725999	CASTAÑEDA REYES RICARDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00	X															0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00	X															0	11	11	11	11	PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00	X															0	6	6	6	6	COLPENSIONES	$ 232.000	$ 37.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 91257327	CASTELLANOS PINZON MODESTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 93413312	CAICEDO ARDILA WILLIAM	01	00	X	X														0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	EPS SANITAS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1000987459	MACIAS RAMIREZ JAIDER STIVEN	01	00		X														0	7	7	7	7	PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	COMPENSAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00	X															0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001799128	BARANDICA CANTILLO JULIO JOSE	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

Pagado: 10/02/2023 **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** **Planilla Nro: 61382667** **Periodo Cotización: enero de 2023** **Periodo Servicio: febrero de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001800488	POLO DE LA HOZ NEIRON ALBERTO	01	00		X														0	21	21	21	21	PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 812.000	$ 32.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 812.000	$ 56.600	COMPENSAR CCF	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM MAURICIO	01	00	X															0	26	26	26	26	COLFONDOS	$ 1.005.334	$ 160.900	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1004365555	RONIN ALFONSO PRATTO MONTENEGRO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006865545	SABOGAL CRUZ BRAYAN FERNANDO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00	X															0	12	12	12	12	PORVENIR	$ 464.000	$ 74.300	SALUD TOTAL EPS	$ 464.000	$ 18.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 464.000	$ 32.300	COMPENSAR CCF	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 1022990242	COLO RODRIGUEZ ANDERSON CAMILO	01	00	X	X														0	5	5	5	5	PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 193.334	$ 13.500	COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023945915	LOPEZ GARCIA JALLY LORENA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024464486	PINZON DIAZ SANDRA MILENA	01	00	X	X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	COMPENSAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	COMPENSAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00	X															0	16	16	16	16	COLFONDOS	$ 618.667	$ 99.000	SALUD TOTAL EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1033745073	MONTENEGRO BALI ESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00	X															0	15	15	15	15	PROTECCION	$ 580.000	$ 92.800	SALUD TOTAL EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1033759847	FLOREZ INFANTE JONATHAN ARBEY	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045167583	SARAVIA RIVERO DARLIS ALBERTO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1053838008	ZAPATA VILLADA JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065577261	CUJIA MANJARREZ CARLOS ALFONSO	01	00	X	X														0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	FAMISANAR EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	SALUD TOTAL EPS	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00	X															0	6	6	6	6	PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 232.000	$ 16.200	COMPENSAR CCF	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1121846956	CRUZ REYES LUIS FERLEY	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	SALUD TOTAL EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00	X															0	26	26	26	26	PROTECCION	$ 1.005.334	$ 160.900	FAMISANAR EPS	$ 1.005.334	$ 40.300	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.005.334	$ 70.000	COMPENSAR CCF	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 1147693165	VIZCAINO VALENCIA JORDAN ANDRES	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00	X															0	11	11	11	11	COLFONDOS	$ 425.334	$ 68.100	COMPENSAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 425.334	$ 29.700	COMPENSAR CCF	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 6563294	FIGUEROA LOPEZ KELLYS TATIANA	01	00		X														0	14	14	14	14	COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	COMPENSAR EPS	$ 541.334	$ 21.700	POSITIVA DE SEGUROS	$ 541.334	$ 37.700	COMPENSAR CCF	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 42.030.684	$ 6.726.500	$ 0	$ 0	$ 1.736.400	$ 2.928.400	$ 1.683.800	$ 12.400	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.106.100	$ 0	$ 13.106.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-084

Bogotá, D.C, marzo 09 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN ACTA DE COBRO PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1

Respetados señores:

Por medio de la presente, y en cumplimiento a las obligaciones contractuales esta interventoría realiza la entrega del Acta de cobro Parcial No. 1 correspondiente al periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero de 2023, para su correspondiente revisión y aprobación. Dentro de este contexto se anexa los documentos soporte para el trámite del acta parcial:

1. Oficio de solicitud de aprobación de acta interventoría
2. Acta parcial en Excel y PDF
3. Aportes parafiscales
4. FURC - hoja información de pagos
5. RUT CONSORCIO
6. RIT CONSORCIO
7. Pre Factura
8. Resolución de facturación DIAN
9. Certificación Bancaria
10. Acta de autorización de pagos
11. Actualización de terceros (primera cuenta)

CONSORCIO TIG

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Ing. Pamela Beltrán
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-085

Bogotá, D.C, marzo 10 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Jorge Stiven Quiroga Gomez	1027521715	ayudante	Diana Turbay

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.027.521.715
QUIROGA GOMEZ
APELLIDOS
JORGE STIVEN
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 26-JUN-2004
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-JUL-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
0067579195A 3

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1027521715
Nombre:	JORGE STIVEN QUIROGA GOMEZ
Fecha Ingreso:	09/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	08/03/2023 10:08:21 a.m.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **QUIROGA GOMEZ JORGE STIVEN** identificado(a) con **CC** número **1.027.521.715** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de julio de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 09 de marzo de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202303091705

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4009928666	09/03/2023

I. DATOS DEL TRÁMITE (Las las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliacion ☐ B.Reporte de Novedades ☒	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
QUIROGA (Primer apellido)	GOMEZ (Segundo apellido)	JORGE (Primer nombre)	STIVEN (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1027521715	Femenino ☐ Masculino ☒	29/06/2004

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N H I — Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia			
CG 53B 3D 28 SUR — Dirección	Telefono fijo	3023316774 — Telefono celular	JORGEQUIROGA@GMAIL.COM — Correo electronico
BOGOTA — Municipio/Distrito	zona: Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	BOGOTA — Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de Identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo** Femenino ☐ Masculino ☐	**23. Fecha de nacimiento**

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo documento de Identidad	26. Número de Identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
01					
02					
03					
04					
05					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
01							
02							
03							
04							
05							

	32. Datos de residencia					
	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS OLAYA - JOD DENTOLASER OLAYA	VSOLAYA - DENTOOLAYA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	NIT	901402165	01

39.Ubicación				
CR 23 B 67 56 — Dirección	3212584512 — Telefono	LMCASTANOC@GMAIL.COM — Correo electrónico	MANIZALES — Municipio/Distrito	CALDAS — Departamento

No de Radicacion
4009928666

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		09/03/2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la Historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

Jorge Stiven Quiroga Gomez	MARCELA SENA OSORIO
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-086

Bogotá, D.C, marzo 13 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	José Ricardo Rodríguez	79057932	Ayudante	Restrepo Millán
2	Honorio Martínez Arenas	79526595	Ayudante	Restrepo Millán

CONSORCIO TIG

3	Douglas Orlando Reyes	1031160183	Ayudante	Restrepo Millán

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

Bogotá DC. 17 de febrero de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 17 de febrero de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 79526595
Nombres y Apellidos	HONORIO MARTINEZ ARENAS
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	17/02/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	17/02/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar

No. Radicación **28210905**

Fecha de Radicación								
1	7	0	2	2	0	2	3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

RADICADO

1.Tipo de Trámite
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2.Tipo de Afiliación
A.Individual [ ] Cotizante o Cabeza Familia [X] Beneficiario o Cabeza adicional [ ]
B. Colectiva [ ] C.Institucional [ ] D.De Oficio [ ]

3. Regimen
C. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5.Tipo de Cotizante
A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS) **01**

A. AFILIACIÓN

o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
MARTINEZ	**ARENAS**	**HONORIO**	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8. Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	**79526595**	Femenino [ ] Masculino [X]	**1 1 0 5 1 9 7 0**

III.DATOS COMPLEMENTARIOS
Datos personales

11.Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
0 6	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]		**0 0**

15. Administradora de Riegos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de Cotización - IBC
POSITIVA S.A.	**003 / PORVENIR**	**1.160.000**

18. Residencia			
CALLE 78 N 24 21	**3133138066**	**3112660449**	**honoriomartinez70@hotmail.com**
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono Celular	Correo electrónico

Municipio/Distrito	Zona	Localidad/Comuna	Departamento
54001 / CUCUTA	Urbana [X] Rural [ ]		**54 / NORTE DE SANTANDER**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. fecha de Nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Numero del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentescos	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Telefonofijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de los Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
C	SINERGIA U.P.R.E.C CUCUTA PPR	SINERGIA UNIDAD BASICA CENTRO P P R	30600433	30600437
B				
B				
B				

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO.

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	**CC**	**13240346**	**0 1**

39. Ubicación				
CLL 3 # 7B-140 URBANIZACION ALTAMIRA	**5801473**	**obras.joyavi@gmail.com**	**LOS PATIOS**	**NORTE DE SANTANDER**
Dirección	Teléfono	Correo electronico	Municipio/Distrito	Departamento

Famisanar

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y correcciónde datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de un entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo régimen [ ] B. Diferente régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	1 7 0 2 2 0 2 3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Regimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de los Servicios de Salud
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad:

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	Total
Cantidad:	0	0	0	1	0	0	0	0	1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la teminación de la unión marital
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Codigo del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70.Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones: _____

Marque con una (X) en la casilla de respuesta correspondiente a las siguientes preguntas:	SI	NO
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	( )	( )
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente?	( )	( )
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	( )	( )
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	( )	( )

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.170.043-7

CERTIFICA QUE:

HONORIO MARTINEZ ARENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.526.595**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE CESANTÍAS PORVENIR**.

La presente certificación se expide el 17 de Febrero del 2023.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 17/02/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	210	18/02/2023	CC 79526595	MARTINEZ ARENAS HONORIO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

32DF46FB0A3113B14892AD7E14F56C88 Certificado impreso el día 2/17/2023 11:28:09 AM por el portal de empresas Edesk

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 06:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62015197

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	68
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO	01	00	X															0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 10893066	TORRES CARLOS ANTONIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00		X														0	13	13	13	13	COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 62.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 223.800
CC 12132930	PEÑA PRIETO EFRAIN	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 12400786	MORENO TOLOZA ROIMAN	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	FAMISANAR EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 17610941	RODRIGUEZ CUPITRA JOSE IVAN	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 19336646	LAVERDE JOSE ANTONIO	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00		X														0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 84095652	CARRANZA DE LA CRUZ JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000335016	TOQUICA MOYANO BRANDON ESTIVEN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1000596619	HENAO MORA WILLIAM CAMILO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000689054	DEVIA CARDENAS BRYAN STEVEN	01	00		X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1000936764	PAEZ MONTOYA CARLOS EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	NUEVA EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1001047146	SERRANO ARIAS ALIX NAYELI	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS FAMILIAR DE	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 10/03/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 62015197** | **Periodo Cotización: febrero de 2023** | **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	MAURICIO																										COLOMBIA													
CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN ALFONSO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS CAJACOPI	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00		X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	COMPENSAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022958502	GALINDO LOZANO ANDERSON MAURICIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032433118	MARTINEZ PARRA YULDER JAVIER	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1033745073	MONTENEGRO BALLESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00		X														0	18	18	18	18	PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1058843089	LONDOÑO RUIZ LUIS FERNANDO	01	00	X															0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00	X															0	18	18	18	18	PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1221978771	MONTESDEOCA IVIS DANIEL	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 2000005803	YEPEZ SILVA YENDRYS ALBERTO	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
PT 5660234	MANRIQUE ROMERO FREDY RAFAEL	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6231154	GONZALEZ MERCADO JEAN CARLOS	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.553.345	$ 54.713.345	$ 54.713.345	$ 54.708.012	$ 8.569.900	$ 0	$ 0	$ 2.232.900	$ 3.811.800	$ 2.190.000	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.829.800	$ 0	$ 16.829.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000**.

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

HONORIO
MARTINEZ ARENAS
79526595
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
79526595

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.160.183**

ESPINOSA REYES

APELLIDOS

DOUGLAS ORLANDO

NOMBRES

Douglas Espinosa

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-JUL-1995**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-AGO-2013 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00820743-M-1031160183-20160429 • 0049578226A 1 1543898236

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 9068

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 28/01/2023 HORA:12:17	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: DOUGLAS ORLANDO ESPINOSA REYES	DOCUMENTO: 1031160183	EDAD: 27 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCION	Tel: 3153891235 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad

Douglas Espinosa



LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 1031160183**	**6898**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 06:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62015197

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	68
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO	01	00	X															0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 10893066	TORRES CARLOS ANTONIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00		X														0	13	13	13	13	COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 62.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 223.800
CC 12132930	PEÑA PRIETO EFRAIN	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 12400786	MORENO TOLOZA ROIMAN	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	FAMISANAR EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 17610941	RODRIGUEZ CUPITRA JOSE IVAN	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 19336646	LAVERDE JOSE ANTONIO	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00		X														0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 84095652	CARRANZA DE LA CRUZ JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000335016	TOQUICA MOYANO BRANDON ESTIVEN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1000596619	HENAO MORA WILLIAM CAMILO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000689054	DEVIA CARDENAS BRYAN STEVEN	01	00		X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1000936764	PAEZ MONTOYA CARLOS EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	NUEVA EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1001047146	SERRANO ARIAS ALIX NAYELI	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS FAMILIAR DE	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 10/03/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 62015197** | **Periodo Cotización: febrero de 2023** | **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	MAURICIO																										COLOMBIA													
CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN ALFONSO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS CAJACOPI	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00		X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	COMPENSAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022958502	GALINDO LOZANO ANDERSON MAURICIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032433118	MARTINEZ PARRA YULDER JAVIER	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1033745073	MONTENEGRO BALLESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00		X														0	18	18	18	18	PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1058843089	LONDOÑO RUIZ LUIS FERNANDO	01	00	X															0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00	X															0	18	18	18	18	PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1221978771	MONTESDEOCA IVIS DANIEL	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 2000005803	YEPEZ SILVA YENDRYS ALBERTO	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
PT 5660234	MANRIQUE ROMERO FREDY RAFAEL	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6231154	GONZALEZ MERCADO JEAN CARLOS	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.553.345	$ 54.713.345	$ 54.713.345	$ 54.708.012	$ 8.569.900	$ 0	$ 0	$ 2.232.900	$ 3.811.800	$ 2.190.000	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.829.800	$ 0	$ 16.829.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 06:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62015197

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	68
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO	01	00	X															0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 10893066	TORRES CARLOS ANTONIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00		X														0	13	13	13	13	COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 62.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 223.800
CC 12132930	PEÑA PRIETO EFRAIN	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 12400786	MORENO TOLOZA ROIMAN	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	FAMISANAR EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 17610941	RODRIGUEZ CUPITRA JOSE IVAN	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 19336646	LAVERDE JOSE ANTONIO	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00		X														0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 84095652	CARRANZA DE LA CRUZ JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000335016	TOQUICA MOYANO BRANDON ESTIVEN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1000596619	HENAO MORA WILLIAM CAMILO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000689054	DEVIA CARDENAS BRYAN STEVEN	01	00		X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1000936764	PAEZ MONTOYA CARLOS EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	NUEVA EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1001047146	SERRANO ARIAS ALIX NAYELI	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS FAMILIAR DE	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 10/03/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 62015197** | **Periodo Cotización: febrero de 2023** | **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	MAURICIO																										COLOMBIA													
CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN ALFONSO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS CAJACOPI	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00		X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	COMPENSAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022958502	GALINDO LOZANO ANDERSON MAURICIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032433118	MARTINEZ PARRA YULDER JAVIER	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1033745073	MONTENEGRO BALLESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00		X														0	18	18	18	18	PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1058843089	LONDOÑO RUIZ LUIS FERNANDO	01	00	X															0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00	X															0	18	18	18	18	PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1221978771	MONTESDEOCA IVIS DANIEL	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 2000005803	YEPEZ SILVA YENDRYS ALBERTO	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
PT 5660234	MANRIQUE ROMERO FREDY RAFAEL	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6231154	GONZALEZ MERCADO JEAN CARLOS	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.553.345	$ 54.713.345	$ 54.713.345	$ 54.708.012	$ 8.569.900	$ 0	$ 0	$ 2.232.900	$ 3.811.800	$ 2.190.000	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.829.800	$ 0	$ 16.829.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.057.932**

RODRIGUEZ CUBILLOS

APELLIDOS

JOSE RICARDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-NOV-1970**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-FEB-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00244259-M-0079057932-20100710 0022653467A 1 5020390548

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

Nro. 8720

FECHA : 13/01/2023 HORA:12:11	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: JOSE RICARDO RODRIGUEZ CUBILLOS	DOCUMENTO: 79057932	EDAD: 52 GENERO: M
Empresa: OBRAS JOYAVI	Cargo: MAESTRO GENERAL	Tel: 3228611701 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad







LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 79057932**	**6898**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 06:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62015197

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	68
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO	01	00	X															0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 10893066	TORRES CARLOS ANTONIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00		X														0	13	13	13	13	COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 62.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 223.800
CC 12132930	PEÑA PRIETO EFRAIN	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 12400786	MORENO TOLOZA ROIMAN	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	FAMISANAR EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 17610941	RODRIGUEZ CUPITRA JOSE IVAN	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 19336646	LAVERDE JOSE ANTONIO	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00		X														0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 84095652	CARRANZA DE LA CRUZ JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000335016	TOQUICA MOYANO BRANDON ESTIVEN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1000596619	HENAO MORA WILLIAM CAMILO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000689054	DEVIA CARDENAS BRYAN STEVEN	01	00		X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1000936764	PAEZ MONTOYA CARLOS EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	NUEVA EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1001047146	SERRANO ARIAS ALIX NAYELI	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS FAMILIAR DE	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 10/03/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 62015197** | **Periodo Cotización: febrero de 2023** | **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	MAURICIO																										COLOMBIA													
CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN ALFONSO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS CAJACOPI	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00		X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	COMPENSAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022958502	GALINDO LOZANO ANDERSON MAURICIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032433118	MARTINEZ PARRA YULDER JAVIER	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1033745073	MONTENEGRO BALLESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00		X														0	18	18	18	18	PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1058843089	LONDOÑO RUIZ LUIS FERNANDO	01	00	X															0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00	X															0	18	18	18	18	PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1221978771	MONTESDEOCA IVIS DANIEL	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 2000005803	YEPEZ SILVA YENDRYS ALBERTO	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
PT 5660234	MANRIQUE ROMERO FREDY RAFAEL	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6231154	GONZALEZ MERCADO JEAN CARLOS	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.553.345	$ 54.713.345	$ 54.713.345	$ 54.708.012	$ 8.569.900	$ 0	$ 0	$ 2.232.900	$ 3.811.800	$ 2.190.000	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.829.800	$ 0	$ 16.829.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 06:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62015197

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	68
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO	01	00	X															0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 10893066	TORRES CARLOS ANTONIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00		X														0	13	13	13	13	COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 62.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 223.800
CC 12132930	PEÑA PRIETO EFRAIN	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 12400786	MORENO TOLOZA ROIMAN	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	FAMISANAR EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 17610941	RODRIGUEZ CUPITRA JOSE IVAN	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 19336646	LAVERDE JOSE ANTONIO	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00		X														0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 84095652	CARRANZA DE LA CRUZ JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000335016	TOQUICA MOYANO BRANDON ESTIVEN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1000596619	HENAO MORA WILLIAM CAMILO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000689054	DEVIA CARDENAS BRYAN STEVEN	01	00		X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1000936764	PAEZ MONTOYA CARLOS EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	NUEVA EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1001047146	SERRANO ARIAS ALIX NAYELI	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS FAMILIAR DE	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 10/03/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 62015197** | **Periodo Cotización: febrero de 2023** | **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	MAURICIO																										COLOMBIA													
CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN ALFONSO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS CAJACOPI	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00		X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	COMPENSAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022958502	GALINDO LOZANO ANDERSON MAURICIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032433118	MARTINEZ PARRA YULDER JAVIER	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1033745073	MONTENEGRO BALLESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00		X														0	18	18	18	18	PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1058843089	LONDOÑO RUIZ LUIS FERNANDO	01	00	X															0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00	X															0	18	18	18	18	PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1221978771	MONTESDEOCA IVIS DANIEL	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 2000005803	YEPEZ SILVA YENDRYS ALBERTO	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
PT 5660234	MANRIQUE ROMERO FREDY RAFAEL	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6231154	GONZALEZ MERCADO JEAN CARLOS	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.553.345	$ 54.713.345	$ 54.713.345	$ 54.708.012	$ 8.569.900	$ 0	$ 0	$ 2.232.900	$ 3.811.800	$ 2.190.000	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.829.800	$ 0	$ 16.829.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-087

Bogotá, D.C, marzo 13 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Yesit Antonio Rojano	1124046584	Ayudante	Liceo Femenino
2	Javier Guilombo	7687771	Ayudante	Restrepo Millán

CONSORCIO TIG

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.124.046.584
ROJANO PEREZ
YESIT ANTONIO
CO


FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1993
MAICAO
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
08-MAR-2012 MAICAO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 13/03/2023, el empleador CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS identificado con NIT número 901402105 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
5533966	13/03/2023	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1124046584	YESITANTONIO ROJANO PEREZ	1160000	AYUDANTE DE OBRA	2023-03-14

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de Marzo del año 2023.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1124046584
Nombre:	YESIT ANTONIO ROJANO PEREZ
Fecha Ingreso:	14/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	13/03/2023 09:25:35 a.m.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ROJANO PEREZ YESIT ANTONIO** identificado(a) con **CC** número **1.124.046.584** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 11 de junio de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 13 de marzo de 2023.

Cordialmente,



***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202303130927


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.687.771
GUILOMBO MONTES
JAVIER
REPUBLICA DE COLOMBIA


19-NOV-1970
NEIVA
(HUILA)
1.76
O+
M
27-JUN-1989 NEIVA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 08/03/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	267	09/03/2023	CC 7687771	GUILOMBO MONTES JAVIER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8C5C06CBED4263447ADE7D530E8C1A44 Certificado impreso el día 3/8/2023 3:35:06 PM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

JAVIER
GUILOMBO MONTES
7687771
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
40090805715	0|8|0|3|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
B. Colectiva ☐
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Institucional ☐ B. De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
GUILOMBO Primer apellido	MONTES Segundo apellido	JAVIER Primer nombre	Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	7687771	Femenino ☐ Masculino ☒	1|4|0|8|1|9|8|9

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PORVENIR	1160000

18.Residencia

AVENIDA 39 N 33 21 **Dirección**	59756710 **Telefono fijo**	3054578748 **Telefono celular**	Obras.ard@hotmail.com **Correo electronico**

BOGOTA D.C **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	BOGOTA D.C. **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS UAB CENTRO - SOCIEDAD MEDICA BOGOTA CAP	VSCENTRO - BOGOTA
B		-	-
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	CC	13240346	01

39.Ubicación

CL 34 122 SUR 17D BRR ENVIGADO Dirección	5801473 Teleéfono	ALRODE73@HOTMAIL.COM Correo electrónico	ENVIGADO Municipio/distrito	ANTIOQUIA Departamento

No de Radicacion
40090805715

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.**Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		0|8|0|3|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código: ☐	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

JAVIER GUILOMBO MONTES CC 7687771	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	**55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio**

IX.ANEXOS

- ☐ **56.**Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐
  Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0
- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.**Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.**Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.**Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.**Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.**Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		
☐	☐	☐	☐	☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAVIER GUILOMBO MONTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **7.687.771**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Marzo del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Bogotá DC. 8 de marzo de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 8 de marzo de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 7687771
Nombres y Apellidos	JAVIER GUILOMBO MONTES
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	08/03/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	08/03/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-088

Bogotá, D.C, marzo 13 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO 2023_RUU_MGP_082_EMERGENCIA CAFAM SANTA LUCÍA

Respetados señores:

En respuesta al comunicado en mención, esta interventoría presenta las siguientes observaciones respecto al presupuesto, aclarando que solo se hará intervención de las áreas que no se encuentren en garantía del contrato de mantenimientos 2021 de la secretaría, adicional, :

Ítem	Observación
1.1.	De acuerdo con la reunión del día 6 de marzo con la supervisión, únicamente se contemplará el ítem cuando sea una obra nueva y no cuando mantenimiento.
1.2.52.	Revisar el área que se va a intervenir, de acuerdo al alcance plasmado en el acta de la emergencia.
1.4.1.	Se debe aclarar en qué lugar se ejecutará este ítem
17.1.7. 17.1.33. NP -09	Definir cuál de los tres procedimientos se va a ejecutar, porque cumplen la misma función. Revisar las

CONSORCIO TIG

Ítem	Observación
	especificaciones técnicas para revisar el alcance de cada ítem.
20.1.1.	Ítem a evaluar y se debe revisar la cantidad a intervenir. Revisar las especificaciones técnicas para revisar el alcance de cada ítem.
NP-07	Se debe remitir el APU de la actividad para realizar la evaluación por parte de la interventoría
NP-08	Cambiar por el ítem contractual 1.3.2. y revisar la cantidad a intervenir

Por favor subsanar este documento, a más tardar el día de mañana 14 de marzo en horas de la mañana.

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-089

Bogotá, D.C, marzo 13 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: PENDIENTES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN RESPUESTA COMUNICADOS 2023_RUU_MGP_084 Y 2023_RUU_MGP_085

Respetados señores:

Dando alcance al oficio 2023_RUU_MGP_084 y 2023_RUU_MGP_085 enviado por el contratista solicitamos respuesta a los comunicados TIG-MEM-078 Y TIG MEM-071 donde se presenta propuesta de planimetría de los baños de las instituciones San Agustín y Diana Turbay. Además, en vista de la escasez de materiales cerámicos para acabados en la región, se ha buscado obtener la cantidad necesaria para llevar a cabo las obras. Sin embargo, debido a que estos materiales no están especificados en las especificaciones técnicas ni en los Análisis de Precio Unitario (APUs) del contrato, es necesario que la entidad los apruebe.

De igual manera se extiende la solicitud de planos y diseños de la nueva tarima a construir en el colegio Marruecos y Molinos, agradeciendo se proporcione una respuesta rápida, con el fin de evitar la interrupción de las obras relacionadas con lo mencionado en este documento.

CONSORCIO TIG

Sin otro particular.

cordialmente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado: 2023_RUU_MGP_084-085

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_084

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud planos y diseños tarima Colegio Marruecos y Molinos.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente el Consorcio Mia GP solicita los planos y diseños de la nueva tarima a construir en el Colegio Marruecos y Molinos. Dado que el alcance del contrato en referencia es la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, todo lo anterior a espacios existentes, es claro que el presente es un contrato de obra y no de consultoría, por lo cual dentro de su alcance no se encuentra la realización de planos y diseños de nuevas estructuras o como lo es para el Colegio Marruecos y Molinos, el diseño de tarima.

Es prioritaria la entrega de esta información para que el Consorcio Mia GP pueda cumplir con las fechas de los compromisos adquiridos entre la SED y la institución educativa.

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_085

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud respuesta a planimetrías y acabados.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente el Consorcio Mia GP solicita respuesta a los oficios 2023_RUU_MGP_065 y 2023_RUU_MGP_067, donde por solicitud de la SED, el Consorcio Mia GP presentó propuesta de planimetría de los baños de las instituciones San Agustín y Diana Turbay. Por otra parte, debido a la escases de materiales cerámicos para acabados que presenta la región, se ha buscado la disponibilidad de las cantidades necesarias para la ejecución de las obras pero al no ser los materiales descritos en las especificaciones técnicas ni APUs contractuales, se requiere la aprobación de los mismos por parte de la entidad.

Se solicita a la interventoría el traslado de estos requerimientos a la SED y la pronta respuesta a fin de no suspender obras relacionadas con lo tratado en el presente oficio en la institución San Agustín, de lo contrario nos veremos en la obligación de trasladar al personal a otra sede y regresarlo una vez se tenga definidos estos temas.

Sin otro particular,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_067

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega propuesta baños colegio Diana Turbay Sede B.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se adjunta planimetría de propuesta de diseño arquitectónico de los baños a intervenir del colegio Diana Turbay Sede B, con el fin de recibir aprobación por parte de la entidad.


Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Planimetría
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

PLANTAS ARQUITECTONICAS Esc. 1:150

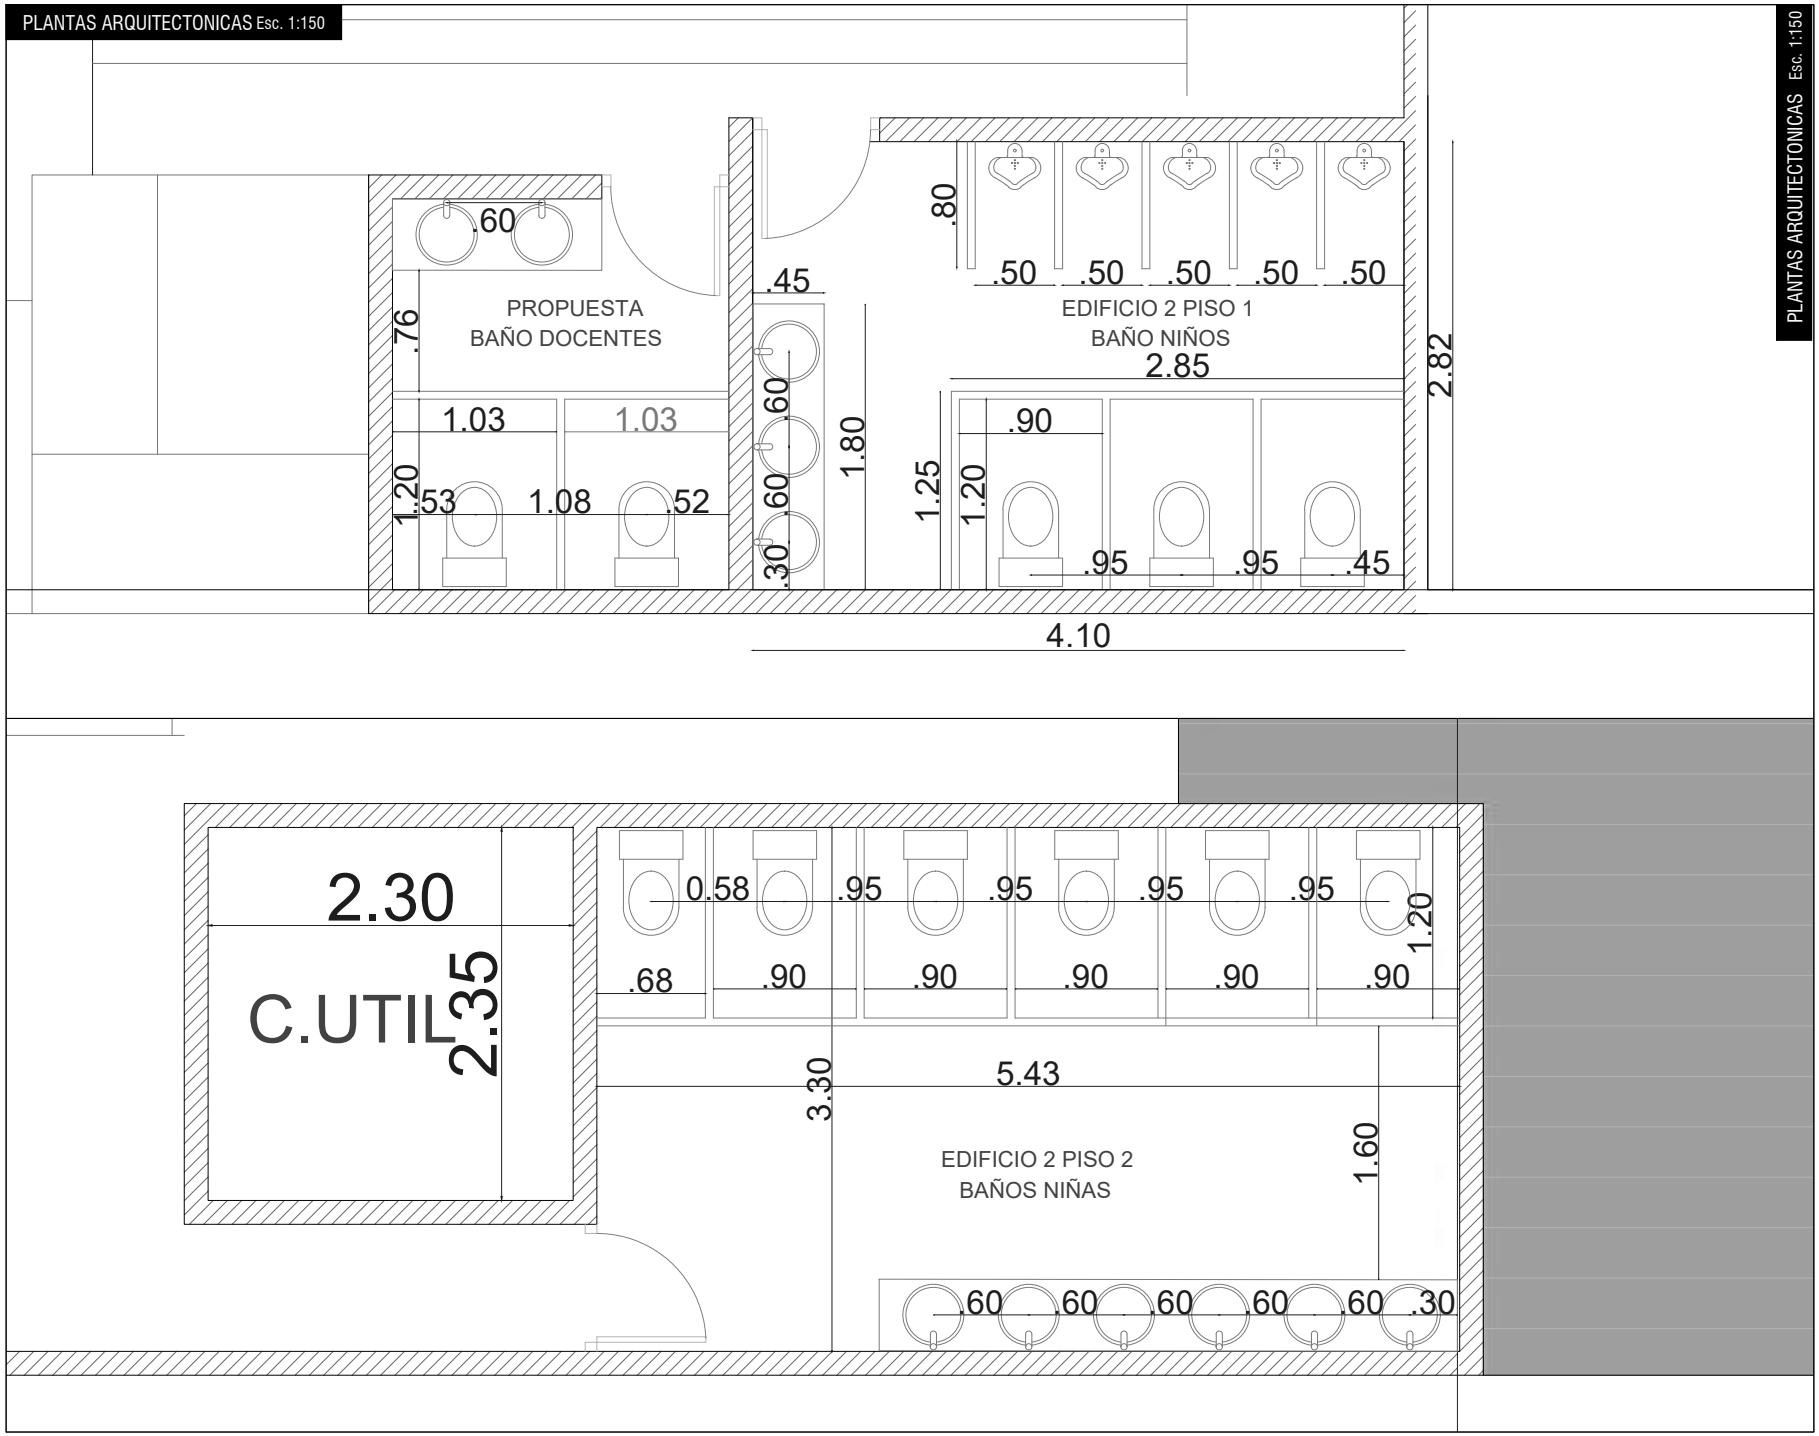

PLANTAS ARQUITECTONICAS Esc. 1:150

PROYECTO

COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B

BOGOTÁ,CUNDINAMARCA
ADECUACIÓN GENERAL

PROPIETARIO

Colegio Distrital Diana Turban Sede B

ARQUITECTA

Valentina Osorio Giraldo
M.P. A2328201 7-1094944405

CONTACTO

Valeosorio@hotmail.es
(+57) 300-785-87-06
Armenia, Quindío

NOTAS GENERALES

1.- LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO SISMICO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCIÓN SE ELABORARAN LOS DIFERENTES DISEÑOS PARTICULARES.
"EL RESPONSABLE(NO) DEL SUPERVISOR TÉCNICO EL VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS NOESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN EN LA EDIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CUENTA DE CONFORME AL CAMPO AL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO EN(NR)A.9.6.1 Y A.9.3 DE LA NSR-98). EL CONSTRUCTOR DEBE INFORMAR AL PROPIETARIO DE LOS COSTOS DE ASUMIR UN GRADO DE DESEMPEÑO MAYOR, Y EL DE QUE PUEDA TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.

2.- LAS SPECIMES ELECTRICOS, POR EL ARQUITECTO DEBEN REVISADOS POR EL DISEÑADOR ESTRUCTURAL, EL CONSTRUCTOR Y EL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OBRA, CUANDO CORRESPONDA CON EL ARQUITECTO DISEÑADOR. LAS SOLUCIONES PROPUESTAS A FIN DE CUMPLIR ESTA CONDICIÓN, EL CÁLCULO DEL REFUERZO Y DE LOS AISLADO DE LAS MAMPOSTERÍAS INTERNAS Y DE FACHADA, ASÍ COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES NO CONTINUOS, DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR EL PROFESIONAL CALCULISTA DE LA OBRA, O POR LOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

3. - LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTOS PLANOS DE ARQUITECTONICA Y DE CARÁCTER GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS SOBRE COMPONENTES EN LOS PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y EN LOS DE LOS DISEÑADORES TÉCNICOS. CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLOS Y LA DE ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE CON EL ARQUITECTO.

ARCHIVO

CBL_P-ARQUITECTONICOS.dwg

FECHA

Febrero 2023

CONTIENE

Planta Cubiertas

ESCALA

INDICADA

01 | 01

PLANO No

DIANATURBAY_
P-ARQ

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_065

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega propuesta baños colegio San Agustín Sede A.

Cordial saludo,

Por medio de la presente se adjunta planimetría de propuesta de diseño arquitectónico de los baños a intervenir del colegio San Agustín Sede A, con el fin de recibir aprobación por parte de la entidad.

Esta propuesta contempla los hallazgos por parte el Consorcio Mia GP en sitio como se expresa a continuación:

- Necesidad de implementar cielo raso en baños piso 3.

- Cambio de la especificación de piso contemplada inicialmente (baldosa de granito), por una especificación de menor espesor por la determinante de acabado de piso del pasillo.


- La especificación de enchape de pared esta por definir, ya que en el mercado actualmente no se encuentra con disponibilidad inmediata de material en gran cantidad y puede llegarse a demorar hasta un periodo mayor a 4 meses.

- La tubería que alimenta las baterías sanitarias actuales es de 1'' y deriva a cada sanitario de tanque en 1/2'', para realizar el cambio a sanitario de fluxómetro se debe realizar un cambio de la red principal, lo cual no fue contemplado de esta manera, por tal motivo se recomienda utilizar sanitarios de tanque ahorradores.


Cordialmente,

Mateo Luzardo V.


MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

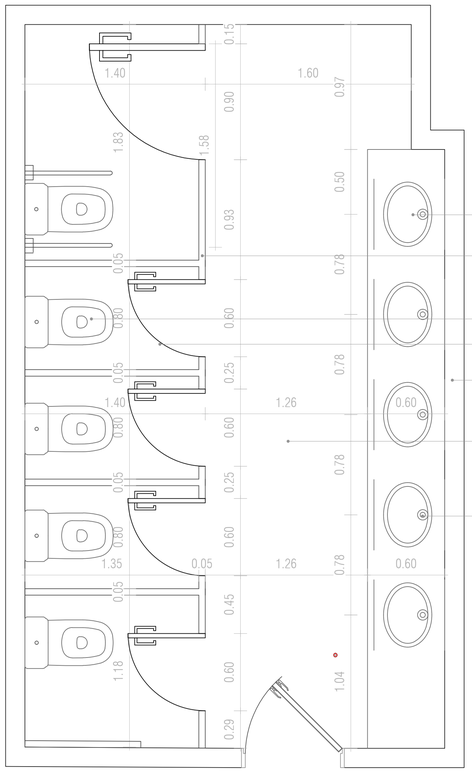


1 Baño mujeres
1 :20

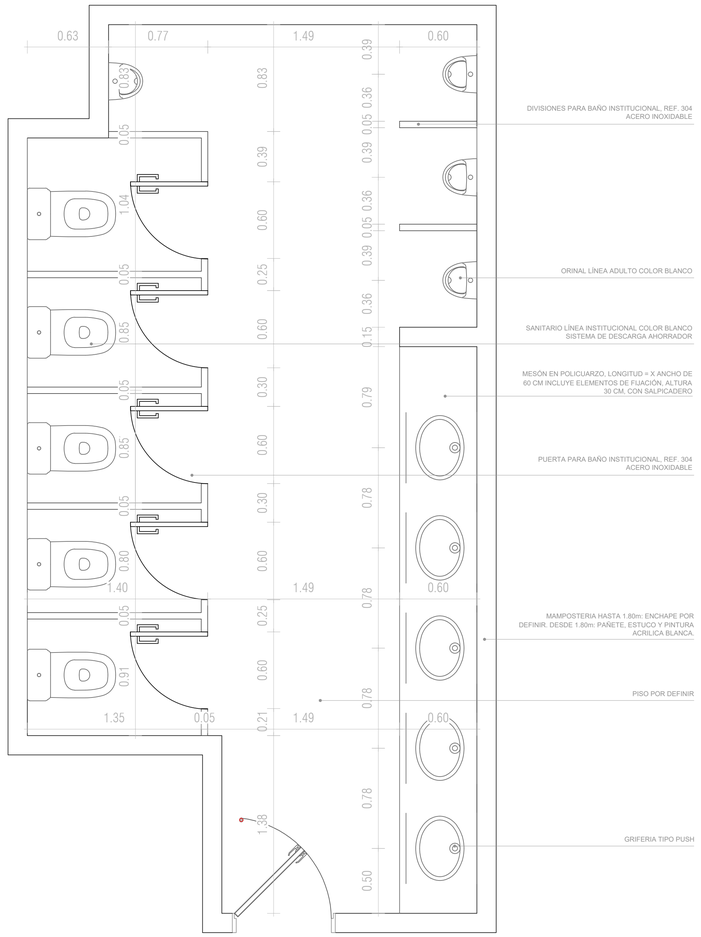


2 Baño hombres
1 : 20

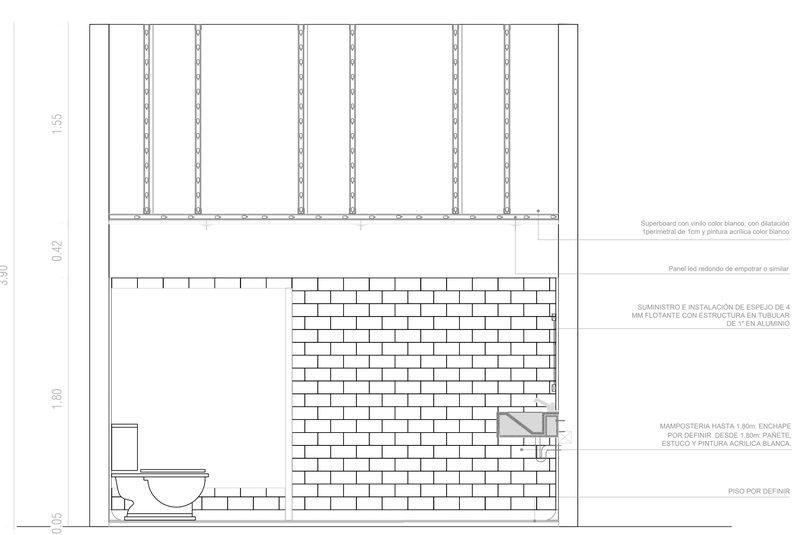

3 Corte
1 : 20

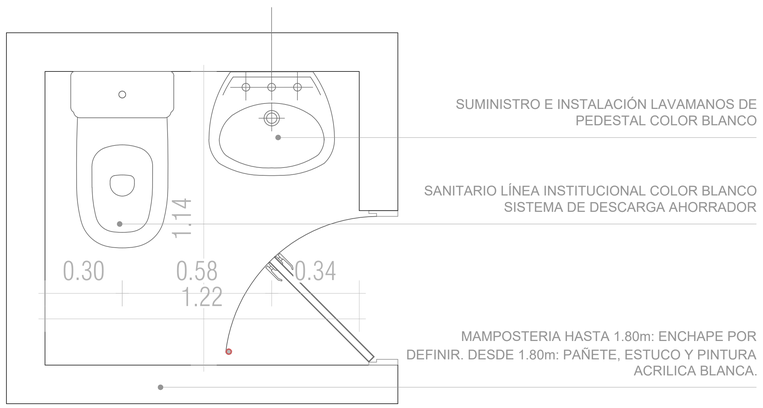

4 Baño profesores
1 : 10

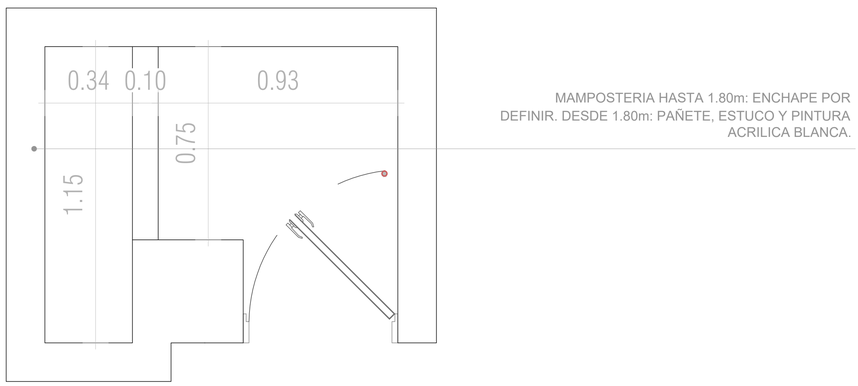

5 Cuarto aseo
1 : 10

BA01

PLANO No.

PROYECTO
SAN AGUSTIN SEDE A

Diseño propuesta baños

FECHA ULTIMA REVISION:
28/02/23

REVISIÓN: 1

PLANO No.

BA01

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-087

Bogotá, D.C, marzo 15 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
Representante legal
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: APROBACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA GRUPO 8

Respetados señores:

En relación a la documentación remitida por ustedes, se informa que una vez revisada, cumple con los parámetros establecidos en temas de afiliación a seguridad social, por ende, se da aprobación de ingreso al personal para involucrarse a las actividades de obra en los frentes relacionados que se tienen para ejecución.

No.	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	COLEGIO
1	Luis Antonio Barajas	6762943	Ayudante	Liceo Femenino
2	Carlos Julio Beltrán	19497864	Ayudante	Santa Lucia

CONSORCIO TIG

3	Pedro Hurtado Uribe	1416839	Ayudante	Santa Lucia
4	Daniel Gregorio Munevar	79808874	Ayudante	Santa Lucia
5	Juan De Jesus Sogamoso	5969876	Ayudante	Bravo Páez

Sin otro particular, atentamente.

Atentamente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG
Revisó y aprobó: Katherine Guañarita SST Consorcio TIG
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.497.864

BELTRAN RUIZ

APELLIDOS

CARLOS JULIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1962**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500100-42123572-M-0019497864-20040507 **00015**041291 02 137118925

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de Radicación: 07 03 2023

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	A. Afiliación [X]	**2. Tipo de Afiliación**	A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X]	B. Colectiva [ ]	D. De Oficio [ ]	**3. Régimen**	A. Contributivo [X]	
	B. Reporte de Novedades [ ]		- Beneficiario o Afiliado adicional [ ]	C. Institucional [ ]			B. Subsidiado [ ]	

4. Tipo de afiliado A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	**5. Tipo de cotizante** A. Dependiente B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	**Código** (a registrar por la EPS) [ ] [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
BELTRAN	RUIZ	CARLOS	JULIO
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	19497864	Femenino [ ] Masculino [X]	15 11 1962

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ] [ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC

18. Residencia Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico

Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]				D D M M A A A A
B2	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]				D D M M A A A A
B3	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]				D D M M A A A A
B4	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]				D D M M A A A A
B5	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]				D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR	[X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	13240346	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CALLE 3A 7B 140	5801473	obras.joyavi@gmail.com	Los Patios	Nd S

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad
  - [ ] A. Régimen Contributivo
  - [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado
  - [ ] A. Mismo Régimen
  - [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo		Fecha de Radicación	42. Fecha
		Femenino	Masculino		D D M M A A A A
		[ ]	[ ]		

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [ ] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [ ] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [ ] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
CARLOS JULIO BELTRAN RUIZ CC 19497864	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad

	CN	RC	TI	CC	CE	PA	CD	SC	Total
Cantidad				1					1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
Código del Municipio / Código del Departamento	Número de Ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
C.C. No.		

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 07/03/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	13240346	**Cédula Usuario:**	CC 13240346
Nombre:	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR				
Dirección:	MZ B LT 39				
Departamento:	NORTE DE SANTANDER		**Municipio:**	LOS PATIOS	
Correo electrónico:	obras.joyavi@gmail.com				
Teléfono:	3138601375		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5455901 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 13240346	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	258	08/03/2023	CC 19497864	BELTRAN RUIZ CARLOS	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

F992F77C862EED7A625F579AE75A4E15 Certificado impreso el día 3/7/2023 11:28:47 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva: **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

POSITIVA

CARLOS JULIO
BELTRAN RUIZ
19497864

JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
13240346

Bogotá DC. 07 de marzo de 2,023

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 07 de marzo de 2023, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificacion	CC 19497864
Nombres y Apellidos	CARLOS JULIO BELTRAN RUIZ
Tipo y Número de Identificac ion del Empleador	NI 13240346
Razón Social Empleador	JOSE JOAQUIN YAÑEZ VILLAMIZAR
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	07/03/2023
Fecha de Ingreso a Compensar	07/03/2023
Cargo	obrero
Horas Labor Mes	198
Sueldo básico	$ 1160000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **BELTRAN RUIZ CARLOS JULIO** identificado(a) con **CC** número **19.497.864** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de mayo de 1995 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 80% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR
2. El 20% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de marzo de 2023.

Cordialmente,



Laura Patricia Merchan Metaute
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2023030711391

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.969.876**

SOGAMOSO QUESADA

APELLIDOS

JUAN DE JESUS

NOMBRES



Juan de Jesus Sogamoso

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ABR-1969**

ORTEGA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-ABR-1989 ORTEGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00129846-M-0005969876-20081119 0006392809A 2 1120024665

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 06:43:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62015197

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Nombre Sucursal**	TUNAL	**Código Sucursal**	MOTUNAL
Documento	NI13240346	**Dirección**	MZ B LOTE 39		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5801473		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	68
Ciudad	LOS PATIOS	**Departamento**	NORTE DE SANTANDER		
Representante Legal	YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN	**Identificación**	CC13240346		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3082270	TORO RAMOS FABIO ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 5969876	SOGAMOSO QUESADA JUAN DE JESUS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 6212586	CARVAJAL LOPEZ DANIEL MARIA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 7630373	CASTRO CARDENAS JAVIER ALFONSO	01	00	X															0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 10893066	TORRES CARLOS ANTONIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11522038	AVILA PEREZ JUAN JOSE	01	00		X														0	13	13	13	13	COLPENSIONES	$ 502.667	$ 80.500	FAMISANAR EPS	$ 502.667	$ 62.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 502.667	$ 35.000	COMPENSAR CCF	$ 502.667	$ 20.200	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 223.800
CC 12132930	PEÑA PRIETO EFRAIN	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 12400786	MORENO TOLOZA ROIMAN	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	FAMISANAR EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 17610941	RODRIGUEZ CUPITRA JOSE IVAN	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PROTECCION	$ 348.000	$ 55.700	ASMET SALUD	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
CC 19336646	LAVERDE JOSE ANTONIO	01	04																0	0	30	30	30	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.600
CC 52388693	ALVAREZ OSORIO GLORIA ESTHER	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79051816	PATIÑO WALTEROS MARCO ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79057932	RODRIGUEZ CUBILLOS JOSE RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79258390	CUBILLOS CHINGATE JOSE YURI	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79560984	SUAREZ PAEZ CARLOS JULIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79669502	MORENO RODRIGUEZ MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79672298	ESPINOSA ROJAS RAFAEL	01	00		X														0	4	4	4	4	PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 79673590	VALENCIA HERNANDEZ RAFAEL VICENTE	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 79729870	SUAREZ PAEZ NICOLAS	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79823372	MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79976026	AVILA PEREZ DIEGO MAURICIO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80041566	MEDINA MORENO LUIS ARCANGEL	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80113612	LUNA RAMIREZ DAVID RICARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80226139	MARTINEZ CAMELO JORGE ARMANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80369941	CORONADO MIRANDA LUIS FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80738455	COLO RODRIGUEZ CESAR ANDRES	01	00		X														0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 84095652	CARRANZA DE LA CRUZ JOSE GREGORIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 93413044	RODRIGUEZ BONILLA LUIS ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94458377	MANCILLA JOSE ROMIR	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000335016	TOQUICA MOYANO BRANDON ESTIVEN	01	00	X															0	8	8	8	8	PORVENIR	$ 309.334	$ 49.500	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 309.334	$ 12.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 309.334	$ 21.600	COMPENSAR CCF	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1000596619	HENAO MORA WILLIAM CAMILO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 1000614892	AVILA TORO JOHN ALEXANDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000689054	DEVIA CARDENAS BRYAN STEVEN	01	00		X														0	15	15	15	15	PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 580.000	$ 40.400	COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1000936764	PAEZ MONTOYA CARLOS EDUARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001043676	ORTIZ CRUZ ANDRES OSWALDO	01	00	X															0	16	16	16	16	PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	NUEVA EPS	$ 618.667	$ 24.800	POSITIVA DE SEGUROS	$ 618.667	$ 43.100	COMPENSAR CCF	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 1001047146	SERRANO ARIAS ALIX NAYELI	01	00	X	X														0	10	10	10	10	PORVENIR	$ 386.667	$ 61.900	SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 386.667	$ 27.000	COMPENSAR CCF	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1001283348	TOQUICA MOYANO KEVIN DANIEL	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1003805819	CASTRO VASQUEZ WILLIAM	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS FAMILIAR DE	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

Pagado: 10/03/2023 | **Empresa NI13240346 YANEZ VILLAMIZAR JOSE JOAQUIN** | **Planilla Nro: 62015197** | **Periodo Cotización: febrero de 2023** | **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	MAURICIO																							COLOMBIA																
CC 1004365555	PRATTO MONTENEGRO RONIN ALFONSO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	EPS CAJACOPI	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1004711690	YESQUEN PEÑA ALEXIS	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	NUEVA EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1012333574	CUBILLOS LADINO DIEGO FASSBINDER	01	00		X														0	4	4	4	4	PORVENIR	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1012375312	RICO WILMER FABIAN	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	COMPENSAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1014176195	PEREA HURTADO JHON FREYDER	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022958502	GALINDO LOZANO ANDERSON MAURICIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023000436	MEDINA PATIÑO LEONARDO	01	00		X														0	20	20	20	20	PORVENIR	$ 773.334	$ 123.800	FAMISANAR EPS	$ 773.334	$ 31.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 773.334	$ 53.900	COMPENSAR CCF	$ 773.334	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.700
CC 1023933729	VELASQUEZ GOMEZ YOHAN ALFONSO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 38.667	$ 2.700	COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1024503523	MONTAÑO NIÑO DAIRO ALONSO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030637166	BEJARANO DIAZ YEISON FERNANDO	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1031131349	SUAREZ VARGAS JOHN ANDERSON	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1031160183	ESPINOSA REYES DOUGLAS ORLANDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032374371	MONDRAGON ORTIZ MICHAEL STIVEN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1032433118	MARTINEZ PARRA YULDER JAVIER	01	00	X															0	7	7	7	7	PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 270.667	$ 18.900	COMPENSAR CCF	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1033745073	MONTENEGRO BALLESTEROS HECTOR ALEXANDER	01	00		X														0	18	18	18	18	PROTECCION	$ 696.000	$ 111.400	SALUD TOTAL EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1033811872	CORENA JIMENEZ JOSE ALFREDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041890049	POLO DE LA HOZ NEIDER ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1041902626	VIZCAINO CONRADO LEYDER JOSE	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1058843089	LONDOÑO RUIZ LUIS FERNANDO	01	00	X															0	18	18	18	18	COLFONDOS	$ 696.000	$ 111.400	FAMISANAR EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1074712783	PALOMEQUE GAVIRIA LEVIS ANTONIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1114881453	OROBIO JORGE ENRIQUE	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1117490303	RODRIGUEZ HERRERA JESUS DAVID	01	00	X															0	18	18	18	18	PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	POSITIVA DE SEGUROS	$ 696.000	$ 48.500	COMPENSAR CCF	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 1127652609	PADILLA RANGEL DARWIN SAUL	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1221978771	MONTESDEOCA IVIS DANIEL	01	00	X															0	23	23	23	23	PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	POSITIVA DE SEGUROS	$ 889.334	$ 61.900	COMPENSAR CCF	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 2000005803	YEPEZ SILVA YENDRYS ALBERTO	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	FAMISANAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 4132393	ROMAÑA PEÑA GYVER	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	SALUD TOTAL EPS	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
PT 5660234	MANRIQUE ROMERO FREDY RAFAEL	01	00	X	X														0	9	9	9	9	PORVENIR	$ 348.000	$ 55.700	FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 348.000	$ 24.300	COMPENSAR CCF	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.000
PT 6231154	GONZALEZ MERCADO JEAN CARLOS	01	00	X															0	22	22	22	22	PORVENIR	$ 850.667	$ 136.200	COMPENSAR EPS	$ 850.667	$ 34.100	POSITIVA DE SEGUROS	$ 850.667	$ 59.300	COMPENSAR CCF	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
PT 6530626	GARCIA DAVILA RONIEL JOSE	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.160.000	$ 80.800	COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
PT 7166646	SIERRA MALDONADO ROBERTO ANTONIO	01	00		X														0	4	4	4	4	COLFONDOS	$ 154.667	$ 24.800	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 154.667	$ 6.200	POSITIVA DE SEGUROS	$ 154.667	$ 10.800	COMPENSAR CCF	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 53.553.345	$ 54.713.345	$ 54.713.345	$ 54.708.012	$ 8.569.900	$ 0	$ 0	$ 2.232.900	$ 3.811.800	$ 2.190.000	$ 10.100	$ 15.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.829.800	$ 0	$ 16.829.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

IPS EN SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDICINA ESPECIALIZADA Y ULTRASONIDO

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolucion 2005 del 23 de mayo de 2022

Habilitación Nro. 1100138158
del 3 de marzo de 2022



Nro. 8829

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA : 17/01/2023 HORA:12:13	**EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO**	
NOMBRES: JUAN DE JESUS SOGAMOSO QUESADA	DOCUMENTO: 5969876	EDAD: 53 GENERO: M
Empresa: PROCASA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	Cargo: OFICIAL DE CONSTRUCCION	Tel: 31087897637 -

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

TIPO DE EXAMEN REALIZADO: Preocupacional o Ingreso

FINALIDAD DEL EXAMEN: Establecer el estado de salud del trabajador de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales estará expuesto

CONCEPTO MÉDICO LABORAL

Se certifica al trabajador para laborar Apto Para el Cargo Sin Restricciones, según resultados del cuestionario, valorización medica ocupacional y para clínicos según resolución N° 4272 del 27 de Diciembre del 2021

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Medica Laboral	**SI**	Respiratorio	NA	Espirometria	NA
Dermatología	NA	Audiometria	NA	Osteomuscular	**SI**
Visiometria	NA	Cardiovascular	NA	Optometria	NA
Prueba de equilibrio	NA		NA		NA

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Glicemia	NA	Trigliceridos	NA	Colesterol	NA
Cuadro Hematico	NA	Serologia	NA	Parcial de Orina	NA
Coprologico	NA	Frotis Faringeo	NA	KOH Uñas	NA

RECOMENDACIONES

Pausas Activas	Si	Uso de elementos de protección personal	Si	Control audio métrico	NA
Control optométrico periódico	NA	Uso de lentes permanentes	NA	Estilos de vida saludable	NA
Evitar posturas prolongadas	Si	Control medico ocupacional anual	NA	Higiene postural	Si
Valoración por medicina laboral	NA	Uso de doble protección auditiva	NA	Uso de lentes visión cercana	NA
Control de tensión arterial	NA	Dieta y Ejercicio físico semanal	NA	Valoración y manejo en EPS	NA

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LECTURA OBLIGATORIA ANTES DE FIRMAR

He comprendido el objetivo, propósito, beneficios y riesgo del examen médico, paraclínico y/o ocupacionales que se me practicaron. Certifico que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y que se plasmaron en este documento son veraces y completas. Entiendo que este es un proceso voluntario y libre de toda cohesión, fui informado de las medidas que el profesional de SST que labora en IPS EN SALUD tomara para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta, AUTORIZO para que den a conocer sea por medio electrónico o físico esta información a la persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente para el adecuado cumplimiento del SGSST. Hago constar con mi firma que h leído y comprendido lo anteriormente expuesto y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

Lea este codigo QR con su celular para validar su autenticidad





LICENCIA No. 250425 **Medico Especialista en Salud Ocupacional**	**Firma Trabajador C.C. No 5969876**	**6898**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6.768.843
BARAJAS BARRERA
LUIS ANTONIO


09-MAY-1963
SAN MATEO
(BOYACA)
1.71
O+
M
12-AGO-1981 TUNJA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901402105
Número Afiliación:	9001382
Razón social:	CASTANO CONSTRUCCION CONSCIENTE S A S -

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	6766843
Nombre:	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA
Fecha Ingreso:	14/03/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	SUCURSAL 1
Centro de trabajo:	CTRAB 005
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	13/3/2023 4:45:41 PM

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | salud eps

No. de Radicación | Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran antes del formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de Usuario: A. Afiliado ● | B. Reporte de Novedades
2. Tipo de Afiliación: A. Individual | Cotizante y cabeza de Familia | Beneficiario y afiliado adicional | B. Colectivo | C. Institucional | D. Independiente
3. Régimen: A. Contributivo | B. Subsidiado
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante | B. Cabeza de familia | C. Beneficiario
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente | B. Independiente | C. Pensionado
Código (a ser asignado por la EPS)

A. AFILIACIÓN B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	BARAJAS	BARRERA	LUIS	ANTONIO
7. Tipo de documento de identidad	CC	8. Número de documento de identidad	6768943	9. Sexo: Femenino / Masculino ●	10. Fecha de nacimiento	09/05/1963

B. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia | 12. Discapacidad: Tipo / Carnet | 13. Puntaje SISBÉN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: AXA COLPATRIA | 16. Administradora de pensiones: COLPENSIONES

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia: TRASVERSAL 12 39 A 50		3044531208
	BOGOTA	Zona: Urbana ● / Rural	BOGOTA

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres				
20. Tipo de documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo: Femenino / Masculino	23. Fecha de nacimiento	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
01								
02								
03								
04								
05								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Edad	31. Discapacidad: Tipo F	Tipo N	Carnet U	Carnet T	Carnet F	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01														
02														
03														
04														
05														

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Cun	
R	
S	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: CASTAÑO CONSTRUCCION CONSCIENTE SAS	36. Tipo de documento de identificación: NIT
37. Número del documento de identificación: 901402105	38. Tipo de cotizante a pagador pensiones (a registrar por la EPS)

39. Ubicación: CR 24 20 08	3218565198	marce_1393@hotmail.com	Manizales	Caldas

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad:
1. Modificación datos básicos de identificación
2. Corrección datos básicos de identificación
3. Actualización documento de identidad
4. Actualización y corrección de datos complementarios
5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código:
6. Reinscripción en la EPS
7. Inclusión de cónyuge/compañero(a) o de afiliados adicionales
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
9. Pérdida de calidad afiliado/ actualización de condiciones para cotizar
10. Terminación de la calidad afiliado/ pérdida de las condiciones para seguir cotizando
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo / B. Régimen Subsidiado
14. Traslado: A. Mismo Régimen / B. Diferente Régimen
15. Reporte por fallecimiento
16. Reporte del fondo de protección al cesante
17. Reporte de la calidad de Preparensionado
18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación					
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha	
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar a Pagador de Pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de inexistencias económicas de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los Documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de la información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere con la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados reportal y a las entidades públicas que por ley tuvieran la regulación.
52. Autorización para que la EPS maneje en bases personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

Cotizante	Cabeza de familia
Luis Antonio Barajas Barrera	Marcela Serna Osorio

IX. ANEXOS

54. Anexe copia del documento de identidad: CN Cant. | RC Cant. | TI Cant. | CC Cant. | PA Cant. | CE Cant. | CD Cant. | RC Cant. | Folio
57. Copia del Número de Identificación permanente emitida por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de nacimiento, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial con declaración de divorcio, sentencia judicial que ordene la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega con menor.
61. Copia de la orden judicial o fallo(s) administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o fallo de privación expedido por el competente sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Constitución de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de los autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación						
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad				71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta el conocimiento de la información registrada y de los deberes y las prohibiciones contenidas en el artículo 70 del formulario.

VIGILADO Supersalud

Versión 4.000 Superintendencia de Salud

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO

compensar | salu eps

	SI	NO
¿ Previo diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	☑	☐
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo la entrega de la carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	☑	☐
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	☑	☐
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	☑	☐
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	☑	☐

¿Autoriza recibir la Carta de Derechos y Deberes y la Carta de Desempeño por medio electrónico?
SI: ☐ Correo electrónico: _____ NO: ☑

Me comprometo a consultar en www.compensar/salud ☐ ☐

Como cotizante y representante de mi grupo familiar, hago constar mediante mi firma que compartiré la presente carta de derechos y deberes y carta de desempeño de la EPS con mis beneficiarios.

Firma del afiliado: Luis Antonio Burgos

No. Identificación: 6 768 943

FIRMA A RUEGO (Diligenciar exclusivamente cuando el cotizante no pueda firmar)

A ruego de (la) señor (a) _____ con C.C. No. _____ lo hace en su nombre, el (la) señor(a) _____ con C.C. No. _____ mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que se está entregando, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a) _____

Firma a Ruego: _____

Nombres y apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombres y apellidos de quien no sabe firmar: _____

Identificación: _____

huella

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De manera voluntaria, explícita, previamente informada e inequívoca a todos los servicios de Salud Compensar EPS, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, para tratar mi información personal según lo establecido en el Manual de protección de Datos Personales de Compensar, disponible en: www.compensar.com en el link políticas de privacidad y condiciones de uso; información que será utilizada en el desarrollo de las funciones propias para:

- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo y/o mis beneficiarios.
- Dar cumplimiento a requerimientos legales y de organismos de control.
- Actualizar la información de contacto en las bases de datos de Compensar con la información de contacto registrada ante las Centrales de Información Financiera y Operadores.
- Proveer y/o evaluar la calidad de los productos y/o servicios requeridos por mí.
- La realización de estudios internos sobre fines estadísticos y analíticos de los datos, para mejoras de nuestros servicios o programas especializados de atención salud; Información sobre la cual en cualquier momento podré ejercer mis derechos de Habeas Data (Actualizar, Revocar, Suprimir, Conocer), para solicitar que no se me envíe información de los servicios en los casos que sea pertinente, y que no afecte el servicio de salud prestado por Compensar EPS.
- Transmitir mis datos personales, a las administradoras encargadas de la seguridad social, con el fin de actualizar el estado de mi afiliación y/o traslado en el sistema.
- Compartir mis datos personales y/o menores de edad con la Caja y EPS para los fine relacionados con las funciones propias de Compensar.

Como titular de la información personal sobre la que Compensar EPS ejerce el tratamien to, se me informa sobre los canales a través de los cuales puedo ejercer mis derechos: conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos personales, entre ellos el formulario wel https://corporativo.compensar.com/proteccion-de-datos además manifiesto expresament que conozco y se dónde consultar la información sobre protección de datos personales d Compensar, así como los efectos y alcance de la presente autorización y que estoy libr de todo vicio del consentimiento en el momento de otorgarla.

La protección de datos personales en Compensar EPS, cumple con los principios d finalidad, necesidad, circulación restringida, confidencialidad y seguridad señalados en l Ley 1581 de 2012 y así mismo, cabe anotar, que la protección de los datos personales s efectúa a través de proveedores tecnológicos, con los cuales se tienen firmados contrato de transmisión de información, en aras de cumplir a cabalidad con los principios de acces de la ley, así como de tomar las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para e aseguramiento de los datos.

Vigilado Supersalud

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CESAR CIRO CAMACHO LOPEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **6766843,** estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *TRASLADADO A OTRO FONDO*.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 13 de marzo de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


79.606.374
DANIEL GREGORIO


20-MAY-1977
BOGOTA D.C
1.66
O+
M
14-AGO-1995 BOGOTA D.C

Centro De Formación Trabajo Seguro En Alturas

PSM VERTICKAL SAS
NIT. 900905747 - 2

IMPERMEATOR CONSTRUCTION SAS
Empresa NIT. 9015949571
Representante Legal
DANIEL GREGORIO MUNEVAR CASALLAS

HACE CONSTAR QUE:

ARL SURAMERICANA
Empresa administradora de riesgos laborales

DANIEL GREGORIO MUNEVAR CASALLAS

Con Cedula de Ciudadanía No. **79808874**

Curso y se certifico en capacitación y entrenamiento
EN REENTRENAMIENTO SECTORIAL EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 4272 -2021
En Protección Contra Caídas En Trabajo Seguro En Alturas
Con una intensidad de 08 Horas.

Realizado los días 18 de octubre del 2022 en la Ciudad de Bogotá D.C.
En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Res. 4272 del 2021 NTC 6072/2014
Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. el día 18 de Octubre de 2022

ALBA MERY
Representante Legal
PSM VERTICKAL TSA SAS
NIT 900.905. 747-2

JAIME NICOLAS GONZALEZ
C.C. 1026557157
LSST N0670/2020-33829
2022/05/15-2022/05/22
Licencia en SO -25-1186

CELAC

RESOLUCIÓN MINTRABAJO

Verificación y Autenticidad del Certificado: psm.verticksl@gmail.com /www.psmverticksl.com
322 452 5330 749 8581 Av Americas No. 68B - 61 Bogota D.C. / Colombia

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-16, 07:54:20 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61461512

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 15/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IMPERMEATOR CONSTRUCTION SAS		
Documento	NI901594957	**Dirección**	CR 10H ESTE #21 - 29 SUR
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3084498
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MUNEVAR CASALLAS DANIEL GREGORIO	**Identificación**	CC 79808874
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007749905	JAVIER ESTIVEN GONZALEZ FUENTES	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1193372088	LUZ DAMARIS VELEZ ALVAREZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 580.000	$ 23.200	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1193379830	DIEGO ALEJANDRO VELEZ ALVAREZ	01	00	X	X															0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 734.667	$ 117.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
CC 79808874	DANIEL GREGORIO MUNEVAR CASALLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79949567	DIEGO ANTONIO VELEZ MARIN	01	00	X	X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 734.667	$ 117.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
PT 1416839	PEDRO ANTONIO HURTADO URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200


III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.562.668	$ 4.562.668	$ 4.562.668	$ 4.562.668	$ 730.200	$ 182.600	$ 317.900	$ 182.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.413.300	$ 2.200	$ 1.415.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
COL
No. 1416839
HURTADO URIBE
PEDRO
VEN M
9532166100891990
10-09-1990
10-05-2021 BOGOTA D.C.
30-05-2031
VISIBLE
Pedro Hurtado

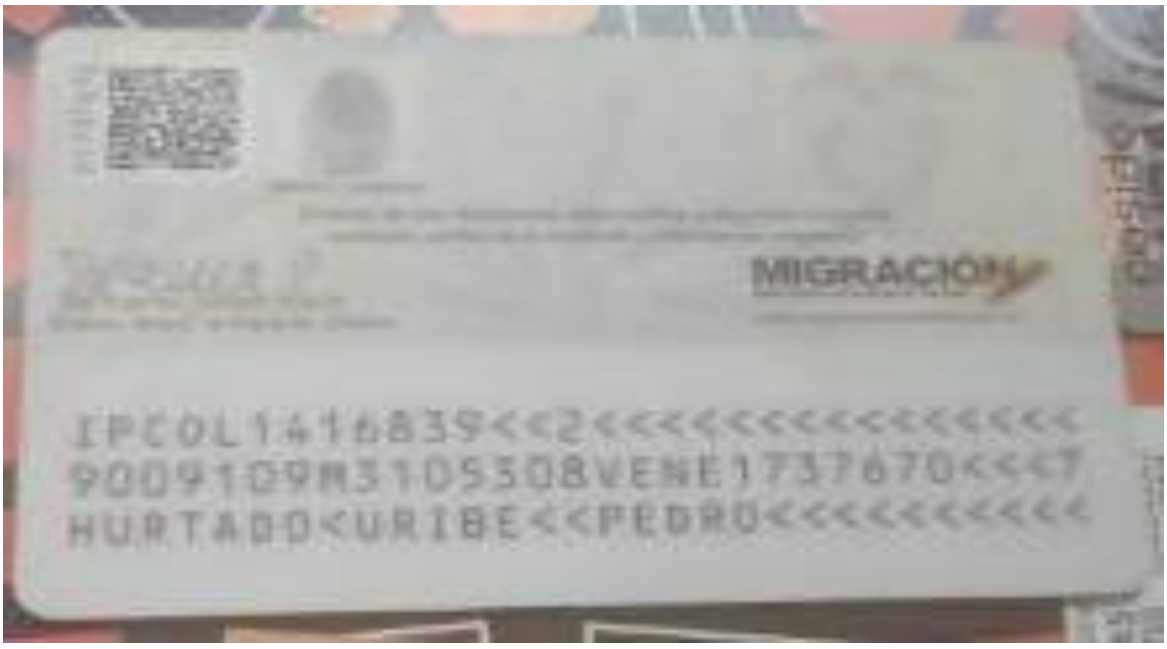
MIGRACIÓN
IPCOL1416839<<2<<<<<<<<<<<<<<<
9009109M3105308VENE1737670<<<7
HURTADO<URIBE<<PEDRO<<<<<<<<<<

CODIGO DE VERIFICACION Y AUTENTICACION

110822/1/REN11-6-8

CUMBRE COLOMBIA

CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

NIT: 901 139 753 - 4

CERTIFICADOS EN LA NTC 6072 POR BUREAU VERITAS CO21.01731 Y APROBADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO DESDE EL 05062018 RADICADO 08SE2018220000000020162 Y PROGRAMA DE FORMACION DE LA 4272 Y LICENCIA DE SERVICIOS SST 8989 de 31/05/2021

GRUPO CUMBRE COLOMBIA - SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OTORGA LA:

CERTIFICACION DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

A:

PEDRO HURTADO URIBE

IDENTIFICADO CON: PP T 1416839

POR HABER CURSADO Y APROBADO EL NIVEL DE CAPACITACION

REENTRENAMIENTO

BAJO ESTANDARES Y LINEAMIENTOS RESOLUCION 4272 / 2021

REALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC, DURANTE EL 8/11/2022 *A* 8/11/2022

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE **8 HORAS**

SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA 9/11/2022 *DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS*

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

Rosalba Garcia R.

ROSALBA GARCIA RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA: 23.779.061 DE MONIQUIRA

MARCOS LEON MONTAÑO
ENTRENADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
LICENCIA SST 6564 - 42523

DATOS COMPLEMENTARIOS RESOLUCION 4272



REALIZADO PARA EMPRESA: IMPERMEATOR — IMPERMEATOR CONSTRUCTION SAS — **NIT:** 901.594.957 - 1

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GREGORIO MUNEVAR CASALLAS — **DOCUMENTO ID:** 79808874

AFILIACION DEL TRABAJADOR A RIESGOS LABORALES EN: ARL SURA

WWW.CUMBRECOLOMBIA.COM

CALLE 71 # 21 - 44 BOGOTA - COLOMBIA / MOVIL: 301 382 9000 - 322 406 4354 / FIJO 601 300 1094

EXAMENES MEDICOS | ARL REINVERSION | ALTURAS CURSOS | CONFINADOS ESPACIOS | EQUIPOS INSPECCION | ANCLAJES INSTALACION

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-16, 07:54:20 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61461512

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 15/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IMPERMEATOR CONSTRUCTION SAS		
Documento	NI901594957	**Dirección**	CR 10H ESTE #21 - 29 SUR
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3084498
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MUNEVAR CASALLAS DANIEL GREGORIO	**Identificación**	CC 79808874
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007749905	JAVIER ESTIVEN GONZALEZ FUENTES	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1193372088	LUZ DAMARIS VELEZ ALVAREZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 580.000	$ 23.200	6,960	$ 580.000	$ 40.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.600
CC 1193379830	DIEGO ALEJANDRO VELEZ ALVAREZ	01	00	X	X															0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 734.667	$ 117.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
CC 79808874	DANIEL GREGORIO MUNEVAR CASALLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79949567	DIEGO ANTONIO VELEZ MARIN	01	00	X	X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 734.667	$ 117.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 734.667	$ 29.400	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600
PT 1416839	PEDRO ANTONIO HURTADO URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.562.668	$ 4.562.668	$ 4.562.668	$ 4.562.668	$ 730.200	$ 182.600	$ 317.900	$ 182.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.413.300	$ 2.200	$ 1.415.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-090

Bogotá, D.C, marzo 13 de 2023

Señores:
CONSORCIO MIA GP
Atn: MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
CRA 8 No. 12-21
Telefono: 313 3876020
Bogotá D.C

REFERENCIA: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: RESPUESTA COMUNIACADO 2023_RUU_MGP_083 DIAGNOSTICO RESTREPO MILLAN SEDE C

Respetados señores:

Una vez revisado su comunicado, esta interventoría quiere informar al contratista que el informe presentado aún sigue presentando inconformidades y que aún no se ha suplido la necesidad primaria que se debe tener en cuenta desde el pliego de condiciones para el manejo de las emergencias.

Es de aclarar que la primera etapa y ante un inminente riesgo de colapso se debe hacer la mitigación necesaria, es decir: *"en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento."*

Así las cosas, se puede observar en la imagen sin numeración “Desprendimiento seccionado del revestimiento del talud aumentando el riesgo de volcamiento del árbol”, la atención primaria debía hacerse lo siguiente:

1. Señalización y sensibilización sobre el posible riesgo.
2. Tratamiento silvicultural.
3. Acercamiento con Secretaría de educación distrital

Referente a la conclusión del contratista donde nos manifiesta que: “CONSORCIO MIA GP expone la responsabilidad que debe asignarse al contratista de la obra en el predio vecino dado que por negligencia en los procesos constructivos que exacerbaron en el grado de inestabilidad del talud en el colegio Restrepo Millán sede C” solicitamos se haga llegar a la entidad las pruebas de la negligencia para ser presentadas a la entidad contratante como prueba para hacer el proceso a que haya lugar entre las partes implicadas.

Volvemos a recordar que el contratista debe tener en cuenta el procedimiento y las etapas de la intervención de emergencias de acuerdo a los pliegos de condiciones (página 6).

cordialmente,

Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado: 2023_RUU_MGP_083

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_083

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Diagnóstico sobre Inestabilidad del Talud en Colegio Restrepo Millán Sede C

Cordial Saludo,

El día 11 de febrero de 2023, mediante 2023_RUU_MGP_041, Consorcio Mia GP emitió informe preliminar sobre diagnóstico de las condiciones iniciales del talud ubicado en el colegio Restrepo Millán Sede C, y de acuerdo a este informe se tiene que dentro de la ETAPA 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, se debía tomar muestras de laboratorio de suelos para ser analizadas por los especialistas correspondientes. El día 15 de febrero, se procedió a realizar ensayos de suelos los cuales servirán de suministro para el diseño de la alternativa más idónea necesaria en la institución.

Para el día 9 de marzo de 2023, se realiza una visita para hacer seguimiento mediante la auscultación y replanteo determinar el perfil del talud, al llegar al área de la emergencia se evidencia con preocupación el aumento en el grado de inestabilidad del terreno:

- Se observa aumento de fisuras y grietas en el revestimiento del talud











Carrera 8 No.12-21 Bogotá - Tel: 313 3876020
E-mail: consorciomiagpru2022@gmail.com

- Desprendimiento seccionado del revestimiento del talud aumentando el riesgo de volcamiento del árbol



- Aumento del Flujo de agua que filtra el talud continuo y empozado en patio de juegos de niños, el empozamiento de agua puede ocasionar proliferación de enfermedades y malos olores



- Saturación del talud, evidenciada con el flujo de agua que infiltra en el talud, y la falencia funcional de los drenes que están colmatados, aumentando la presión de poros y afectando el revestimiento, acentuando el riesgo de socavación y deslizamiento.



Posteriormente, el día 10 de marzo de 2023, se presenta un evento sísmico y de acuerdo al boletín del servicio geológico de Colombia tuvo una magnitud de 5.9, cifra que en la escala de Richter representa como efecto del sismo, daños ligeros a edificios, así que teniendo en cuenta la naturaleza de la emergencia presentada en la institución educativa, Consorcio Mia GP procede a hacer una auscultación en el talud:

- Acentuación de grietas bajo la raíz del árbol en corona del talud





- Se observa que en obra contigua están realizando la construcción de muro de contención con anclajes y pilotes al talud, alrededor de 50m del talud, mientras se adelantan las actividades constructivas allí la vibración en las instalaciones del colegio se perciben con intensidad.





- El análisis del estado de avance de la obra en el predio vecino posibilita inferir que el déficit en el plan de excavación profunda el contratista del edificio adyacente desconfinó el suelo, y debido a la distancia entre el talud y dicha obra, el colegio se encuentra en zona de falla del movimiento del terreno que se genera en dicha obra.



- La planta física de la institución educativa, de acuerdo a lo informado por la rectora y coordinadora, desde los primeros meses del año 2022 han observado diferentes anomalías en los pisos, muros y exteriores del colegio:

Grietas en mampostería sala de juegos preescolar





Hundimiento en piso aula de prejardin, enchape fisurado



Dilatación en junta de enchape de piso aula prejardín



Escalonamiento en losas de concreto, dilatación en juntas.



Hundimiento de piso en aula de preescolar



Dilatación entre placa de contrapiso y columna central



Dadas las consideraciones planteadas, CONSORCIO MIA GP expone la responsabilidad que debe asignarse al contratista de la obra en el predio vecino dado que por negligencia en los procesos constructivos que exacerbaron en el grado de inestabilidad del talud en el colegio Restrepo Millán Sede C.

En respuesta al comunicado TIG-MEM-081, se solicita a interventoría no desconocer la gestión que este consorcio a realizado para la atención de la emergencia, así mismo tal como se puntualizó en el informe técnico preliminar presentado el día 11 de febrero de 2023, se recomienda una evacuación preventiva de manera inmediata en la institución, mientras se consolida la alternativa acertada de acuerdo a la emergencia a subsanar.

Anexo se entregan los informes de concepto técnico e inspección visual realizado por el residente de obra, concepto técnico del especialista estructural y el acta de la visita al colegio del día 10 de marzo de 2023.

El Consorcio Mia GP reitera su compromiso en atender las emergencias que puedan surgir durante la ejecución de la obra en referencia, pero para este caso particular ninguna obra de mitigación que el consorcio dentro de su alcance pueda realizar, estabilizará el talud que esta evidentemente afectado por las obras de construcción de un tercero.

Agradecemos la atención prestada,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Concepto técnico e inspección visual Concepto técnico del especialista estructural Acta de la visita al colegio del día 10 de marzo de 2023.
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONCEPTO TECNICO E INSPECCION VISUAL POR LLAMADO DE EMERGENCIA POR FISURAS Y ESCORRENTIAS EN EL TALUD CONTIGUO AL COLEGIO DISTRITAL RESTREPO MILLAN SEDE C

ANTECEDENTES

Al día de hoy**,** 10 de marzo del 2023, La Rectora del Colegio Marina Castelblanco informó al Arq. Mauricio Rodriguez del **CONSORCIO MIA GP,** que desde el mes de enero del 2023, el talud colindante con el colegio ya venía presentando fisuras y escorrentías de agua, pero en menor proporción, la Rectora del colegio indico, que una profesora el mes de enero hizo una medición de una fisura y esta era de 1 cm de ancho, hoy esa misma fisura tenía más de 2 cm, lo cual genero alertas entre el personal de la planta física. La Rectora manifiesta también que la infraestructura del colegio ha presentado fisuras y hundimientos en el piso del primer nivel y fisuras en el pavimento asfaltico del patio interno entre el edificio y el muro de contención en concreto que recibe el talud y que se identifican grietas en mampostería de patio de juegos de preescolar. Manifiesta que el talud el día de hoy presenta más fisuras que las que había el mes de enero, que hoy las fisuras existentes son más grandes y que el flujo y caudal del agua de escorrentía en el talud y patio interno es constante, sin importar si es invierno o verano.

La Rectora manifiesta que reportó el 27 de enero del 2023, por escrito a PLANTAS FÍSICAS e IDIGER, motivo por el cual recibió una visita por parte del Ingeniero John Jairo Dueñas de la secretaría de Educación Distrital, quien hizo una revisión del Talud.

A partir de esto, se realizó una visita por parte del área de PLANTAS FÍSICAS, Interventoría y el CONSORCIO MIA GP, haciendo una inspección de los reportado. Posterior a esto, el 15 de febrero del 2023, se realizó un análisis de suelos por parte del Contratista, quienes emitieron informe técnico preliminar a la interventoría, donde se recomendaba como medida de mitigación inicial, el cierre del tránsito peatonal interno en las áreas contiguas al talud, también se solicitó identificar las redes hidráulicas y de alcantarillado que pasan por el área de arriba de la corona del Talud.

La Rectora manifiesta que el día 24 de febrero del 2023, se acercó el funcionario David Saavedra del Acueducto, donde generó un aviso a la entidad con radicado 1001997662. A la vez, La Rectora reporta que el día 9 de marzo de 2023, se acercaron los funcionarios Miguel Ángel Turmequé y Mario Quiroz, de la Secretaría de Educación

del Distrito, realizando una observación del talud y que en una próxima visita realizarían una prueba del agua, ya que si se identificaba presencia de cloro sería competencia del Acueducto y que trasladarían la gestión con el ingeniero forestal para la evaluación de un árbol que se encuentra alrededor del muro, indicando frente a lo reportado por el colegio que no existía riesgo para la comunidad educativa.

El día 10 de marzo del 2023, el **CONSORCIO MÍA GP** pregunto al Colegio por las actas de vecindad que por proceso normativo debió realiza la obra **MACONDO DE SANTA LUCIA**, obra que está en Ejecución, en etapa de cimentación y de contención del talud con pantallas de concreto, el colegio indica que las buscarían, indicando que la obra hizo un reconocimiento inicial.

INSPECCIÓN VISUAL DEL 10 DE MARZO DEL 2023

El día 10 de marzo del 2023, La Ingeniera Yesenia Arenas y los Arquitectos Juan Camilo Cristancho y Mauricio Rodriguez del **CONSORCIO MIA GP** se presentaron al **COLEGIO DISTRITAL RESTREPO MILLAN SEDE C**, con el objeto de atender al llamado de emergencia referente a la inestabilidad del talud colindante con el colegio. Hacia el mediodía, se hizo una inspección visual del talud, evidenciando fisuras, filtraciones de agua de escorrentía, desprendimiento del concreto lanzado y un desplazamiento mínimo de dos de los árboles. Según la inspección visual en sitio, se evidencio que el talud con el tiempo puede presentar riesgo de desprendimiento y por ende presentar riesgo a la planta física del colegio y en general a la comunidad educativa. Por lo cual es necesario generar una alerta con las entidades pertinentes.

CONCEPTO TECNICO

El CONSORCIO MIA GP manifiesta a la Rectora del Colegio, que se evidencia una falla en el proceso constructivo de la obra vecina al colegio, puesto que la excavación de la cimentación y la contención del terreno con pantallas de concreto generan una expansión del terreno, que, sumado a las vibraciones de la maquinaria, pueden hacer que el talud del colegio se siga desprendiendo y desestabilizando.

Por tanto se recalca que, la inestabilidad del talud del colegio proviene de los movimientos de tierra ocasionados por la obra vecina, Así mismo como Contratista, el

CONSORCIO MIA GP, desde que se informó de la emergencia, hemos estado trabajando en la compilación de alternativas para subsanar pero el aumento de la inestabilidad del talud que se ha venido evidenciando en cada visita, alerta sobre la presunta responsabilidad de la empresa que está construyendo la obra MACONDO DE SANTA LUCIA, por tanto se recomienda a la Interventoría, solicitar a la obra la mitigación dando estabilidad al área contigua al talud del colegio, porque aunque se realice una intervención por parte nuestra al talud, ésta fallaría, dado a que se debe dar contención al terreno en la parte inferior y la obra vecina seguirá en labores y la afectación aumentará directamente proporcionar al movimiento de tierras que ellos generen allí.

RECOMENDACIONES

1. Activar el sistema Distrital de gestión de riesgo y Cambio climático atreves de la línea 123, con el fin de reportar la emergencia por amenaza de deslizamiento de talud y proceso de remoción en masa en el **COLEGIO DISTRITAL RESTREPO MILLAN SEDE C,** además, reportar que se presenta alta vulnerabilidad por ser un colegio con amplia población de niños y niñas, eventos de aglomeración de público entre otros, que se encuentran expuestos a riesgos por factores amenazantes de tipo geológico que se pueden ver incrementados por la intensidad de lluvias y los efectos antes mencionados de la obra MACONDO DE SANTA LUCIA que realiza obras afectando la estabilidad del talud del colegio. Esto con el fin de que se cree el número de eventos SIRE por parte del IDIGER, la urgente visita técnica y acta. Con la cual se puede realizar el adecuado seguimiento a las recomendaciones de reducción de riesgos, que, en este caso, se considera, deben tener medidas de prevención con la evacuación de la comunidad educativa y medidas de mitigación con relación a las afectaciones de la infraestructura y el talud.
2. Notificar de manera formal a la Secretaría de Educación y al Consejo local de gestión del Riesgo y cambio Climático, en especial a la secretaria técnica a cargo del IDIGER y a la Alcaldía Local y el DILE, la situación de riesgo en la que se encuentra la comunidad educativa del Colegio, con el fin de que las entidades competentes incluyan este predio en los monitoreos y seguimientos a puntos críticos por condiciones de riesgos de la localidad.

3. De acuerdo con el recorrido e inspección visual del día de hoy 10 de marzo del 2023 por parte del **CONSORCIO MIA GP**, que se encuentra adelantando obras de adecuación, mantenimiento y mejoramiento, se recomienda la **EVACUACIÓN INMEDIATA** del **COLEGIO DISTRITAL RESTREPO MILLAN SEDE C**, mientras las entidades competentes generan la evaluación y análisis del riesgo actual, que se ha visto incrementado por la temporada de lluvias y la afectación de la obra en construcción vecina al colegio.
4. En caso tal de no dar alcance a las dos primeras recomendaciones, Se sugiere apelar a las pólizas de estabilidad por afectación a terceros de la obra MACONDO DE SANTA LUCIA que toda obra normativamente debe tener.

INFORME TECNICO,



Arq Mauricio Rodriguez Muñoz
CONSORCIO MIA GP
MP: A25012003-79715893

	CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022 - ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

ANEXO 1 CONCEPTO TECNICO ASESOR ESTRUCTURAL CONSORCIO MIA GP

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE

TALUD EN EL COLEGIO RESTREPO MILLÁN

AUTOR:

GEOVANNY ALEXANDER CASTAÑO CASTAÑO

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

MAT. 05202-275557 ANT

FIRMA:



PRESENTADO A:

LUISA FERNANDA PROAÑOS

BOGOTÁ DC

10 MARZO 2023

1. POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA

1.1 Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), El sismo de magnitud 6 en la escala de Richter se presentó en el departamento de Santander, municipio Los Santos.



Imagen 1. Localización del sismo de magnitud 6 en la escala de Richter hoy a las 4:30am

1.2 Según el IDEAM y el registro de precipitaciones de la presente semana, Bogotá está en temporada de lluvias.



Imagen 2. Lluvias durante toda la semana en Bogotá acompañado de tormentas eléctricas

1.3 Según se muestra en las imágenes 3 y 4, encima del talud se encuentra el cerramiento que separa al colegio de la vía de tránsito vehicular. Ocasionalmente pueden pasar vehículos muy pesados como el carro de la basura, volquetas, camiones, buses etc.



Imagen 3. Vía que pasa al frente del colegio encima del talud



Imagen 4. Vista del talud internamente que da apoyo al cerramiento y la vía


10 mar. 2023 0:00:59 a. m.
Avenida Caracas
Bogotá, 11821
Colegio Restrepo Millán sede C


10 mar. 2023 10:00:59 a. m.
Avenida Caracas
Bogotá, 11821
Colegio Restrepo Millán sede C



Imagen 5. Vista del talud del colegio y de la propiedad contigua.



Imagen 6. Técnica de estabilización de talud mediante muro anclado.

Se observa personal trabajando en la perforación de anclajes y en el armado de muros

1.4 Posibles causas de los problemas de estabilidad del talud

Luego de analizar los ítems 1.1 a 1.3 se puede inferir el siguiente panorama crítico:

1. El sismo que ocurrió en la mañana produjo un movimiento leve de tierras.
2. Bogotá está en una temporada invernal en donde se presentan fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas. El talud tiene un mal manejo tanto del agua de escorrentía (no hay cunetas en la corona) como subterránea (desagües tapados). Lo único que tenía era un champeado con mezcla de concreto el cual se ha ido erosionando, así como el propio talud.
3. Lo anterior puede desencadenar en la inestabilidad del talud y producir un deslizamiento del talud sobre el colegio
4. Por último, cabe mencionar que la evolución de la inestabilidad del talud **PUDO** haber sido ocasionado directamente proporcional al avance de la obra vecina, la cual no está a más de 50m del colegio. cómo se puede ver en la imagen 7 que muestra la obra desde dos puntos de vista diferentes.



Imagen 7. Avance del muro de contención de la obra vecina

2 EFECTOS DEL PROBLEMA SOBRE EL COLEGIO

2.1. Se nota el agua subterránea que lleva el talud por la escorrentía que se ve en las fotos,



Imagen 8. Flujo continuo de agua

El flujo continuo de agua y empozamiento en el patio representa además, un riesgo biológico a la población estudiantil por la proliferación de enfermedades.

2.2. Se nota que el árbol se ha desprendido un poco desde su raíz.



Imagen 9. Desprendimiento de raiz y parte de talud

2.3. Se nota agua sobresaliendo del talud como si tuviera agua represada.



Imagen 10. Flujo continuo de agua

2.4. Se nota que la columna de mampostería se ha desprendido de la cubierta y se ha producido un asentamiento del terreno.



Imagen 11. Asentamiento de columna de mampostería

2.5. Se nota que el revestimiento del talud está más fisurado que antes y el cambio ha sido notorio en los últimos días según las observaciones de la inspectora de Obra del consorcio Mia GP, Yesenia Arenas



Imagen 12. Mayor cantidad de grietas en el revestimiento

2.6. Se notan más las dilataciones en los pisos de salones y de patio



Imagen 13. Se notan dilataciones notorias en la baldosa y pisos en concreto

2.7. Se notan más las dilataciones en los muros de mampostería



Imagen 14. Se notan fisuras diagonales en los muros de mampostería



Imagen 15. Se notan fisuras diagonales en los muros de mampostería

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. **Evacuar preventivamente la institución**. Tómese como una alerta temprana



3.2 Realizar un estudio de suelos que presente la mejor alternativa de estabilidad del talud

Presentar una posible reclamación al proyecto vecino por los inconvenientes aquí manifestados en el colegio si dentro del estudio de suelos el profesional de geotecnia manifiesta que pudo haber causado la inestabilidad del terreno talud del colegio o si es una consecuencia por haberse construido en dicho lugar debajo del talud sin ningún sistema de estabilidad de talud

3.3 Realizar tala de árboles que están en la cima con alta probabilidad de caer. A pesar de que sirve de agarre del terreno presentan riesgo de caída cuando pierden resistencia. Evaluar ambientalmente dicha posibilidad.

3.4 Para verificar la información aquí presentada se recomienda a la secretaría de educación consultar las actas de vecindad del proyecto vecino para contrastar con el registro fotográfico del estado en que se encontraba el colegio.

BOGOTÁ

COLEGIO RESTREPO MILLAN IED

"FORMACIÓN DEL CIUDADANO MEDIANTE EL DESARROLLO DE VALORES, CON ESPÍRITU DEMOCRÁTICO, ACADÉMICO Y HUMANÍSTICO"

ACTA DE REUNIÓN. Nº 001

Código	CP-001	Fecha	10-03-2023	Inicio	10:00 a.m.	Fin	1:00pm	Lugar	SEDE C – EL PESEBRE
Área	COORDINACIÓN					Asunto	TALUD, REVISIÓN TERRENO		
Asistentes	Rectora (E) Marina Castelblanco Coordinadora (E) Lizeth Sanabria					Asistentes Externos	Yesenia Arenas		
Fecha de Elaboración	10-03-2023	Elaborado por	Yesenia Arenas				Próxima Reunión		

AGENDA DEL DÍA

1. Saludo
2. Revisión y evaluación del terreno
3. Cierre

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Saludo.

   Se inicia reunión

2. Revisión

   Personal del Consorcio MIA GP se presenta el día 10 de marzo con el objeto de hacer una revisión de la inestabilidad observable en el talud tras el sismo presentado el día de hoy 10-03-2023, tomando registro fotográfico y fílmico.

   La institución manifiesta que en la plantas físicas del colegio desde enero de 2023 han empezado a presentar fisuras y hundimientos en pisos, se procede a realizar recorrido por las instalaciones de la institución evidenciando en el primer nivel fisuras en el piso, hundimientos, grietas en el pavimento asfáltico del patio exterior entre el edificio y el talud, Se evidencian grietas en mampostería de patio de juegos de preescolar, el flujo de agua que se filtra en el talud es constante, se evidencia grietas en el talud que no se habían observado en anteriores visitas y dilatación de las ya identificadas, además del riesgo de volcamiento de dos arboles que están la corona y parte central del talud.

La institución manifiesta que reportó el caso el 27 de enero del año en curso a las diferentes entidades correspondientes(plantas físicas e IDIGER), frente a lo cual el día 30 de enero hubo una visita por parte de un ingeniero de la SED (Jhon Jairo Dueñas) quien hizo una revisión del talud, a partir de esto se realiza una visita por parte del área de plantas físicas, interventoría y consorcio Mia GP haciendo una inspección de lo reportado, posterior a esto el 15 de febrero se realizó un ensayo de suelos por parte de contratista, quienes emitieron un informe técnico preliminar a interventoría en donde se exponía como mitigación inicial el cierre al transito peatonal en las áreas contiguas al talud, se solicitó identificar las redes hidráulicas y de alcantarillado que pasan por el área de arriba de la corona del talud.

La institución expone que el día 24 de febrero se acercó un funcionario (David Saavedra) de Acueducto generando un aviso en la entidad con radicado 1001997662. La institución reporta que el día 9 de marzo de 2023 se acercan dos funcionarios (Miguel Angel Turmequé, Mario Quiroz) de la SED realizando una observación del terreno mencionando que en una próxima visita realizarían una prueba del agua ya que si se identifica presencia de cloro sería competencia del acueducto y que trasladarían la gestión con el ingeniero forestal para la evaluación de un árbol que se encuentra alrededor del muro, indicando frente a lo reportado por la institución que no existe riesgo para la comunidad educativa.

Consorcio MIA GP pregunta a la institución por las actas de vecindad, y el colegio indica que las buscarían ya que la obra hizo un reconocimiento inicial.

En el sentido de las consideraciones presentadas, Consorcio Mia GP manifiesta a Rectoría que se evidencia una falencia en el proceso constructivo de la obra contigua al colegio, puesto que dada la excavación y contención que están ejecutando generan una expansión del terreno y dado que el colegio está en la zona de falla se presenta la afectación encontrada, por tanto, se recalca que la inestabilidad del talud en el colegio proviene de los movimientos de tierra ocasionados por la obra vecina, así mismo, como contratista desde que se nos informó de la emergencia hemos estado trabajando en la compilación de alternativas para subsanar, pero el aumento en el grado de inestabilidad evidenciado en cada visita alerta sobre la presunta responsabilidad de la empresa que está construyendo al lado, por tanto se recomienda a la institución solicitar a la obra la mitigación dando estabilidad al área contigua al talud del colegio, pues aunque se realice una intervención al talud, esta fallará dado a que se debe dar contención al terreno en la parte inferior y la obra seguirá en labores, la afectación aumentara directamente proporcional al movimiento de tierras que generan allí. Se sugiere apelar a las pólizas de estabilidad por afectación a terceros que toda obra debe tener.

Consorcio Mia GP recomienda una evacuación preventiva de la institución de manera inmediata hasta que se consolide una ruta de intervención y subsanación para la estabilidad que requiere el talud cuyo grado de inestabilidad aumenta rápidamente en la medida de avance de las labores constructivas de la obra contigua.

3. Cierre

En constancia se firma a las _____ horas

Nombre: Mario Polanco Quiroz
Cargo: Director Interventoría – Residente SST Consorcio MIA GP

Nombre: Yeraldo Villota
Cargo: DILE 18

Nombre: Yeraldy Arenas Arias
Cargo: Inspectora obra Consorcio MIA GP

Nombre: Liseth Salamanca
Cargo: Coordinadora (E)

Nombre: Mario Castellanos
Cargo: Rector

Nombre: _____
Cargo: _____

CONSORCIO TIG

TIG-MEM-091

Bogotá, D.C, marzo 17 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atn: ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4155718 INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 8

ASUNTO: ALCANCE SOLICITUD DE ADICIÓN PRESUPUESTAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.4077645 CONSORCIO MIA GP

Respetados señores:

Dando alcance al comunicado 2023_RUU_MGP_091 por medio del cual, el CONSORCIO MIA GP de acuerdo con la asignación de recursos adicionales por parte de la Secretaría de Educación Distrital a los contratistas de obra objeto de vigilancia, envió solicitud de adición al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.4155718 y, de acuerdo a su solicitud, nos permitimos dar las siguientes claridades:

1. Mediante licitación pública de infraestructura social No. SED-LP-DCCEE-039-2022 publicada en la plataforma SECOP II, se adelantó el proceso de selección que tenía por objeto “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.”

2. Una vez surtido el proceso de selección, se adjudicó el **GRUPO 8** al proponente CONSORCIO MIA GP, identificado con N.I.T: 901634703-9, representado legalmente por MATEO LUZARDO VILLAMIZAR, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de once (11) MESES, y un valor inicial de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($11.941.262.150,00) incluido A.I.U. y el **GRUPO 8** al proponente de interventoría CONSORCIO TIG, identificado con N.I.T: 901649890-3, representado legalmente por EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, cuya adjudicación comprende un plazo inicial de ejecución de doce (12) MESES, y un valor inicial de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($878.587.938) incluido A.I.U.

3. El día 03 de enero de 2023, una vez cumplidos los requisitos legales para el perfeccionamiento de los contratos No. CO1.PCCNTR.4155718 (Grupo 8) de interventoría y el día 20 de enero de 2023 No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de obra, se procedió a la suscripción de las actas de inicio de los mismos.

4. El alcance inicial abarcaba la intervención de diecisiete (17) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8).

5. En el mes de marzo de 2023, una vez analizadas las circunstancias del caso, las partes, de mutuo acuerdo, y a solicitud de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito (SED) de mejorar la infraestructura educativa de acuerdo a los recursos que serán invertidos en mantenimientos programados a los ocho (8) colegios adicionales. Surge la necesidad del Modificatorio adición No. 1 bajo el entendido que el alcance del objeto del Contrato de Obra, conlleva acometer actividades de ADECUACIÓN, y atención de REQUERIMIENTOS y NECESIDADES para la prestación del servicio educativo y ante la necesidad de intervención de las obras requeridas en las I.E.D., así como la ejecución eficiente de los recursos asignados por el FOME y los recursos propios de la entidad para el cumplimiento de los propósitos para los que fueron gestionados; y en acatamiento de los principios de planeación, eficiencia, economía, responsabilidad habida consideración que se cuenta con la oportunidad necesaria para la ejecución de los mismos.

6. Dicho lo anterior, el Modificatorio adición No. 01 del contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8) de 2022, considera una adición de CINCO MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 5.050.000.000) la cual no genera solicitud prorroga y se mantiene bajo los plazos contractuales.

7. En tal sentido, el plazo contractual actualizado para el contrato de obra objeto de vigilancia, será de ONCE (11) MESES, es decir que el plazo se mantendrá de acuerdo a lo establecido y la finalización del contrato será para el 19 de diciembre de 2023.

8. El alcance actualizado según modificación adición No. 01 comprenderá la intervención adicional de ocho (08) frentes de obra para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 (Grupo 8).

De acuerdo con lo anterior y, considerando que el contrato de referencia no a surtido proceso de modificación No. 01 y, bajo la consideración que entre el Contrato de Interventoría y el Contrato de Obra objeto de vigilancia se configura una coligación negocial que implica que las modificaciones realizadas sobre las condiciones de ejecución del contrato supervisado impacten de manera sustancial el alcance y condiciones del contrato de interventoría, de tal forma que deban ser ajustados de manera homogénea garantizando el equilibrio contractual y cumplimiento de la finalidad del contrato en óptimas condiciones, ajustándose el contrato de interventoría a las nuevas necesidades del contrato que le da origen, y de acuerdo a la solicitud realizada por la entidad, nos permitimos dar algunas claridades relacionadas con el alcance dado a la Modificación adición No 1.

1. ALCANCE MODIFICACIÓN NO. 1 – GRUPO DE OBRA No. 8

El contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077645 correspondiente al grupo No. 8, dentro del alcance actual abarca la ejecución de diecisiete (17) frentes de obra, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

GRUPO 8 RAFAEL URIBE URIBE				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALEXANDER FLEMING	B	ANTONIO RICAURTE
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A	A	LOS CHIRCALES
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE	B	EL MIRADOR
4	RAFAEL URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY	B	DIANA TURBAY II
5	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	B	MANUEL MURILLO TORO
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA	A	ENRIQUE OLAYA HERRERA
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSE MARTI	A	LUIS LOPEZ DE MESA
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO JOSE MARTI	C	GRANJAS DE SAN PABLO


9	RAFAEL URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	A	LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO
10	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A	A	MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ
11	RAFAEL URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B	B	REPUBLICA DE ISRAEL
12	RAFAEL URIBE	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO	A	GENERAL PAEZ
13	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	A	REINO DE HOLANDA
14	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	B	ISABEL II DE INGLATERRA
15	RAFAEL URIBE	COLEGIO RESTREPO MILLÁN	D	GABRIELA MISTRAL
16	RAFAEL URIBE	COLEGIO SAN AGUSTÍN	A	SAN AGUSTÍN
17	RAFAEL URIBE	COLEGIO EL LIBERTADOR	C	JUAN DEL RIZO

Es importante precisar, que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el alcance que se defina, ya que se trata de un fondo específico que se utilizará para temas relacionados con los colegios expuestos anteriormente, tal y como se establece en el contrato inicial.

	PRESUPUESTO	INICIO	FIN	No. FRENTES
INICIAL	$11,941,262,150.00	20-ene-23	19-dic-23	17
MODIFICACIÓN NO. 1	$ 5,050,000,000.00	15-abr-23	19-dic-23	8
TOTAL	$16,991,262,150.00	20-ene-23	19-dic-23	25

A continuación, se muestra el cronograma de ejecución de los diferentes frentes de obra, discriminados por frentes contractuales y frentes adición No. 01, en donde se muestra el porcentaje de ejecución, y las fechas de inicio y fin de cada actividad, de acuerdo con el cronograma planteado por el contratista de obra.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8**	**238 días**	**vie 20/01/23**	**mar 19/12/23**
2	ACTA DE INICIO DE OBRA	0 días	vie 20/01/23	vie 20/01/23
3	**MANTENIMIENTO PROGRAMADO**	**223 días**	**vie 10/02/23**	**mar 19/12/23**
4	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	67 días	lun 13/03/23	mar 13/06/23
5	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	56 días	mié 01/03/23	mié 17/05/23
6	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	120 días	lun 05/06/23	vie 17/11/23
7	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	110 días	vie 10/02/23	jue 13/07/23
8	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	120 días	lun 12/06/23	vie 24/11/23
9	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	87 días	lun 20/02/23	mar 20/06/23
10	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	87 días	mié 15/02/23	jue 15/06/23
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABL	120 días	lun 19/06/23	vie 01/12/23
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	47 días	lun 27/02/23	mar 02/05/23
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	120 días	lun 26/06/23	vie 08/12/23
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	120 días	lun 03/07/23	vie 15/12/23
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	117 días	lun 10/07/23	mar 19/12/23
16	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOL	87 días	lun 20/02/23	mar 20/06/23
17	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE ING	87 días	mar 14/02/23	mié 14/06/23
18	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTI	90 días	lun 17/07/23	vie 17/11/23
19	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	87 días	jue 16/02/23	vie 16/06/23
20	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	90 días	lun 24/07/23	vie 24/11/23
21	**MODIFICATORIO ADICION DE RECURSOS**	**0 días**	**lun 20/03/23**	**lun 20/03/23**
22	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	120 días	lun 27/03/23	vie 08/09/23
23	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	120 días	lun 22/05/23	vie 03/11/23
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	120 días	lun 10/04/23	vie 22/09/23
25	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	120 días	lun 05/06/23	vie 17/11/23
26	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	120 días	lun 24/04/23	vie 06/10/23
27	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	120 días	lun 19/06/23	vie 01/12/23
28	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A	120 días	lun 08/05/23	vie 20/10/23
29	PRESUPUESTO COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	122 días	lun 03/07/23	mar 19/12/23

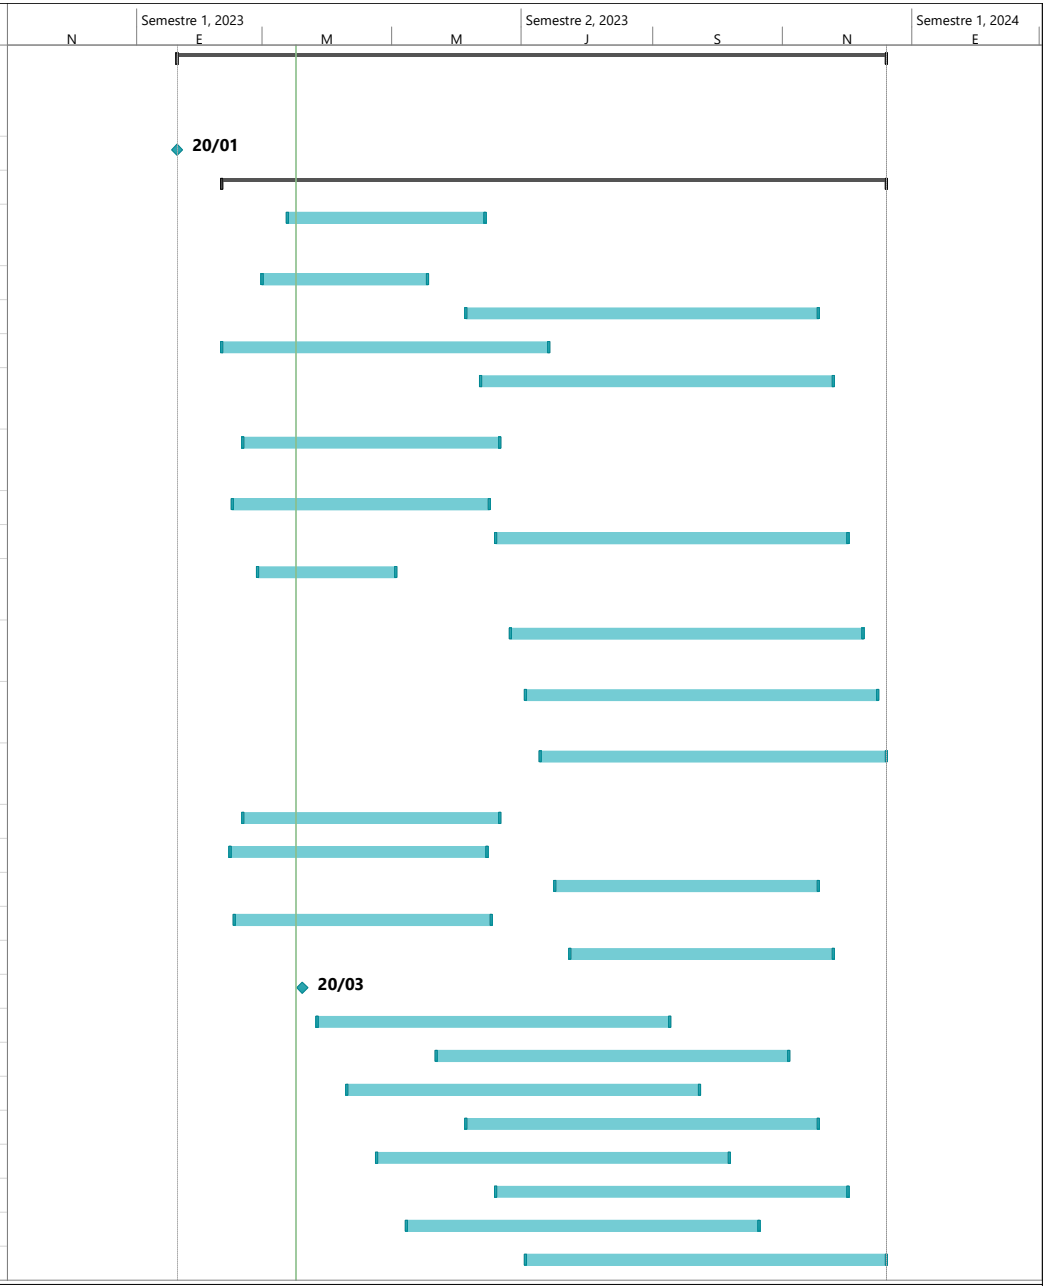

Proyecto: Programacion para a
Fecha: vie 17/03/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

1.1. Alcances frentes adicionales – Modificación No. 1 Grupo 8

Las instituciones educativas por intervenir dentro del alcance de la modificación No. 1 para el grupo de obra No. 8, se componen de ocho (08) instituciones educativas, relacionadas así:

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B	$ 304,703,052
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A	$ 656,544,890
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	B	$ 339,352,709
4	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 2,027,739,816
5	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS		$ 455,893,410
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	B	$ 335,852,053
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	A	$ 502,836,423
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		$ 427,077,647
				$ 5,050,000,000

Los alcances definidos para cada una de las instituciones a intervenirse muestran a continuación:

- **COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B**

Esta institución requiere mantenimiento preventivo y correctivo a cubiertas tanto plana como en tipo sándwich, en las zonas exteriores, específicamente en canchas se requiere la reparación de fisuras y mantenimiento de pintura sobre cancha deportiva. En cubierta plana se requiere mejorar los niveles de pendiente ya que actualmente se presentan empozamientos, para ello se realizará picado y retiro de membrana, se realizará alistado de pisos mejorando la pendiente y posteriormente se instalará manto asfaltico para una correcta impermeabilización. Sobre cubierta tipo sándwich se contempla el remplazo de piezas como flanches y caballetes y reparación de filtraciones. Los bajantes y canales serán objeto de limpieza y mantenimiento. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

- **COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A**

La intervención contempla la intervención completa del cerramiento, esto incluye el desmonte del cerramiento en mal estado, posterior a ello se realizará las excavaciones necesarias para la realización de la nueva cimentación y posterior instalación de cerramiento. También se incluye cambio del portón de ingreso principal. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

- **COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B**

Esta institución requiere mantenimiento preventivo y correctivo a cubiertas tanto plana como en tipo sándwich. Estas actividades contemplan el remplazo de piezas como flanches y caballetes en cubierta tipo sándwich y reparación de filtraciones. En cubierta plana se requiere mejorar los niveles de pendiente ya que actualmente se presentan empozamientos, para ello se realizará picado y retiro de membrana, se realizará alistado de pisos mejorando la pendiente y posteriormente se instalará manto asfaltico para una correcta impermeabilización. Los bajantes y canales serán objeto de limpieza y mantenimiento. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

- **FE Y ALEGRÍA PALERMO SUR**

Se realizará intervención total a uno de los dos bloques existentes. Estas adecuaciones incluyen en zonas exteriores la realización de poda y urbanismo. Debido al estado de abandono de la edificación se requiere intervención en general. Se contempla cambio de cubierta junto con el respectivo desalojo de residuos especiales. Se verificará el estado de la estructura actual y se realizará refuerzos y remplazos donde sea necesario además de pintura para un acabado uniforme entre estructura actual y nueva. Se debe verificar el estado de redes eléctricas e hidrosanitarias y su correspondiente remplazo. Cambio total de carpintería metálica. Los baños requieren cambio de enchapes, instalación de lavamanos y cambio de aparatos sanitarios. Toda la edificación requiere pañetes y pintura en general. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

- **FE Y ALEGRÍA LOS NARANJOS**

Se realizará remplazo de cubierta debido a que las actuales tejas son en asbesto cemento y pueden causar daños a la salud. Para la ejecución de estas actividades se requiriere el cerramiento en lona para el aislamiento de las áreas a intervenir. Se realizará el desmonte de la teja actual junto con su correspondiente tratamiento. Se verificará el estado de la estructura actual y se realizará refuerzos y remplazos donde sea necesario además de pintura para un acabado uniforme entre estructura actual y nueva. La teja con la cual ser remplazará la cubierta será tipo sándwich con sus respectivos caballetes. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

- **COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B**

La intervención solicitada se enfoca en bloque de aulas y bloque administrativo. Se contempla el cambio de cubiertas actuales por tejas tipo sándwich en aulas y en pasillos por teja traslucidas, esta intervención incluye remplazo de canales y bajantes de aguas lluvias. En el acceso al colegio se debe realizar una rampa de acceso para personas con movilidad reducida. En zonas exteriores se realizará el mantenimiento de la pintura de la cancha deportiva.

- **COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A**

Se realizará mantenimiento a estructura existente y construcción de tarima. Para la ejecución de las obras se requiere cerramiento en lona para aislar a los espacios. Para construcción de tarima se requiere excavaciones y construcción de estructura en concreto, la cual comprende zapatas, vigas y placa de contrapiso. El segundo frente consiste en la impermeabilización de la estructura, cambio de redes eléctricas a nivel de cubierta, pañetes y pinturas. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

- **COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM**

Se realizará la instalación de manto asfaltico para impermeabilización de cubierta. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

De acuerdo a este contexto, esta Interventoría manifiesta su aprobación y recomienda su aprobación por parte de la Secretaría de Educación del Distrito a la solicitud de adición presupuestal realizada por el contratista de obra Consorcio MIA GP contrato No. CO1.PCCNTR.4077645 de 2022, por valor de Cinco Mil Cincuenta Millones de Pesos M/C ($5.050.000.00). El alcance de cada una de las obras a realizar en dichos colegios ha sido definido mediante visitas a campo realizadas por personal de la interventoría y de la Secretaría de Educación del Distrito, por lo que se cuenta con la debida justificación y memorias de cálculo respectivas, cabe resaltar que el presupuesto de las actividades de obra puede variar según el alcance que se defina, ya que se trata de un fondo específico que se utilizará para temas relacionados con los colegios expuestos anteriormente, tal y como se establece en el contrato inicial, adicionalmente la adición presupuestal no implica una solicitud de prórroga del plazo contractual, por lo que el plazo se mantendrá en 11 meses y la finalización del contrato de obra para el 19 de diciembre de 2023.

CONSORCIO TIG

cordialmente,



Pamela Beltrán
Tel: 3057847825
Directora interventoría
CONSORCIO TIG

CC. Arq. Alexander Osorio Páez Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
CC. Mateo Luzardo Villamizar R.L Consorcio MIA GP
CC. Arq. Hugo Tibaquirá Apoyo supervisión Interventoría Grupo 8
Anexo comunicado: 2023_RUU_MGP_091

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_091

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud adición presupuestal al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el **Consorcio MIA GP** solicita la adición presupuestal al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 por valor de Cinco Mil Cincuenta Millones de Pesos M/C ($ 5.050.000.000) , recursos que serán invertidos en mantenimientos programados a colegios del grupo No 8 de la siguiente manera:


No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B	$ 304.703.052
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A	$ 656.544.890
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	B	$ 339.352.709
4	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$ 2.027.739.816
5	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS		$ 455.893.410
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	B	$ 335.852.053
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	A	$ 502.836.423
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		$ 427.077.647
			TOTAL	**$ 5.050.000.000**

Esta solicitud surge de la necesidad de la Secretaria de Educación del Distrito de mejorar la infraestructura educativa. El alcance de cada uno de los frentes se definió mediante visitas a campo con personal de interventoría y personal de la SED, la primera de las visitas se realizó el día miércoles 22 de febrero de 2023 en el colegio Fe y Alegría y seguidamente se realizaron las demás visitas, producto de las cuales, anexo al presente documento se entrega los presupuestos estimados, junto con sus respectivas memorias de cálculo para las obras de mantenimiento de las instituciones previamente mencionadas.

Actualmente el contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 cuenta con una totalidad de 17 colegios a intervenir con un recurso total por Once Mil Setenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Veintidós Mil Pesos M/C ($ 11.078.776.222) y Ochocientos Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/C ($ 862.485.928). El plazo contractual es de 11 meses contados a partir del acta de inicio de obra la cual se firmó el pasado 20 de febrero de 2023 y la finalización esa planeada para el 19 de diciembre de 2023.

La presente solicitud de adición presupuestal no genera solicitud prorroga, es decir que el plazo se mantendrá en 11 meses y la finalización del contrato para el 19 de diciembre de 2023.

A continuación presentamos la programación estimada para las 25 instituciones.

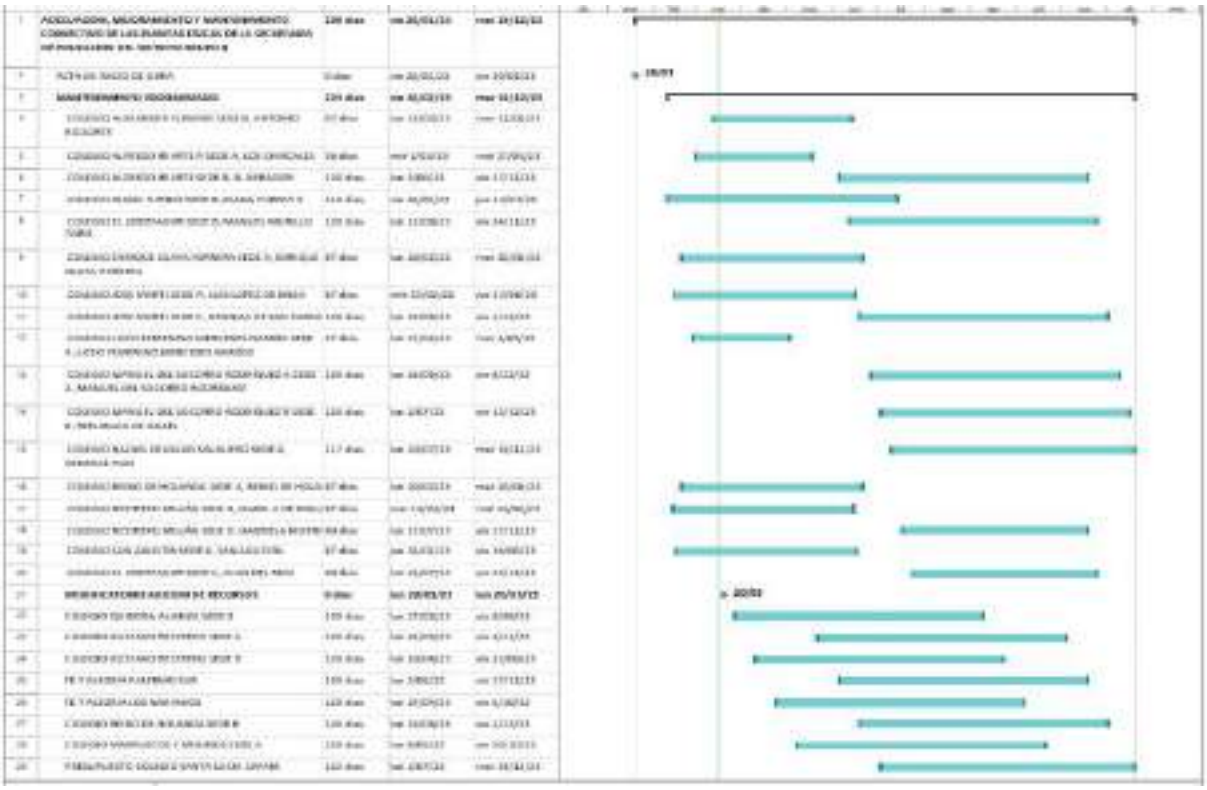

Alcances Frentes Adicionales – Grupo 8

Mediante la presente solicitud se plantea la adición de 8 sedes, la cuales son:

- Colegio Quiroga Alianza Sede B
- Colegio Gustavo Restrepo Sede A
- Colegio Gustavo Restrepo Sede B
- Fe Y Alegria Palermo Sur
- Fe Y Alegria Los Naranjos
- Colegio Reino De Holanda Sede B
- Colegio Marruecos Y Molinos Sede A
- Colegio Santa Lucia CAFAM

Los alcances definidos para cada una de las institucione se describen a continuación:

1. Colegio Quiroga Alianza Sede B

   Esta institución requiere mantenimiento preventivo y correctivo a cubiertas tanto plana como en tipo sándwich, en las zonas exteriores, específicamente en canchas se requiere la reparación de fisuras y mantenimiento de pintura sobre cancha deportiva. En cubierta plana se requiere mejorar los niveles de pendiente ya que actualmente se presentan empozamientos, para ello se realizará picado y retiro de membrana, se realizará alistado de pisos mejorando la pendiente y posteriormente se instalará manto asfaltico para una correcta impermeabilización. Sobre cubierta tipo sándwich se contempla el remplazo de piezas como flanches y caballetes y reparación de filtraciones. Los bajantes y canales serán objeto de limpieza y mantenimiento. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

2. Colegio Gustavo Restrepo Sede A

   La intervención contempla la intervención completa del cerramiento, esto incluye el desmonte del cerramiento en mal estado, posterior a ello se realizará las excavaciones necesarias para la realización de la nueva cimentación y posterior instalación de cerramiento. También se incluye cambio del portón de ingreso principal. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

3. Colegio Gustavo Restrepo Sede B

   Esta institución requiere mantenimiento preventivo y correctivo a cubiertas tanto plana como en tipo sándwich. Estas actividades contemplan el remplazo de piezas como flanches y caballetes en cubierta tipo sándwich y reparación de filtraciones. En cubierta plana se requiere mejorar los niveles de pendiente ya que actualmente se presentan empozamientos, para ello se realizará picado y retiro de membrana, se realizará alistado

de pisos mejorando la pendiente y posteriormente se instalará manto asfaltico para una correcta impermeabilización. Los bajantes y canales serán objeto de limpieza y mantenimiento. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

4. Fe y Alegría Palermo Sur

Se realizará intervención total a uno de los dos bloques existentes. Estas adecuaciones incluyen en zonas exteriores la realización de poda y urbanismo. Debido al estado de abandono de la edificación se requiere intervención en general. Se contempla cambio de cubierta junto con el respectivo desalojo de residuos especiales. Se verificará el estado de la estructura actual y se realizará refuerzos y remplazos donde sea necesario además de pintura para un acabado uniforme entre estructura actual y nueva. Se debe verificar el estado de redes eléctricas e hidrosanitarias y su correspondiente remplazo. Cambio total de carpintería metálica. Los baños requieren cambio de enchapes, instalación de lavamanos y cambio de aparatos sanitarios. Toda la edificación requiere pañetes y pintura en general. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

5. Fe y Alegría Los Naranjos

Se realizará remplazo de cubierta debido a que las actuales tejas son en asbesto cemento y pueden causar daños a la salud. Para la ejecución de estas actividades se requiriere el cerramiento en lona para el aislamiento de las áreas a intervenir. Se realizará el desmonte de la teja actual junto con su correspondiente tratamiento. Se verificará el estado de la estructura actual y se realizará refuerzos y remplazos donde sea necesario además de pintura para un acabado uniforme entre estructura actual y nueva. La teja con la cual ser remplazará la cubierta será tipo sándwich con sus respectivos caballetes. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

6. Colegio Reino De Holanda Sede B

La intervención solicitada se enfoca en bloque de aulas y bloque administrativo. Se contempla el cambio de cubiertas actuales por tejas tipo sándwich en aulas y en pasillos por teja traslucidas, esta intervención incluye remplazo de canales y bajantes de aguas lluvias. En el acceso al colegio se debe realizar una rampa de acceso para personas con movilidad reducida. En zonas exteriores se realizará el mantenimiento de la pintura de la cancha deportiva.

7. Colegio Marruecos Y Molinos Sede A


Se realizará mantenimiento a estructura existente y construcción de tarima. Para la ejecución de las obras se requiere cerramiento en lona para aislar a los espacios. Para construcción de tarima se requiere excavaciones y construcción de estructura en concreto, la cual comprende zapatas, vigas y placa de contrapiso. El segundo frente consiste en la impermeabilización de la estructura, cambio de redes eléctricas a nivel de cubierta,

pañetes y pinturas. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

8. Colegio Santa Lucia Cafam

Se realizará la instalación de manto asfaltico para impermeabilización de cubierta. Al finalizar la obra se realizará aseo general final y limpieza de las zonas intervenidas.

Sin otro particular, agradecemos su gestión y apoyo,



MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto general adición (8 colegios) Programación de obra (25 colegios) Presupuestos colegios adición (8 colegios) Memorias colegios (8 colegios)
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá


CONSORCIO MIA GP

GRUPO 8 RAFAEL URIBE URIBE

PRESUPUESTO ADICIONAL POR SEDES

No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PRESUPUESTO	
1	RAFAEL URIBE	COLEGIO QUIROGA ALIANZA	B	$	304.703.052
2	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	A	$	656.544.890
3	RAFAEL URIBE	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO	B	$	339.352.709
4	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR		$	2.027.739.816
5	RAFAEL URIBE	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS		$	455.893.410
6	RAFAEL URIBE	COLEGIO REINO DE HOLANDA	B	$	335.852.053
7	RAFAEL URIBE	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS	A	$	502.836.423
8	RAFAEL URIBE	COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM		$	427.077.647
			TOTAL	**$**	**5.050.000.000**

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO GRUPO 8**	**238 días**	**vie 20/01/23**	**mar 19/12/23**
2	ACTA DE INICIO DE OBRA	0 días	vie 20/01/23	vie 20/01/23
3	**MANTENIMIENTO PROGRAMADO**	**223 días**	**vie 10/02/23**	**mar 19/12/23**
4	COLEGIO ALEXANDER FLEMING SEDE B, ANTONIO RICAURTE	67 días	lun 13/03/23	mar 13/06/23
5	COLEGIO ALFREDO IRIARTE A SEDE A, LOS CHIRCALES	56 días	mié 1/03/23	mié 17/05/23
6	COLEGIO ALFREDO IRIARTE SEDE B, EL MIRADOR	120 días	lun 5/06/23	vie 17/11/23
7	COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II	110 días	vie 10/02/23	jue 13/07/23
8	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE B, MANUEL MURILLO TORO	120 días	lun 12/06/23	vie 24/11/23
9	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A, ENRIQUE OLAYA HERRERA	87 días	lun 20/02/23	mar 20/06/23
10	COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA	87 días	mié 15/02/23	jue 15/06/23
11	COLEGIO JOSE MARTI SEDE C, GRANJAS DE SAN PABLO	120 días	lun 19/06/23	vie 1/12/23
12	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO SEDE A, LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	47 días	lun 27/02/23	mar 2/05/23
13	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ A SEDE A, MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ	120 días	lun 26/06/23	vie 8/12/23
14	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ B SEDE B, REPUBLICA DE ISRAEL	120 días	lun 3/07/23	vie 15/12/23
15	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO SEDE A, GENERAL PAEZ	117 días	lun 10/07/23	mar 19/12/23
16	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE A, REINO DE HOLAI	87 días	lun 20/02/23	mar 20/06/23
17	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLA	87 días	mar 14/02/23	mié 14/06/23
18	COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE D, GABRIELA MISTRA	90 días	lun 17/07/23	vie 17/11/23
19	COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN	87 días	jue 16/02/23	vie 16/06/23
20	COLEGIO EL LIBERTADOR SEDE C, JUAN DEL RIZO	90 días	lun 24/07/23	vie 24/11/23
21	**MODIFICATORIO ADICION DE RECURSOS**	**0 días**	**lun 20/03/23**	**lun 20/03/23**
22	COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE B	120 días	lun 27/03/23	vie 8/09/23
23	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A	120 días	lun 22/05/23	vie 3/11/23
24	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B	120 días	lun 10/04/23	vie 22/09/23
25	FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	120 días	lun 5/06/23	vie 17/11/23
26	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS	120 días	lun 24/04/23	vie 6/10/23
27	COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B	120 días	lun 19/06/23	vie 1/12/23
28	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A	120 días	lun 8/05/23	vie 20/10/23
29	PRESUPUESTO COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM	122 días	lun 3/07/23	mar 19/12/23

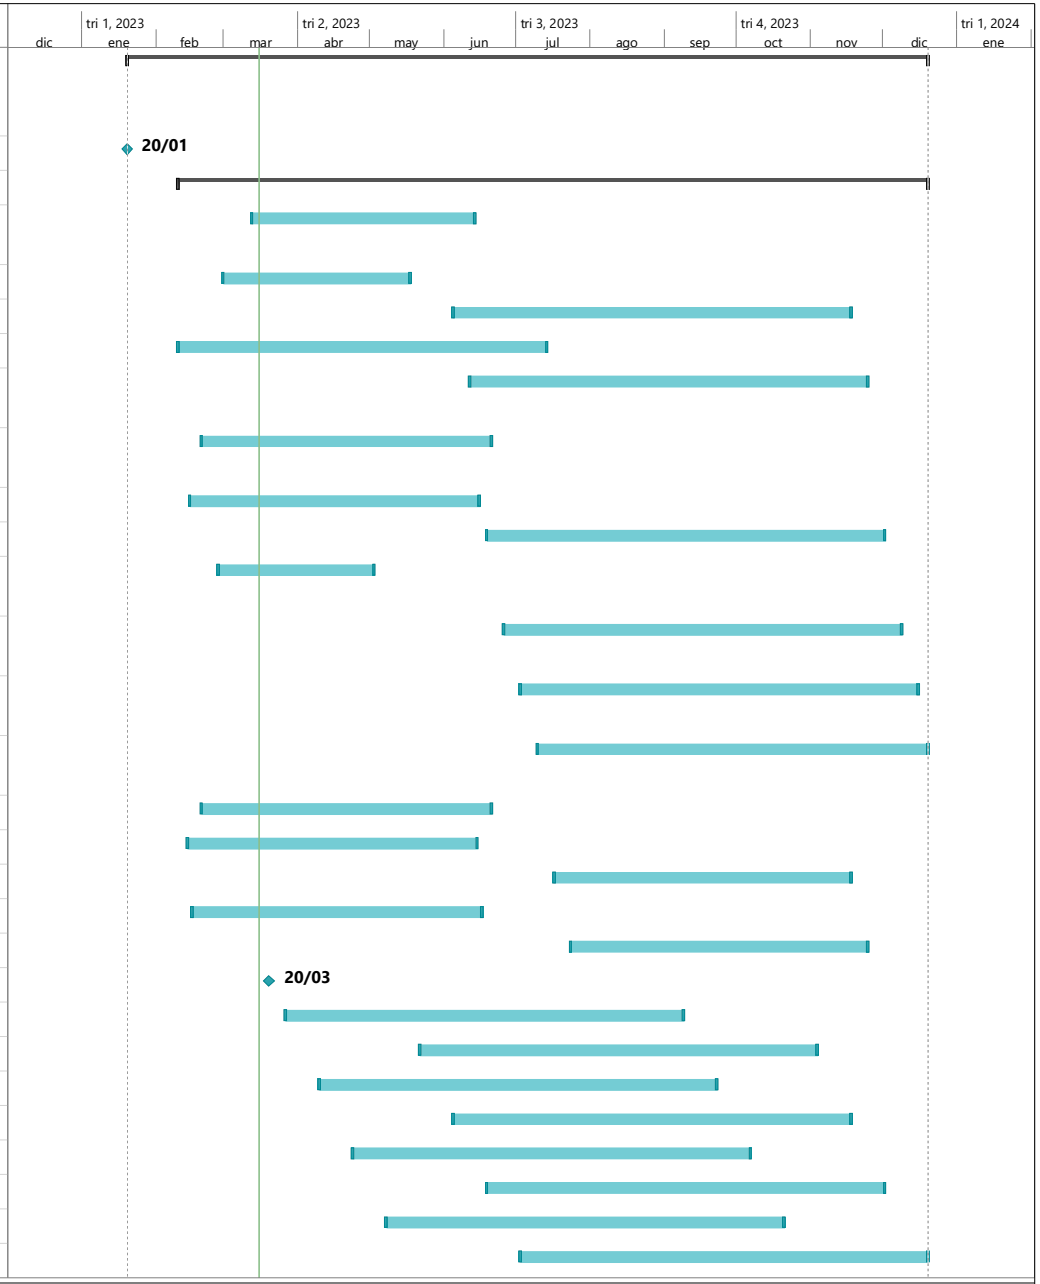

Proyecto: Programacion para a
Fecha: jue 16/03/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO QUIROGA ALIANZA SEDE A

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	221.67	$ 35,570.00	$ 7,884,802.00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	1200.98	$ 47,638.00	$ 57,212,285.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	1678.88	$ 10,072.00	$ 16,909,679.00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	915.40	$ 4,193.00	$ 3,838,272.00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 85,845,038.00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	1678.88	$ 44,020.00	$ 73,904,298.00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.37	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	190.98	$ 20,630.00	$ 3,939,917.00
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	718.90	$ 91,866.00	$ 66,042,467.00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 143,886,682.00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	80.00	$ 46,709.00	$ 3,736,720.00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	667.21	$ 58,194.00	$ 38,827,619.00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	120.00	$ 91,884.00	$ 11,026,080.00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 53,590,419.00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	2773.86	$ 7,708.00	$ 21,380,913.00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 21,380,913.00**

VALOR TOTAL	**$ 304,703,052.00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 304,703,052.00**

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	EDIFICACIONES					
	CUBIERTAS	221.67			1	221.67
PASAN:					SUBTOTAL	221.67
					TOTAL	221.67

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	COLEGIO QUIROGA ALIANZA			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.3.1	M2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
ALA 1	45.27	5.4		1	244.46
ALA 2	47.65	6.35		1	302.58
ALA 3	45.21	5.4		1	244.13
ALA 4	50.59	5.3		1	268.13
ALA 5	32.95	4.3		1	141.69
PASAN:				SUBTOTAL	1200.98
				TOTAL	1200.98

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	COLEGIO QUIROGA ALIANZA		
	FECHA:	8	03	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.5	M2	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	DESARROLLO	ALTO	CANT	TOTAL
ALA 1	45.27	2.8		1	126.76
	5.40	3.2		1	17.28
ALA 2	47.65	2.8		1	133.42
	6.35	2.8		1	17.78
ALA 3	50.59	2.8		1	141.65
	5.30	2.8		1	14.84
ALA 4	45.21	2.8		1	126.59
	7.80	5.6		1	43.68
ALA 5	45.21	7.8		1	352.64
	50.59	1.9		2	192.24
CANALES PERIMETRALES	320.00	0.8		2	512.00
PASAN:				SUBTOTAL	1678.88
				TOTAL	1678.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	COLEGIO QUIROGA ALIANZA			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANALES PERIMETRALES	320.00	0.8		1	320.00
BAJANTES			22.90	26	595.40
PASAN:				SUBTOTAL	915.40
				TOTAL	915.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.1.2	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	DESARROLLO	ALTO	CANT	TOTAL
ALA 1	45.27	2.8		1	126.76
	5.40	3.2		1	17.28
ALA 2	47.65	2.8		1	133.42
	6.35	2.8		1	17.78
ALA 3	50.59	2.8		1	141.65
	5.30	2.8		1	14.84
ALA 4	45.21	2.8		1	126.59
	7.80	5.6		1	43.68
ALA 5	45.21	7.8		1	352.64
	50.59	1.9		2	192.24
CANALES PERIMETRALES	320.00	0.8		2	512.00
PASAN:				SUBTOTAL	1678.88
				TOTAL	1678.88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.37	M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
CANCHA 1	28.02	14.94		5	102.72
CANCHA 2	23.01	13.05		5	88.26
PASAN:				SUBTOTAL	190.98
				TOTAL	190.98

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.42	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
CANCHA 1	28.02	14.94		1	418.62
CANCHA 2	23.01	13.05		1	300.28
PASAN:				SUBTOTAL	718.90
				TOTAL	718.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	COLEGIO QUIROGA ALIANZA			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
CAMBIOS PARCIALES	80.00				80.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	80.00
				TOTAL	80.000

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

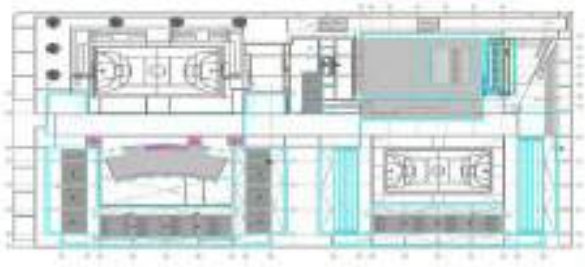



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	COLEGIO QUIROGA ALIANZA		
	FECHA:	8	03	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
ALA 1	45.27	2.8		1	126.76
	5.40	3.2		1	17.28
ALA 2	47.65	2.8		1	133.42
	6.35	2.8		1	17.78
ALA 3	50.59	2.8		1	141.65
	5.30	2.8		1	14.84
ALA 4	45.21	2.8		1	126.59
	7.80	5.6		1	43.68
ALA 5	45.21	7.8		1	45.21
	50.59	1.9		2	101.18
CANALES PERIMETRALES	320.00	0.8		2	640.00
PASAN:				SUBTOTAL	667.21
				TOTAL	667.21

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO QUIROGA ALIANZA**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.18	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
REPARACIONES PARCIALES	40.00			3	120.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	120.00
				TOTAL	120

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	COLEGIO QUIROGA ALIANZA			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
CUBIERTA TEJA	ALA 1	45.27	5.4		1	244.46
	ALA 2	47.65	6.35		1	302.58
	ALA 3	45.21	5.4		1	244.13
	ALA 4	50.59	5.3		1	268.13
	ALA 5	32.95	4.3		1	141.69
CANALES PERIMETRALES		350.00	0.8		1	350.00
ALA 1		25.27	2.8		1	70.76
		5.40	3.2		1	17.28
ALA 2		27.65	2.8		1	77.42
		6.35	2.8		1	17.78
ALA 3		30.59	2.8		1	85.65
		5.30	2.8		1	14.84
ALA 4		25.21	2.8		1	70.59
		7.80	5.6		1	43.68
ALA 5		25.21	7.8		1	196.64
		30.59	1.9		2	116.24
CANALES PERIMETRALES		320.00	0.8		2	512.00
PASAN:					SUBTOTAL	2773.86
					TOTAL	2773.86

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

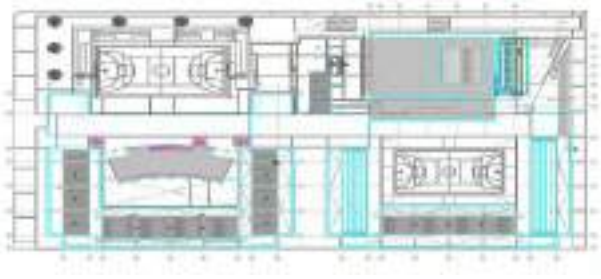

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE A

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	284.69	$ 5,012.00	$ 1,426,866.00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	258.81	$ 35,570.00	$ 9,205,872.00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1198.48	$ 75,964.00	$ 91,041,335.00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 101,674,073.00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	517.62	$ 92,298.00	$ 47,775,291.00
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)	M	258.81	$ 66,867.00	$ 17,305,848.00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	463.29	$ 7,952.00	$ 3,684,082.00
SUBTOTAL	**2,ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 68,765,221.00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	214.02	$ 34,999.00	$ 7,490,486.00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 7,490,486.00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.03	$ 648,921.00	$ 16,242,493.00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40	M2	572.87	$ 800,775.00	$ 458,743,459.00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 474,985,952.00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	470.83	$ 7,708.00	$ 3,629,158.00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3,629,158.00**

VALOR TOTAL	**$ 656,544,890.00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	

VALOR TOTAL	$ 656,544,890.00

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.2	M2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09	1.1		1	1.20
2		26.72	1.1			29.39
3		6.05	1.1			6.66
4		14.53	1.1			15.98
5		8.94	1.1			9.83
6	**Cerramiento en mamposteria**	86.30				0.00
7	**Cerramiento en mamposteria**	82.92				0.00
8		12.81	1.1			14.09
9		9.88	1.1			10.87
10		169.69	1.1			186.66
11		9.10	1.1			10.01
PASAN:					**SUBTOTAL**	284.69
					TOTAL	284.69

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

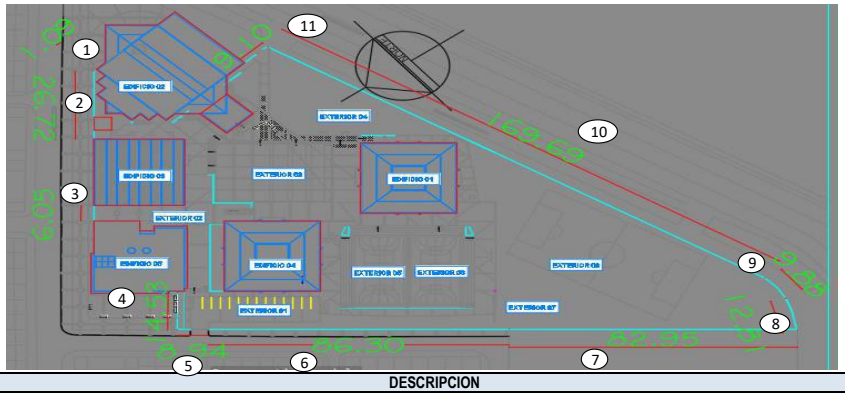

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09			1	1.09
2		26.72				26.72
3		6.05				6.05
4		14.53				14.53
5		8.94				8.94
6	Cerramiento en mamposteria	86.30				
7	Cerramiento en mamposteria	82.92				
8		12.81				12.81
9		9.88				9.88
10		169.69				169.69
11		9.10				9.10
PASAN:					SUBTOTAL	258.81
					TOTAL	258.81

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

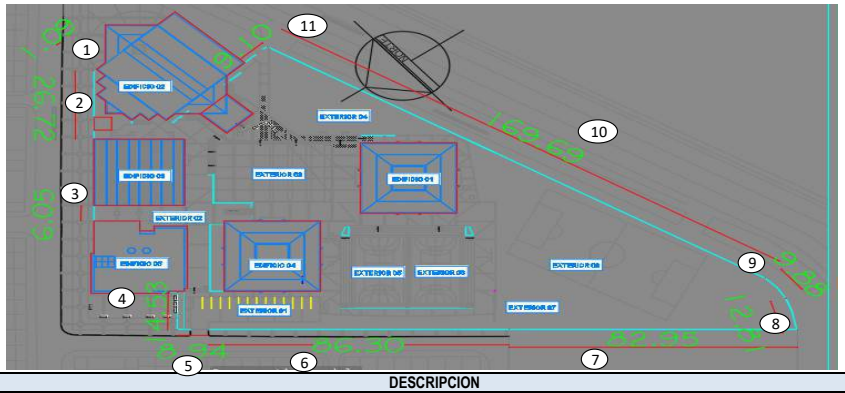

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.24	M2	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09		2.80		3.05
2		26.72		2.80		74.82
3		6.05		2.80		16.94
4		14.53		2.80		40.68
5		8.94		2.80		25.03
6		86.30		2.80		241.64
7		82.92		2.80		232.18
8		12.81		2.80		35.87
9		9.88		2.80		27.66
10		169.69		2.80		475.13
11		9.10		2.80		25.48
PASAN:					SUBTOTAL	1198.48
					TOTAL	1198.48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE A**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.10	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO

	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09			2	2.18
2		26.72			2	53.44
3		6.05			2	12.10
4		14.53			2	29.06
5		8.94			2	17.88
6	**Cerramiento en mamposteria**	86.30				0.00
7	**Cerramiento en mamposteria**	82.92				0.00
8		12.81			2	25.62
9		9.88			2	19.76
10		169.69			2	339.38
11		9.10			2	18.20
PASAN:					**SUBTOTAL**	517.62
					TOTAL	517.62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

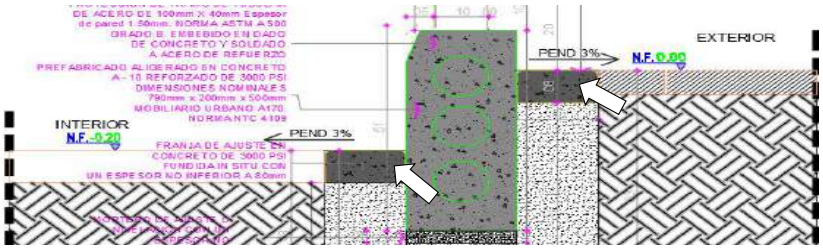

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.3.15	M	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)

	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09				1.09
2		26.72				26.72
3		6.05				6.05
4		14.53				14.53
5		8.94				8.94
6	Cerramiento en mamposteria	86.30				0.00
7	Cerramiento en mamposteria	82.92				0.00
8		12.81				12.81
9		9.88				9.88
10		169.69				169.69
11		9.10				9.10
						0.00
PASAN:					SUBTOTAL	258.81
					TOTAL	258.81

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.4.1	KG	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	DIAMETRO	PESO/ML	LONG	CANT	TOTAL
MICROPILOTES	0.50	1.00	1.90	368.00	348.20
	0.38	0.56	6.00	92.00	115.09
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	463.29
				TOTAL	463.29

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

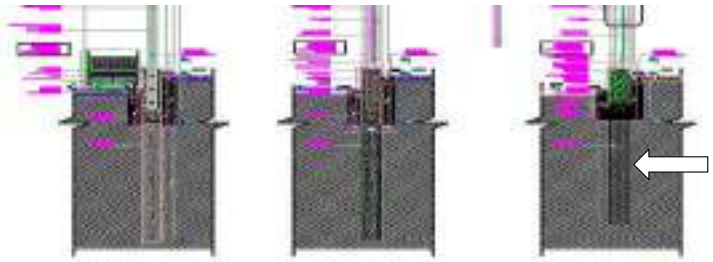

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.1.1	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04

	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09	0.5			0.55
2		26.72	0.5			13.36
3		6.05	0.5			3.03
4		14.53	0.5			7.27
5		8.94	0.5			4.47
6	Cerramiento en mamposteria	86.30	0.5			43.15
7	Cerramiento en mamposteria	82.92	0.5			41.46
8		12.81	0.5			6.41
9		9.88	0.5			4.94
10		169.69	0.5			84.85
11		9.10	0.5			4.55
PASAN:					SUBTOTAL	214.02
					TOTAL	214.02

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE A			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.1.4	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
5	PUERTA DE INGRESO	8.94		2.80		25.03
PASAN:					SUBTOTAL	25.03
					TOTAL	25.03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE A**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.3.14	M2	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		572.87				572.87
PASAN:					SUBTOTAL	572.87
					TOTAL	572.87

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE A**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

	DESCRIPCION	DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	CERRAMIENTO PERIMETRAL					
1		1.09	1.1		1	1.20
2		26.72	1.1			29.39
3		6.05	1.1			6.66
4		14.53	1.1			15.98
5		8.94	1.1			9.83
6	**Cerramiento en mamposteria**	86.30	1.1			94.93
7	**Cerramiento en mamposteria**	82.92	1.1			91.21
8		12.81	1.1			14.09
9		9.88	1.1			10.87
10		169.69	1.1			186.66
11		9.10	1.1			10.01
PASAN:					**SUBTOTAL**	470.83
					TOTAL	470.83

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

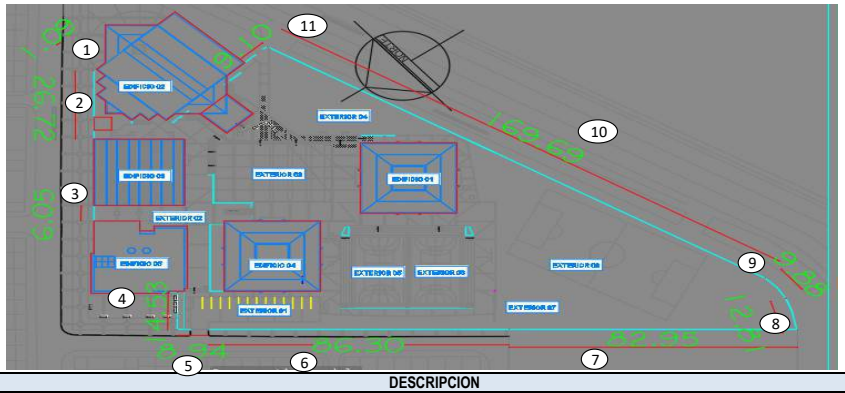

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO GUSTAVO RESTREPO SEDE B

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	180.00	$ 35,570.00	$ 6,402,600.00
1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	3450.00	$ 47,638.00	$ 164,351,100.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	1184.00	$ 10,072.00	$ 11,925,248.00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	549.60	$ 4,193.00	$ 2,304,473.00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 184,983,421.00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	1184.00	$ 44,020.00	$ 52,119,680.00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 52,119,680.00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	80.00	$ 46,709.00	$ 3,736,720.00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	1184.00	$ 58,194.00	$ 68,901,696.00
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M	30.00	$ 91,884.00	$ 2,756,520.00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 75,394,936.00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3484.00	$ 7,708.00	$ 26,854,672.00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 26,854,672.00**

VALOR TOTAL	**$ 339,352,709.00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 339,352,709.00**

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
	EDIFICACIONES					
	CUBIERTAS	180.00			1	180.00
PASAN:					SUBTOTAL	180.00
					TOTAL	180

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.3.1	M2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
ALA 1	50.00	15		1	750.00
ALA 2	50.00	15		1	750.00
ALA 3	50.00	15		1	750.00
ALA 4	80.00	15		1	1200.00
PASAN:				SUBTOTAL	3450.00
				TOTAL	3450

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

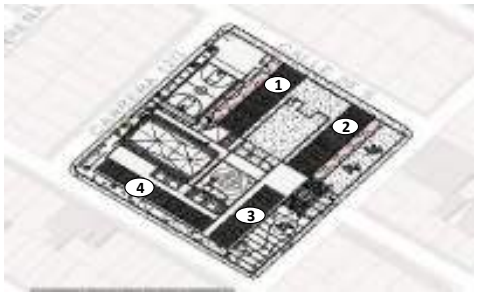



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.5	M2	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	DESARROLLO	ALTO	CANT	TOTAL
ALA 1	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	6.8		1	102.00
ALA 2	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	6.8		1	102.00
ALA 3	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	1.2		1	18.00
ALA 4	80.00	2.8		1	224.00
	15.00	1.2		1	18.00
CANALES PERIMETRALES	300.00	0.9		1	300.00
PASAN:				SUBTOTAL	1184.00
				TOTAL	1184

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

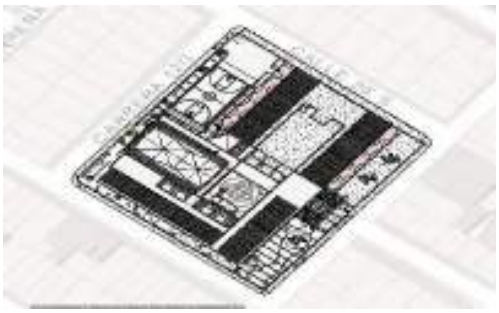





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.10	M	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
CANALES PERIMETRALES	300.00	0.8		1	300.00
BAJANTES			15.60	16	249.60
PASAN:				**SUBTOTAL**	549.60
				TOTAL	549.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.1.2	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	DESARROLLO	ALTO	CANT	TOTAL
ALA 1	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	6.8		1	102.00
ALA 2	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	6.8		1	102.00
ALA 3	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	1.2		1	18.00
ALA 4	80.00	2.8		1	224.00
	15.00	1.2		1	18.00
CANALES PERIMETRALES	300.00	0.9		1	300.00
PASAN:				SUBTOTAL	1184.00
				TOTAL	1184

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES					
CAMBIOS PARCIALES	80.00				80.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	80.00
				TOTAL	80.000

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ		
	FECHA:	8	03	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
ALA 1	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	6.8		1	102.00
ALA 2	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	6.8		1	102.00
ALA 3	50.00	2.8		1	140.00
	15.00	1.2		1	18.00
ALA 4	80.00	2.8		1	224.00
	15.00	1.2		1	18.00
CANALES PERIMETRALES	300.00	0.8		1	300.00
PASAN:				SUBTOTAL	1184.00
				TOTAL	1184

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

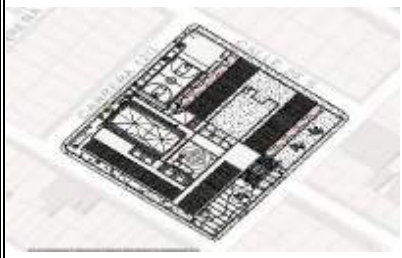



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.18	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
REPARACIONES PARCIALES	30.00			1	30.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	30.00
				TOTAL	30

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**GUSTAVO RESTREPO SEDE B - JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
CUBIERTA TEJA	ALA 1	50.00	10		1	500.00
	ALA 2	50.00	10		1	500.00
	ALA 3	50.00	10		1	500.00
	ALA 4	80.00	10		1	800.00
CANALES PERIMETRALES		300.00	0.8		1	300.00
CUBIERTA PLANA	ALA 1	50.00	2.8		1	140.00
		15.00	6.8		1	102.00
	ALA 2	50.00	2.8		1	140.00
		15.00	6.8		1	102.00
	ALA 3	50.00	2.8		1	140.00
		15.00	1.2		1	18.00
	ALA 4	80.00	2.8		1	224.00
		15.00	1.2		1	18.00
PASAN:					**SUBTOTAL**	3484.00
					TOTAL	3484

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

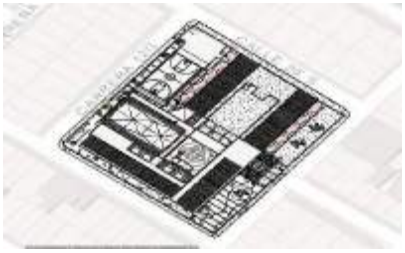



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO FE Y ALEGRÍA - PALERMO SUR

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2	3200,00	$ 3.222,00	$ 10.310.400,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	2800,00	$ 35.570,00	$ 99.596.000,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1160,00	$ 30.664,00	$ 35.570.240,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	23,40	$ 26.351,00	$ 616.613,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	109,20	$ 14.008,00	$ 1.529.674,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	920,00	$ 29.215,00	$ 26.877.800,00
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	580,00	$ 66.944,00	$ 38.827.520,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	45,00	$ 8.634,00	$ 388.530,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	120,00	$ 8.921,00	$ 1.070.520,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	45,00	$ 5.062,00	$ 227.790,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3000,00	$ 20.244,00	$ 60.732.000,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 275.747.087,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,00	$ 75.296,00	$ 903.552,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 903.552,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	50,00	$ 9.784,00	$ 489.200,00
SUBTOTAL	**3. MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 489.200,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	450,00	$	68.798,00	$ 30.959.100,00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	200,00	$	33.343,00	$ 6.668.600,00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	200,00	$	63.687,00	$ 12.737.400,00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	100,00	$	22.099,00	$ 2.209.900,00
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN	100,00	$	140.046,00	$ 14.004.600,00
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN	100,00	$	99.155,00	$ 9.915.500,00
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**					
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	400,00	$	27.292,00	$ 10.916.800,00
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	400,00	$	15.067,00	$ 6.026.800,00
4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
4.8.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	10,00	$	888.143,00	$ 8.881.430,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 102.320.130,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	100,00	$	144.994,00	$ 14.499.400,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	150,00	$	144.482,00	$ 21.672.300,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1200,00	$	42.467,00	$ 50.960.400,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	400,00	$	18.061,00	$ 7.224.400,00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	100,00	$	168.166,00	$ 16.816.600,00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	95,00	$	5.571.063,00	$ 529.250.985,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 640.424.085,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	1160,00	$	44.020,00	$ 51.063.200,00
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2	1160,00	$	151.381,00	$ 175.601.960,00
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	500,00	$	61.112,00	$ 30.556.000,00
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	500,00	$	73.610,00	$ 36.805.000,00
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	580,00	$	52.370,00	$ 30.374.600,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	200,00	$	5.632,00	$ 1.126.400,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 325.527.160,00**

9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	250,00	$ 623.348,00	$ 155.837.000,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN POLICUARZO, LONGITUD = X ANCHO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA 30 CM, CON SALPICADERO	M2	30,00	$ 882.572,00	$ 26.477.160,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 182.314.160,00**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	16,00	$ 878.674,00	$ 14.058.784,00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	16,00	$ 693.298,00	$ 11.092.768,00
SUBTOTAL	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 25.151.552,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	85,00	$ 1.073.302,00	$ 91.230.670,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 91.230.670,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	950,00	$ 26.269,00	$ 24.955.550,00
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	450,00	$ 20.163,00	$ 9.073.350,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2	90,00	$ 22.043,00	$ 1.983.870,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 36.012.770,00**
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2	20,00	$ 154.786,00	$ 3.095.720,00
SUBTOTAL	**15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 3.095.720,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	500,00	$ 46.709,00	$ 23.354.500,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	120,00	$ 69.142,00	$ 8.297.040,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	150,00	$ 63.665,00	$ 9.549.750,00

17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	1012,00	$	250.250,00	$ 253.253.000,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	120,00	$	104.586,00	$ 12.550.320,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 307.004.610,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	3200,00	$	7.708,00	$ 24.665.600,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 24.665.600,00**
21	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					
21.1.4	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	5,00	$	233.852,00	$ 1.169.260,00
21.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	5,00	$	377.762,00	$ 1.888.810,00
21.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE.	UN	5,00	$	683.570,00	$ 3.417.850,00
21.1.7	PODA DE CESPED.	M2	3200,00	$	1.993,00	$ 6.377.600,00
SUBTOTAL	**21. EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**					**$ 12.853.520,00**

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ L.

VALOR TOTAL	**$**	**2.027.739.816,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)		
VALOR TOTAL	**$**	**2.027.739.816,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
REPLANTEO COLEGIO FE Y ALEGRIA PALERMO SUR	3.200,00				3200,00
PASAN:				SUBTOTAL	3200,00
				TOTAL	3200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
					0,00
CERRAMIENTO ACOPIO DE MATERIALES Y AREAS DE TRABAJO			2.800,00	1	2800,00
OBSERVACION:					
PASAN:				**SUBTOTAL**	2800,00
				TOTAL	2800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ÁREA DE LAS INSTALACIONES A CAMBIAR EL PISO	1160,00				1160,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1160,00
				TOTAL	1160,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
PUERTAS EXISTENTES EN EL BLOQUE		0,90	2,00	13,00	23,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	23,40
				TOTAL	23,40

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
VENTANAS EXISTENTES EN EL BLOQUE		2,60	1,20	35,00	109,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	109,20
				TOTAL	109,20

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS	230,00			4,00	920,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	920,00
				TOTAL	920,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.4	M2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
PLACA EXISTENTE DE LAS CANCHAS Y ÁREAS COMUNES	580,00				580,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	580,00
				TOTAL	580,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
IMPLEMENTOS ELECTRICOS PRESENTES EN LOS EDIFICIOS				45,00	45,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	45,00
				TOTAL	45,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CANALETA PRESENTE EN LOS EDIFICIOS			120,00		120,00
PASAN:				SUBTOTAL	120,00
				TOTAL	120,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
LAMPARAS PRESENTES EN LOS EDIFICIOS				45,00	45,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	45,00
				TOTAL	45,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE			3000		3000,00
PASAN:				SUBTOTAL	3000,00
				TOTAL	3000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**#¡REF!**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.01.01	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	VOLUMEN	ANCHO	LARGO	ALTO	TOTAL
EXCAVACION A REALIZAR		2	3,00	2,00	12,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	12,00
				TOTAL	12,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	#¡REF!			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
03.01.24	M2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
FISURAS EXISTENTES EN LOS MUROS DE LA ESTRUCTURA	50,00				50,00
PASAN:				SUBTOTAL	50,00
				TOTAL	50,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.02.03	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
TUBERIA PARA BAÑOS			450,00		450,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	450,00
				TOTAL	450,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.02.04	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
TUBERIA PARA BAÑOS			200,00		200,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	200,00
				TOTAL	200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**#¡REF!**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.2.5	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
BLOQUE DE EDIFICIOS			200,00		200,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	200,00
				TOTAL	200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.02.6	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
BLOQUE DE EDIFICIOS			100,00		100,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	100,00
				TOTAL	100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.03.14	UN	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
BLOQUE DE EDIFICIOS				100,00	100,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	100,00
				TOTAL	100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.03.15	UN	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
BLOQUE DE EDIFICIOS				100,00	100,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	100,00
				TOTAL	100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.03.9	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
BLOQUE DE EDIFICIOS				400,00	400,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	400,00
				TOTAL	400,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
04.03.10	UN	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
BLOQUE DE EDIFICIOS				400,00	400,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	400,00
				TOTAL	400,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.8.4	UN	CAJA DE INSPECCION 100 X 100. INCLUYE TAPA PREFABRICADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
CAJAS DE INSPECCION BANOS				10	10,00
OBSERVACION:					
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	10,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.01	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
				100,00	100,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	100,00
				TOTAL	100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
				150,00	150,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	150,00
				TOTAL	150,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
				1.200,00	1.200,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	1.200,00
				TOTAL	1.200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
				400,00	400,00
					-
PASAN:				**SUBTOTAL**	400,00
				TOTAL	400,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.94	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED STREET PARA ALUMBRADO RECREATIVO DE CANCHA DEPORTIVA TIPO EXTERIOR DE 60W, 100V A 277V. INCLUYE ESTRUCTURA TIPO POSTE METÁLICO, ESTRUCTURA CIVIL, CABLE DE PUESTA A TIERRA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
				95,00	95,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	95,00
				TOTAL	95,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.01.02	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
	1160,00				1160,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1160,00
				TOTAL	1160

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.01	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
	1.160,00				1160,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1160,00
				TOTAL	1160

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.03	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
				500,00	500,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	500,00
				TOTAL	500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.5	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
				500	500,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	500,00
				TOTAL	500

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.41	M2	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
				480	480,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	480,00
				TOTAL	480

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**FE Y ALEGRIA PALERMO SUR**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
07.02.54	M2	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
				480	480,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	480,00
				TOTAL	480

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO 1 PISO 1					
1	11,25			8%	12,15
6	53,45			8%	57,73
EDIFICIO 1 PISO 2					
9 Y10	126,00			8%	136,08
EDIFICIO 2 PISO 2	-				
18 Y 16	29,00			8%	31,32
EDIFICIO 3 PISO 2					
23,24,25,26,27	134,00			8%	144,72
PASAN:				**SUBTOTAL**	458,40
				TOTAL	458,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLOMBIA VIVA SEDE C DIANA TURBAY**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO 1			30	1,0	30,00
EDIFICIO 2			15	1,0	15,00
EDIFICIO 3			20	1,0	20,00
PASAN:				SUBTOTAL	65,00
				TOTAL	65,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2	1130.00	$ 3,222.00	$ 3,640,860.00
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1130.00	$ 29,215.00	$ 33,012,950.00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 36,653,810.00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	4400.00	$ 16,242.00	$ 71,464,800.00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 71,464,800.00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1242.00	$ 23,886.00	$ 29,666,412.00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 29,666,412.00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	914.31	$ 250,250.00	$ 228,805,051.00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	230.00	$ 104,586.00	$ 24,054,780.00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 252,859,831.00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1129.13	$ 7,708.00	$ 8,703,334.00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	13560.00	$ 1,898.00	$ 25,736,880.00
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	13560.01	$ 2,272.00	$ 30,808,343.00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 65,248,557.00**

VALOR TOTAL	**$ 455,893,410.00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 455,893,410.00**

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			1,130.00	1	1130.00
PASAN:					SUBTOTAL	1130.00
					TOTAL	1130

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1	1,130.00			1.00	1130.00
PASAN:					SUBTOTAL	1130.00
					TOTAL	1130

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta	80.00			55	4400.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4400.00
				TOTAL	4400

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LONG	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Transversal			24.84	50	1242.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1242.00
				TOTAL	1242

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	914.31			1	914.31
PASAN:					SUBTOTAL	914.31
					TOTAL	914.31

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	ANCHO ALA	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1	230				230.00
PASAN:					SUBTOTAL	230.00
					TOTAL	230

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	FE Y ALEGRIA LOS NARANJOS			
	FECHA:	8	03	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	ÁREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA			1,129.13	1	1,129.13
PASAN:				**SUBTOTAL**	1129.13
				TOTAL	1129.13

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	10	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.2	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG POR M2	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA	1,130.00			12	13560.00
PASAN:				SUBTOTAL	13560.00
				TOTAL	13560

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	10	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.3	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	PROMEDIO AREA	KG POR M2	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA	1,130.00			12	13560.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	13560.00
				TOTAL	13560

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	53,00	$ 35.570,00	$ 1.885.210,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.28	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,00	$ 26.351,00	$ 395.265,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	327,89	$ 29.215,00	$ 9.579.306,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	84,00	$ 8.634,00	$ 725.256,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	27,00	$ 8.921,00	$ 240.867,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	84,00	$ 5.062,00	$ 425.208,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1080,00	$ 20.244,00	$ 21.863.520,00
1,3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	239,47	$ 47.638,00	$ 11.407.872,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 46.522.504,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	18,00	$ 75.296,00	$ 1.355.328,00
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	2,25	$ 174.350,00	$ 392.288,00
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.21	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	15,00	$ 148.076,00	$ 2.221.140,00
2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	84,40	$ 8.711,00	$ 735.208,00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	2.962,03	$ 16.242,00	$ 48.109.291,00

SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 52.813.255,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	44,00	$ 144.994,00	$ 6.379.736,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	44,00	$ 144.482,00	$ 6.357.208,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	410,00	$ 42.467,00	$ 17.411.470,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	410,00	$ 18.061,00	$ 7.405.010,00
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	84,00	$ 194.999,00	$ 16.379.916,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 53.933.340,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	273,00	$ 91.866,00	$ 25.079.418,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 25.079.418,00**
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
12.1.23	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M2	10,00	$ 841.426,00	$ 8.414.260,00
SUBTOTAL	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 8.414.260,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	569,00	$ 23.886,00	$ 13.591.134,00
SUBTOTAL	**13. PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 13.591.134,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	248,88	$ 46.709,00	$ 11.624.936,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27,00	$ 69.142,00	$ 1.866.834,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	27,00	$ 63.665,00	$ 1.718.955,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	54,00	$ 58.194,00	$ 3.142.476,00

17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	74,25	$ 136.173,00	$ 10.110.845,00
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	353,64	$ 250.250,00	$ 88.498.410,00
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	91,00	$ 104.586,00	$ 9.517.326,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 126.479.782,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1170,00	$ 7.708,00	$ 9.018.360,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 9.018.360,00**

VALOR TOTAL	**$ 335.852.053,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 335.852.053,00**

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ L.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE 1-B1			23	1,00	23,00
BLOQUE 2-B2			30,00	1,00	30,00
BLOQUE 3-B3			15,00	1,00	
PASAN:				**SUBTOTAL**	53,00
				TOTAL	53,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

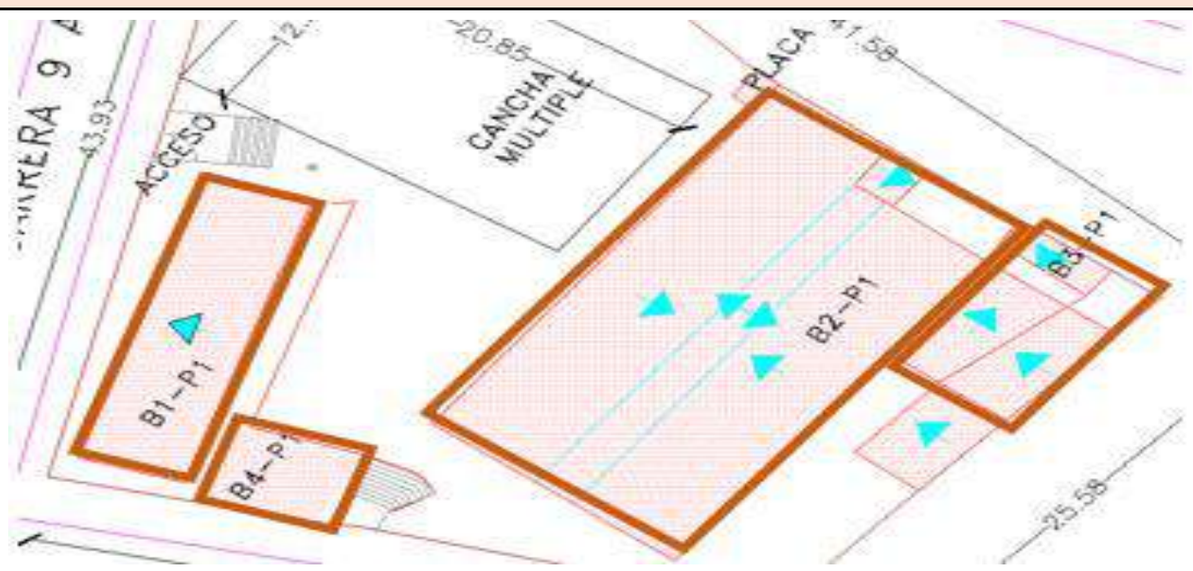

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION ESCALERAS Y PLACA PARA RAMPA		1,50	10,00	1,00	15,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,00
				TOTAL	15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

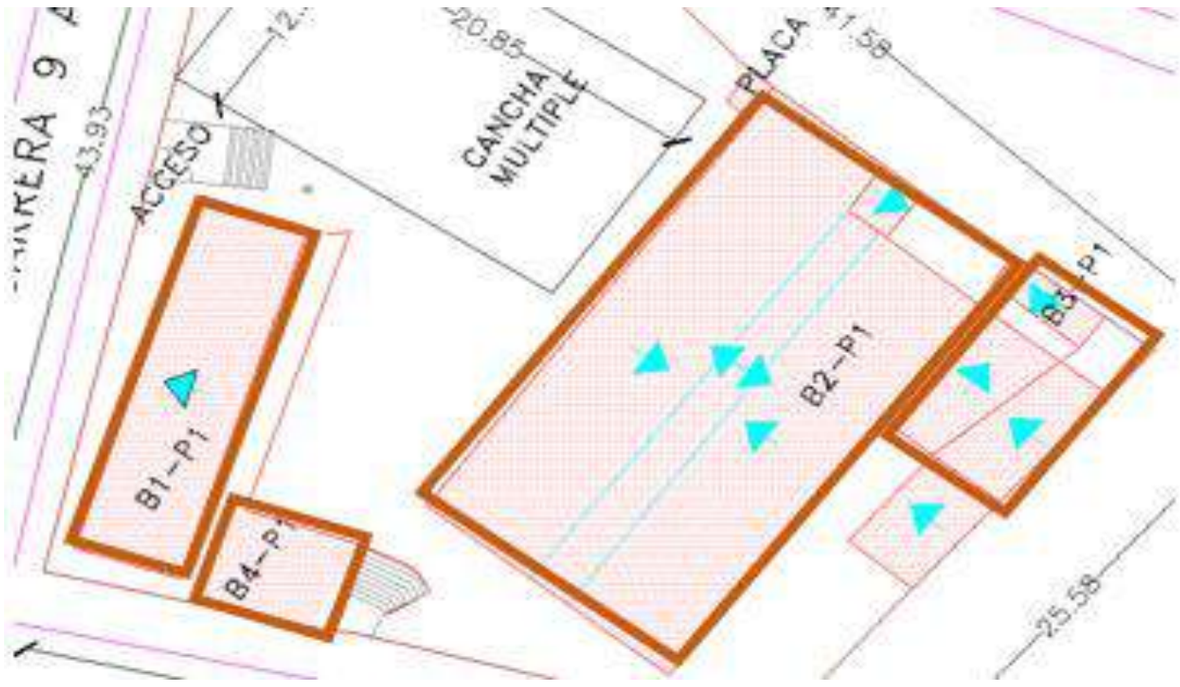



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	% A DESMONTAR	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1	20%	5,20	18,97	5%	20,72
BLOQUE EMISORA B4-P1	100%	3,00	4,50	5%	14,18
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1	40%	6,14	27,00	7%	70,95
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2	40%	6,1	27,00	7%	66,95
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS	100%	2,50	27,00	10%	74,25
BLOQUE AUDITORIO B3-P1	100%	7,00	11,00	5%	80,85
PASAN:				SUBTOTAL	327,89
				TOTAL	327,89


REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

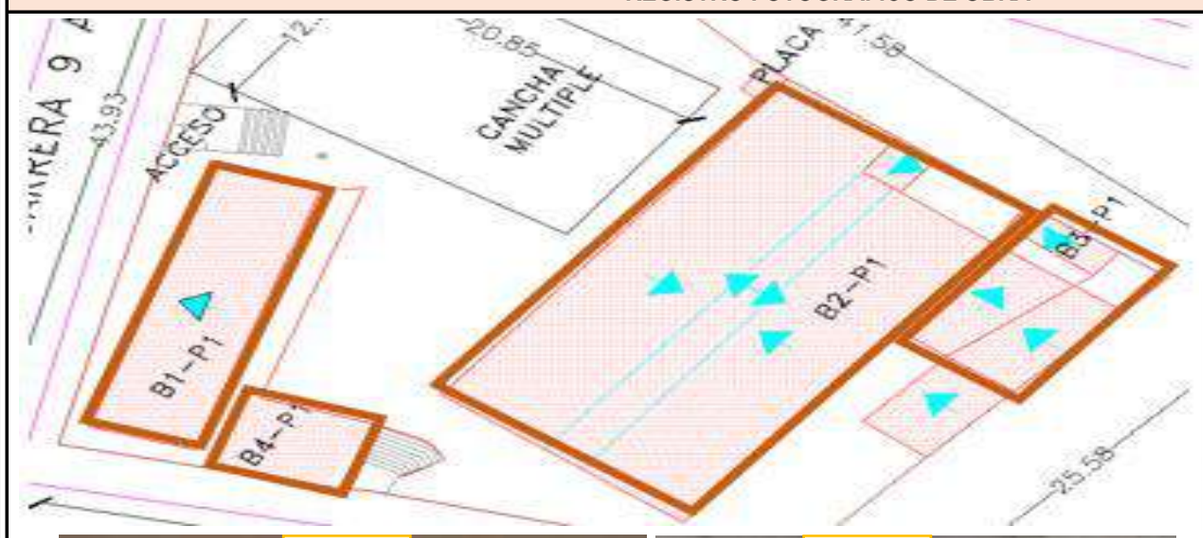




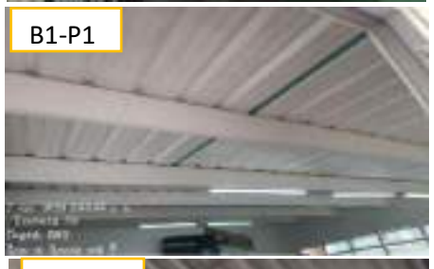

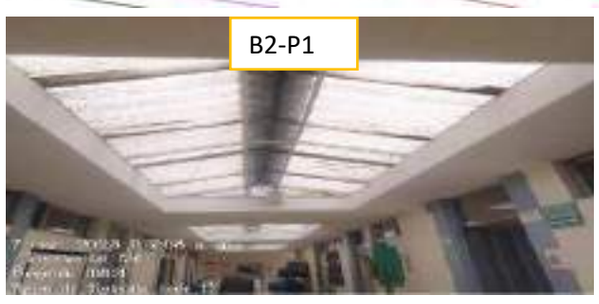

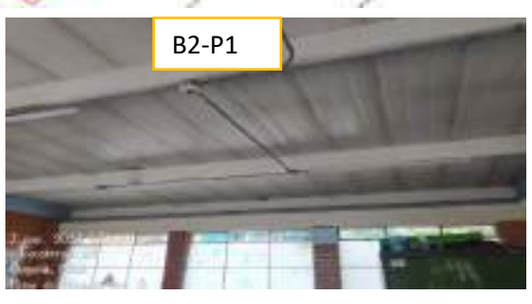

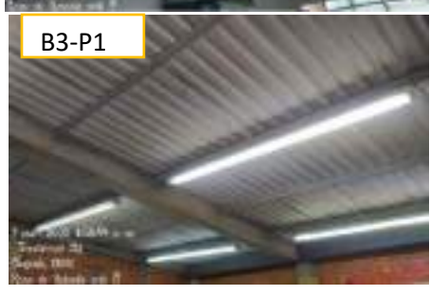

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1				18,00	18,00
BLOQUE EMISORA B4-P1				4,00	4,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1				20,00	20,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2				24,00	24,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS				0,00	0,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1				18,00	18,00
PASAN:				SUBTOTAL	84,00
				TOTAL	84,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1					0,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			5,00	1,00	5,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1					0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2					0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS					0,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			11,00	2,00	22,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	27,00
				TOTAL	27,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

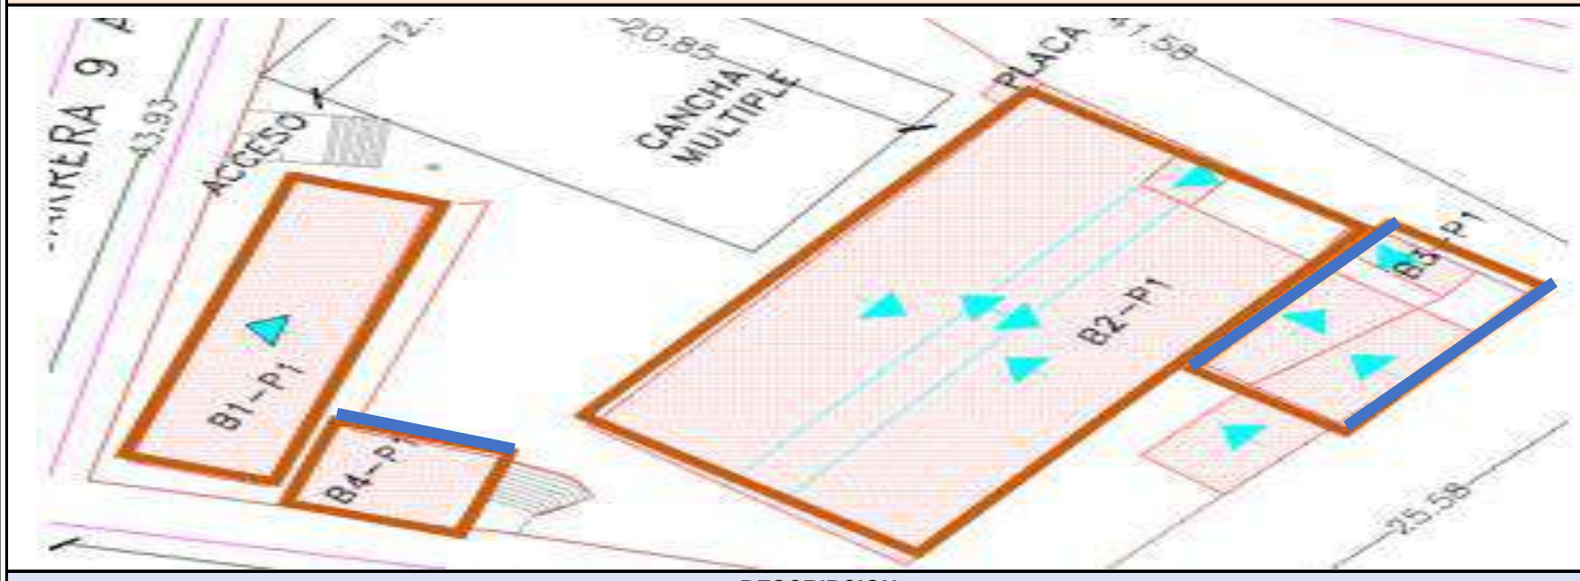

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1				18,00	18,00
BLOQUE EMISORA B4-P1				4,00	4,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1				20,00	20,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2				24,00	24,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS				0,00	0,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1				18,00	18,00
PASAN:				SUBTOTAL	84,00
				TOTAL	84,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			180	1,00	180,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			100	1,00	100,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			300	1,00	300,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			300	1,00	300,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS			50	1,00	50,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			150	1,00	150,00
PASAN:				SUBTOTAL	1080,00
				TOTAL	1080,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.03.01	M2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1	103,58	5,20	18,97	5%	20,72
BLOQUE EMISORA B4-P1					
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1	177,38	6,14	27,00	7%	70,95
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2	176,23	6,1	27,00	7%	66,95
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS					
BLOQUE AUDITORIO B3-P1	80,85	7,00	11,00	5%	80,85
	0			1	0
	0			1	0,00
	0			1	0,00
PASAN:				SUBTOTAL	239,47
				TOTAL	239,47

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

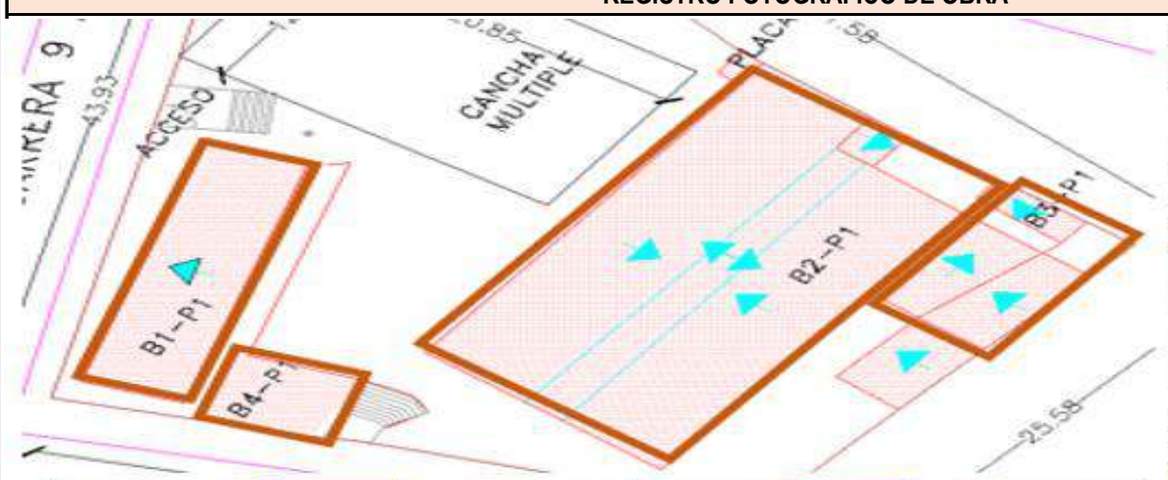











DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.1.1	M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTURA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION PARA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL	1,20	1,50	10,00	1,00	18,00
PASAN:				SUBTOTAL	18,00
				TOTAL	18

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

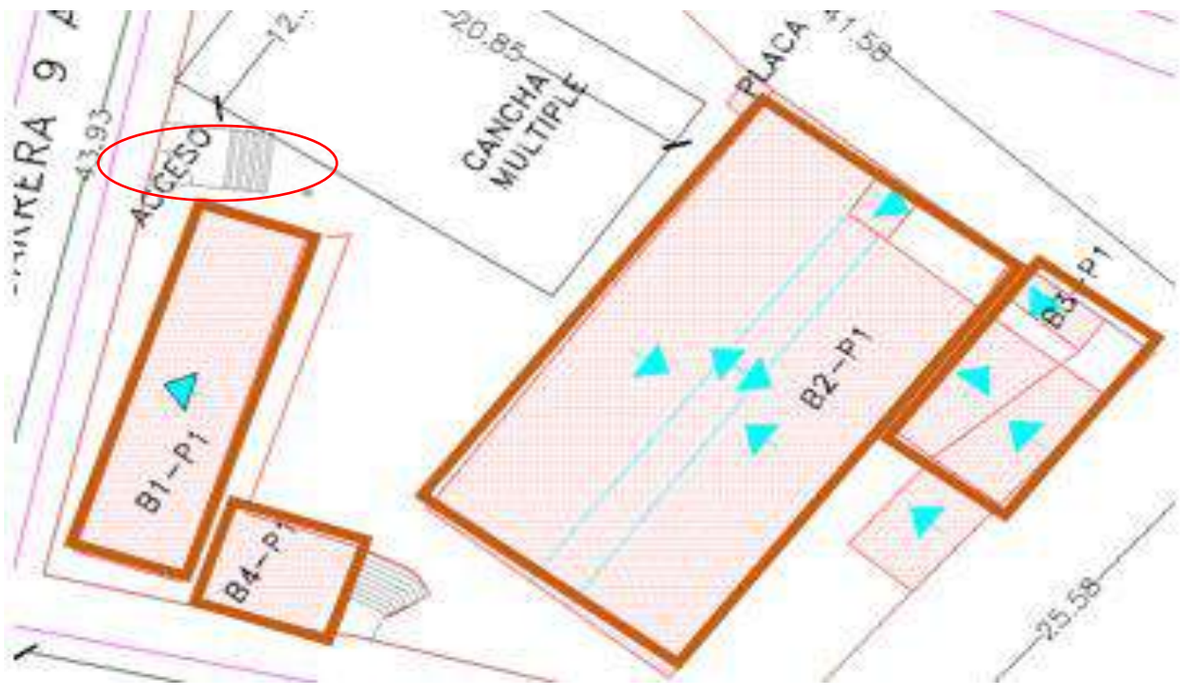



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.1.10	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTURA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL	0,15	1,50	10,00	1,00	2,25
PASAN:				SUBTOTAL	2,25
				TOTAL	2,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

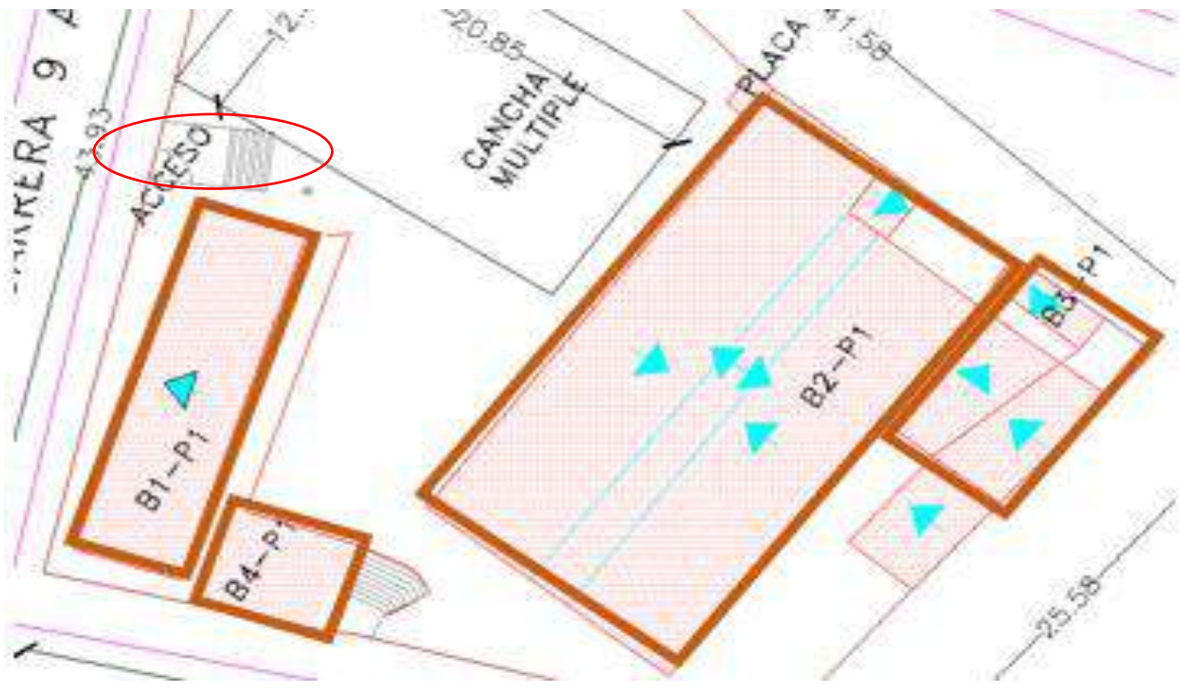

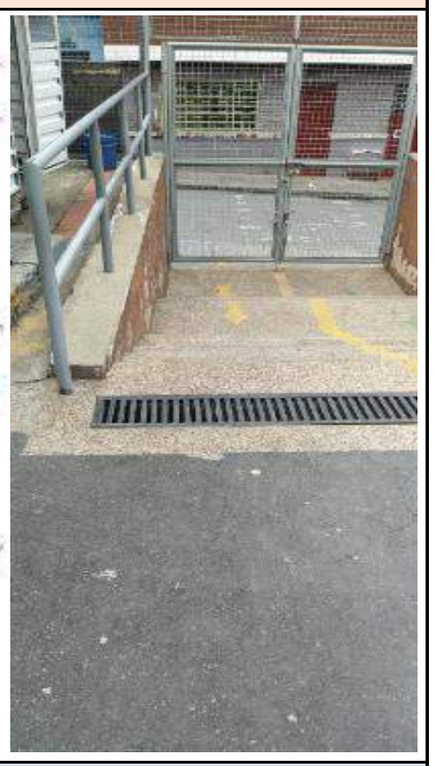

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.21	M2	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ALTURA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL	0,15	1,50	10,00	1,00	15,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,00
				TOTAL	15

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

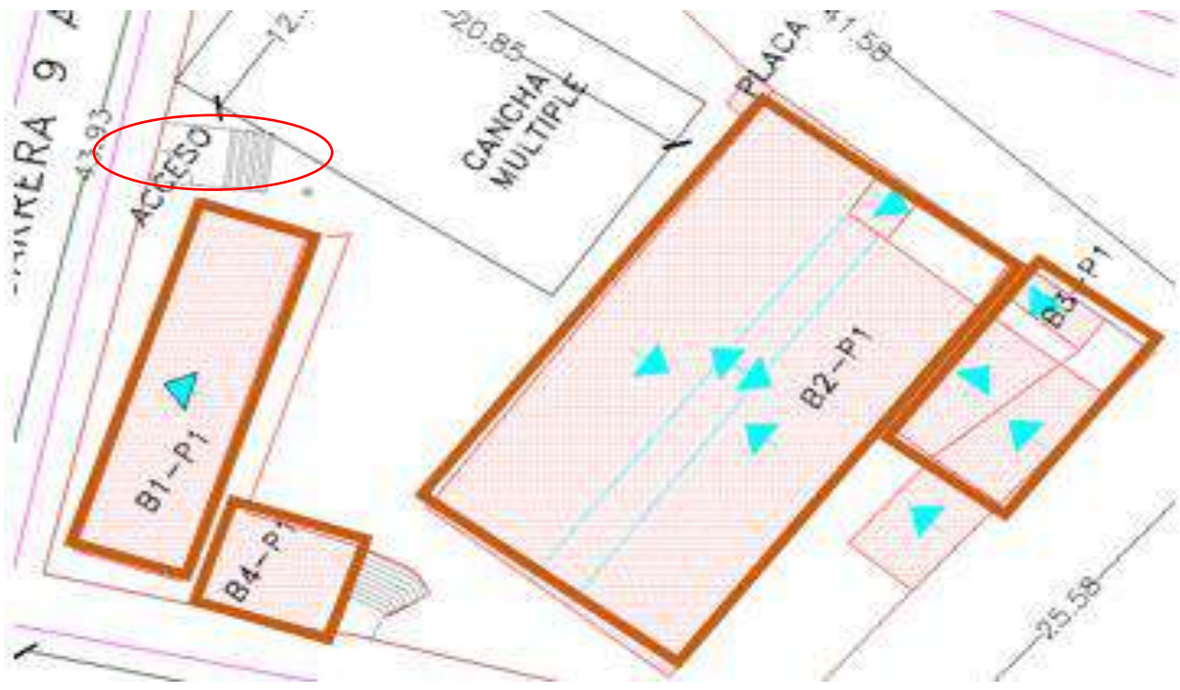

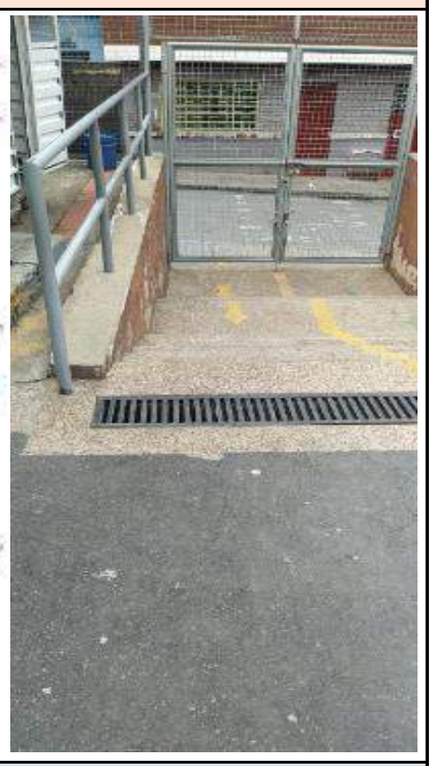

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.4.3	M2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PESO KG	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL	42,20	2,35	6,00	2,00	84,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,40
				TOTAL	84,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

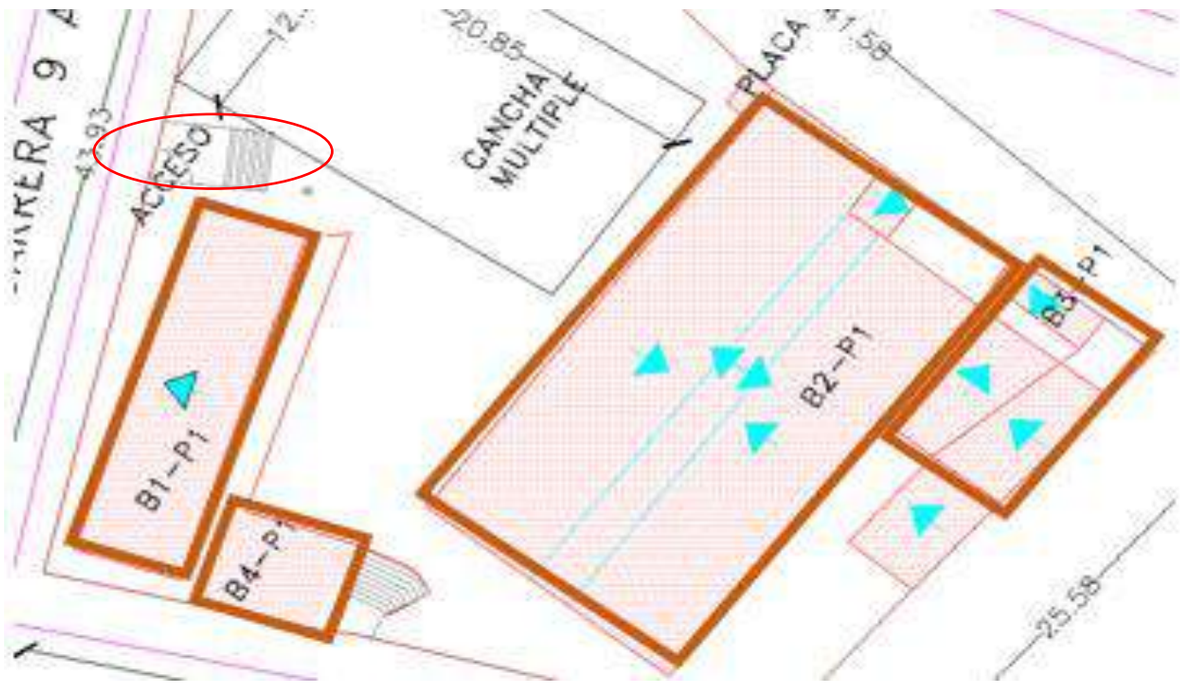

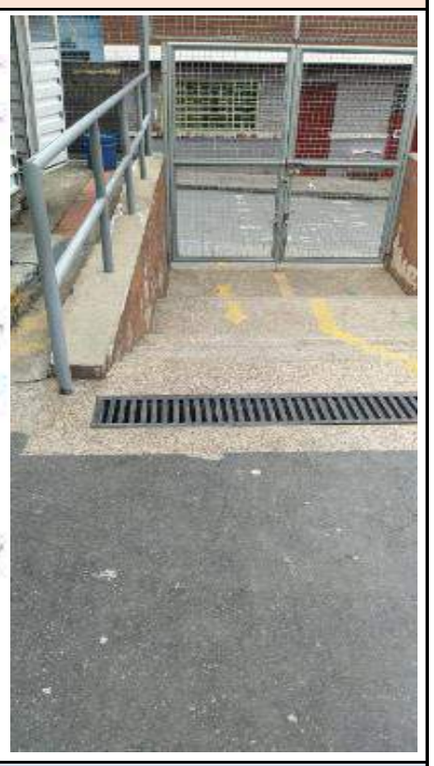

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS	269,28			2.962,03	2.962,03
PASAN:				**SUBTOTAL**	2.962,03
				TOTAL	2.962,03

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia Gp Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.01	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			10,00		10,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			2,00		2,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			10,00		10,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			20,00		20,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS			2,00		2,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1					
					-
PASAN:				SUBTOTAL	44,00
				TOTAL	44,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

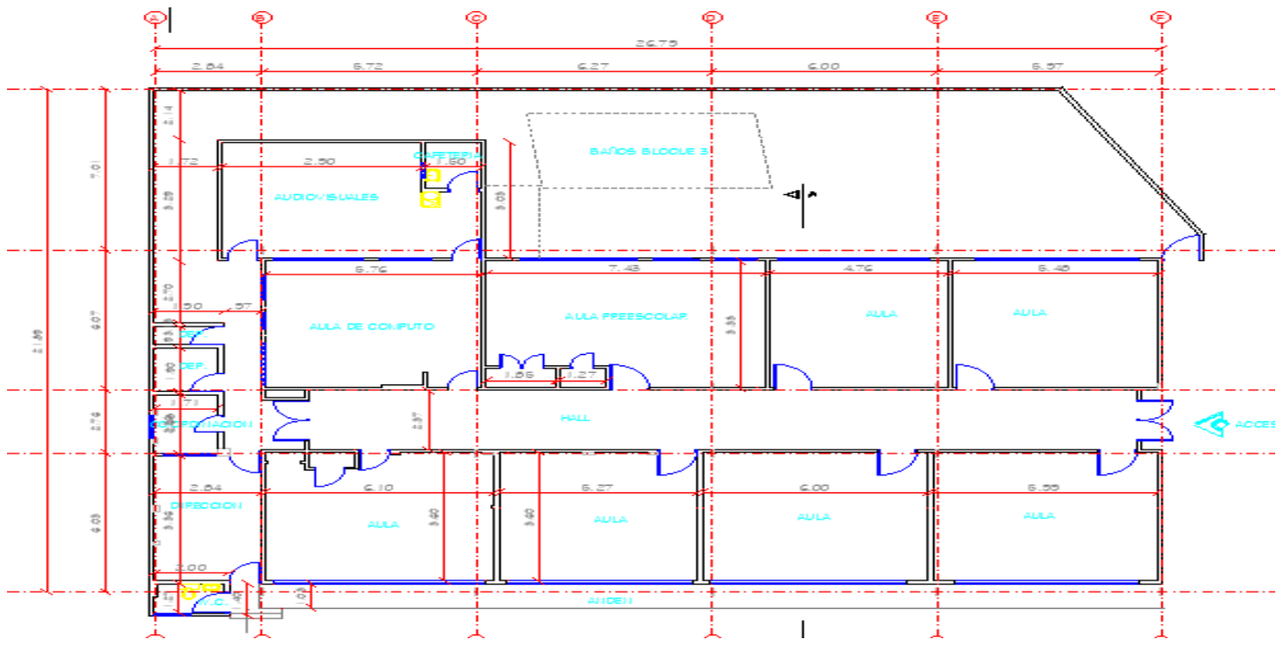

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD	VOLUMEN	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			10,00		10,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			2,00		2,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			10,00		10,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			20,00		20,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS			2,00		2,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1					
					-
PASAN:				SUBTOTAL	44,00
				TOTAL	44,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

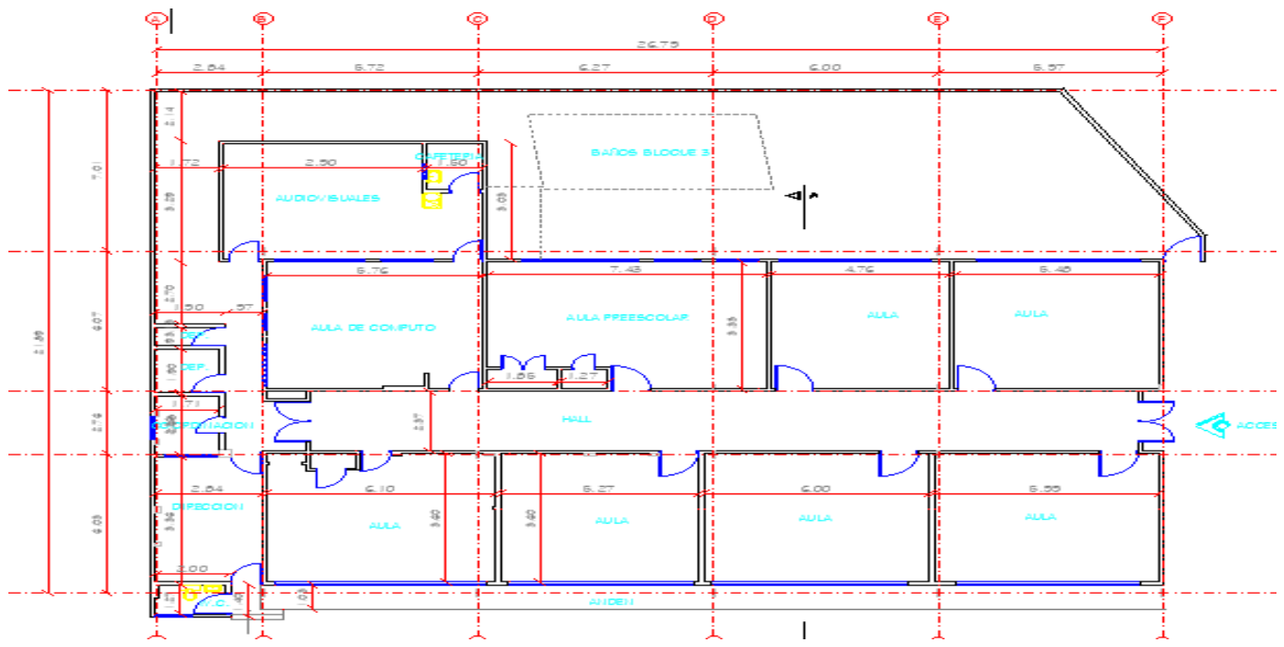

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			80	1,00	80,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			30	1,00	30,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			100	1,00	100,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			100	1,00	100,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS			20	1,00	20,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			80	1,00	80,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	410,00
				TOTAL	410,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			80		80,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			30		30,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			100		100,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			100		100,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS			20		20,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			80		80,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	410,00
				TOTAL	410,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

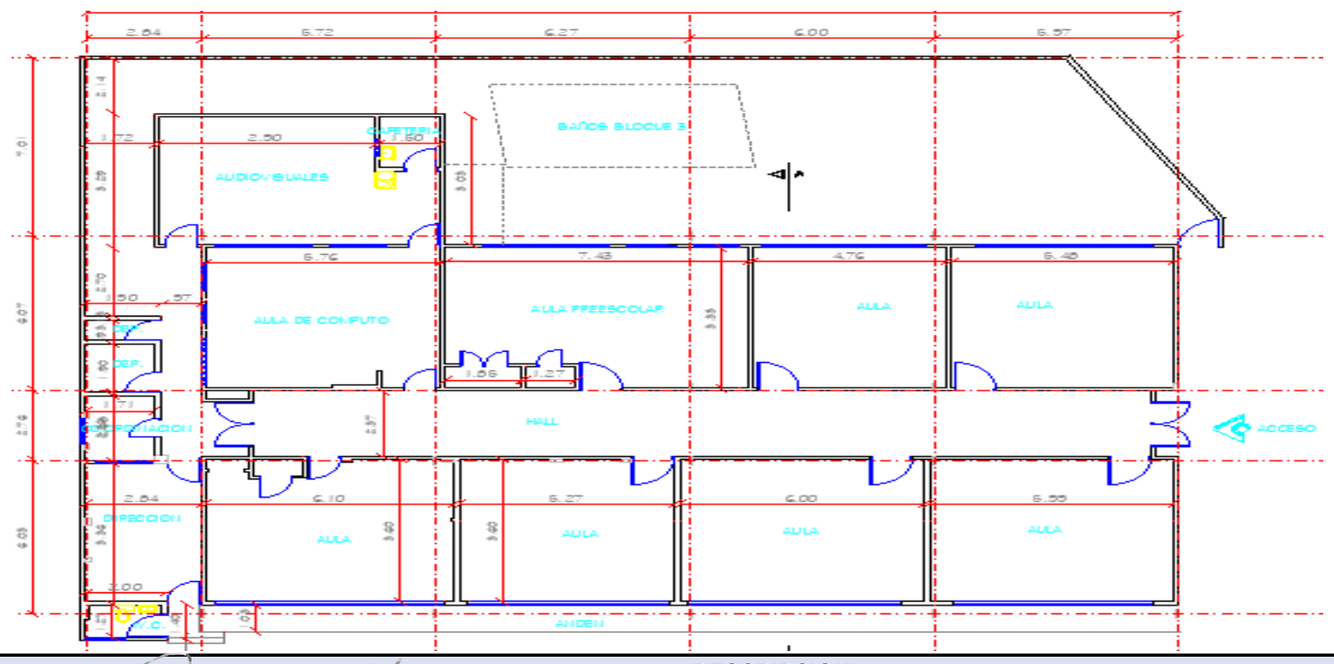

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.80	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1				18,00	18,00
BLOQUE EMISORA B4-P1				4,00	4,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1				20,00	20,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2				24,00	24,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS				0,00	0,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1				18,00	18,00
PASAN:				SUBTOTAL	84,00
				TOTAL	84,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

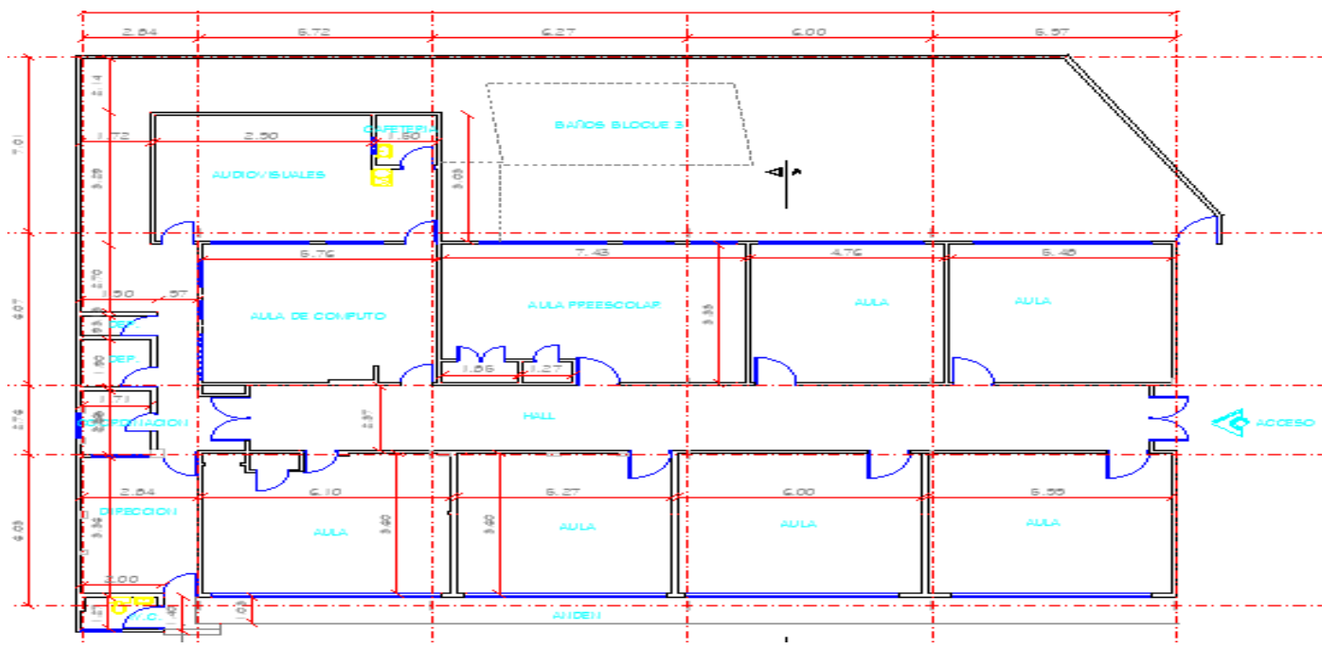

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.2.42	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE (BALONCESTO - VOLEYBOL)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
CANCHA MULTIPLE		13,00	21,00	1,00	273,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	273,00
				TOTAL	273

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

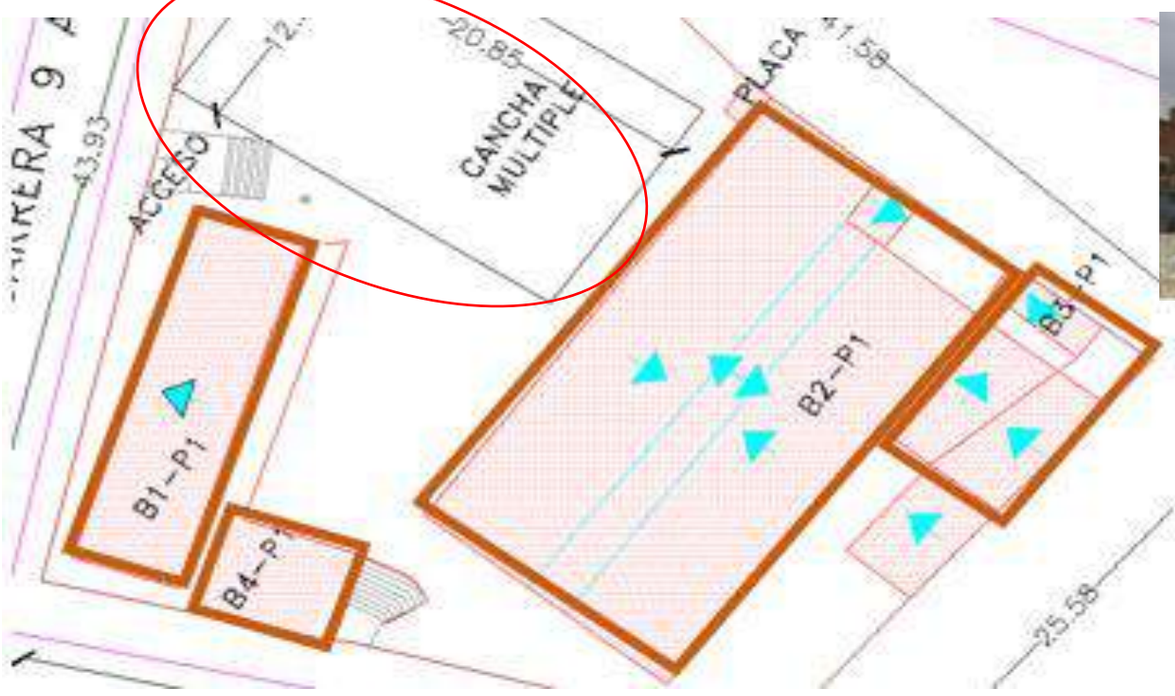



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
12.1.23	ml	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL		1,50	10,00	1,00	10,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	10

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

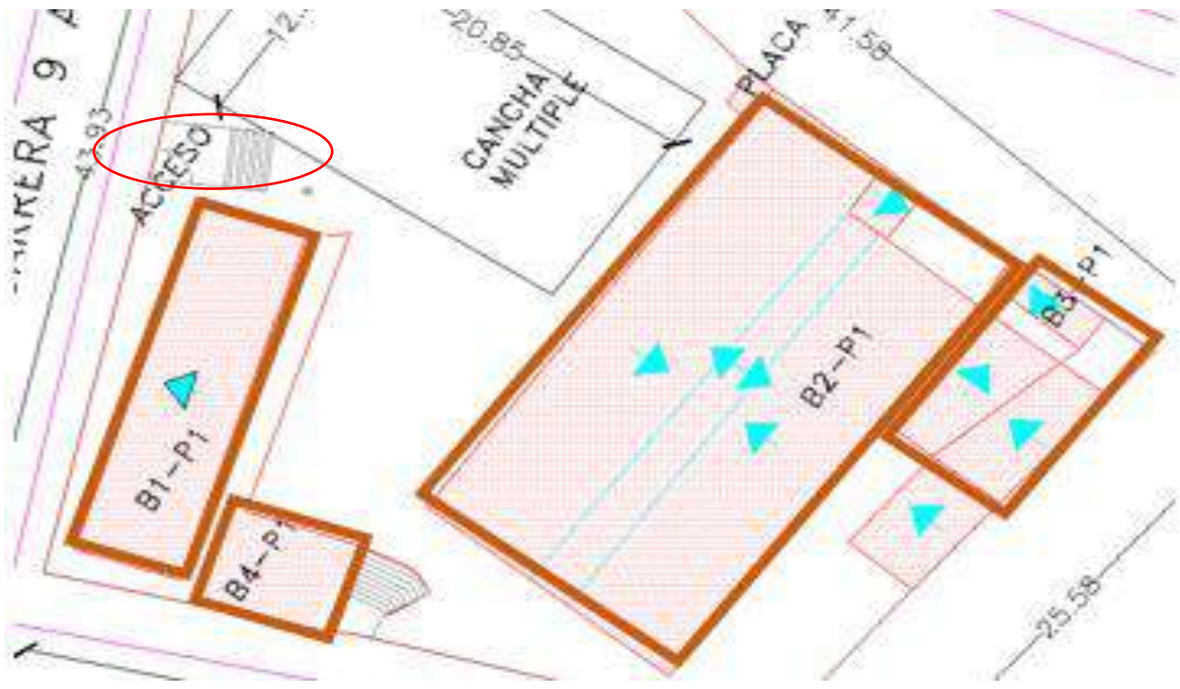

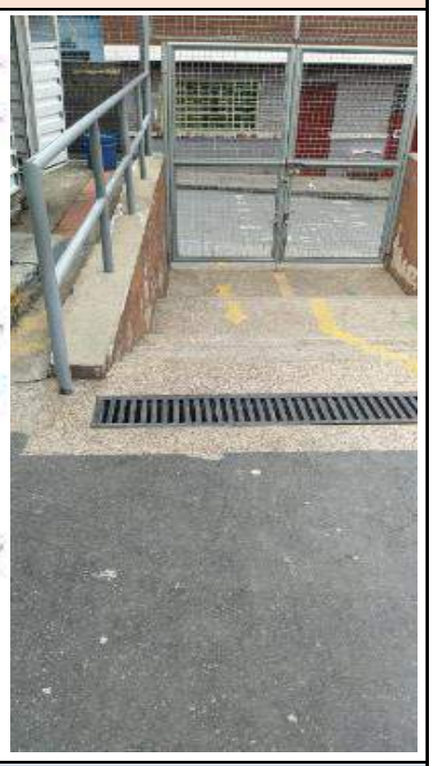

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.04.03	ML	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			19,00	5,00	95
BLOQUE EMISORA B4-P1			0	0	0
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			28	6	168
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			28	6	168
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS			2	25	50
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			11	8	88
PASAN:				SUBTOTAL	569,00
				TOTAL	569,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			24,14	2,0	48,28
BLOQUE EMISORA B4-P1			11	2,0	21,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			36	2,0	72,80
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			36	2,0	72,80
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS			-	0,0	0,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			17,00	2,0	34,00
PASAN:				SUBTOTAL	248,88
				TOTAL	248,88

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

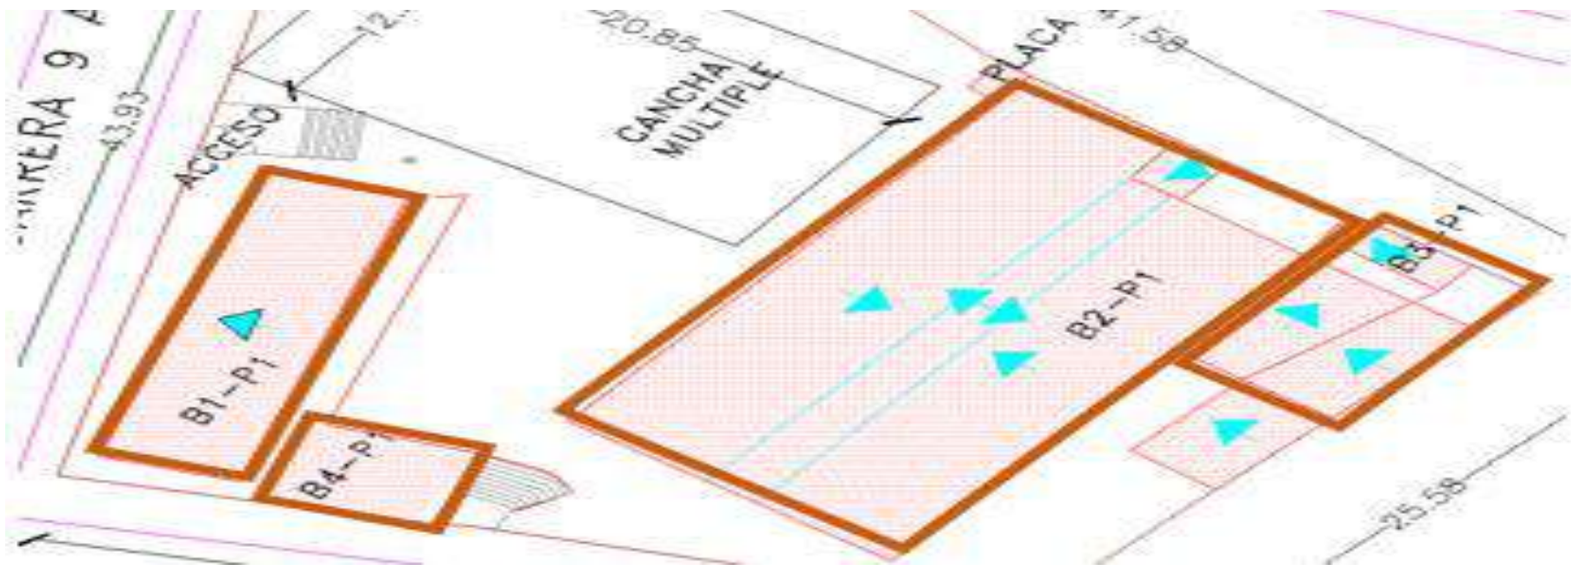

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1					0,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			5,00	1,00	5,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1					0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2					0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS					0,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			11,00	2,00	22,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	27,00
				TOTAL	27,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

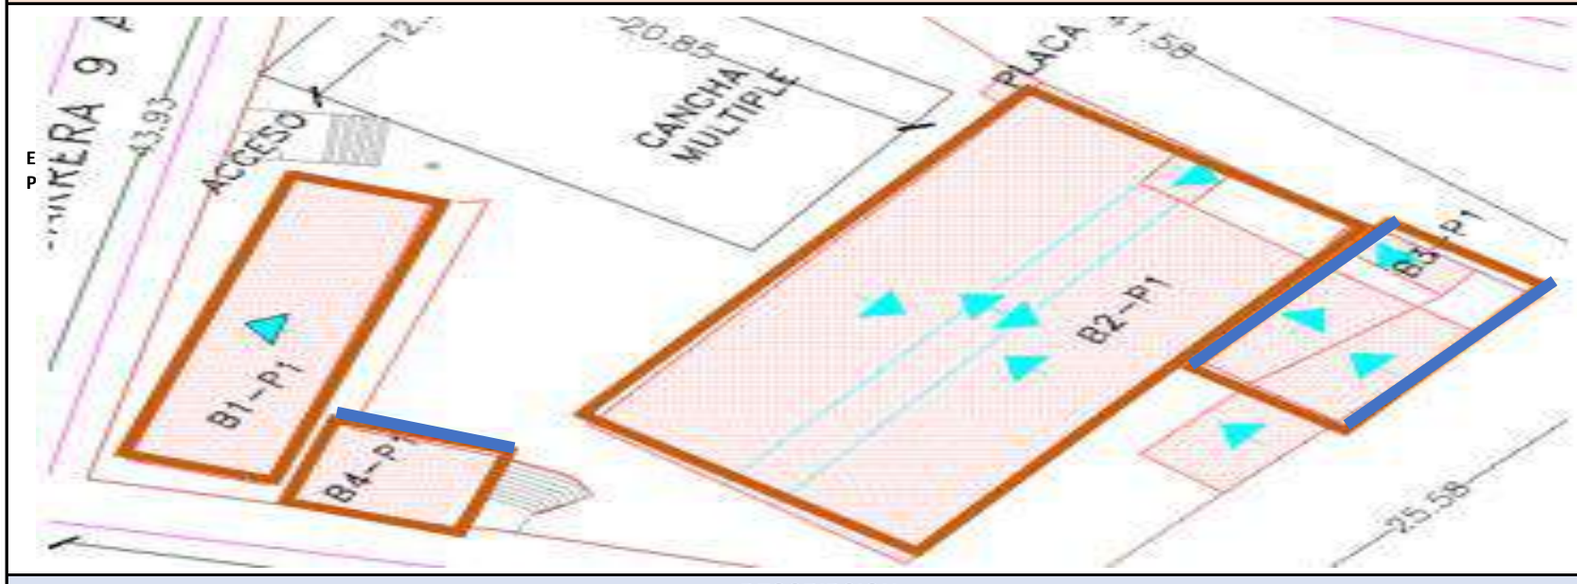

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.05	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			3,5	2,0	7,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			2,5	2,0	5,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1					0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2					0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS			4	2,0	8,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1			3,5	2,0	7,00
PASAN:				SUBTOTAL	27,00
				TOTAL	27,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

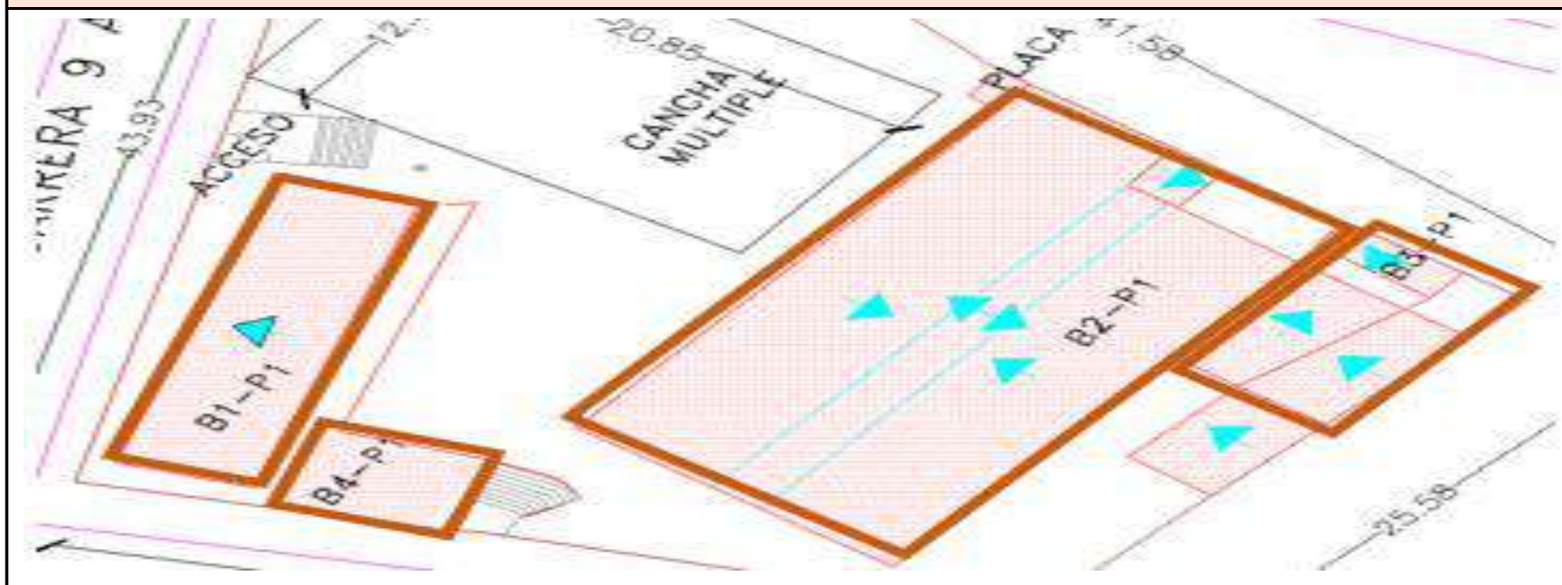

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.07	M	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
IMPERMEABILIZACION VIGAS CAALES		1,00	27	2,0	54,00
	-			1,0	0,00
	-			1,0	0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	54,00
				TOTAL	54,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

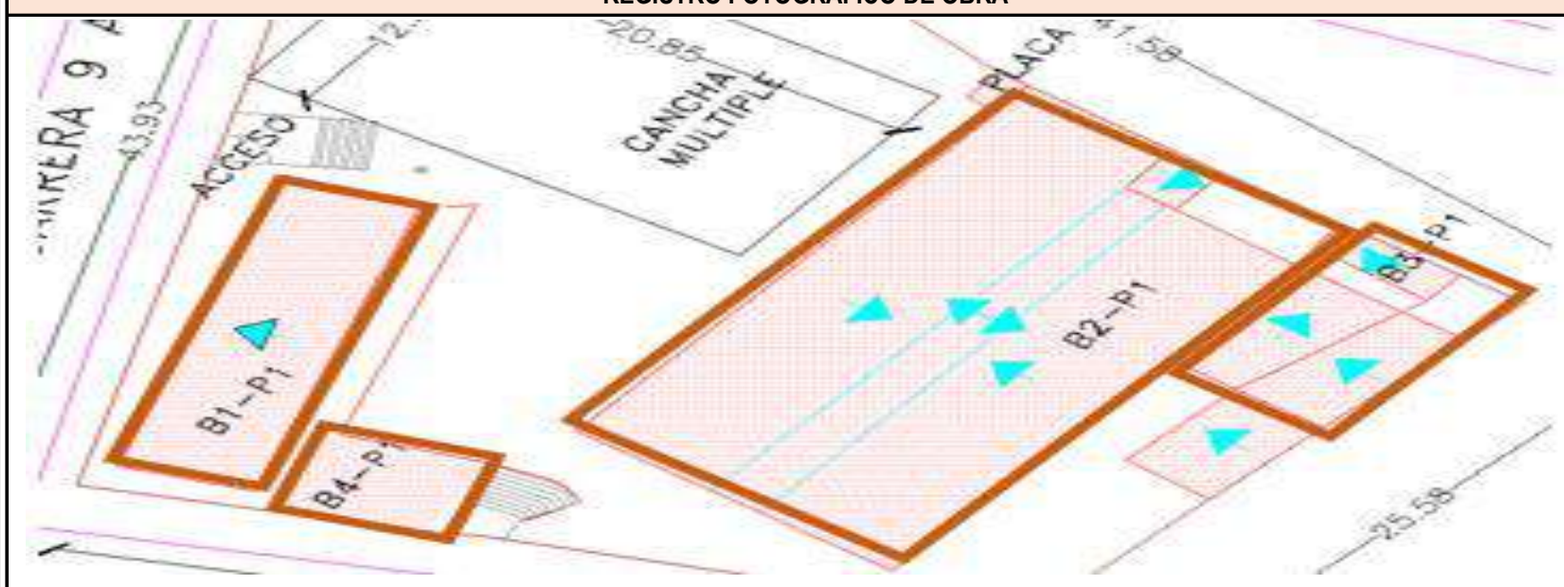

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	% A INSTALAR	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1					
BLOQUE EMISORA B4-P1					
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1					
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2					
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS	100%	2,50	27,00	10%	74,25
BLOQUE AUDITORIO B3-P1					
PASAN:				SUBTOTAL	74,25
				TOTAL	74,25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

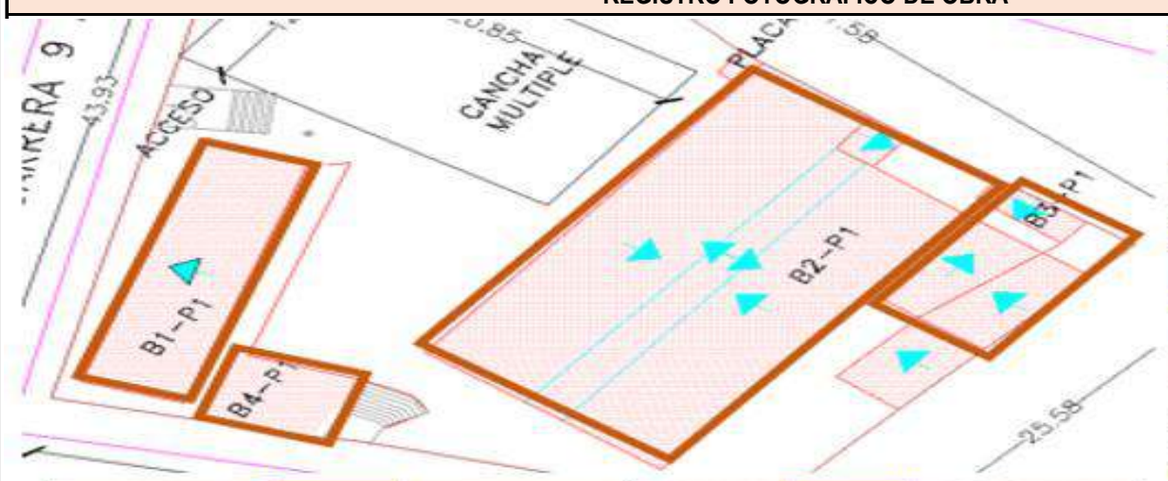











DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	% A INSTALAR	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1	20%	5,20	18,97	5%	20,72
BLOQUE EMISORA B4-P1	100%	3,00	4,50	5%	14,18
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1	40%	6,14	27,00	7%	70,95
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2	40%	6,1	27,00	7%	66,95
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS					
BLOQUE AUDITORIO B3-P1	100%	7,00	11,00	5%	80,85
CUBIERTA AD					100
PASAN:				SUBTOTAL	353,64
				TOTAL	353,64

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

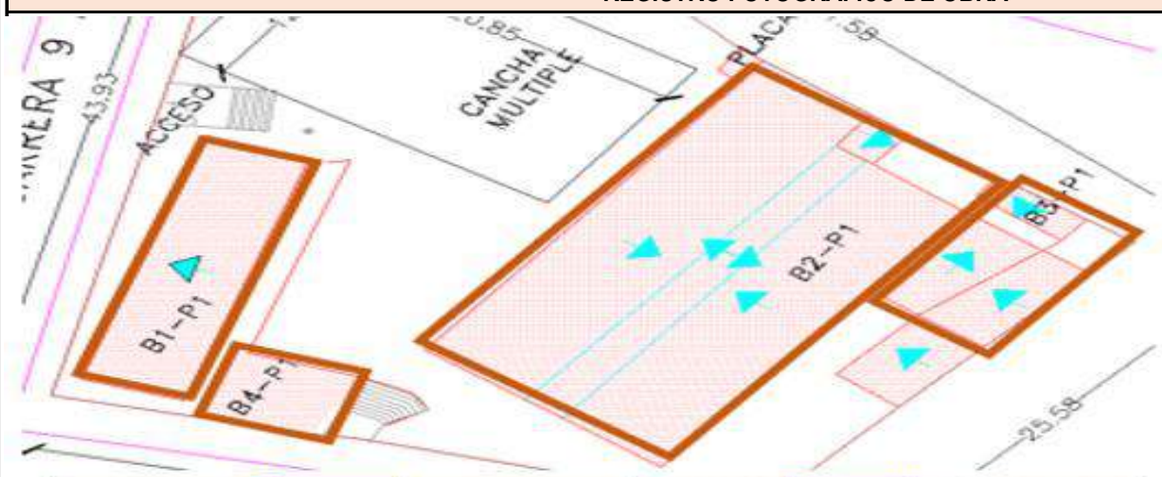











DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**REINO DE HOLANDA SEDE B**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
BLOQUE AULAS B1-P1			19	1,0	19,00
BLOQUE EMISORA B4-P1			5	1,0	5,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 1			28	2,0	56,00
BLOQUE AULAS B2-P1 ALA 2			-		0,00
BLOQUE AULAS B2-P1 CORREDOR CENTRAL TEJAS TRASLUCIDAS			11	1,0	11,00
BLOQUE AUDITORIO B3-P1					
PASAN:				SUBTOTAL	91,00
				TOTAL	91,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

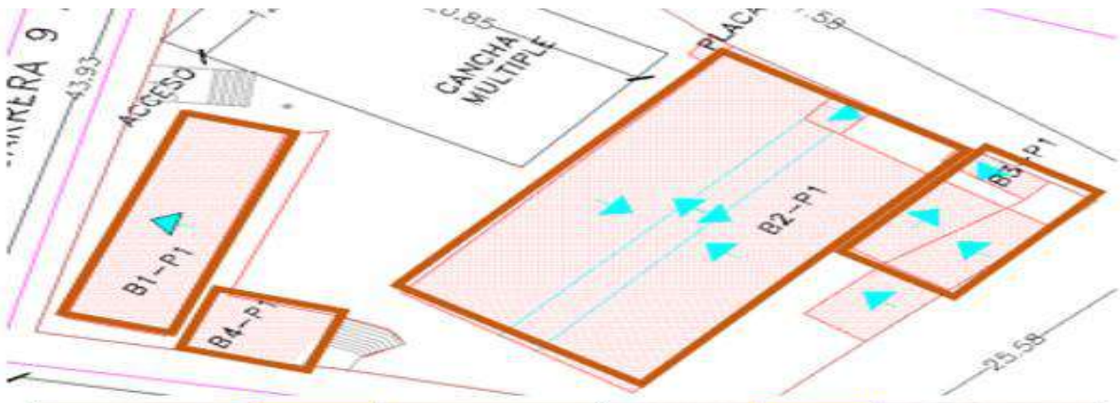











DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia Gp Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.01	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
ASEO AREAS A INTERVENIR		39,00	30,00	1,00	1170,00
					0,00
					0,00

PASAN:		SUBTOTAL	1170,00
		TOTAL	1170,00

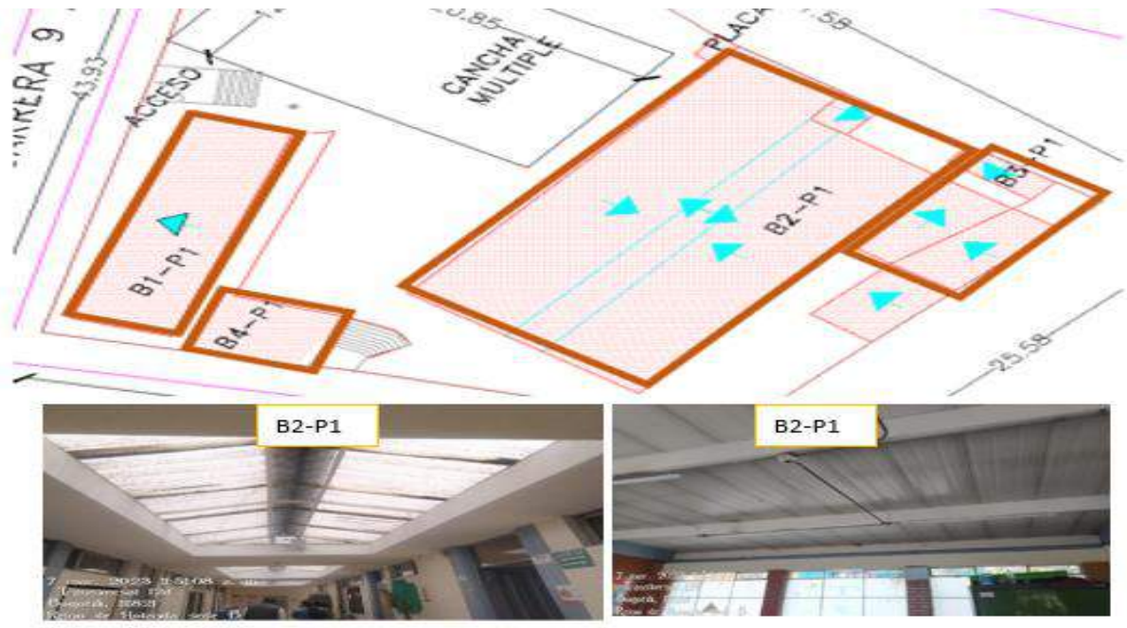







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO MARUECOS Y MOLINOS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2	1424,00	$ 3.222,00	$ 4.588.128,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	70,00	$ 35.570,00	$ 2.489.900,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,00	$ 35.793,00	$ 2.004.408,00
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,00	$ 30.664,00	$ 1.717.184,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	33,00	$ 24.791,00	$ 818.103,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,40	$ 26.351,00	$ 115.944,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,00	$ 29.215,00	$ 3.505.800,00
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1083,62	$ 20.991,00	$ 22.746.267,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 37.985.734,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	8,10	$ 772.848,00	$ 6.260.069,00
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	96,00	$ 81.315,00	$ 7.806.240,00
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	28,00	$ 88.815,00	$ 2.486.820,00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	10450,00	$ 16.242,00	$ 169.728.900,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 186.282.029,00**
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 144.994,00	$ 579.976,00

5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 144.482,00	$ 577.928,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	410,00	$ 18.061,00	$ 7.405.010,00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	36,00	$ 168.166,00	$ 6.053.976,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 14.616.890,00**
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	1083,62	$ 44.020,00	$ 47.700.952,00
SUBTOTAL	**7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 47.700.952,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	13,20	$ 563.283,00	$ 7.435.336,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 7.435.336,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	33,00	$ 33.591,00	$ 1.108.503,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.2.7	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1495,99	$ 28.677,00	$ 42.900.505,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1600,00	$ 23.886,00	$ 38.217.600,00
SUBTOTAL	**13.PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 82.226.608,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	1083,62	$ 58.194,00	$ 63.060.182,00

17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	210,00	$ 250.250,00	$ 52.552.500,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 115.612.682,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1424,00	$ 7.708,00	$ 10.976.192,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 10.976.192,00**

VALOR TOTAL	**$ 502.836.423,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 502.836.423,00**

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ L.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.1	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			1.424,00	1	1424,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	1424,00
					TOTAL	1424

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

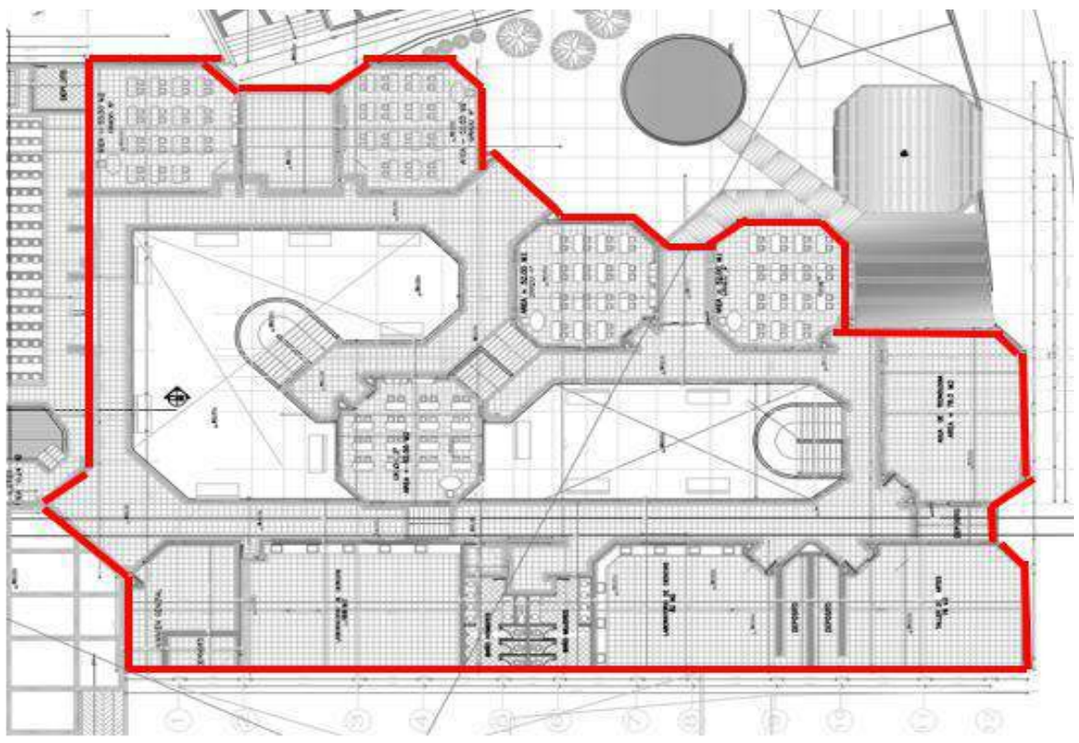

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.1.3	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Longitud 1	24,00			2	48,00
Longitud 2	11,00			2	22,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	70,00
				TOTAL	70

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

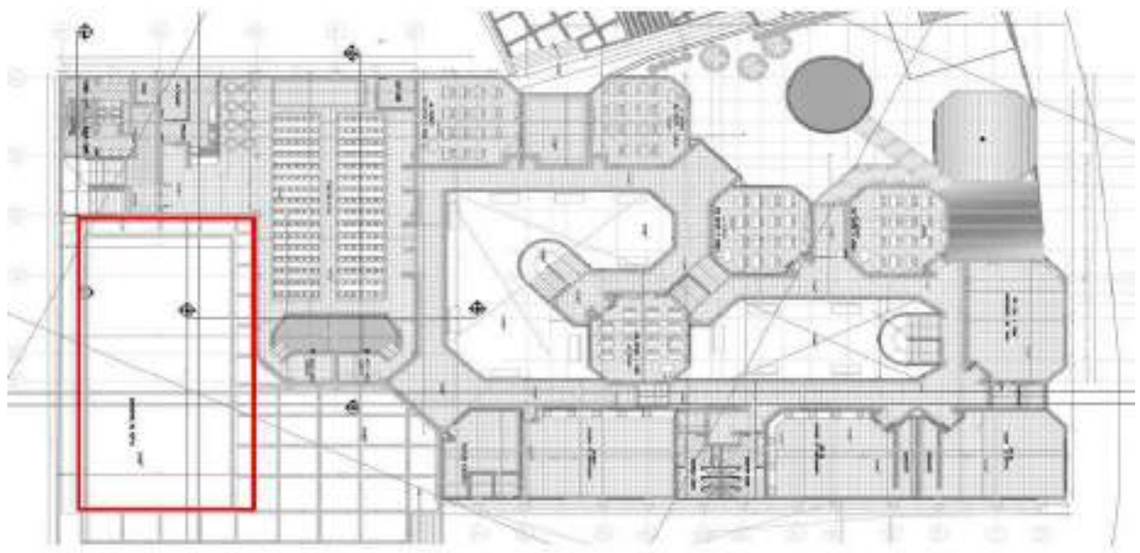

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.10	M2	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					0,00
PISO 1	28,00	7	4,00	2	56,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	56,00
				TOTAL	56

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

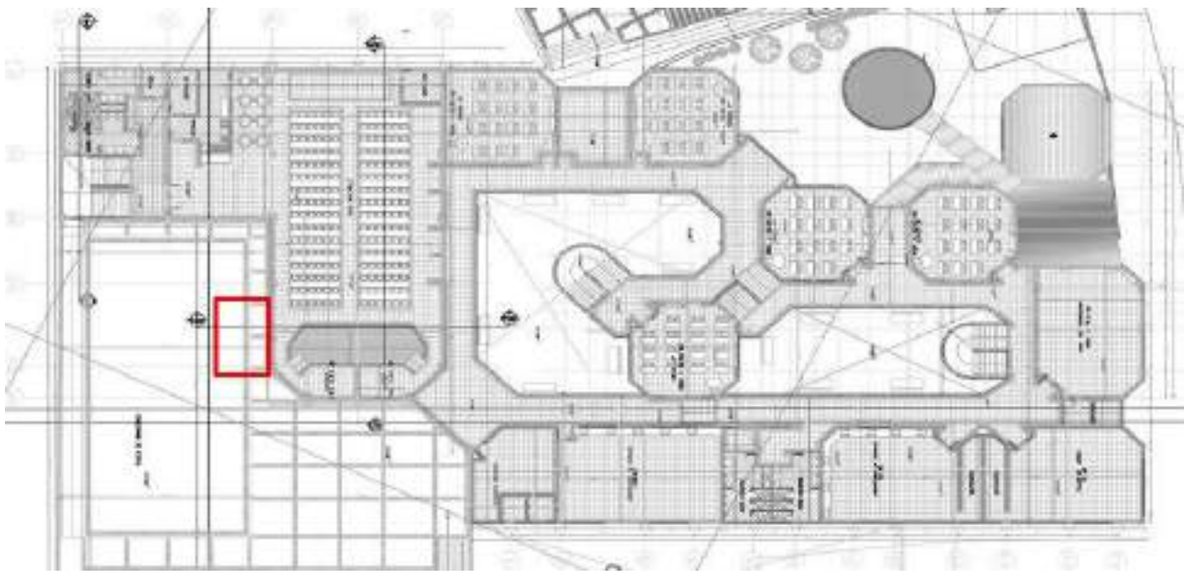

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.14	M2	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	LARGO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 1	28,00	7	4,00	2	56,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	56,00
				TOTAL	56

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

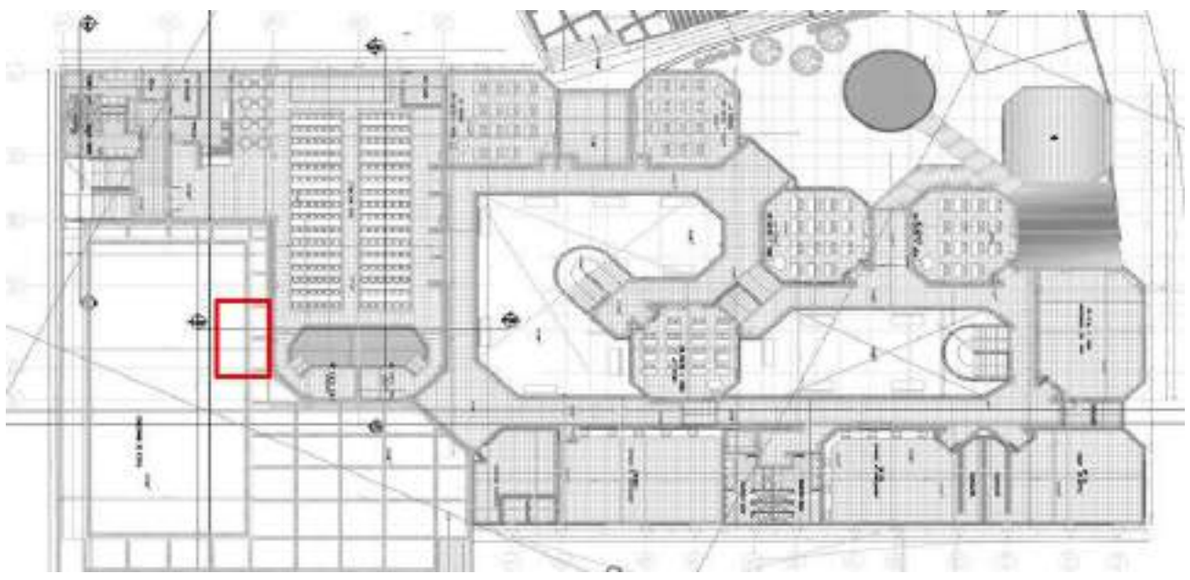

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULA 1	7,00	3,00		1,00	21,00
AULA 2	4,00	3,00		1,00	12,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	33,00
				TOTAL	33

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

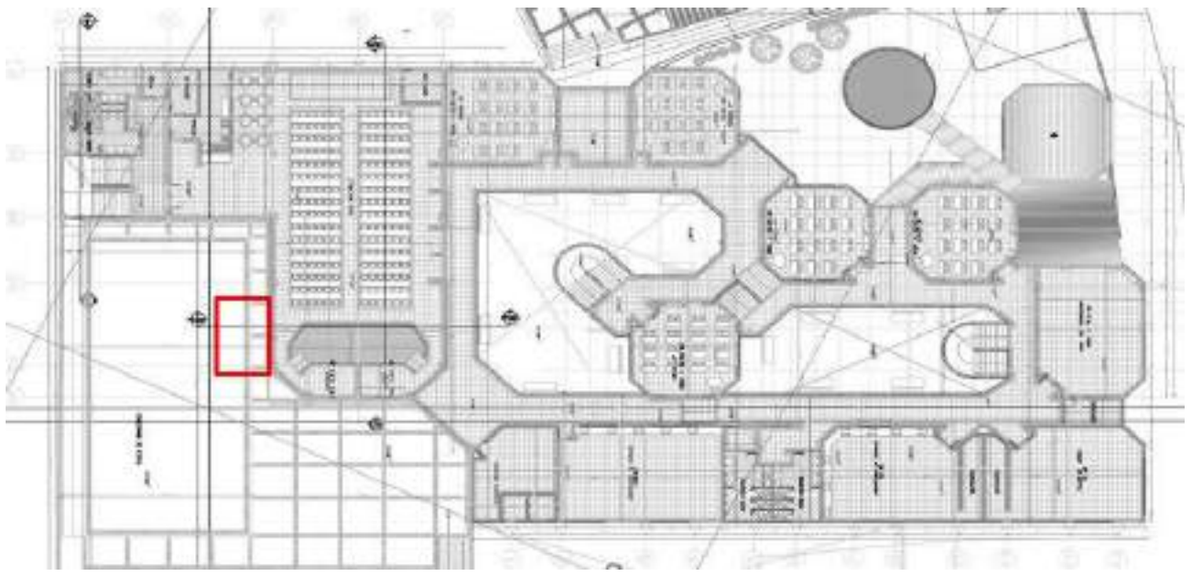

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	PISOS	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 1	1,00	2,2	2,00	1	4,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,40
				TOTAL	4,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

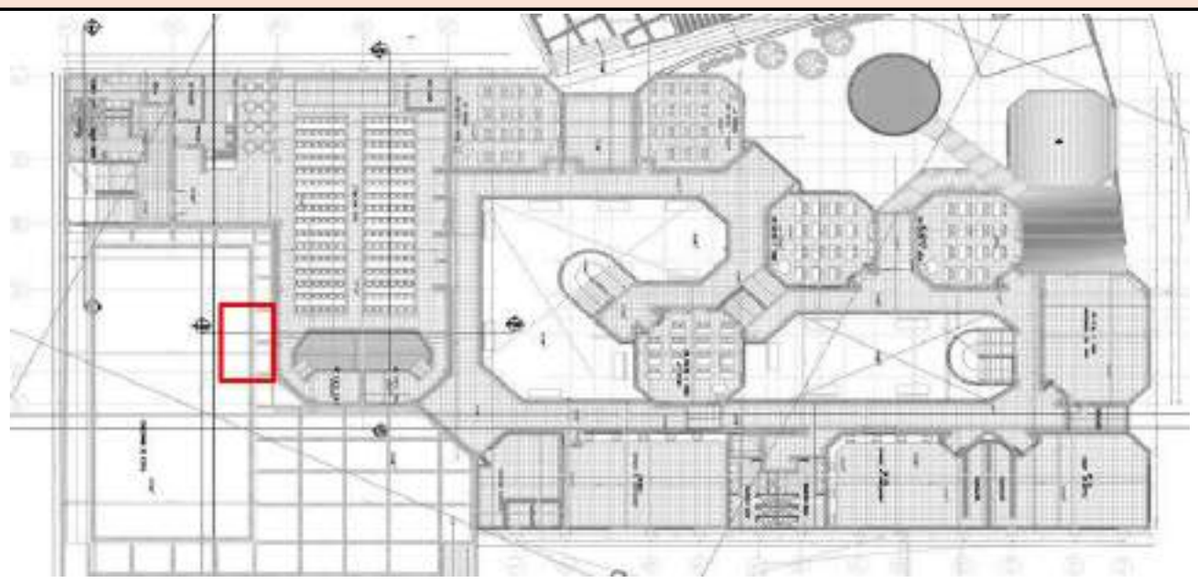

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1	120,00			1	120,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	120,00
					TOTAL	120

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

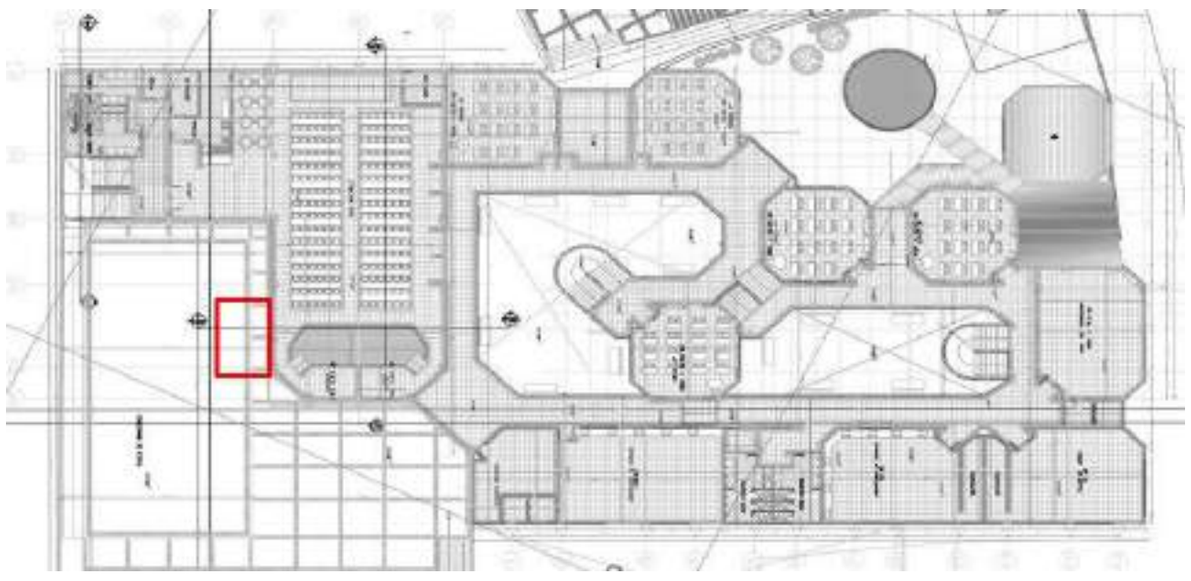

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1,2,52	M2	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			1.424,00	1	1424,00
				202,98	-1	-202,98
				137,40	-1	-137,40
PASAN:					**SUBTOTAL**	1083,62
					TOTAL	1083,62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

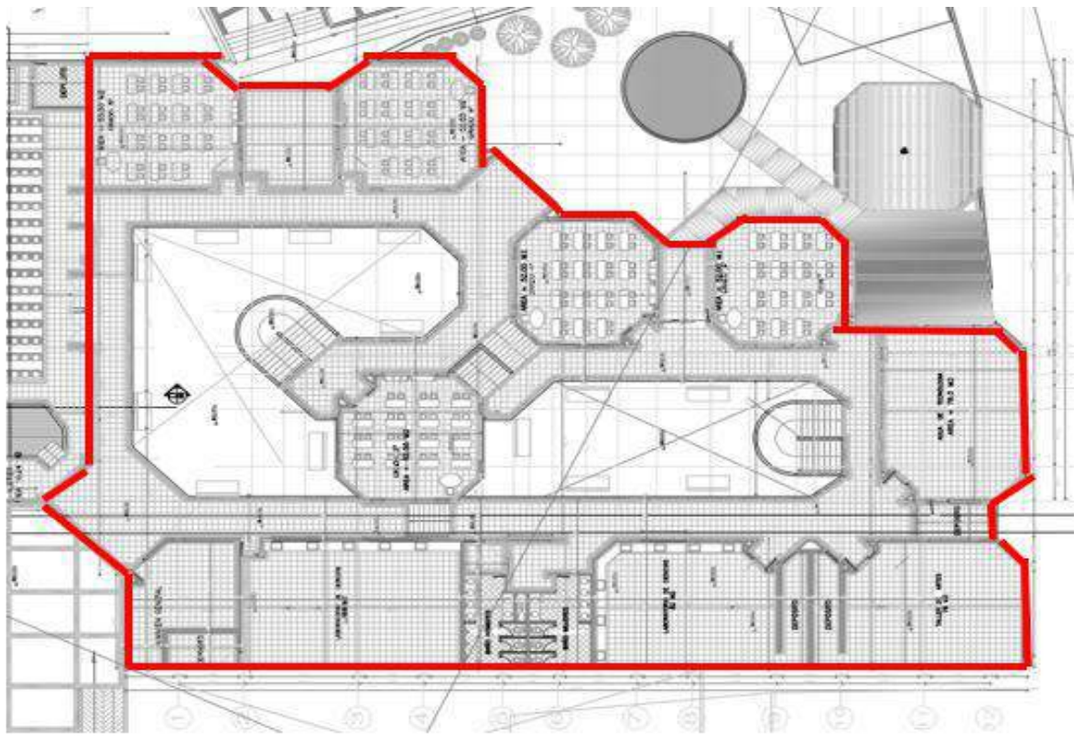

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.4	M3	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PROFUNDIDAD	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA 1	0,30	1,00	1,00	9,00	2,70
	0,30	1,00	1,00	9,00	2,70
	0,30	1,00	1,00	9,00	2,70
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,10
				TOTAL	8,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

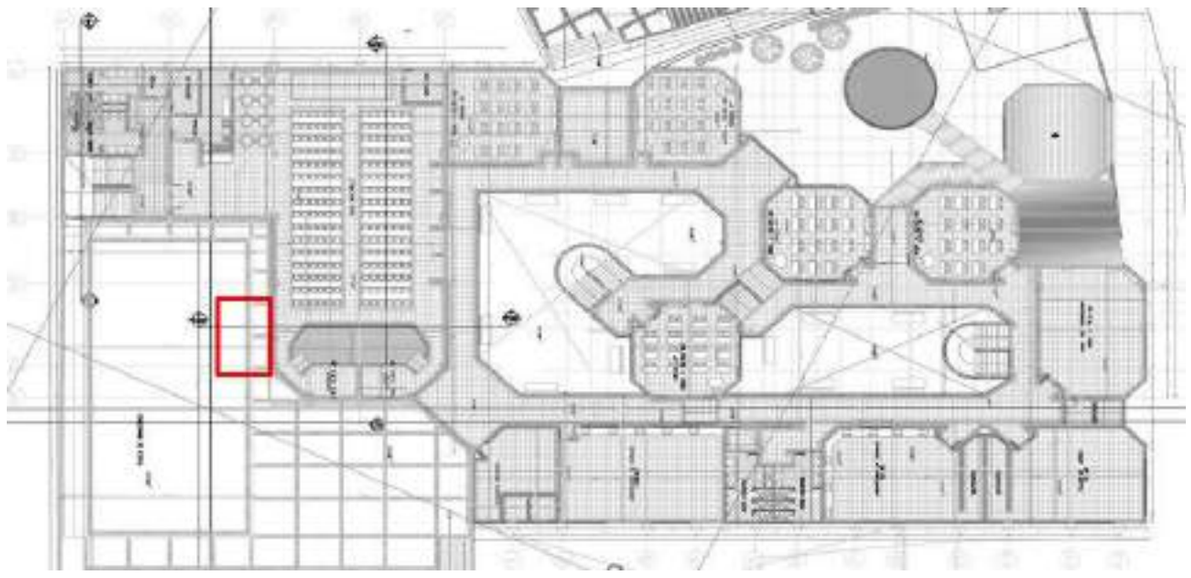

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.6	M	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PROFUNDIDAD	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA 1			8,00	4,00	32,00
			8,00	4,00	32,00
			8,00	4,00	32,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	96,00
				TOTAL	96

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

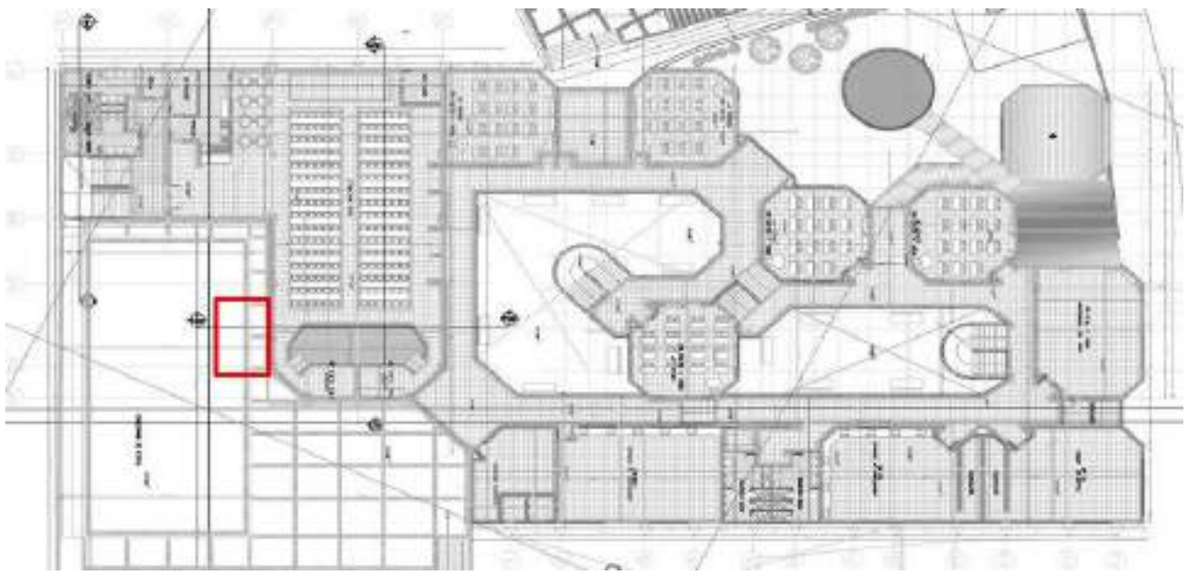

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.2.24	M2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ALTO	ANCHO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 1	28,00	7	4,00	1	28,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	28,00
				TOTAL	28

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

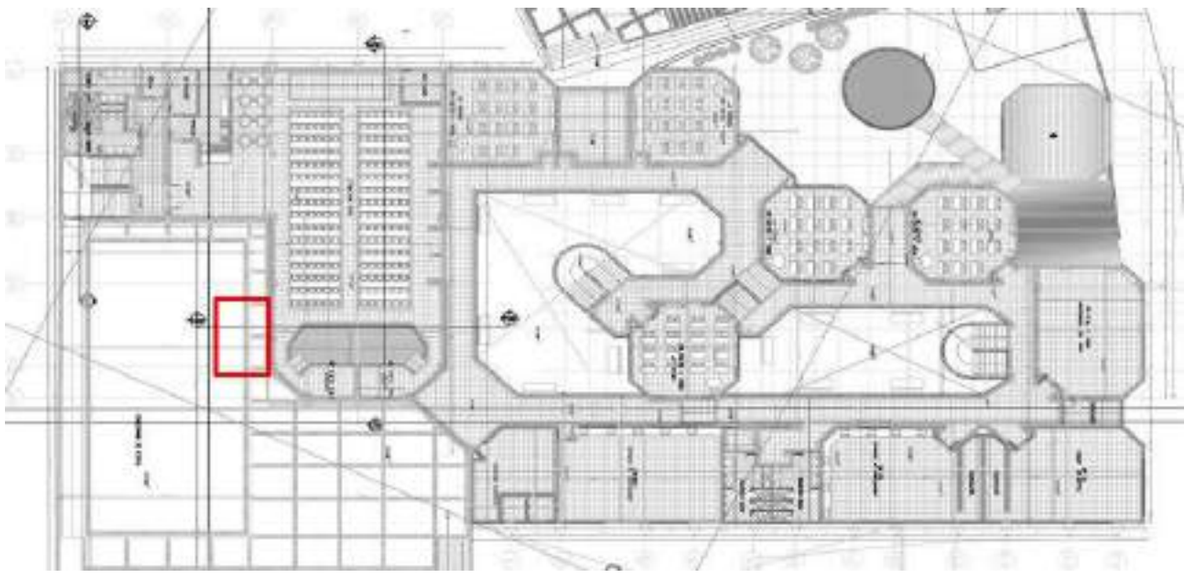

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.5.2	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	KG POR METRO	TOTAL
EDIFICACIONES					
Reforzamiento estructura cubierta	190,00			55	10450,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10450,00
				TOTAL	10450

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.1	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO CUBIERTA			4,00	1	4,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,00
				TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

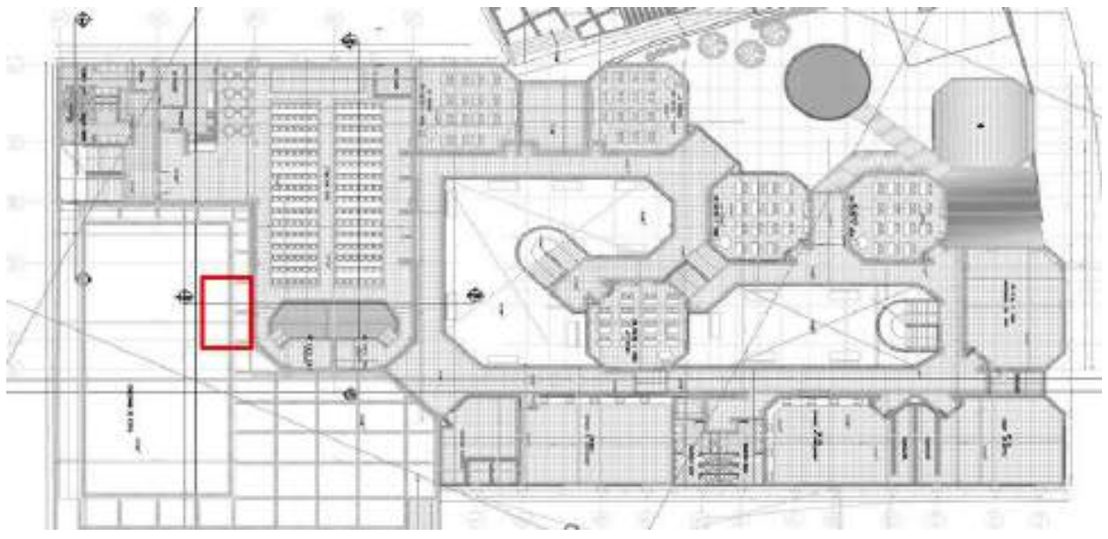

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO CUBIERTA			4,00	1	4,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,00
				TOTAL	4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

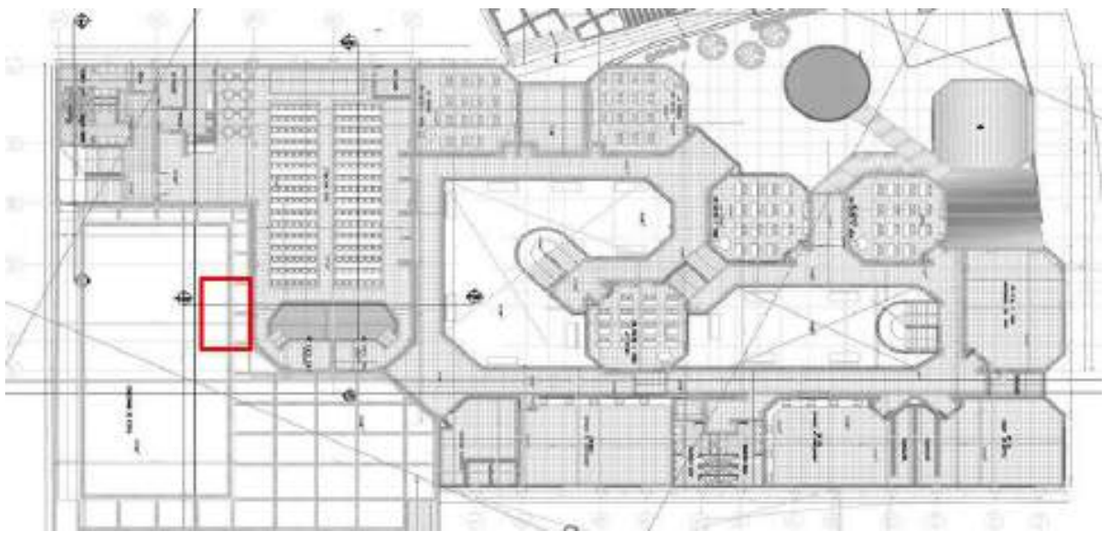

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS BAJO CUBIERTA			82,00	5	410,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	410,00
				TOTAL	410

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

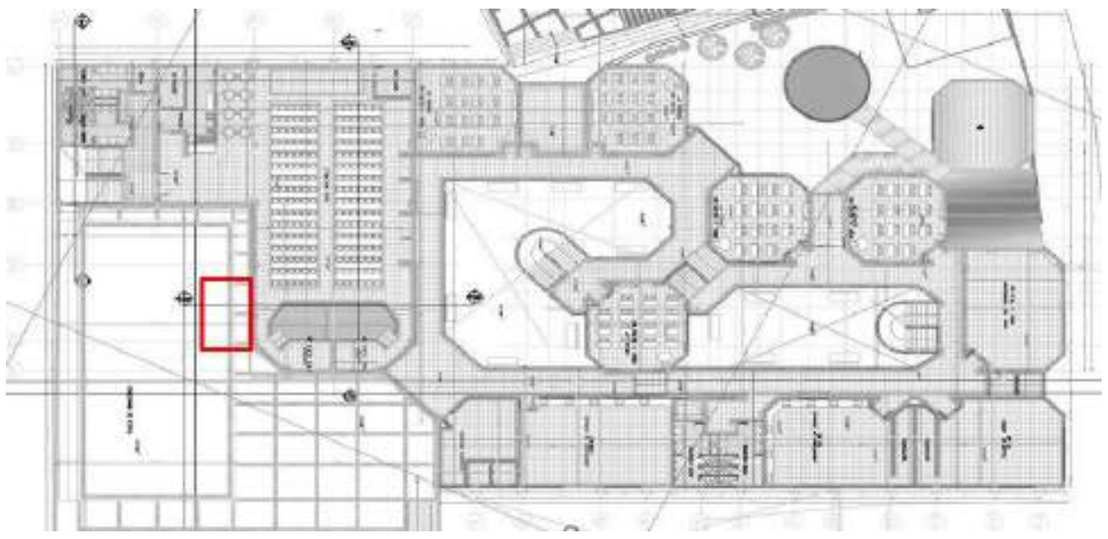

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.88	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	CANT. POR AULA	CANTIDAD AULAS	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULAS			18,00	2	36,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	36,00
				TOTAL	36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

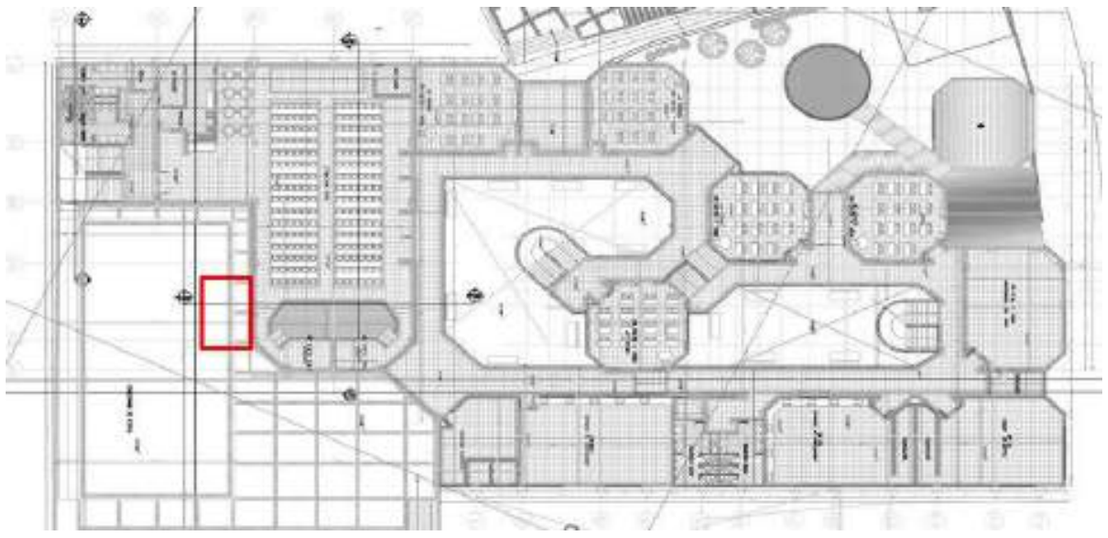

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
7.1.2	M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1			1.424,00	1	1424,00
				202,98	-1	-202,98
				137,40	-1	-137,40
					SUBTOTAL	1083,62
PASAN:					TOTAL	1083,62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

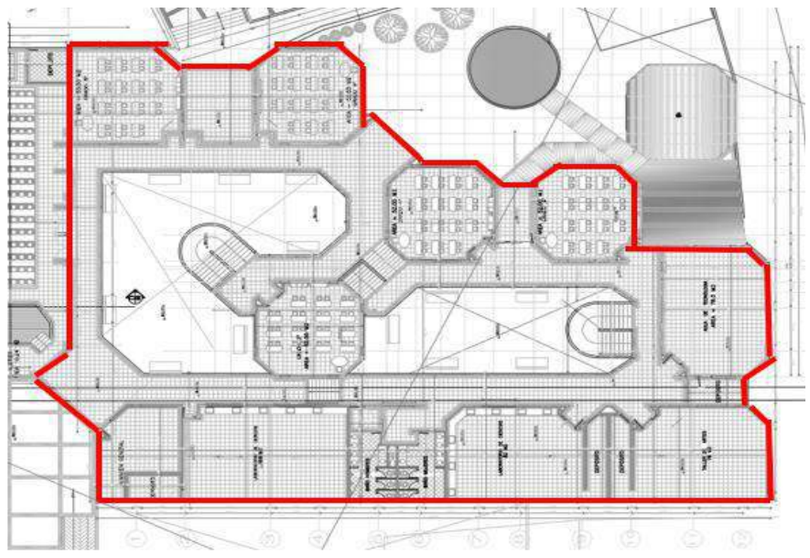

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.1.3	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
PISO 1		2	2,20	3	13,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	13,20
				TOTAL	13,2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

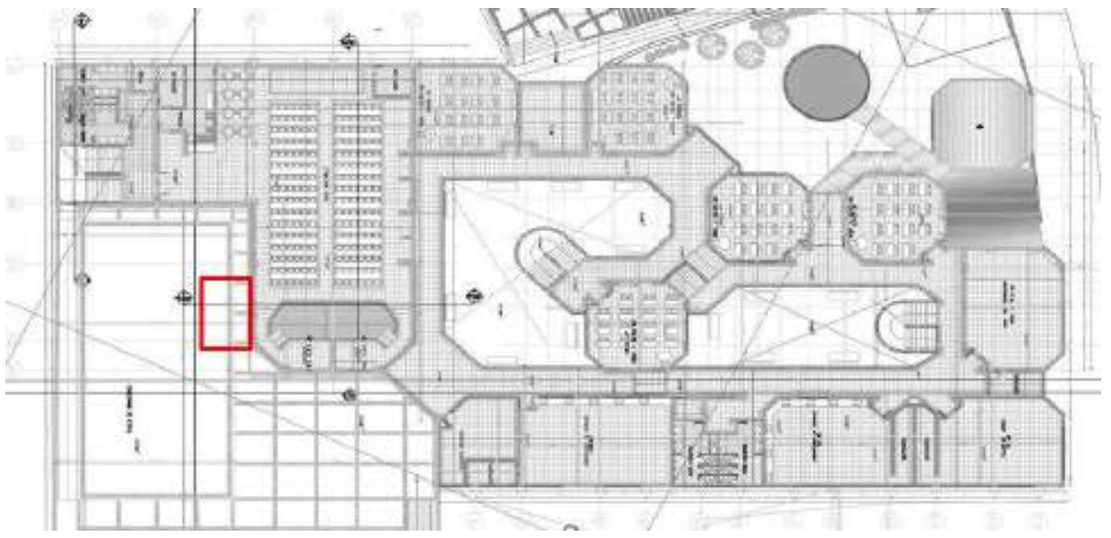

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.1	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
AULA 1	7,00	3,00		1,00	21,00
AULA 2	4,00	3,00		1,00	12,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	33,00
				TOTAL	33

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

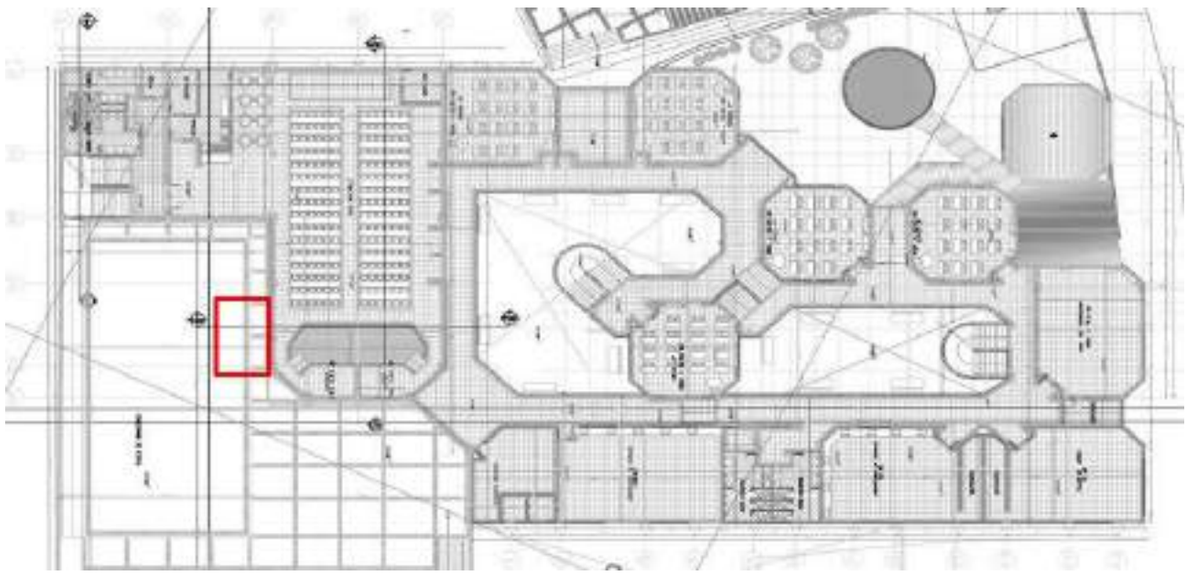

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.7	M2	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
TARIMA	7,00		3,00	1,00	21,00
	4,00		3,00	1,00	12,00
PISO 2	114,92		2,5	1,00	287,30
	30,88		2,5	1,00	77,20
	51,28		2,5	1,00	128,20
	56,73		2,5	1,00	141,83
BAJO PLACA	473,79			1,00	473,79
	59,59			1,00	59,59
	136,60			1,00	136,60
	158,48			1,00	158,48
PASAN:				**SUBTOTAL**	1495,99
				TOTAL	1495,99

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

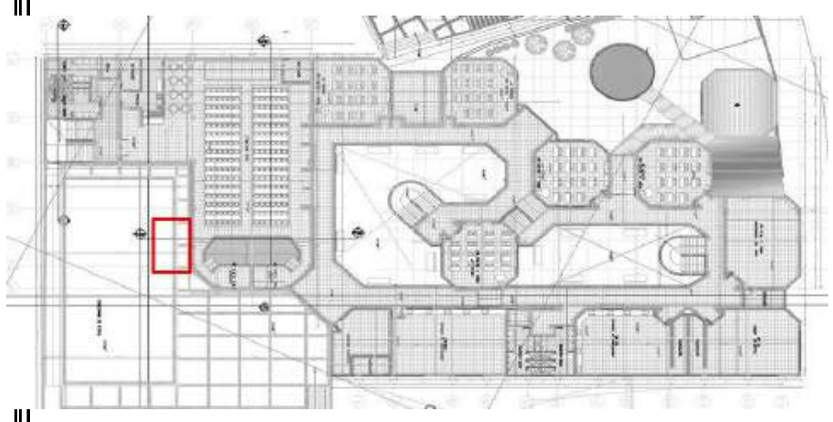

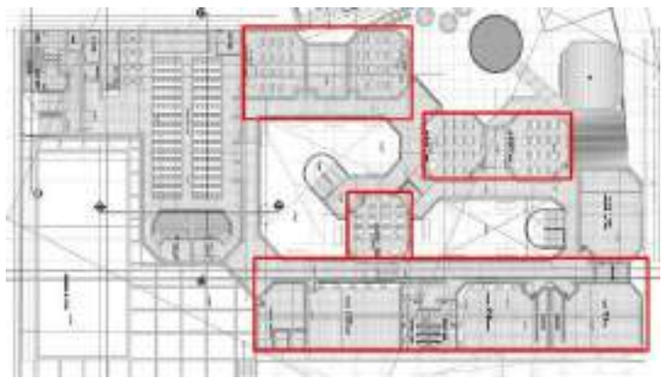

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.4.3	M	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LONG	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
Transversal			20,00	50	1000,00
longitudinal			30,00	20	600,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1600,00
				TOTAL	1600

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

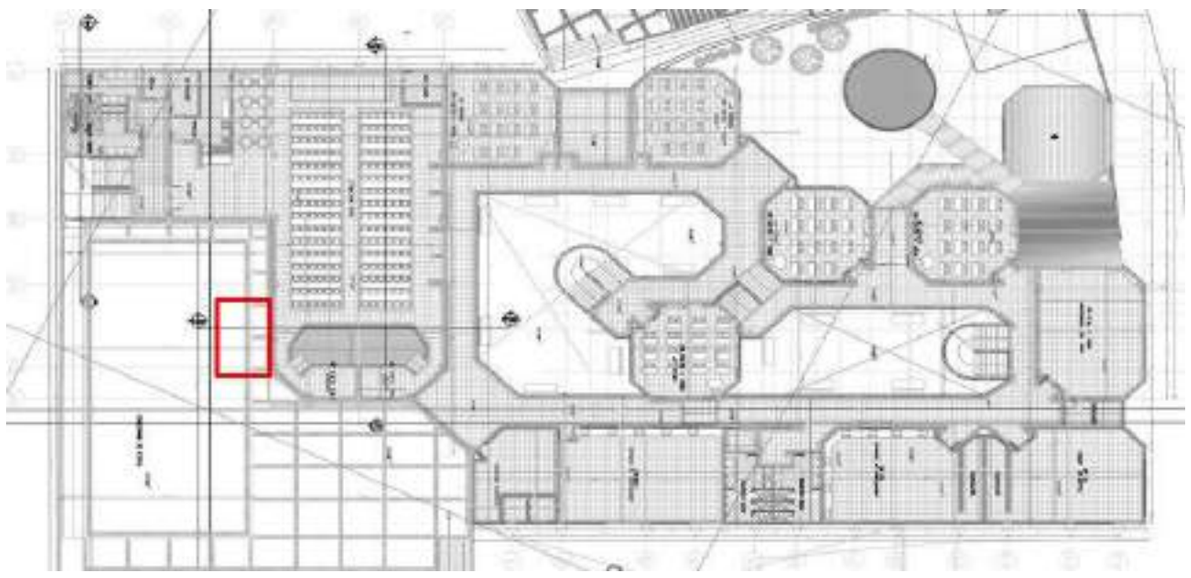

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17,1,7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	AREA 1			1.424,00	1	1424,00
				202,98	-1	-202,98
				137,40	-1	-137,40
PASAN:					**SUBTOTAL**	1083,62
					TOTAL	1083,62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

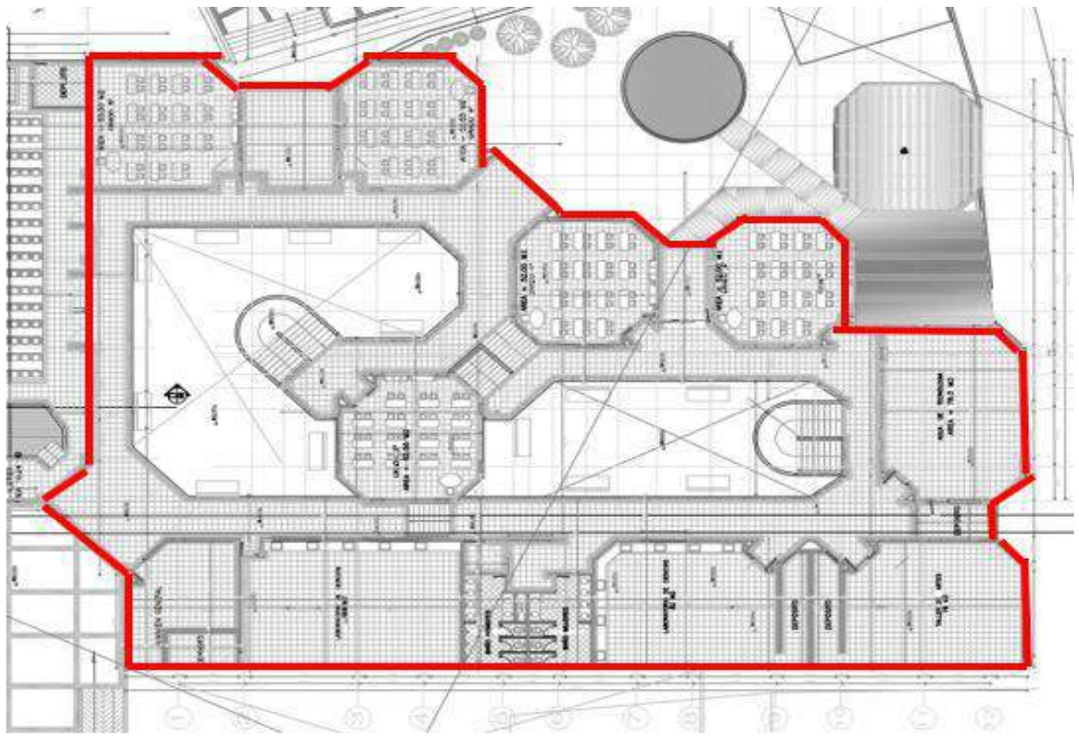

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta						
	AREA 1	210,00			1	210,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	210,00
					TOTAL	210

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

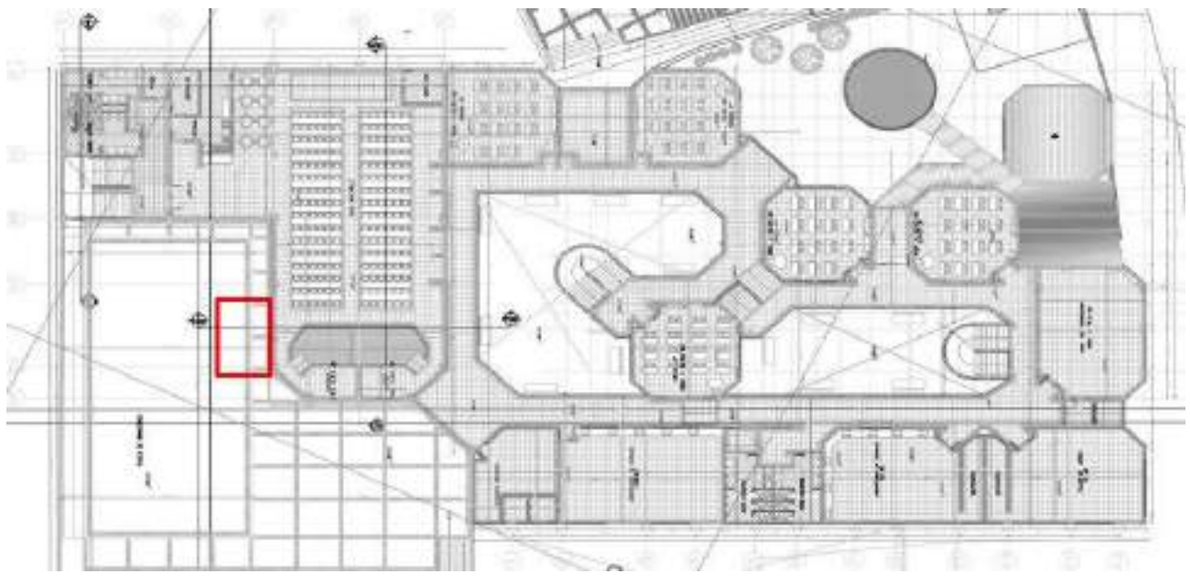

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**			
	FECHA:	**8**	**03**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	ÁREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
AREA CUBIERTA			1.424,00	1	1.424,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1424,00
				TOTAL	1424

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

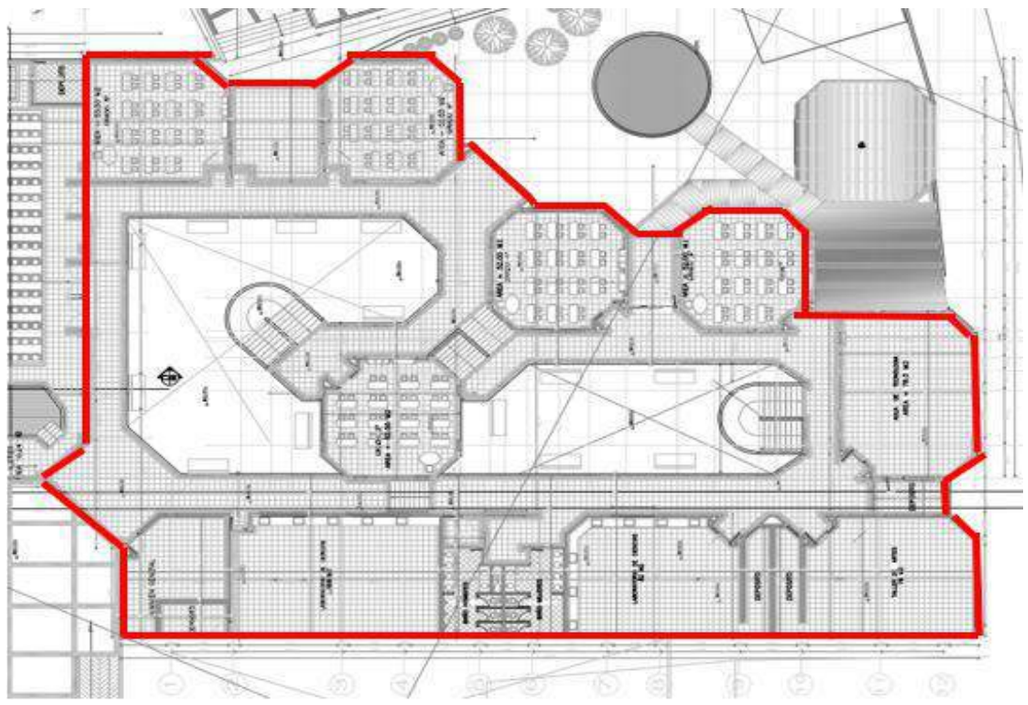

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO EMERGENCIA EN CUBIERTAS COLEGIO SANTA LUCIA CAFAM

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	491.09	$ 21,716.00	$ 10,664,510.00
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	545.79	$ 20,991.00	$ 11,456,678.00
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS	M2	3169.00	$ 13,332.00	$ 42,249,108.00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	491.09	$ 13,327.00	$ 6,544,756.00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 70,915,052.00**
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.21	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E = 0.10 M	UN	2.00	$ 113,427.00	$ 226,854.00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 226,854.00**
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1823.66	$ 33,591.00	$ 61,258,563.00
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	491.09	$ 15,323.00	$ 7,524,972.00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1823.66	$ 17,773.00	$ 32,411,909.00
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 107,946,452.00**
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	639.62	$ 46,709.00	$ 29,876,011.00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	1447.94	$ 58,194.00	$ 84,261,420.00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	25.00	$ 63,665.00	$ 1,591,625.00
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	1864.44	$ 12,701.00	$ 23,680,252.00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 139,409,308.00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	4095.34	$ 7,708.00	$ 31,566,881.00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 31,566,881.00**
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP-07	Desmonte y retiro de flanche en lamina galvanizada calibre 26	M	639.62	$ 18,913.00	$ 12,097,133.00
NP-08	Pintura Reflectiva de Aluminio para Protección de Cubiertas (Incluye andamios certificados)	M2	1447.94	$ 44,990.00	$ 65,142,821.00
SUBTOTAL	**NP. ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				**$ 77,239,954.00**

VALOR TOTAL	**$ 427,077,647.00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 427,077,647.00**

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.19	M	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59			1	90.59
	E. amarillo	84.02			1	84.02
	E. rojo	84.02			1	84.02
	E. morado	108.11			1	108.11
	E. azul	124.35			1	124.35
	E. amarillo 2				1	0.00
	E. amarillo 2 placa				1	0.00
PASAN:					SUBTOTAL	491.09
					TOTAL	491.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	10	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.3.2	M2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLIUYE CAMBIO DE TEJAS

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde			477.00	1	477.00
	E. amarillo			416.00	1	416.00
	E. rojo			416.00	1	416.00
	E. morado			509.00	1	509.00
	E. azul			607.00	1	607.00
	E. amarillo 2			744.00	1	744.00
PASAN:					SUBTOTAL	3169.00
					TOTAL	3169

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.52	M2	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59	1	90.59	1	90.59
	E. amarillo	84.02	1	84.02	1	84.02
	E. rojo	84.02	1	84.02	1	84.02
	E. morado	108.11	1	108.11	1	108.11
	E. azul	124.35	1	124.35	1	124.35
	E. amarillo 2			13.92	1	13.92
	E. amarillo 2 placa			40.78	1	40.78
PASAN:					SUBTOTAL	545.79
					TOTAL	545.79

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.4.1	M	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59			1	90.59
	E. amarillo	84.02			1	84.02
	E. rojo	84.02			1	84.02
	E. morado	108.11			1	108.11
	E. azul	124.35			1	124.35
PASAN:					SUBTOTAL	491.09
					TOTAL	491.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	10	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.3	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59	2.2	199.30	1	199.30
	E. amarillo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. rojo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. morado	108.11	2.2	237.84	1	237.84
	E. azul	124.35	2.2	273.57	1	273.57
	E. amarillo 2	148.53	2.2	326.77	1	326.77
	placas					
	E. amarillo 2 - piso 1			208.25	1	208.25
	E. amarillo 2 - piso 2			208.25	1	208.25
PASAN:					SUBTOTAL	1823.66
					TOTAL	1823.66

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.2	M	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59			1	90.59
	E. amarillo	84.02			1	84.02
	E. rojo	84.02			1	84.02
	E. morado	108.11			1	108.11
	E. azul	124.35			1	124.35
	E. amarillo 2				1	0.00
	E. amarillo 2 placa				1	0.00
PASAN:					SUBTOTAL	491.09
					TOTAL	491.09

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.3.21	UN	PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E = 0.10 M

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. amarillo				2	2.00
PASAN:					SUBTOTAL	2.00
					TOTAL	2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.2.1	M2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59	2.2	199.30	1	199.30
	E. amarillo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. rojo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. morado	108.11	2.2	237.84	1	237.84
	E. azul	124.35	2.2	273.57	1	273.57
	E. amarillo 2	148.53	2.2	326.77	1	326.77
	placa					
	E. amarillo 2 - piso 1			208.25	1	208.25
	E. amarillo 2 - piso 2			208.25	1	208.25
PASAN:					SUBTOTAL	1823.66
					TOTAL	1823.66

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.1	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59			1	90.59
	E. amarillo	84.02			1	84.02
	E. rojo	84.02			1	84.02
	E. morado	108.11			1	108.11
	E. azul	124.35			1	124.35
	E. amarillo 2	148.53			1	148.53
PASAN:					SUBTOTAL	639.62
					TOTAL	639.62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.5	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. amarillo	25.00			1	25.00
PASAN:					SUBTOTAL	25.00
					TOTAL	25

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.7	M2	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59	2.2	199.30	1	199.30
	E. amarillo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. rojo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. morado	108.11	2.2	237.84	1	237.84
	E. azul	124.35	2.2	273.57	1	273.57
	E. amarillo 2	148.53	2.2	326.77	1	326.77
	E. amarillo 2 placa			40.78	1	40.78
PASAN:					SUBTOTAL	1447.94
					TOTAL	1447.94

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	10	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.33	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59	2.2	199.30	1	199.30
	E. amarillo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. rojo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. morado	108.11	2.2	237.84	1	237.84
	E. azul	124.35	2.2	273.57	1	273.57
	E. amarillo 2	148.53	2.2	326.77	1	326.77
	placa					
	E. amarillo 2			40.78	1	40.78
	placa					
	E. amarillo 2 - piso 1			208.25	1	208.25
	E. amarillo 2 - piso 2			208.25	1	208.25
PASAN:					SUBTOTAL	1864.44
					TOTAL	1864.44

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	10	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde			663.24	1	663.24
	E. amarillo			526.90	1	526.90
	E. rojo			532.09	1	532.09
	E. morado			625.59	1	625.59
	E. azul			776.94	1	776.94
	E. amarillo 2			970.58	1	970.58
PASAN:					SUBTOTAL	4095.34
					TOTAL	4095.34

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-07	M	Desmonte y retiro de flanche en lamina galvanizada calibre 26

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59			1	90.59
	E. amarillo	84.02			1	84.02
	E. rojo	84.02			1	84.02
	E. morado	108.11			1	108.11
	E. azul	124.35			1	124.35
	E. amarillo 2	148.53			1	148.53
PASAN:					SUBTOTAL	639.62
					TOTAL	639.62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma PAMELA BELTRÁN
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	10	12	2022	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
NP-09	M2	Pintura Reflectiva de Aluminio para Protección de Cubiertas (Incluye andamios certificados)

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ALTO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
Cubierta	E. verde	90.59	2.2	199.30	1	199.30
	E. amarillo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. rojo	84.02	2.2	184.84	1	184.84
	E. morado	108.11	2.2	237.84	1	237.84
	E. azul	124.35	2.2	273.57	1	273.57
	E. amarillo 2	148.53	2.2	326.77	1	326.77
	E. amarillo 2 placa			40.78	1	40.78
PASAN:					SUBTOTAL	1447.94
					TOTAL	1447.94

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA POR	DIRGIDA A
20/2/2022	2023_RUU_MGP_048	Entrega de Concepto Estructural Colegio Distrital Diana Turbay Sede B.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
22/2/2022	2023_RUU_MGP_049	Entrega de Concepto Estructural de Colegio Alexander Fleming Sede B.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
22/2/2022	2023_RUU_MGP_050	Entrega de Concepto Estructural de Colegio San Agustín Sede A.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
22/2/2022	2023_RUU_MGP_051	Entrega de presupuesto actualizado Colegio Jose Marti Sede A, Luis Lopez de Mesa – Alternativa 4.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
22/2/2022	2023_RUU_MGP_052	Entrega de presupuesto Emergencia en Baterías de Baños - Colegio San Agustín Sede A.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
24/2/2022	2023_RUU_MGP_059	Informe Mensual de Obra No 1	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
1/3/2023	2023_RUU_MGP_068	Solicitud planos y diseños	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
2/3/2023	2023_RUU_MGP_069	Entrega de presupuesto Colegio Liceo Femenino	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
3/3/2023	2023_RUU_MGP_072	Ficha Técnica de piso tipo Taralay de Gerflor y Piso Mini de LG Hausys.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
6/3/2023	2023_RUU_MGP_073	Subsanación informe mensual SST	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
6/3/2023	2023_RUU_MGP_074	Concepto de emergencia, del Colegio Restrepo Millán sede C "El Pesebre"	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
7/3/2023	2023_RUU_MGP_075	Entrega de fichas diagnosticas	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría



FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA POR	DIRGIDA A
7/3/2023	2023_RUU_MGP_076	Recomendaciones cerchas de cubierta colegio José Martí Sede A	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
8/3/2023	2023_RUU_MGP_077	Acta de Pago Parcial No 1	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
9/3/2023	2023_RUU_MGP_078	Subsanación informe mensual SST No 1	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
9/3/2023	2023_RUU_MGP_079	Informe ambiental No 1	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
9/3/2023	2023_RUU_MGP_080	Informe Mensual de Obra No 1	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
10/3/2023	N/A	Solicitud atención por Emergencia IED Clemencia Holguin de Urdaneta	Arq. Alexander Osorio Páez LIDER TERRITORIAL ORIENTE SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
11/3/2023	2023_RUU_MGP_082	Atención emergencia Santa Lucia Cafam	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
11/3/2023	2023_RUU_MGP_083	Diagnóstico sobre Inestabilidad del Talud en Colegio Restrepo Millán Sede C	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
13/3/2023	2023_RUU_MGP_084	Solicitud planos y diseños tarima Colegio Marruecos y Molinos.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
13/3/2023	2023_RUU_MGP_085	Solicitud respuesta a planimetrías y acabados	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
14/3/2023	2023_RUU_MGP_086	Informe sobre Emergencia IED Clemencia Holguín de Urdaneta	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
14/3/2023	2023_RUU_MGP_087	Cierre emergencia San Agustín Sede A	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
14/3/2023	2023_RUU_MGP_088	Entrega de presupuesto actualizado Colegio Alfredo Iriarte Sede A - Los Chircales	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA POR	DIRGIDA A
14/3/2023	2023_RUU_MGP_089	Respuesta comunicado TIG-MEM-088-RESPUESTA A COMUNICADO2023_RUU_MGP_082_EMERGENCIA CAFAM SANTA LUCÍA	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
14/3/2023	2023_RUU_MGP_090	Entrega de presupuesto actualizado Colegio Reino de Holanda Sede A.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
14/3/2023	2023_RUU_MGP_091	Solicitud adición presupuestal al contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
14/3/2023	2023_RUU_MGP_092	Análisis de precios Unitario del ítems no previstos 002 a 010	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
16/3/2023	2023_RUU_MGP_093	Entrega de presupuesto Emergencia 2 Colegio San Agustín Sede A	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
16/3/2023	2023_RUU_MGP_094	Entrega de presupuesto Actualizado Colegio Enrique Olaya Herrera Sede A.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
16/3/2023	2023_RUU_MGP_095	Entrega de Memoria de Cálculo de Cantidades – Acta Parcial No 2	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
17/3/2023	2023_RUU_MGP_096	Ficha y cronograma Colegio Alfredo Iriarte Sede A, Los Chircales	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
17/3/2023	N/A	FW: URGENTE - LISTADO DE DOCUMENTOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ Supervisor Contratos de Interventoría de Mejoramientos Territorio Oriente
18/3/2023	2023_RUU_MGP_097	Situación actual Colegio Reino de Holanda.	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría
18/3/2023	2023_RUU_MGP_098	Entrega de presupuesto Actualizado Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II de Inglaterra	Mateo Luzardo Villamizar REPRESENTANTE LEGAL Consorcio Mia GP	CONSORCIO TIG Pamela Beltran Directora interventoría

Firma:

Nombre: PAMELA BELTRÁN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Código	Vigencia
FMI022-1	7/1/2021

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_048

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de Concepto Estructural Colegio Distrital Diana Turbay Sede B.

Cordial Saludo,

Mediante la presente el Consorcio Mia GP hace entrega del Concepto Estructural Colegio Distrital Diana Turbay Sede B para su conocimiento.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Concepto Estructural Colegio Distrital Diana Turbay Sede B
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

Manizales, 16 de febrero del 2022
Ingeniero Luis Miguel Castaño.

REFERENCIA: Concepto Estructural. Colegio Distrital Diana Turbay Sede B.

El presente concepto técnico se elabora para evaluar las posibles implicaciones generadas por las obras de mejoramiento contratadas.

CIUDAD =	Bogotá D.C
DIRECCION =	Calle 49 Sur #2a- 38 / 2a-14a
PROPIETARIO =	Distrito.

Dentro de las obras a realizar dentro del inmueble para su mejoramiento se pueden enumerar los siguientes puntos:

- Cambio de pisos: se demolieron los morteros de los pisos existentes eliminando las baldosas antiguas reduciendo la carga muerta por concepto de acabados. Adicionalmente, se pretende instalar un piso en vinilo de 40Kgr/m2 o más liviano previa autorización de la interventoría.

- Cambio de cubiertas: se desmotarán las tejas de fibrocemento existentes y se instalarán tejas tipo Sandwich de máximo 4Kgr/m2. Esta medida reduce considerablemente la carga muerta a nivel de cubierta.

- Cambio de ventanería: se retirarán las ventanerias en lámina originales por carpinterias en aluminio.

Todo lo anterior es realizado para mejorar las condiciones de la edificación de la referencia en el marco de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de su planta física.

Por medio de una inspección visual realizada en la institución educativa en el mes de Febrero, se observó una grieta transversal (ver figura 1) que evidencia una patología por golpeteo sísmico en las losas (ver figura 2) y en las columnas del mismo eje (ver figura 3). Al momento de realizarse la escarificación del recubrimiento de dichos elementos, se pudieron identificar 2 porciones de la edificación que fueron construidas en momentos diferentes y que trataron de ser unidas de manera deficiente mediante morteros y concreto simples.



Figura 1. Vista frontal del Colegio y localización de grieta transversal.



Figura 2. Grieta transversal superior a nivel de entrepiso.



Figura 3. Grieta transversal en las 2 porciones de la edificación.

Por lo mencionado, las grietas presentadas no corresponden a afectaciones directas provocadas por las labores de mejoramiento de la obra actual sino, por el contrario, ayudan a evitar posibles sobrecargas en los elementos principales del sistema de resistencia sísmica a partir de las reducciones de las cargas de acabados y pesos propios.

Vale la pena aclarar que ambos porciones de la edificación están configuradas espacialmente por medio de pórticos resistentes a momentos con columnas y vigas que resiste todas las cargas verticales (cargas muertas y vivas) y de fuerzas horizontales (cargas de viento y sísmicas).

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077, no requieren Licencia de Construcción las reparaciones o mejoras locativas son aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones

de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas.

Finalmente, se puede concluir que las intervenciones realizadas en el Colegio Distrital Diana Turbay Sede B **NO AFECTAN EL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN NI COMPROMETE LA SEGURIDAD DE SUS PROPIETARIOS**. Además, durante el proceso constructivo se cuenta con la presencia de profesionales idóneos que velan por la correcta y adecuada ejecución de las obras.

Sin otro particular,



Alejandro Morales Farfán.
Ingeniero Civil. Especialista en Estructuras.
M.P. 17202-289046

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_049

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de Concepto Estructural de Colegio Alexander Fleming Sede B.

Cordial Saludo,

Mediante la presente el Consorcio Mia GP hace entrega del Concepto Estructural Colegio Alexander Fleming Sede B para su conocimiento y observaciones.

Agradecemos la atención y pronta respuesta,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Concepto Estructural Colegio Alexander Fleming Sede B
Copia 1	Supervisor del contrato – Ing. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

1

CARACTERIZACIÓN - INFORME PRELIMINAR DE OBRA

PISO DE CANCHA

CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022




ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

AUTOR

GEOVANNY ALEXANDER CASTAÑO CASTAÑO

ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FIRMA:



CONTRATISTA: CONSORCIO MIA GP

FEBRERO DE 2023

BOGOTA D.C.

2


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
MATRÍCULA PROFESIONAL No.
05202-275557 ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 08/05/2014
GEOVANNY ALEXANDER
CASTAÑO CASTAÑO
C.C. 1037612806
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO


UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
EN ATENCIÓN A QUE
GEOVANNY ALEXÁNDER CASTAÑO
CASTAÑO
Identificado con cédula de ciudadanía 1037612806
Ha completado todos los requisitos que los estatutos
universitarios exigen para optar al título de
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE
ESTRUCTURAS
Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma en Medellín,
República de Colombia, el 14 de marzo de 2018.

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de Colegio Alexander Fleming Sede B. Tomado de Google Maps. 4
Ilustración 2. Ubicación de la cancha dentro del colegio 4
Ilustración 3. Fotografía panorámica de la cancha. 5
Ilustración 4. Agrietamiento de losa de contrapiso de la cancha 7
Ilustración 5. Tabla acerca del diseño de elementos de concreto reforzado 8
Ilustración 6. Vista en planta de la cancha 9
Ilustración 7. Sección A-A - Corte transversal de la cancha 10
Ilustración 8. Grietas generadas en la losa de contrapiso por el contorno de la viga de fundación 10
Ilustración 9. Grietas que marcan la viga de fundación. Este es el patrón de fisuración general en toda la cancha 11
Ilustración 10. Espesor mínimo de losas según la NSR10 13
Ilustración 11. Agrietamiento de losa de contrapiso de la cancha 14
Ilustración 12. Fotografía de agrietamiento de losa de contrapiso 15
Ilustración 13. Carga MUERTA de servicio ingresada al modelo 16
Ilustración 14. Carga VIVA de servicio ingresado al modelo 16
Ilustración 15. Diagrama de momentos de la viga bajo carga mayorada 17
Ilustración 16. Tabla para seleccionar malla electrosoldada según la cuantía. 18
Ilustración 17. Diagrama de cortantes mayorados 19
Ilustración 18. Diseño con malla D335 para resistir M+ y varillas N3@0.25m para resistir M – de longitud 1.5m 22
Ilustración 19. Acero de refuerzo con varilla de 3/8 cerca a las vigas y malla electrosoldada de XX335 con tralaspos minimos de 30cm. 22

4

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Localización del proyecto

El colegio Alexander Fleming está ubicado en la Cl. 43 Sur, de Ciudad Bolívar, Bogotá DC. Por lo anterior y de acuerdo a la Tabla A.2.3-2 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) la estructura se encuentra ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia.



Ilustración 1. Ubicación de Colegio Alexander Fleming Sede B. Tomado de Google Maps.



Ilustración 2. Ubicación de la cancha dentro del colegio

1.2. Descripción del Proyecto arquitectónico

En el colegio Alexander Fleming sede B, específicamente en el sector de la cancha, se presentan problemas de grietas en la losa de contrapiso. La cancha tiene unas medidas internas de 12.07m de ancho x 20.98m de largo aproximadamente, sin contar los muros de mampostería de las fachadas.



Ilustración 3. Fotografía panorámica de la cancha.

1.3. Estructuración del problema

En el estudio realizado por G. Hermida, J. González, A. Romero, denominado “Agrieto Luego existo, la retracción del concreto”, definen este fenómeno como la causa más frecuente, de la mayoría de los agrietamientos que aquejan las estructuras de concreto. Este caso no es ajeno a dicha problemática y por eso a continuación se describe su definición, clasificación y conclusiones más importantes.

Por otro lado, también está la posibilidad que el agrietamiento se haya producido por esfuerzos de flexión, inexistencia o falta de acero de refuerzo cerca a los apoyos de losa sobre las vigas de cimentación.

1.3.1. Retracción del concreto

La retracción del concreto puede ser definida como un cambio de volumen tridimensional del material que tiene lugar tanto en estado fresco como endurecido y cuya causa no obedece a una

carga externa al mismo. 4Por otro lado, Existen parámetros externos al material que gobiernan la retracción del concreto como la humedad relativa, la velocidad del viento, la radiación solar, la misma geometría del elemento etc. En general el material debe madurar bajo unas condiciones atmosféricas determinadas, sin que podamos modificarlas, pero sobre el proporcionamiento del material y su composición si podemos actuar tratando de minimizar el fenómeno de la retracción del mismo.

1.3.2. Clasificación de la retracción

El concreto desde sus inicios puede sufrir diferentes tipos de retracción, entre ellos la comunidad científica del concreto reconoce los siguientes:

a) Retracción autógena o química: Es aquella provocada por la propia naturaleza de la hidratación del cemento. Los volúmenes de los componentes iniciales (agua y cemento) son mayores que el volumen final del hidrato resultante.

b) Retracción plástica: Es conocida como aquella relacionada con la pérdida del agua superficial del concreto fresco (paso de superficie brillante a mate). La tensión superficial en los meniscos que se forman en los capilares, engendra esfuerzos de tensión que retraen la matriz del concreto.

c) Retracción por secado o hidráulica: La más conocida y mencionada entre todas las retracciones tiene lugar en estado endurecido y está asociada a la pérdida de agua de gel. Esta retracción se mide a diferentes edades y su acción se prolonga durante meses e incluso años.

d) Retracción Térmica: La hidratación inicial del concreto se constituye en una reacción exotérmica, una vez esta primera fase de generación de calor pasa, el concreto como cualquier sólido se enfría y por lo tanto se contrae.

e) Retracción por Carbonatación: Este cambio dimensional tiene lugar a largo plazo y está relacionado con la pérdida o lavado de productos de la carbonatación como el bicarbonato de calcio.

Para términos prácticos la clasificación anterior no resulta muy útil, debido a que los métodos actuales para medir la retracción descrito en la norma ASTM C157, no hacen discriminación sobre el tipo de retracción o la causa que la provoca. Los procedimientos miden una retracción total.

Por lo tanto, resulta más lógico hablar de:

- retracción total en estado endurecido (a partir de las 24 horas) y
- en estado "plástica o durante las primeras horas" es decir anterior a las 24 horas.

1.3.3. Conclusiones sobre el la retracción del concreto

- La retracción del concreto en estado plástico o medida antes de las primeras 24 horas, depende fundamentalmente de la pérdida de agua por evaporación con respecto al contenido inicial de agua del concreto.

- La retracción a las 24 horas que puede ser 10 veces mayor que aquella obtenida a largo plazo y puede anularse completamente si se empieza el curado lo más temprano posible. Este curado debe hacerse inundando permanentemente el elemento o usando una membrana curadora. Resulta también aconsejable utilizar, antes de curar, retardantes de evaporación.

- Para unos materiales dados, la retracción en estado endurecido, aquella que nos fisura el material a las semanas o meses de haber sido fundido, es gobernada por el volumen de pasta, en cuanto al proporcionamiento del concreto se refiere.



Ilustración 4. Agrietamiento de losa de contrapiso de la cancha

8

1.4. Falta acero de refuerzo en losa y seleccionar la malla de acero de refuerzo adecuada.

(CÓDIGO)	RESUMEN DEL CAPÍTULO
(C.10)	FLEXIÓN Y CARGAS AXIALES
(C.10.1)	Alcance - Elementos sometidos a flexión, carga axial o flexocompresión.
(C.10.2)	Suposiciones de diseño por resistencia según (C.10.2.2 - C.10.2.7)
(C.10.2.1)	Condiciones de Equilibrio y Compatibilidad de Deformaciones.
(C.10.2.2)	Deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto directamente proporcionales al eje neutro. EXCEPTO para vigas altas según (C.10.7). Usar Modelo puntal tensor según Apéndice (C-A) debido a la No linealidad.
(C.10.2.3)	εcu = 0.003
(C.10.2.4)	Si εs < εcy ….. Asfs =AsEsεs, Sino Asfs =Asfy
(C.10.2.5)	Se desprecia la resistencia del concreto a la tracción. EXCEPTO si (C.18.4)
(C.10.2.6)	Forma rectangular equivalente para la relación entre la distribución de esfuerzos de C y T.
(C.10.2.7)	Se cumplen las condiciones según (C.10.2.7.1), (C.10.2.7.2) y (C.10.2.7.3)
(C.10.2.7.1)	Esfuerzo equivalente en el concreto de 0.85fc' limitada por los bordes de la sección y una línea paralela al eje neutro a una distancia a = β1c
(C.10.2.7.2)	La medida c, se toma perpendicular al eje neutro.
(C.10.2.7.3)	Si 17MPa <= fc' <= 28MPa ... β1 = 0.85 Si 28MPa < fc' <= 56MPa ... β1 = 0.85 - 0.05(7x) Si fc' > 56MPa … β1 = 0.65
(C.10.3)	Principios y requisitos generales
(C.10.3.1)	El diseño de elementos sometidos a flexión, carga axial o flexocompresión se basa en las suposiciones de (C.10.2)
(C.10.3.2)	La condición balanceada existe cuando el acero en tracción y el concreto en compresión alcanzan al tiempo el valor de εcu = εt =0.003.
(C.10.3.3)	Sección Controlada a Compresión SCC ... cuando εcu = 0.003 y εt <= 0.003. En condiciones de deformación unitaria balanceada. Para Acero Grado 420 y aceros preesforzados se permite fijar el límite εt=0.002.
(C.10.3.4)	Sección Controlada a Tracción SCT ... cuando εcu =0.003 y εt >=0.005. Sección En Transición SET entre SCC y SCT …. Cuando 0.005 >= εt >= 0.003.

Ilustración 5. Tabla acerca del diseño de elementos de concreto reforzado

La tabla anterior muestra las condiciones que se tienen en cuenta en el diseño de elementos de concreto reforzado sometidos a esfuerzos de flexión. En este caso la losa de contrapiso.

9

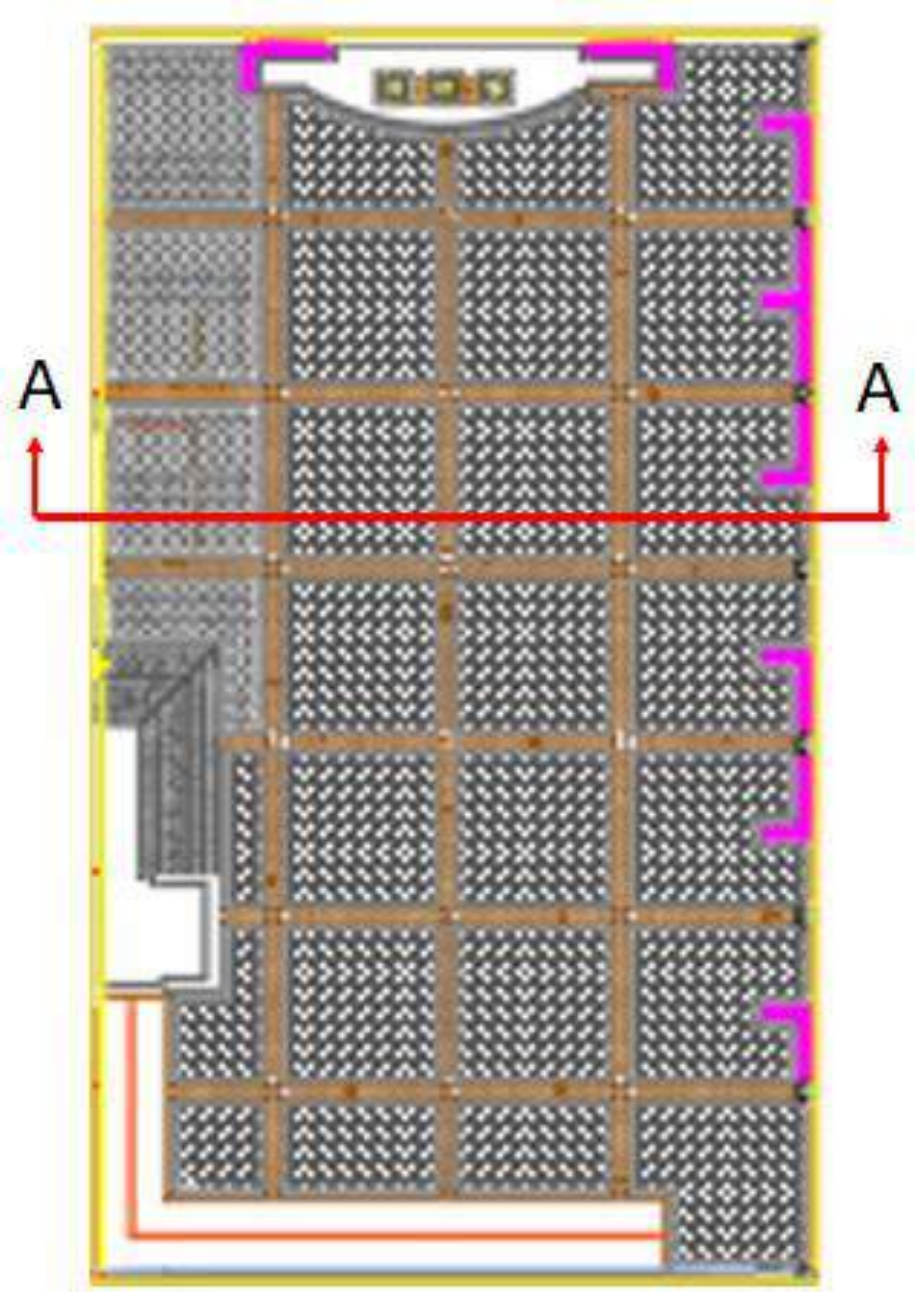


Ilustración 6. Vista en planta de la cancha

En la ilustración 6, se muestra una vista en planta de la cancha como parte de la información inicial que se tiene de la estructura. Desde mi punto de vista, se puede inferir que la retícula de color café representa vigas de fundación que pertenecen al diseño


estructural inicial de la losa de contrapiso de la cancha. Se le pide al contratista y a la supervisión de obra, comprobar si esta observación es correcta. La ilustración 7 por su parte, muestra un corte transversal de la losa de contrapiso de la cancha. Allí se muestra las vigas de fundación y la losa de contrapiso de espesor y refuerzo desconocido, hasta el momento.



Ilustración 7. Sección A-A - Corte transversal de la cancha

Una de las hipótesis de la fisuración de la losa es:

La losa maciza se apoya cada 3m aproximadamente sobre vigas de fundación. Con el paso del tiempo, la degradación del concreto, la falta de dilataciones y la falta de refuerzo se generan grietas como las que se puede observar en las siguientes dos ilustraciones.

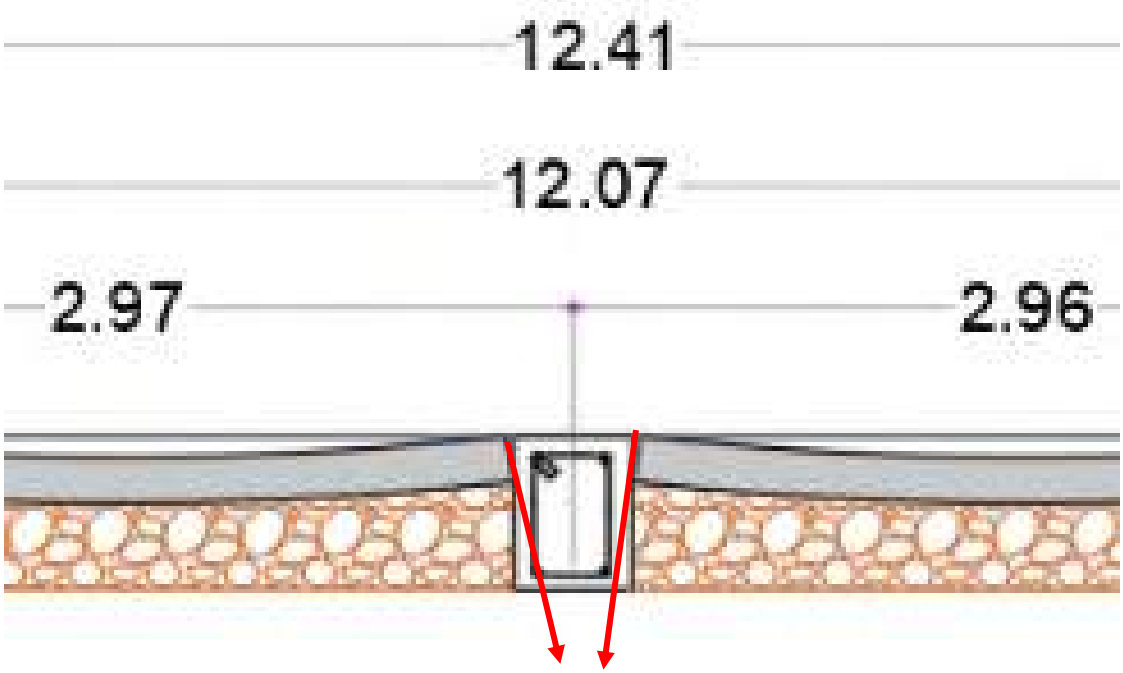

Grietas muy definidas en la losa. El refuerzo de la viga se desconoce

Ilustración 8. Grietas generadas en la losa de contrapiso por el contorno de la viga de fundación

11



Ilustración 9. Grietas que marcan la viga de fundación. Este es el patrón de fisuración general en toda la cancha

1.5. Objetivo general

En la presente memoria de cálculo se diseña la losa de contrapiso de la cancha auxiliar y se dan recomendaciones para evitar que los problemas de agrietamiento se vuelvan a repetir.

1.6. Normas de diseño

El siguiente diseño está basado en el decreto 926 de 2010, NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NSR-10). Y sus modificaciones:
Decreto 92 del 2011 y Decreto 340 del 2012

1.7. Especificaciones de los materiales

1.7.1 Concreto

- Resistencia de diseño f'c: 21 MPa, para losa de contrapiso
- Peso específico: 2400 kg/m^3
- Módulo de elasticidad Ec: 21538 MPa, para vigas y losa (C.8.5.1). Se toma con base a la NSR-10, sección (C.8.5.1) en donde: para concretos de densidad normal $E_c = 4700\sqrt{f_c'}$

1.7.2 Acero

- Resistencia del acero de refuerzo longitudinal fy: 420 MPa
- Resistencia del acero de la malla electrosoldad fy(malla): 490MPa
- Módulo de elasticidad del acero Es: 200.000 MPa, valor de la NSR-10 (C.8.5.2)

1.8. Programa de diseño

El modelamiento de la estructura se realiza en el software ETABS 2016.2.1 software especializado en el diseño de edificaciones.

2. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA DE DISEÑO: MACIZA UNIDIRECCIONAL

2.1. Losa maciza: Clasificación según el grado de consolidación

Debido al requerimiento del cliente se diseña losa maciza de contrapiso sobre unas vigas de cimentación, para conservar el diseño inicial.

2.2. Losa Unidireccional: Clasificación según el comportamiento en la transmisión de carga

Las cargas se distribuyen en una dirección según la sección (C.13.1.6.1) ó (C.1.13.6.2)

(C.13.1.6.1) Cuando tienes dos bordes libres, sin apoyo vertical, y tiene vigas o muros, en los otros dos bordes opuestos aproximadamente paralelos, ó

(C.1.13.6.2) Cuando el panel de losa tiene forma aproximadamente rectangular con apoyo vertical en sus cuatro lados, con una relación de Luz larga (Lb) a La luz corta (Lb) mayor que 2. Es decir cuando se cumple:

$$(l_b/l_a) > 2$$

2.3. Predimensionamiento de la losa maciza unidireccional

Para predimensionar un elemento sometido a flexión se puede calcular las deflexiones y verificar el cumplimiento de las especificaciones dadas por la NSR -10. En caso de no calcular deflexiones, para losas macizas en una dirección, se puede utilizar la tabla 2. Esta tabla es apropiada cuando NO se utilizan particiones livianas como se especifica en CR.9.5.2.1.

	Espesor mínimo, **h**			
	Simplemente apoyados	Con un Extremo continuo	Ambos Extremos continuos	En voladizo
Elementos	Elementos que **NO** soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.			
Losas macizas en una dirección	$\frac{\ell}{20}$	$\frac{\ell}{24}$	$\frac{\ell}{28}$	$\frac{\ell}{10}$
Vigas o losas nervadas en una dirección	$\frac{\ell}{16}$	$\frac{\ell}{18.5}$	$\frac{\ell}{21}$	$\frac{\ell}{8}$

NOTAS:
Los valores dados en esta tabla se deben usar directamente en elementos de concreto de peso normal y refuerzo grado 420 MPa.

Ilustración 10. Espesor mínimo de losas según la NSR10

En este caso se identifica el caso más crítico con una luz L de 3150mm y un extremo continuo.:

Luz 1 (1 extremos continuo): 3150mm $h_{min} = \left(\frac{3150}{24}\right) = 131mm$

A partir de estos cálculos se asume un espesor losa maciza de: 150 mm para estar por encima de los mínimos.

14



Ilustración 11. Agrietamiento de losa de contrapiso de la cancha

15



Ilustración 12. Fotografía de agrietamiento de losa de contrapiso

3. DISEÑO DE LOSA MACIZA

3.1. Cargas de diseño

Carga muerta considerada

$360\,kg/m^2$ para una losa de espesor 0.15m y un peso de concreto de 2400 kg/m3

Carga viva:

$500\,kg/m^2$

3.2. Combinaciones de carga

La combinación de carga que se consideran en este caso y se van a ingresar al diagrama de cuerpo libre y modelo matemático es:

$U1 = 1{,}2D + 1{,}6L \;\; = \;\; 1242\,kg/m^2 \qquad (B.2.4-2)$

De U1 se obtienen los valores máximos y mínimos de carga para el momento y para el cortante.

Donde: D: Carga muerta y L: Carga viva

3.3. Coeficiente de reducción de resistencia

$\phi = 0.9$ Para elementos diseñados a flexión

$\phi = 0.6$ Para elementos chequeados a cortante

3.4. Diagrama de cuerpo libre (Carga muerta y carga viva) en unidades de kN/m




Ilustración 13. Carga MUERTA de servicio ingresada al modelo




Ilustración 14. Carga VIVA de servicio ingresado al modelo

3.5. Diagrama de momento (Combinación U1) en unidades de kN.m




Ilustración 15. Diagrama de momentos de la viga bajo carga mayorada

3.5.1. Máximo momento positivo: 9.5 kN.m

3.5.2. Máximo momento negativo: 11.3 kN.m

3.6. Diseño de losa maciza

3.6.1. Acero longitudinal inferior

- Momento máximo positivo (9.5kN.m): se calcula la cuantía con los siguientes datos de entrada

$$f'_c = 21\ MPa$$

$$f_y = 485\ MPa$$

$$M_u = 9.5x10^6\ N.mm$$

$$b = 1000\ mm$$

$$d = h - r = 150\ mm - 75\ mm = 75\ mm$$

$$\phi = 0.9$$

$(\rho_{min} = 0.0018)$ por retracción y temperatura

Se aplica la siguiente ecuación:

$$\rho = \frac{0.85f'_c}{f_y}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2M_u}{0.85\phi f'_c bd^2}}\right)$$

$$\rho = \frac{0.85(21)}{(485)}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2(9.5x10^6)}{0.85(0.9)(21)(1000)(75^2)}}\right) = 0.00316$$

$(\rho = 0.00316) > (\rho_{min} = 0.0018)$

Cuantía: $\rho = 0.00316$

Profundidad efectiva: $d = 7.5\ cm$

Área de acero: $As = (\rho)(d)(b) = 0.00409\ x\ 7.5\ cm\ x\ 100\ cm = 3.07\ cm2/m$

Diseño 1: Malla electrosoldada de referencia GERDAU DIACO XX-335

18

Características Dimensionales										
Ref.	Nº de Barras por malla		Diámetro		Separación		Longitud pelos		Peso	Cuantía principal
	long	transv	long	transv	long	transv	long	transv		Nominal
	6.00m	2.35m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	cm2/ml
XX Mallas electrosoldadas GG Diaco con refuerzo principal en dos direcciones (Panel 6,00 x 2,35m)										
XX-050	10	24	4,0	4,0	250	250	125	50	11,5	0,50
XX-063	12	30	4,0	4,0	200	200	100	75	14,1	0,63
XX-084	16	40	4,0	4,0	150	150	75	50	18,8	0,84
XX-106	16	40	4,5	4,5	150	150	75	50	23,8	1,06
XX-131	16	40	5,0	5,0	150	150	75	50	29,3	1,31
XX-159	16	40	5,5	5,5	150	150	75	50	35,5	1,59
XX-188	16	40	6,0	6,0	150	150	75	50	42,2	1,88
XX-221	16	40	6,5	6,5	150	150	75	50	49,6	2,21
XX-257	16	40	7,0	7,0	150	150	75	50	57,4	2,57
XX-295	16	40	7,5	7,5	150	150	75	50	65,9	2,95
XX-335	16	40	8,0	8,0	150	150	75	50	75,1	3,35
XX-378	16	40	8,5	8,5	150	150	75	50	84,7	3,78

Ilustración 16. Tabla para seleccionar malla electrosoldada según la cuantía.

3.6.2. Acero longitudinal superior

- Momento máximo positivo (11.3kN.m): se calcula la cuantía con los siguientes datos de entrada

$$f'_c = 21\ MPa$$

$$f_y = 420\ MPa$$

$$M_u = 11.3x10^6\ N.mm$$

$$b = 1000\ mm$$

$$d = h - r = 150\ mm - 50\ mm = 100\ mm$$

$$\phi = 0.9$$

$(\rho_{min} = 0.0018)$ por retracción y temperatura

Se aplica la siguiente ecuación:

$$\rho = \frac{0.85f'_c}{f_y}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2M_u}{0.85\phi f'_c bd^2}}\right)$$

$$\rho = \frac{0.85(21)}{(420)}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{2(11.3x10^6)}{0.85(0.9)(21)(1000)(100^2)}}\right) = 0.0031$$

$$(\rho = 0.0031) > (\rho_{min} = 0.0018)$$

Cuantía: $\rho = 0.0031$

Profundidad efectiva: $d = 10\ cm$

Área de acero: $As = (\rho)(d)(b) = 0.00409\ x\ 10\ cm\ x\ 100\ cm = 2.40\ cm2/m$

Diseño 2: Varilla N3 @ 0.25m de Longitud = 2m centrada en los apoyos

En los apoyos se va a suministrar un refuerzo adicional teniendo en cuenta que el momento máximo es 11.3 kN.m

Este refuerzo adicional será suministrado en varilla N3 cada 0.25m de 2m de longitud a conveniencia para generar la suficiente longitud de desarrollo.

3.7. Diagrama de cortante (Combinación U1) en unidades de kN.m




Ilustración 17. Diagrama de cortantes mayorados

3.7.1. Máximo cortante positivo: 22 kN

3.7.2. Máximo cortante negativo: -22 kN.m

La resistencia al cortante suministrada por el concreto es

$$\emptyset Vc = \emptyset 0.17\lambda bd\sqrt{f'_c}$$

$$\emptyset Vc = (0.6)(0.17)(1)(1000mm)(75mm)\left(\sqrt{21}\right)/1000 = 35.05kN$$

$$(Vu = 22.00kN) \leq (\emptyset Vc = 35.05kN)\ \text{¡OK!}$$

4. OBSERVACIONES AL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

CANCHA MÚLTIPLE De acuerdo a inspección del estado actual de la cancha, se observa que esta presenta agrietamientos considerables en un 70% de la superficie las cuales son provocadas por asentamientos del terreno y posiblemente por la presencia del tanque de suministro de agua potable; por tanto, el contratista no garantiza el buen funcionamiento de las reparaciones ya que no se tiene conocimiento del refuerzo y espesor de esta placa.

Se programará un ingeniero especialista con el fin de realizar una inspección y estudio detallado del estado de esta estructura, se presentará una propuesta para demolición y construcción nueva, garantizando así el buen funcionamiento de esta área. A continuación, se puede observar el estado actual de la estructura de la cancha en mención:

• Es necesario relacionar detalles que identifiquen los materiales a utilizar en muros, acabado de cancha y domo a instalar.

• Se requiere el estudio previo para evaluar la estructura de la cancha existente.

• Se presentará un diseño estructural para la construcción de cancha múltiple.

• Se requiere el estudio previo para evaluar la estructura de la cubierta.

• Se debe presentar un balance preliminar el cual será evaluado por la entidad.

5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

1. Demoler la totalidad de la placa de contrapiso existente sin demoler la cubierta del tanque. Si se desea reparar esta parte se recomienda demoler 5 cm de losa, aplicar sika 32primer o similar como puente adherente y vaciar un mortero para aplicaciones de bajos espesores con fibra masterfiber o similar. Dilatar el perímetro de la losa que seguro se marcará en la losa de contrapiso de igual manera.

21



2. Descubrir y realizar limpieza del acero de refuerzo de las vigas de cimentación que se han comentado en el documento.
3. Rellenar y compactar con material granular seleccionado hasta obtener el 95% de la densidad del Proctor. Tomar densidades para control de calidad. Separar el lleno con plástico de calibre 8.
4. Replantear las pendientes de la losa de contrapiso para la evacuación del agua superficial de escorrentía. Es decir, plantear una pendiente mínima del centro hacia los laterales.
5. Vaciar de nuevo el concreto de la losa de contrapiso con un concreto de 21MPa o superior, teniendo en cuenta de adicionarle fibra master fiber m60 ó similar para compensar la retracción del concreto debido a la geometría de la losa y a los demás puntos tratados en el documento.

6. Darle el acabado tipo industrial para pisos mediante mano de obra especializada, los equipos (“helicópteros” y demás) y materiales (endurecedor rocktop y demás),
7. Comenzar el proceso de curado tan pronto sea posible mediante inundación de la superficie con agua o aplicar antisol en toda la superficie.
8. Realizar las debidas dilataciones de piso no mayores a 2.5m x 2.5m.
9. Ubicar la cola de ratón y el vulkén para las juntas de movimiento.
10. Realizar este proceso a no más de 12 horas de haber realizado el vaciado.



Ilustración 18. Diseño con malla D335 para resistir M+ y varillas N3@0.25m para resistir M – de longitud 1.5m

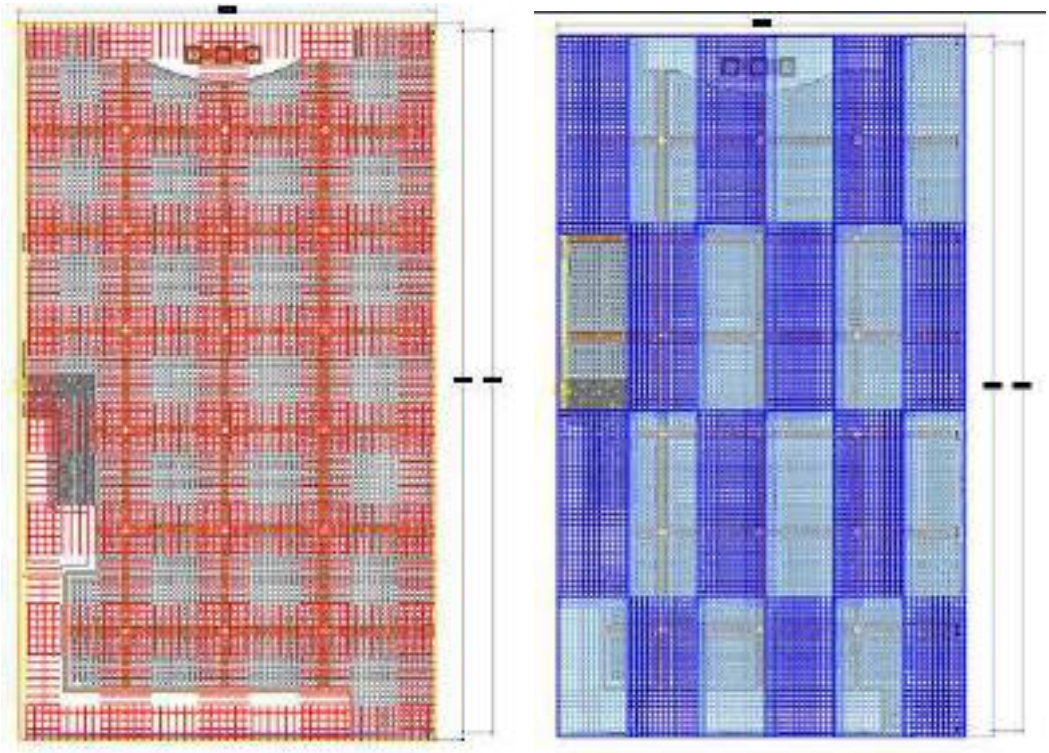


Ilustración 19. ***Acero de refuerzo con varilla de 3/8 cerca a las vigas y malla electrosoldada de XX335 con tralaspos minimos de 30cm.***

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_050

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de Concepto Estructural de Colegio San Agustín Sede A.

Cordial Saludo,

Mediante la presente el Consorcio Mia GP hace entrega del Concepto Estructural del Colegio San Agustín Sede A, para su conocimiento y observaciones.

Agradecemos la atención y pronta respuesta,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Concepto Estructural Colegio Alexander Fleming Sede B
Copia 1	Supervisor del contrato – Ing. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONCEPTO TÉCNICO SOBRE
CERCHAS DE CUBIERTA
COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

AUTOR:

GEOVANNY ALEXANDER CASTAÑO CASTAÑO

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

MAT. 05202-275557 ANT

FIRMA:



BOGOTÁ DC

2023


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
05202-275557 ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 08/05/2014
GEOVANNY ALEXANDER
CASTAÑO CASTAÑO
C.C. 1037612806
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
EN ATENCIÓN A QUE
GEOVANNY ALEXÁNDER CASTAÑO CASTAÑO
Identificado con cédula de ciudadanía 1037612806
Ha completado todos los requisitos que los estatutos universitarios exigen para optar al título de
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
Le expide el presente diploma. En testimonio de ello se firma en Medellín, República de Colombia, el 14 de marzo de 2018.

TABLA DE CONTENIDO

0. PORTADA 1
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
1.1. Localización del proyecto 5
1.2 Actividad a ejecutar - CUBIERTAS – objeto del presente documento. 6
1.2.1 Cubierta de Aulas 6
1.3. Estructuración de la cubierta de las aulas 7
1.4. Objetivo principal 11
1.5. Normas de chequeo 11
1.6. Especificaciones del material 11
1.6.1 Acero 11
1.7. Programas de diseño 11
2. CÁLCULO DE CARGAS 12
2.1. Cargas de chequeo 12
2.1.1 Peso propio de la cercha principal 12
2.1.2 Carga muerta D 12
2.1.3 Carga viva de techo Lr o Carga de Granizo G 12
2.1.5 Carga viento W 13
2.2. Combinaciones de carga 19
2.3 Diagrama de cuerpo libre 19
2.2.1 Carga Mayorada 20
La carga mayorada corresponde a un total de 896kg/9 = 99.5kg se redonde a 100kg 20
2.4. Coeficiente de reducción de resistencia 20
3. CHEQUEO DE CERCHA 21
4. RECOMENDACIONES 22
4.1. Instalar apoyo entre cerchas con perfil metálico PTE 50mm x 100mm x 3mm 22
4.2 Reforzar las platinas que soportan las cerchas de los corredores 23
4.3 Reparar los anclajes y sitios donde haya problemas con el concreto de la viga cinta con mortero de alta resistencia sikatop122 o similar. 24
4.4 Pintar todas las cerchas con anticorrosivo y con el color de diseño arquitectónico que se elija para el colegio. 24
4.5 Reparar con soldadura elementos que en la visita no se hayan visto defectuosos o que se vena muy corroídos. 24
4.6 Instalar templetes entre cerchas con varilla de D:1/2” separados máximo 2m 24

TABLA DE IMAGENES

Imagen 1. Ubicación de COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN 5

Imagen 2. Localización de la intervención dentro del colegio San Agustín Sede A 6

Imagen 3. Cubierta de Aulas - COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN 7

Imagen.4. Tejas de asbesto cemento 7

Imagen 5. Cerchas de cubierta con apoyo intermedio con perfil metálico IPE 8

Imagen 6. Muro de mampostería con viga cinta en la parte superior 8

Imagen 7. Cercha de 8m con apoyo intermedio a los 4m y contravientos con varilla 8

Imagen 8. Cercha típica de Longitud: 8.0m con apoyo intermedio a los 4m. y Altura: 0.25m 8

Imagen 9 Sección transversal de cercha 9

Imagen 10. Geometría de los perfiles metálicos 9

Imagen 11. Modelo de la cercha en ETABS 10

Imagen 12. Isométrico de la estructuración actual de la cubierta de aulas 10

Imagen 13. Vista frontal de la estructuración actual de la cubierta de aulas 10

Imagen 14. Aplicación de cargas de cubierta según la NSR10 19

Imagen 15. Cargas mayoradas ingresadas al modelo 20

Imagen 16. Chequeo con ETABS de la cercha tridimensional teniendo en cuenta las combinaciones de carga de la NSR10 21

Imagen 17. Diagrama de fuerza axial de las cerchas 21

Imagen 18. Instalación de perfiles intermedios entre cerchas 22

Imagen 19. Chequeo de cercha con la mitad de la carga 22

Imagen 20. Platina de cerchas de corredores 23

Imagen 21. Ejemplo de Instalación e templetes entre cerchas 24

Imagen 22. Ejemplo de instalación de templetes 25

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Localización del proyecto

El Colegio San Agustín Sede A, San Agustín se encuentra ubicado en la Cl. 50a Sur #5C-40.



Imagen 1. Ubicación de COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

La cerchas metálicas a chequear se localizan en el COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN, perteneciente a la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá DC, departamento de Cundinamarca. Por lo anterior y de acuerdo a la Tabla A.2.3-2 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) la estructura se encuentra ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia y además en una zona de amenaza eólica 2 con vientos hasta de 80 km/h.



Imagen 2. Localización de la intervención dentro del colegio San Agustín Sede A

1.2 Actividad a ejecutar - CUBIERTAS – objeto del presente documento.

Una vez realizado el reconocimiento del COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, y de acuerdo con las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato, se define las CUBIERTAS como uno de los espacios a intervenir. Las cubiertas de Aulas se visitaron el día 24 de enero de 2023 para poder tomar medidas más representativas de la estructura en mención.

1.2.1 Cubierta de Aulas

Se observa que las cubiertas tienen tejas de asbesto cemento. De acuerdo a la ley 1968 de 2019 y reglamentado mediante el decreto 0402 de 2021 está prohibido el uso de fibras de asbesto cemento debido a los problemas que afectan la salud.

Por otro lado, de acuerdo a requerimiento para el cambio de la cubierta en el edificio de aulas, se observa que la estructura metálica para el soporte de la cubierta existente (asbesto-cemento) cumple en gran parte con las especificaciones y luces requeridas para garantizar el óptimo funcionamiento. Sin embargo, también hay algunos detalles que serán tocados en el presente documento que a juicio del ingeniero estructural falta detallar

para realizar el cambio de especificación a teja. Todo esto con el fin de proponer alternativas que garanticen el cumplimiento de la norma NSR 10 – título F – estructuras metálicas.



Imagen 3. Cubierta de Aulas - COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

1.3. Estructuración de la cubierta de las aulas

Las cubiertas de las aulas son a dos aguas y están estructuradas actualmente de la siguiente manera:

1. Tejas de asbesto cemento traslapadas que están apoyadas sobre cerchas metálicas.
2. Cerchas metálicas de 25 cm de altura con una longitud de 8m y distanciadas máximo a 2m.
3. En la parte central tiene una viga IPE que sirve de apoyo intermedio a las cerchas.
4. La carga llega a un muro de mampostería con viga cinta en la parte superior



Imagen.4. Tejas de asbesto cemento



Imagen 5. Cerchas de cubierta con apoyo intermedio con perfil metálico IPE



Imagen 6. Muro de mampostería con viga cinta en la parte superior



Imagen 7. Cercha de 8m con apoyo intermedio a los 4m y contravientos con varilla




Imagen 8. Cercha típica de Longitud: 8.0m con apoyo intermedio a los 4m. y Altura: 0.25m

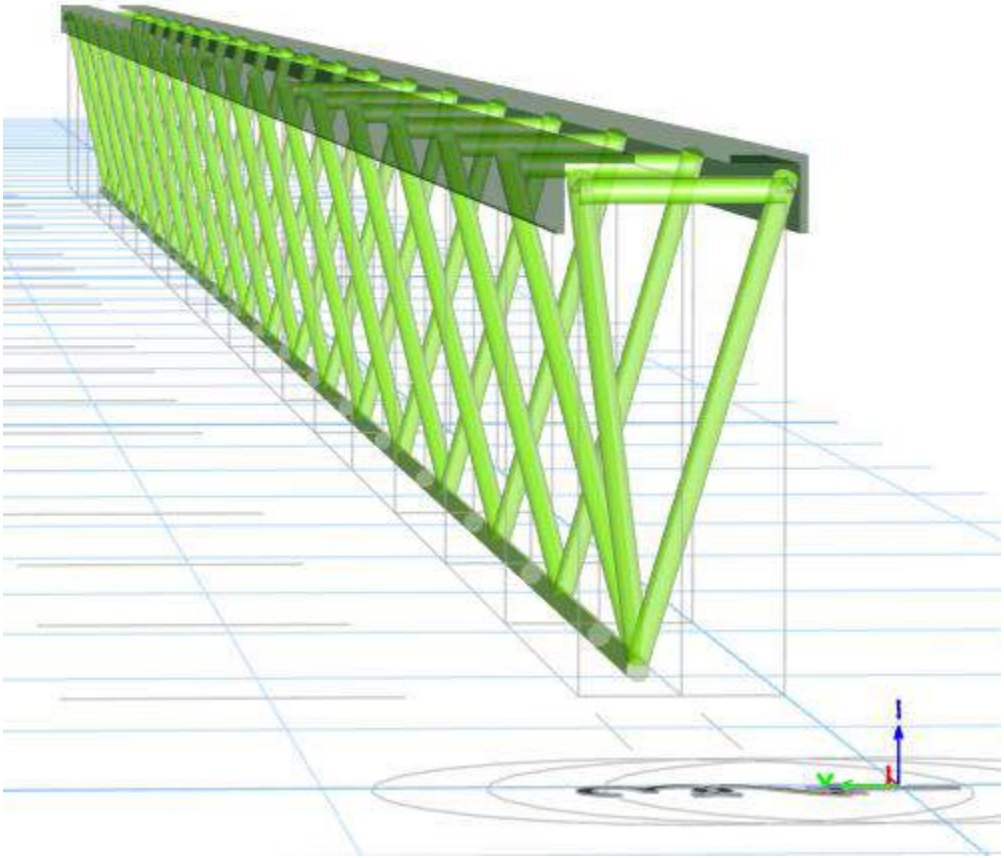


Imagen 9 Sección transversal de cercha

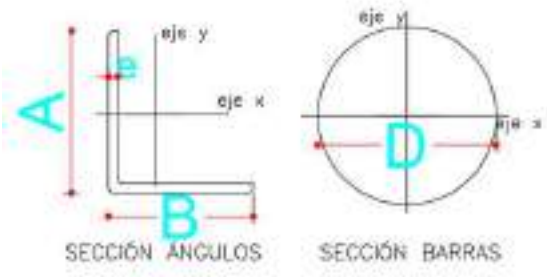


Imagen 10. Geometría de los perfiles metálicos

- Verde Oscuro – Cuerda superior – 2 Ángulos de 1-1/2 x 4mm
- Verde Claro – Cuerda inferior y ondas – Barra lisa de D: ½”

* Se asume una calidad de acero A36 debido a que es el más común, menos resistente y más económico.



Imagen 11. Modelo de la cercha en ETABS

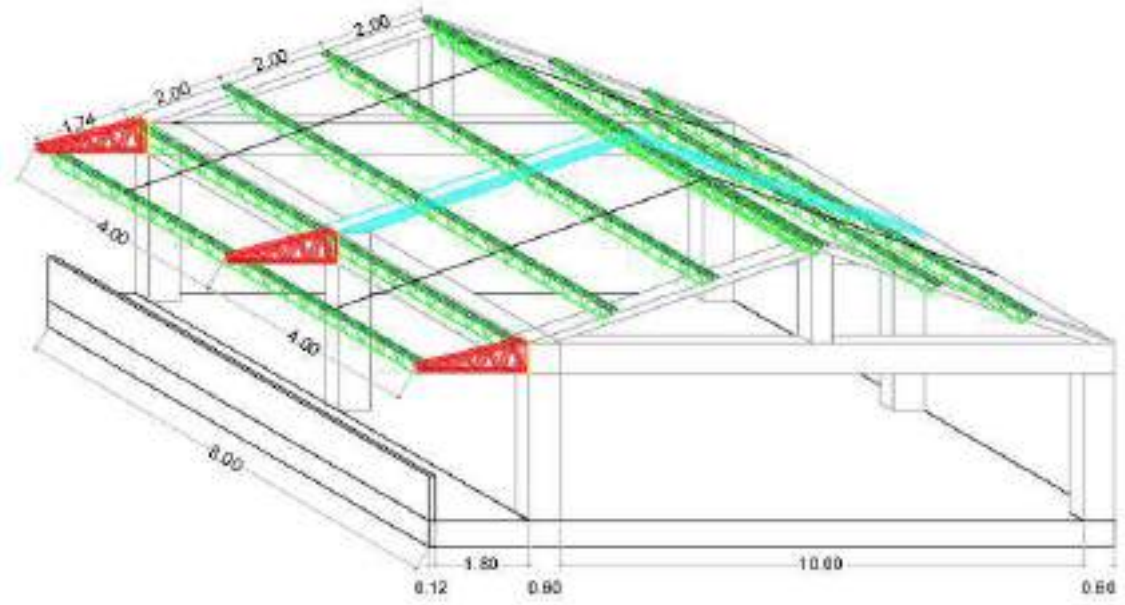


Imagen 12. Isométrico de la estructuración actual de la cubierta de aulas

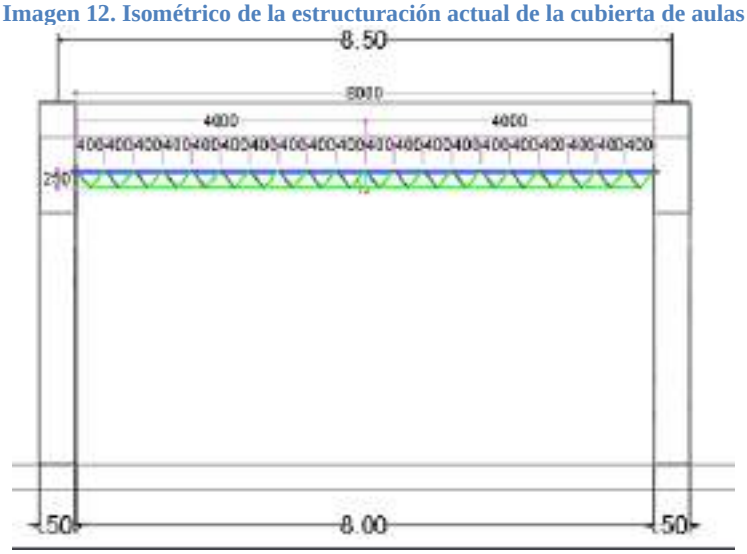


Imagen 13. Vista frontal de la estructuración actual de la cubierta de aulas

1.4. Objetivo principal

La idea principal del presente análisis es chequear que las cerchas de la cubierta de la AULAS cumplan con los requisitos mínimos del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes (NSR10) específicamente en los títulos A, B, y F. De lo contrario ofrecer una serie de recomendaciones para lograr una correcta remodelación de la cubierta.

1.5. Normas de chequeo

El siguiente chequeo está basado en:

- El decreto 926 de 2010, NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NSR-10). Y sus modificaciones: Decreto 92 del 2011 y Decreto 340 del 2012.

1.6. Especificaciones del material

1.6.1 Acero

- Calidad A36 grado 50.
- Resistencia del acero de refuerzo longitudinal fy: 245 MPa y fu: 345 MPa
- Módulo de elasticidad del acero Es: 200.000 MPa, valor de la NSR-10 (C.8.5.2)

1.7. Programas de diseño

- El modelamiento de la estructura se realiza en el software ETABS 2018.2.1 software especializado de diseño.
- Programa de dibujo asistido por computador AUTOCAD 2021
- Paquete de office – Excel y Word

2. CÁLCULO DE CARGAS

2.1. Cargas de chequeo

2.1.1 Peso propio de la cercha principal

Lo tiene en cuenta el modelo matemático en ETABS* con base en la geometría y el material.

Especificación técnica de la teja

17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS)	M2

Este tipo de teja se le asigna un peso promedio por metro cuadrado de 6kg/m2,

La tubería, ductos, cables, lamparas se le asigna un peso de 4kg/m2

En total se considera una carga muerta total de 10kg/m2

2.1.2 Carga muerta D

Carga distribuida de techo: 10 kg/m^2 (Según especificación técnica)

2.1.3 Carga viva de techo Lr o Carga de Granizo G

(B.4.8.2)	**CARGA POR EMPOZAMIENTO DE AGUA**
(B.4.8.2.1)	El proyecto hidráulico de la edificación debe incluir el diseño del sistema de drenaje de la cubierta y del sistema auxiliar de evacuación del exceso de agua y definirá el volumen de agua que pueda acumularse antes de que el sistema auxiliar de drenaje del exceso opere. Es responsabilidad del constructor que suscribe la licencia de construcción aprobar el proyecto hidráulico y asegurarse de que los sistemas de drenaje normal y auxiliar sean apropiados y de suministrar la información acerca del volumen de agua que pueda acumularse al diseñador estructural.
(B.4.8.2.2)	Con base en la información suministrada por el constructor el diseñador estructural determinará las cargas causadas por el volumen de agua que pueda acumularse antes de que el sistema auxiliar de drenaje del exceso opere y su distribución a los elementos estructurales de soporte de la cubierta realizando su diseño de tal manera que sean capaces de resistir este peso sin fallar.
(B.4.8.2.3)	Para cubiertas en estructura metálica, la revisión del empozamiento debe tener adicionalmente en cuenta lo indicado en F.2.2.3.9.
(B.4.8.3)	**CARGA DE GRANIZO**
(B.4.8.3.1)	Las cargas de granizo, G , deben tenerse en cuenta en las regiones del país con más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar o en lugares de menor altura donde la autoridad municipal o distrital así lo exija.
(B.4.8.3.2)	En los municipios y distritos donde la carga de granizo deba tenerse en cuenta, su valor es de 1.0 kN/m2 (100 kgf/m2). Para cubiertas con una inclinación mayor a 15% este valor puede reducirse a 0.5 kN/m2 (50 kgf/m2).

Tabla B.4.2.1-2		
Cargas vivas mínimas en cubiertas		
(F) Cubiertas inclinadas con pendiente de 15% o menos en estructura metálica o de madera con imposibilidad física de verse sometidas a cargas superiores a la aquí estipulada y sin posibilidad alguna de acceso a personas diferentes del personal de mantenimiento	0.35kN/m2	35kg/m2

Según la Tabla **B.4.2.1-2,** del Reglamento Colombiano de Construcción Resistente NSR-10, para las cubiertas inclinadas con más de 15% de pendiente en estructura metálica o de madera con imposibilidad física de verse sometidas a cargas superiores, se asume la carga de 35kg/m2.

Según la sección B.4.8.3.2 Bogotá se encuentra a 2640msnm. Por lo tanto, se debe tener en cuenta Carga de Granizo G. Si la inclinación de la cubierta tiene un valor menor a 15% se toma 100kg/m2 De lo contrario 50kg/m2. Como la inclinación es de 34% entonces se asume una carga distribuida de 50kg/m2.

Se toma la carga mayor, en este caso 50kg/m2.
Pendiente de cubierta en %: 34%

2.1.5 Carga viento W

Según B.6.4.2.2.1 de la NSR 10, Las presiones mínimas de viento de diseño positivas y negativas, de la sección B.6.4.2.2 no serán menores a+40 kg/m^2, respectivamente. Pero
Carga distribuida VERTICAL de techo: 40 kg/m^2

Para demostrar porque se usa las presiones mínimas se aplica el método 1

(B.6.4.1.1)	**Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento (SPRFV)** Para el diseño del SPRFV el edificio debe cumplir todas las siguientes condiciones:		**Requisito**
(B.6.4.1.1a)	**(a)** El edificio sea de diafragma simple como se define en la sección B.6.2.		OK
(B.6.2)	Edificio de diafragma simple Un edificio en el cual las cargas de viento a barlovento y sotavento se trasmiten a través de los diafragmas de piso y cubierta hacia un mismo SPRFV, es decir no tiene separaciones estructurales.		
(B.6.4.1.1b)	**(b)** El edificio sea bajo de acuerdo con la sección B.6.2.		OK
(B.6.2)	Edificio bajo Edificio cerrado o parcialmente cerrado que cumpla con las siguientes condiciones: (a) Altura media de la cubierta (h) menor o igual a 18 m (60 ft). (b) Altura media de la cubierta (h) no excede la menor dimensión horizontal del edificio.		
	Altura media de la cubierta	9 m	OK
	Menor dimensión del edificio	12 m	OK
(B.6.4.1.1c)	**(c)** El edificio sea cerrado como se define en la sección B.6.2 y cumpla las provisiones de zonas propensas a huracanes de acuerdo con la sección B.6.5.9.3		N/A
(B.6.2)	Edificio cerrado Un edificio que no cumpla los requerimientos de edificios abiertos o parcialmente cerrados.		OK
(B.6.5.9.3)	**Escombros arrastrados por el viento** Los vidrios de edificios localizados en regiones de escombros arrastrados por el viento, deberán protegerse con una cobertura resistente a impacto o ser vidrios resistentes a impactos de acuerdo con los requerimientos especificados en las normas ASTM E1886 y ASTM E 1996 u otros métodos de ensayo aprobados y criterios de desempeño. EXCEPCIONES: (a) Podrán no estar protegidos los vidrios en edificios de categoría II, III o IV localizados a más de 18.0 m por encima del nivel del suelo y a más de 9.0 m sobre cubiertas con superficies de agregado localizados a 450 m alrededor del edificio. (b) Se permiten los vidrios sin protección en edificios de categoría I.		N/A
(B.6.4.1.1d)	**(d)** El edificio sea de forma regular como se define en la sección B.6.2.		OK
(B.6.2)	Estructura o edificio de forma regular Un edificio u otra estructura que no tenga geometría irregular en su forma espacial.		
(B.6.4.1.1e)	**(e)** El edificio no sea clasificado como flexible como se define en la sección B.6.2.		OK
(B.6.2)	Edificio u otra estructura flexible Edificios u otras estructuras esbeltas con frecuencia natural fundamental < 1 Hz.		

(B.6.4.1.1f)	**(f)** Las características de respuesta del edificio sean tales que el mismo no esté sujeto a cargas por viento a través de él, a generación de vórtices, a inestabilidad por golpeteo o aleteo, y no esté ubicado en un sitio en el que se puedan presentar efectos de canalización o sacudimiento por la estela de obstrucciones en barlovento, que obliguen a consideraciones especiales	OK
(B.6.4.1.1g)	**(g)** El edificio tenga una sección transversal aproximadamente simétrica en cada dirección y tenga una cubierta plana o cubierta a dos o cuatro aguas con ángulo de inclinación θ<=45º.	OK
(B.6.4.1.1h)	**(h)** El edificio esta eximido de los casos de carga torsional indicados en la Nota 5 de la fig. B.6.5-7, o estos casos no controlan el diseño de ninguno de los elementos del SPRFV del edificio.	OK

(B.6.4.1.2)	**Componentes y Revestimientos** Para el diseño de los componentes y elementos de revestimiento, el edificio debe cumplir todas las siguientes condiciones:			**Requisito**
(B.6.4.1.2a)	(a) La altura promedio h es igual o menor a 18.0 m.			OK
	Altura media de la cubierta	9 m	OK	
(B.6.4.1.2b)	(b) El edificio es cerrado como se define en la sección B.6.2 y cumple las provisiones de zonas propensas a huracanes de acuerdo con la sección B.6.5.9.3.			N/A
(B.6.2)	Edificio cerrado Un edificio que no cumpla los requerimientos de edificios abiertos o parcialmente cerrados.		OK	
(B.6.5.9.3)	**Escombros arrastrados por el viento** Los vidrios de edificios localizados en regiones de escombros arrastrados por el viento, deberán protegerse con una cobertura resistente a impacto o ser vidrios resistentes a impactos de acuerdo con los requerimientos especificados en las normas ASTM E1886 y ASTM E 1996 u otros métodos de ensayo aprobados y criterios de desempeño. EXCEPCIONES: (a) Podrán no estar protegidos los vidrios en edificios de categoría II, III o IV localizados a más de 18.0 m por encima del nivel del suelo y a más de 9.0 m sobre cubiertas con superficies de agregado localizados a 450 m alrededor del edificio. (b) Se permiten los vidrios sin protección en edificios de categoría I.		N/A	
(B.6.4.1.2c)	(c) El edificio es de forma regular como se define en la sección B.6.2.			OK
(B.6.2)	Estructura o edificio de forma regular Un edificio u otra estructura que no tenga geometría irregular en su forma espacial.			
(B.6.4.1.2d)	(d) El edificio tiene una cubierta plana, una cubierta a dos aguas con θ<=45º o una cubierta a cuatro aguas con θ<=27º.			OK

(B.6.4.2)	**PROCEDIMIENTO DE DISEÑO**			
(B.6.4.2a)	**(a)** La velocidad básica de viento V se determina de acuerdo con la sección B.6.5.4. Deberá suponerse que el viento viene de cualquier dirección horizontal.			
(B.6.5.4)	**VELOCIDAD DE VIENTO BÁSICA** La velocidad de viento básica, V usada en la determinación de las cargas de viento de diseño edificios y otras estructuras se tomará de la Fig. B.6.4-1, excepto con lo especificado en las secciones B.6.5.4.1 y B.6.5.4.2. Se supondrá que el viento proviene de cualquier dirección horizontal.			
(B.6.5.4.1)	**Regiones Especiales para Viento** La velocidad básica de viento se incrementará donde existan registros o la experiencia indique velocidades de viento mayores que las expresadas en la fig. B.6.4-1. Terrenos montañosos, precipicios y las regiones especiales de la figura B.6.4-1 se deberán estudiar para determinar si existen condiciones de viento inusuales. La autoridad respectiva ajustará los valores de la fig. B.6.4-1 para reflejar velocidad de viento locales mayores. Este ajuste se debe hacer basado en información meteorológica y en una estimación de la velocidad básica del viento según las especificaciones de la sección B.6.5.4.2.			
	¿Región especial para viento?			NO
(B.6.5.4.2)	**Estimación de la Velocidad Básica del Viento a partir de Información Climática Regional** Los datos climáticos regionales se pueden usar en lugar de las velocidades básicas de viento dadas en la figura B.6.4-1 solamente cuando la autoridad competente considere que se han cumplido las siguientes condiciones:			
(B.6.5.4.2.1)	Se han utilizado procedimientos estadísticos aprobados para el análisis de valores extremos en el tratamiento de los datos, y			
(B.6.5.4.2.2)	Se han tenido en cuenta la longitud de registros, el error de muestreo, el tiempo promedio, la altura del anemómetro, la calidad de los datos y la exposición del terreno.			
	¿Estimación de la velocidad a partir de información climática regional?			NO
Fig. B.6.4-1	La velocidad de viento básica, V	Región 2	22 m/s	80 km/h
(B.6.4.2b)	**(b)** El factor de importancia I se determina de acuerdo con la sección B.6.5.5.			
(B.6.5.5)	FACTOR DE IMPORTANCIA El factor de importancia, I , para el edificio u otra estructura debe determinarse de la tabla B.6.5-1. de acuerdo con los grupos de uso presentados en la sección A.2.5			
(A.2.5)	Coeficiente de Importancia, I		II	1.10
(B.6.4.2c)	**(c)** La categoría de exposición se determina de acuerdo con la sección B.6.5.6.			
(B.6.5.6)	EXPOSICIÓN Para cada dirección de viento considerada, la categoría de exposición a barlovento se determinará con base en la rugosidad del terreno que a su vez es determinada por la topografía natural, la vegetación y las estructuras construidas en éste			
(B.6.5.6.3)	Categorías de Exposición			
(B.6.5.6.2B)	Rugosidad de Terreno B — Áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones del tamaño, iguales o mayores al de una vivienda unifamiliar y con poca separación entre ellas.			
	Rugosidad del terreno			B

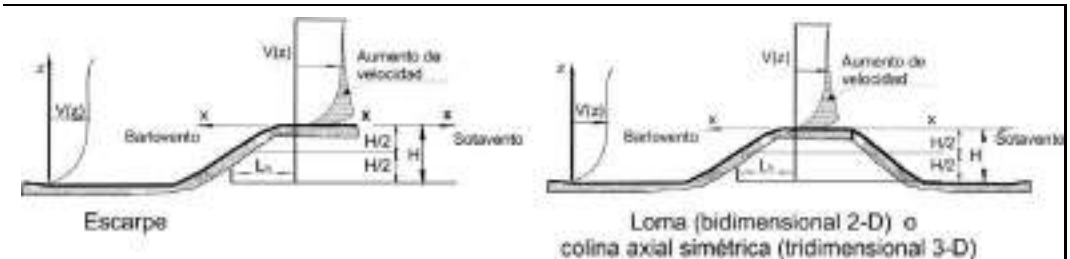
(B.6.5.6.3B)	Exposición B — La categoría de exposición B aplica cuando la rugosidad del terreno, como se define en Rugosidad de Terreno B, prevalece por una distancia de al menos 800m o 20 veces la altura del edificio, la que sea mayor, en la dirección al viento. EXCEPCIÓN — Para edificios cuya altura media sea menor o igual a 9.0 m, la distancia viento arriba pueden reducirse a 460 m.				
	Categoría de exposición	B			
(B.6.4.2d)	(d) Se determina un coeficiente de ajuste por altura y exposición, λ de acuerdo con la fig. B.6.4-2.				
Fig. B.6.4-2	Altura media de la cubierta	9.0 m			
	Coeficiente de ajuste por altura y exposición λ	1			
(B.6.5.7)	EFECTOS TOPOGRÁFICOS				
(B.6.5.7.1)	Aumento de velocidad sobre Colinas o Escarpes Se deben incluir en el diseño los efectos de aumento de velocidad del viento sobre colinas aisladas, o escarpes, que constituyan cambios abruptos en la topografía general. Los edificios, las condiciones del sitio y la localización deben cumplir todas las siguientes condiciones:				
(B.6.5.7.1a)	(a) Que la colina, o escarpe esté aislada y sin obstrucciones en barlovento, por otros accidentes topográficos de altura cercana a 100 veces su altura (100H) o 3 km, la que sea menor. La distancia se debe medir horizontalmente del punto desde el cual la altura H de la loma, colina o escarpe se mide.	OK	OK		
(B.6.5.7.1b)	(b) Que la colina, o escarpe sobresalga por encima del terreno viento arriba por un factor de 2 o más, dentro de un radio de 3 km.	OK			
(B.6.5.7.1c)	(c) Que la estructura esté localizada en la mitad superior de la colina o cerca de la cresta del escarpe, como se muestra en la fig. B.6.5-1.	OK			
(B.6.5.7.1d)	(d) Que H / Lh >= 0.2 .	OK			
(B.6.5.7.1e)	(e) H es mayor o igual a 4.5 m para la Exposición C y D y 18 m para la Exposición B.	OK			
(B.6.5.7.2)	Factor Topográfico El efecto de aumento de velocidad de viento se incluirá en el cálculo de cargas de viento de diseño usando el factor Kzt : Donde K1 , K2 y K3 se dan en la Fig. B.6.5-1. $K_{zt} = (1 + K_1K_2K_3)^2$ (B.6.5-1) Si el sitio o la localización de la estructura no cumple las condiciones especificadas en la sección B.6.5.7.1, entonces Kzt = 1.0.				
					
	Tipo de terreno	Colina Axial simétrica 3-D			
	Altura sobre el nivel del terreno local	z	10 m	Factor Kzt	1.00

Fig. B.6.4.2

Ps10 = presión de viento de diseño simplificada para la categoría de exposición B , con h=10 m de la fig. B.6.4-2.

Velocidad Básica deViento m/s (km/h)	22(80)		Angulo de Inclinación de la cubierta (grados)	20		Caso de Carga	1	
Presiones Horizontales	A	0.26	Presiones Verticales	E	-0.23	Aleros	E_{OH}	-0.32
	B	-0.07		F	-0.16			
	C	0.17		G	-0.16		G_{OH}	-0.25
	D	-0.04		H	-0.12			

(B.6.4.2.1.1)

Presiones Mínimas

Los efectos de carga de las presiones de viento de diseño de la sección B.6.4.2.1 no serán menores que el caso de carga mínima de la sección B.6.1.3.1, suponiendo presiones ps , de +0.40 kN/m2 para las zonas A, B, C y D y de 0 kN/m2 para las zonas E, F, G y H.

(B.6.4.2.1)

Sistema Principal de Resistencia de Fuerzas de Viento (SPRFV)

Las presiones de viento de diseño simplificado, ps , representan la presión neta (suma de presiones internas y externas) que se debe aplicar a las proyecciones horizontales y verticales de las superficies del edificio como se muestra en la fig. B.6.4-2. Para la presión horizontal (zonas A, B, C y D), ps es la combinación de las presiones netas a barlovento y sotavento, ps se determinará con la siguiente Ec.:

donde;

$$P_s = \lambda K_{zt} I P s_{10} \quad \text{(B.6.4-1)}$$

λ = factor de ajuste por altura y exposición, de la fig. B.6.4-2 (continuación).
Kzt = factor topográfico como se define en la sección B.6.5.7 evaluado a la altura promedio de la cubierta, h ecuación B.6.5-1
I = factor de importancia como se define en la sección B.6.5.5
Ps10 = presión de viento de diseño simplificada para la categoría de exposición B , con h=10 m de la fig. B.6.4-2.

Presiones Horizontales	A	0.40	Presiones Verticales	E	-0.40	Aleros	E_{OH}	-0.40
	B	-0.40		F	-0.40			
	C	0.40		G	-0.40		G_{OH}	-0.40
	D	-0.40		H	-0.40			

Fig. B.6.4-3

Pnet10 = presión neta de viento de diseño para la categoría de exposición B a h = 10.0 m
PARA CUBIERTAS Y MUROS.

Angulo de Inclinación de la cubierta (grados)	8 a 27	Área de viento efectivo (m2)	10	Velocidad Básica de Viento V m/s (km/h)	22(80)	
Presiones POSITIVAS en regiones 1 a 5	1	0.09	Presiones NEGATIVAS en regiones 1 a 5	1	-0.18	
	2	0.09		2	-0.25	
	3	0.09		3	-0.39	
	4			4		
	5			5		

Como pueden ver los factores las presiones negativas y positivas son de + o – 0.40kg/m2

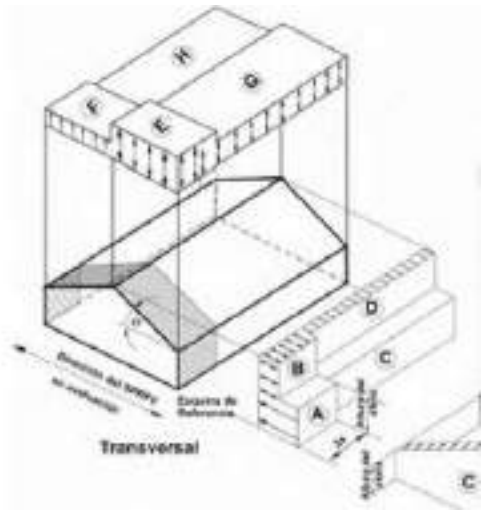


Imagen 14. Aplicación de cargas de cubierta según la NSR10

2.2. Combinaciones de carga

Datos de entrada

- D: 10kg/m2 Carga muerta, peso propio + sobrecarga
- Lr o G o Le: 50 kg/m2 Carga de granizo
- W: 40 kg/m2 Carga de viento

Las combinaciones de carga que se consideran en este caso y se van a ingresar al modelo son:

$U1 = 1{,}4D$	(B.2.4-1)	= 1.4(10)	= 14 kg/m2
$U2 = 1{,}2D + 0.5Lr$	(B.2.4-2)	= 1.2(10) + 0.5(50)	= 37 kg/m2
$U3 = 1{,}2D + 1.6Lr + 0.5W$	(B.2.4-3)	= 1.2(10) + 1.6(50) + 0.5(40)	= 112 kg/m2
$U4 = 1{,}2D + 1.0W + 0.5\ Lr$	(B.2.4-4)	= 1.2(10) + 1.0(40) + 0.5(50)	= 77 kg/m2
$U5 = 0.9D + 1.0W$	(B.2.4-6)	= 0.9(10) + 1.0(40)	= 49 kg/m2

2.3 Diagrama de cuerpo libre

Debido a que las cargas en el modelo de ETABS se aplican en los nodos de la cercha TRIDIMENSIONAL se descompone la carga total en 10 nodos.

Ancho aferente: 2.0m

Longitud aferente: 4.0m

Carga puntual: =(Carga distribuida de techo x Ancho x Longitud)

=(112 kg/m2 x 2.0m x 4.0m)

= 896kg

2.2.1 Carga Mayorada

La carga mayorada corresponde a un total de 896kg/9 = 99.5kg se redonde a 100kg

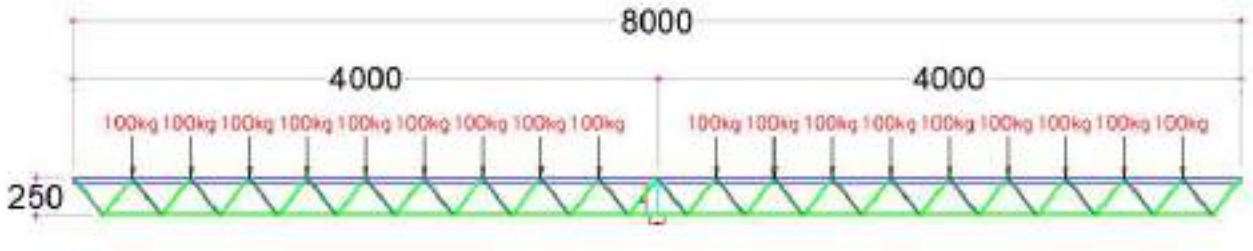


Imagen 15. Cargas mayoradas ingresadas al modelo

2.4. Coeficiente de reducción de resistencia

$\phi = 0.9$ Para elementos chequeados a compresión

$\phi = 0.9$ Para elementos chequeados a tracción (fluencia)

$\phi = 0.75$ Para elementos chequeados a tracción (fractura)

3. CHEQUEO DE CERCHA

El programa ETABS chequea la estructura metálica con base en el Código AISC 360-16 y los datos de entrada mencionados anteriormente.

Los resultados son los siguientes:




Imagen 16. Chequeo con ETABS de la cercha tridimensional teniendo en cuenta las combinaciones de carga de la NSR10



Imagen 17. Diagrama de fuerza axial de las cerchas

Como se puede ver en las imagen 16 y 17 se puede decir que es una luz de 4m recomendad para una cercha de este tipo. Los miembros de la cercha más afectados se pueden describir de la siguiente manera:

- Cuerda superior:

  En los apoyos de la izquierda y de la derecha, los valores son de 1.2T, quieren decir que la carga que fluye a través de ellos supera en esa relación a la capacidad que tiene el elemento para resistirla, en este caso cuando actúa esfuerzos de tracción. En otras palabras, los elementos están sobrecargados con las combinaciones actuales de la NSR-10.

- Los elementos diagonales u ondas y separadores:

  el valor de sobreesfuerzo está 1.5T, por lo que también tiene sobreesfuerzo. Se evidencia más que todo en elementos que están cerca a los apoyos, izquierdo, derecho y centro.

- La cuerda inferior

  En la parte inferior se tiene una barra de 1/2” que actúa 100% a Tracción. Luego de analizar la información solo se nota un sobreesfuerzo cerca del apoyo intermedio.

4. RECOMENDACIONES

4.1. Instalar apoyo entre cerchas con perfil metálico PTE 50mm x 100mm x 3mm

Al instalar apoyo intermedio entre las cerchas existentes con un perfil adicional de calidad ASTM A36 de 50mm x 100mm x 3mm la carga disminuye a la mitad. Otra de las razones es que debido a que las cerchas están cada 2m, la teja propuesta se sale de la especificación en donde se recomienda entre 1 a 1.5m. Se evita el desmonte de las cerchas existentes y se prioriza la pintura con anticorrosivo y la del acabado según diseño arquitectónico.

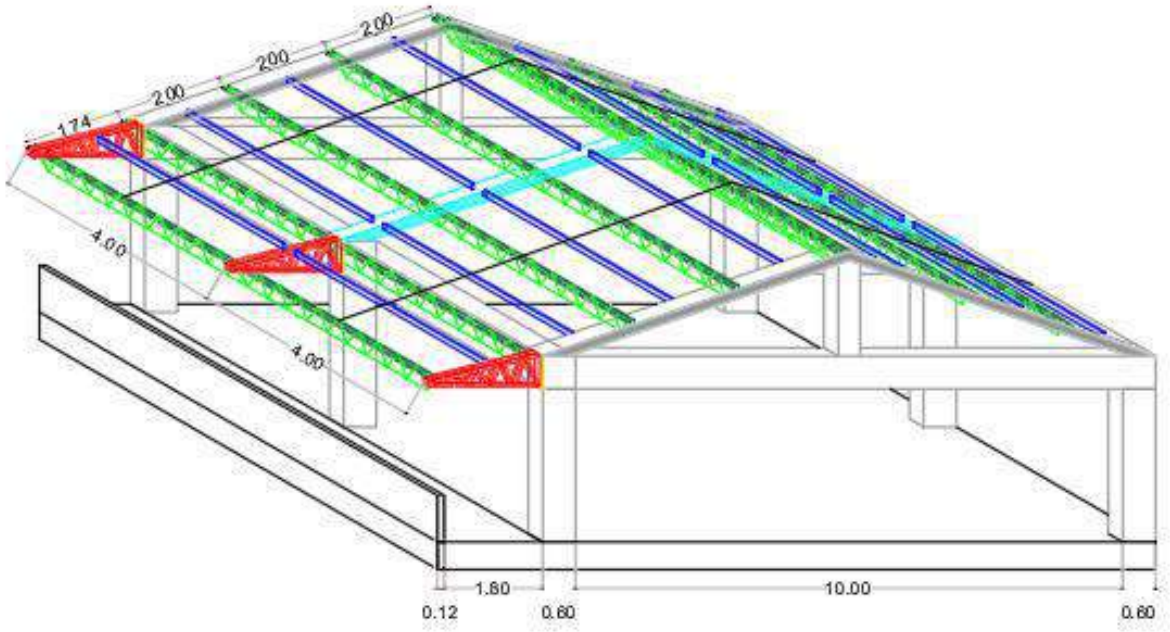


Imagen 18. Instalación de perfiles intermedios entre cerchas

El perfil se recomienda:

1. Soldar el elemento perfil tubular al perfil IPE de la mitad del salón.
2. Anclar con platina de 3/8 de 10 x 20 con 2 pernos de ½" al concreto de la viga cinta con una profundidad de 10cm. El perfil se suelda a la platina con soldadura 70xx de 10mm.




Imagen 19. Chequeo de cercha con la mitad de la carga

Reducir área aferente mejora comportamiento de la cercha. No habría que reforzarla.

4.2 Reforzar las platinas que soportan las cerchas de los corredores

Como se puede observar en la fotografía de la imagen 20, solo se alcanzan a ver dos pernos en parte inferior. Lo normal es que los pernos también estén en el parte superior anclado a la viga porque son lo que soportan mayor carga a tracción a diferencia de los inferiores que trabajan a compresión. A estos pernos les está tocando trabajar a tracción desde una distancia muy corta a punto de vuelco.



Imagen 20. Platina de cerchas de corredores

Instalar al menos dos pernos, uno a cada lado de la parte superior de la platina. 2 pernos A490 de 5/8" con profundidad de 15cm. Anclaje con epóxico anchor fix o similar al concreto de la viga de cubierta

4.3 Reparar los anclajes y sitios donde haya problemas con el concreto de la viga cinta con mortero de alta resistencia sikatop122 o similar.

4.4 Pintar todas las cerchas con anticorrosivo y con el color de diseño arquitectónico que se elija para el colegio.

4.5 Reparar con soldadura elementos que en la visita no se hayan visto defectuosos o que se vena muy corroídos.

4.6 Instalar templetes entre cerchas con varilla de D:1/2" separados máximo 2m

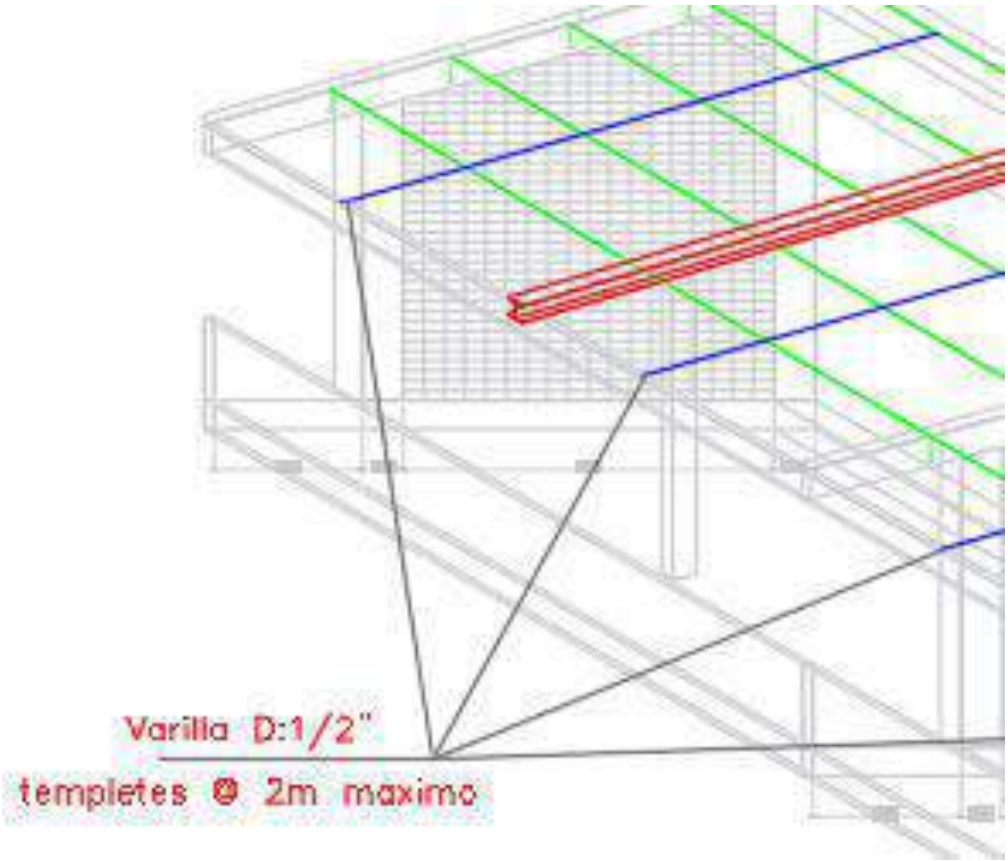


Imagen 21. Ejemplo de Instalación e templetes entre cerchas



Imagen 22. Ejemplo de instalación de templetes

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_051

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de presupuesto actualizado Colegio Jose Marti Sede A, Luis Lopez de Mesa – Alternativa 4.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del presupuesto actualizado del Colegio Jose Marti Sede A, Luis Lopez de Mesa, esto atendiendo a la solicitud de interventoría. El presente presupuesto tiene un alcance de intervención de cambio cubiertas existentes en asbesto cemento (Boque A, Comedor y Serigrafia); Carpintería metálica únicamente en de serigrafia, redes eléctricas a nivel de cubierta, bajantes y canales en áreas intervenidas con cubierta. Esto con el objetivo de revisión y aprobación, o en su defecto definir el alcance para el ajuste pertinente, antes de iniciar intervenciones.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto Memorias de Calculo
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO COLEGIO JOSE MARTI SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.1.1	REPLANTEO	M2	1500,00	$ 3.222,00	$ 4.833.000,00
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	392,00	$ 35.570,00	$ 13.943.440,00
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,69	$ 26.351,00	$ 149.937,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	41,84	$ 14.008,00	$ 586.095,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1500,00	$ 29.215,00	$ 43.822.500,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	370,00	$ 8.634,00	$ 3.194.580,00
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	560,00	$ 8.921,00	$ 4.995.760,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	240,00	$ 5.062,00	$ 1.214.880,00
1.2.46	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	800,00	$ 20.244,00	$ 16.195.200,00
1.2.47	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	800,00	$ 16.194,00	$ 12.955.200,00
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1500,00	$ 13.327,00	$ 19.990.500,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 121.881.092,00**
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.3.24	SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN 795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA PARA USO DE MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA OBRA DE CONSTRUCCION.	UN	20,00	$ 240.531,00	$ 4.810.620,00
2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	16.500,00	$ 16.242,00	$ 267.993.000,00
SUBTOTAL	**2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 272.803.620,00**

5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	180,00	$ 144.994,00	$ 26.098.920,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	140,00	$ 144.482,00	$ 20.227.480,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	300,00	$ 42.467,00	$ 12.740.100,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	1800,00	$ 18.061,00	$ 32.509.800,00
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	90,00	$ 168.166,00	$ 15.134.940,00
SUBTOTAL	**5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 106.711.240,00**
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,69	$ 563.283,00	$ 3.205.080,00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	41,84	$ 623.348,00	$ 26.080.880,00
SUBTOTAL	**9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 29.285.960,00**
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	250,00	$ 46.709,00	$ 11.677.250,00
17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	360,00	$ 69.142,00	$ 24.891.120,00
17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	112,00	$ 63.665,00	$ 7.130.480,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	50,00	$ 58.194,00	$ 2.909.700,00
17.1.29	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).**	**M2**	**1500,00**	**$ 250.250,00**	**$ 375.375.000,00**

17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M	165,00	$ 104.586,00	$ 17.256.690,00
SUBTOTAL	**17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 439.240.240,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1466,74	$ 7.708,00	$ 11.305.632,00
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	22923,07	$ 1.898,00	$ 43.507.991,00
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG	29961,41	$ 2.272,00	$ 68.072.319,00
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	1000,00	$ 1.841,00	$ 1.841.000,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 124.726.942,00**

VALOR TOTAL	**$ 1.094.649.094,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 1.094.649.094,00**

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ L.

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	15	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.01	M2	REPLANTEO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores	178,5	8,5	21	1	178,5
Edificio aulas frente a administrativo	240	12	20	1	240
Alero adicional en área de sobrecubierta	21,5	2,5	8,6	1	21,5
Edificio area sobre auditorio	70,38	15,3	4,6	1	70,38
Edificio area sobre cafetería	367,74	22,7	16,2	1	367,74
area de entrada escaleras por cafeteria a edificio	69,7	8,5	8,2	1	69,7
area entre edificio administrativos y edificio aulas	30,6	4,5	6,8	1	30,6
CELIGRAFIA	112	8,00	14,00	1	112,00
COMEDOR	376,32	14,7	25,60	1	376,32
CUBIERTA AD					33,26
PASAN:			**SUBTOTAL**		1500,00
			TOTAL		1500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

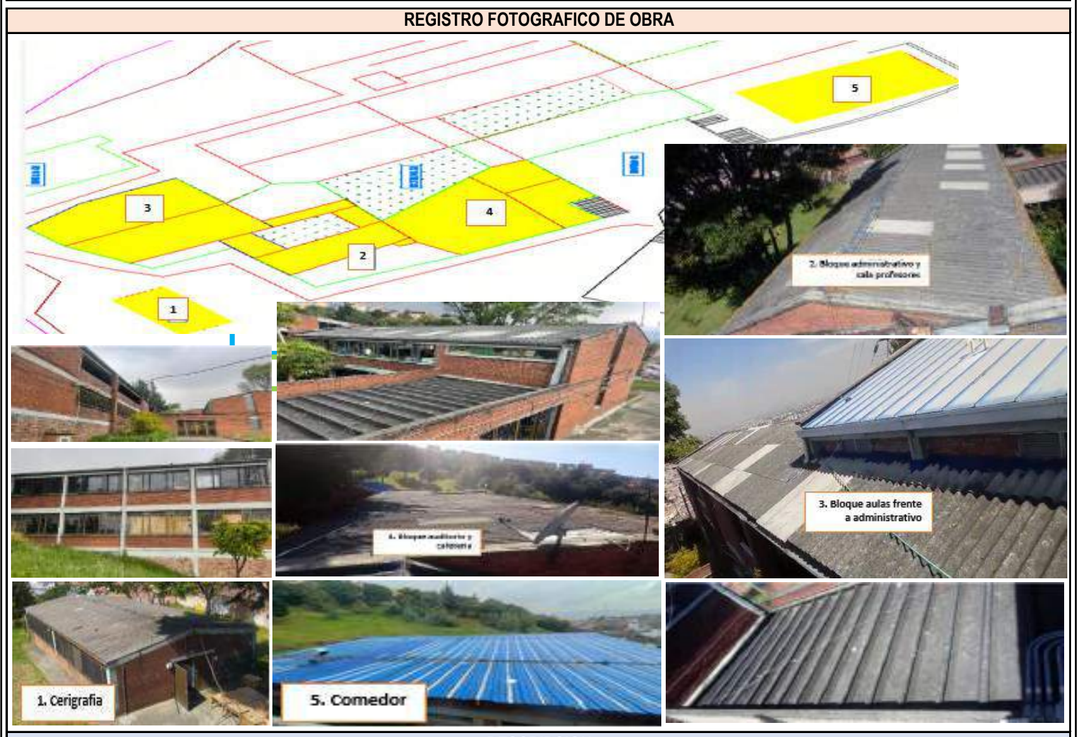

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.01.03	M	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			280	1,00	280,00
CELIGRAFIA			39,00	1,00	39,00
COMEDOR			73,00	1,00	73,00
PASAN:				SUBTOTAL	392,00
				TOTAL	392,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

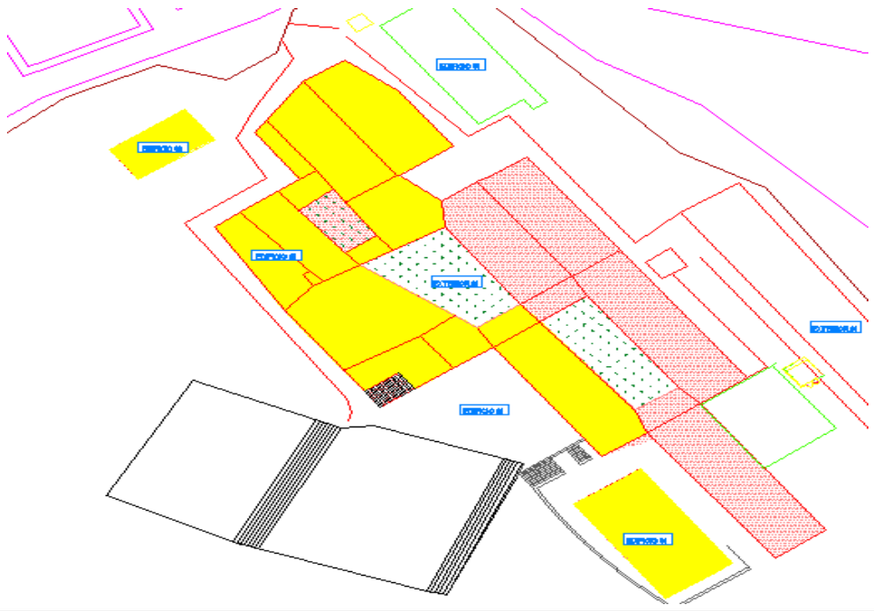







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.28	M2	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
REPLANTEO EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
CELIGRAFIA	3,68	1,75	2,10	1,00	3,68
	2,02	0,96	2,10	1,00	2,02
COMEDOR					
PASAN:				**SUBTOTAL**	5,69
				TOTAL	5,69

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA









DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.29	M2	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	5,84	3,65	1,60	1,00	5,84
CELIGRAFIA	36,00	12,00	1,50	2,00	36,00
COMEDOR					
PASAN:				SUBTOTAL	41,84
				TOTAL	41,84

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA













DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.33	M2	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores	178,5	8,5	21	1	178,5
Edificio aulas frente a administrativo	240	12	20	1	240
Alero adicional en área de sobrecubierta	21,5	2,5	8,6	1	21,5
Edificio area sobre auditorio	70,38	15,3	4,6	1	70,38
Edificio area sobre cafeteria	367,74	22,7	16,2	1	367,74
area de entrada escaleras por cafeteria a edificio	69,7	8,5	8,2	1	69,7
area entre edificio administrativos y edificio aulas	30,6	4,5	6,8	1	30,6
EDIFICIO 3 CELIGRAFIA	112	8,00	14,00	1	112,00
EDIFICIO 1 COMEDOR	376,32	14,7	25,60	1	376,32
CUBIERTA AD					33,26
PASAN:				**SUBTOTAL**	1500,00
				TOTAL	1500

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.41	UN	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				300,00	300,00
EDIFICIO 3 CELIGRAFIA				20,00	20,00
EDIFICIO 1 COMEDOR				50,00	50,00
PASAN:				SUBTOTAL	370,00
				TOTAL	370,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.42	M	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			200	2,00	400,00
CELIGRAFIA			30,00	2,00	60,00
COMEDOR			50,00	2,00	100,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	560,00
				TOTAL	560,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.44	UN	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				200,00	200,00
CELIGRAFIA				10,00	10,00
COMEDOR				30,00	30,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	240,00
				TOTAL	240,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.46	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA DE RED ELECTRICA EMT (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			600	1,00	600,00
CELIGRAFIA			100	1,00	100,00
COMEDOR			100	1,00	100,00
PASAN:				SUBTOTAL	800,00
				TOTAL	800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.02.47	M	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RED ELÉCTRICA PVC (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			600	1,00	600,00
CELIGRAFIA			100	1,00	100,00
COMEDOR			100	1,00	100,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	800,00
				TOTAL	800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	15	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
01.04.01	M	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			900	1,00	900,00
CELIGRAFIA			300	1,00	300,00
COMEDOR			300	1,00	300,00
PASAN:				SUBTOTAL	1500,00
				TOTAL	1500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

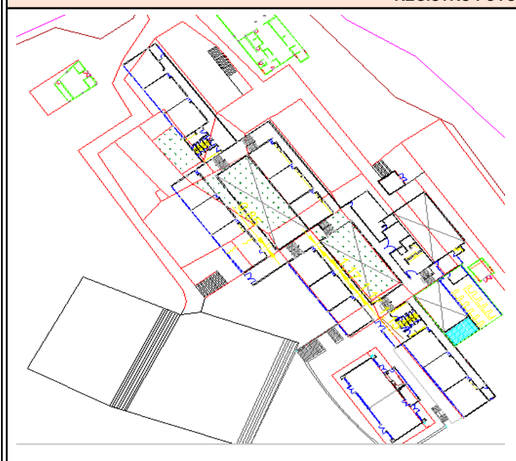



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
2.3.4	UN	SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN 795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA PARA USO DE MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA OBRA DE CONSTRUCCION.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				12,00	12,00
CELIGRAFIA				4,00	4,00
COMEDOR				4,00	4,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	20,00
				TOTAL	20,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

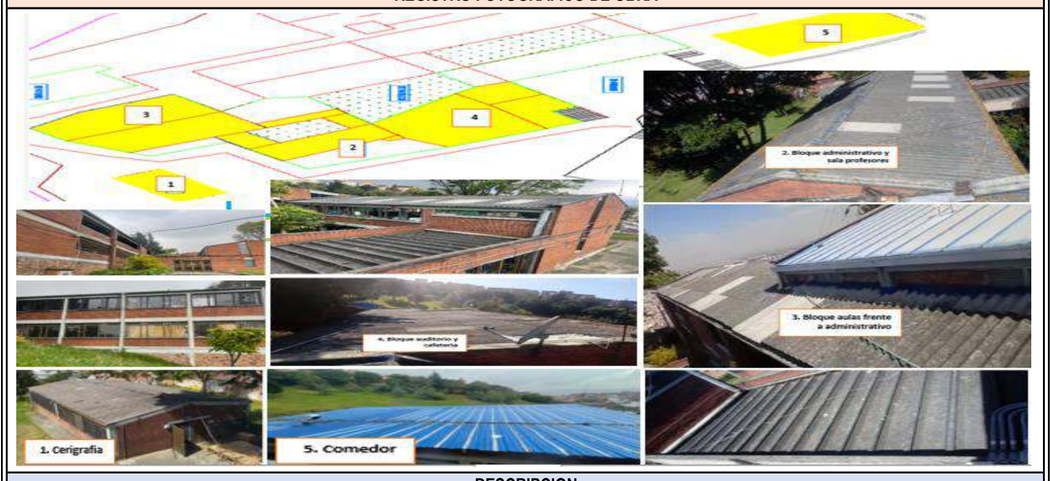

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
02.05.02	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	KG	TOTAL
ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS	1.500,00			16.500,00	16.500,00
PASAN:				SUBTOTAL	16.500,00
				TOTAL	16.500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

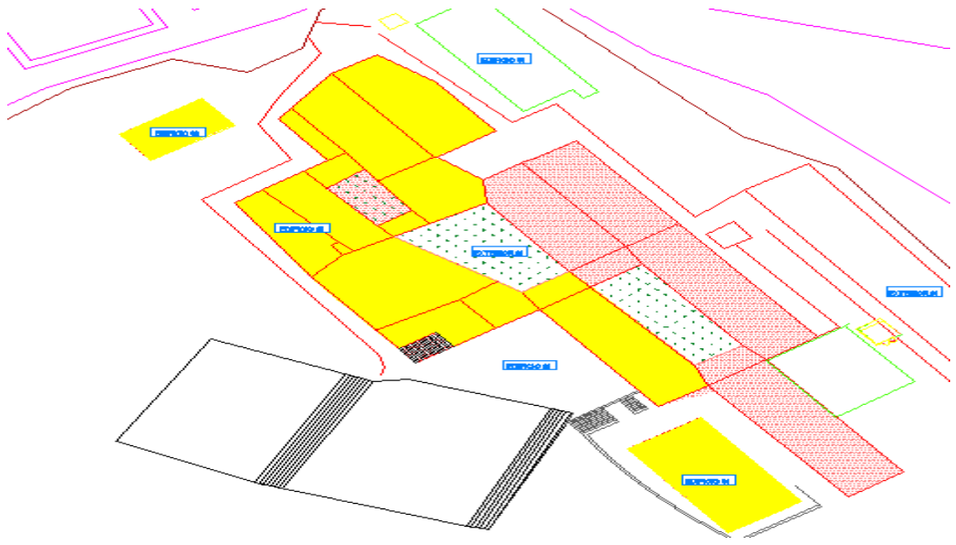

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.01	UN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			150,00		150,00
CELIGRAFIA			10,00		10,00
COMEDOR			20,00		20,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	180,00
				TOTAL	180,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

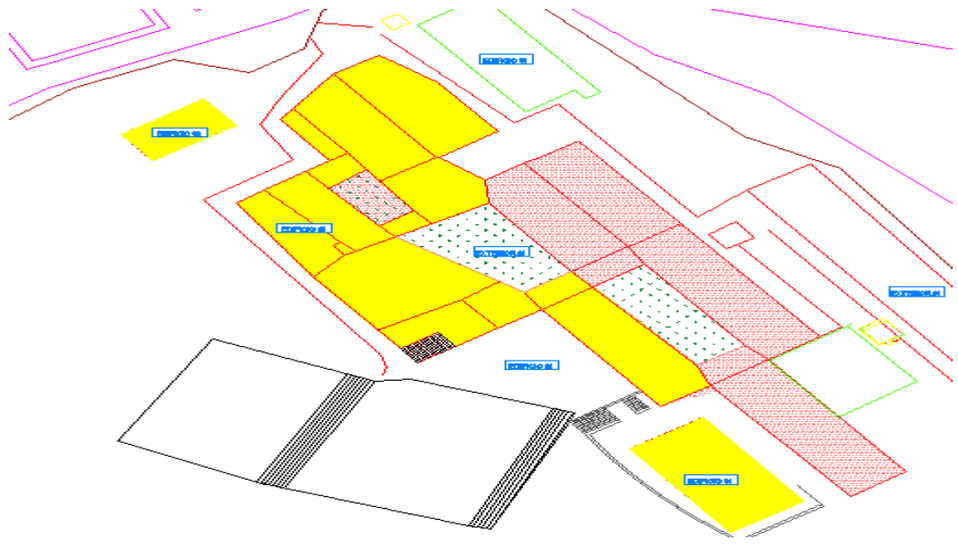

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.11	UN	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			80,00		80,00
CELIGRAFIA			20,00		20,00
COMEDOR			40,00		40,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	140,00
				TOTAL	140,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

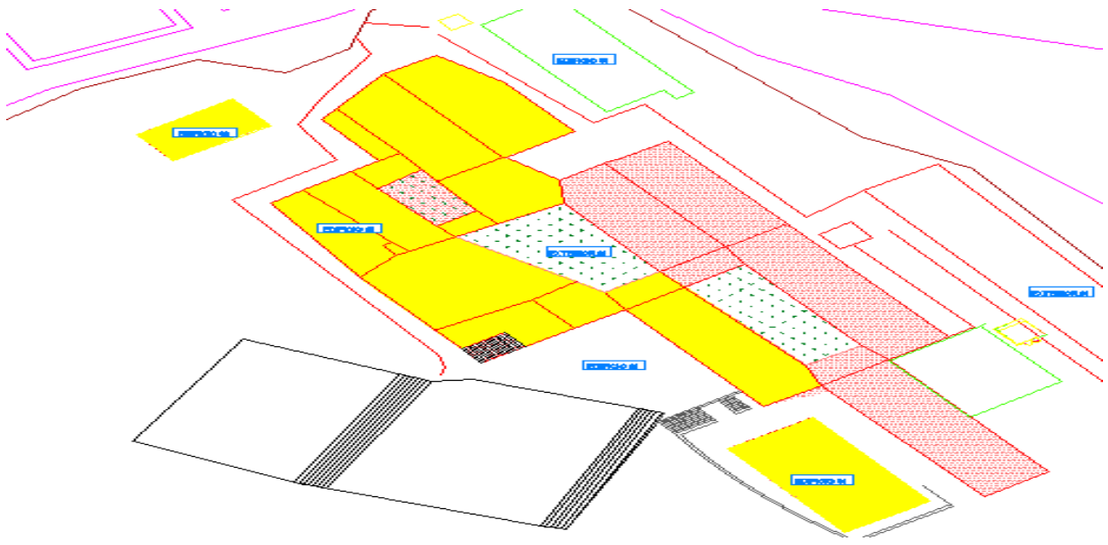

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.50	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			200,00		200,00
CELIGRAFIA			50,00		50,00
COMEDOR			50,00		50,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	300,00
				TOTAL	300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

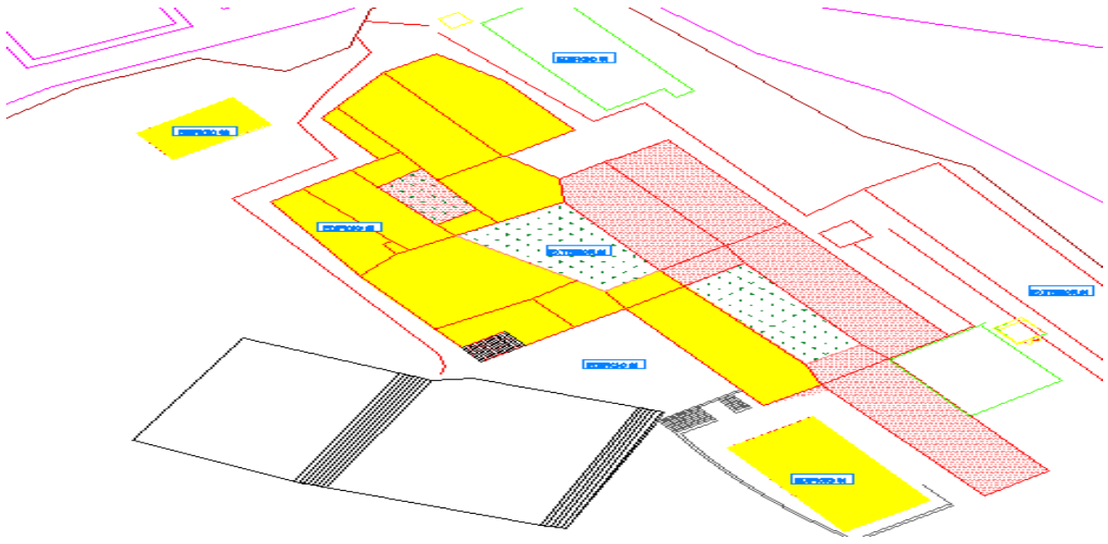

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
05.01.56	M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	VOLUMEN	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			1000,00		1.000,00
CELIGRAFIA			300,00		300,00
COMEDOR			500,00		500,00
					-
PASAN:				SUBTOTAL	1.800,00
				TOTAL	1.800,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

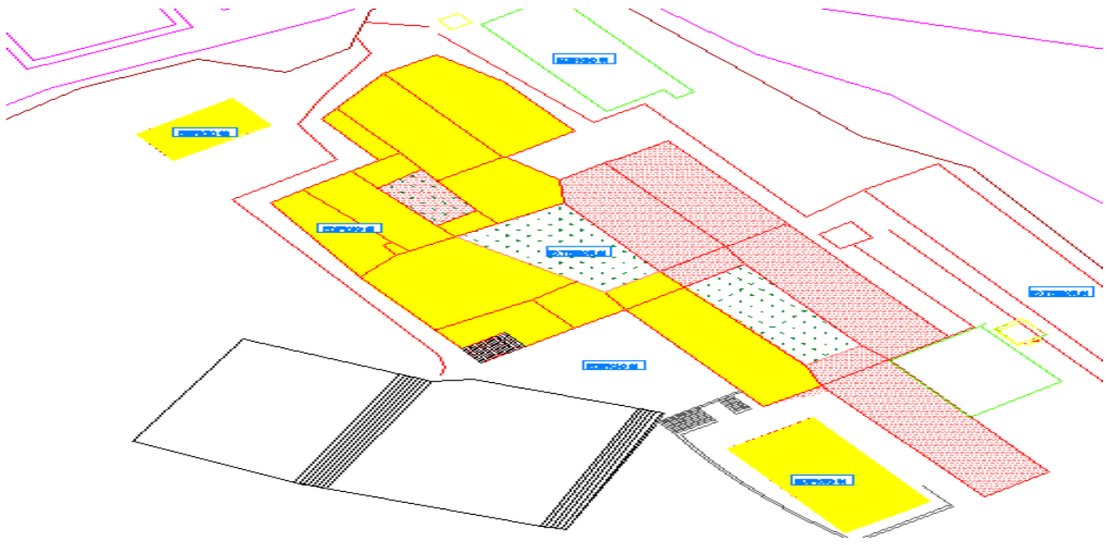

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.1.88	UN	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				60,00	60,00
CELIGRAFIA				10,00	10,00
COMEDOR				20,00	20,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	90,00
				TOTAL	90,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

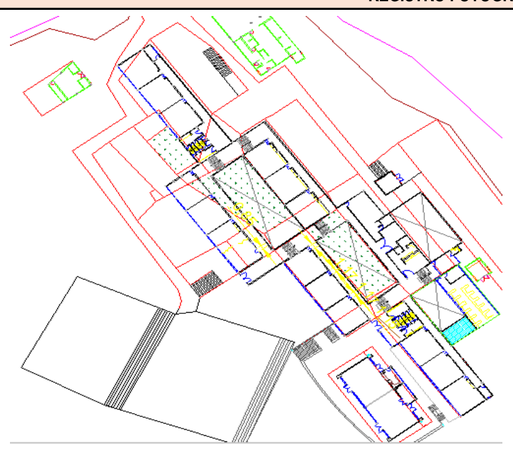



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA			
	FECHA:	15	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
09.01.03	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
CELIGRAFIA	3,68	1,75	2,10	1,00	3,68
	2,02	0,96	2,10	1,00	2,02
COMEDOR					
PASAN:				SUBTOTAL	5,69
				TOTAL	5,69

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

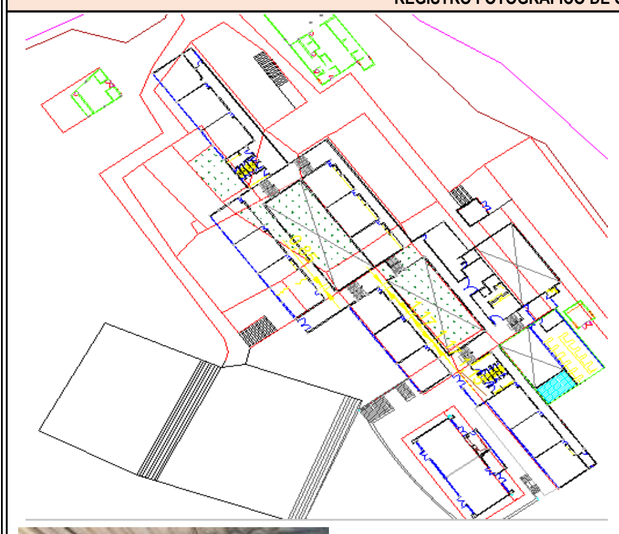







DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
09.02.02	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	5,84	3,65	1,60	1,00	5,84
CELIGRAFIA	36,00	12,00	1,50	2,00	36,00
COMEDOR					
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	41,84
				TOTAL	41,84

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA













DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.01	M	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			200	1,0	200,00
CELIGRAFIA			20	1,0	20,00
COMEDOR			30	1,0	30,00
PASAN:				SUBTOTAL	250,00
				TOTAL	250,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

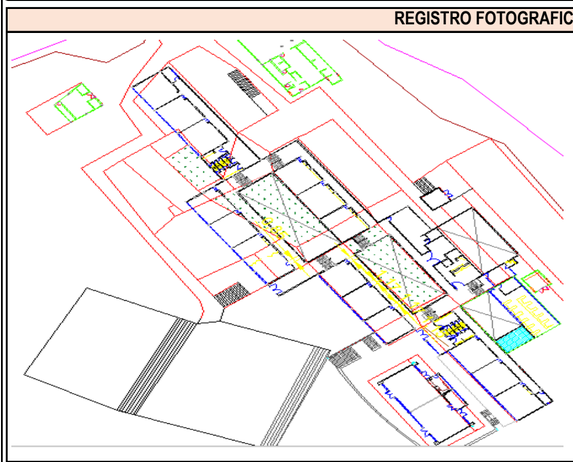



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.04	M	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			100	2,00	200,00
CELIGRAFIA			30,00	2,00	60,00
COMEDOR			50,00	2,00	100,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	360,00
				TOTAL	360,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.05	M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			80	1,0	80,00
CELIGRAFIA			12	1,0	12,00
COMEDOR			20	1,0	20,00
PASAN:				SUBTOTAL	112,00
				TOTAL	112,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

EI
PI





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.07	M	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	40,00	0,20	200	1,0	40,00
CELIGRAFIA	4,00	0,20	20	1,0	4,00
COMEDOR	6,00	0,20	30	1,0	6,00
PASAN:				SUBTOTAL	50,00
				TOTAL	50,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

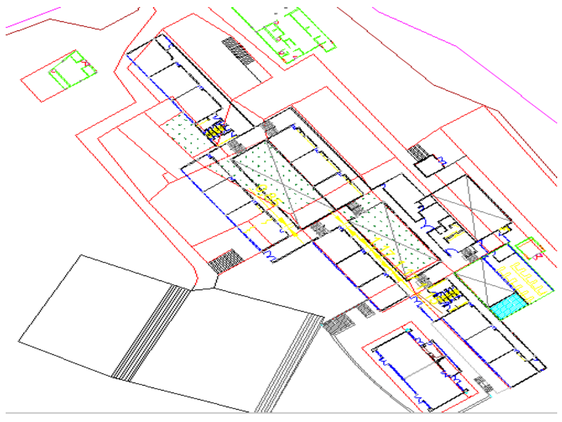



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia Gp Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.1.29	M2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDING SEAM (ANCHO = 500mm.) DOBLE CAPA CON AISLANTE DE POLIETILENO DE 50 mm. - SEGUN MEDIDAS IN SITU - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL					
Edificio administrativos y profesores	178,5	8,5	21	1	178,5
Edificio aulas frente a administrativo	240	12	20	1	240
Alero adicional en area de sobrecubierta	21,5	2,5	8,6	1	21,5
Edificio area sobre auditorio	70,38	15,3	4,6	1	70,38
Edificio area sobre cafeteria	367,74	22,7	16,2	1	367,74
area de entrada escaleras por cafeteria a edificio	69,7	8,5	8,2	1	69,7
area entre edificio administrativos y edificio aulas	30,6	4,5	6,8	1	30,6
EDIFICIO 3 CELIGRAFIA	112	8,00	14,00	1	112,00
EDIFICIO 1 COMEDOR	376,32	14,7	25,60	1	376,32
CUBIERTA AD					33,26
PASAN:				**SUBTOTAL**	1500,00
				TOTAL	1500

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

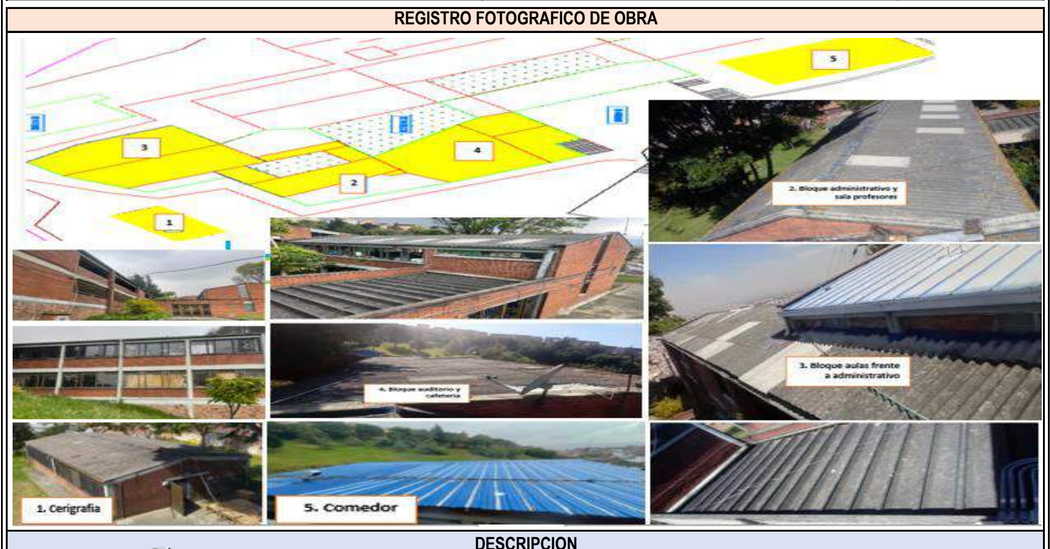

DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**		
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**		
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01.30	M	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL			120	1,0	120,00
CELIGRAFIA			17	1,0	17,00
COMEDOR			28	1,0	28,00
PASAN:				SUBTOTAL	165,00
				TOTAL	165,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

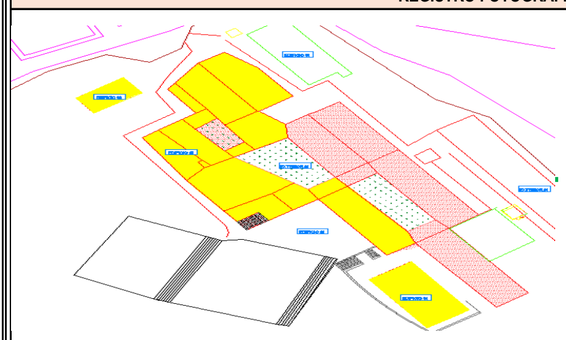







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.01	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	LARGO	CANT	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	978,42				978,42
CELIGRAFIA	112,00				112,00
COMEDOR	376,32				376,32

PASAN:		SUBTOTAL	1466,74
		TOTAL	1466,74

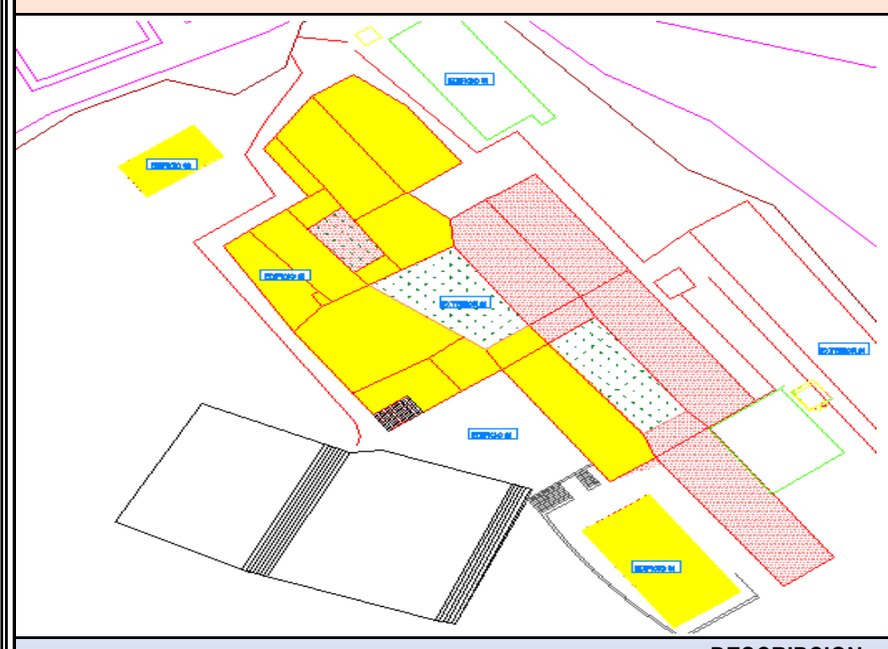







DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2022**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.02	KG	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PESO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	978,42			17,00		16633,14
CELIGRAFIA	112,00			17,00		1904,00
CUBIERTA AD	33,26			17,00		565,42
PASAN:					SUBTOTAL	22923,07
					TOTAL	22923,07

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

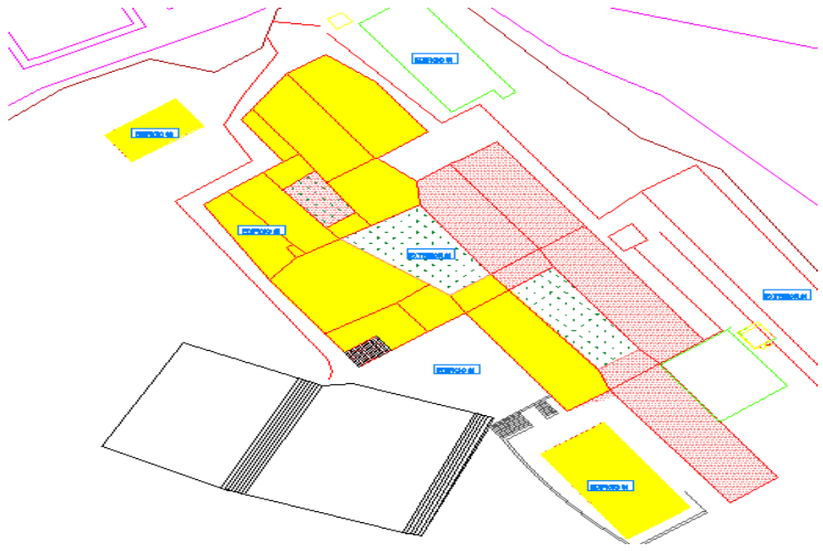





DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2022**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.03	KG	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PESO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL	978,42			17,00	8%	16633,14
CELIGRAFIA	112,00			17,00	8%	1904,00
COMEDOR	376,32			17,00	8%	6397,44
CUBIERTA AD						33,26
PASAN:					SUBTOTAL	29961,41
					TOTAL	29961,408

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

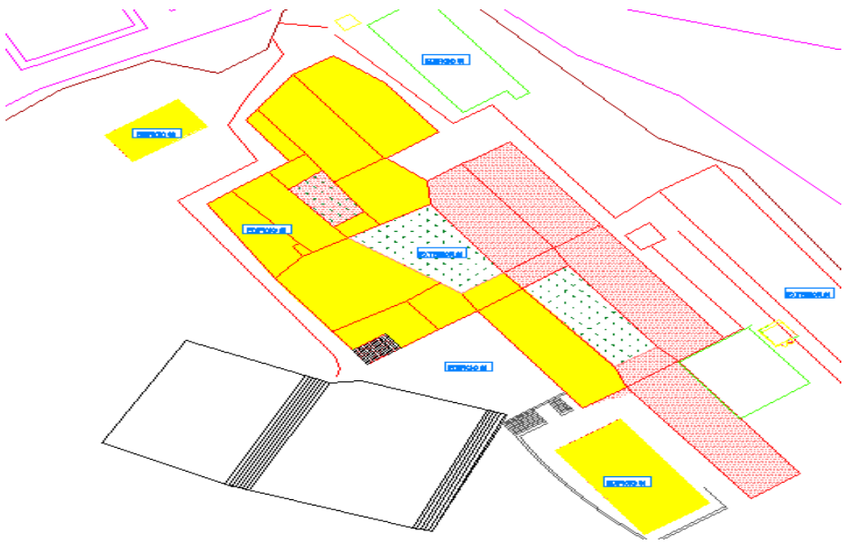





DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			
	FRENTE:	**JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LOPEZ DE MESA**			
	FECHA:	**15**	**02**	**2022**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.01.04	KG	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)

DESCRIPCION	DIMENSIONES					
	ÁREA	ANCHO	LARGO	PESO	PENDIENTE	TOTAL
EDIFICIO BLOQUE CENTRAL				600,00		600,00
CELIGRAFIA				200,00		200,00
COMEDOR				200,00		200,00
						0,00
PASAN:					SUBTOTAL	1000,00
					TOTAL	1000

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

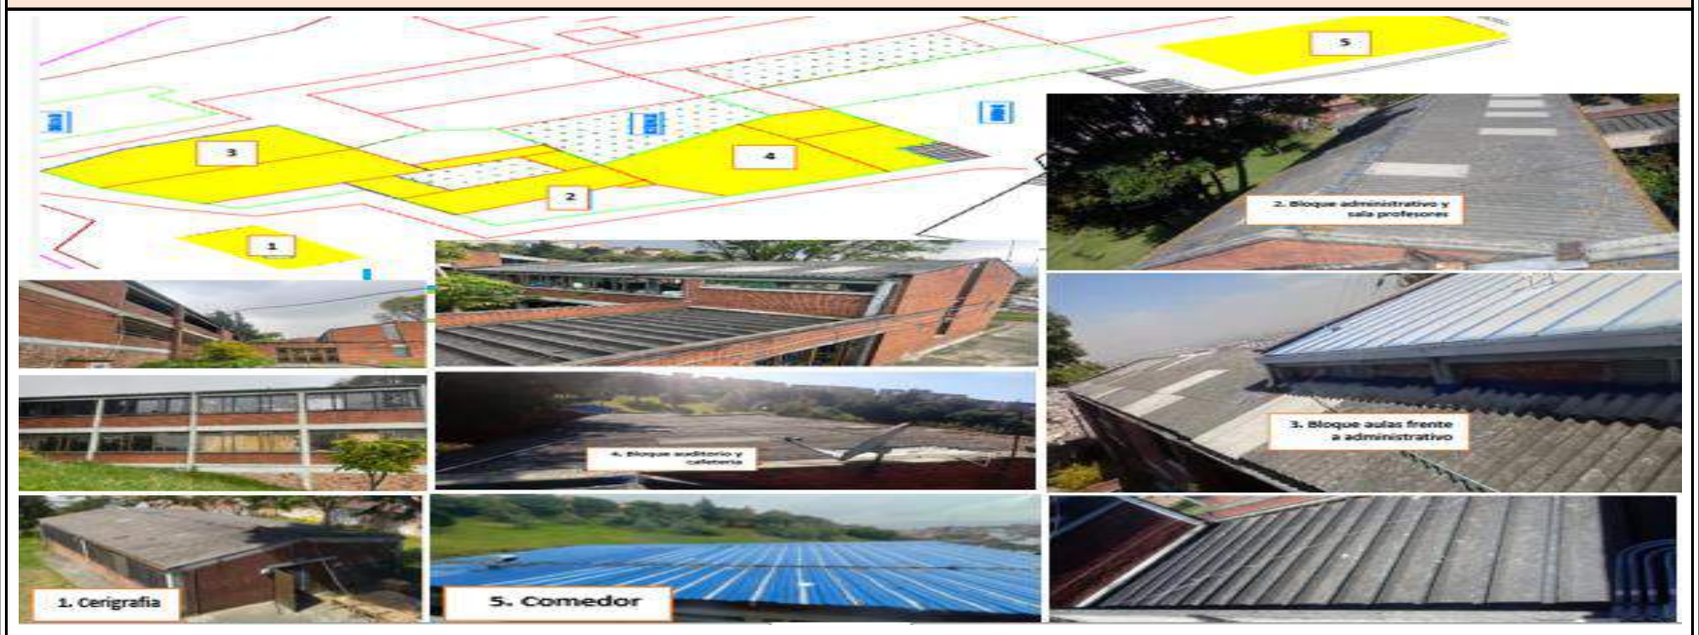

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_052

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega de presupuesto Emergencia en Baterías de Baños - Colegio San Agustín Sede A.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la entrega del presupuesto actualizado de la Emergencia en Baterías de Baños - Colegio San Agustín Sede A.

Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Presupuesto Memorias de Calculo
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

CONSORCIO MIA GP

OBJETO:ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

PRESUPUESTO EMERGENCIA EN BATERIAS DE BAÑOS COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	8,40	$ 24.791,00	$ 208.244,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,10	$ 8.916,00	$ 18.724,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 14.890,00	$ 14.890,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	9,00	$ 16.887,00	$ 151.983,00
SUBTOTAL	**1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 393.841,00**
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
3.1.10	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M2	8,40	$ 125.254,00	$ 1.052.134,00
SUBTOTAL	**3. MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.052.134,00**
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**				
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"	UN	1,00	$ 66.903,00	$ 66.903,00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00	$ 38.796,00	$ 116.388,00
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"	UN		$ 19.077,00	$ 0,00
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00	$ 16.553,00	$ 49.659,00
4.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"	UN	5,00	$ 7.490,00	$ 37.450,00
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	3,00	$ 14.651,00	$ 43.953,00
4.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'	UN	6,00	$ 5.185,00	$ 31.110,00
4.11	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	160,00	$ 3.818,00	$ 610.880,00
SUBTOTAL	**4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 956.343,00**
8.	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2	2,10	$ 70.077,00	$ 147.162,00
SUBTOTAL	**8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 147.162,00**
13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				

13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	2,10	$ 33.591,00	$ 70.541,00
SUBTOTAL	**13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 70.541,00**
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	217,36	$ 7.708,00	$ 1.675.411,00
SUBTOTAL	**20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**				**$ 1.675.411,00**

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ L.

VALOR TOTAL	**$ 4.295.432,00**
VALOR EMERGENCIAS (NO OFERTABLE)	
VALOR TOTAL	**$ 4.295.432,00**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.15	M2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
BAÑO HOMBRES 3 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,40
				TOTAL	8,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 2

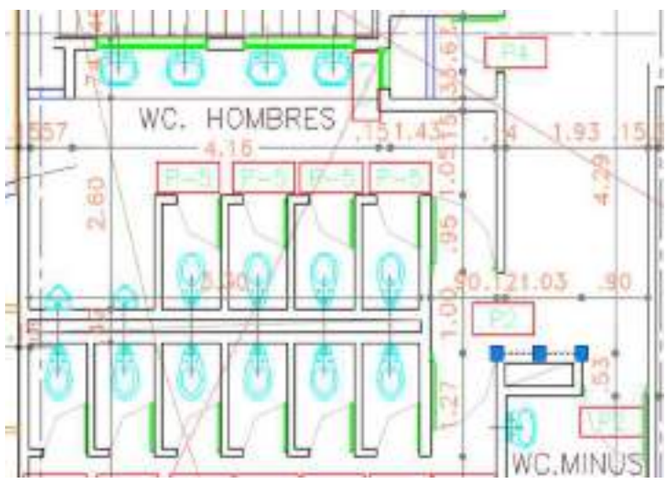

Piso 3

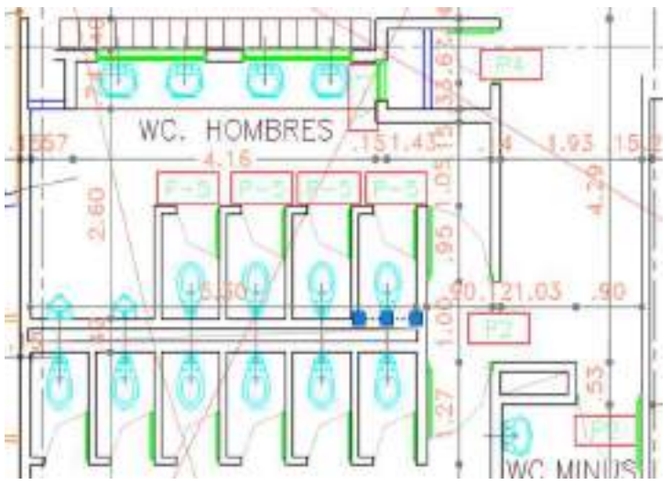

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.20	M2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 3 PISO	2,1	1,00	2,10	1	2,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,10
				TOTAL	2,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





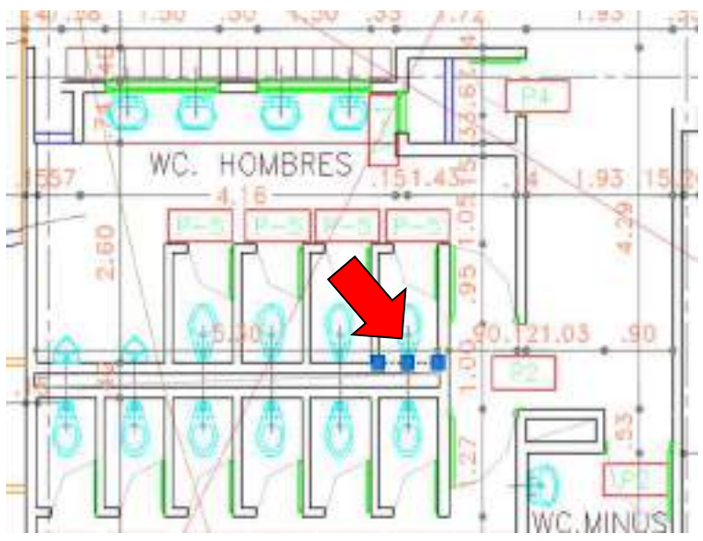

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.30	UN	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	ÁREA	ANCHO	CANTIDAD POR PISO	piso	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 3 PISO			1,00	3	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

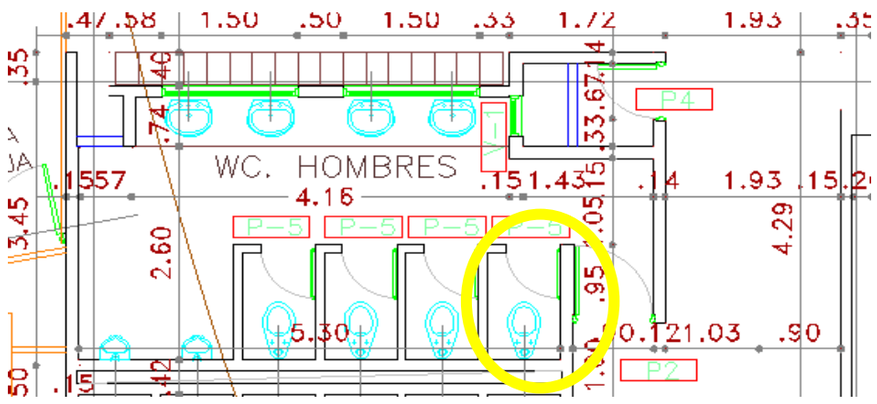



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.2.31	M	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS	9,00				9,00
					0,00
					0,00
					0,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	9,00
				TOTAL	9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
3.1.10	M2	MURO TRABA NORMAL EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24 X 12 X 6 ACABADO A LA VISTA. (INLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE, MORTERO, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).


DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
BAÑO HOMBRES 3 PISO	4,2	1,00	2,10	2	4,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	8,40
				TOTAL	8,4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

Piso 2

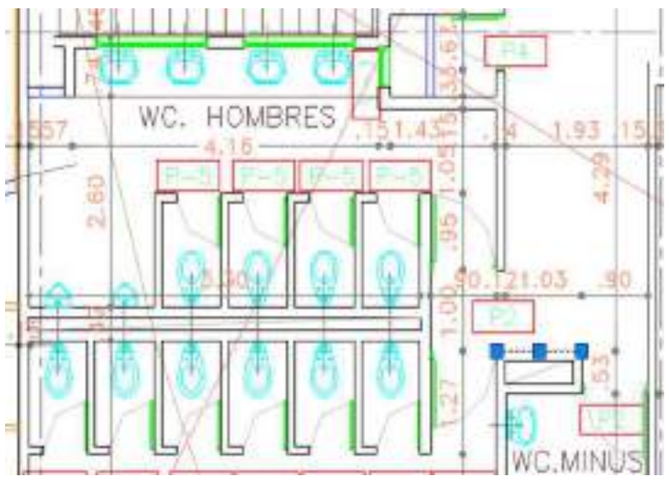

Piso 3

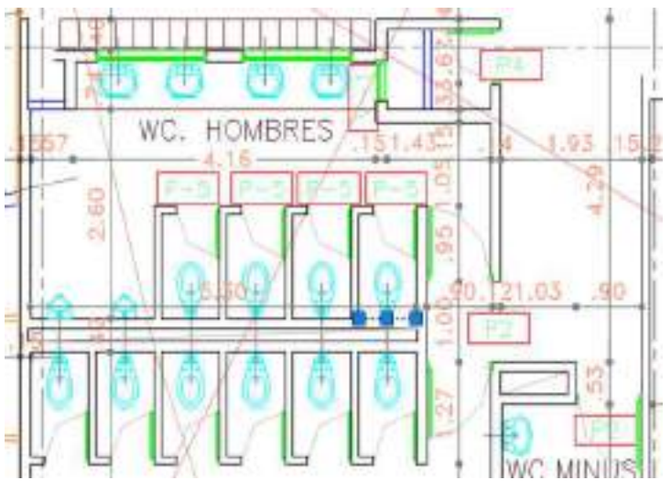

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio MIA GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.4	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				1	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

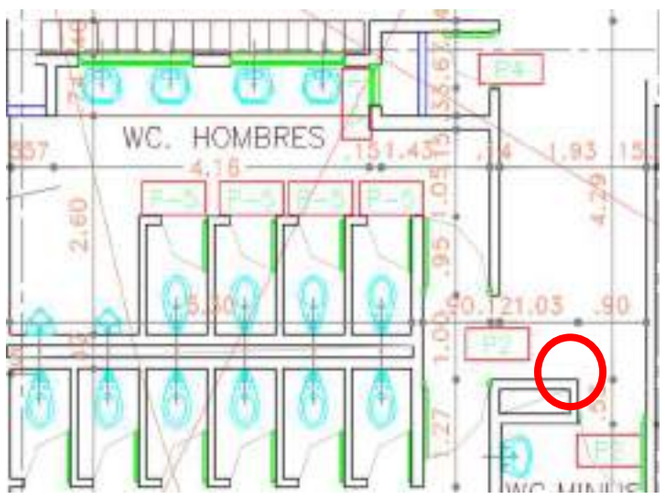



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.7	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			1,50		1,50
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			1,50		1,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

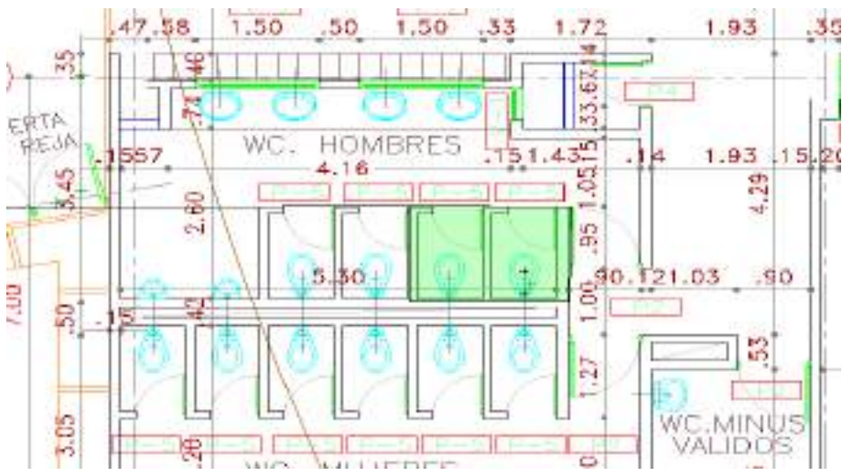



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.8	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				10	10,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				7	7,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	17,00
				TOTAL	17

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

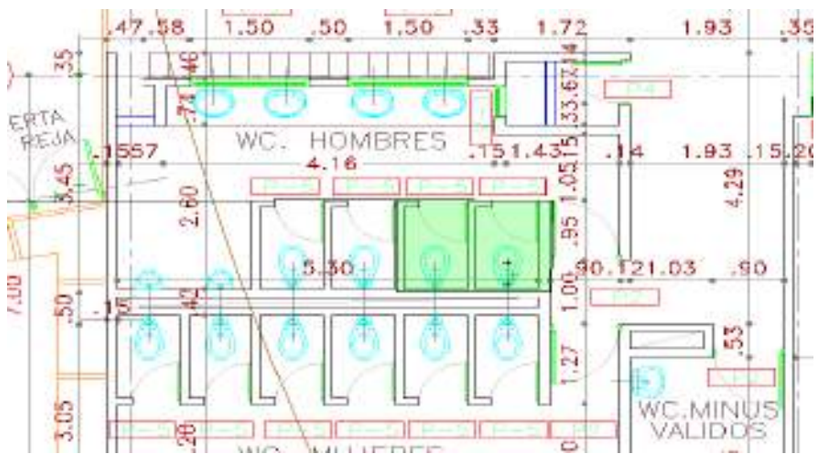



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.13	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			1,5		1,50
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			1,5		1,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

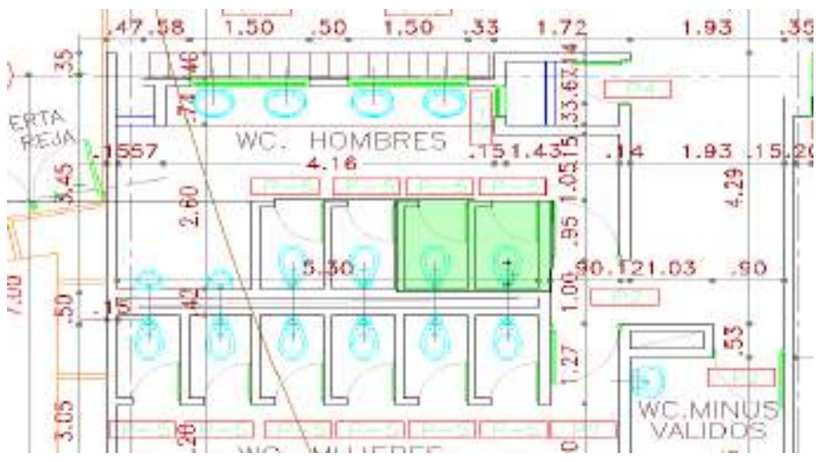



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.14	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1"

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				2	2,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				3	3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	5,00
				TOTAL	5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

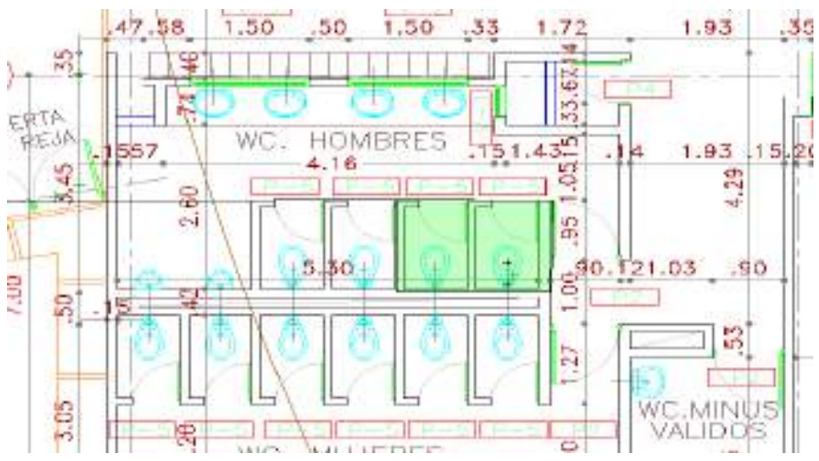



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.15	M	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2			1,5		1,50
BATERIAS SANITARIAS PISO 3			1,5		1,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

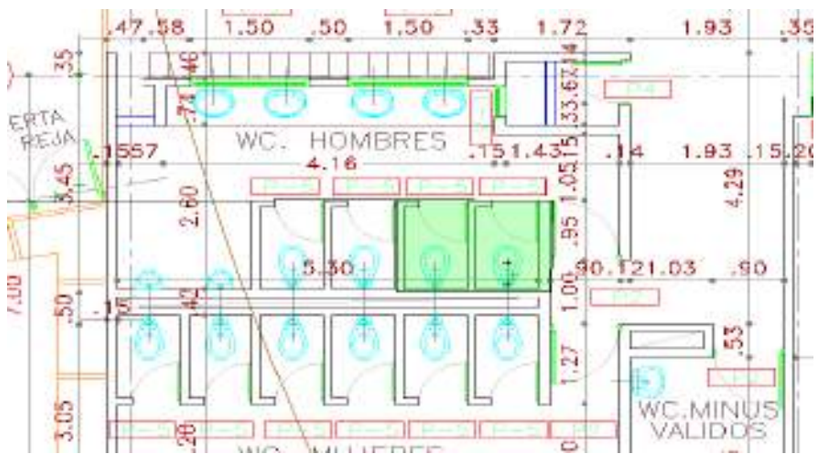



DESCRIPCION

Firma
ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma
ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN		
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN		
	FECHA:	21	02	2023

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.3.16	UN	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4'

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	LARGO	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES					
BATERIAS SANITARIAS PISO 2				3	3,00
BATERIAS SANITARIAS PISO 3				3	3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6,00
				TOTAL	6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

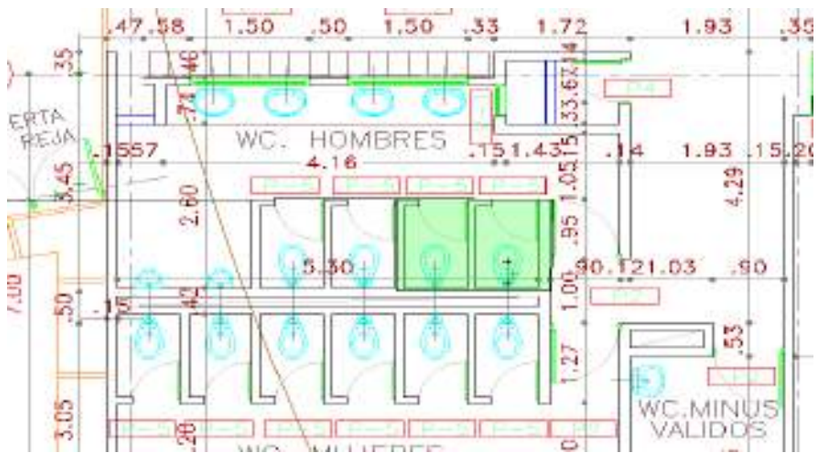



DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia Gp Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
4.11.21	M	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	CANTIDAD	TOTAL
EDIFICACIONES						
BATERIAS DE BAÑOS	PRIMER PISO	50,00				50,00
	SEGUNDO PISO	50,00				50,00
	TERCER PISO	60,00				60,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	160,00
					TOTAL	160,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

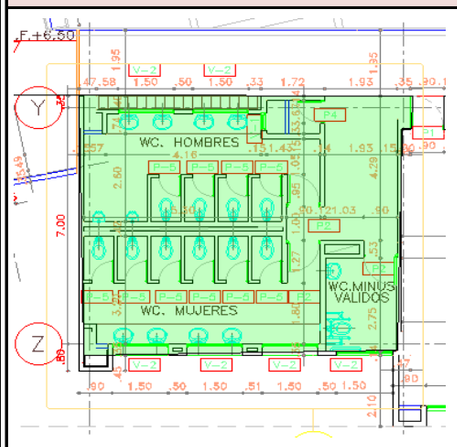











DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO


NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
8.1.4	M2	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	AREA	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO					
BAÑO HOMBRES 3 PISO	2,1	1,00	2,10	1	2,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,10
				TOTAL	2,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

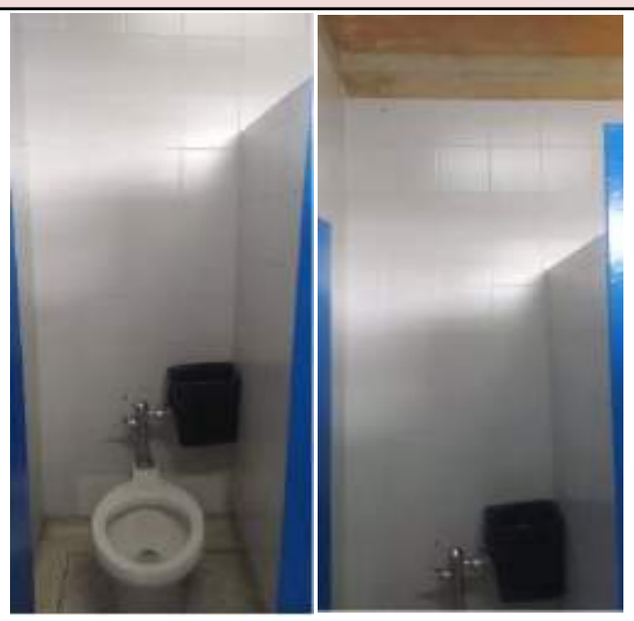

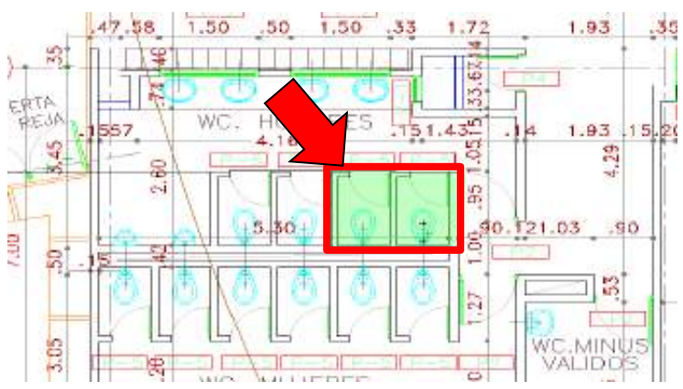

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

	CONSORCIO MIA GP	MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN			
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FRENTE:	SAN AGUSTIN			
	FECHA:	21	02	2023	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
13.1.1	M2	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	PERIMETRO	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
EDIFICACIONES					
BAÑO HOMBRES 2 PISO					
BAÑO HOMBRES 3 PISO		1,00	2,10	1	2,10
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,10
				TOTAL	2,1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA





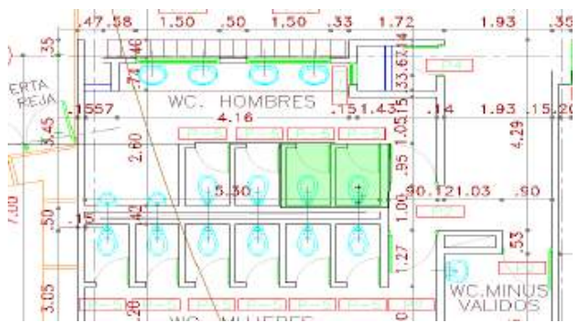

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN

DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**CONSORCIO MIA GP**	**MEMORIAS DE CUANTIFICACIÓN**			Consorcio Mia GP Rafael Uribe Uribe
	FRENTE:	**SAN AGUSTIN**			
	FECHA:	**21**	**02**	**2023**	

INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATISTA	CONSORCIO MIA GP
INTERVENTOR	CONSORCIO TIG
SUPERVISOR	ING. ALEXANDER OSORIO


INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4077645
OBJETO CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - GRUPO 8

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
20.1.1	M2	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

DESCRIPCION		DIMENSIONES				
		LARGO	ANCHO	PROMEDIO AREA	AREA	TOTAL
EDIFICACIONES						
BATERIAS DE BAÑOS	PRIMER PISO	8,89	8,15	72,45	1	72,45
	SEGUNDO PISO	8,89	8,15	72,45	1	72,45
	TERCER PISO	8,89	8,15	72,45	1	72,45
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PASAN:					**SUBTOTAL**	217,36
					TOTAL	217,36

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

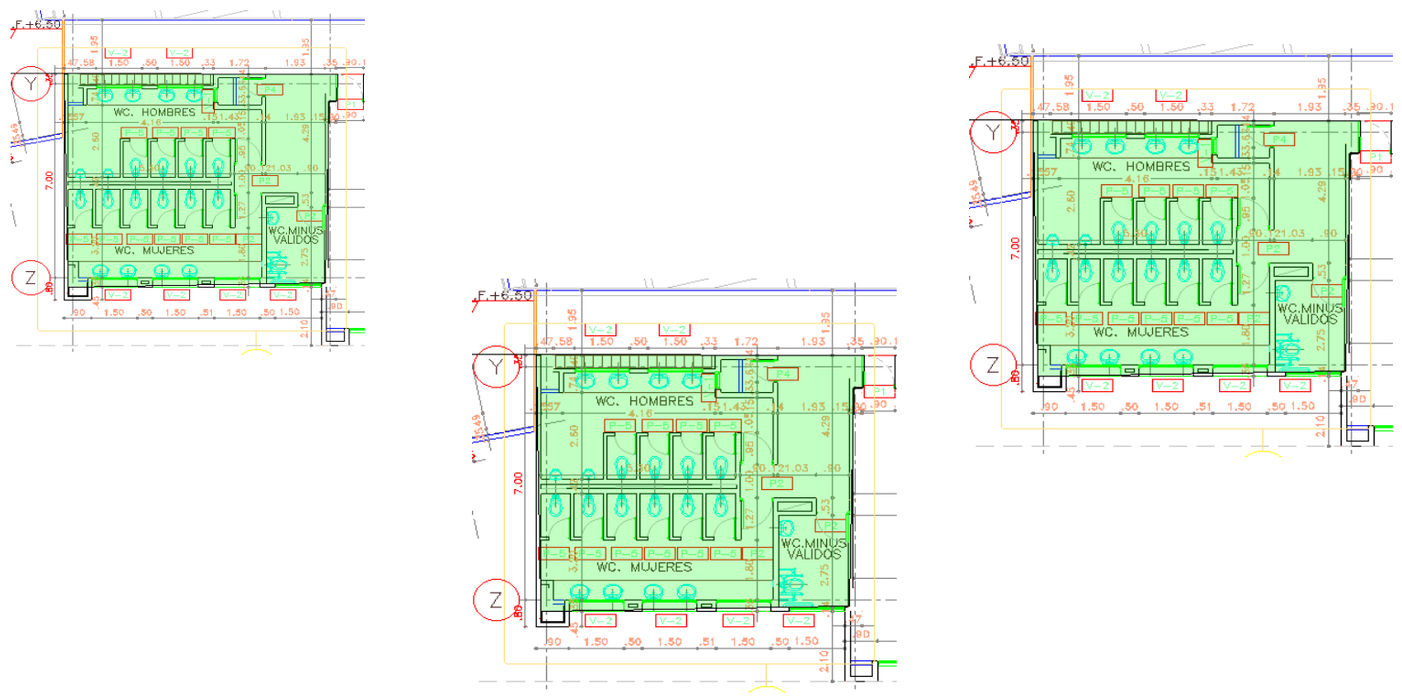

DESCRIPCION

Firma

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA

Firma

ING. PAMELA BELTRAN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_053

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Presentación de alternativas de piso vinílico solicitando definición del estilo, diseño y/o material a instalar para el piso en pasillo y aula en edificio 2, Colegio Restrepo Millán.

Cordial Saludo,

Mediante este comunicado el Consorcio Mía GP presenta las diferentes alternativas de piso vinílico, atendiendo a la solicitud realizada por supervisión, para el pasillo (33) y aula (32) en edificio 2 en el Colegio Restrepo Millán Sede B- Isabel II de Inglaterra. Ver Imagen 1.

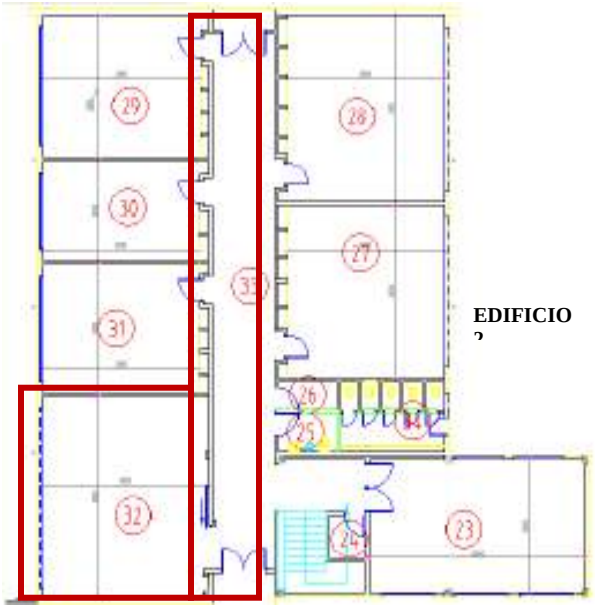


Imagen 1. Ubicación áreas a intervenir con instalación de piso

En las fotografías se evidencia que se adelantó la demolición del piso en aula 32 y corredor 33, por tanto, se solicita a interventoría en conjunto con la Secretaria Distrital de Educación, la definición del estilo y diseño del piso a instalar, para tal efecto se presenta en el anexo el Portafolio Hausys en donde están compiladas las opciones y fichas técnicas de cada tipo de piso vinílico presentado para que sea considerado por interventoría y definido para poder dar continuidad con la intervención prevista para los pisos demolidos, Teniendo en cuenta que dependiendo el material del acabado del piso se hará el alistamiento adecuado de la superficie de base; resaltando que esta situación representa un condicionante en el desarrollo de las intervenciones a ejecutar en la I.E.



Imagen 2. Pisos.



Imagen 3. Demolición piso en edificio 2.

Por otra parte, los pisos actualmente se evidencian sueltos, fisurados y agrietados lo cual no es garantía para la correcta instalación del vinilo.



Imagen 4. Evidencia de alistado fisurado.

En el presente informe se recomienda demoler los morteros de piso porque no cumplen los requisitos mínimos para lo que fueron construidos. Este documento sirve de referencia para realizar un procedimiento de cargue de piso sin fisuras, nivelado y liso.

- Realizar limpieza de piso y generar una superficie rugosa. Los morteros adheridos trabajan por fricción y entre mayor fricción mayor agarre.
- Juntas perimetrales con icopor de 7cm de altura, de 1cm de espesor contra muros y columnas.

- Vaciar de nuevo el cargue de piso adicionando fibra master m 60 o malla electrosoldada XX106.
- Darle el acabado tipo industrial para pisos mediante mano de obra especializada, los equipos (“helicópteros” y demás) y materiales (endurecedor rocktop y demás).
- Realizar cortes, con cortadora de piso industrial para las debidas dilataciones. Distancias no mayores a 2.5m x 2.5m. Profundidad de 1cm, ancho de 6mm. De tal manera que el piso vinilo se instale sobre un piso nivelado y liso.
- Comenzar el proceso de curado tan pronto sea posible mediante inundación de la superficie con agua o curado con antisol.

Agradecemos la atención y pronta respuesta,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Portafolio Hausys
Copia 1	Supervisor del contrato – Ing. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá


PORTAFOLIO
LG Hausys
NEXTILE
NEXSPC
NEXROLL
NEXCHEM®
La fórmula profesional para el éxito



LG HAUSYS, Flooring

LG Hausys es el fabricante líder de materiales de construcción en Corea. Es la sociedad matriz del Grupo LG, una empresa verticalmente integrada de nacionalidad Coreana que fabrica una amplia gama de productos petroquímicos de alto valor añadido de PVC, alto rendimiento y materiales industriales.

LG Hausys




¿Qué es LG ?

También ha ampliado sus conocimientos químicos para materiales de alta tecnología para la electrónica, tales como baterías recargables y TFT - LCD de materiales.

Composición del Vinilo

Hidrogeno




Carbono



Cloro



El resultado de está materia prima de primera calidad+tecnología es nuestro producto LG. Garantiza a nuestro producto un diseño único y de mayor durabilidad.

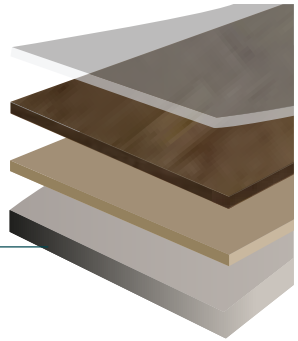


LUXURY VINYL TILE
SPC


HIGH DENSITY PUR
EASY CLEAN
EASY CLEAN+ UV ™
Nuestra capa con tratamiento superficial UV hace que sea de fácil limpieza.
Excelente resistencia contra la contaminación.
Bajo costo de mantenimiento.
LG Hausys

PROTECCIÓN UV

Nuestro material contiene una capa protectora que no permite cambios de color por exposición al sol.

No se debe instalar películas en las ventanas para protección UV.

LG Hausys



NEXTILE

NUEVO

LISTÓN HETEROGÉNEO

Espesor Total 2,5 mm
Capa Protectora 0.3 mm
Formato 2,5mm x 17.7 cm x 1.21 mts

Certificaciones

NEXTILE

Nuestro **NUEVO PISO NEXTILE 2,5MM** es un piso vinílico en listón compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas como tratamiento superficial **HIGH DENSITY PUR** (poliuretano de alta resistencia), capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,3 mm y capa impresa en **nuevos** tonos madera que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos.

Lo puedes utilizar en proyectos residenciales, institucionales y retail.

Certificaciones



NEXTILE 2,5MM

Tamaño: 2,5mm x 17.7 cm x 1.21 mt/Tile
Capa protectora: 0.3 mm

Silver - P1-00



Roble - P1-514



Coco - P1-211



NEXTILE 2,5MM

Tamaño: 2,5mm x 17.7 cm x 1.21 mt/Tile
Capa protectora: 0.3 mm

Tauppe - P1-173



Khaki - P1-215




Cinnamon - P1-067



NEXTILE 2,5MM

ESTRUCTURA

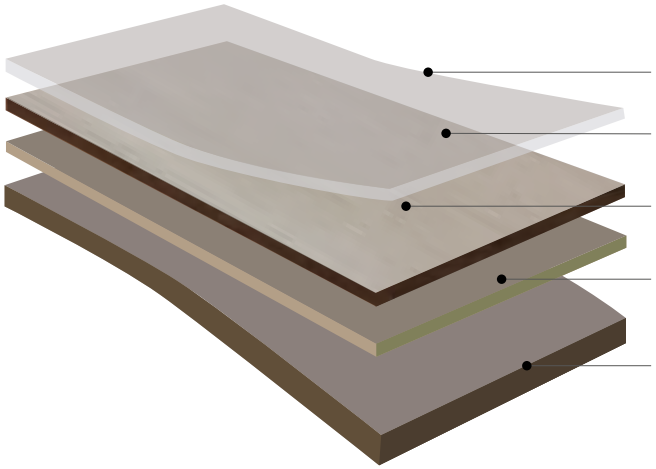

2,5mm x 17.7cmx 1.21mt/Tile

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

POR QUÉ ELEGIR NEXTILE 2,5MM

Pisos con larga durabilidad, fácil instalación y mantenimiento. Pueden instalarse sobre revestimientos existentes

USOS

Restaurante · Oficina · Escolar · Retail

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	NEXTILE 2,5mm
Formato	ISO 10582	Listón heterogéneo
Tratamiento Superficial		HIGH DENSITY PUR
Clasificación	EN ISO 10582	23 / 33
Largo del listón		17.7 cm
Ancho del listón		1.21 mts
Peso	EN ISO 23997	5,700g/m2
Espesor total	EN ISO 24346	2,5 mm
Capa protectora	EN ISO 24340	0.3mm
Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤0.25 %
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R9/R10
Resistencia Química	EN ISO 26987	No cambia (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	5 dB
Unidad de empaque		3,90 m2
Garantía - Comercial		10 años
Garantía - Residencial		15 años


Coco - P1-211
NEXTILE



LG Hausys

DECOTILE 3MM

Espesor total 3mm
Capa protectora 0.55 mm

Listón Heterogéneo

LG Hausys

Nuestra referencia **DECOTILE 3MM** es un piso vinílico en listón compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **HIGH DENSITY PUR** (poliuretano de alta resistencia), capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,55 mm y capa impresa en tonos madera que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos.

Lo puedes utilizar en proyectos residenciales, institucionales y retail.

Certificaciones

ANSI · EMS KAB ISO14001 · CE · Bfl-s1 · Wear Group P · Non-slip R9 · DEEP CLEAN C-UV™ · Body voltage · 100% Recyclable · floor score · 15 YEARS



DECOTILE 3MM

Tamaño: 3mm x 18 cm x 120 cm/Tile
Capa protectora: 0.55 mm

Coco - DEW 2608



China Oak - DSW 2511



Hielo - DEW1228



Smoke - DSW1201



DECOTILE 3MM

Tamaño: 3mm x 18 cm x 120 cm/Tile
Capa protectora: 0.55 mm

Khaki Oak - DSW 2785



Teak - DSW 2792



American Pine - DSW 5715




Oak Buff - DLW 2786



DECOTILE 3MM

ESTRUCTURA

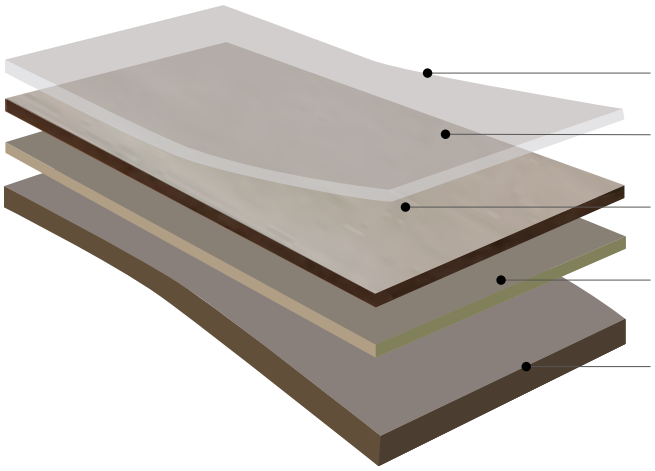

3mm x 18cmx 120cm/Tile

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

POR QUÉ ELEGIR DECOTILE 3MM

Pisos con larga durabilidad, fácil instalación y mantenimiento. Pueden instalarse sobre revestimientos existentes


USOS

Restaurante · Oficina · Escolar · Retail

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	DECOTILE 3,0mm
Formato	ISO 10582	Listón heterogéneo
Tratamiento Superficial		HIGH DENSITY PUR
Clasificación	EN ISO 10582	23 / 33 / 42
Largo del listón		120 cm
Ancho del listón		18 cm
Peso	EN ISO 23997	5,700g/m2
Espesor total	EN ISO 24346	3 mm
Capa protectora	EN ISO 24340	0.55mm
Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤0.25 %
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R9/R10
Resistencia Química	EN ISO 26987	No cambia (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	5 dB
Unidad de empaque		3,24 m2
Garantía		15 años


LG Hausys
American Pine - DSW 5715

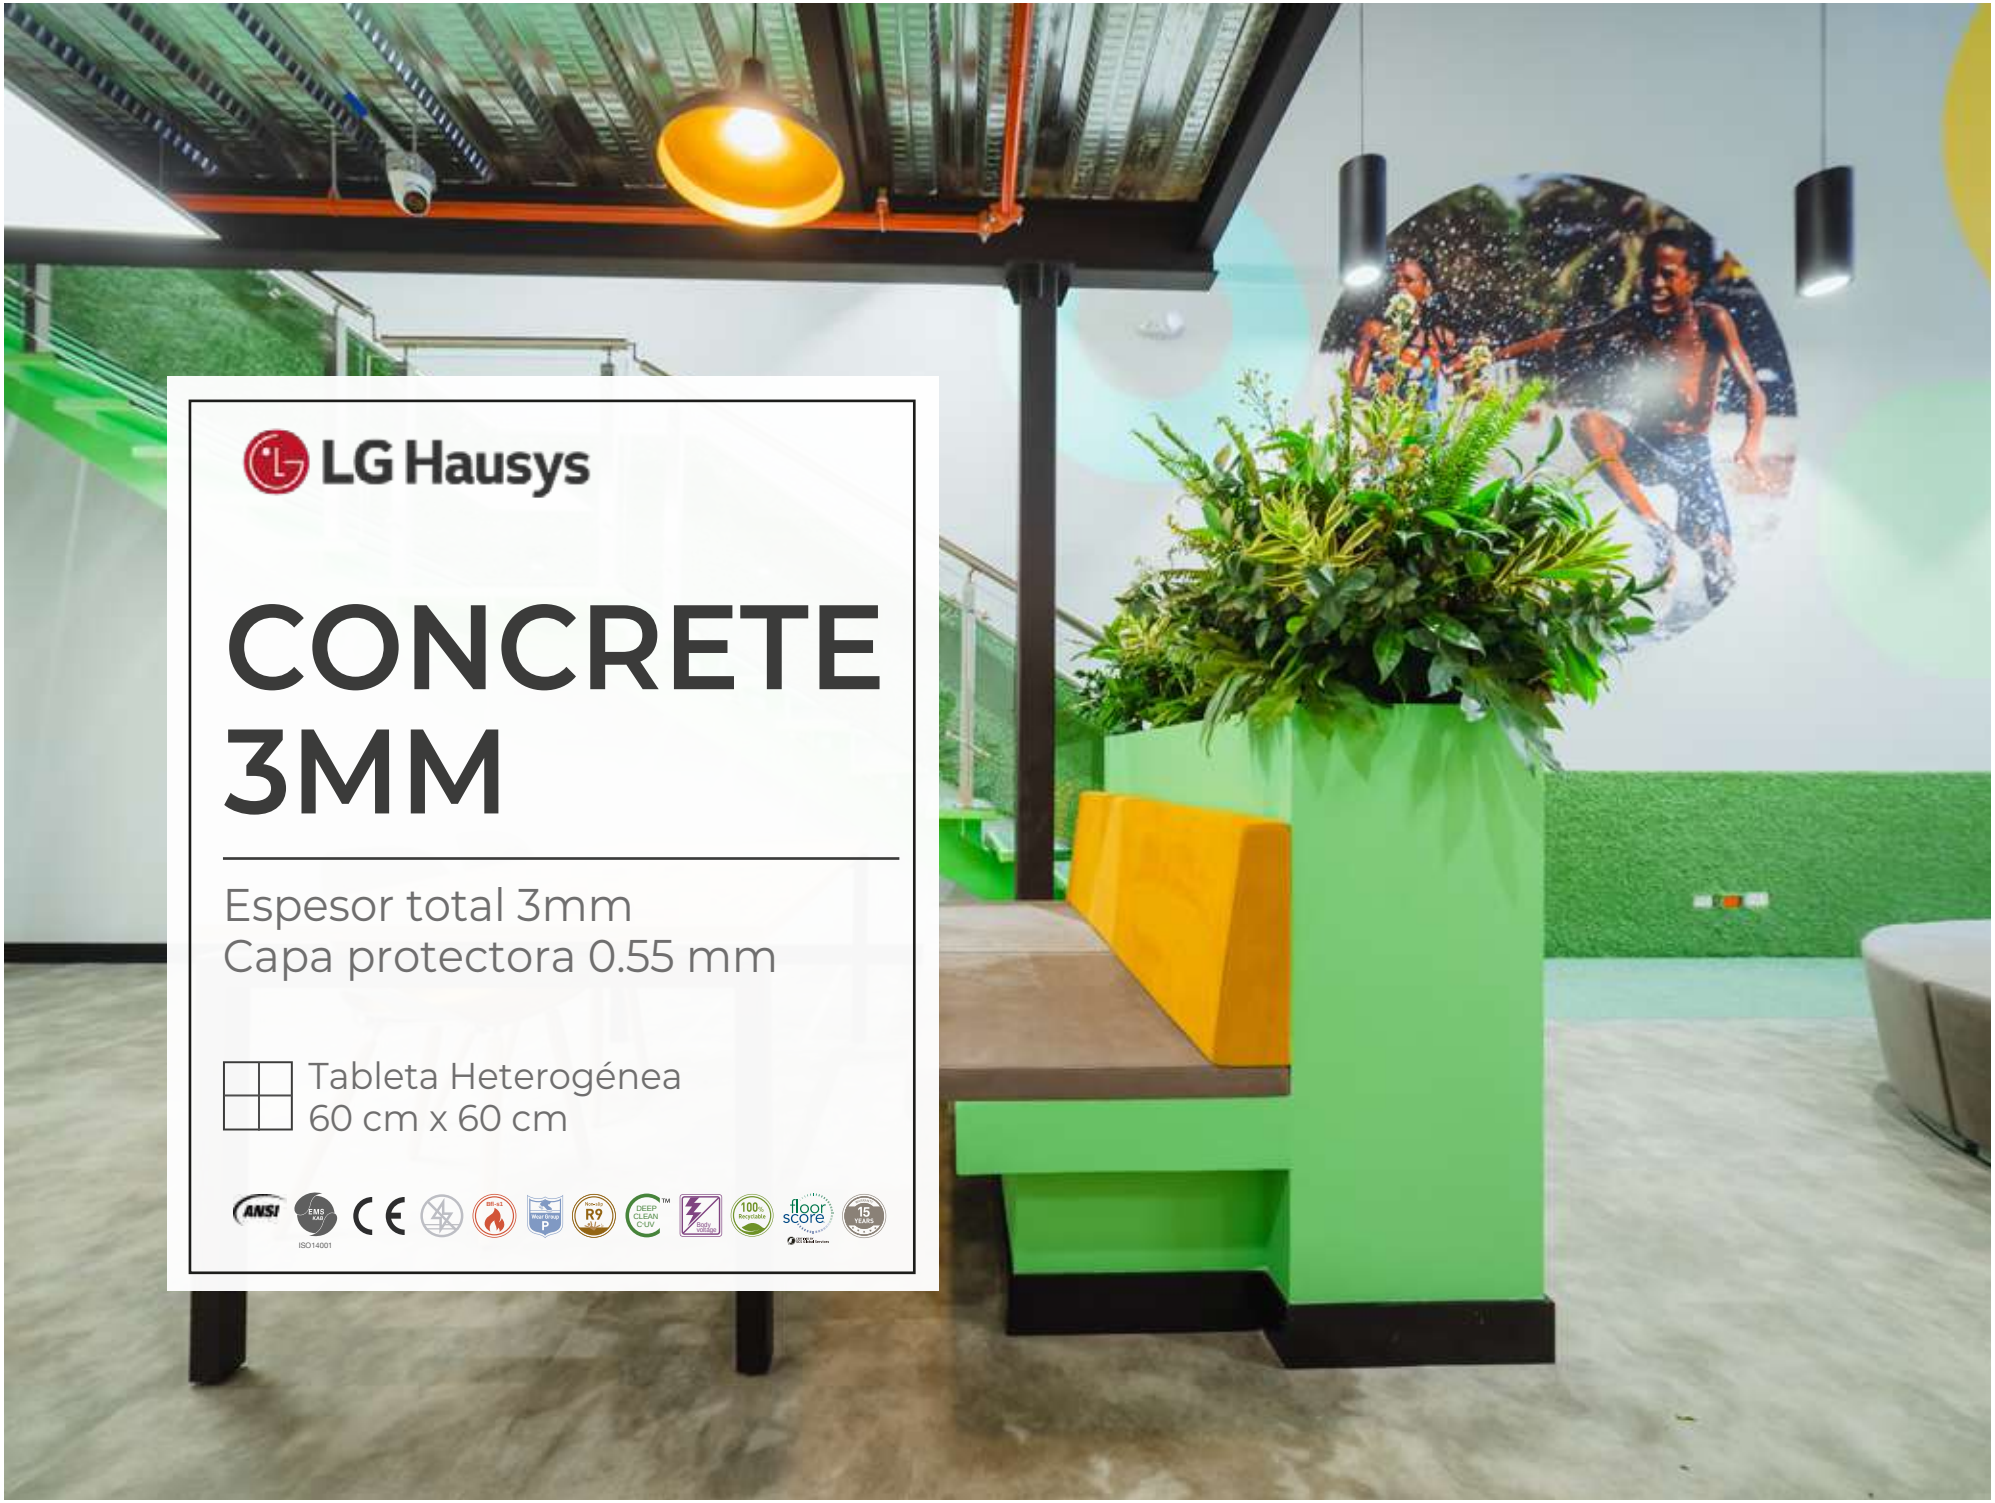

LG Hausys

CONCRETE 3MM

Espesor total 3mm
Capa protectora 0.55 mm

Tableta Heterogénea
60 cm x 60 cm



Nuestra referencia **CONCRETE 3MM** es un piso vinílico en tableta de 60 cm x 60 cm compuesta por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **HIGH DENSITY PUR** (poliuretano de alta resistencia), capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,55 mm y capa impresa en tonos concreto que ofrece soluciones creativas en diseño y textura para todos tus proyectos.

Lo puedes utilizar en proyectos residenciales, institucionales y retail.

Certificaciones


CONCRETE 3MM

Tamaño: 3mm x 60 cm x 60 cm/Plank
Capa protectora: 0.55 mm

Titanio - DTE 6243




Element - DTE 6244

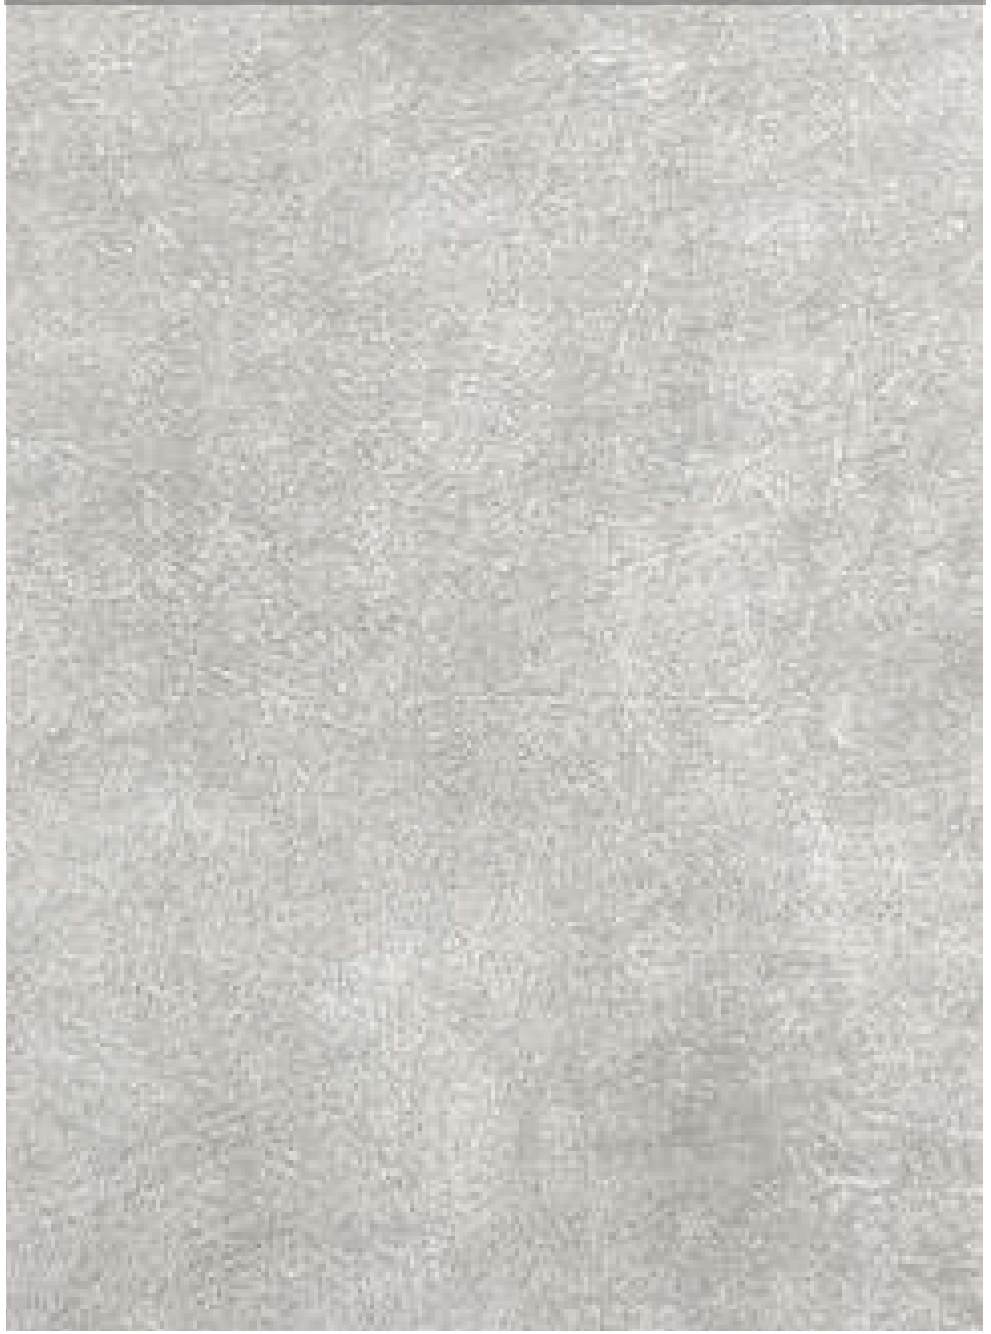

CONCRETE 3mm

ESTRUCTURA

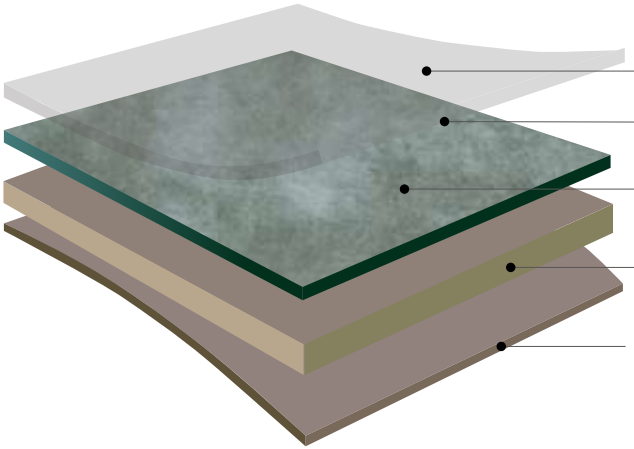

3mm x 60cmx 60cm/Plank

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

POR QUÉ ELEGIR CONCRETE 3MM

Aislamiento acústico, especialmente atenuando el sonido de pasos y otros impactos en el suelo - Mayor resistencia a golpes y quebraduras

USOS

Restaurante · Oficina · Escolar · Retail

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	CONCRETE 3,0mm
Formato	ISO 10582	Tableta heterogénea
Tratamiento Superficial		HIGH DENSITY PUR
Clasificación	EN ISO 10582	23 / 33 / 42
Largo de la tableta		60 cm
Ancho del la tableta		60 cm
Peso	EN ISO 23997	5,700g/m2
Espesor total	EN ISO 24346	3 mm
Capa protectora	EN ISO 24340	0.55mm
Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤0.25 %
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R9/R10
Resistencia Química	EN ISO 26987	No cambia (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	5 dB
Unidad de empaque		6,04 m
Garantía		15 años


LG Hausys
Element - DTE 6244


Element - DTE 6244



NEXSPC

¡ABARCA MÁS ESPACIOS CON MAYOR FORMATO!

SPC

Espesor Total 5mm
Capa Protectora 0.5 mm
Foam Backing EVA 1mm
Acoustic 18 dB
Formato 5mm x 1524 mm x 228 mm

Listón Heterogéneo
100% PVC Virgen



NEXSPC

¡ABARCA MÁS ESPACIOS CON MAYOR FORMATO!

Nuestro piso **NEXSPC** 5mm es un piso vinílico que está compuesto por un 80% de PVC y 20 % de fibras de piedra caliza. **(Stone Plastic Composite)** Por su composición, los Pisos Vinílicos SPC logran obtener una gran durabilidad, alta resistencia al desgaste e impactos y mayor impermeabilidad.

Son ideales para alto tránsito comercial y zonas residenciales de exigencia como la cocina y el baño (excepto en la zona de la ducha).

Es un producto muchísimo más resistente y se adapta a cualquier clima o ambiente.

Resistente al Agua

Resistente al Fuego

Resistente a las Bacterias

Material Amigable con el medio ambiente

NEXSPC 5MM

Tamaño: 5mm x 1524 mm x 228 cm/Tile
Capa protectora: 0.5 mm

Pino - 2044-03



Cinnamon - 2260-1



Teak - 3012-5



NEXSPC 5MM

Tamaño: 5mm x 1524 mm x 228 cm/Tile
Capa protectora: 0.5 mm

Smoke - 686-08



Oak - 88066-3




White - PG7094-8



NEXSPC 5MM

ESTRUCTURA

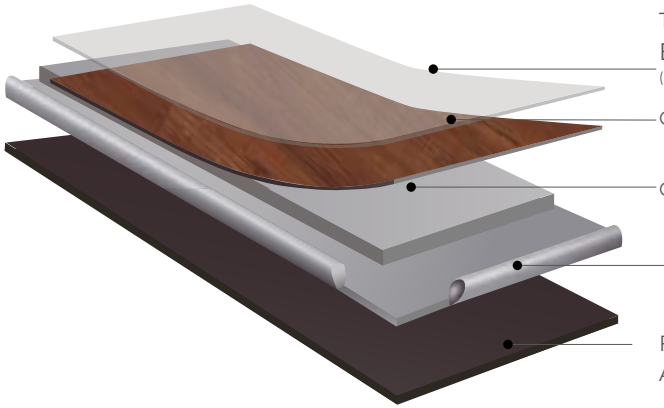

5mm x 1524mm x 228cm/Tile

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS

Restaurante · Oficina · Escolar · Retail

POR QUÉ ELEGIR NEXSPC

100% PVC virgen - Espacios libres sin uso de perfiles de transición o dilatación por lo tanto el aspecto queda más limpio y el mantenimiento más sencillo.

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	NEXSPC 5MM
Formato	EN ISO 10582	Tableta heterogénea
Tratamiento Superficial		HIGH DENSITY PUR
Clasificación	ISO 10582	33 / 42
Alto del listón		1524 mm
Ancho del listón		228 cm
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.5mm
Identación residual	ISO 24343-1(EN 433)	-0.04 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	X Direction: 0.08%
		Y Direction: 0.07%
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Prueba de Sillas	ISO 4918	Sin cambios
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DIN 51130	R9 / R10
Resistencia Química	EN ISO 26987	Sin cambios (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	18 dB
Garantía		5 años


NEXSPC
¡Abarca más espacios a gran formato!
Oak - 88066-3


NEXSPC
¡Abarca más espacios a gran formato!
Smoke - 686-08

ROLLOS

Heterogéneo y Homogéneo

LG Hausys


EASY CLEAN
EASY CLEAN+ UV
TM
Nuestra capa con tratamiento superficial UV hace que sea de fácil limpieza.
Excelente resistencia contra la contaminación.
Bajo costo de mantenimiento.
LG Hausys

ANTI-BACTERIAL

Proyectos Límpios,
Planeta Límpio

ANTIBACTERIAL

Producto antibacterial con una función antibacteriana
para un alto nivel de limpieza e higiene

ANTI-RAYONES

No se desgasta fácilmente
contra el tráfico pesado



Resistencia al desgaste grupo T

LG Hausys

AISLAMIENTO ACÚSTICO


Debido a su construcción con una base de PVC compacta, cuenta con absorición acústica leve.

LIBRES DE METALES PESADOS

Libre de Gases VOC y Ftalatos

Aptos para todo tipo de proyectos.

LG Hausys

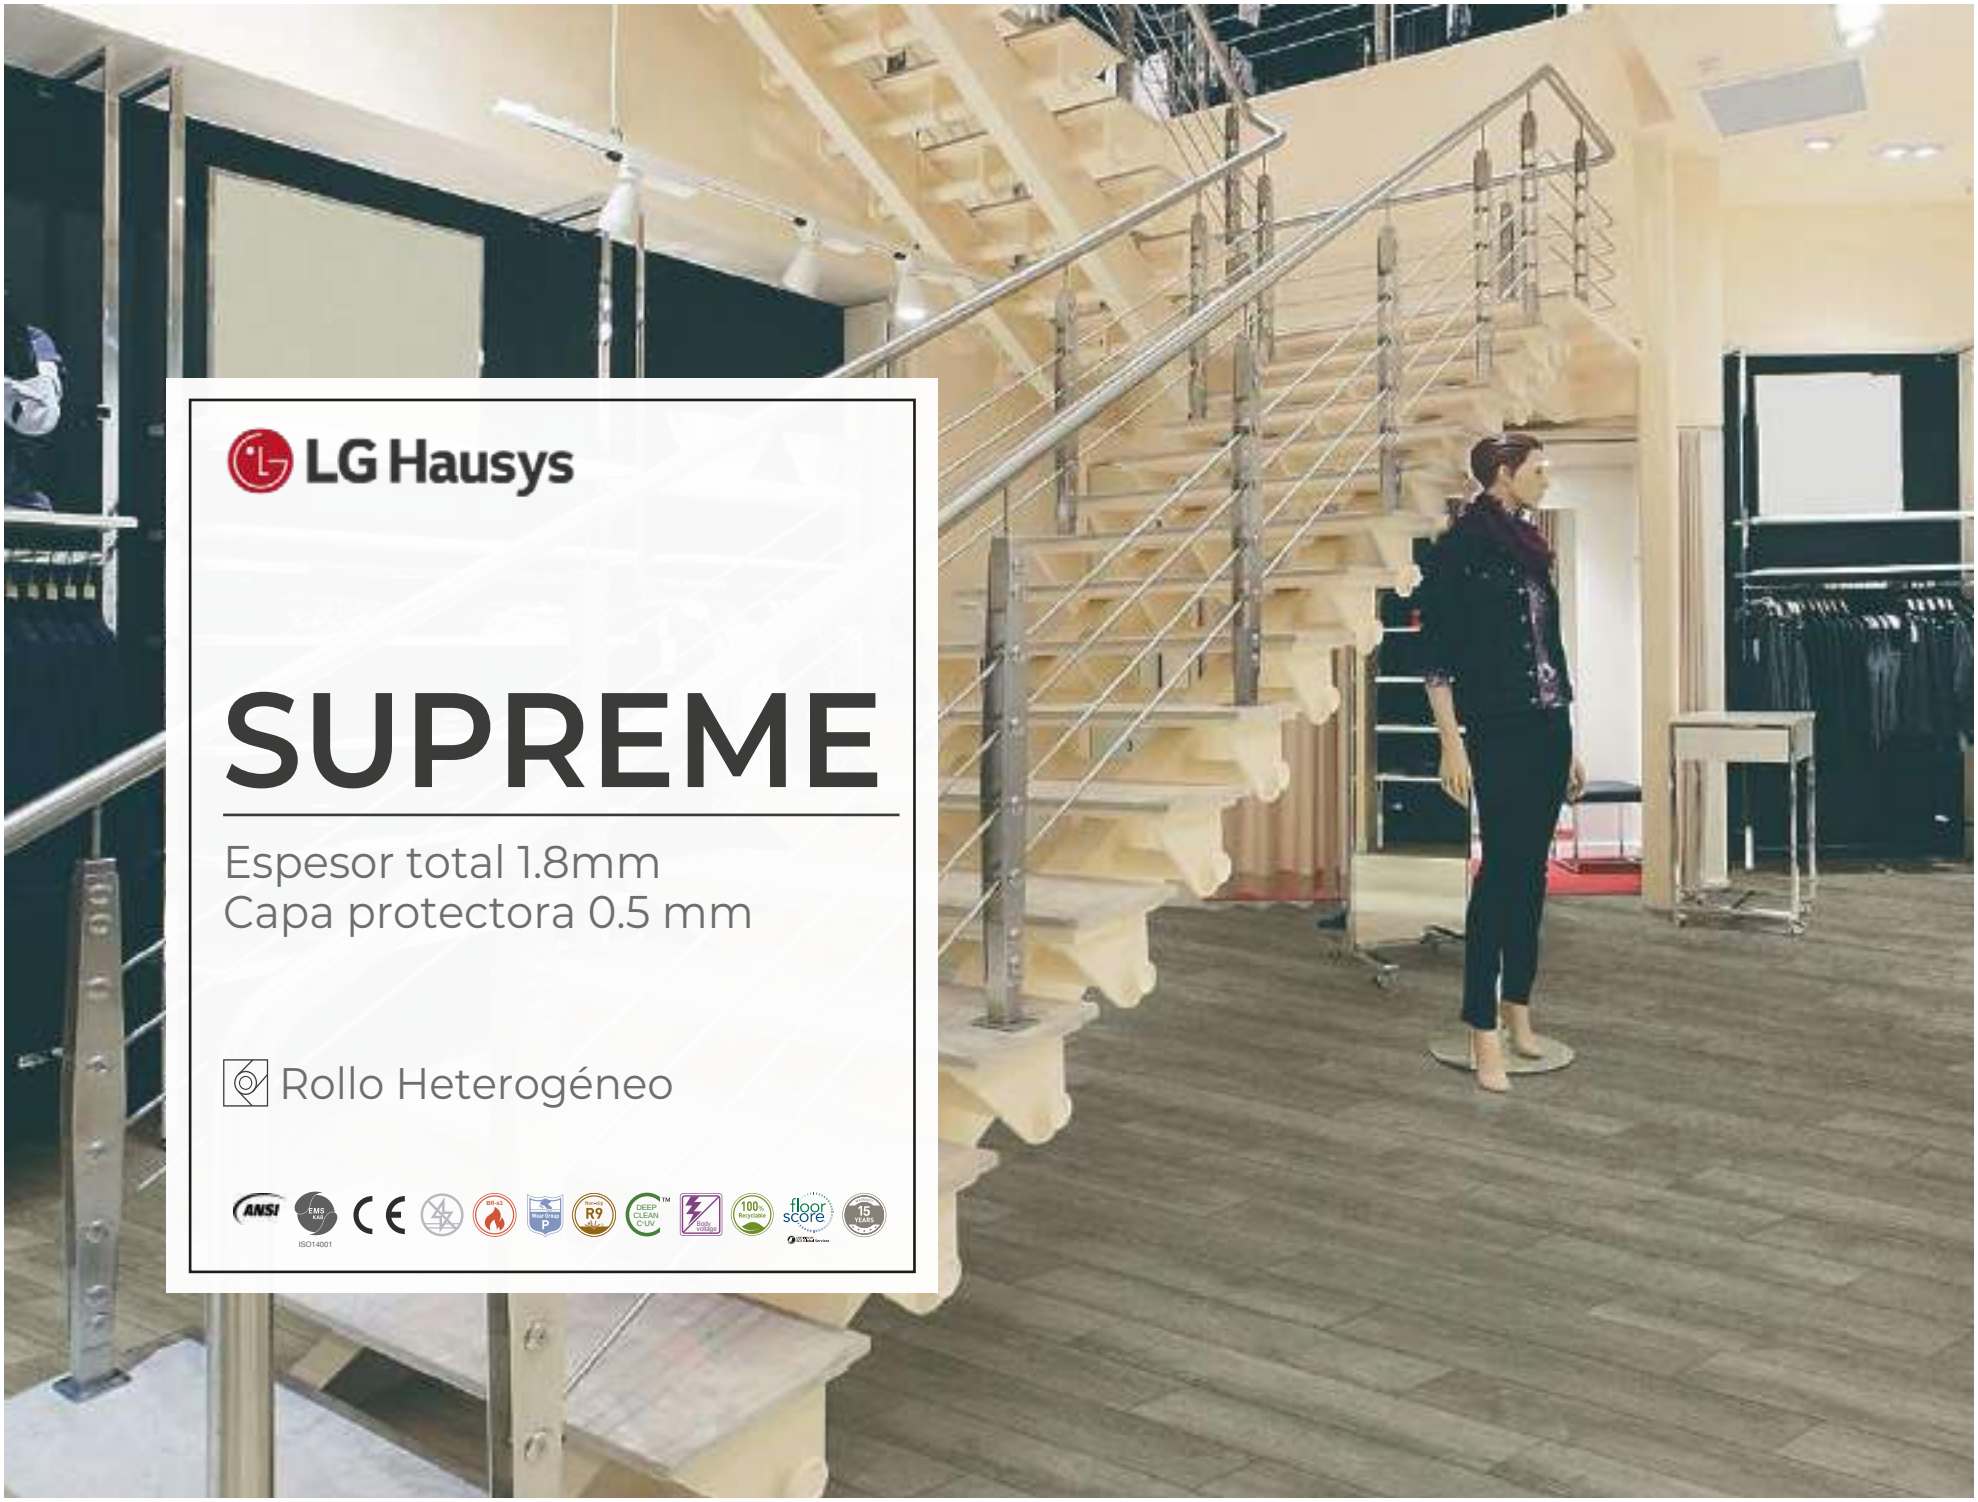

LG Hausys

SUPREME

Espesor total 1.8mm
Capa protectora 0.5 mm

Rollo Heterogéneo



Roble Claro - SPR8081 - 02

SUPREME 1,8 MM es un piso vinílico en rollo heterogéneo compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **EASY CLEAN UV** (poliuretano de alta resistencia), capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,5mm, fácil mantenimiento, producto 100% antibacterial y capa impresa tonos madera que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos

Gracias a todos sus componentes es perfecto para usos de tráfico intenso como sectores **comerciales, retail e institucionales.**

Certificaciones

SUPREME 1,8MM

Tamaño: 1,8mm x 2 M x 20 M/Roll
Capa protectora: 0,5 mm

Roble Claro - SPR8081 - 02



Nogal - SPR8082 - 02



Cedro - SPR1826 - 02




Cenizo SPR1828 - 02



SUPREME 1,8MM

ESTRUCTURA

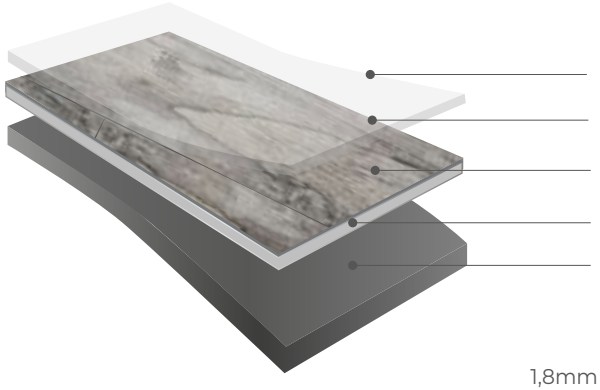

Tratamiento superficial
EASY CLEAN UV
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa de uso de 0.5mm

Capa impresa

Capa de fibra de vidrio reforzada

Capa compacta

1,8mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS

Restaurante | Oficina | Escolar | Retail | Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	SUPREME 1,8mm
Formato	EN ISO 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
Clasificación	EN ISO 10874	22 / 31
Longitud de Rollo		20 M
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
Peso	ISO 23997(EN 430)	2,900g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	1,8 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.5mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 10456	0.0012m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
Resistencia a muebles	EN 13893	Sin daños
Flexibilidad	ISO 24344	Sin grietas
Resistencia Química	EN ISO 26987	No Cambia (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Garantía - Comercial Garantía - Residencial		10 años 15 años




LG Hausys
Cenizo SPR1828 - 02



LG Hausys

ABC

Espesor total 2mm
Capa protectora 0.55 mm

Rollo Heterogéneo



Oxford - AB34602
Gris Àrtico - AB34606

LG Hausys

Nuestra referencia **ABC** es un piso vinílico en rollo heterogéneo compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **EASY CLEAN UV** (poliuretano de alta resistencia), capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,55mm y capa impresa que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos


Gracias a todos sus componentes es perfecto para usos de tráfico intenso como sectores **comerciales, institucionales y hospitalarios.**

Certificaciones

ABC 2MM

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Capa protectora: 0.55 mm


Azul Cobalto - AB34612




Beige - AB34603



Gris Àrtico - AB34606




Oxford - AB34602

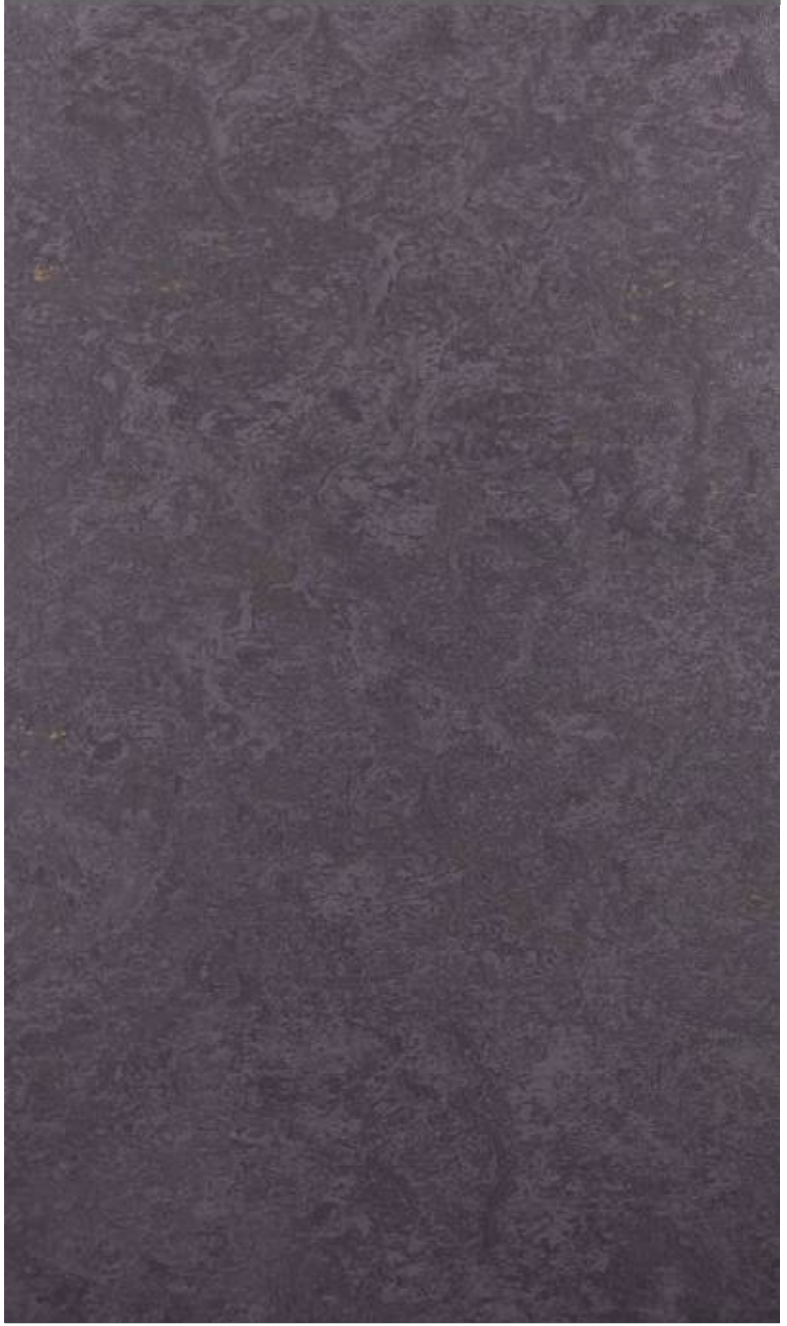

ABC 2MM

ESTRUCTURA

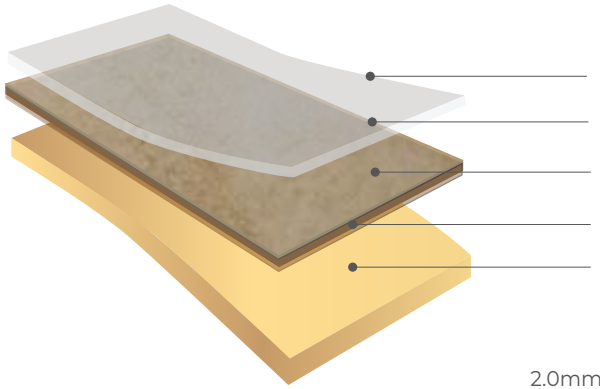

Tratamiento superficial
EASY CLEAN UV
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa de uso de 0.55mm

Capa de fibra de vidrio reforzada

Capa compacta

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS

Restaurante | Oficina | Escolar | Retail | Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	ABC 2mm
Formato	EN ISO 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
Clasificación	EN ISO 10874	33/42
Longitud de Rollo		20 M
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2,000mm
Peso	ISO 23997(EN 430)	3,0000g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 10456	0.0012m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Resistencia Química	EN ISO 26987	No Cambia (PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Garantía		10 años




LG Hausys
Beige - AB34603



LG Hausys

MINI 2MM

Espesor total 2mm
Capa protectora 0.7 mm

Rollo Heterogéneo



Red - MIN 0013-01

MINI 2MM es un piso vinílico en rollo heterogéneo compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **EASY CLEAN UV** (poliuretano de alta resistencia), que garantiza resistencia y estabilidad al color, capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,7mm, base compacta de PVC, antibacterial y capa impresa que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos.


Es ideal para proyectos institucionales, hospitalarios y retail.

Certificaciones

MINI 2MM

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Capa protectora: 0.7 mm

Yellow - MIN 006-01

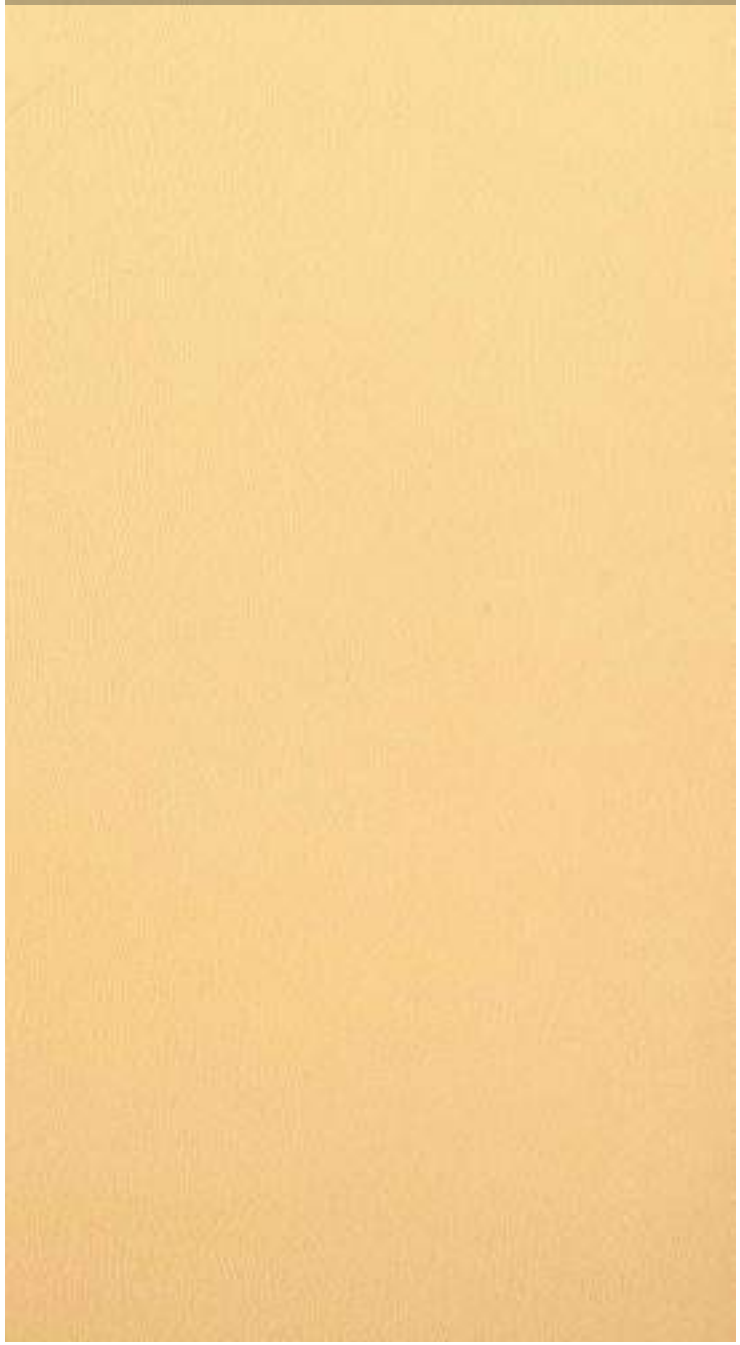

Orange - MIN 0014-01



Green - MIN 0012-01



White - MIN 0001-01

MINI 2MM

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Capa protectora: 0.7 mm

Aquamarine - MIN 0011-01



Blue - MIN 007-01




Red - MIN 0013-01



MINI 2MM

ESTRUCTURA

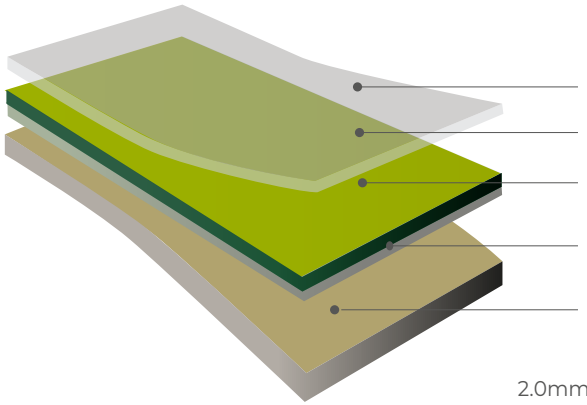

Tratamiento superficial
EASY CLEAN UV
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa protectora de 0.7mm
Tráfico Comercial

Fotografía unicolor

Capa de fibra de vidrio reforzada (Estabilidad dimensional)

Base Compacta de PVC

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS

Restaurante | Oficina | Escolar | Retail | Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	MINI 2mm
Formato	EN 10582	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
Clasificación	EN ISO 10874	33 / 42
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2m
Peso	EN ISO 23997	2.950 g/m2
Espesor total	EN ISO 24346	2,0 mm
Capa protectora	EN ISO 24340	0.7mm
Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.1
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	< 0.4 %
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 10456	0.035 m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Resistencia Química	EN ISO 26987	Sin cambios (PUR)
Garantía		15 años

POR QUÉ ELEGIR MINI

Fotografía unicolor ideal para tráfico industrial pesado, tiene resistencia química, alta estabilidad, antibactrial y durabilidad


White - MIN 0001-01
Yellow - MIN 006-01
Red - MIN 0013-01
LG Hausys



LG Hausys

DELIGHT ACOUSTIC

Espesor total 2,2mm
Capa protectora 0.55 mm

Rollo Heterogéneo



Gris Oscuro - DLT9109-02
Gris Claro - DLT9101-02

DELIGHT ACOUSTIC 2,2M es un piso vinílico en rollo heterogéneo compuesto por varias capas las cuales ofrecen soluciones completas con tecnología avanzada LG HAUSYS como tratamiento superficial **EASY CLEAN UV** (poliuretano de alta resistencia), que garantiza resistencia y estabilidad al color, capa de fibra de vidrio reforzada, capa de uso de 0,55mm que contiene partículas de *Nano Plata*, base espumada que da propiedades acústicas con una reducción entre **16 a 19 db** de sonido y capa impresa que ofrece soluciones creativas en diseño y color para todos tus proyectos

Gracias a todos sus componentes es perfecto para usos de tráfico intenso como sectores **comerciales, institucionales y hospitalarios.**

Nuestro piso DELIGHT ACOUSTIC ES 100% ANTIBACTERIAL, cumple la norma de la secretaría de salud - **RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996**

Certificaciones

DELIGHT ACOUSTIC

Tamaño: 2,2mm x 2 M x 20 M/Roll
Capa protectora: 0.55 mm

Gris Oscuro - DLT 9109-02

Azul Oscuro - DLT 9105-02

Gris Claro - DLT 9101-02




Negro - DLT 9108 - 01
Bajo importación

Blanco Sin Escarcha - P-DLT 8831 - 02

DELIGHT ACOUSTIC

ESTRUCTURA

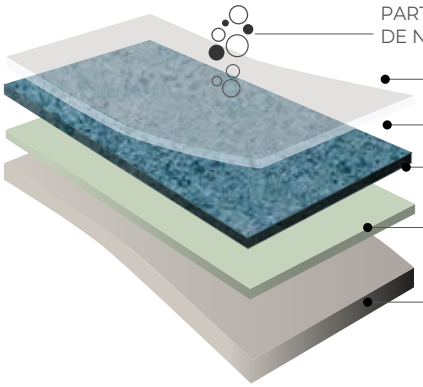

PARTICULAS DE NANOPLATA

Tratamiento superficial EASY CLEAN UV
(Poliuretano de alta resistencia)

Capa de uso de 0.55mm

Capa impresa

Capa de fibra de vidrio reforzada(Estabilidad multidimensional)

Base de PVC espumada

2.2m-m x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS


Restaurante | Oficina | Escolar | Retail | Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	DELIGHT 2,2mm
Formato	EN 651	Rollo heterogéneo
Tratamiento Superficial		EASY CLEAN UV
Clasificación	ISO 10874	33/42
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	EN ISO 24341	2M
Peso	EN ISO 23997	2,2000g/m2
Espesor total	EN ISO 24346	2,2 mm
Capa protectora	ISO 24340	0.55mm
Punzonamiento residual	EN ISO 24343-1	< 0.4 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	< 0.4 mm
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0.035 m2.k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	No Cambios(PUR)
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	16 A 19 dB
Garantía		15 años



PARTÍCULAS
NANO SILVER



Las partículas nano plata actúan como agente antimicrobiano, encapsulando, evitando y extinguendo las bacterias, este ha sido utilizado cientos de años en el cuidado de la medicina.

Ahora con la tecnología avanzada de LG HAUSYS lo obtienes para proteger todos tus proyectos.

LG Hausys

TEST REPORT

La construcción de su capa protectora en poliuretano reforzado + tratamiento EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.



VS



LG HAUSYS (EASY CLEAN)

COMPETIDORES
CONTAMINATION LEVEL

Es un producto antibacterial con alta resistencia a agentes químicos utilizados en el sector salud:

70 % Ácido Nítrico
97% Ácido Sulfúrico
100% Solución de amoniaco
100% Ethanol

La durabilidad de los pisos LG HAUSYS está certificada y probada para que su uso sea adecuado para áreas de tráfico intenso: Cero emisión de formaldehídos, apto para sillas con ruedas, resistente a los agentes químicos, absorción acústica, facilidad en mantenimiento y limpieza.

LG Hausys



LG Hausys

MEDISTEP ORIGIN

Espesor total 2 mm
Base compacta de PVC

Rollo Homogéneo



Los pisos homogéneos **MEDISTEP ORIGIN 2mm** son aquellos compuestos por una sola capa con tratamiento superficial DEEP CLEAN UV (Tratamiento en poliuretano de alta resistencia) y base compacta de PVC, Ideales para áreas del cuidado de la salud ya que solucionan resistencia y son ultra duraderos por ser tráfico pesado.

Tienen una infinita lista de características y ventajas, como lo son la elevada resistencia a la abrasión y su fácil limpieza.

Nuestro piso MEDISTEP ORIGIN ES **100% ANTIBACTERIAL**, cumple la norma de la secretaría de salud - **RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996** .

Certificaciones

MEDISTEP ORIGIN

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Base compacta de PVC

Ash - SMO 5204



Pebble - SMO 1202




Sapphire - SMO 1216



MEDISTEP ORIGIN

ESTRUCTURA

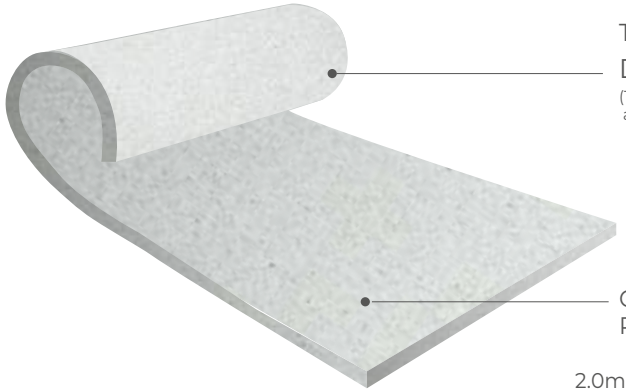

Tratamiento superficial
DEEP CLEAN UV
(Tratamiento en poliuretano de alta resistencia)

Capa base compacta de PVC

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- DEEP CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

USOS

Institucional

Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	M. Origin 2mm
Formato	EN 10582	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		DEEP CLEAN UV
Clasificación	ISO 10874	34 / 43
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
Peso	ISO 23997(EN 430)	2.900 g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.40 %
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2 k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	Sin cambios
Garantía		15 años

POR QUÉ ELEGIR MEDISTEP ORIGIN

Tratamiento UV limpio profundo y PUR de alta densidad que permite una alta resistencia al yodo fuerte y efecto antibacteriano.
Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados


LG Hausys
Ash - SMO 5204



NEXROLL

NUEVO

ROLLO HOMOGÉNEO

Espesor Total 2 mm
Propiedades bacterioestáticas y fungicidas.



NEXROLL

Los **NUEVOS PISOS HOMOGÉNEOS NEXROLL 2MM** son aquellos compuestos por una sola capa compacta de PVC con tratamiento superficial de poliuretano de alta resistencia, estabilidad dimensional, eco friendly - 100% reciclable, libre de metales pesados y solventes, bajo en emisione VOC, libre de formalehidos y alta resisencia al desgaste.

Tienen una infinita lista de características y ventajas, como lo son la elevada resistencia a la abrasión y su fácil limpieza.

Nuestro piso NEXROLL 2MM ES 100% ANTIBACTERIAL, cumple la norma de la secretaría de salud: RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996 .

Certificaciones

NEXROLL 2MM - **TERRA**

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Base compacta de PVC

Sand - WL440 - 6601



Grass - WL440 - 6621




Stone - WL440 - 6629



NEXROLL 2MM - **SPACE**

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Base compacta de PVC

Quark - WL440 - 8665

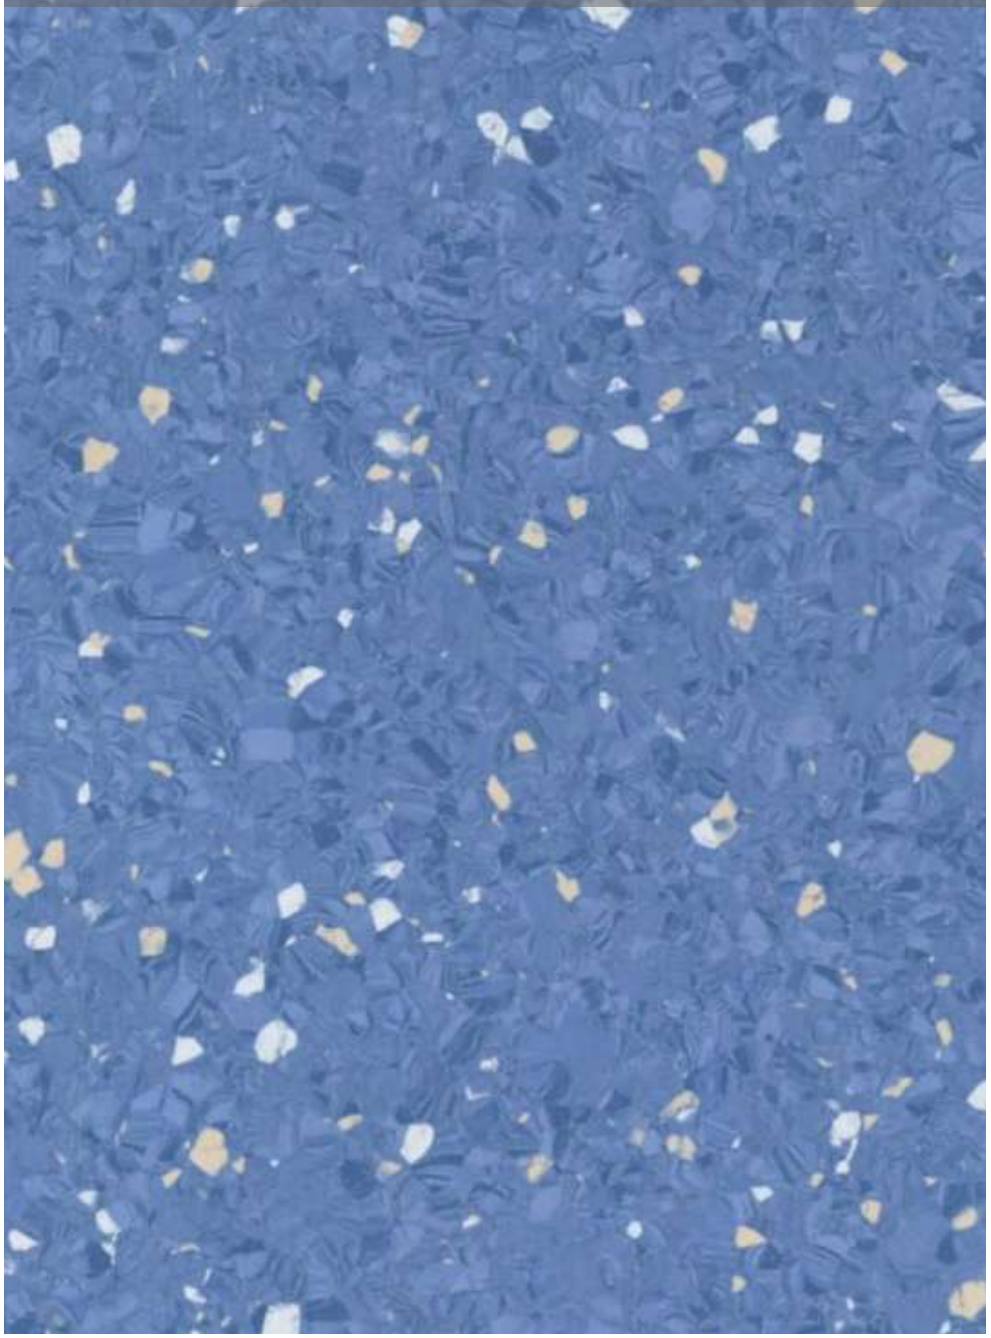


Nova - WL430 - 8688



NEXROLL 2MM

ESTRUCTURA

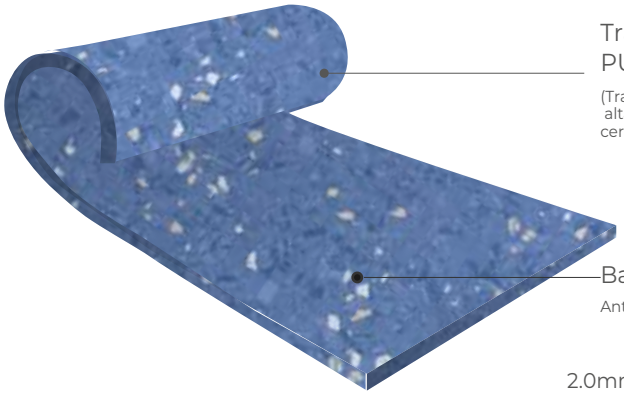

Tratamiento superficial PUR

(Tratamiento en poliuretano de alta resistencia, antiyodo, no necesita cera ni sellante)

Base compacta de PVC

Antiestático

2.0mm x 2,000mmx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
PUR de alta resistencia de garantiza una fácil limpieza, estabilidad y gran duració del color durante el tiempo.
Reduce costo de mantenimiento

USOS

Institucional

Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	NEXROLL 2MM
Formato	ISO 10581	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		STRENGTHEN PUR
Clasificación	ISO 10874	43
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
Peso	ISO 23997(EN 430)	2.900 g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	0.2
Estabilidad dimensional	ISO 23999	x< 0.40%, Y< 0.40%
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12667	0.01 m2 k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Resistencia Química	ISO 26987(EN 423)	Sin cambios
Garantía		15 años

POR QUÉ ELEGIR NEXROLL

Gracias a su tratamiento UV que aporta proteccion a los rayos del sol y PUR de alta densidad que permite una alta resistencia al yodo,con propiedades bacterioestáticos y fungicidas, Libre de plastificantes Ftalatos y metales pesados lo hace ideal para que lo incluyas en todos tus proyectos.



Sand - WL440 - 6601
Grass - WL440 - 6621

NEXROLL



Stone - WL440 - 6629

NEXROLL



LG Hausys

MEDISTEP CONDUCTIVO

Espesor total 2 mm
Base de Carbono

Rollo Homogéneo



Azul - SOC 3216

MEDISTEP CONDUTIVO 2mm es un piso vinílico en rollo homogéneo compuesto por una sola capa con tratamiento superficial **DEEP CLEAN UV** (Tratamiento en poliuretano de alta resistencia) y base de carbono la cual ofrece recubrimiento con altas propiedades de conducción, que nos permite redirigir la generación de campo electrostático y evitar que se produzca una chispa capaz de producir combustión o afectar aparatos electrónicos.

Gracias su componente es perfecto para usos de tráfico intenso como sectores hospitalarios e institucionales.


Nuestro piso MEDISTEP CONDUCTIVO ES 100% ANTIBACTERIAL, cumple la norma de la secretaría de salud - **RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996**

Certificaciones

MEDISTEP CONDUCTIVO

Tamaño: 2mm x 2 M x 20 M/Roll
Base de carbono

Azul - SOC 3216

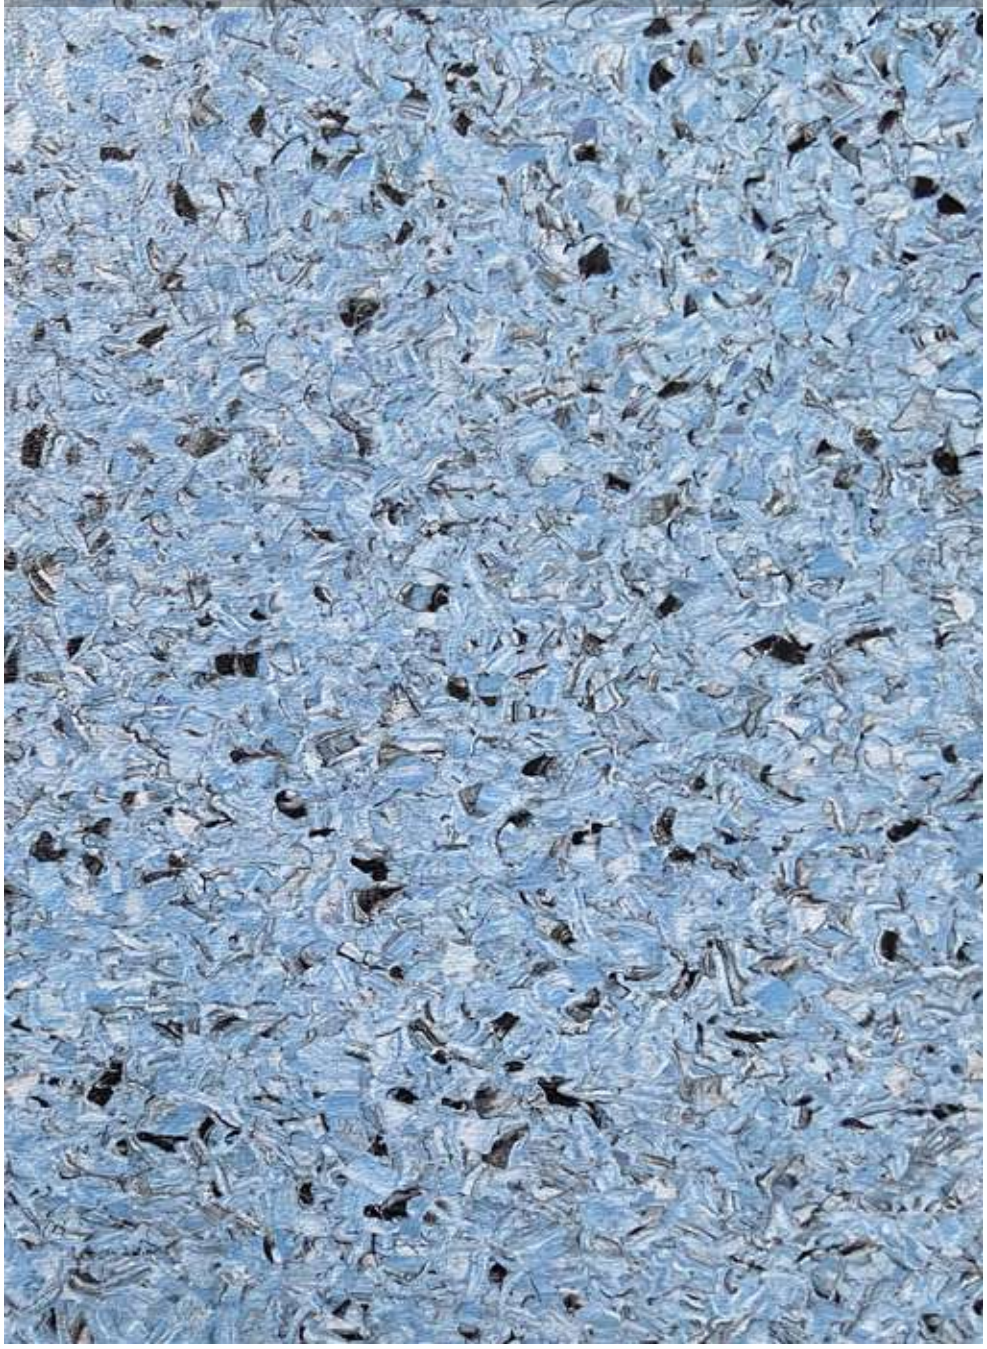


Gris - SOC 3203



MEDISTEP CONDUCTIVO

ESTRUCTURA

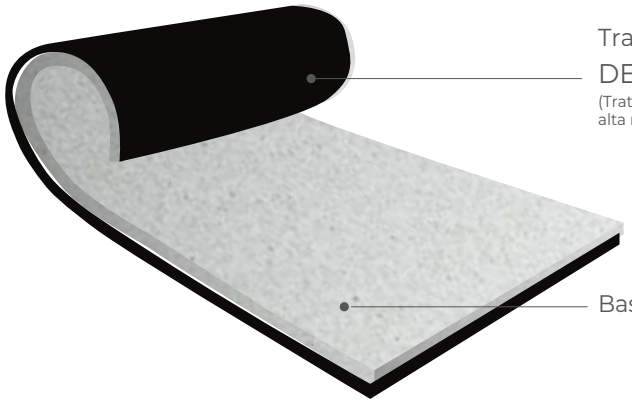

2mm x 2Mx20M/Roll

CARACTERÍSTICAS

Diseño y patrones exclusivos:
Patrones y colores que mejoran la creatividad y la concentración, diseñados y probados especialmente para uso comercial, institucional y hospitalario.

Fuerte resistencia al rayado:
- No se desgasta fácilmente contra el tráfico pesado
- Grupo de resistencia al desgaste T(EN 660-2)

Fácil mantenimiento:
- EASY CLEAN UV garantiza una fácil limpieza, estabilidad y resistencia del color durante el tiempo.
- Reduce costo de mantenimiento

Institucional

Hospital

FICHA TÉCNICA

Características	Estándar	Conductivo 2mm
Formato	EN 10581	Rollo homogéneo
Tratamiento Superficial		DEEP CLEAN UV
Clasificación	ISO 10874	34 / 43
Longitud de Rollo		20 m
Ancho de Rollo	ISO 24341(EN 426)	2M
Peso	ISO 23997(EN 430)	2.800 g/m2
Espesor total	ISO 24346(EN 428)	2,0 mm
Punzonamiento residual	ISO 24343-1(EN 433)	< 0.1
Estabilidad dimensional	ISO 23999	< 0.4 %
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Propiedades electroestáticas	EN 1815	<2 kV
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia Térmica	EN 12664	0.04 m2 k/w
Resistencia al Deslizamiento	EN 13893	Class DS
	DNI 51130	R9
Aislamiento Acústico	EN ISO 10140	4 dB
Resistencia Eléctrica	EN 1081	10^4 ≤ R ≤ 10^6
Garantía		15 años

POR QUÉ ELEGIR MEDISTEP CONDUCTIVO

Pisos asépticos, facilitan la higiene y no generan acumulación de bacterias, El piso conductivo es la manera de manejar la descarga electrostática y salvar vidas


LG Hausys

NEXCHEM®

La fórmula profesional para el éxito

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

Adhesivo Acrílico

para pisos vinílicos

- Alta Adherencia y Estabilidad
- Mayor Rendimiento
- Rollos, Tabletas, Listones y Alfombras



NexChem®

La fórmula profesional para el éxito

NEXCHEM es un adhesivo de dispersión acuosa, formulada con resinas y polímeros especializados que le brindan excelentes propiedades adhesivas. Utilizado en interiores para adherir revestimientos de PVC homogéneos y heterogéneos, en formatos de rollos, listones y tabletas.

Bajo Olor

Bajo en VOC

Alta Adherencia

Listo para usar

RENDIMIENTO:

5 KG



20 a 22 m2

10 KG



40 a 45 m2

20 KG



80 a 85 m2

TEXTURA:



MODO DE EMPLEO

1.Limpiar muy bien la superficie preparada previamente para la instalación del piso.

2. La base en concreto debe estar totalmente curada y seca (sin huecos e imperfecciones).

3. Aplicar una capa muy delga da de producto al suelo con llana dentada de 1.6mm*


4. Dejar secar 10 a 20 minutos y realizar la instalación del piso vinílico, evitando que quede aire atrapado presionando con un rodillo.

5. Usar en un área ventilada.

NexChem®
La fórmula profesional para el éxito

PROPIEDADES FISÍCAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Tipo Crema
Color:	Blanco
Olor:	Aromático
Umbral de olor:	Neutro
pH:	Punto de inflación (°C): Superior a 100
Gravedad específica:	1.2 ± 0.2
Viscosidad:	Tipo crema contenido de sólidos: 70 ± 5 (% en peso)

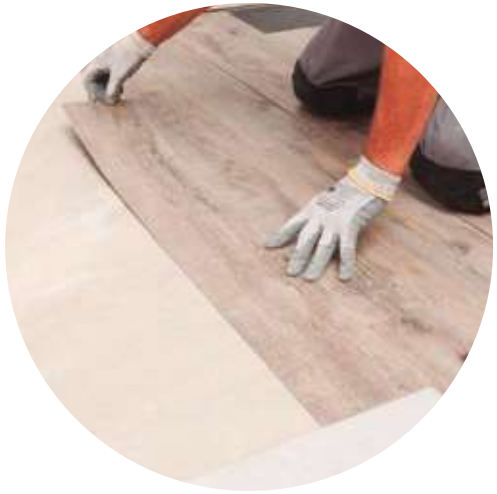

Adhesivo Acrílico

para pisos vinílicos

- NO SE CRISTALIZA
- RESISTENTE A LA HUMEDAD MAX 15 %
- RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
- CALIDAD PREMIUM
- ALTO RENDIMIENTO
- ALTA ADHERENCIA Y ESTABILIDAD



GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

Óptima Instalación



5 KG **10 KG** **20 KG**

Adhesivo Acrílico

para pisos vinílicos

Fácil
de llevar y usar

Empaque en bolsa con la caneca

Tiempos
de aplicación e instalación

20 a 30 Minutos
antes de instalar
el producto

48 Horas
Después de 48 horas
se procede a pisar el área

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_055

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega Hoja de Vida Residente de Obra

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se entrega la hoja de vida del Arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRÍGUEZ MUÑOZ, identificado con C.C. 79.715.893 de Bogotá y tarjeta profesional No A-25012003-79715893, para ocupar el cargo dentro del personal minino requerido de Residente de Obra.

Agradecemos la atención y pronta aprobación,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Hoja de Vida
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79715893

RODRIGUEZ MUÑOZ
APELLIDOS

LEONARDO MAURICIO
NOMBRES

Mauricio Rodríguez M.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-DIC-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500113-43065642-M-0079715893-20020103 03073 02002B 01 101834390

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

El Presidente del Consejo
Certifica

1. Que en cumplimiento de la ley 435 de 1998 el Arquitecto **LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ, identificado** con cédula de ciudadanía No. **79.715.893 de Bogotá** D.C., presentó solicitud de Matrícula Profesional de **Arquitecto** ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, acreditando para el efecto su grado profesional, otorgado por la **Universidad La Gran Colombia** el día **21 de Marzo de 2002**.

2. Que, estudiada la solicitud, el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares mediante la resolución No. **01 del 3 de Febrero de 2003**, matriculó al Arquitecto **LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ**, en el Registro Nacional de Arquitectos, bajo el número:

A25012003-79715893

Este certificado se expide en Bogotá D.C., el día 7 de Febrero de 2003.

Presidente

Juramento
Juro conocer, acatar, cumplir y hacer cumplir la Ley 435 de 1998, y el código de ética.



Arquitecto

Matrícula Profesional
A25012003-79715893

Carrera 6 No. 26 – 85 Piso 2, Tels. 3502700 - 3502702 – 3502704
Fax. 3804201 administracion@arquitecturacolombia.org.co
Bogotá D.C.- COLOMBIA

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E526485

CERTIFICA

Que el Arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ con cédula de ciudadanía No. 79715893 de Bogota D.C., registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A25012003-79715893, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 1 del 3 de Febrero de 2003 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 28 dias del mes de Diciembre de 2022.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación EXJKfnA

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

La República de Colombia

y en su nombre

LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Personería Jurídica No. 47 de 1953 del Ministerio de Justicia

teniendo en cuenta que

Leonardo Mauricio Rodríguez Muñoz

c.c. Nº 79.715.303 de Bogotá, D.C.

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el título profesional de

Arquitecto

En testimonio, le expide el presente **Diploma**, firmado y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, D. C. el 21 de Marzo del año 2002.

El Rector

Secretario General

El Decano

Registrado bajo el Nº 1205

Anotado al Folio Nº 140 del Libro Nº 5

Firma del Titular

Bogotá, D.C., a 9 de Abril del 2002

ACTA DE GRADO No. 217

En la ciudad de Bogotá el día 7 de diciembre de 2012, se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Señor Teniente Coronel RICHARD GONZALEZ VERA, en el cual la Escuela de Ingenieros Militares, previo el juramento reglamentario, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

A **LEONARDO MAURICIO RODRÍGUEZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº79.715.893 de Bogotá, quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y las normas legales y le otorgó el Diploma que lo acredita como tal.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá a los 7 días del mes de diciembre de 2012.

Firmada por

TC RICHARD GONZALEZ VERA Director	MY ABRAHAM RUIZ VASQUEZ Secretario General	CT LEONARDO CARDENAS ORTEGA Inspector de Estudios

Es fiel copia tomada del original en lo pertinente.

Secretario General

Ing. Olaguer Agudelo
C.C. 3.169.341 Sesquile

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo OLAGUER AGUDELO PRIETO, certifico que el arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.715.893 de Bogotá D.C., y Matricula profesional No. A25012003 – 79715893, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA, con una dedicación del 100%, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	21150005 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL AREA DE URGENCIAS Y ARCHIVO CENTRAL DEL HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS ESES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA.
FECHA DE INICIACIÓN:	27 de Julio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN :	10 de Julio de 2017
VALOR TOTAL CONTRATO:	$4.780.429.719
AREA TOTAL INTERVENIDA :	2.126 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTLACIONES HIDROSANITARIAS, EQUIPOS ESPECIALES, PISOS, ENCHAPES, PINTURAS, CUBIERTAS, ACABADOS EN GENERAL,
CUMPLIMIENTO :	Excelente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de 2017.

Atentamente,



ING. OLAGUER AGUDELO PRIETO
CC.3.169.341 SESQUILE
MP. 70202-128472 TLM

Carrera 4 No.10-12 Of. .03 Ibagué – Tolima
Cel. 310.2224514 / proyectosciviles2015@outlook.com

Ing. Olaguer Agudelo
C.C. 3.169.341 Sesquile


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo OLAGUER AGUDELO PRIETO, certifico que el Arquitecto LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ con cedula de ciudadanía No. 79.715893 de Bogotá D.C., y matricula profesional No. A25012003 – 79715893, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA, con una dedicación del 100%, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	1417 DE 2010
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO GARCIA DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de Enero de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN :	14 de Abril de 2013
VALOR TOTAL CONTRATO:	$3.000.000.000
AREA CUBIERTA :	1.302 M2
AREA TOTAL INTERVENIDA :	3.552 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	PRELIMINARES, DESCAPOTE, EXCAVACIÓN CERRAMIENTO), CIMENTACIÓN, OBRA CIVIL (ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPE DE MUROS, MESONES EN CONCRETO), ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICA, PISOS Y ENCHAPES, CARPINTERÍA METÁLICA, CARPINTERÍA MADERA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS), INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, BAÑOS (APARATOS SANITARIOS, GRITERÍAS PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS, DISPENSADORES DE PAPEL, JABONERAS), VIDRIOS Y ESPEJOS, CUBIERTAS, ASEO.
CUMPLIMIENTO :	Excelente

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Cinco (05) días del mes de Noviembrede 2017.

Atentamente,



ING. OLAGUER AGUDELO PRIETO
CC.3.169.341 SESQUILE
MP. 70202-128472 TLM

Carrera 4 No.10-12 Of. .03 Ibagué – Tolima
Cel. 310.2224514 / proyectosciviles2015@outlook.com

CONSORCIO GIRARDOT AG

NIT 900.191.295-9

CERTIFICACION

La suscrita **MARTHA LUCIA AYCARDI PACHECO**, identificada con Cédula de ciudadanía No 60.306.611 de Cúcuta, en mi calidad de Representante Legal del Consorcio **GIRARDOT AG**, del contrato 164 de 2007 cuyo objeto es Elaboración del Diseño Arquitectónico, Estudios Técnicos Complementarios y la Ejecución de las obras necesarias para la Construcción de los Despachos Judiciales de Girardot (Cundinamarca).

Hago constar que el Arquitecto **LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ MUÑOZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.715.893 de Bogotá D.C., y matricula profesional No. A25012003 – 79715893, se desempeño como **RESIDENTE DE OBRA,** del siguiente proyecto:

CONTRATO No	05 DE 2008
OBJETO	LA ELABORACION DEL DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y LA CONSTRUCCION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.
UBICACIÓN	CARRERA 10 N 37-39
VALOR OBRA	$4.964.928.681
FECHA DE INICIACION	12 DE DICIEMBRE DE 2008
FECHA DE TERMINACION	02 DE ABRIL DE 2012
AREA DISEÑADA	
CONSTRUIDA CUBIERTA	4.800 m2
AREA INTERVENIDA	10.000 m2
NUMERO DE PISOS	4 PISOS Y SOBRECUBIERTA
CALIFICACION	BUENA

Se expide a solicitud del interesado a los 27 días del mes de Julio de 2012.

MARTHA LUCIA AYCARDI PACHECO
Representante Legal
CONSORCIO GIRARDOT AG

Copia a : Consecutivo/Coordinación/Archivo GG/Gestión Documental/DCC/KABS

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_057

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega Hoja de Vida Inspector de Obra

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el Consorcio MIA GP hace entrega la hoja de vida de la Arquitecta VALENTINA OSORIO GIRALDO, identificada con C.C. 1.094.944.405 de Armenia y tarjeta profesional No A-23282017-1094944405, para ocupar el cargo dentro del personal minino requerido como inspector de obra, remplazando a la profesional Pilar Rojas.

Agradecemos la atención y pronta aprobación,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Hoja de Vida
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.094.944.405
OSORIO GIRALDO
APELLIDOS
VALENTINA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1994
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

B-
G.S. RH

F
SEXO

20-SEP-2012 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2600100-01024834-F-1094944405-20180724 0062013040A 1 9905110345

Scanned with CamScanner

En nombre de la República de Colombia y
por autorización del Ministerio de Educación,

La Universidad La Gran Colombia

Personería Jurídica No. 47 de 1953 del Ministerio de Justicia

en virtud a que:

Valentina Osorio Giraldo

CC. 1094944405 Armenia

ha terminado satisfactoriamente los estudios correspondientes
al Programa Universitario de

Arquitectura

y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la Ley y
los Estatutos Universitarios, le confiere el título de:

Arquitecta

En testimonio, le expide el presente Diploma, firmado y refrendado con
el sello mayor de la Universidad, en Armenia, República de Colombia,
el día 12 del mes de Diciembre del año 2017

Rector Delegatario

El Decano

Secretario(a) General

Firma del Titular

Anotado al folio No. 087 del Libro No. 18
Armenia, a Dic. 12 del año 2017

No. 0001321

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E501429

CERTIFICA

Que la Arquitecta VALENTINA OSORIO GIRALDO con cédula de ciudadanía No. 1094944405 de Armenia, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A23282017-1094944405, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 28 del 12 de Diciembre de 2017 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 6 dias del mes de Septiembre de 2022 .

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digitall] y digite el siguiente código de verificación y1IyGuh

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la señora **VALENTINA OSORIO GIRALDO**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.094.944.405 de Armenia**,** laboro para mí como **INSPECTORA DE OBRA**, al proyecto con las siguientes características:

NUMERO DE CONTRATO:	256 de 2017
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO, ZONA CENTRO (Grupo 9).
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de Octubre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN :	28 de Junio de 2019
VALOR DEL CONTRATO :	$13.269.971.487
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA :	3.806 M2
CUMPLIMIENTO :	Excelente
Actividades Ejecutadas :	PRELIMINARES, CIMENTACION, DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA, MAMPOSTERIA, INSTALCIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCEDIOS, RED GAS, INSTALCIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO, REDES EXTERIORES, PAÑETES, PISOS Y ENCHAPES, ACABADOS, CUBIERTAS, PISOS, ASEO Y LIMPIEZA.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2019.

Cordialmente,

ARQ. JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ
C.C 13.459.838 CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCAR 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El **CONSORCIO MG 2021** identificado con NIT No. 901.511.981-1, certifica que la señora **VALENTINA OSORIO GIRALDO**, identificado con C.C. 1.094.944.405 de Manizales, se desempeñó como **INSPECTOR DE OBRA** , en el siguiente proyecto:

NUMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR 2732419 DE 2021
OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - A MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIACIÓN:	6 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2022
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 13.269.852.079
ÁREA TOTAL INTERVENIDA :	5.297 M2
ACTIVIDADES REALIZADAS :	REPLANTEO, EXCAVACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EQUIPOS ESPECIALES, REDES DE VENTILACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, GAVIONES, PARQUEADERO EN ASFALTO, SENDEROS PEATONALES EN ADOQUÍN, MAMPOSTERÍA, PISOS Y ACABADOS, CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA, VENTANERIA, SEÑALIZACIÓN
CUMPLIMIENTO :	Excelente
FRENTES DE OBRA	Cundinamarca, Meta y Boyacá

La presente certificación se expide a petición del interesado en Bogotá D.C. a los Nueve (9) días del mes de Enero de 2023.

Cordialmente,

JESÚS GUILLERMO GÓMEZ LÓPEZ
C.C. 13.459.838 CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 8 No.12-21 Oficina 1001 Bogotá - Telefax: 313 3876020
E-mail: consorciomg2021@gmail.com

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

2023_RUU_MGP_059

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Informe Mensual de Obra No 1

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el Consorcio MIA GP hace entrega del Informe Mensual de Obra No 1 el cual comprende las actividades de obra realizadas en periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero de 2023.

Agradecemos la atención prestada,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe Mensual de Obra No 1
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

INFORME MENSUAL DE OBRA No 1

PROYECTO:

CONTRATO No CO1.PCCNTR.4077645 DE 2022

OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

CONTRATISTA :
CONSORCIO MIA GP

PERIODO 20 DE ENERO DE 2023 A 19 DE FEBRERO DE 2023

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI” y el proyecto 7638 “Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,” se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones locativas.

La estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

La finalidad de este informe es expresar las inquietudes y e inconsistencias encontradas en la revisión preliminar de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios e hidráulicos, para que sean aclaradas y definidas en pro del correcto avance de la obra en ejecución.

Dejar en evidencia CUALITATIVAMENTE las deficiencias en la construcción de algunos elementos estructurales que puedan afectar el normal comportamiento de los elementos no estructurales como cubiertas, pisos y muros de mampostería, así como el comportamiento de la misma estructura

La información con la que se ha realizado este informe recopila lo estudiado entre las especificaciones técnicas, presupuesto, planimetría y estado actual de obra.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Las actividades a realizar dentro del alcance del contrato de obra se encuentran en la zona oriente de la ciudad de Bogotá y más específicamente en la localidad de Rafael Uribe Uribe, los colegios a intervenir se listan a continuación:

- Colegio Alexander Fleming Sede B, Antonio Ricaurte
- Colegio Alfredo Iriarte A Sede A, Los Chircales
- Colegio Alfredo Iriarte Sede B, El Mirador
- Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay
- Colegio El Libertador Sede B, Manuel Murillo Toro
- Colegio Enrique Olaya Herrera Sede A, Enrique Olaya Herrera
- Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa
- Colegio José Martí Sede C, Granjas De San Pablo
- Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño Sede A, Liceo Femenino Mercedes Nariño
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez A Sede A, Manuel Del Socorro Rodríguez
- Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez B Sede B, Republica De Israel
- Colegio Rafael Delgado Salguero Sede A, General Páez
- Colegio Reino De Holanda Sede A, Reino De Holanda
- Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra
- Colegio Restrepo Millán Sede D, Gabriela Mistral
- Colegio San Agustín Sede A, San Agustín
- Colegio El Libertador Sede C, Juan Del Rizo

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas. Dentro del listado de sedes a intervenir del presente

contrato, se priorizaran sedes de acuerdo a las indicaciones dadas por la SED y la disponibilidad de los recursos.

2. CONTRATO SUSCRITO

2.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4077645 de 2022
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTUR FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATISTA:	Consorcio MIA GP
NIT:	901.634.703-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Mateo Luzardo Villamizar
CONTACTO:	Cra 8 No 12-21 MN edificio Restrepo Bogotá D.C
VALOR INICIAL:	$11.941.262.150,00
PLAZO INICIAL:	Once (11) Meses
FECHA DE INICIO:	20 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de diciembre de 2023

3. CONTROL DE PÓLIZAS

3.1. PÓLIZAS INICIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**1**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	18/03/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/10/2022	18/09/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	18/09/2023	18/09/2025	$ 2.388.252.430,oo
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**15/12/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/10/2022	18/09/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18/10/2022	18/09/2023	$ 298.531.552,75

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	22/12/2022	26/10/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	22/12/2022	26/10/2023	$ 1.300.000.000,oo

3.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**NACIONAL DE SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA No:	**400044676**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	20/06/2024	$ 2.288.252.430,oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2023	20/12/2026	$ 1.194.126.215,oo
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2023	20/12/2025	$ 2.388.252.430,oo

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA N°:	**400044675**		
ANEXO	**2**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**31/01/2023**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/2023	20/12/2023	$ 597.063.107,50
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/01/2023	20/12/2023	$ 298.531.552,75
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY COLOMBIA SEGUROS**		
PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE			
PÓLIZA No:	**1547/0**		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**22/11/2022**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURAD**
	INICIAL	**FINAL**	
COBERTURA PRINCIPAL A	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA TERREMOTO, TEMBLOR MAREMOTO, ERUPCIÓN VOLCÁNICA	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA PARA HMACC-AMIT INCLUYENDO SABOTAJE Y TERRORISMO	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
COBERTURA CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, OTROS EVENTOS	20/01/2023	19/12/2023	$ 11.941.262.150,oo
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL COBERTURA E	20/01/2023	19/12/2023	$ 1.300.000.000,oo

4. ESTADO ACTUAL DE LOS COLEGIOS A INTERVENIR

4.1. COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B, DIANA TURBAY II

El Colegio Diana Turbay Sede B, Diana Turbay encuentra ubicado en la Cl. 49 Sur #2a-38 2a-14 a.





4.1.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Valentina Osorio Giraldo	1094944405	Inspector de Obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Elias Michelly Medina	19.490.651	Maestro General
Neudo José González	2.20.950.569	Ayudante obra
Brayan Andrés Marín Salas	1.023.967.015	Ayudante de obra
Manuel Antonio Cárdenas	79.461.540	Ayudante

4.1.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para El Colegio Diana Turbay Sede B, Luis López De Mesa:

- **REPLANTEO:** Se realiza replanteo de toda la edificación, teniendo en cuenta que es una obra de mejoramiento y mantenimiento correctivo y esta desalojada para la ejecución del contrato verificando medidas y pendiente.

- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA** Se realiza demolición de pisos del edificio 2 y edificio 3.

- **DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M** Se realiza demolición de muros correspondientes a los baños del edificio 2 y aulas del edificio 3.

- **DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS.:** Se realiza desinstalación de carpintería metálica interna de la infraestructura correspondientes a los edificios 2 y 3.

- **DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC** Se realiza desmonte de los aparatos sanitarios correspondientes al baño del edificio 2 y a la cocineta del mismo edificio.

4.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- REPLANTEO



imagen 1. Replanteo

- DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA



imagen 2. Demolición áreas intervenidas

- DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M



Imagen 3. Demolición muros en mampostería baños edificio 2

- DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS.:



imagen 4 Desmonte de ventanas Edificio 2 y 3

- DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC.



imagen 5. Desconexión de aparatos sanitarios y módulos biblioteca.

4.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se realizaron varios comités de obra con interventoría y supervisión, para determinar alcance contractual para el mejoramiento correctivo de dicha institución. Se pacto entregar diseños de las nuevas redes a ejecutar en la independización de baños y la adecuación del baño de docentes, para ser aprobados y ejecutados.

4.2. COLEGIO JOSE MARTÍ SEDE A, LUIS LÓPEZ DE MESA

El Colegio José Martí Sede A, Luis López De Mesa se encuentra ubicado en la Dg. 32 Bis Sur #14-97.





imagen 6. Colegio José Martí- Luis López de Mesa- Sede A

4.2.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Yeison Manuel Romero	10681368777	Ayudante obra
Jonathan Londoño Quiñonez	80111297	Oficial Obra
John Bernal	7956608	Maestro General

4.2.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para la Institución Educativa José Martí Sede A-Luis López de Mesa:

- **REPLANTEO:** Se realiza replanteo de todas las cubiertas a ejecutar en bloque A, Serigrafía y Comedor, verificando medidas y pendiente.

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO:** Se realiza cerramiento para aislar las áreas en que se está interviniendo, así como áreas de acopio de tejas en asbesto cemento a desmontar y materiales a utilizar.

- **DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):** Se realiza desinstalación de tubería y cableado existente en aula de profesores.

- **DESMONTE DE LÁMPARAS:** Se realiza desinstalación de luminarias existentes en aula de profesores.

4.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- REPLANTEO



imagen 7. Replanteo en serigrafia



imagen 8. Replanteo aula profesores



imagen 9. Replanteo pasillo escaleras entre auditorio y aula profesores



imagen 10. Replanteo aulas



imagen 11. Replanteo auditorio



imagen 12. Replanteo comedor

- CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO.



imagen 13. Cerramiento en área de circulación y trasiego interno desde áreas de desmonte de cubierta hasta acopio temporal



imagen 14. Cerramiento perimetral a aula de profesores

- DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS):



imagen 15. Desmonte de salidas eléctricas aula profesores

- DESMONTE DE LAMPARAS:



imagen 16. Desmonte de luminarias en aula profesores

4.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el período reportado, se adelantaron múltiples comités de obra con interventoría y supervisión, y visitas en la institución para la definición del alcance contractual para la instalación, en donde se nos requirió plantear varias alternativas en el presupuesto de acuerdo a las áreas priorizadas por supervisión, a la fecha no se tiene aprobación formal de alternativa definitiva por parte de interventoría.

- Se remitió el diseño del refuerzo a la estructura metálica soporte de cubierta existente a interventoría y aún no se tiene observaciones y o aprobación del mismo, por tanto, no se ha dado inicio a desmonte de cubierta existente hasta tanto sea definido el alcance final y aprobado el diseño estructural.

- Cabe resaltar que durante la semana del 13 de febrero al 18 de febrero en la institución educativa tenían programado una actividad, es así que informaron a consorcio Mía GP, del condicionamiento para trabajar en exteriores, por tanto, se procedió a realizar el desmonte de redes eléctricas a nivel de cubierta en área de aula de profesores.

- Tras evidenciar que las canales existentes en aula de profesores están colmatadas de material vegetal proveniente de los árboles contiguos a la edificación, se sugiere que las canales contempladas dentro del marco del contrato de obra, estén internas y/o que se les instale una rejilla que filtre el material vegetal, en todo caso se requerirá un mantenimiento frecuente.



imagen 17. Canales edificio aula profesores

4.3. COLEGIO RESTREPO MILLÁN SEDE B, ISABEL II DE INGLATERRA

El Colegio Restrepo Millán Sede B, Isabel II De Inglaterra se encuentra ubicado en la Dg. 37b Sur #17c98 17c- a.





imagen 18. Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.3.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Fabio Toro	3.082.270	Maestro
Luis Fernando Londoño Ruiz	10.058.843.089	Ayudante
Carlos Antonio Torres	10.893.066	Ayudante
Anderson Mauricio Galindo	1.022.958.502	Ayudante

4.3.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para la Institución Educativa Restrepo Millán Sede B-Reina Isabel II de Inglaterra descritas a continuación:

- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):** Se realiza demolición de piso existente en aula 32 y corredor 33 edificio 2.

4.3.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS):




imagen 19. Demolición piso en corredor 33 y aula 32 edificio 2 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra



imagen 20. Demolición piso en corredor 33 y aula 32 edificio 2 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

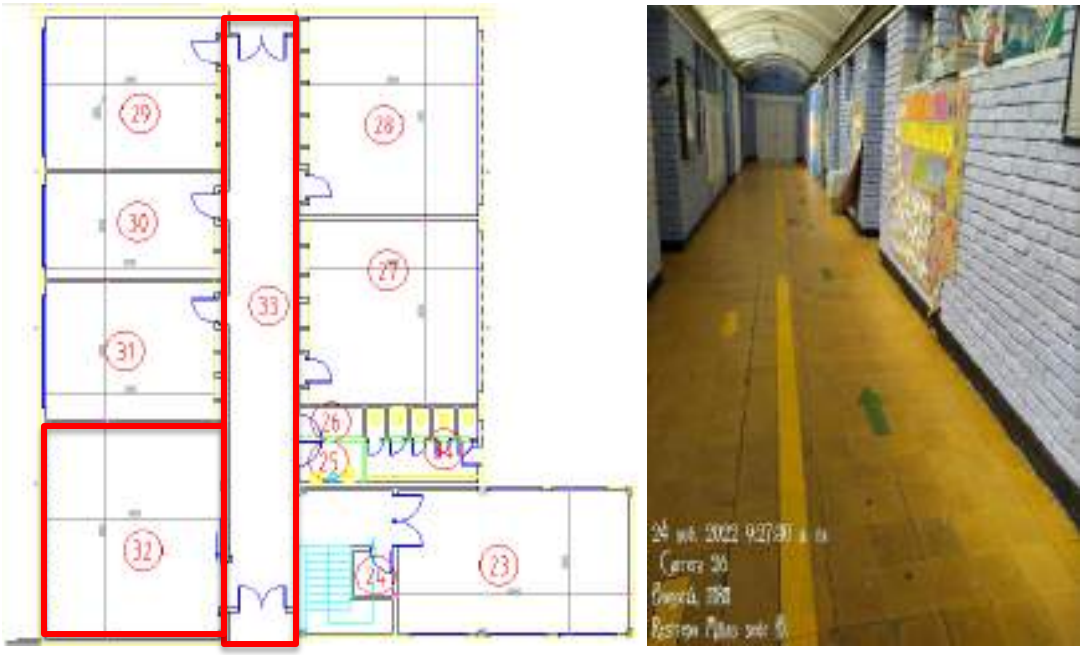


imagen 21. Demolición piso en corredor 33 y aula 32 edificio 2 Colegio Restrepo Millán Sede B Isabel II de Inglaterra

4.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza socialización de ficha de diagnóstico con rectoría de la institución educativa, supervisión e interventoría en donde se presenta ante el colegio el alcance que

contemplará el techo de inversión asignado para las adecuaciones en el establecimiento educativo.

- Tras realizar inicio de la demolición del piso, interventoría solicita suspender la actividad hasta tanto hacer la aclaración del alcance para la institución, y finalmente tras dicha aclaración se hace demolición de corredor y aula, se pausó la intervención, atendiendo a que no ha sido definido formalmente el tipo, estilo y diseño del acabado que van a tener dichos pisos.

- En este mismo sentido, consorcio Mia GP, remite a interventoría y supervisión muestras físicas y fichas técnicas con las diferentes opciones de piso vinílico, cabe aclarar que dependiendo del material del acabado de piso y referencia del mismo se tendrá que hacer el ajuste pertinente en el presupuesto.

- De acuerdo a lo plasmado inicialmente en informe preliminar del estado de las instalaciones del colegio Restrepo Millán Sede B Reina Isabel II de Inglaterra, se reitera que en la institución educativa no existen elementos estructurales, los muros son mampostería la cual presenta grietas, desplazamiento de piezas, deformaciones y fisuras que sugieren una intervención de mayor envergadura, y apelando a que el proyecto es obra de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de las plantas físicas, nos remitimos a solicitar una mesa de trabajo interdisciplinar en donde se considere la alternativa idónea para dar solución y garantizar la estabilidad, calidad y rendimiento de las obras considerando todo dentro del marco y objeto contractual.



imagen 22. Estado mampostería y estructura metálica



imagen 23. Estado mampostería y estructura metálica

4.4. COLEGIO SAN AGUSTÍN SEDE A, SAN AGUSTÍN

El Colegio San Agustín Sede A, San Agustín se encuentra ubicado en la Cl. 50a Sur #5C-40.



4.4.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Juan Camilo Cristancho	1018483507	Inspector de obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1.069.724.034	Instalador de cubierta
Edgar Moreno Reyes	1.005.195.748	Instalador de cubierta
Frannkyn Roosevelth Mendez	1.024.484.580	Instalador de cubierta
Johan Estiven Rozo Leyton	1.233.692.117	Instalador de cubierta

4.4.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se recibió por parte de la interventoría notificación de emergencia en el colegio san Agustín sede B – Área bachillerato donde se presentaba fuga hidráulica.

En primera instancia de visito el lugar donde se citó a la aseguradora por parte de la institución ya que se había realizado una intervención cerca al área de la fuga. Sin embargo, se concluyó

que no hacia parte de la intervención anterior, por lo que se precedió el 13 de febrero del 2023 a realizar prueba con geófono y cámara para evidenciar con mayor exactitud la ubicación de la fuga. Una vez se detectaron las fugas en piso 2 y 3, se programó intervención el día 17 de febrero, toda vez que la institución no podía quedar sin el suministro de agua con estudiantes en el lugar.

- Se realizo reparación de las fugas, reemplazando tramos de tubería con el fin de generar nuevamente el empalme de la red.



imagen 24. Prueba Geófono



imagen 25. Prueba Cámara



imagen 26. Reparación de Fuja

- Se realiza cerramiento en lona para protección y aislamiento de área de trabajo piso 3.



Imagen 27. Cerramiento en lona

- Se realiza demolición de acabado de piso en batería sanitaria del piso 3



Imagen 28. Demolición acabado de Piso

- Se realiza demolición de muros y enchapes de baterías sanitarias del piso 3



Imagen 29. Demoliciones

- Se realiza desmonte de aparatos sanitarios del piso 3



Imagen 30. Desmontes de aparatos sanitarios

- Se inicia actividad de esmalte sobre estructura existente



Imagen 31. Esmalte sobre estructura existente

4.4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se avanza en las actividades de diseño de baterías sanitarias para ser socializadas con la interventoría y la entidad con el fin de contar con el visto bueno para la ejecución de las actividades de acabados en las áreas.

4.5. COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE A

El Instituto educativo Enrique Olaya Herrera se encuentra ubicado en Cra. 10 #31 Sur-29, Bogotá.



Imagen 32. Colegio Enrique Olaya Herrera

4.5.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Nombre	Cedula	Cargo
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS
Valentina Osorio Giraldo	1094944405	Inspector de Obra
Angela Tarazona	60448725	SST
CONSORCIO MIA GP		OBRA
Elias Michelly Medina	19.490.651	Maestro General

Eduardo José Zoteranis Riera	12.077.613	Ayudante obra
Ubaldo Antonio Márquez Márquez	7.038.443	Ayudante de obra

4.5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante esta fase del proyecto se da inicio a las intervenciones preliminares contempladas dentro del alcance contractual para la I.E.D Enrique Olaya Herrera descritas a continuación:

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO**
  Se inician actividades preliminares en el bloque de preescolar, verificar memorias de cálculo.

- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**
  Se realizan actividades de demolición retiro y limpieza del modulo de preescolar.

4.5.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO**
  Se inician actividades preliminares en el bloque de preescolar.



Imagen 33. Cerramiento en lona

- **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**



Imagen 34. Demolición alistado

4.5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza socialización de ficha de diagnóstico con rectoría de la institución educativa, supervisión e interventoría en donde se presenta ante el colegio el alcance que contemplará el techo de inversión asignado para las adecuaciones en el establecimiento educativo.

- Se inician actividades sin ninguna novedad en la fecha pactada.

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_067

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Entrega propuesta baños colegio Diana Turbay Sede B.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se adjunta planimetría de propuesta de diseño arquitectónico de los baños a intervenir del colegio Diana Turbay Sede B, con el fin de recibir aprobación por parte de la entidad.


Agradecemos la atención,

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Planimetría
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

PLANTAS ARQUITECTONICAS Esc. 1:150

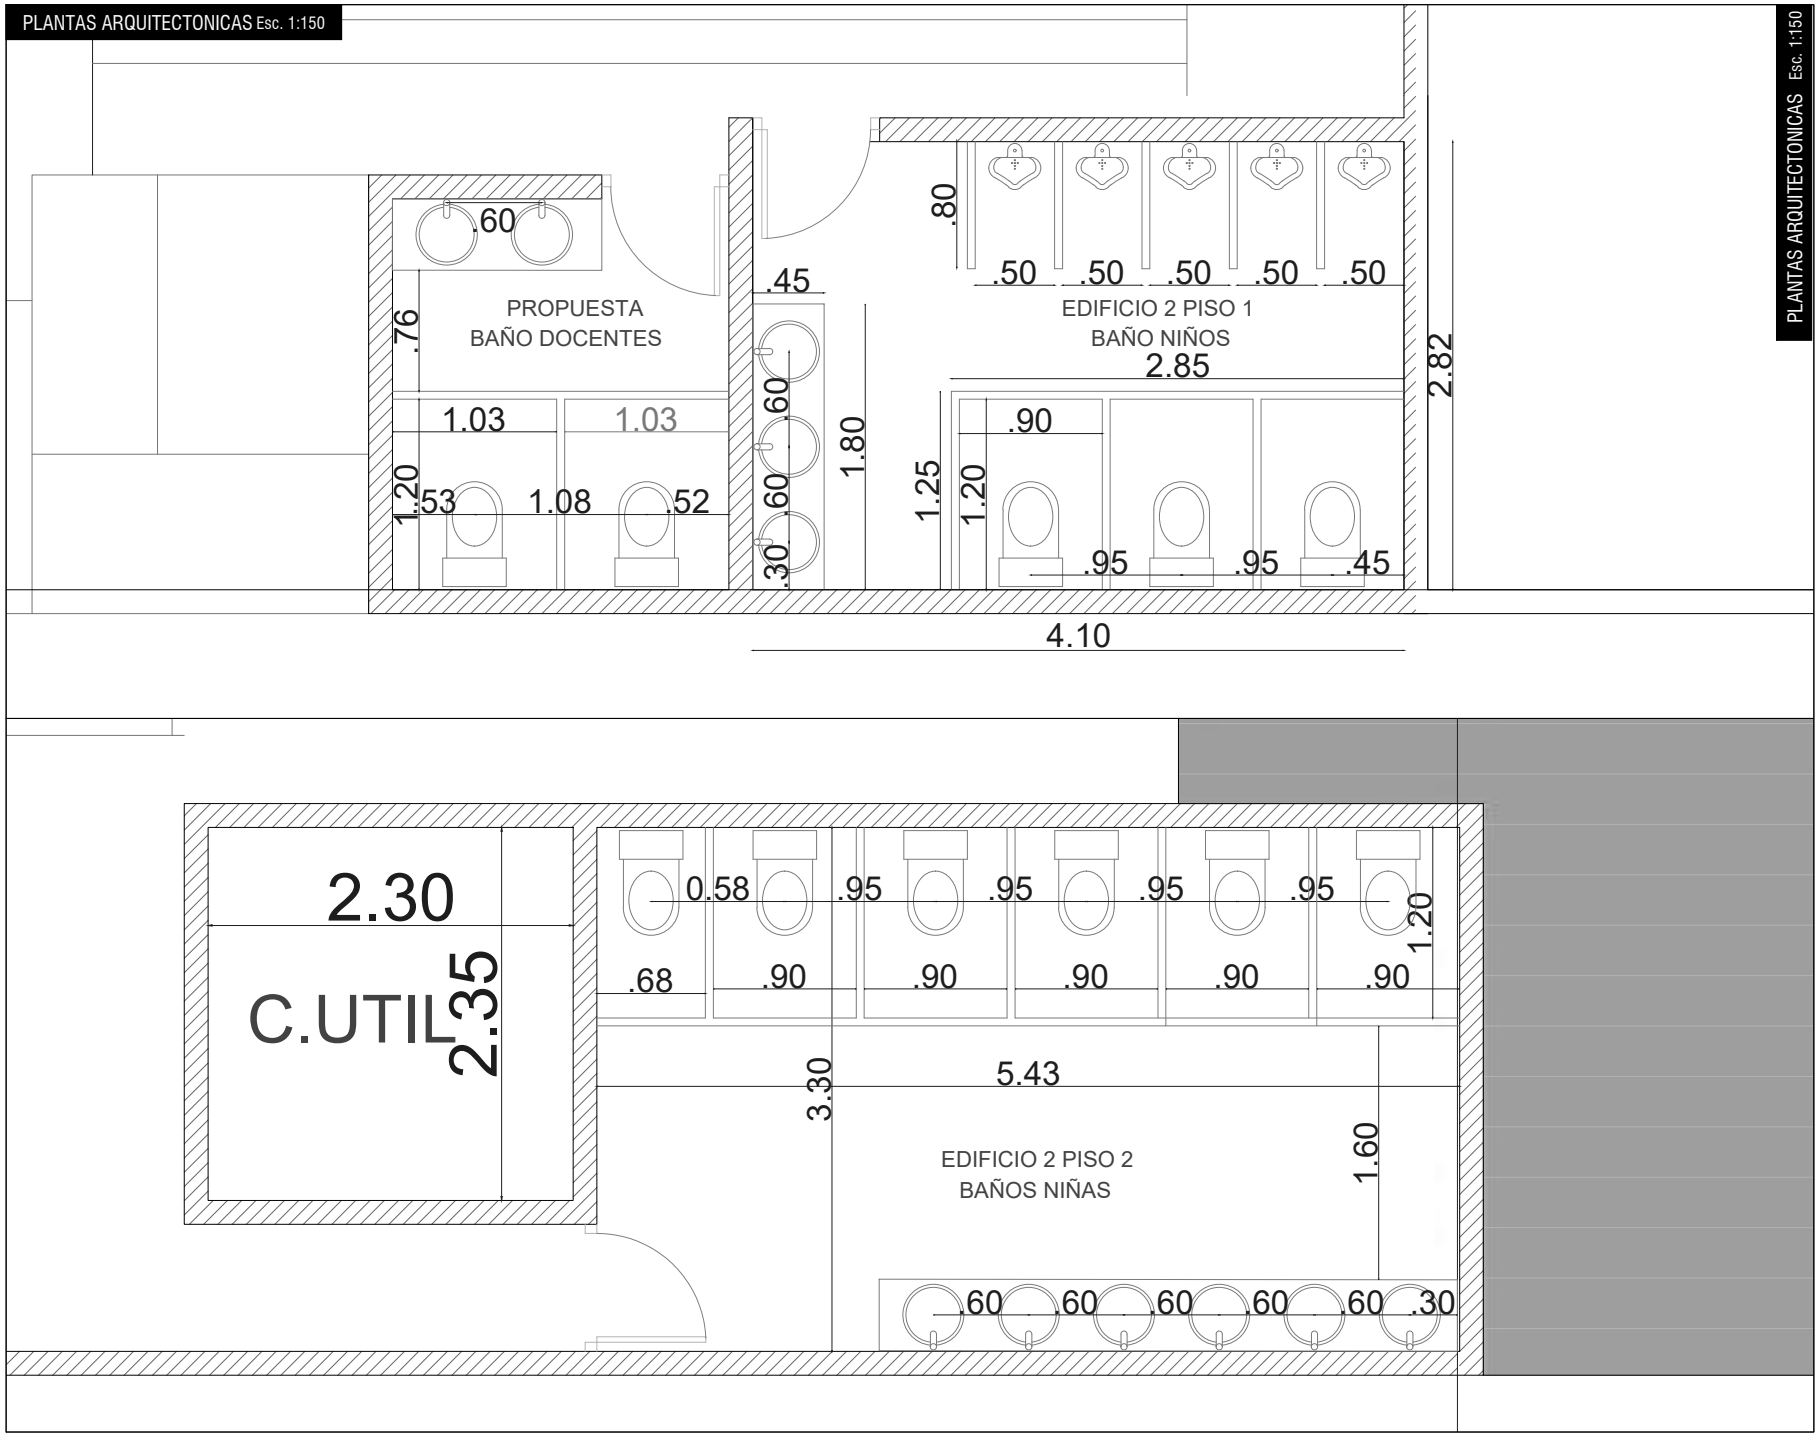

PLANTAS ARQUITECTONICAS Esc. 1:150

PROYECTO

COLEGIO DIANA TURBAY SEDE B

BOGOTÁ,CUNDINAMARCA
ADECUACIÓN GENERAL

PROPIETARIO

Colegio Distrital Diana Turban Sede B

ARQUITECTA

Valentina Osorio Giraldo
M.P. A2328201 7-1094944405

CONTACTO

Valeosorio@hotmail.es
(+57) 300-785-87-06
Armenia, Quindío

NOTAS GENERALES

1.- LA RESPONSABILIDAD DEL DISEÑO SISMICO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES RECAE EN LOS PROFESIONALES, BAJO CUYA DIRECCIÓN SE ELABORARAN LOS DIFERENTES DISEÑOS PARTICULARES.
"EL RESPONSABLE(NO) DEL SUPERVISOR TÉCNICO EL VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS NOESTRUCTURALES QUE SE INSTALEN EN LA EDIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CUENTA DE CONFORME AL CAMPO AL GRADO DE DESEMPEÑO ESPECIFICADO EN(NR)A.9.6.1 Y A.9.3 DE LA NSR-98). EL CONSTRUCTOR DEBE INFORMAR AL PROPIETARIO DE LOS COSTOS DE ASUMIR UN GRADO DE DESEMPEÑO MAYOR, Y EL DE QUE PUEDA TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.

2.- LAS SPECIMES ELECTRICOS, POR EL ARQUITECTO DEBEN REVISADOS POR EL DISEÑADOR ESTRUCTURAL, EL CONSTRUCTOR Y EL SUPERVISOR TÉCNICO DE LA OBRA, CUANDO CORRESPONDA CON EL ARQUITECTO DISEÑADOR. LAS SOLUCIONES PROPUESTAS A FIN DE CUMPLIR ESTA CONDICIÓN, EL CÁLCULO DEL REFUERZO Y DE LOS AISLADO DE LAS MAMPOSTERÍAS INTERNAS Y DE FACHADA, ASÍ COMO LOS DE OTROS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES NO CONTINUOS, DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR EL PROFESIONAL CALCULISTA DE LA OBRA, O POR LOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

3. - LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTOS PLANOS DE ARQUITECTONICA Y DE CARÁCTER GENERAL. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVAS SOBRE COMPONENTES EN LOS PLANOS DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y EN LOS DE LOS DISEÑADORES TÉCNICOS. CUALQUIER INCONSISTENCIA QUE SE ENCUENTRE EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLOS Y LA DE ESTE PLANO DEBE CONSULTARSE CON EL ARQUITECTO.

ARCHIVO

CBL_P-ARQUITECTONICOS.dwg

FECHA

Febrero 2023

CONTIENE

Planta Cubiertas

ESCALA

INDICADA

01 | 01

PLANO No

DIANATURBAY_
P-ARQ

Bogotá D.C., 01 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_068

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Solicitud planos y diseños.

Cordial saludo,

El Consorcio MIA GP con el objetivo de acometer los deberes suscritos mediante el contrato en referencia solicita las planimetrías de las sedes visitas a continuación:

Visita 22 de febrero 2023.

1. Fe y alegría Palermo sur.
2. Palermo sur – Sede A.
3. Marruecos y molinos – Sede A.

Visita 24 de febrero 2023.

4. Quiroga alianza – Sede A.
5. Gustavo restrepo – Sede A.
6. Gustavo restrepo – Sede B.

Pendientes por visitar.

7. Reino de Holanda.
8. Fe y alegría la paz los naranjos.

Así mismo, teniendo en cuenta el alcance de las obras de mantenimiento programado del contrato en referencia, el cual es la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición

de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, y sabiendo que es claro que el presente es un contrato de obra y no de consultoría, el Consorcio MIA GP requiere los diseños para la construcción de las actividades requeridas, mas aun conociendo que el Decreto 330 de 2008 en su artículo 27, ha establecido como la función B de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos: "*B. Adelantar los trámites necesarios para la compra de lotes, la contratación del diseño, ejecución e interventoría de las obras civiles, conforme a los planes, programas y proyectos aprobados".*

Agradecemos la atención y gestión pertinente.

Cordialmente,

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_073

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Subsanación informe mensual SST No 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la subsanación del informe mensual SST No 1 correspondiente al periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ **COLEGIO ENRIQUE OLAYA**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían dos trabajadores por relacionar: LEYDER JOSE VIZCANIO Y WILMER FABIAN RIOS.

R/: Los Trabajadores en mención no se presentaron a realizar las actividades en la obra.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Jose Elías Michelly y Manuel Antonio Cardenas. La del señor Manuel fue realizada el 21 de febrero, fecha por fuera del periodo que se está presentando este informe. Faltan los soportes de inducciones de: Luis Miguel Castaño, Valentina Osorio, Angela Tarazona, Leyder Jose Vizcanio y Wilmer Fabian Rios.

R/: Se adjuntaron las inducciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra , los que no se presentaron no se adjunta soportes.

3. Capacitaciones: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/Se realizó su respectiva corrección de retirarla de informe numero 1

4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.

R/ Se adjuntaron los soportes de entrega de EPP pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra , los que no se presentaron no se adjunta soportes.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

9. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

10. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza su respectiva corrección.

11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

12. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

13. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó Vehículos por que la actividad no lo requiere.

14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO REINO HOLANDA**

1. Tabla de personal: Relacionan 6 personas. Los señores Juan Carlos Campos y Brayan Alexis Lopera, fueron autorizados para ingreso el día 21 de febrero, por el cual, no aplican dentro del periodo del presente informe. Según lo aprobado por nosotros, no relacionan los siguientes trabajadores:

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores, con fechas que no coinciden con el periodo del presente informe.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

3. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

4. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

5. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

6. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

7. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

9. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

10. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

11. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

12. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó Vehículos por que la actividad no lo requiere.

13. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

14. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

15. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO DIANA TURBAY**

1. Inducciones: solo dieron inducción a 3 trabajadores. Falta la inducción de 4 trabajadores. Brayan Andrés Marin, Angela Tarazona, Valentina Osorio, Luis Miguel Castaño.

R/Se adjuntaron las inducciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra , los que no se presentaron no se adjunta soportes.

2. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/Se realizó su respectiva corrección de retirarla de informe numero 1

3. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

4. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

5. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

6. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

7. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente se adjunta información solicitada.

8. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

9. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

10. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente se adjunta información solicitada.

11. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

12. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO RESTREPO MILAN**

1. El personal reportado según el informe, son 4 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.

R/Se adjuntó a información solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra, todavía la actividad no lo requiere.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Anderson Mauricio Galindo Lozano y Luis Fernando Londoño. Faltan los soportes de inducciones de: YESENIA ARENAS, ANGELA TARAZONA, FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.

R/Se adjuntaron las inducciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes.

3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo áreas de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla y según en la observación del punto 1 y 2.

R/Se adjuntaron entrega de Epp pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

10. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

11. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soporte.

14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO JOSE MARTI**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían ocho trabajadores por relacionar: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO. El señor Jairo Sánchez, ingresó a partir del día 21/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se está presentando el informe.

   R/Se adjuntó a información solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra, todavía la actividad no lo requiere, se realiza corrección de lo solicitado.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Faltan los soportes de inducciones de: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO.

   R/Se adjuntó inducciones solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra.

3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo área de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

   R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

4. Entrega EPP: solo adjuntaron soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.

   R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

   R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

   R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

   R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

10. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

11. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO SAN AGUSTIN**

1. El personal reportado según el informe, son 6 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: NEIDER ANTONIO POLO DE LA HOZ, GLORIA ESTHER ALVAREZ OSORIO, JHONATAN LONDOÑO QUIÑONEZ, GINA KATERINE CASAS CASTILLO, VALENTINA OSORIO CRISTANCHO CARDENAS SAENZ, ROMAN ELIAS CONDE. El señor Johan Estiven Rozo, ingresó a partir del día 20/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se esta presentando el informe.

R/Se adjuntó a información solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra, todavía la actividad no lo requiere, se realiza corrección de lo solicitado.

2. Inducciones: No presentaron soportes de inducciones

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

3. Capacitaciones: No presentan soportes de capacitaciones.

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

4. Entrega EPP: No presentaron soportes de entrega de EPP

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

   R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. No presentan soportes de ATS

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

7. No presentan soportes de inspecciones.

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

8. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

   R/: En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

9. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

   R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

10. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

    R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

    R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

12. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

    R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

13. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

Agradecemos la atención y gestión pertinente.

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe SST Listado de personal Soportes (RAR)
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

INFORME No 1

GESTIÓN SG-SST

CONTRATO No. CO1-PCCNTR 4077645
PERIODO DEL 20 DE ENERO DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023

Consorcio Mia GP
NIT :901634703-9
Contrato de obra -CO1-PCCNTR 4077645

Bogotá, D.C., Colombia
CONTRATO No.
Contrato de obra
CO1-PCCNTR 4077645

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO……..2

1.INTRODUCCION……4
2. OBJETIVOS……5
3. TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA 6
4 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA…… 6
5 LISTADO DE VEHICULOS ……..6
6. REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD……6-7
7. CERTIFICACIONES DE PARAFISCALES……..,,,.7
8. CUADRO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN PSST…… …..7-11
9. LISTA DE ANEXOS……12

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 01. TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA

ANEXO 02. SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 03. INDUCCIONES

ANEXO 04. CHARLAS Y CAPACITACIONES

ANEXO 05. ENTREGA EPP

ANEXO 06. INSPECCIONES

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

1.INTRODUCCION

En el presente informe tiene plasmado las actividades que se ejecutaron por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST durante el periodo del 20 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023, donde se evidencian todas las actividades de SST ejecutadas en las obras de los colegios Enrique Olaya, Reino de Holanda, Diana Turbay, Restrepo Millán, José Martí San Agustín.

Por parte del área SST se realizó las siguientes actividades: solicitud de documentación del personal que va a ingresar nuevo, Cedula de ciudadanía, EPS, FONDO DE PENSION, ARL, se realizan inducciones al personal, Entrega de Epp, charlas diarias de seguridad y capacitación de acuerdo al SGSST, delimitaciones y señalización de áreas con poli sombra, actividades de orden y aseo, Inspecciones de herramienta menor.

2. OBJETIVOS

- Realizar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obra para la reducción de incidencia en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales posiblemente presentados durante la ejecución del proyecto.

- Aplicar, supervisar y verificar los sistemas de control de factores de riesgos ocupacionales en la fuente, en el medio ambiente la necesidad de suministrar elementos de los elementos de protección personal (EPP) y equipos de protección contra caídas.

- Realizar actividades de prevención que mejoren las condiciones salud y trabajo para los empleados vinculados.

3.TABLA DE CONTROL DE PERSONAL REPORTADO EN OBRA.

Para el periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023 se presenta tabla en Excel con el reporte y movimiento del personal que realizo actividades en los colegios de la localidad Rafael Uribe. Ver Anexo Tabla de Control del personal.

4.LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Durante el periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023 no se utilizaron maquinaria ni equipos por que las obras estaban en actividades de Diagnostico, demolición de pisos, desmonte de ventaneria.

5.LISTADO DE VEHICULOS.

Durante el periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023 no se utilizaron vehículos por que las obras estaban en actividades de Diagnostico, demolición de pisos, desmonte de ventaneria.

6. INDICADORES DE SST

Para el periodo de gestión del 20 enero al 19 de febrero del 2023, se presentan los siguientes indicadores SST.

- Número de afiliaciones para el periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023.

5	Total, trabajadores que ingresaron (19) X100 Total, de trabajadores afiliados (19)	100%

- Número de ingresos de personal para el periodo de gestión 20 enero al 19 de febrero del 2023

1	N.º de inducciones (19) X100 N.º de ingresos (19)	100%

- Número de charlas de seguridad ejecutadas para el periodo de gestión 20 enero al 19 de febrero del 2023

4	Capacitaciones Programadas (3) X100 Capacitaciones Ejecutadas (3)	100%

- Número de accidentes reportados para el periodo de gestión del 20 enero al 19 de febrero del 2023

3	N.º de accidentes reportados (0) X10 0 N.º de accidentes presentados (0)	100%

- Número de investigaciones de accidentes laborales para el periodo de gestión del 20 enero al 19 de febrero del 2023

7	Total, de AT investigados (0) X100 Total, accidentes ocurridos en el periodo (0)	100%

7. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

Registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.

Durante el periodo de gestión del 20 enero al 19 de febrero del 2023 no se presentaron incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

Durante el periodo de gestión del 20 enero al 19 de febrero del 2023 no se presentaron Investigación de incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

Durante el periodo de gestión del 20 enero al 19 de febrero del 2023 no se presentaron planes de acción de incidentes y accidentes de trabajo en las obras de los colegios de la localidad Rafael Uribe.

8. CERTIFICACION DE PARAFISCALES.

Durante el periodo de gestión del 20 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023, se verifican y se adjuntan las respectivas planillas de seguridad social de todo el personal activo vinculado a obra.

9 ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES DEL PSST.

Dando cumplimiento al cronograma de actividades presentado al inicio del proyecto, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante este periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023

9.1. INDUCCIONES

Durante el periodo de gestión del 20 al 19 de febrero del 2023 se aplicaron las inducciones a los

trabajadores que ingresaron (19) en las cuales se desarrollaron los siguientes temas:

- Inducción General de la empresa
- Horarios de trabajo
- Normas de la empresa
- Política integral del Sistema de Gestión de, Salud en el trabajo. Seguridad y Medio ambiente.
- Que hacer en caso d un accidente de trabajo.
- Que hacer en caso de una enfermedad laboral.
- Sistema de Gestión de Salud en el trabajo Seguridad y Medio Ambiente
- Riesgos a los que están expuestos.
- Elementos de protección personal
- Funciones, responsabilidades y competencias en SST
- Funcionamiento de las Brigadas de Emergencia y tipos de emergencias.
- Que hacer en caso de una emergencia.

Se adjuntan los respectivos formatos debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores.

NOMBRES APELLIDO	CEDULA	COLEGIO	CARGO
Luis Miguel Castaño	1053816598	Enrique Olaya	Ingeniero Residente de Obra
Valentina Osorio	10949444045	Enrique Olaya	Inspector de Obra
Angela Tarazona	60448725	Enrique Olaya	Inspector de SST
Jose Elias Michelly	19490651	Enrique Olaya	Maestro de Obra
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Diana Turbay	Ayudante de Obra
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Diana Turbay	Ayudante de Obra
Yesenia Arenas	1049638441	Restrepo Millan	Inspector de Obra
Fabio Toro	3082270	Restrepo Millan	Maestro de Obra
Luis Fernando Londoño	10058843089	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Restrepo Millan	Ayudante de Obra
John Benal	7956608	Jose Martin	Maestro de Obra
Yeison Manuel Romero	10681368777	Jose Martin	Ayudante de Obra
Jonathan Londoño Quiñonez	80111297	Jose Martin	Ayudante de Obra
Juan Camilo	1049638441	San Agustin	Inspector de Obra
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	San Agustin	Instaladores
Edagar Moreno Reyes	1005195748	San Agustin	Instaladores
Frannkyn Roosevelth mendex	1024484580	San Agustin	Instaladores
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	San Agustin	Instaladores
Gina Kterine Casas	1069754573	San Agustin	Inspector SST

9.2. CAPACITACIONES Y CHARLAS

Durante este periodo de gestión del 20 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023 se realizaron las siguientes charlas de seguridad y salud en el trabajo las cuales se relacionan a continuación, se hacen con el fin de dar a conocer la importancia del autocuidado y las condiciones inseguras que se podrían presentar al no trabajar correctamente, esta documentación es evidenciada en la carpeta de Capacitaciones y charlas.

FECHA	TEMA	COLEGIO
16/2/2023	Uso correcto de los EPP	José Martin
17/2/2023	Uso correcto de los EPP	San Agustín
17/2/2023	Uso correcto de los EPP	Restrepo Millán
17/2/2023	Uso correcto de los EPP	Diana Turbay



Fotografía



Fotografía

9.3. ENTREGA DE EPP

Durante el periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023 a todo el personal que ingresó al proyecto, se le proporcionaron elementos de protección personal para el desarrollo adecuado de sus actividades, los cuales se relacionan en los formatos de entrega de EPP debidamente diligenciados y firmados por los trabajadores, esta documentación es evidenciada en la carpeta de entrega de EPP.

	
Fotografía	Fotografía

9.4. INSPECCIONES

Durante el periodo de gestión del 20 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023 se realizaron las respectivas inspecciones de herramienta menor que se utilizó en las obras. esta documentación es evidenciada en la carpeta de Inspecciones.

FECHA	TEMA	COLEGIO
17/2/2023 al 18/2/2023	Inspección de herramienta menor	José Martin
16/2/2023 al 18/2/2023	Inspección de herramienta menor	San Agustín
17/2/2023 al 18/2/2023	Inspección de herramienta menor	Restrepo Millán
17/2/2023 al 18/2/2023	Inspección de herramienta menor	Diana Turbay

9.5. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Durante el periodo de gestión del 20 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023 no se realizaron análisis de trabajo seguro porque solo se hicieron actividades de Diagnostico de obra, demolición de pisos ,retiro de ventaneria.

9.6. PERMISOS DE TRABAJO

Durante el periodo de gestión del 20 de enero del 2023 al 19 de febrero del 2023 no se realizaron permiso de trabajo seguro porque solo se hicieron actividades de Diagnostico de obra, demolición de pisos, retiro de ventaneria.

9.7. CONFORMACION DE COPASST Y ASIGNACION DE BRIGADISTAS

Se encuentra en proceso de conformación.

9.8. SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS TE TRABAJO

Durante el periodo de gestión del 20 de enero al 19 de febrero del 2023 se realizaron las siguientes señalización y delimitación de áreas de trabajo.

	
Fotografía	Fotografía

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya

conocidos y mencionados con anterioridad, se concluye que se cumplió con los requisitos y planes de mejoras dadas por interventoría, aplicándose en el proyecto para cumplir con las normativas vigentes expedidas por ministerio de trabajo.

De igual manera, se reconoce el esfuerzo realizado por parte de todas las áreas y contratistas que hacen parte del proyecto con el área de SST para el fomento de una cultura de autocuidado en pro de promover procesos seguros durante la ejecución de la obra.

ITEM	NOMBRES APELLIDO	CEDULA	COLEGIO	CARGO	FRENTES
1	Luis Miguel Castaño	1053816598	Enrique Olaya	Ingeniero Residente de Obra	1
2	Valentina Osorio	10949444045	Enrique Olaya	Inspector de Obra	1
3	Angela Tarazona	60448725	Enrique Olaya	Inspector de SST	1
4	Jose Elias Michelly	19490651	Enrique Olaya	Maestro de Obra	1
5	Luis Miguel Castaño	1053816598	Reino de Holanda	Ingeniero Residente de Obra	
6	Valentina Osorio	10949444045	Reino de Holanda	Inspector de Obra	
7	Angela Tarazona	60448725	Reino de Holanda	Inspector de SST	
8	Jose Elias Michelly	19490651	Reino de Holanda	Maestro de Obra	
11	Valentina Osorio	10949444045	Diana Turbay	Inspector de Obra	
12	Angela Tarazona	60448725	Diana Turbay	Inspector de SST	
13	Jose Elias Michelly	19490651	Diana Turbay	Maestro de Obra	
14	Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Diana Turbay	Ayudante de Obra	1
15	Neudo Jose Gonzalez	22095569	Diana Turbay	Ayudante de Obra	1
16	Carlos Cujia	1065577261	Restrepo Millan	Ingeniero Residente de Obra	
17	Yesenia Arenas	1049638441	Restrepo Millan	Inspector de Obra	1
18	Fabio Toro	3082270	Restrepo Millan	Maestro de Obra	1
19	Angela Tarazona	60448725	Restrepo Millan	Inspector de SST	
20	Luis Fernando Londoño	10058843089	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
21	Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Restrepo Millan	Ayudante de Obra	1
22	Carlos Cujia	1065577261	Jose Martin	Ingeniero Residente de Obra	
23	Yesenia Arenas	1049638441	Jose Martin	Inspector de Obra	
24	Angela Tarazona	60448725	Jose Martin	Inspector de SST	
25	John Benal	7956608	Jose Martin	Maestro de Obra	1
26	Yeison Manuel Romero	10681368777	Jose Martin	Ayudante de Obra	1
27	Jonathan Londoño Quiñonez	80111297	Jose Martin	Ayudante de Obra	1
28	Carlos Cujia	1065577261	San Agustin	Ingeniero Residente de Obra	
29	Juan Camilo Cristancho	1049638441	San Agustin	Inspector de Obra	1
30	Fabio Toro	3082270	San Agustin	Maestro de Obra	
31	Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	San Agustin	Instaladores	1
32	Edagar Moreno Reyes	1005195748	San Agustin	Instaladores	1
33	Frannkyn Roosevelth mendex	1024484580	San Agustin	Instaladores	1
34	Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	San Agustin	Instaladores	1
35	Gina Kterine Casas	1069754573	San Agustin	Inspector SST	1

Nota 1: El personal con numero 1 es el que se presenta para un solo frene de trabajo
Nota 2: El personal en amarillo son los que trabajaron en varios frentes de trabajo

PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																														
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																											
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra																											
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra																											
Angela Tarazona	60448725	SST																											
CONSORCIO MIA GP		OBRA																											
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra																											
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																													

PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																														
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																											
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra																											
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra																											
Angela Tarazona	60448725	SST																											
CONSORCIO MIA GP		OBRA																											
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra																											
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																													

PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																													
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																											
Luis Miguel Castaño	1053816598	Residente de obra de obra																									x	x	x
Valentina Osorio	10949444045	Inspector de obra																									x	x	x
Angela Tarazona	60448725	SST																									x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																											
Jose Elias Michelly	19490651	Maestro de obra																									x	x	x
Brayan Andres Marin Salsas	1023967015	Ayudante de Obra																									x	x	x
Neudo Jose Gonzalez	22095569	Ayudante de Obra																									x	x	x
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																													

PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																													
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																											
Carlos Cujia	1065577261	Residente de obra de obra																									x	x	x
Yesenia Arenas	1049638441	Inspector de obra																									x	x	x
Angela Tarazona	60448725	SST																									x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																											
Fabio Toro	3082270	Maestro de obra																									x	x	x
Luis Fernando Londoño Ruiz	10058843089	Ayudante de Obra																									x	x	x
Anderson Mauricio Galindo	1022958502	Ayudante de Obra																									x	x	x
EN COLOR SE MARCA LA ETAPA DE DIAGNOSTICO - CON LA X SE MARCA LA EJECUCION EN OBRA																													

PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																													
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																											
Carlos Cujia	1065577261	Residente de obra de obra																									x	x	x
Yesenia Arenas	1049638441	Inspector de obra																									x	x	x
Angela Tarazona	60448725	SST																									x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																											
John Benal	7956608	Maestro de obra																									x	x	x
Yeison Manuel Romero	10681368777	Ayudante de Obra																									x	x	x
Jonathan Londoño Quiñonez	80111297	Ayudante de Obra																									x	x	x
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																													

PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																														
Nombre	**Cedula**	**Cargo**	19	20	21	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
CONSORCIO MIA GP		ADMINISTRATIVOS																												
Carlos Cujia	1065577261	Residente de obra de obra																									x	x	x
Juan Camilo Cristancho Bohada	1018843507	Inspector de obra																									x	x	x
Angela Tarazona	60448725	SST																									x	x	x
CONSORCIO MIA GP		OBRA																												
Cristian Camilo Uribe Valbuena	1069724034	Instalador																									x	x	x
Edgar Moreno Reyes	1005195748	Instalador																									x	x	x
Frannkyn Roosevelth mendez	1024484580	Instalador																									x	x	x
Johan Estiven Rozo Leyton	1233692117	Instalador																									x	x	x
Gina Kterine Casas	1069754573	Inspector de obra																									x	x	x
PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2023																														

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2023

2023_RUU_MGP_073

Señores:
CONSORCIO TIG
Atn: Ing. Pamela Beltrán
Directora de interventoría
Carrera 47A No 93-41 Barrio La Castellana
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de obra No CO1.PCCNTR.4077645 de 2022 - Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Asunto: Subsanación informe mensual SST No 1

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO MIA GP realiza la subsanación del informe mensual SST No 1 correspondiente al periodo del 20 de enero de 2023 al 19 de febrero de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ **COLEGIO ENRIQUE OLAYA**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían dos trabajadores por relacionar: LEYDER JOSE VIZCANIO Y WILMER FABIAN RIOS.

R/: Los Trabajadores en mención no se presentaron a realizar las actividades en la obra.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Jose Elías Michelly y Manuel Antonio Cardenas. La del señor Manuel fue realizada el 21 de febrero, fecha por fuera del periodo que se está presentando este informe. Faltan los soportes de inducciones de: Luis Miguel Castaño, Valentina Osorio, Angela Tarazona, Leyder Jose Vizcanio y Wilmer Fabian Rios.

R/: Se adjuntaron las inducciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra , los que no se presentaron no se adjunta soportes.

3. Capacitaciones: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se esta presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/Se realizó su respectiva corrección de retirarla de informe numero 1

4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.

R/ Se adjuntaron los soportes de entrega de EPP pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra , los que no se presentaron no se adjunta soportes.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

9. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

10. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza su respectiva corrección.

11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

12. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

13. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó Vehículos por que la actividad no lo requiere.

14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO REINO HOLANDA**

1. Tabla de personal: Relacionan 6 personas. Los señores Juan Carlos Campos y Brayan Alexis Lopera, fueron autorizados para ingreso el día 21 de febrero, por el cual, no aplican dentro del periodo del presente informe. Según lo aprobado por nosotros, no relacionan los siguientes trabajadores:

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores, con fechas que no coinciden con el periodo del presente informe.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

3. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

4. En el soporte de inspecciones, adjuntaron inspección realizada del 20 al 26 de febrero; el presente informe es de20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

5. El ATS presentado es con fecha del 20 al 26 de febrero. El informe es del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

6. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

7. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

9. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

10. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

11. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

12. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó Vehículos por que la actividad no lo requiere.

13. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

14. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

15. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO DIANA TURBAY**

1. Inducciones: solo dieron inducción a 3 trabajadores. Falta la inducción de 4 trabajadores. Brayan Andrés Marin, Angela Tarazona, Valentina Osorio, Luis Miguel Castaño.

R/Se adjuntaron las inducciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra , los que no se presentaron no se adjunta soportes.

2. CHARLA DE SEGURIDAD: Tema uso correcto de EPP. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/Se realizó su respectiva corrección de retirarla de informe numero 1

3. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

4. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

5. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

6. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

7. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente se adjunta información solicitada.

8. Falta listado de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

9. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

10. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente se adjunta información solicitada.

11. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

12. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO RESTREPO MILAN**

1. El personal reportado según el informe, son 4 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.

R/Se adjuntó a información solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra, todavía la actividad no lo requiere.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Anderson Mauricio Galindo Lozano y Luis Fernando Londoño. Faltan los soportes de inducciones de: YESENIA ARENAS, ANGELA TARAZONA, FABIO ALEXANDER TORO RAMOS, JOSE YURY CUBILLOS LOPEZ, JOHN ANDERSON SUAREZ VARGAS, JEAN GONZALEZ MERCADO, YENDRIS ALBERTO YEPEZ SILVA, CARLOS ANTONIO TORRRES.

R/Se adjuntaron las inducciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes.

3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo áreas de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

4. Entrega EPP: solo adjuntaron dos soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla y según en la observación del punto 1 y 2.

R/Se adjuntaron entrega de Epp pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

10. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

11. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soporte.

14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO JOSE MARTI**

1. El personal reportado según el informe, son 5 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían ocho trabajadores por relacionar: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO. El señor Jairo Sánchez, ingresó a partir del día 21/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se está presentando el informe.

   R/Se adjuntó a información solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra, todavía la actividad no lo requiere, se realiza corrección de lo solicitado.

2. Inducciones: solo dieron inducción a 2 trabajadores: Faltan los soportes de inducciones de: LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BONILLA, DANIEL MARIA CARVAJAL, LUIS OMAR ZAMUDIO CHACON, NICOLAS SUAREZ PAEZ, LUIS FERLEY CRUS REYES, GYVER ROMAN PEÑA, JHON ALEXANDER BERNAL VARGAS, EFRAIN PEÑA PRIETO.

   R/Se adjuntó inducciones solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra.

3. Capacitaciones: Tema Orden y aseo área de trabajo. Esta fecha de capacitación esta por fuera del periodo que se está presentando. Del 20 de enero al 19 de febrero.

   R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

4. Entrega EPP: solo adjuntaron soportes de entrega de EPP. Falta soporte del resto del personal de ingreso que relacionaron en la tabla.

   R/ En el presente ítem se realiza corrección solicitada.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

   R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

   R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

7. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

   R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

8. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

R/ En el presente ítem no se soporta porque no tiene anexos.

9. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

10. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

11. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

12. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

13. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

14. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

✓ **COLEGIO SAN AGUSTIN**

1. El personal reportado según el informe, son 6 trabajadores. Según lo aprobado por parte de nosotros, faltarían siete trabajadores por relacionar: NEIDER ANTONIO POLO DE LA HOZ, GLORIA ESTHER ALVAREZ OSORIO, JHONATAN LONDOÑO QUIÑONEZ, GINA KATERINE CASAS CASTILLO, VALENTINA OSORIO CRISTANCHO CARDENAS SAENZ, ROMAN ELIAS CONDE. El señor Johan Estiven Rozo, ingresó a partir del día 20/02/2023, por lo anterior, no entra dentro del periodo que se esta presentando el informe.

R/Se adjuntó a información solamente del personal que realizo ingreso a obra, el que no esta es porque no ingreso a obra, todavía la actividad no lo requiere, se realiza corrección de lo solicitado.

2. Inducciones: No presentaron soportes de inducciones

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

3. Capacitaciones: No presentan soportes de capacitaciones.

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

4. Entrega EPP: No presentaron soportes de entrega de EPP

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

5. Seguridad social: no adjuntaron afiliaciones a seguridad social. Ojo: en la redacción manifiestan frente Sede Sena Villavicencio.

   R/ Se adjuntaron los soportes de afiliaciones pendientes de los trabajadores que realizaron ingreso a la obra, los que no se presentaron no se adjunta soportes, se corrige redacción en párrafo.

6. No presentan soportes de ATS

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

7. No presentan soportes de inspecciones.

   R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

8. En el ítem ASIGNACION DE VIGIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, no adjunta ningún anexo.

   R/: En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

9. En el ítem ASIGNACION DE BRIGADISTAS, no adjunta ningún anexo.

   R/ En presente ítem no se soporta porque se encuentra en conformación para este periodo de informe.

10. En el ítem INDICES DE SGSST, no anexan indicadores.

    R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

11. Se recomienda una tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.

    R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

12. Falta listada de maquinaria y equipos utilizado durante todo el contrato.

    R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó maquinaria y equipos por que la actividad no lo requiere.

13. Listado de vehículos

R/ En el presente ítem no se adjunta información porque no se utilizó vehículos por que la actividad no lo requiere.

14. Falta reporte de las actividades y estadística de accidentalidad

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

15. Falta certificación del representante legal o del revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios del contratista y subcontratista.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

16. Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista en el periodo del 20 de enero al 19 de Febrero.

R/ En el presente ítem se adjunta información solicitada.

Agradecemos la atención y gestión pertinente.

Mateo Luzardo V.

MATEO LUZARDO VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MIA GP

Anexo	Informe SST Listado de personal Soportes (RAR)
Copia 1	Supervisor del contrato – Arq. Alexander Osorio
Copia 2	Apoyo a la supervisión – Arq. Hugo Tibaquirá
