Bogotá noviembre 27 de 2023

Señores:
Jefatura de Seguridad
Fuerza Aérea Colombiana
My. Nilson Cuellar
Ciudad.

Asunto: **Solicitud de 2 Prórroga Contrato 078-00-A-COFAC-CEGOT-2023**

Respetado señor;

Yo MARIA ANDREA LOSADA MEDINA identificada con cedula de ciudadanía No. 52.78.348 de Bogotá actuando en calidad de Representante Legal de la Empresa A&A INGENIERIA S.A.S con Nit. No. 900.650.723-1 solicito a esta Entidad la prórroga del Contrato **078-00-A-COFAC-CEGOT-2023** cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE DETECTORES DE MOVIMIENTO TERRESTRE, COMO MEDIDAS ACTIVAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, este contrato estaba inicialmente con una fecha de finalización para el día 31 de octubre de 2023, se solicitó una prórroga el día 28 de octubre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2023 por los inconvenientes presentados con los permisos de importación por parte del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, los quipos llegaron a Colombia el día 17 de noviembre de 2023 como se evidencia en el manifiesto de importación pero por los problemas que se están presentando en la actualidad con la DIAN a Nivel Nacional con la actualización del software de nacionalización e importación no ha sido posible que esta Entidad nos haya realizado la entrega de los equipos faltantes, este proceso que no tardaba más de 05 días nos ha retrasado por más de quince días informando que en el trascurso de eta semana serán liberados y entregados a nosotros para proceder con la instalación y puesta en servicio.


La ejecución de este contrato a la fecha de hoy está en un porcentaje de ejecución del 80% ya que realizamos la instalación y puesta en servicio de los paneles, gabinetes, baterías, sistemas puesta a tierra, radio enlaces y cámaras ptz






PANELES SOLARES E INVERSORES Y CONTROLADORES

Carrera 39 a No. 2-15 Piso 1 Bogotá ayaingenieriasas@gmail.com, gerencia@ayaing.com, Tel:7028483, Cel: 321 376 94 37

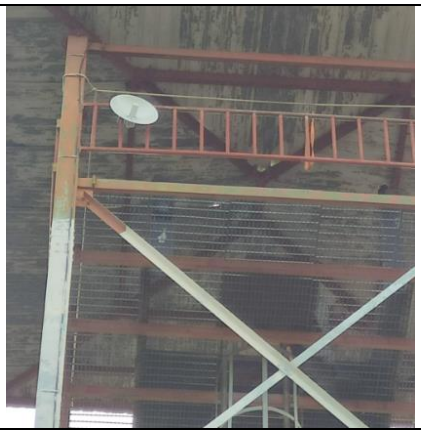

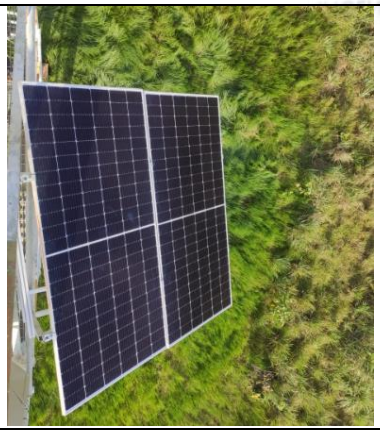


RADIO ENLACES Y PANEL SOLAR





CAMARAS PTZ Y VISUALIAZACION



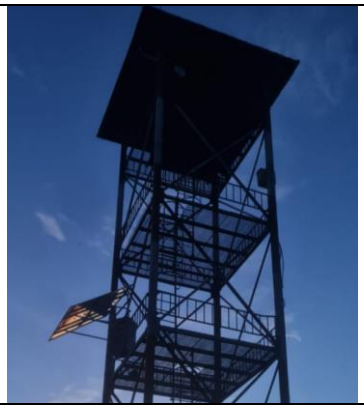

GABINETES Y PANELES SOLARES





CAMARAS PTZ




BATERIAS Y GABINETES

Como se evidencia en el registro fotográfico los equipos ya están instalados y en operación lo único equipos que faltan por instalar son los detectores de movimiento lo cual duraría un tiempo de instalación y programación no mayor de 03 días, teniendo los equipos en sitio lo cual debemos tener en cuenta disposición de vuelos de apoyo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana.

Como lo mencionamos con anterioridad es un caso fortuito ya que el retrasó que se está presentando para la ejecución proviene de una Entidad que no depende de nosotros sino directamente del Estado en este caso la DIAN, es por eso que solicitamos a esta Entidad la prórroga de este contrato hasta el día 15 de diciembre de 2023 siendo la fecha máxima para la entrega final de este proyecto.

Prueba de ello envió lo informado por el representante la marca en Colombia con comunicado enviado el 24 de noviembre de 2023 y demás documentos donde pueden validar la información presentada anteriormente.

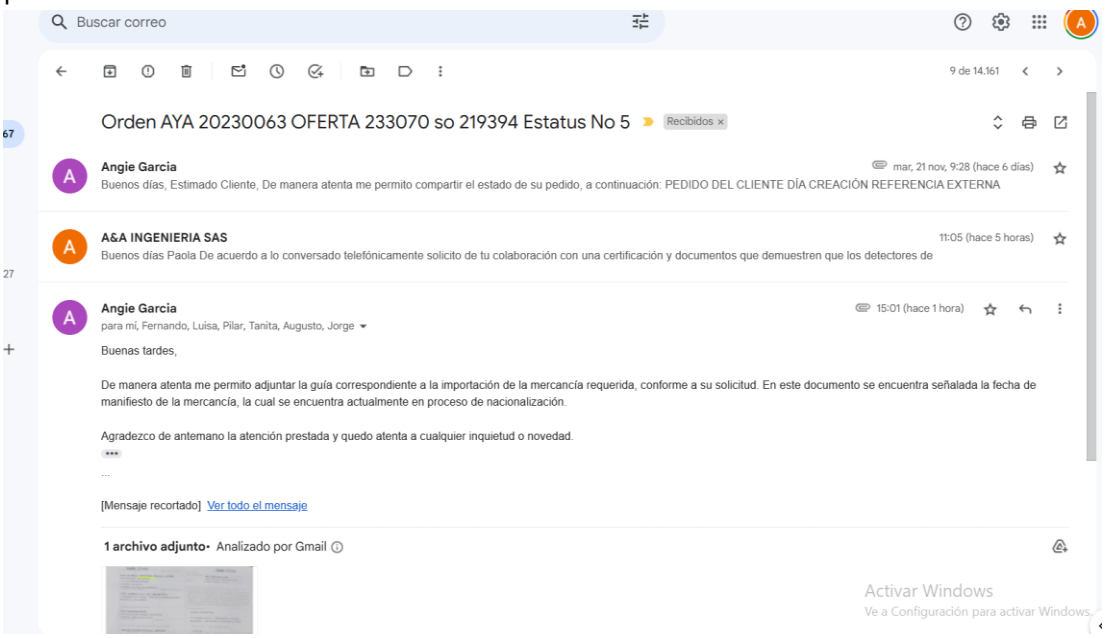

Bogotá, Noviembre 23 de 2023

Estimado Cliente

Por medio del presente le informamos, que por el momento ISTC ANDINA S.AS presenta retrasos en la entrega de su mercancía, dado a que el sistema de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se encuentra intermitente afectando el proceso de importaciones. Esto debido a una actualización de Software que esta realizando esta entidad y hasta el momento está presentando fallas.

Por el momento se desconoce cuánto tiempo pueda tardar el restablecimiento del sistema, por lo que agradecemos su comprensión dado que esta situación es ajena a la operación de ISTC Andina, ofrecemos disculpas por los inconvenientes que se puedan generar y le estaremos informando avances del proceso.

Cordial saludo;

PILAR RAMOS ALDANA
Gerente de Operaciones

Anexo: Comunicado DIAN.

Comunicado de Prensa

DIAN

No. 079

Por fallas tecnológicas,

LA DIAN TRABAJA PARA REESTABLECER EL SERVICIO SYGA

Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 2023

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- informa que, de conformidad con la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, declara contingencia en el servicio digital SYGA a partir de las 10:57 a.m. de hoy, hasta que se reestablezca el servicio.

La entidad también informa que los únicos autorizados para pronunciarse sobre este incidente son el director general y la directora de Gestión de Aduanas. Agradecemos hacer caso omiso a cualquier otro tipo de información proveniente de fuentes que no están designadas y por lo tanto no se consideran oficiales en este momento.

El equipo de atención de respuesta a incidentes, en la DIAN, ha desplegado las actividades encaminadas a la contención, erradicación de vulnerabilidades y recuperación de los servicios para garantizar la atención a nuestros usuarios.

La autoridad tributaria, aduanera y cambiaria se ha trazado el reto de ser una entidad innovadora y moderna, que sea referente en el uso de la analítica de datos en sus procesos para hacer más eficiente su gestión y la lucha contra fenómenos como la evasión y el contrabando.

(FIN).

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Hacienda

HAWB-37685

HID GLOBAL / SPOTTER / NEXSAN / KIDDE
DETRONICS / BUILDING
611 CENTER RIDGE DR,
AUSTIN, TX 78753
UNITED STATES OF AMERICA

ISTC ANDINA S.A.S. NIT: 900.308.795-5,
CARRERA 49 # 103-60 / DEPOSITO REPREMUNDO 1
BOGOTA, COLOMBIA

ZIX CORPORATION
2355 SALZEDO STREET, SUITE 205,
CORAL GABLES, FL 33134

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

BOG ATLAS

BOGOTA

HAWB-37685

Air Waybill

ZIX CORPORATION
2355 SALZEDO STREET, SUITE 205
CORAL GABLES, 33134,

MAWB 369-88071082

***/ KIDDE 9193575 / DETRONICS 23012451 /
BUILDING : 2093242946, 11152045404, 5777890

23-61161

USD X X NVD NVD

070 17 NOV 2023 NIL

NO DANGEROUS GOODS - PLEASE NOTIFY CONSIGNEE UPON ARRIVAL - NOT RESTRICTED -

COLOMBIA

1	154 339	K L	220 486	0.67	147.40	STC:EQUIPOS PARTES Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD, CCTV, ALARMA, SEGURIDAD PERIMETRAL, CONTROL INCENDIOS, ETHERNET, VIDEO, AUDIO, CONTROL ACCESO, INTRUSION, COMUNICACIONES, SISTEMAS DE RASTREO, PARKING, LICENCIAS, CPU SFF, NVR, TECLADO DE VIGILANCIA DE ESCRITORIO,KIT DE RIELES DESLIZANTES P

ARA MONTAJE EN RACK, CONECTOR/ INYECTOR POE, INTERFAZ DE PANTALLA, PUENTE MULTIPROTOCOLO BACNET, SOPORTES, DETECTOR DE HUMO, INFRARROJO, INTERRUPTOR / SENSORES DE PRESIÓN, MONITOR, SENSOR, CÁMARAS, ACCESORIOS Y SOPORTES, SIRENAS CONMUTADOR. INVOICE HID GLOBAL: 11152045537,11152045553 / SPOTTER INV/2023/0399 / NEXSAN: INVS85055 ***

1 154 K 147.40

[redacted]

0.00 MIAMI HANDLING - 65.00 , PACKING - 45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

manifiesto llegada

INTERLATE

11/16/2023 MIAMI LORENA RODRIGUEZ

HAWB-37685

NIT. 900650723-1

ORDEN DE COMPRA

			ORDEN DE COMPRA
COMPRADOR:	A&A INGENIERIA S.A.S		No. 20230063
DIRECCION DE DESPACHO:	CARRERA 39 A # 2-15	TELEFONO:	7028483
		CELULAR:	3213769437

PROVEEDOR:	ISTC ANDINA	NIT:	
DIRECCION:	Carrera 49 No.103-60	CORREO:	
TELEFONO:	2560100	FAX:	
CONTACTO DE VENTAS	JORGE GOMEZ	CELULAR:	3012837503
FORMA DE PAGO:	1		

APROBACION COTIZACION SPOTTER

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SP-C40D	SPOTTER RF C40D 450M RANGE	2	$ 18,000.00	$ 36,000.00
2	ITEM NUEVO	SPMOUNT-1-PQT Mount kit	2	$ 600.00	$ 1,200.00
3	ITEM NUEVO	SP-POWER-1 Power Kit	2	$ 750.00	$ 1,500.00
4	NIO-VM-SMALL	SPOTTER NETWORKEDIO VIRTUALIZED SERVER	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00
5	NIO-LICSPOTTER	SPOTTER NETWORKEDIO SOFTWARE LICENSE	2	$ 500.00	$ 1,000.00
6	NIO-LIC-ATC	SPOTTER NETWORKEDIO SOFTWARE LICENSE	2	$ 1,200.00	$ 2,400.00
			SUBTOTAL		$45,600.00
			DESC 5% GLOB		$2,280.00
			IVA		$8,230.00
			TOTAL		$53,830.00

SON: ********CINCUENTA Y TRESMIL OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES**********

NOTA: Para el tramite de su factura debe tener presente los siguientes requisitos

2. Anexar Orde de Compra y Remision Debidamente Firmadas
3. Presentar Factura en original y copia incluyendo la informacion tributaria completa (Nombre Proveedor, Nit/CC, Direccion, TelefonoResolucion DIAN Regimen a que prestenezca, Codigo ICA si son Grandes Contribuyentes

AUTORIZACIONES

MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

Gracias y quedamos atentos a su pronta respuesta y pedimos excusas por los inconvenientes que sean presentados de ser positiva la prórroga solicitada realizaremos los cambios pertinentes en las pólizas de este proceso y asumiremos los retrasos que implique el pago de la factura.

Cordialmente



MARIA ANDREA LOSADA MEDINA
52.078.348 de Bogotá
Representante Legal
A&A INGENIERIA S.A.S
900.650.723-1
