Informe de Gestión No. 34
Contrato de Adhesión No. 6 Municipio de Yarumal
Período del 01 al 30 de septiembre del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Septiembre 30 de 2023

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 2
1 Informe Administrativo y Financiero 3
1.1 Informe Administrativo 3
1.2 Informe Financiero 3
2 Informe Jurídico 5
3 Informe Técnico 5
3.1 Informe Convocatoria 5
3.2 Informe Acreditación 6
3.3 Informe Evaluación 6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación 8
3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría 8
4 Atención al Emprendedor 11
CONCLUSIONES Y RETOS 11
ANEXOS 13

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 "*Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes*"; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: "*Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA*", del contrato de Adhesión No. 6; se presenta a continuación el informe con corte al 30 de septiembre de 2023, del contrato de adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: "*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas*".

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Yarumal, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de septiembre de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 30 de septiembre del año 2023.

1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Adhesión	06	**Entidad Adherente**	Yarumal, Antioquia
Fecha de Inicio		11/12/2020	
Duración	Desde el 11/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.		
Valor Total del Contrato		$900.000.000	
Valor Aporte SENA		$600.000.000	
Valor Aporte Aliado		$300.000.000	
Nombre de Supervisor Adhesión Fondo Emprender		Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento	
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada		Andrés Correa López	
Nombre del Contacto en Entidad Aliada		Andrés Correa López	
Cargo del Contacto en Entidad Aliada		Secretario de Educación y Cultura del municipio de Yarumal	
Número Telefónico o Celular	310 545 2337 (+57)4 8537218	**Correo Electrónico**	educacion@yarumal.gov.co
Nombre de orientador regional SENA	Santiago Vélez Muñoz	**Correo Electrónico**	svelezmu@sena.edu.co
Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia	Alirio Rodríguez	**Correo Electrónico**	alrodriguezi@unal.edu.co

Durante el período del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 6.

1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9022_SEPTIEMBRE_2023).

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

No. Convocatoria	172
Recursos SENA	$ 600.000.000
Recursos Adherente	$ 300.000.000
Total recursos de la convocatoria (a)	**$ 900.000.000**

Total recursos planes aprobados CDN (b)	**$ 898.439.781**
Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)	**$ 0**
Total recursos planes con desistimientos (d)	**$ 0**
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)	**$ 1.560.219**
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)	**$ 898.439.781**
Valor Reintegro Aliado	$ 0
Fecha de Reintegro	NA

Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Valor Trasladado a la Fiducia SENA	$ 598.959.854
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente	$ 299.479.927
Valor Trasladado a la fiducia acumulada	**$ 898.439.781**
Ejecución recursos SENA	$ 594.003.274
Ejecución recursos Adherente	$ 297.001.637
Ejecución acumulada total de recursos	**$ 891.004.911**

Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.

Banco	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No	0077-0086-9022
Saldo Total en Bancos	$ 793.923,94
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco	$ 273.849,61
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado	$ 0,00

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia al 30 de septiembre de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de $898.439.781 equivalente al 99.83% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $1.560.219.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de $891.004.911 equivalentes al 99.17% de los recursos comprometidos y 99,00% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecución de recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

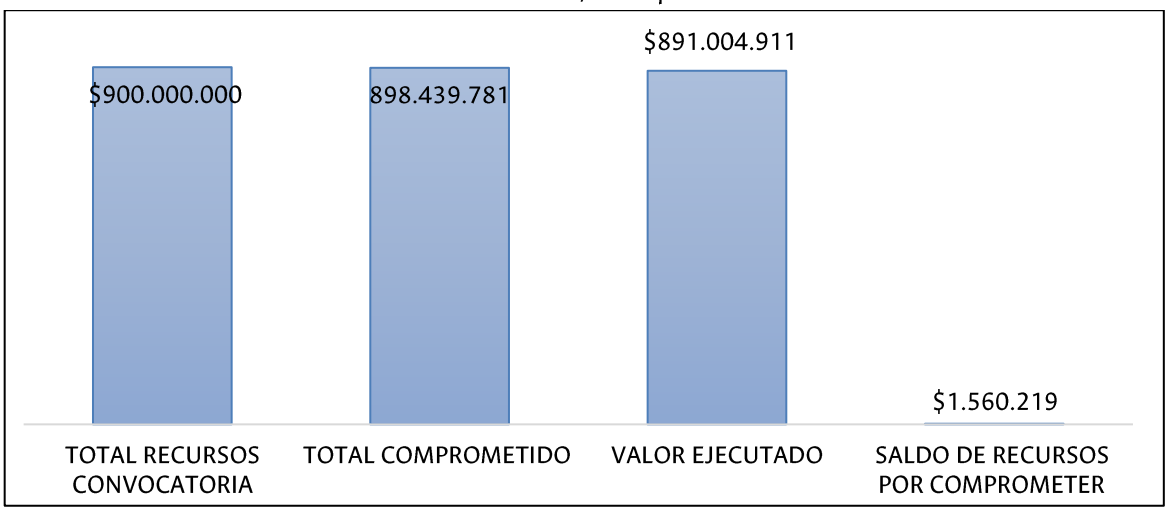

Como parte de las instrucciones dadas por la Supervisión del SENA y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la liquidación y cierre de contratos, se recuerda el procedimiento para efectuar la devolución de los dineros no asignados y/o no ejecutados dentro de la presente adhesión:

Previa solicitud por escrito por parte del ente adherente con la sustentación e información del número de cuenta a la cual se le debe girar el valor correspondiente a que haya lugar, anexando certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** elaborará el informe de ejecución financiera según el modelo establecido por el SENA y debidamente conciliado con la fiducia, el cual será enviado a la Supervisión del presente contrato de adhesión, para que emita su concepto y avale el valor a devolver. Una vez se emita el concepto definitivo sobre la solicitud de devolución por parte del supervisor del presente contrato, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** procederá a realizar el giro correspondiente en un término no mayor a 60 días.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en parágrafo de la cláusula octava del contrato de adhesión.

2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 30 de septiembre del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídica relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en* ***contratos de adhesión*** *suscritos en el marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales"* (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 172 específica del municipio de Yarumal, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en el enlace http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1722020.aspx, se tienen las siguientes características:

Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Convocatoria	172

Fecha de Lanzamiento	11/12/2020	**Monto Máximo a Financiar por Plan**	$100.000.000
Fecha de Apertura	21/12/2020	**Fecha de Cierre**	03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1	28/02/2021	**Fecha de Cierre Corte No. 2**	03/05/2021

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditación

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el período del mes de septiembre 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Convocatoria					**172**		
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**21/12/2020**		**Fecha de Cierre**		**28/02/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	15/03/21	Número de Planes Formalizados	8	Número de Planes Acreditados	8	% de Acreditación	**100%**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/01/2021**		**Fecha de Cierre**		**03/05/2021**
Fecha de Publicación Final Acreditación	17/05/21	Número de Planes Formalizados	7	Número de Planes Acreditados	7	% de Acreditación	**100%**

3.3 Informe Evaluación

La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de septiembre de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de evaluación del primer cierre que fueron publicados en el mes de mayo de 2021, y el segundo cierre en el mes de agosto para la convocatoria No. 172 – Yarumal.

Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Número de Convocatoria			**172**				
Corte No. 1	**Fecha Apertura**		**21/12/2020**			**Fecha de Cierre**	**28/02/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	05/04/21	Número de Planes Evaluados	8	Número de Planes Viabilizados	5	% de Viabilización	**62%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	06/05/21	Fecha de Consejo Directivo	13/05/21	Número de Planes a Financiar	5	Valor Planes a Financiar	**$499.432.580**
Corte No. 2	**Fecha Apertura**		**11/01/2021**			**Fecha de Cierre**	**05/03/2021**
Fecha de Publicación Final Evaluación	08/06/21	Número de Planes Evaluados	7	Número de Planes Viabilizados	6	% de Viabilización	**85%**
Fecha Comisión Técnica de Aprobación	21/07/21	Fecha de Consejo Directivo	03/08/21	Número de Planes a Financiar	4	Valor Planes a Financiar	**$399.007.201**

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría

El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.

Para el período del 01 al 30 de septiembre de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 172, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 172.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 1C.

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	72743	297-172-2021	DE UNA!	27/08/2021	27/08/2022	$99.521.690	80,00%	112,50%	100,00%	100,00%	TERMINADO
2	73186	298-172-2021	IDEAL DISEÑO TEXTIL	30/08/2021	30/08/2022	$99.987.820	100,00%	100,00%	100,00%	96,64%	TERMINADO
3	74061	299-172-2021	CHORILLANOS	30/08/2021	30/08/2022	$99.929.170	100,00%	100,00%	100,00%	99,27%	TERMINADO
4	74093	300-172-2021	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE	7/09/2021	7/12/2022	$99.993.900	100,00%	100,00%	100,00%	96,66%	TERMINADO

5	74136	301-172-2021	BIOSOAP	6/09/2021	6/01/2023	$100.000.000	100,00%	180,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Planes de negocios segundo cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 2C

No	Id Plan de Negocios	NO. CONTRATO	Nombre Plan de Negocios	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO	CUMPLIMIENTO EMPLEOS	CUMPLIMIENTO MERCADEO	CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS	CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ESTADO
1	67312	343-172-2021	CORAZONES DE MILUU	3/11/2021	3/11/2022	$100.000.000	100,00%	140,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO
2	74101	344-172-2021	VITAL SACHA INCHI	11/11/2021	11/11/2022	$99.645.960	100,00%	171,43%	100,00%	100,00%	TERMINADO
3	74213	345-172-2021	HOFISOL	5/11/2021	5/11/2022	$99.405.374	100,00%	118,18%	100,00%	100,00%	TERMINADO
4	74647	346-172-2021	PRODUCE VERDE	4/11/2021	4/11/2022	$99.955.867	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado al SENA los informes finales de interventoría para 7 planes de negocio, se espera la emisión por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA de la resolución con la recomendación de condonación, para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 172 – Yarumal.

Tabla 10. Planes de negocio finalizados con recomendación a CDN.

No	ID Plan de Negocio	Nombre del Plan de Negocio	Estado Contractual	Entrega a SENA	Recomendación	Resolución CDN	No. de Resolución	Valor Condonado
1	67312	CORAZONES DE MILUU	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
2	72743	DE UNA!	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
3	73186	IDEAL DISEÑO TEXTIL	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
4	74061	CHORILLANOS	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
5	74101	VITAL SACHA INCHI	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
6	74213	HOFISOL	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -
7	74647	PRODUCE VERDE	TERMINADO	7/06/2023	CONDONACIÓN	0	0	$ -

Los planes terminados que aún no se han entregado están en proceso de revisión de informe consolidado para finalizar la construcción de las carpetas y hacer la entrega al SENA.

4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona el consolidado general de la convocatoria No. 172, el cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria

Tabla 11. Ficha técnica de la convocatoria 172 municipio de Yarumal, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria	
Total recursos de la convocatoria	**$ 900.000.000**
Número total de planes formalizados	15
Número total de planes acreditados	15
Número total de planes viables	11
Número de planes financiables	9
Número de planes aprobados en CDN	**9**
Total recursos aprobados en CDN	**$ 898.439.781**
Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos	0
Total recursos planes con desistimientos (-)	$ -
Planes pendientes de aprobación CDN	0
Total recursos planes pendientes de aprobación CDN	$ -
Total recursos comprometidos	$ 898.439.781
Saldo de recursos por comprometer	$ 1.560.219
Ejecución acumulada de recursos	$ 891.004.911

A continuación, se muestra el estado de avance de los planes de negocios en la puesta en marcha.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 172 - Municipio de Yarumal, Antioquia.

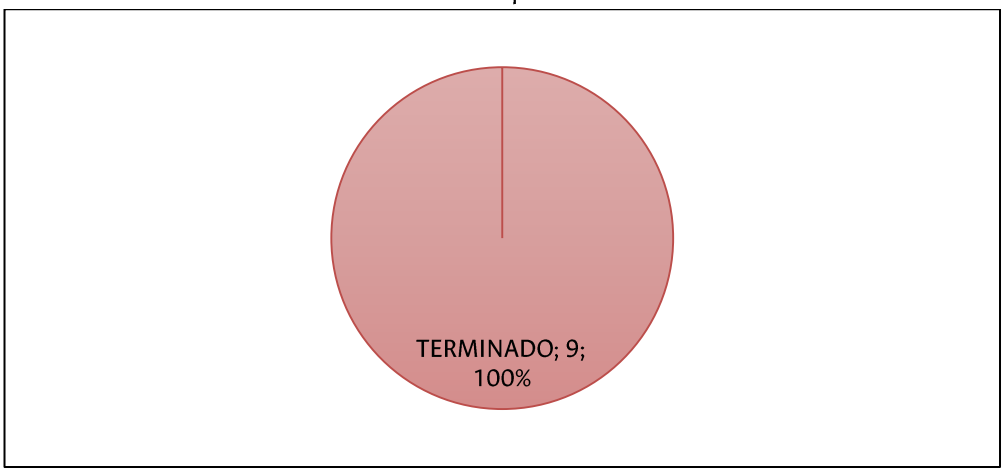

Como conclusiones generales del período del 01 al 30 de septiembre de 2023, podemos encontrar:

1. La convocatoria No. 172 tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.

2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 172 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 62% de viabilización. Los 5 planes de negocio recomendados para financiación del cierre 1 apropian recursos por valor de $499.432.580.
3. La convocatoria 172 tuvo el segundo cierre el 03/05/2021, en el cual se formalizaron 7 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 –acreditó 7 de los 7 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 viabilizó de forma definitiva 6 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 85% de viabilización. Se recomendaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 172, 4 planes de negocio por valor de $399.007.201, que apropian el 55% de los recursos disponibles de la convocatoria.
5. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 16 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (8), otras solicitudes operativas (3), agendas especiales (3) e informes y conceptos (2) para la convocatoria 172 - Yarumal, solicitudes resueltas oportunamente.
6. A la fecha la totalidad de los planes de negocio aprobados y financiados de la convocatoria 174 se encuentran terminados y presentan una ejecución acumulada de $891.004.911.
7. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma, se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
8. En lo corrido del año 2023, en el proceso de interventoría se han recibido 6 PQRS por parte de los emprendedores, distribuidos por tipología de la siguiente manera: Prórrogas (0 abiertas y 0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y 0 cerradas), Informes y conceptos (0 abiertas y 5 cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 0 cerradas), Terminación anticipada (0 abiertas y 0 cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y 1 cerradas), Reintegro (0 abiertas y 0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y 0 cerradas).
9. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 172 no se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de agosto de 2023 se tiene un acumulado de 30 pagos rechazados de los cuales el 37% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 43% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 20% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A OCTUBRE 31 DE 2023

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperación terminados asociados a la convocatoria No. 172, la interventoría continúe preparando y enviando los informes finales con la respectiva recomendación de condonación o no condonación, de acuerdo con la ejecución de los proyectos para presentar a la Comisión Técnica y aprobación por parte de Consejo Directivo Nacional - SENA.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolución de los recursos no ejecutados en la convocatoria No. 172 por valor total de $1.560.219,00 por el SENA ($1.040.146,00) y el ente adherente ($520.073,00), más rendimientos financieros generados en la

cuenta del adherente por valor de $273.849,61, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS

Anexo 1	EXTRACTO_DAV_9022_ SEPTIEMBRE_2023
Anexo 2	Ejecución por Emprendimiento
Anexo 3	Estado de avance de emprendimientos CV 172

Anexo 1_EXTRACTO_SEPTIEMBRE_2023

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9022

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 06 SENA-YARUMAL-ANTIOQUIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior	$788,917.47
Más Créditos	$5,006.47
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$793,923.94
Saldo Promedio	$788,917.47

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30 09	$ 5,006.47+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento Septiembre 30 de 2023

ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ID CONVOCATORIA	VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN	GMF APROBADO	TOTAL APORTES	VALOR BRUTO PAGADO	GMF VALOR BRUTO PAGADO	TOTAL EJECUTADO	REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS	GMF DE LOS REINTEGROS	SALDO POR EJECUTAR
72743	DE UNA!	172	$ 99.521.690,00	$ 398.086,76	$ 99.919.776,76	$ 99.519.372,00	$ 398.077,49	$ 99.917.449,49	$ -	$ -	$ 2.327,27
73186	IDEAL DISEÑO TEXTIL	172	$ 99.987.820,00	$ 399.951,28	$ 100.387.771,28	$ 96.624.384,00	$ 386.497,54	$ 97.010.881,54	$ -	$ -	$ 3.376.889,74
74061	CHORILLANOS	172	$ 99.929.170,00	$ 399.716,68	$ 100.328.886,68	$ 115.086.941,31	$ 460.347,77	$ 115.547.289,08	$ 15.882.750,00	$ 63.531,00	$ 727.878,60
74093	MIV MAQUINARIA INDUSTF	172	$ 99.993.900,00	$ 399.975,60	$ 100.393.875,60	$ 96.649.764,00	$ 386.599,06	$ 97.036.363,06	$ -	$ -	$ 3.357.512,54
74136	BIOSOAP	172	$ 100.000.000,00	$ 400.000,00	$ 100.400.000,00	$ 100.000.000,00	$ 400.000,00	$ 100.400.000,00	$ -	$ -	$ -
67312	CORAZONES DE MILUU	172-2	$ 100.000.000,00	$ 400.000,00	$ 100.400.000,00	$ 100.000.000,00	$ 400.000,00	$ 100.400.000,00	$ -	$ -	$ -
74101	VITAL SACHA INCHI	172-2	$ 99.645.960,00	$ 398.583,84	$ 100.044.543,84	$ 99.645.959,03	$ 398.583,84	$ 100.044.542,87	$ -	$ -	$ 0,97
74213	HOFISOL	172-2	$ 99.405.374,00	$ 397.621,50	$ 99.802.995,50	$ 99.405.374,00	$ 397.621,50	$ 99.802.995,50	$ -	$ -	$ 0,00
74647	PRODUCE VERDE	172-2	$ 99.955.867,00	$ 399.823,47	$ 100.355.690,47	$ 99.955.866,84	$ 399.823,47	$ 100.355.690,31	$ -	$ -	$ 0,16
TOTAL			**$ 898.439.781,00**	**$ 3.593.759,13**	**$ 902.033.540,13**	**$ 906.887.661,18**	**$ 3.627.550,64**	**$ 910.515.211,82**	**$ 15.882.750,00**	**$ 63.531,00**	**$ 7.464.609,31**

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	72743
Plan de Negocios:	DE UNA!
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	JHORMAN ALEXIS CALLE RODRIGUEZ
Cedula	1042773324
No. Contrato	297-172-2021
Valor Contrato	$99.521.690, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	DEUNA! MENSAJERIA Y LOGISTICA S.A.S.
Nit	901.513.929-7
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/27/2021
Segunda visita	12/15/2021
Tercera visita	4/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/27/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	4	80%	8	9	113%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	50	8374	19%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$134.228.232, 00	$85.083.337, 00	63,39%	$99.521.690, 00	$99.519.372, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	73186
Plan de Negocios:	IDEAL DISEÑO TEXTIL
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ROBINSON VARGAS OBANDO
Cedula	14571938
No. Contrato	298-172-2021
Valor Contrato	$99.987.820, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	IDEAL DISEÑO TEXTIL S.A.S
Nit	901.514.691-4
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/16/2021
Tercera visita	5/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
9	9	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	51	38142	119%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$462.000.000, 00	$112.466.535, 00	24,34%	$99.987.820, 00	$96.624.384, 00	96,64%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74061
Plan de Negocios:	CHORILLANOS
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ERICA YANET ZAPATA TORRES
Cedula	32559119
No. Contrato	299-172-2021
Valor Contrato	$99.929.170, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CARNICOS ARZA S.A.S
Nit	901.514.505-2
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	8/30/2021
Segunda visita	12/15/2021
Tercera visita	4/27/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	8/30/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
8	8	100%	52	101248	194%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$221.895.008, 00	$271.107.794, 00	122,18%	$99.929.170, 00	$99.204.191,310	99,27%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74093
Plan de Negocios:	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	ROBERTH JULIAN GOMEZ GUTIERREZ
Cedula	1042771682
No. Contrato	300-172-2021
Valor Contrato	$99.993.900, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE S.A.S
Nit	901.516.881-6
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio	9/7/2021
Segunda visita	12/21/2021
Tercera visita	4/29/2022
Cuarta visita	44909
Prorroga	3
Fecha finalización	12/7/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	7	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	53	1408	3%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$198.000.000, 00	$3.306.355, 00	1,67%	$99.993.900, 00	$96.649.764, 00	96,66%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74136
Plan de Negocios:	BIOSOAP
Convocatoria	172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario	VERÒNICA VÀSQUEZ AGUDELO
Cedula	1001774016
No. Contrato	301-172-2021
Valor Contrato	$100.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	BIO SOAP S.A.S
Nit	901.516.001-1
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	9/6/2021
Segunda visita	1/12/2022
Tercera visita	5/13/2022
Cuarta visita	44979
Prorroga	4
Fecha finalización	1/6/2023

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	9	180%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	54	4620	5%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$133.425.000, 00	$,000	0,0%	$100.000.000, 00	$100.000.000, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	67312
Plan de Negocios:	CORAZONES DE MILUU
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	ADRIANA PATRICIA SUÀREZ LONDOÑO
Cedula	32559426
No. Contrato	343-172-2021
Valor Contrato	$100.000.000, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	CORAZONES DE MILUU S.A.S
Nit	901.533.943-6
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/3/2021
Segunda visita	3/2/2022
Tercera visita	7/5/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/3/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	10	14	140%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	55	639	38%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$87.777.000, 00	$14.387.346, 00	16,39%	$100.000.000, 00	$100.000.000, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74101
Plan de Negocios:	VITAL SACHA INCHI
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	YANNETH DEL SOCORRO FERNÁNDEZ URIBE
Cedula	32559400
No. Contrato	344-172-2021
Valor Contrato	$99.645.960, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS FEME´ Z S.A.S
Nit	901.536.263-1
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/11/2021
Segunda visita	3/11/2022
Tercera visita	7/8/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/11/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	7	12	171%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	56	458	3%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$85.995.000, 00	$1.656.632, 00	1,93%	$99.645.960, 00	$99.645.959,030	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74213
Plan de Negocios:	HOFISOL
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	LIZETH ALBARRACÍN CORRALES
Cedula	1042770152
No. Contrato	345-172-2021
Valor Contrato	$99.405.374, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	HOFISOL S.A.S
Nit	901.535.143-1
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/5/2021
Segunda visita	3/4/2022
Tercera visita	7/7/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/5/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
5	5	100%	11	13	118%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	57	215	49%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$91.198.800, 00	$44.090.522, 00	48,35%	$99.405.374, 00	$99.405.374, 00	100%

Anexo 3. CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

INFORMACIÓN GENERAL

ID Plan:	74647
Plan de Negocios:	PRODUCE VERDE
Convocatoria	172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre
Beneficiario	DIANA SOFIA PALACIO CEBALLOS
Cedula	1045077702
No. Contrato	346-172-2021
Valor Contrato	$99.955.867, 00
Estado	TERMINADO

EMPRESA

Razón social	PRODUCE VERDE S.A.S
Nit	901.535.657-3
Ciudad	Yarumal
Departamento	Antioquia

INTERVENTORÍA

Interventor(a)	QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio	11/4/2021
Segunda visita	3/3/2022
Tercera visita	7/6/2022
Cuarta visita	
Prorroga	
Fecha finalización	11/4/2022

INDICADORES					
EMPLEOS			**MERCADEO**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
4	4	100%	5	5	100%
CONTRAPARTIDAS			**PRODUCCIÓN**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
7	7	100%	58	13320	62%
VENTAS			**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**		
Meta	Verificado	% Avance	Meta	Verificado	% Avance
$113.275.000, 00	$56.125.610, 00	49,55%	$99.955.867, 00	$99.955.866,840	100%
