Dora Consuelo Gonzalez Villamil

De: Andres Alberto Ruiz Taborda
Enviado el: martes, 5 de diciembre de 2023 7:00 a. m.
Para: Dora Consuelo Gonzalez Villamil
Asunto: RV: Entrega Correspondencia Radicado No. 000E2023019956 de fecha 23-11-2023 // RV: OFICIOS APUs NP CORREGIDOS
Datos adjuntos: 2- SOLICITUD NP CONSTRUCAM DSA DIAN.pdf

Muy buenos días,

Envío lo solicitado

ANDRÉS ALBERTO RUIZ TABORDA
Coordinación de Infraestructura
Subdirección Administrativa UAE – DIAN
aruizt@dian.gov.co
Teléfono: 6079999 ext. 902863
Cr. 7a N° 6C - 54 Edificio SENDAS Piso 10 Bogotá D.C.
www.dian.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | DIAN

De: Juan Camilo Rodas Serrano <jrodass@dian.gov.co>
Enviado el: lunes, 27 de noviembre de 2023 9:57 a. m.
Para: Andres Alberto Ruiz Taborda <aruizt@dian.gov.co>
Asunto: RV: Entrega Correspondencia Radicado No. 000E2023019956 de fecha 23-11-2023 // RV: OFICIOS APUs NP CORREGIDOS

Cordialmente,

JUAN CAMILO RODAS SERRANO
jrodass@dian.gov.co
Coordinador de Infraestructura (A)
Cel: 318 5166011
Carrera 7 No. 6C-54 Piso 9 Bogotá D.C

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | DIAN

De: corresp_entrada_NC <corresp_entrada_NC@dian.gov.co>
Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 4:10 p. m.
Para: Andres Alberto Ruiz Taborda <aruizt@dian.gov.co>; Juan Camilo Rodas Serrano <jrodass@dian.gov.co>; Andres Felipe Arenas <aarenas@dian.gov.co>
CC: arq.fagar@gmail.com
Asunto: Entrega Correspondencia Radicado No. 000E2023019956 de fecha 23-11-2023 // RV: OFICIOS APUs NP CORREGIDOS

Entrega Correspondencia Radicado No. 000E2023019956 de fecha 23-11-2023

Cordial Saludo,

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

De manera atenta, me permito informarle que su petición ha sido recibida de la cual se da traslado al buzón de **LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA de NIVEL CENTRAL, para su trámite correspondiente, de acuerdo con el organigrama de competencias de la Entidad**. Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier inquietud relacionada con su radicado deberá remitirla al destinatario de su solicitud.

La presente información se remite para su conocimiento y se deberá tener en cuenta que el trámite estará sujeto a los tiempos establecidos por la Ley para respuesta de los mismos por parte de las áreas competentes. Tenga en cuenta que las peticiones, solicitudes o respuestas deben tener las características requeridos en cada uno de los procedimientos y normatividad vigente.

Así mismo, las direcciones de correo electrónico habilitadas para radicar sus documentos en las diferentes sedes, podrán ser consultadas en la página principal de la DIAN https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NS-En-las-Direcciones-Seccionales-de-la-DIAN.aspx

Atentamente,

SEBASTIAN BURGOS

Coordinación de Correspondencia y Notificaciones

Subdirección de Gestión Administrativa – Nivel Central

U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

corresp_entrada_NC@dian.gov.co

Cra 7 C No. 6C - 54 primer piso Edificio Sendas

Bogotá D.C.

www.dian.gov.co



De: Andres Alberto Ruiz Taborda <aruizt@dian.gov.co>
Enviado: jueves, 23 de noviembre de 2023 3:00 p. m.
Para: corresp_entrada_NC <corresp_entrada_NC@dian.gov.co>
Asunto: RV: OFICIOS APUs NP CORREGIDOS

Muy buenos días,

Me permito remitir el archivo adjunto enviado por CONSTRUCAM SAS en 25 folios. Asunto: SOLICITUD APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS (N.P.) AL CONTRATO 00-130- 2023

Para el Numero de Radicado Correspondiente, Por favor enviar a aruizt@dian.gov.co

ANDRÉS ALBERTO RUIZ TABORDA
Coordinación de Infraestructura
Subdirección Administrativa UAE – DIAN
aruizt@dian.gov.co
Teléfono: 6079999 ext. 902863
Cr. 7a N° 6C - 54 Edificio SENDAS Piso 10 Bogotá D.C.
www.dian.gov.co



De: fabian alberto garcia blandón <arq.fagar@gmail.com>
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 4:51 p. m.
Para: Andres Alberto Ruiz Taborda <aruizt@dian.gov.co>
Asunto: OFICIOS APUs NP CORREGIDOS

Buenas tardes ingeniero Andres.

Por favor omitir el correo anterior, los archivos que se adjuntan a continuación ya presentan las correcciones pertinentes de acuerdo a las observaciones realizadas (fechas y APU 16,6)

Cordialmente,

ARQ. FABIAN ALBERTO GARCIA BLANDÓN
Director de Obra
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SA.S.
Cel: 316 620 23 25
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”

Cúcuta, Norte de Santander 20 de noviembre de 2023

Señor:
Ing. Andrés Alberto Ruíz Taborda
Supervisor de obra DSA
(Dian seccional de aduanas)
Ciudad. -

Referencia: Contrato de obra No. 00-130-2023

Asunto: SOLICITUD APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS (N.P.) AL CONTRATO 00-130-2023

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de informar que, para el desarrollo de las obras de Mantenimiento y Adecuación en la sede seccional de aduanas de la ciudad de Cúcuta, se hace necesario incorporar al contrato algunas actividades No Previstas, con el fin de lograr el mejoramiento y complementación de las actividades contractuales iniciales, resultantes de la intervención en sitio y que no pueden ser previstas con anterioridad a su ejecución.

- Una vez se inicia la ejecución de obras de excavación para la red de aguas lluvias, se pudo evidenciar en sitio la existencia de una tubería de aguas lluvias de 16" la cual no contaba con la pendiente indicada para la correcta evacuación de las aguas. Por lo tanto, se requiere incluir como actividad no prevista el desmonte y reinstalación de esta tubería mejorando su pendiente y funcionamiento; esto se contempla en el (NP-01). De igual manera, se hace necesario el desmonte y retiro (NP-02) de tramos de red de agua lluvia existente seleccionados para así poder intervenir y ejecutar el objeto del contrato de manera correcta y siguiendo el debido proceso constructivo.
- Por otro lado, para la construcción del muro de cerramiento. Se hace necesario incluir el desmonte y reinstalación de cerca eléctrica existente 6 hilos incluyendo postes y accesorios (NP-03). El retiro de estos elementos contractualmente no estaba incluido en los ítems iniciales; y se hace

indispensable para lograr el cumplimiento y correcto funcionamiento del material a instalar.

- Para lograr la instalación y mejoramiento de la red de aguas lluvias de la seccional, se hace necesario hacer demoliciones de material enchape cerámica actividad que no se tenía contemplada en la ejecución inicial. Incluir la demolición de enchape cerámico exterior (NP-04) en zona de terrazas para lograr la conexión de estos tramos con las otras secciones y así completar la red. En consecuencia, de la actividad anterior se hace inevitable no tener en cuenta la reposición e instalación del nuevo enchape cerámico para exterior formato 25 cm*25 cm (NP-05) y enchape cerámico formato 35 cm* 35 cm (NP-07) reemplazando el enchape demolido de tal manera que no se afecte la estética y formatos existente en la edificación.
- Para alcanzar la altura y las demás especificaciones técnicas existentes del cerramiento en malla eslabonada perimetral, se hace indispensable la inclusión de la instalación de tubería de cerramiento en 2" post galvanizado calibre 16 de 2mts con acabados en pintura esmalte y anticorrosivo (NP-06). De esta manera se garantiza la correcta instalación de elementos como la malla eslabonada, ángulos y cerca eléctrica.

Por los motivos anteriores y dando cumplimiento al debido proceso del presente contrato, me permito solicitar la aprobación de las actividades antes mencionadas como ÍTEMS NO PREVISTOS al ingeniero Andrés Alberto Ruiz Taborda como supervisor del contrato. Cabe anotar que estas nuevas actividades no afectan el valor inicial del contrato y que estos al ejecutarse estarán acorde al balance de cantidades Mayores y Menores relacionadas al Final de la ejecución del proyecto de obra, lo cual no requieren de un presupuesto y/o prorroga adicional.

Atentamente:



CONSTRUCAM CONSTRUCIONES SAS
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Rep. Legal
Adjunto: -Oficio Concertación de Valores y sus anexos

Cúcuta, Norte de Santander 20 de noviembre de 2023

Señor:
Ing. Andrés Alberto Ruíz Taborda
Supervisor de obra DSA
(Dian seccional de aduanas)
Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. 00-130-2023

Asunto: CONCERTACIÓN VALORES APUs N.P.

Por medio del presente, solicitamos amablemente a la supervisión del contrato de obra No. 00-130-2023 el análisis, revisión y concertación de las siguientes actividades No Previstas. Las cuales no se encontraban dentro del alcance inicial del contrato y que se hacen necesarias para la culminación y ejecución del proyecto.

A continuación, se presenta la relación de las actividades no previstas (N.P.) en la siguiente tabla donde se evidencia la unidad de medida y el valor unitario propuesto por parte de CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. para su revisión y posterior aprobación.


- **CUADRO CON ÍTEMS, UNIDAD Y PRECIO:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN - ACTIVIDAD	UNIDAD	Cant.	Vr. Unitario
16	**ACTIVIDADES NP**			
16,1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE HASTA 18"	ML		$ 10.792,59
16,2	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DE HASTA 18", INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	ML		$ 14.576,61
16,3	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA 6 HILOS INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS	ML		$ 15.751,85

16,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR, INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL.	M2		$	22.068,19
16,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 25 X 25 CMS	M2		$	54.696,16
16,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POST GALVANIZADO 2" CAL 16. 2 Mts DE ALTURA PARA CERRAMIENTO EN MALLA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.	M2		$	57.806,78
16,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 35X35 CMS	UND		$	66.893,16

El valor unitario de cada actividad tiene su sustento económico en los Análisis de Precios Unitarios (APU) y cotizaciones los cuales serán Anexados a este oficio para más información.

Atentamente:



CONSTRUCAM CONSTRUCIONES SAS

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO

Rep. Legal

Adjunto: **Anexo A.P.U.s N.P.**

Cotizaciones materiales.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA	**Capitulo**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS**
	SubCap.	**16,1**
	Actividad.	**DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE HASTA 18"**
	UND	**ML**
	No. CONTRATO:	**00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Hora Cuadrilla	28.870,60	0,2667	7.699,79
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
			Total Materiales	**10.792,59**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Equipo	**0,00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0,00
			Total Transporte	

Total Costos Directos Actividad:	**10.792,59**

NOMBRE DEL PROPONENTE:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA	**Capitulo**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS**
	SubCap.	**16,2**
	Actividad.	**DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA PVC DE HASTA 18", INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL**
	Und.	**ML**
	No. CONTRATO:	**00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Hora Cuadrilla	28.870,60	0,2667	7.699,79
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
			Total Materiales	**$ 10.792,59**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Equipo	**0,00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA CAPACIDAD 6 M3	M3/KM	378.402,27	0,0100	$ 3.784,02
			Total Transporte	**$ 3.784,02**

Total Costos Directos Actividad:	**14.576,61**

NOMBRE DEL PROPONENTE:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

DIAN **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA**	**Capitulo** **SubCap.** **Actividad.** **Und.** **No. CONTRATO:**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS** **16,3** **DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA 6 HILOS INCLUYE POSTES Y ACCESORIOS** **ML** **00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA FF1 - ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS	Hora Cuadrilla	50.636,19	0,2500	12.659,05
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
			Total Materiales	**15.751,85**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Equipo	**0,00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0,00
			Total Transporte	

Total Costos Directos Actividad:	**15.751,85**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA	**Capitulo**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS**
	SubCap.	**16,4**
	Actividad.	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR, INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL.**
	Und.	**M2**
	No. CONTRATO:	**00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Hora Cuadrilla	24.685,35	0,6154	15.191,36
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
			Total Materiales	**18.284,16**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Equipo	**0,00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA CAPACIDAD 6 M3	M3/KM	378.402,27	0,0100	$ 3.784,02
	Total Transporte			**3.784,02**

Total Costos Directos Actividad:	**22.068,19**

NOMBRE DEL PROPONENTE:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

DIAN **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA**	**Capitulo**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS**
	SubCap.	**16,5**
	Actividad.	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 25 X 25 CMS**
	Und.	**M2**
	No. CONTRATO:	**00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PEGANTE CERAMICO PARA EXTERIORES	Kilogramo	1.916,00	7,0000	13.412,00
TABLON DE GRESS 25X25 CMS	Metro Cuadrado	21.500,00	1,0000	21.500,00
HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Hora Cuadrilla	24.685,35	0,6154	15.191,36
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
			Total Materiales	**53.196,16**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Kilogramo			0,00
			Total Equipos	**0,00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Kilogramo			0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL	Dia	150.000,00	0,0100	1.500,00
Total Transporte				**1.500,00**

Total Costos Directos Actividad:	**54.696,16**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

DIAN **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA**	**Capitulo** **SubCap.** **Actividad.** **Und.** **No. CONTRATO:**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS** **16,6** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO POST GALVANIZADO 2" CAL 16 2 MTS DE ALTURA PARA CERRAMIENTO EN MALLA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.** **UND** **00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TUBO POS GALVANIZADO REDONDO DE 2" CAL 16 X 6 ML	ML	105.042,01	2,00	35.014,00
TAPA METALICA GALVANIZADA DE 2"	UND	3.500,00	1,00	3.500,00
ESMALTE 2 EN 1	Galon	96.180,31	0,05	4.809,02
SOLDADURA 6013-3/16	Kilogramo	12.184,80	0,04	487,39
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
HORA CUADRILLA ORNAMENTACIÓN	Hora Cuadrilla	28.870,60	0,25	7.217,65
			Total Materiales	**54.120,86**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	Mes	21.859,16	0,1000	2.185,92
			Total Equipo	**2.185,92**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL	Dia	150.000,00	0,0100	$ 1.500,00
		Total Transporte		**1.500,00**

Total Costos Directos Actividad:	**57.806,78**

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SECCIONAL CÚCUTA	**Capitulo**	**16. ACTIVIDADES NO PREVISTAS**
	SubCap.	**16,7**
	Actividad.	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA EXTERIOR DE 35 X 35 CMS**
	Und.	**M2**
	No. CONTRATO:	**00-130-2023**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PEGANTE CERAMICO PARA EXTERIORES	Kilogramo	1.916,00	7,0000	13.412,00
TABLETA CERAMICA 35 x 35 CMS PARA EXTERIOR	Metro Cuadrado	33.697,00	1,0000	33.697,00
HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Hora Cuadrilla	24.685,35	0,6154	15.191,36
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	736.380,54	0,0042	3.092,80
			Total Materiales	**65.393,16**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Kilogramo			0,00
			Total Equipos	**0,00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Kilogramo			0,00
			Total Mano de Obra	**0,00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL	Dia	150.000,00	0,0100	1.500,00
		Total Transporte		**1.500,00**

Total Costos Directos Actividad:	**66.893,16**

NOMBRE DEL PROPONENTE:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA
FIRMA DEL PROPONENTE:	**FIRMA SUPERVISOR DIAN:**

FERRETERIA Y DEPOSITOS DE MATERIALES
CATATUMBO S.A.S

NIT 901.416.941-0 Responsable de I.V.A

AV. 6 # 0-12 BR LA INSULA REDOMA AEROPUERTO TEL 5877322

COTIZACION DE VENTA NO. 2021 017611

SEÑORES :	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S	N.I.T:	900322299	FECHA :	2023/10/21
DIRECCION:	CC ARKACENTRO OF E 2B 19	CIUDAD:	IBAGUÉ - Tolima	VENCE:	3 DIAS
TELEFONO	6082690602	VENDEDOR:	JULIAN		

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	IVA	TOTAL
T25	TABLETA 25 X 25 1A LADRILLO LISA PRIMERA EXC.	35.00	METROS	21,500.00	0	752,500.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	$752,500.00
DESCUENTO:	$0.00
IVA TOTAL:	$0.00
TOTAL :	$752,500.00

ENCUÉNTRANOS EN SABANETA| NARANJAL | GUAYABAL. +57 (604) 448 4068





LAD TABLETA VITRIF LISO 25X25 R.A

Escríbenos Ahora

Precio por m²: $29.600

Rendimiento: 1.0 m² por MT2

IVA incluido

Mas información

Calcula cantidad de MT2 que necesitas

* Realizamos una aproximación según el rendimiento de la unidad de empaque.

Mi área es de **m²**, y necesito

Sin existencias

Notifícame cuando este producto esté disponible:

Email *

Envíame un correo cuando esté disponible

Pregúntanos por Whastapp

SKU: 06048


Descripción

También te pueden gustar










Escríbenos Ahora





Suscríbete a nuestro Newsletter y
recibe beneficios exclusivos

Tu email

Suscribirse

CONTACTO

SOBRE NOSOTROS

SERVICIO AL CLIENTE

HORARIO DE ATENCIÓN

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados Degres

Escríbenos Ahora

Fecha: 19.10.2023	Hora: 09:20:03

alfagres s.a.
En reorganización

Nit 860.032.550-7

Avenida Caracas No 35-55
Bogotá D.C. - Colombia
Telefono 601 331 1515
www.alfa.com.co

COTIZACIÓN N° 23047859

El presente documento es válido unicamente como cotización

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	Construcam constructores sas
NIT o CC:	9003222991
Domicilio:	DIAN av 7 #8n-47
Teléfono:	NOTIENE-31674...
Ciudad:	CÚCUTA

DATOS DE ENTREGA

Dirección:	DIAN av 7 #8n-47
Obra:	Construcam constructores sas
Teléfono:	NOTIENE-3167406328
Contacto:	
Ciudad:	CÚCUTA

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor:	JUAN DUARTE	Dirección:	
Punto de venta:	Canal Virtual	Email:	JUAN.DUARTE@ALFA.COM.CO
Teléfono:	FAX:	Ciudad:	

REFERENCIA CÓDIGO	UNIDAD EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	UND	CAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DTO	No CAJAS	SUBTOTAL SIN IVA
225026402	1.00	NEW TABLON TRADICION SAHARA 30.5X3 ***Este documento no es un contrato*** ***Este documento no es un recibo de pago***	M2	1	50.00	33.697	0	50	1.684.850

OBSERVACIONES:

PESO BRUTO:	**1.125 KG**
VALIDEZ DE LA OFERTA:	**03.11.2023**

Subtotal:	**1.684.850**
Transporte:	**0**
IVA:	**320.122**
Total:	**2.004.972**

Actividad principal industrial 2392 municipio Soacha, no efectuar retención de ICA en Bogotá somos grandes contribuyentes de la DIB Res. DD1-32117 del 25/10/2019, responsable del impuesto a las ventas "somos grandes contribuyentes por la DIAN según resolución 9061 del 10/12/2020"

Su ahorro en esta compra fue de:
$ 1.320.000

Autorizo a Alfagres S.A. para recaudar, almacenar, utilizar y actualizar mis datos personales con fines exclusivamente comerciales y garantizándome que esta información no será revelada a terceros salvo orden de autoridad competente - Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013.


* LA FECHA DE ENTREGA SE DETERMINARÁ EN EL MOMENTO DE EFECTUAR EL PEDIDO, LOS PRECIOS DE ESTA OFERTA SE PODRÁN MODIFICAR SIN PREVIO AVISO
* POR FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO.
* PARA LOS PRODUCTOS IMPORTADOS SU PRECIO SE LIQUIDARÁ Y ESTABLECERÁ EN PESOS COLOMBIANOS COP EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZA EL PAGO, APLICANDO LA TRM VIGENTE EN EL PAÍS PARA ESA FECHA.
* Los precios varían de acuerdo con el destino, por el flete del transpote.

"SERVICIO DE TRANSPORTE RECAUDO PARA TERCEROS PISOTRANS S.A NIT 830045034-5"
TIEMPOS ESTÁNDAR DE ENTREGA, SUJETOS A VARIACIONES LOGÍSTICAS INTERNACIONALES

Para mayor información técnica acerca de los productos alfa. Visite nuestra página WEB: www.alfa.com.co./Información al cliente.

APROBACIÓN DEL CLIENTE

CLIENTE

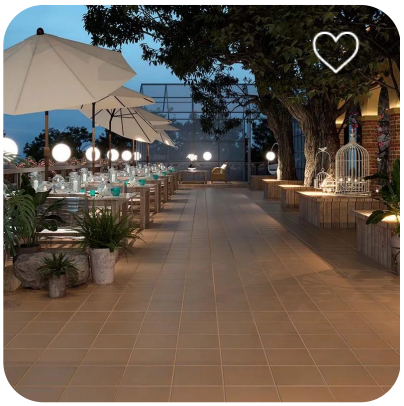



* Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, pueden variar de acuerdo con la resolución de tu pantalla y respecto al producto exhibido en las salas de venta. Señor consumidor, por favor revise cuidadosamente la identificación del número de lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico. Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso.

New Tablón Tradición 30x30 Sahara

SKU: 225026402

$40.099 Caja

Los precios incluyen IVA. No incluyen instalación, ni transporte este se calculará al finalizar la compra.

El mejor tablón de Gres en colores tradicionales y cálidos

- Resistente a las manchas - Resistencia al deslizamiento - Máxima resistencia a la rotura. tráfico pesado y abrasión profunda

Color Sahara



Formato

30X30

Calcula la cantidad de producto

Escribe la cantidad de m² que necesitas

Ingrese Número m2

(*1.00 m2*)

Adicionar 5% de desperdicio

La cantidad de pegante que necesitas para instalar tu producto es de 0 bolsas de

¿Cómo calcular los m² que necesitas? | Calcula aquí

Agregar al carrito Comprar Ahora

Múltiples medios de pago

Métodos de entrega

Estos son los métodos de entrega disponibles para este producto, podrás elegir tu preferido al momento de hacer la compra:


Envío a domicilio

Recogida en tienda *Ver tiendas*

Visualizar en



Ambientes 3D



Nuestros productos en tu espacio


Ficha técnica | Manual de instalación | Manual de mantenimiento | Garantía | Objeto BIM

locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso

HOT SALE

Cantidad Pegante	0.00	Cantidad Junta	0.00
Datos técnicos	Máxima resistencia a la rotura tráfico pesado y abrasión profunda Resistencia al deslizamiento Resistente a las manchas	Tendencias	Elegancia y confort
Uso	Pisos, Paredes, Fachadas, Interior	Tipo	Tablón
Unidad de empaque	CJ	Unidad	M2
Unidades de venta (m2/caja)	1	Calidad	Calidad 1
Realidad aumentada	NO		


Productos relacionados



Tablón Tradición

$ 36.999 *Caja*

Agregar al carrito



Tablón portal

$ 44.600 *Caja*

Agregar al carrito



Porcelagres Ardesia Marrone 7x30

$ 109.836 *Caja*

$ 66.973 m²


Agregar al carrito



Porcelagres Deco Duna 15x30

$ 68.782 *m²*

Agregar al carrito



Porcelagres Deco Duna 30x30

$ 65.212 *m²*

Agregar al carrito

Comentarios

Por favor, inicie sesión para escribir un comentario.

Sin comentarios.

ALFA INTERNACIONAL

Información

Términos y condiciones

Términos y condiciones

Conócenos

Quiénes somos

Trabaja con nosotros

Nuestros catálogos

Contacto

Línea gratuita nacional:
01 8000 914 900

newsletter y obtén un 10% de descuento en tu primera compra.

Suscribirme

Política de devoluciones y cambios

Aviso reorganización Ley 1116

Proceso de reorganización

Preguntas frecuentes

Estados financieros Grupo Alfa

Certificaciones

Rastrea tu pedido

Sostenibilidad

tu comp
WhatsAp
Naranja 3188007804

Déjanos tus comentarios


Encuéntranos en

Powered By: Technology:

Todos los derechos reservados Alfa

Productos
> TABLON TRADICION SAHARA 30.5X30.5 PRIM. ALFA

Buscar...

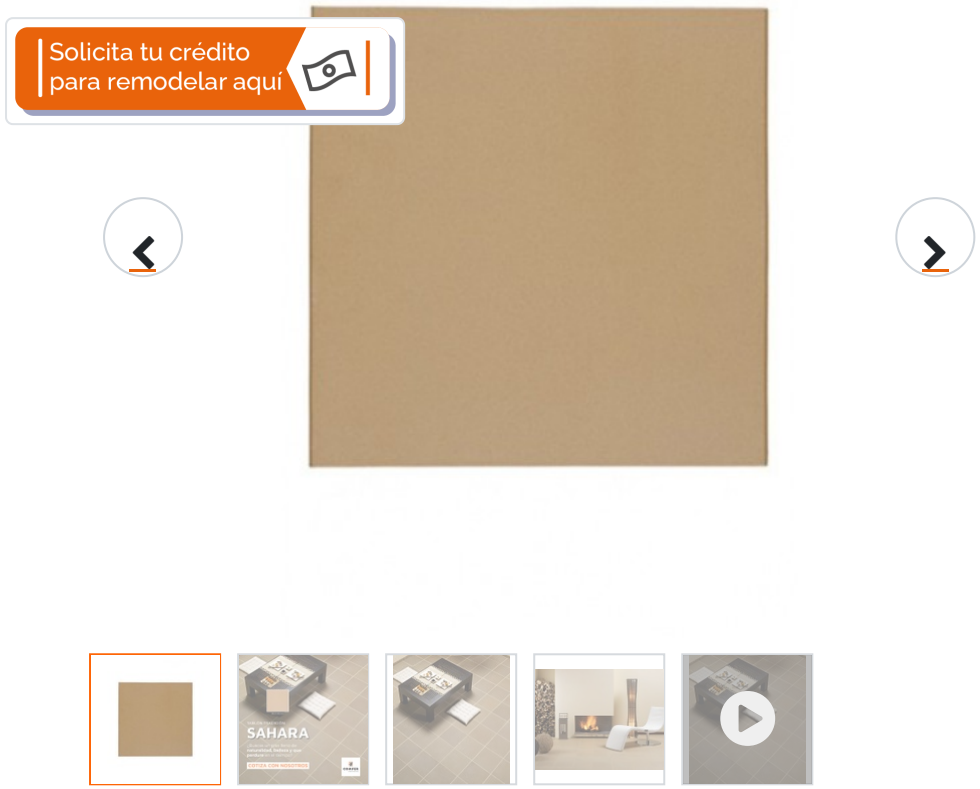

TABLON TRADICION SAHARA 30.5X30.5 PRIM. ALFA

$ 36.900,00

Contactar vendedor

1

Agregar al carrito

Añadir para comparar

Entregamos Gres en Tunja, Villa de Leyva, Paipa, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Barbosa y alrededores. Contáctanos al teléfono 315 6266703 para conocer el costo del envio.

Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales

Solicita tu crédito para remodelar aquí

revestimiento

El Tablón de Gres ALFA es un producto diseñado para **pisos exteriores e interiores** sometidos a tráfico comercial.
Puede ser colocado en instalaciones de tipo residencial, institucional y comercial.
El **piso Gres Alfa** es una línea clásica con aires modernos debido a la combinación de colores, texturas y tamaños que la hacen la opción más completa y de mayor calidad.

Ventajas

- Alta resistencia.
- Resistencia al impacto.
- Excelente adherencia.
- Durabilidad.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.
- Componente estético y de diseño que aporta al acabado final.

Material	GRES
Marca	ALFA
CALIDAD	CALIDAD PRIMERA
USO	PISOS

ESTILO	CERÁMICA GRES NATURAL
FORMATO	30.5X30.5
Unidad de empaque	1 metro
TRAFICO	COMERCIAL ALTO

Solicita tu crédito para remodelar aquí

Alternativas sugeridas:

Marca	Alfa
Tráfico	Comercial general
Materiales	Gres
Dimensiones	30.5x30.5
Peso	22,50 kg

Clasificación	Gres tablon
Envío	Entregamos Gres en Tunja, Villa de Leyva, Paipa, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Barbosa y alrededores. Contáctanos al teléfono 315 6266703 para conocer el costo del envio.

Copyright © Comfer

Con tecnología de odoo - El #1 Comercio electrónico de código abierto

Solicita tu crédito para remodelar aquí

FERRETERIA Y DEPOSITOS DE MATERIALES
CATATUMBO S.A.S

NIT 901.416.941-0 Responsable de I.V.A

AV. 6 # 0-12 BR LA INSULA REDOMA AEROPUERTO TEL 5877322

COTIZACION DE VENTA NO. 2021 017608

SEÑORES :	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S	N.I.T:	900322299	FECHA :	2023/10/21
DIRECCION:	CC ARKACENTRO OF E 2B 19	CIUDAD:	IBAGUÉ - Tolima	VENCE:	3 DIAS
TELEFONO	6082690602	VENDEDOR:	GEIDY		

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	IVA	TOTAL
TG2	TUBO GALVANIZADO 2 CORP C-2.9 MM	20.00	TUBO	217,000.00	19	4,340,000.00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	$3,647,058.83
DESCUENTO:	$0.00
IVA TOTAL:	$692,941.17
TOTAL :	$4,340,000.00

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426-3
CL 8 3A 65 ZONA INDUSTRIAL Cúcuta
Tel: 5790550-2056-2970 Fax: 5780212

COTIZACION VENTAS No. CVC-12303424

Fecha Elaboracion: 21 de Octubre 2023
Estado: APROBADO **Fecha Estado:** 21 de Octubre 202
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

Cliente : CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit : 900322299
Dirección : CC ARKACENTRO OF E 2 B 19
Ciudad-Depto: Ibagué Tolima
Teléfono : 3143470337 **Fax:** 3164904476
Contacto : CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO

SUCURSAL

Sucursal : CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. : 900322299
Dirección : CC ARKACENTRO OF E 2 B 19
Ciudad - Depto: Ibagué Tolima
Teléfono : 3143470337 **Fax:**
Contacto : CONSTRUCAM

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA %	SUBTOTAL
1152	TUBO CERRAMIENTO GALVA 2" ESP .059"	1.00 UND	13.65	105,042.01	19	105,042.00

	TOTALES	13.65	**Subtotal** 105,042
			I.V.A. 19,958
			Total 125,000

CONDICIONES COMERCIALES

NOTA: PRECIOS GARANTIZADOS ENTREGAS _____-, BASE PROMEDIO ENTREGA MENSUAL DE ACERO 80 TON FIGURADO - 120 RECTO.

* **Forma de pago: ANTICIPADO 100%**
* **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA HIERRO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
* **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** Octubre 25 de 2023
* **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE POR COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
* ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
* EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
* ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIAS S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 0560470169985087 o BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 49700002933

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES

Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asesores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error de diseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4) cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

ASESOR COMERCIAL

Nombre VENTAS ASESOR CONTADO

Celular

mostrador.cucuta	mostrador.cucuta	
Elaboró	**Aprobó**	**Recibió**
