Acta Consecutivo No.	01 / 2023	**Lugar y Fecha**	Puerto Carreño, Vichada, 05 de diciembre de 2023.
Asunto	Reunión previa por posible Riesgo incumplimiento del proceso N° 117-00-B-COFAC-BACOF-2023		
Oficina Productora	ESALO - GAORI		
Hora Inicio	14:30	**Hora Finalización**	16:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día: Posible Riesgo incumplimiento del proceso N° 117-00-B-COFAC-BACOF-2023

I. Verificar línea de tiempo, avances, ejecución y riesgos en el cumplimiento del proceso N° 117-00-B-COFAC-BACOF-2023.
II. Informar al contratista del proceso las novedades e inconsistencias en la ejecución del proceso.
III. Escuchar la sustentación y hechos de las novedades en la ejecución del proceso por parte del contratista.
IV. Propuesta plan de acción para afrontar o solventar las novedades de ejecución.
V. Acuerdos y compromisos.

Desarrollo:

A los cinco (05) días del mes de octubre de 2023, se reunieron por medios electrónicos mediante el aplicativo TEAMS, el Señor TC. PABLO JOSE DIAZ MORA. Segundo Comandante Jefe Estado Mayor BACOF y Ordenador del Gasto, el Señor MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ RAMOS como Gerente de Proyecto GAORI, la Señora CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA, Jefe Sección Compras Públicas BACOF, la Señora CT. ANGELICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA, Especialista jurídica del proceso, el supervisor principal del proceso el Señor T4. ZAMBRANO GUACA GEOVANY ALBERTO y en su calidad de representante legal del contratista, EBRATT & ARENAS SAS la Señora YENIFFER GUZMAN GONZALEZ, con la finalidad de solucionar unas controversias presentadas en virtud de lo establecido en la **Cláusula 18 - Solución de Controversias** de acuerdo a correo enviado por parte del Supervisor el día 04 de diciembre del 2023,



T4. GEOVANY ALBERTO ZAMBRANO GUACA

Para: ebratt arenas <ebrattarenas@gmail.com>; abrattarenas@gmail.com

Lun 04/12/2023 6:43

CC: ST. CARLOS ENRIQUE PULIDO GUZMAN; CT. HECTOR ANDRES JAIMES BERMON; CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA; TC. FREDDY FABIAN FIGUEROA VERGARA; **y 1 más**

En relación al proceso en ejecución 117-00-B-COFAC-BACOF-2023, con objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES, CAJAS DE MANIOBRA, PARARRAYOS, REDES ELÉCTRICAS Y GENERADORES AUXILIARES FIJOS Y MÓVILES DEL GAORIMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES, CAJAS DE MANIOBRA, PARARRAYOS, REDES ELÉCTRICAS Y GENERADORES AUXILIARES FIJOS Y MÓVILES DEL GAORI" me permito informar, que una vez firmada Acta de inicio el día **23 de noviembre de 2023**, cumplimiento previos requisitos, se realizó ingreso de personal de Contratista de acuerdo a lo solicitado, desde el 28 de noviembre de 2023 hasta el 01 de diciembre de 2023.
Durante el tiempo de ingreso, no se logró ejecutar parcial o total alguna actividad o servicio, ya que de acuerdo la informado por estos, por falta de equipo, insumos y elementos. Por lo anterior a la fecha se tiene un **0% de ejecución**, y un avance en tiempo de acuerdo con firma de contrato de: **64%**, por lo anterior informo un **riesgo de incumplimiento** para la fecha programada máxima de ejecución: **22 de diciembre de 2023**.

Por lo anterior les solicito se nos informe curso de acción por parte de EBRATT & ARENAS SAS, para solventar dicha falta de condiciones, insumos o elementos para inicio y ejecución del proceso.

Así mismo quedo atento para tramitar ingreso de personal y carga.

Gracias por la atención.

Cordialmente,

T4. Zambrano Guaca Geovany Alberto
Técnico Especialista Seguimiento Y Evaluación
Elemento Servicios Públicos - ESALO - GAORI
Puerto Carreño - Vichada
Ext. 1930
geovany.z.ambrano@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

La supervisión explica a los asistentes cual fue la línea de tiempo del proceso:

*A. El 02 de noviembre de 2023 se realiza la ponencia en la cual sale elegido el proponente EBRATT & ARENAS SAS, con una fecha máxima de ejecución es hasta el **22 de diciembre del 2023**.*

B. El 03 de noviembre de 2023 se firma el contrato por parte del contratista, se pide formalizar las pólizas de acuerdo con el pliego de condiciones.

C. El 07 de noviembre se recuerda vía correo electrónico los pendientes en el proceso.

D. El 08 de noviembre suben las pólizas a SECOP II y proceden a revisión.

E. El 10 de noviembre de 2023, se les informa vía mensajería SECOP II, que las pólizas fueron rechazadas al no cumplir lo requerido en el pliego de condiciones.

F. A la fecha 14 de noviembre de 2023 mediante oficio No FAC-S-2023-208363-CI del 14 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA, no se han formalizado pólizas, generando el no poder firmar Acta de Inicio del Proceso.


G. Se Firma Acta de inicio del proceso previo visto bueno de requerimientos administrativos y pendiente por formalizar.

H. Con Acta de inicio firmada el día 28 de noviembre del 2023, de realiza ingreso de personal técnico de la empresa a fin de iniciar labores.

I. El día 01 de diciembre del 2023, el personal sale, a razón de manifestar que no cuenta con material, equipos e insumos necesarios para realizar alguna labor.

J. A razón del punto (I) el día 04 de diciembre de 2023 se solicita reunión urgente por "Posible Riesgo de Incumplimiento".

Desarrollo de la reunión:

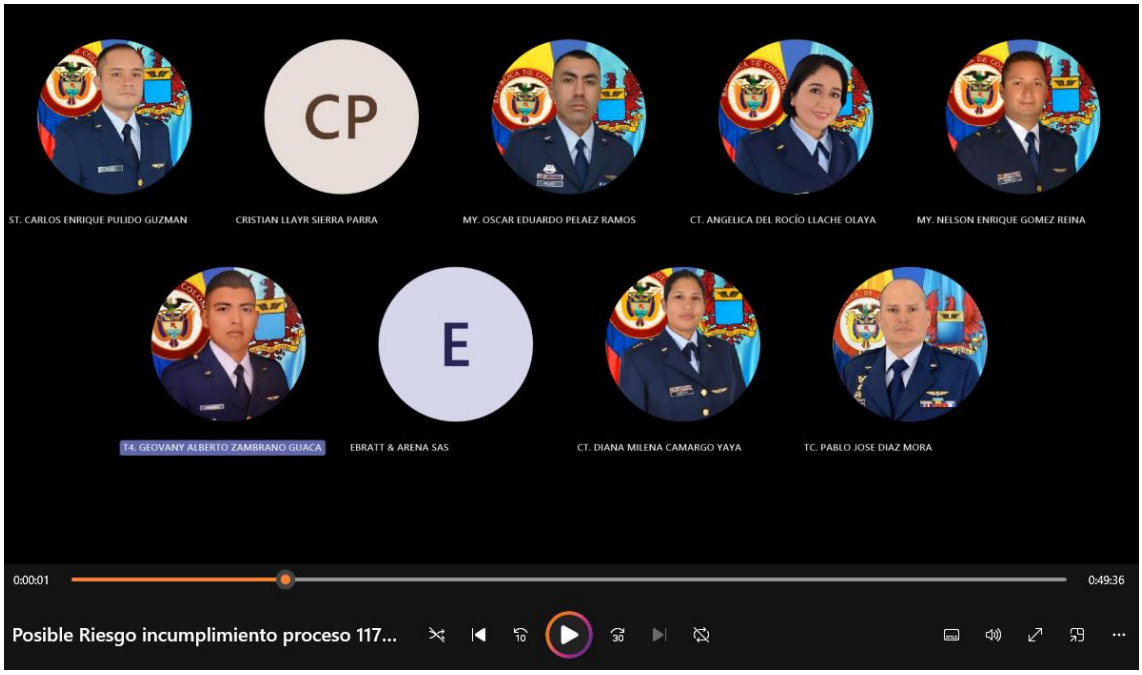

- Una vez Verificada la asistencia, inicia intervención el Supervisor del proceso, explicando la línea de tiempo anteriormente expuesta, y el problema durante la ejecución razón de la citación de la reunión

- Se da la palabra al Señor Fredy Susa en representación del Contratista, quien corrobora lo expuesto por la supervisión y Manifiesta que inicialmente se tenía propuesto que el personal ingresado el 28 de noviembre de 2023, fuera recibiendo los insumos para el desarrollo de las tareas, pero se decidió sacarlos por el tiempo necesario para tener todo disponible. Manifiesta el estar reuniendo el equipo, personal e insumos necesarios para ingresar nuevamente. Informa que a la fecha 14 de diciembre de 2023 tendría todo lo necesario listo por lo cual propone una adición de tiempo hasta el 29 de diciembre de 2023.

- Por parte del GAORI el Señor Gerente de Proyecto manifiesta las restricciones en la programación y carga de los vuelos de apoyo FAC para ingreso a la Unidad, así mismo que estos no son razón para no cumplir con la ejecución del proceso.

- El Señor Ordenador del Gasto y el Gerente del proyecto, así como la Especialista jurídico manifiestan que teniendo en cuenta los plazos de ejecución y lo manifestado por la supervisión, se requiere que a más tardar el día 12 de diciembre del 2023, ingrese todo el personal, maquinaria e insumos necesarios para la ejecución del contrato.

Compromisos establecidos responsabilidad del contratista:

1. El contratista enviara al supervisor, la información del personal y equipo a ingresar a más tardar el día 07 de diciembre del 2023 antes de las 18:00, a fin de tramitar los requisitos de ingreso al GAORI.
2. Debe ingresar todo el personal, equipo e insumos necesarios para inicio ejecución el día 12 de diciembre del 2023.

Por parte de la entidad, esta se obliga en cabeza de la supervisión a:

1. Realizar seguimiento exhaustivo, e informara avances en la ejecución del proceso.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
1. enviar al supervisor, la información del personal y equipo a ingresar 2. ingreso de todo el personal, equipo e insumos necesarios para inicio ejecución 3. Informar sobre avances de ejecución del proceso.	1. CONTRATISTA 2. CONTRATISTA 3. Supervisor del proceso	1. 7 de diciembre del 2023 2. 12 de diciembre del 2023 3. PERMANENTE

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	No aplica.		
Fecha - Hora	------	**Lugar**	-----

FIRMAS,

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA.

Segundo Comandante Jefe Estado Mayor BACOF y Ordenador del Gasto

MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ RAMOS

Gerente del proyecto – GAORI

CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA

Jefe Sección Compras Públicas BACOF

CT. ANGELICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA

Especialista Jurídica del Proceso – BACOF

T4. ZAMBRANO GUACA GEOVANY ALBERTO

Supervisor principal del Proceso


Señora YENIFFER GUZMAN GONZALEZ

Representante legal de EBRATT & ARENAS SAS

Asistencia de la reunión Teams

Captura:

(Siguiente página)

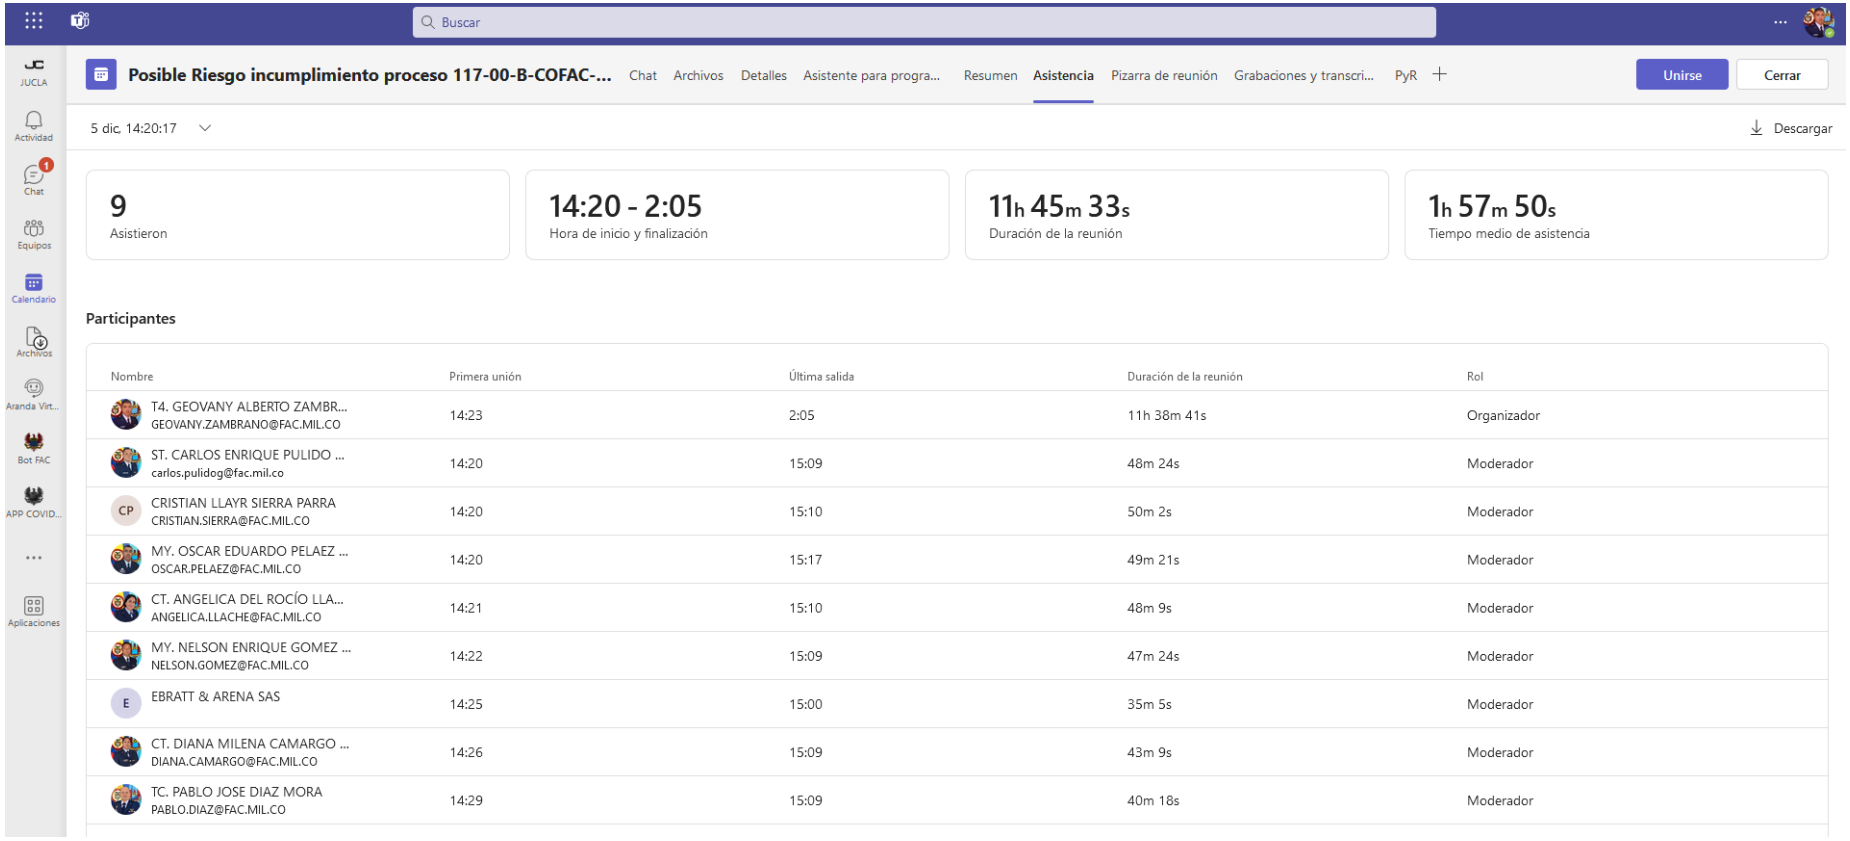
Buscar
Posible Riesgo incumplimiento proceso 117-00-B-COFAC-...
Chat
Archivos
Detalles
Asistente para progra...
Resumen
Asistencia
Pizarra de reunión
Grabaciones y transcri...
PyR
Unirse
Cerrar
5 dic, 14:20:17
Descargar
9
Asistieron
14:20 - 2:05
Hora de inicio y finalización
11h 45m 33s
Duración de la reunión
1h 57m 50s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
T4. GEOVANY ALBERTO ZAMBR... GEOVANY.ZAMBRANO@FAC.MIL.CO 14:23 2:05 11h 38m 41s Organizador
ST. CARLOS ENRIQUE PULIDO ... carlos.pulidog@fac.mil.co 14:20 15:09 48m 24s Moderador
CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA CRISTIAN.SIERRA@FAC.MIL.CO 14:20 15:10 50m 2s Moderador
MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ ... OSCAR.PELAEZ@FAC.MIL.CO 14:20 15:17 49m 21s Moderador
CT. ANGELICA DEL ROCÍO LLA... ANGELICA.LLACHE@FAC.MIL.CO 14:21 15:10 48m 9s Moderador
MY. NELSON ENRIQUE GOMEZ ... NELSON.GOMEZ@FAC.MIL.CO 14:22 15:09 47m 24s Moderador
EBRATT & ARENA SAS 14:25 15:00 35m 5s Moderador
CT. DIANA MILENA CAMARGO ... DIANA.CAMARGO@FAC.MIL.CO 14:26 15:09 43m 9s Moderador
TC. PABLO JOSE DIAZ MORA PABLO.DIAZ@FAC.MIL.CO 14:29 15:09 40m 18s Moderador

1. Resumen

Título de la reunión	Posible Riesgo incumplimiento proceso 117-00-B-COFAC-BACOF-2023	
Participantes que asistieron		9
Hora de inicio	12/05/23, 2:20:16 PM	
Hora de finalización	12/06/23, 2:05:50 AM	
Duración de la reunión	11 h 45 min 33 s	
Tiempo medio de asistencia	1 h 57 min 50 s	

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
T4. GEOVANY ALBERTO ZAMBRANO GUACA	12/05/23, 2:23:12 PM	12/06/23, 2:05:50 AM	11 h 38 min 41 s	GEOVANY.ZAMBRANO@FAC.MIL.CO	GEOVANY.ZAMBRANO@FAC.MIL.CO	Organizador
ST. CARLOS ENRIQUE PULIDO GUZMAN	12/05/23, 2:20:20 PM	12/05/23, 3:09:50 PM	48 min 24 s	carlos.pulidog@fac.mil.co	CARLOS.PULIDOG@fac.mil.co	Moderador
CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	12/05/23, 2:20:33 PM	12/05/23, 3:10:36 PM	50 min 2 s	CRISTIAN.SIERRA@FAC.MIL.CO	CRISTIAN.SIERRA@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ RAMOS	12/05/23, 2:20:51 PM	12/05/23, 3:17:10 PM	49 min 21 s	OSCAR.PELAEZ@FAC.MIL.CO	OSCAR.PELAEZ@FAC.MIL.CO	Moderador
CT. ANGELICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA	12/05/23, 2:21:51 PM	12/05/23, 3:10:01 PM	48 min 9 s	ANGELICA.LLACHE@FAC.MIL.CO	ANGELICA.LLACHE@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. NELSON ENRIQUE GOMEZ REINA	12/05/23, 2:22:21 PM	12/05/23, 3:09:46 PM	47 min 24 s	NELSON.GOMEZ@FAC.MIL.CO	NELSON.GOMEZ@FAC.MIL.CO	Moderador
EBRATT & ARENA SAS	12/05/23, 2:25:03 PM	12/05/23, 3:00:08 PM	35 min 5 s			Moderador
CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA	12/05/23, 2:26:48 PM	12/05/23, 3:09:57 PM	43 min 9 s	DIANA.CAMARGO@FAC.MIL.CO	DIANA.CAMARGO@FAC.MIL.CO	Moderador
TC. PABLO JOSE DIAZ MORA	12/05/23, 2:29:20 PM	12/05/23, 3:09:38 PM	40 min 18 s	PABLO.DIAZ@FAC.MIL.CO	PABLO.DIAZ@FAC.MIL.CO	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
T4. GEOVANY ALBERTO ZAMBRANO GUACA	12/05/23, 2:23:12 PM	12/05/23, 3:10:07 PM	46 min 54 s	GEOVANY.ZAMBRANO@FAC.MIL.CO	Organizador
T4. GEOVANY ALBERTO ZAMBRANO GUACA	12/05/23, 3:14:02 PM	12/06/23, 2:05:50 AM	10 h 51 min 47 s	GEOVANY.ZAMBRANO@FAC.MIL.CO	Organizador
ST. CARLOS ENRIQUE PULIDO GUZMAN	12/05/23, 2:20:20 PM	12/05/23, 3:08:07 PM	47 min 46 s	carlos.pulidog@fac.mil.co	Moderador
ST. CARLOS ENRIQUE PULIDO GUZMAN	12/05/23, 3:09:11 PM	12/05/23, 3:09:50 PM	38 s	carlos.pulidog@fac.mil.co	Moderador
CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	12/05/23, 2:20:33 PM	12/05/23, 3:10:36 PM	50 min 2 s	CRISTIAN.SIERRA@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ RAMOS	12/05/23, 2:20:51 PM	12/05/23, 2:46:45 PM	25 min 53 s	OSCAR.PELAEZ@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ RAMOS	12/05/23, 2:51:00 PM	12/05/23, 2:52:37 PM	1 min 37 s	OSCAR.PELAEZ@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. OSCAR EDUARDO PELAEZ RAMOS	12/05/23, 2:55:19 PM	12/05/23, 3:17:10 PM	21 min 51 s	OSCAR.PELAEZ@FAC.MIL.CO	Moderador
CT. ANGELICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA	12/05/23, 2:21:51 PM	12/05/23, 3:10:01 PM	48 min 9 s	ANGELICA.LLACHE@FAC.MIL.CO	Moderador
MY. NELSON ENRIQUE GOMEZ REINA	12/05/23, 2:22:21 PM	12/05/23, 3:09:46 PM	47 min 24 s	NELSON.GOMEZ@FAC.MIL.CO	Moderador
EBRATT & ARENA SAS	12/05/23, 2:25:03 PM	12/05/23, 3:00:08 PM	35 min 5 s		Moderador
CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA	12/05/23, 2:26:48 PM	12/05/23, 3:09:57 PM	43 min 9 s	DIANA.CAMARGO@FAC.MIL.CO	Moderador
TC. PABLO JOSE DIAZ MORA	12/05/23, 2:29:20 PM	12/05/23, 3:09:38 PM	40 min 18 s	PABLO.DIAZ@FAC.MIL.CO	Moderador
