GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN 8**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: octava reunión del comité técnico. Reunión de seguimiento a la ejecución del contrato 4600015479, cuyo objeto es "Fortalecimiento de la iniciativa clúster cárnico bovino a través de acciones de diferenciación productiva y comercial en concordancia con la ganadería sostenible en el departamento de Antioquia	**Fecha de reunión:** 28 de noviembre de 2023
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Cámara de Comercio Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño - Clúster cárnico Bovino de Antioquia	**Fecha de elaboración:** 2 de noviembre 2023

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
-Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural. **-Yudi Garzón Atehortúa- Coordinador del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.**	**Ninguno**

Convoca: Supervisor
Lugar: Virtual – Plataforma TEAMS
Fecha: 28 de noviembre de 2023
Hora de Inicio: 11: 00 am
Hora Finalización: 12:00 m

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
   - ✔ Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479.
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

Verificación del Quórum

El señor Luis José Baena, Profesional Universitario Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural, Yudi Garzón, coordinadora del CCBA.

1. Lectura del acta anterior:

Se cuenta con acta revisada, firmada y aprobada de la reunión anterior.

2. Revisión de Compromisos anteriores

Se revisaron los compromisos dejados en la reunión anterior a los cuales se les dio cabal cumplimiento.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Estado del compromiso
1	Enviar programación de eventos programados por el CCBA en el mes de noviembre	Equipo CCBA	7/11/2023	Compromiso Cumplido
2	Presentación del sexto informe de ejecución.	Equipo CCBA	7/11/2023	Compromiso Cumplido
3	Programación de la octava reunión del comité técnico	Equipo CCBA	28/11/2023	Compromiso Cumplido

Los compromisos fueron enviados a través de correo electrónico al señor Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural.

3. Temas Tratados

✔ **Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479**: se socializan las actividades ejecutadas en el mes de noviembre y los primeros 7 días de diciembre tanto en los componentes técnicos, como en los compromisos administrativos.

A continuación, se van a enmarcar las actividades y los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el mes de noviembre

Componente: Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza – relacionamiento de los actores
a. Garantizar el funcionamiento de la gerencia de la iniciativa clúster.
b. Garantizar las actividades de la secretaria técnica de la iniciativa clúster.
c. Operatividad del comité estratégico departamental.
d. Continuidad y consolidación de las mesas operativas (mesa de innovación, mesa de desarrollo de mercados y mesa de producción sostenible).
e. Plan de apropiación social y comunicacional.

Durante el mes de noviembre se desarrolla el informe del plan de apropiación social y comunicacional, se realiza la última reunión de la secretaria técnica y última reunión del comité estratégico. Además, se realiza la jornada de innovación que reemplaza las mesas de innovación y desarrollo de mercado decisión que se toma en la segunda reunión de la secretaria técnica.

Componente: Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad.
a. Eventos de apropiación del conocimiento con el fin de generar capacidades para la diferenciación en la producción y/o comercialización.

Durante el mes de noviembre se desarrolla el ultimo evento de apropiación del conocimiento. Este se realiza el martes 28 de noviembre en la Hacienda Palonegro ubicada en el municipio de Puerto Berrío donde hablamos de Buenas prácticas ganaderas.

Componente: Estrategia de conexión comercial entre los actores de la cadena.
a. Realización de eventos de conexión comercial con clientes y canales regionales y departamentales. Ruedas de Negocio y/o espacios comerciales.

Durante el mes de noviembre se realiza las tres jornadas de ruedas comerciales. Grandes Superficies, Plantas de beneficio y Carnicerías y Canal HORECA. Estas jornadas se realizaron en la ciudad de Medellín en las instalaciones de la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia los días 1,2 y 3 de noviembre.

Componente: Procesos de apropiación social del conocimiento con los actores de la cadena cárnica departamental.
a. Eventos de promoción y educación en el consumo de carne bovina y bufalina.

El sábado 4 de noviembre se realizó el ultimo evento de promoción y educación al consumo de carne bovina y bufalina realizado en el centro comercial puerta del norte ubicado en el municipio de Bello.

Las evidencias de estos eventos fueron entregadas en el informe de gestión numero siete (7) el cual se extendió hasta el 4 de noviembre.

COMPONENTE TECNICO:

1. **Componente Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza-Relacionamiento de los actores.**: las actividades realizadas fueron la siguientes.

    - Informe Séptimo (7) y octavo (8) de la gerencia de la iniciativa clúster.
    - Acta de secretaría técnica
    - Acta Comité estratégico
    - Informe final detallado de lo ejecutado en el CCBA
    - Creación de 34 piezas graficas
    - Creación de video con temas de interés para el CCBA.
    - Emisión de una pauta televisiva en Tele Antioquia para socializar el CCBA.

Este componente en su totalidad a fecha de presentación del informe de seguimiento alcanza un acumulado del 100% de ejecución.

2. **Componente Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad:** Las actividades realizadas fueron la siguientes.

    - Se realizan una (1) jornada de campo en la subregión del Magdalena Medio (Puerto Berrio)

Este componente alcanza un acumulado en su ejecución del 100% para el presente informe.

3. **Componente Estrategias de conexión comercial entre los actores de la cadena.**

Este componente para el mes de octubre quedo con el 100% de ejecución.

4. **Componente Procesos de apropiación social del conocimiento con los actores de la cadena cárnica del departamento.**

- Evento de socialización del proyecto (evento de cierre)
- informe del evento realizado.

Este componente alcanza un acumulado en su ejecución del 100% para el presente informe.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

- Se presenta la certificación del pago de seguridad social con sus planillas.
- Se presenta el septimo informe de seguimiento correspondiente al mes de octubre y los primeros cuatro días de noviembre
- En todos los eventos realizados se ha garantizado la visibilidad y apoyo del Departamento de Antioquia con el contrato.
- Se ha venido cumpliendo con los establecido en la ordenanza 01 de 2020 y con la ley 2046 de 2020 sobre compras publicas locales de alimentos.
- Aplicación de la ley 2046 compras publicas locales de alimentos; se solicita que, a la certificación presentada por los proveedores, se le agregue la información de los pequeños productores que venden los insumos (nombre, cedula y teléfono), para verificar si ya están registrados en la plataforma que tiene disponible la secretaria de agricultura de acuerdo a la ley o si no están para ayudarles en el proceso de registro.

Este componente se viene cumpliendo sin inconveniente alguno.

4. Proposiciones y Varios

Durante la reunión se aprueba la propuesta de alargar el informe del mes de noviembre, terminando este hasta el 7 de diciembre; esto teniendo en cuenta que se han programado unas actividades importantes para la primera semana de diciembre, en esta fecha se estaria dando terminación a todas las actividades contempladas en el contrato, por lo cual también se puede presentar el acta de terminación.

Estas actividades son propiamente (secretaria técnica y evento de cierre)
Con estos eventos que se ejecuten se estaría cumpliendo con lo establecido para desembolsar el cuarto y último pago.

5. Compromisos pactados


No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Presentación del séptimo informe de ejecución.	Equipo CCBA	7/12/2023	Conocer los avances en la ejecución del contrato.
2	Presentar la factura del cuarto y ultimo pago	Equipo CCBA	7/12/2023	Tramite del ultimo pago
3	Presentar el informe del cierre del proyecto	Equipo CCBA	7/12/2023	Conocer las conclusiones y resultados de la ejecución del contrato.

Agotados los temas se da por terminada la reunión del comité técnico a las 12:00 m, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen.

Anexo

Listado de asistencia Reunión virtual – Plataforma TEAMS.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN 8	Código: FO-M1-P5-005 Versión: 02 Fecha de aprobación: 25/06/2018

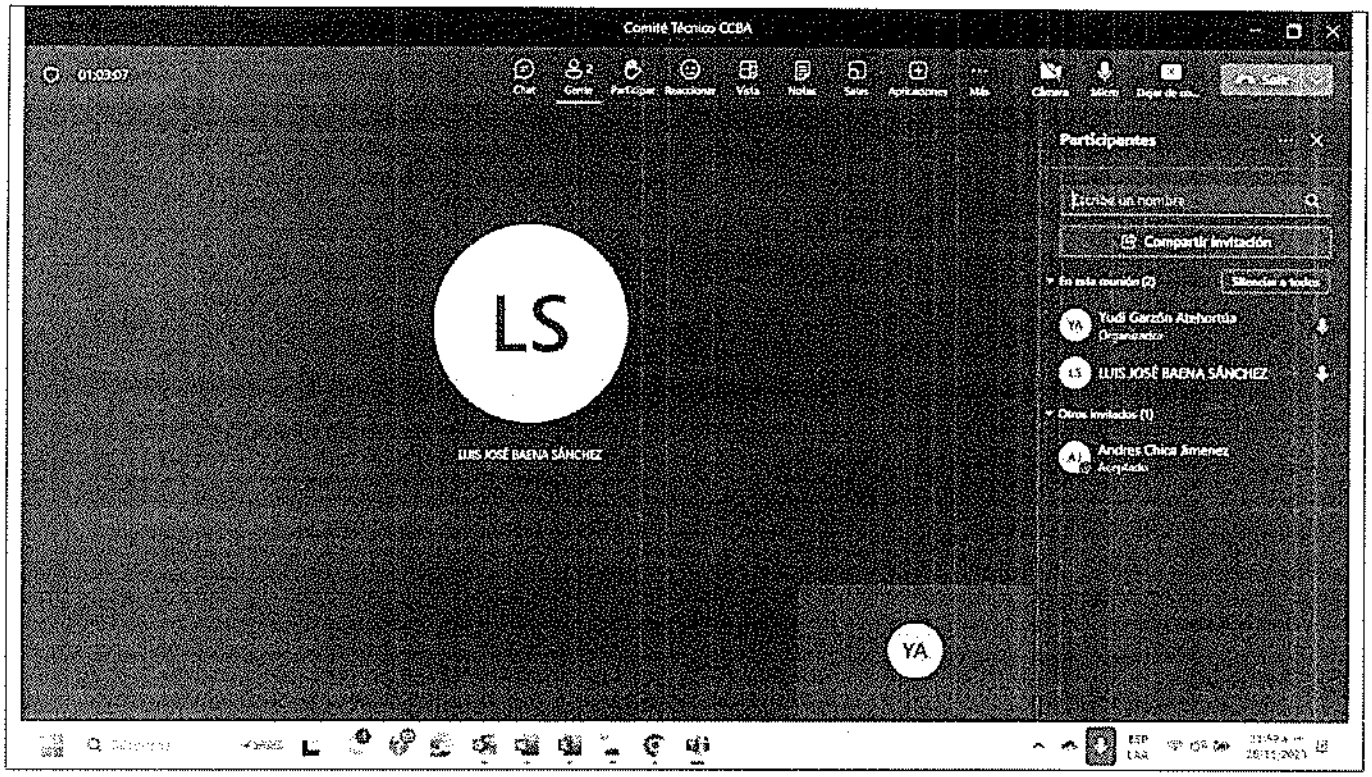

Firma de quien elabora

Yudi Garzón Atehortúa

Firma de quien revisa y aprueba

Luis José Baena Sánchez
