INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2317 DE 2022, MAICAO – LA GUAJIRA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	MAICAO LA GUAJIRA		
BENEFICIARIO:	MAICAO – LA GUAJIRA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 4.129.431.050	
	APORTES ENTE TERRITORIAL	$ 1.032.357.762	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 5.161.788.812	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/10/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR	27/12/2022	19/02/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA	17/01/2023	A LA FECHA
	HAVID NUMA MARCHENA	07/02/2023	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.170022	28/12/2022	$1.858.243.973,00
	No.16923	20/01/2023	$2.271.187.077,00
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.23222	28/12/2022	$2.271.187.077,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.N/A	DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3524294-9	29/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	$		
VALOR INTERVENTORÍA	$		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y a la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de la póliza.	NO APLICA	28/12/2022	$ 1.858.243.973
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 40% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	40%	DD/MM/AAAA	$ 1.032.357.763
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor.	70%	DD/MM/AAAA	$ 825.886.210
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON", debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 412.943.104
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.858.243.973
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

ESTADO CUENTA BANCARIA DEL MES DE MARZO DE 2022	
Saldo inicial	$ 1.858.243.973,00
Abono entidad territorial	$ 1.032.357.762,00
Rendimientos financieros marzo	$ 231.705,00
Saldo total	$ 2.890.817.221,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3524294-9	Cumplimiento	$ 1.032.357.762,00	29/12/2022	29/04/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			

PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 10/03/2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		x
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	x	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023

En atención al seguimiento a la ejecución del cronograma y dando cumplimiento a las actividades propuestas para el correcto desarrollo del proyecto, para el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:

El 03 de marzo se recibe vía correo electrónico el informe de supervisión de los meses de diciembre de 2022 y de enero de 2023 por parte del municipio. (se anexa correo e informes)

El 07 de marzo el municipio envía vía correo electrónico oficio con asunto: "*RESPUESTA A ALERTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2317-2022*". (se anexa correo y oficio)

El 07 de marzo se envía correo electrónico al municipio con asunto: "*CONVENIO 2317-2022 PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS Y ENVIO DE INFORME",* donde la supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita

evidencias de la publicación en SECOP del contrato de interventoría de Estudios y Diseños, Implementación, y el informe de supervisión por parte del municipio del mes de febrero de 2023. (se anexa correo) El 07 de marzo el municipio abre proceso de contratación en la plataforma SECOP, para la ejecución de la interventoría de los Estudios y Diseños e Implementación, enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13547047&g-recaptcharesponse=03AFY_a8VdU10xSsiquAvuqLqdcebuHGN8MU1bR0PS-ZZylfQYnZ_e_S_RJeg--0HJzQVBi7VMVoL1W0WMtkuvYBIz051YqIcVB7aUO56y_bsbnfyPvE1taAYUiKuAqDJ4AF2giYehfj9fvaIKK El 10 de marzo se realiza reunión de reunión virtual de seguimiento contrato 2317-2022. para revisión de ejecución del cronograma. (se anexa acta de reunión) El 10 de marzo se recibe vía correo electrónico el informe de supervisión del mes de febrero de 2023 por parte del municipio. (se anexa correo e informe)
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: El convenio está pendiente de adjudicación de procesos de Estudios y Diseños, Implementación e Interventoría.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA Supervisor Convenio No. 2317 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	**EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA** Apoyo a la supervisión Convenio No. 2317 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON
HAVID NUMA MARCHENA Apoyo a la supervisión Convenio No. 2317 de 2022 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana- FONSECON	

Fwd: Infromes Ajustados

secretariadegobierno maicao-laguajira <secretariadegobierno@maicao-laguajira.gov.co>
Vie 03/03/2023 16:45

Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>;Faiver Rivera Montes <faiver.rivera@mininterior.gov.co>;Edgar Mauricio Sanchez Pita <edgar.sanchez@mininterior.gov.co>

CC: Steven Salom <salom.gobierno@gmail.com>

2 archivos adjuntos (5 MB)

informe Enero Convenio n° 2317 2022.pdf; informe Diciembre Convenio n° 2317 2022.pdf;

--

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Maicao - La Guajira

INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS - FONSECON

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2317 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MAICAO (GUAJIRA)

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO:

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Carrera 15 No. 16-17 Estación de Policía Maicao	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	
NIT	892120020-9	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.161.788.812,00
	80 % MININTERIOR	$ 4.129.431.050,00
	20% MUNIICPIO MAICAO	$ 1. 032.357.762
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28 DE DIEMBRE DE 2022**	
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	**28 DE OCTUBRE DE 2023**	
PLAZO DE EJEECUCIÓN DEL CONVENIO	10 meses	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS – Secretario de Gobierno Municipal	
APOYO A LA SUPERVISIÓNOR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	N/A	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	**NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR** - SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	**HAVID ALEXANDER NUMA MARCHENA** - INGENIERO SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA **EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA** – INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN **FAIVER RIVERA MONTES** – INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N° 92722 de fecha 23 de diciembre de 2022	
RUBRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA–FONSECON	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA MININTERIOR	No. 2-2022-060095 del 14 de DICIEMBRE de 2022	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	No. 2202230009 de fecha 23 de febrero de 2022 por valor de $ 940.184.361.	

	No. 2211150001 de fecha 15 de noviembre de 2022 por valor de $ 92.173.401.
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**28 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**28 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	**N/A**
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 169.844.275
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78.257.956
VALOR INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACION	$ 248.770.074
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	$ 4.664.916.507
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA/CONVENIDO	
NIT	
REPRESENTANTE LEGAL	
C.C.	

2. BALANCE TECNICO - JURIDICO - ADMINISTRATIVO:

- **GARANTIAS:** PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTERADMINISTRATIVO **N° 3524294-9,** DE LA EMPRESA DE SEGUROS **SUDAMERICANA** A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON CON NIT. 830.114.475-6. EL CUAL FUE APROBADO SU PAGO POR EL MUNICIPIO MEDIANTE **LA RESOLUCIÓN N° 1434** DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022, Y PARA EFECTO DEL CUAL, SE APROPIÓ POR MEDIO DEL **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 2212280002**, CON CARGO AL **RUBRO 2102022-07**, DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2022, EL VALOR CORRESPONDIENTE A DICHA PÓLIZA.

PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3524294-9	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT. 890.903.407-9	CUMPLIMIENTO	$15.000.000	29 de diciembre del 2022	29 de abril del 2024

INFORME PARCIAL DE ENERO 2023	SI	NO
INFORME MENSUAL	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0	

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO		
#	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**COMENTARIO**
1	Se hace la designación de supervisión del convenio N° 2317/2022 por parte de la Alcaldía de Maicao, el día treinta (30) de diciembre del 2022, mediante el cual se delega dicha función al Secretario de Gobierno Municipal, el Dr. SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS.	Esta designación es enviada al Ministerio del Interior como notificación de la misma en cumplimiento a la **CLAUSULA SEGUNDA** del convenio: **Obligaciones del Municipio**; **literal 1**: Designar un profesional idóneo como supervisor para el convenio y de los contratos derivados del mismo.
2	Suscripción del Acta de Inicio del Convenio.	Esto, en cumplimiento a la **CLAUSULA SEXTA** del convenio: **FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**; El MINISTERIO desembolsará los recursos al municipio previa presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte del representante legal. Y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: **A.** Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza.
3	Aprobación de Póliza de Cumplimiento a favor del ministerio DEL INTERIOR - FONSECON	

3. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE:

Para el manejo de los recursos provenientes del **MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON** en cumplimiento al **convenio 2317/2022**, el municipio hizo la apertura de la **Cuenta de Ahorros N° 00130466000200464435** denominada CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (SIES) EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, en el banco **BBVA.**

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO DE DESEMBOLSOS	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
				$
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0%

Se allega el informe de movimientos que presenta la Cuenta de Ahorros destinada para el Convenio, según documentación adjunta entregada por el área de tesorería del municipio de Maicao y que hace parte integral del presente informe.

DETALLE DE TRANSACCIONES	FECHA (DD/MM/AA)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
Apertura de la cuenta	02/03/2022			$ 0
Abono – Desembolso del Ministerio del Interior		$ 0		$ 0

- **DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:**

Por no contar con el personal idóneo en la Secretaria de Gobierno y participación ciudadana municipal, respecto al conocimiento técnico y tecnológico que amerita la correcta ejecución del convenio en la implementación del CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (SIES) EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, se está pendiente de la designación del apoyo a la supervisión técnica requerida, por parte del Ente Territorial.

4. **SUPERVISOR:**

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Maicao, siendo el diez (10) de enero del 2023.

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor del Convenio 2317-2022
Maicao, La Guajira

Se Anexan (3) Folios

ANEXO #1: Póliza de cumplimiento.
ANEXO #2: Certificación de la cuenta de ahorros para manejo de los recursos provenientes del MINISTERIO DEL INTERIOR.
ANEXO #3: Designación de supervisor del Convenio por parte del Municipio.

MUNICIPIO DE MAICAO .
.
CLL 13 # 11-36 ALCALDIA MAICAO .
MAICAO LA GUAJIRA- COLOMBIA

9870 2962 Oficina: 0466

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

MAICAO
DIRECCIÓN: CRA 9 13 19
TELEFONO: 00957268751

PERIODO DESDE: 01-12-2022 HASTA: 31-12-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130466020046435
Fecha de corte	31-12-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	21-12-2022	21-12-2022	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		0.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

El futuro es de todos	**FORMATO** **ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO** **ANEXO 2**	**Código: GC-P3-F2** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

FECHA	27/12/2022
CIUDAD	Bogotá D.C
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	2317-22
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.
VALOR	$5´161.788.812
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	Mohamad Jaafar Dasuki Hajj
C.C. O NIT	84072614
NOMBRE SUPERVISOR	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
C.C.	79647835
PLAZO INICIAL	26/10/2023
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA
FECHA DE INICIO	27/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato y/o convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienenen ella.

Mohamad Jaafar Dasuki Hajj ALCALDE MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR SUPERVISOR DEL CONVENIO

Maicao, 30 de diciembre de 2022

Recibí Santander Restrepo 10:30 AM 30/12/22

Señor:
SANTANDER RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal.

Asunto: COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2317 DEL 2022, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.

El suscrito, en calidad de Ordenador del Gasto me permito comunicarle que ha sido designado como Supervisor del siguiente negocio jurídico:

CONVENIO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	OBJETO
2317 DEL 2022	MINISTERIO DEL INTERIOR	MUNICIPIO DE MAICAO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO

En su actuación como Supervisor, está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, en los términos de la Constitución y la Ley. Adicionalmente, estará obligado a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que definan las partes respecto de los asuntos referidos a la ejecución contractual y la etapa postcontractual, para el control, vigilancia y seguimiento técnico, financiero, contable y jurídico del Convenio.

El Supervisor está obligado a expedir los informes de supervisión y demás documentos de la ejecución contractual los cuales deberán presentarse dentro del término que se señale en el clausulado contractual o cuando sea requerido por el Ordenador del Gasto o el Supervisor Designado por la Entidad Contratante.

Dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, de las obligaciones y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar al Ordenador del Gasto del Municipio, la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaria General Municipal, de cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del Contrato o Convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratante, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes señaladas en el respectivo convenio.

Sea esta la oportunidad para reiterarle que la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaria General Municipal le brindará el apoyo y asesoría que requiera para la Supervisión designada.

Atentamente,

MOHAMAD JAAFAR DASUKI HAJJ
Alcalde Municipal

Proyecto: Antonio Hernández Issa – Abogado Contratista

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
TUNJA, 29 DE DICIEMBRE DE 2022	3524294-9		14679679
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ELAR SEGUROS LTDA	80765	2529	01214679679

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
8921200209	MUNICIPIO DE MAICAO		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CARRERA 43B 16 41		MEDELLIN	4482181

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
8921200209	MUNICIPIO DE MAICAO

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8301144756	MINISTERIO DEL INTERIOR / LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-DIC-2022	29-ABR-2024	1.032.357.762,00	13.774.198,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
29-DIC-2022	29-ABR-2024	487	29-DIC-2022	29-ABR-2024	$13.774.198	$2.617.098	$16.391.296

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$1.032.357.762	$10.323.578	$1.032.357.762,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 – NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2529	984266	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80765	ELAR SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	13.774.198

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 – 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 – 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2317 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MAICAO GUAJIRA, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO
SE ACLARA QUE EL ASEGURADO Y BENEFICIARIO EN EL PRESENTE CONVENIO ES LA NACION¿MINISTERIO DEL INTERIOR¿FONSECON NIT: 830.114.475¿6
NOTAS:
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, PROFORMA F 01 12 084 N 01 012 011G

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS - FONSECON

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2317 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MAICAO (GUAJIRA)

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO:

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Carrera 15 No. 16-17 Estación de Policía Maicao	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	
NIT	892120020-9	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.161.788.812,00
	80 % MININTERIOR	$ 4.129.431.050,00
	20% MUNIICPIO MAICAO	$ 1. 032.357.762
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28 DE DIEMBRE DE 2022**	
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	**28 DE OCTUBRE DE 2023**	
PLAZO DE EJEECUCIÓN DEL CONVENIO	10 meses	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS – Secretario de Gobierno Municipal	
APOYO A LA SUPERVISIÓNOR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	N/A	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	**NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR** - SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	**HAVID ALEXANDER NUMA MARCHENA** - INGENIERO SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA **EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA** – INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN **FAIVER RIVERA MONTES** – INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N° 92722 de fecha 23 de diciembre de 2022	
RUBRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA–FONSECON	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA MININTERIOR	No. 2-2022-060095 del 14 de DICIEMBRE de 2022	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	No. 2202230009 de fecha 23 de febrero de 2022 por valor de $ 940.184.361. No. 2211150001 de fecha 15 de noviembre de 2022 por valor de $ 92.173.401.	

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**28 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**28 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	**N/A**
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 169.844.275
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78.257.956
VALOR INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACION	$ 248.770.074
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	$ 4.664.916.507
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA/CONVENIDO	
NIT	
REPRESENTANTE LEGAL	
C.C.	

2. BALANCE TECNICO – JURIDICO - ADMINISTRATIVO:

INFORME PARCIAL DE ENERO 2023	SI	NO
INFORME MENSUAL	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0	

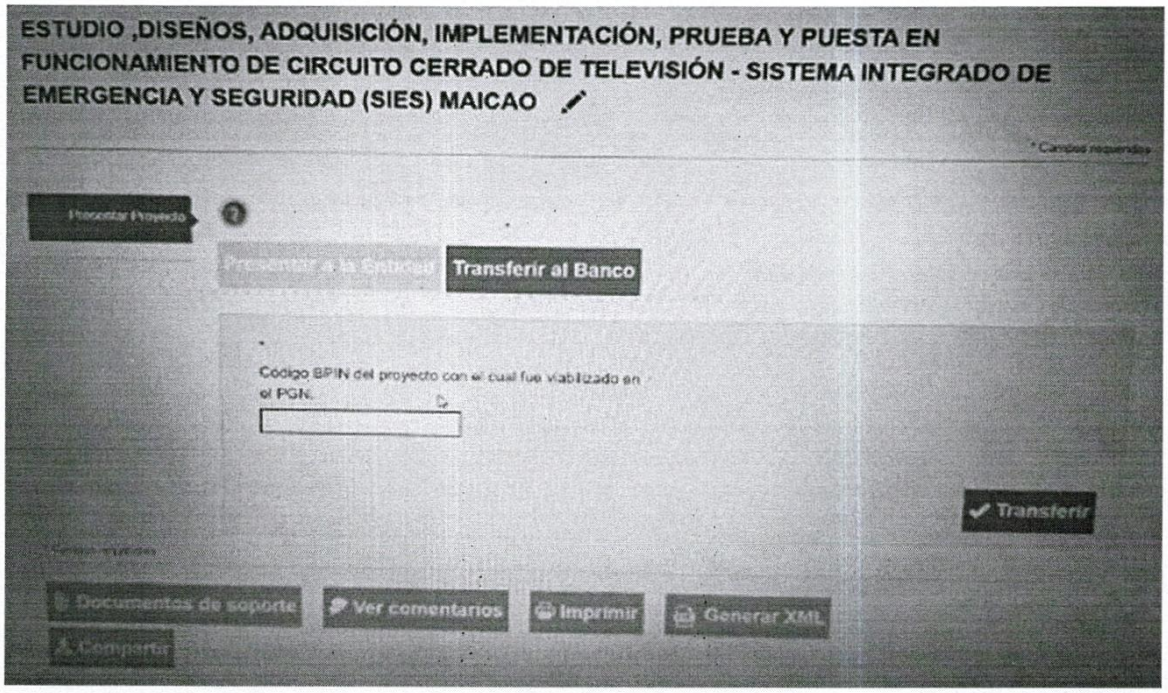
ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO		
#	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**COMENTARIO**
1	Estructuración del Cronograma de Actividades de Ejecución del Convenio. Este cronograma fue enviado al Ministerio para su revisión y posterior aprobación. Mediante una mesa técnica de seguimiento por parte de los Apoyo a la Supervisión del Ministerio, se hicieron los ajustes pertinentes al Cronograma.	Estos se enviaron para revisión y aprobación por parte del Ministerio del Interior, en cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA del convenio: Obligaciones del Municipio; literal 3: Presentar al MINISTERIO - FONSECON, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, un cronograma detallando de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales para la ejecución de los recursos, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el convenio por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR.
2	Se adelantaron los tramites de incorporación de los recursos del convenio, provenientes del Ministerio	Se expidió el Acto Administrativo por concepto de Incorporación de recursos.

	del Interior – FONSECON, al presupuesto municipal.	
3	Se inicio la proyección y estructuración de los estudios previos, pre pliego de condiciones y anexos para el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y la Implementación del CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (SIES) EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.	Están realizando los ajustes pertinentes el área de contratación del municipio.

OBSERVACIONES

- **INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA:**

Aun no se ha publicado el proceso de Licitación Pública de Estudios, Diseños e Implementación. Debido a que se está en estudio la solución del impase presentado con la plataforma del SUIFP TERRITORIO de la MGA (DNP) para la publicación del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, representando un atraso al cumplimiento de las actividades establecidas en el CRONOGRAMA, del cual ya tiene pleno conocimiento el Supervisor del Convenio y los Apoyos a la Supervisión por parte del Ministerio del Interior.



Aclaración: El impase descrito anteriormente, ya se encuentra en sub sanación por parte del profesional del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio de Maicao. Ya se programaron las reuniones previas para consultar las posibles soluciones con acompañamiento del Ministerio del Interior.

DESCRIPCION / MES	M 1 enero	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
ETAPA DE CONTRACTUAL												
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÌA												
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÌA												

3. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE:

Se allega el informe de movimientos que presenta la Cuenta de Ahorros destinada para el Convenio, según documentación adjunta entregada por el área de tesorería del municipio de Maicao y que hace parte integral del presente informe.

DETALLE DE TRANSACCIONES	FECHA (DD/MM/AA)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
Apertura de la cuenta	02/03/2022			$ 0
Abono – Desembolso del Ministerio del Interior		$ 0		$ 0

- **DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:**

Por no contar con el personal idóneo en la Secretaria de Gobierno y participación ciudadana municipal, respecto al conocimiento técnico y tecnológico que amerita la correcta ejecución del convenio en la implementación del CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (SIES) EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, se está pendiente de la designación del apoyo a la supervisión técnica requerida, por parte del Ente Territorial.

4. SUPERVISOR:

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Maicao, siendo el diez (10) de febrero del 2023.

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor del Convenio 2317-2022
Maicao, La Guajira

Se Anexan (2) Folios

ANEXO #1: Certificación de la cuenta de ahorros para manejo de los recursos provenientes del MINISTERIO DEL INTERIOR.
ANEXO #2: Cronograma de Actividades del Convenio.

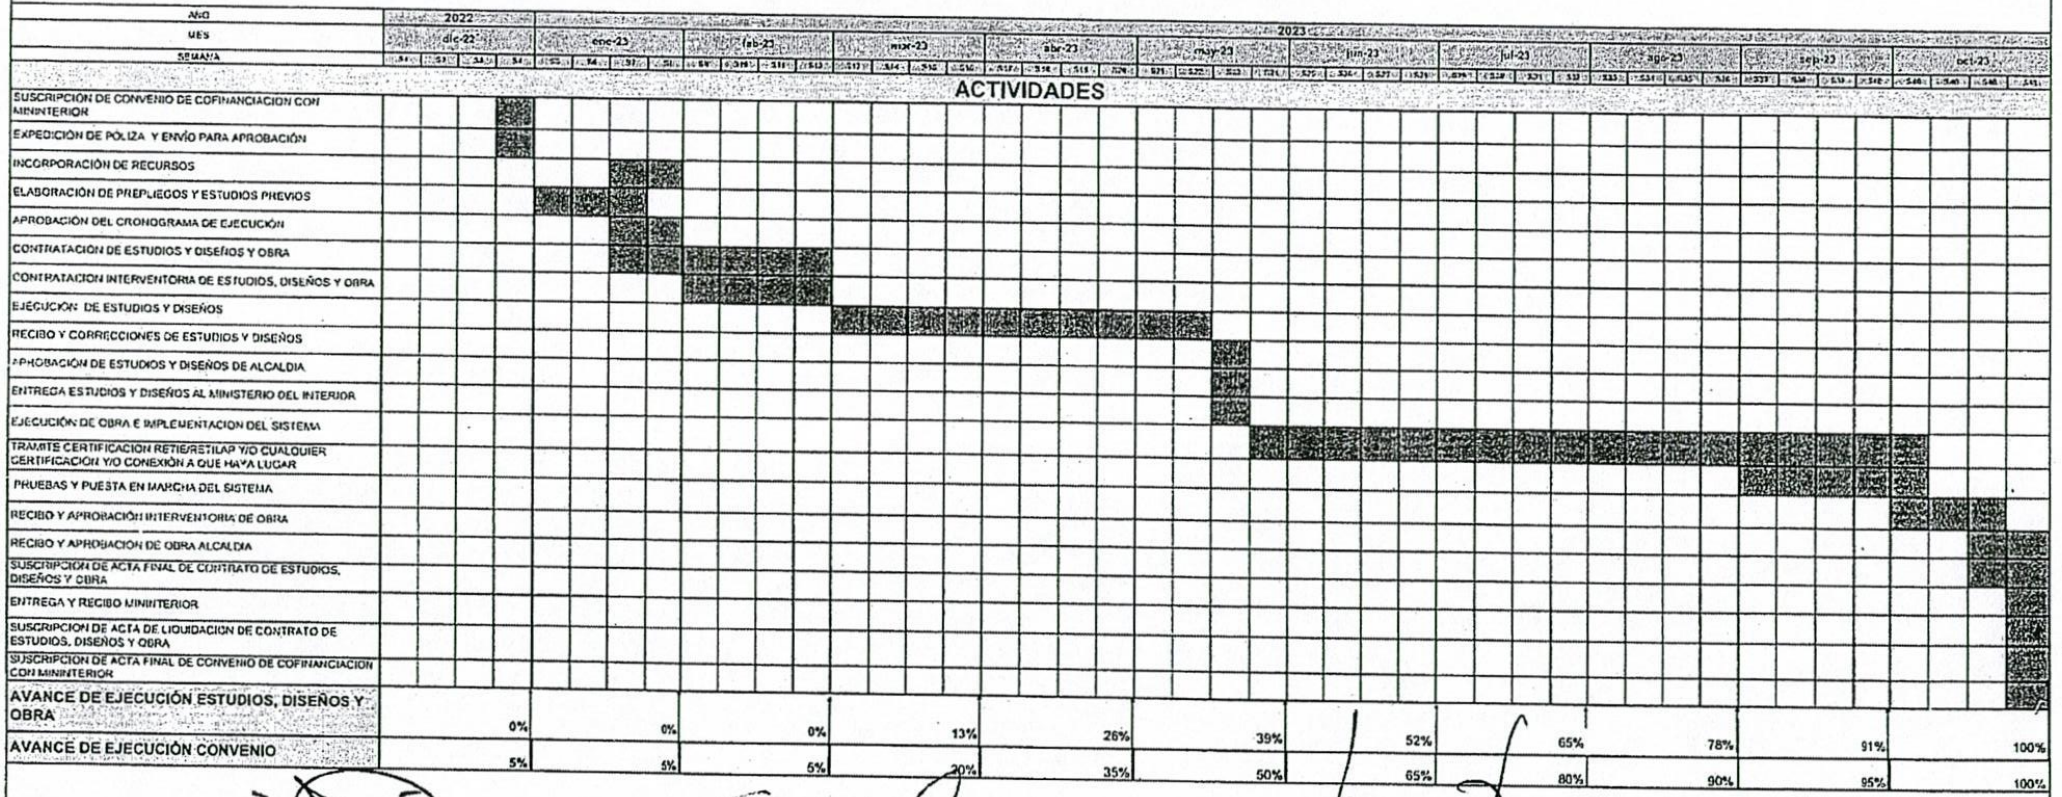
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE MAICAO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO N° 2317 DEL 2022

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO



MOHAMAD JAAFAR DASUKIHAJJ
ALCALDE MUNICIPAL

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
SUPERVISOR CONVENIO - MUNICIPIO

Ing. NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUPERVISOR CONVENIO - MINISTERIO DEL INTERIOR

BBVA

EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2023	SIN MOVMNTOS PERIOD2023-01-012023-01-31	01-01-2023		

PERIODO: Desde 01-01-2023 **Hasta** 31-01-2023

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Nuevo Saldo .00

TITULAR
MUNICIPIO DE MAICAO

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
MAICAO	31-01-2023	0013	0466	60	0200464435	1

Circuito cerrado de TV.

2039

RESPUESTA ALERTA MINISTERIO

secretariadegobierno maicao-laguajira <secretariadegobierno@maicao-laguajira.gov.co>
Mar 07/03/2023 19:06

Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>;Faiver Rivera Montes <faiver.rivera@mininterior.gov.co>;Edgar Mauricio Sanchez Pita <edgar.sanchez@mininterior.gov.co>

CC: Steven Salom <salom.gobierno@gmail.com>

1 archivos adjuntos (366 KB)

Respuesta Alerta de Ministerio.pdf;

--

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Maicao - La Guajira

Maicao, 07 de marzo del 2023

Señores

NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor del Convenio N° 2317/2022
Ministerio del Interior

HAVID ALEXANDER NUMA MARCHENA
INGENIERO - SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Apoyo a la Supervisión del Convenio N° 2317/2022
havid.numa@mininterior.gov.co
Ministerio del Interior

REF. RESPUESTA A ALERTA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2317 DE 2022.

Cordial Saludo,

De conformidad a la Alerta por posible incumplimiento al cronograma, remitida por su despacho, en condición de supervisor del Convenio Interadministrativo **N° 2317 DE 2022**, entre el Ministerio del Interior y el municipio de Maicao, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO",** le hago claridad de lo siguiente:

Para la primera observación, es de su conocimiento, toda vez que fue elevado a consulta en las reuniones virtuales realizadas, así como de forma escrita mediante correo electrónico, de los que existe constancia en las actas levantadas y en su correo electrónico, que el Municipio solicito en múltiples ocasiones el Código del Presupuesto General de la Nación por medio del cual la Nación (Min. Hacienda) asigno los recursos de cofinanciación, el cual era requerido por la plataforma SUIFP TERRITORIO de la MGA (DNP) para la viabilizacion de la publicación en SECOP I, de los procesos de contratación derivados del proyecto a cofinanciar por parte del Ministerio y el Municipio. Estas consultas, a pesar que fueron atendidas, no generaron la solución inmediata del impase, ocasionando un retraso en el Cronograma aprobado para la ejecución del Convenio.

La dificultad descrita anteriormente, fue superada mediante gestion y tramite por parte del profesional del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio de Maicao y los procesos de contratación que se derivan del Convenio Interadministrativo, se encuentran debidamente publicados en el SECOP. Es importante recalcar que el Municipio, se encuentra adelantando gestiones que favorecerán la rápida ejecución de los contratos derivados del convenio, con el propósito de recuperar tiempo perdido y de esta manera poder cumplir con los plazos de ejecución del convenio según el cronograma aprobado.

Con respecto a la segunda observación enunciada en la alerta, sobre el posible incumplimiento de acuerdo al **numeral 13** de la **Cláusula Segunda OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO** que entre otras cosas establece: "13. Elaborar y presentar al MINISTERIO - FONSECON, dentro de los primeros **diez (10)** días hábiles de cada mes,

iniciando en el mes siguiente a la fecha de perfeccionamiento del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma previamente presentado", a la fecha no se han recibido por parte del Municipio los Informes de supervisión de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Permito presentar las excusas por los atrasos presentados en los tiempos de la presentación de los informes técnico, administrativo y financiero por parte de mi supervisión; los cuales ya fueron enviados al Ministerio con los soportes y anexos requeridos para los mismos. Le reitero mi compromiso por propender al cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la suscripción del Convenio en cuestión como el Supervisor designado por parte del Municipio de Maicao.

Hago la claridad que el próximo informe de ejecución correspondiente al mes de febrero, se enviara dentro de los términos expuestos por el convenio.



Correo enviado de los informes técnicos ajustados, correspondientes al mes de diciembre del 2022 y a enero del 2023.

Habiendo atendido dentro del plazo provisto a su solicito, me despido agradeciendo de ante mano su comprensión y atención prestada.

Como constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Maicao - La Guajira, siendo el día seis (6) de marzo del 2023.

Cordialmente,

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor del Convenio Nº2317/2022

Re: CONVENIO 2317-2022 PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATOS DERIVADOS Y ENVÍO DE INFORME

Alcaldia De Maicao <alcaldia@maicao-laguajira.gov.co>
Mié 08/03/2023 10:59
Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>

El mar, 7 mar 2023 a las 18:38, Havid Alexander Numa Marchena (<havid.numa@mininterior.gov.co>) escribió:

> **Buenos tardes, de acuerdo con el cronograma presentado por el municipio y aprobado por el Ministerio del Interior en ejecución del convenio No. 2317 de 2022 y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 de la CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: I. ESPECIFICAS. "El Municipio deberá realizar todas las gestiones necesarias para dar inicio a los procesos de contratación con terceros que se requieran para el desarrollo del objeto del convenio, de conformidad con los cronogramas presentados".**
>
> **13. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma de Contrato previamente presentado.**
>
> **En ese sentido se solicita se informe de acuerdo con la ejecución del cronograma, la fecha de publicación del proceso de interventoría de estudios y diseños e implementación y el envío de los informes de supervisión del mes febrero 2023 del convenio No. 2317 de 2022**
>
> Cordialmente,
>
> **HAVID NUMA MARCHENA**
> **INGENIERO - SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA**
> havid.numa@mininterior.gov.co
> PBX: +571 2427400 ext 2026
> Cel.3007119840
> Carrera 8 Nº 12B -31
> Bogotá, D.C., Colombia
>
> **https://www.mininterior.gov.co**

--

Buenos días,

Confirmamos recibido y traslado al area pertinente.

Despacho Municipal - Alcaldía de Maicao
Calle 12 # 11-36 Centro Administrativo Municipal
Maicao -La Guajira



El futuro es de todos Mininterior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	06– Reunión Virtual
FECHA	10/03/2023
CIUDAD	N/A
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2317 -2022
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

EL 27/12/2022 SE SUSCRIBE EL CONTRATO No. 2317-22
EL 27/12/2022 SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
APORTES MINISTERIO: $4.129.431.050
APORTES MUNICIPIO: $1.858.243.973
VALOR DEL CONTRAO $5.161.788.812

DESARROLLO DE LA REUNION

Reunión de Seguimiento Contrato No. 2317 - 2022

ORDEN DEL DIA

En la mesa trabajo se trataron los siguientes temas:

1. Presentación de los asistentes a la mesa de trabajo, que integran el grupo de supervisión y apoyo a la supervisión; del contrato, tanto del Municipio como del Ministerio.

2. Se establece un seguimiento semanal con personal del municipio de Maicao- La Guajira, con el fin de revisar los hitos del cronograma en la línea de tiempo, para la ejecución del contrato.

3. El municipio manifiesta que ya realizo la publicación del proceso de interventoría.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13547047&g-recaptcha-response=03AFY_a8VdU10xSsiquAvuqLqdcebuHGN8MU1bR0PS-ZZylfQYnZ_e_S_RJeg--0HJzQVBi7VMV-oL1W0WMtkuvYBIz051YqIcVB7aUO56y_bsbnfyPvE1taAYUiKuAqDJ4AF2giYehfj9fvaIKK

4. El municipio solicita enviar las actas de reuniones que se han realizado y de la designación de supervisor del ministerio.

MINISTERIO DEL INTERIOR

- EDGAR MAURICIO SANCHEZ PITA- APOYO A LA SUPERVISIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR
- HAVID NUMA MARCHENA- APOYO A LA SUPERVISIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR

MUNICIPIO DE MAICAO- LA GUAJIRA

- VANESA GUERRA-SECRETARIA GENERAL
- ANTONIO HERNANDEZ ISSA
- SANTANDER RESTREPO- SECRETARIO DE GOBIERNO MAICAO (SUPERVISIÓN DEL CONVENIO)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 2317 de 2022: 27 de octubre de 2023

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

FIRMA	
Nombre y firma: Edgar Mauricio Sánchez. Cargo: Apoyo a la Supervisión	**Nombre y firma: Havid Numa Marchena** Cargo: Apoyo a la Supervisión

Fwd: Informe del mes de Febrero del 2023; Convenio No. 2317/2022

secretariadegobierno maicao-laguajira <secretariadegobierno@maicao-laguajira.gov.co>
Vie 10/03/2023 8:25

Para: Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>;Faiver Rivera Montes <faiver.rivera@mininterior.gov.co>;Edgar Mauricio Sanchez Pita <edgar.sanchez@mininterior.gov.co>

CC: Steven Salom <salom.gobierno@gmail.com>

1 archivos adjuntos (4 MB)

Informe de Febrero 2023 - Convenio 2317.pdf;

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Maicao - La Guajira

INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS - FONSECON

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2317 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MAICAO (GUAJIRA)

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO:

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"	
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Carrera 15 No. 16-17 Estación de Policía Maicao	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAICAO	
NIT	892120020-9	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 5.161.788.812,00
	80 % MININTERIOR	$ 4.129.431.050,00
	20% MUNIICPIO MAICAO	$ 1. 032.357.762
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28 DE DIEMBRE DE 2022**	
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	**28 DE OCTUBRE DE 2023**	
PLAZO DE EJEECUCIÓN DEL CONVENIO	10 meses	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	**SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS** – Secretario de Gobierno Municipal	
APOYO A LA SUPERVISIÓNOR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	N/A	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2023	**NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR** - SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO DE 2023	**SERGIO ANDRES VEGA NOVOA** - SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	**HAVID ALEXANDER NUMA MARCHENA** - INGENIERO SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA **EDGAR MAURICIO SÁNCHEZ PITA** – INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN **FAIVER RIVERA MONTES** – INGENIERO APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N° 92722 de fecha 23 de diciembre de 2022	
RUBRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA–FONSECON	

Powered by CamScanner


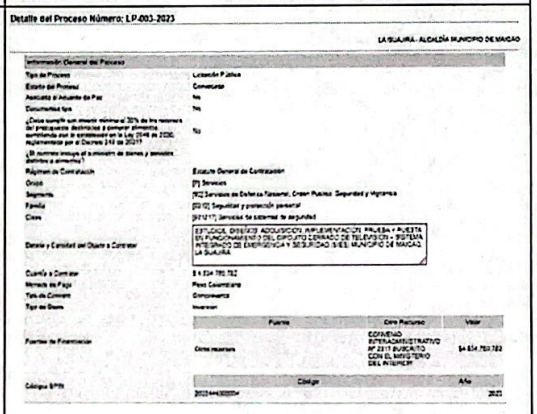
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA MININTERIOR	No. 2-2022-060095 del 14 de DICIEMBRE de 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE TERRITORIAL (ALCALDIA)	No. 2202230009 de fecha 23 de febrero de 2022 por valor de $ 940.184.361. No. 2211150001 de fecha 15 de noviembre de 2022 por valor de $ 92.173.401.
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**28 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**28 DE DICIEMBRE 2022**
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	**N/A**
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 169.844.275
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78.257.956
VALOR INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACION	$ 248.770.074
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA	$ 4.664.916.507
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**
DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA/CONVENIDO	
NIT	
REPRESENTANTE LEGAL	
C.C.	

2. BALANCE TECNICO – JURIDICO - ADMINISTRATIVO:

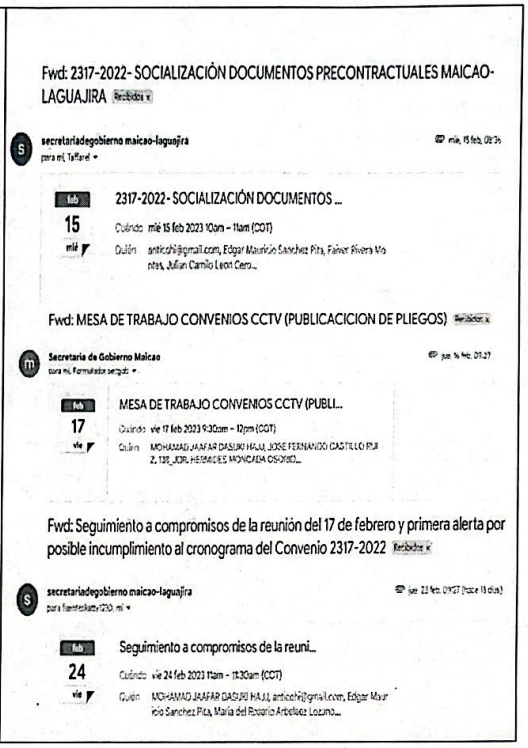
INFORME PARCIAL DE ENERO 2023	SI	NO
INFORME MENSUAL	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$2.890.817.221	

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO		
#	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**COMENTARIO**
1	De conformidad con lo consagrado en el Convenio, en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO I. ESPECÍFICAS**: en el hito **6.** *Revisar la documentación técnica, antes de iniciar los trámites precontractuales, en el caso de presentar inconsistencias en la documentación, deberá realizar los ajustes necesarios a las fichas técnicas, para dar inicio a los respectivos procesos contractuales.*	Se le envió a la supervisión del convenio por parte del Ministerio, los documentos pre contractuales para su respectiva revisión. Posteriormente se realizó una reunión virtual para socializar las observaciones y ajustes pertinentes a los documentos del Proceso de Estudios, Diseños e Implementación, bajo el direccionamiento del Ministerio.

Powered by CamScanner

	Se le presento al Ministerio del Interior los documentos pre contractuales del proceso de Licitación Pública de objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**, por valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($4.834.760.782,00), INCLUIDO IVA.**	
2	Una vez realizados los ajustes pertinentes, se procedió con la publicación de la Licitación Publica en la plataforma del SECOP I. **LP-003-2023.** Fecha de Publicación del Proceso: 17/02/2023 Fecha de cierre del proceso: 16/03/2023 Fecha de Adjudicación del Proceso: 31/03/2023.	
3	Se inicio la proyección y estructuración de los estudios previos, estudios del sector y análisis del riesgo del proceso de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nº LP-003-2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.**	Están realizando los ajustes pertinentes el área de contratación del municipio.

Powered by CamScanner

4	De conformidad con lo consagrado en el Convenio, en la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO I. ESPECÍFICAS:** en el hito **15**. Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio interadministrativo, los cuales se realizarán cuando el MINISTERIO – FONSECON, así lo estimen pertinente. Hemos participado en el transcurso del mes de febrero tres (3) reuniones virtuales a solicitud del Ministerio del Interior, los días: - Miércoles 24/02/2023, a las 10:00 A.M. - Viernes 17/02/2023, a las 09:30 A.M. - Viernes 24/02/2023, a las 11:00 A.M.	

OBSERVACIONES

1. Se está en espera que el Ministerio del Interior a través del supervisor del presente convenio, nos haga llegar las actas de las reuniones virtuales anteriormente mencionadas, y el acta de designación de supervisión del Ingeniero SERGIO ANDRES VEGA NOVOA, el cual se nos informo que, seria el supervisor a partir del 20 de febrero de la presente anualidad.

- **INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA:**

Ya se publicó en la plataforma del SECOP I, el proceso de Licitación Pública de Objeto: **ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES) MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA**. Por un valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($4.834.760.782,00), INCLUIDO IVA.**

Link de publicación del Proceso en la Plataforma del SECOP I:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-228044

DESCRIPCION / MES	M 1 enero	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
ETAPA DE CONTRACTUAL												
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÌA		X	X									
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÌA			X									

Powered by CamScanner

3. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE:

Para el manejo de los recursos provenientes del **MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON** en cumplimiento al convenio **2317/2022**, el municipio hizo la apertura de la Cuenta de Ahorros N° **00130466000200464435** denominada **CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (SIES) EN EL MUNICIPIO DE MAICAO**, en el banco **BBVA**.

Se allega el informe de movimientos que presenta la Cuenta de Ahorros destinada para el Convenio, según documentación adjunta entregada por el área de tesorería del municipio de Maicao y que hace parte integral del presente informe.

DETALLE DE TRANSACCIONES	FECHA (DD/MM/AA)	ABONOS	CARGOS	SALDO
Apertura de la cuenta	02/03/2022			$ 0
Abono – Desembolso del Ministerio del Interior	**09-02-2023**	$ 1.858.243.973		$1.858.243.973
Abono – Desembolso del Ente Territorial (Alcaldía)	**24-02-2023**	$1.032.357.762		$2.890.601.735
Abono Intereses Ganados	**28-02-2023**	$ 231.705		$2.890.833.440
Cargo RETEFUENTE Intereses	**28-02-2023**		$16.219	$2.890.817.221

- **DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:**

Se están adelantando los tramites, por parte del Ente Territorial, con los tramites de selección del personal que cumpla con los requisitos idóneos para vincularlo(a), como apoyo a la supervisión técnica requerida.

4. SUPERVISOR:

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Maicao, siendo el diez (10) de marzo del 2023.

SANTANDER JOSE RESTREPO BARROS
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisor del Convenio 2317-2022
Maicao, La Guajira

Se Anexa (1) Folio

ANEXO #1: Certificación de la cuenta de ahorros para manejo de los recursos provenientes del MINISTERIO DEL INTERIOR.

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE MAICAO .

.

CLL 13 # 11-36 ALCALDIA MAICAO .

MAICAO LA GUAJIRA- COLOMBIA

9183 2775 Oficina: 0466

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

MAICAO

DIRECCIÓN: CRA 9 13 19

TELEFONO: 00957268751

PERIODO DESDE: 01-02-2023 HASTA: 28-02-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001304660200464435
Fecha de corte	28-02-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	2	2,890,601,735.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	14	231,705.00	- RETENCIONES	14	16,219.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		2,890,817,221.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3	09-02-2023	09-02-2023	ABONO DOMI. MINISTERIO DEL INTERIOR		1,858,243,973.00	1,858,243,973.00
26	24-02-2023	24-02-2023	ABONO DOMI. 892120020		1,032,357,762.00	2,890,601,735.00
	28-02-2023	28-02-2023	ABONO INTERESES GANADOS		231,705.00	2,890,833,440.00
	28-02-2023	28-02-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	16,219.00		2,890,817,221.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Fogafín

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Powered by CamScanner
