Acta de supervisión al contrato número **748 - 2023**,
celebrado entre
El Municipio de Villamaría y Estructecnia SAS.

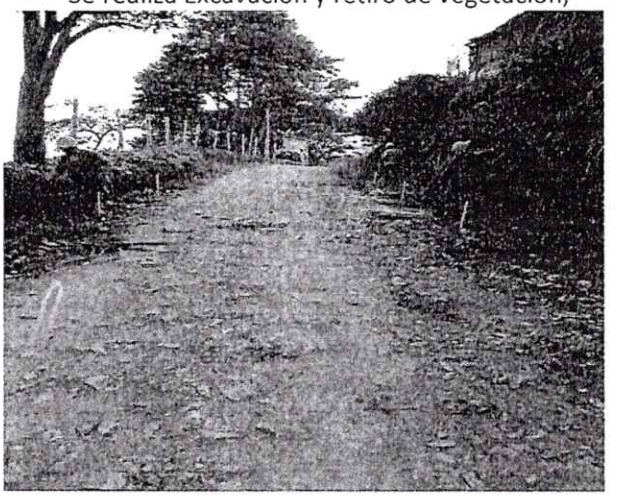
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01
NOVIEMBRE 29 DE 2023

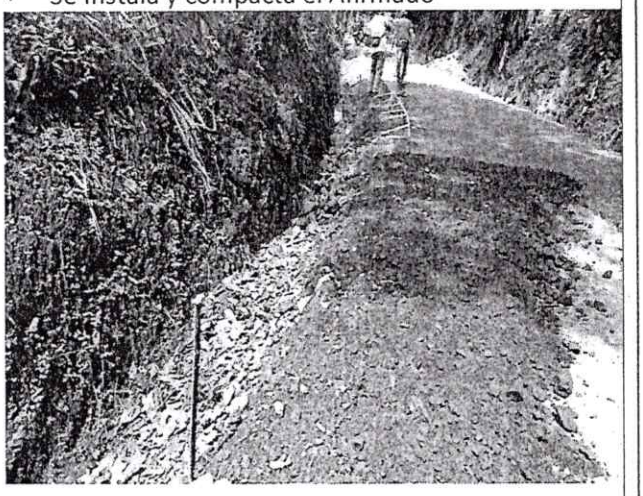
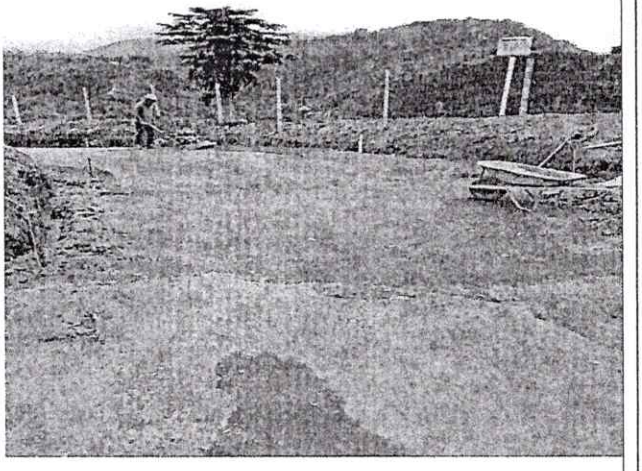
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA	Adición:	**Dinero: N/A**
		Tiempo: N/A
Contratista: ESTRUCTECNIA S.A.S.	**C.C./NIT:** 900.604.040-2	
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA RIO CLARO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA"	**VIGENCIA:** **Desde:** 6 DE OCTUBRE DE 2023 **Hasta:** 6 DE DICIEMBRE DE 2023	
FORMA DE PAGO: Un Anticipo equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato. Cuotas parciales hasta completar el (100%) del valor del contrato, los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que apliqué.		
RUBRO: 16-2.3.2.01.01.001.03.02	**CDP: 695**	**RP: 1844**
Valor a pagar según acta: $90.464.192	**Valor desembolsos efectuados: $96.257.580**	
INFORMACIÓN PARA REPORTAR		
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE, Secretario de infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades durante el periodo comprendido durante los meses de Octubre a Noviembre de 2023, actividades que han sido verificadas y supervisadas, las cuales fueron:		

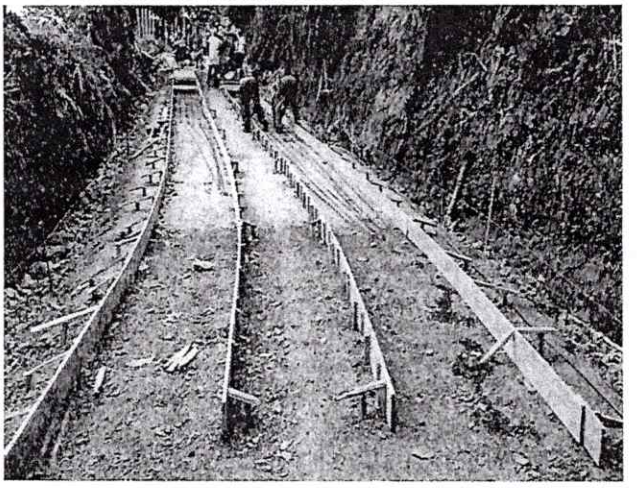
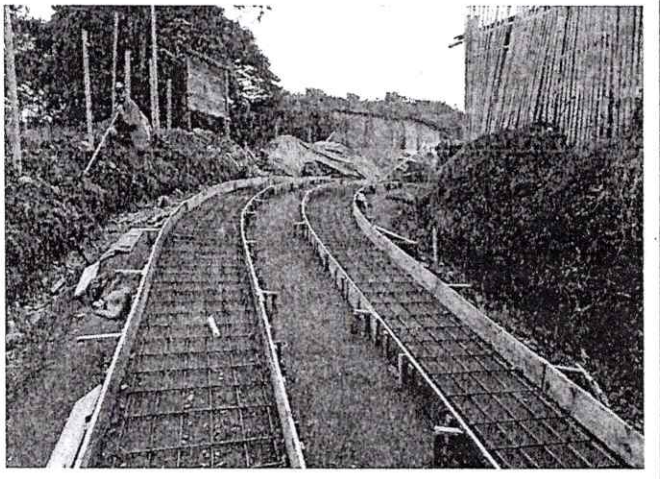
Recibido:

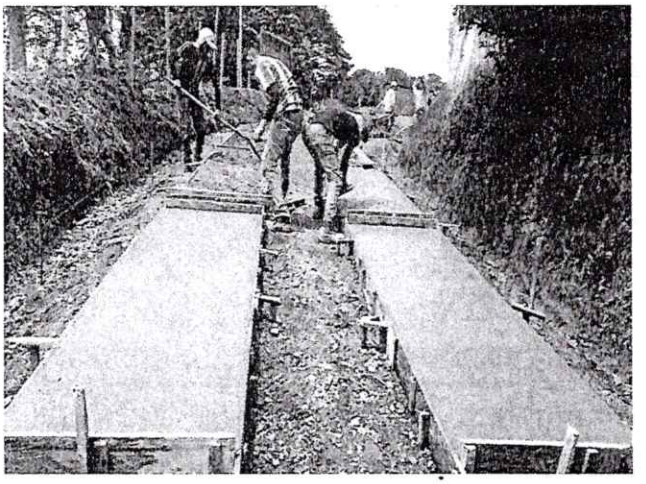
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

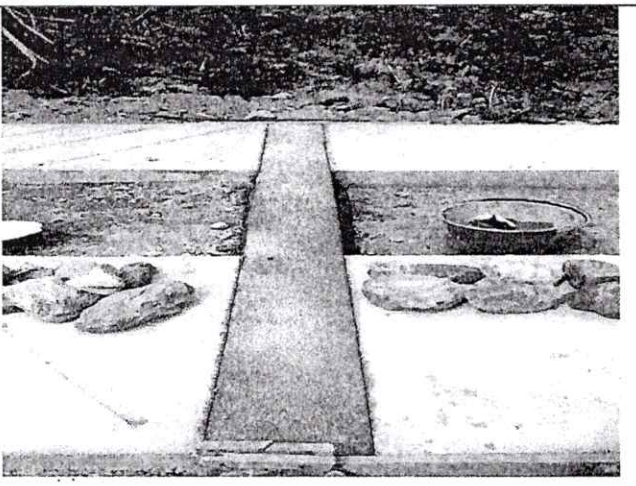
TABLA OBTENIDA SEGÚN BITACORA DE OBRA, INFORME EJECUTIVO Y VISITA DE OBRA.

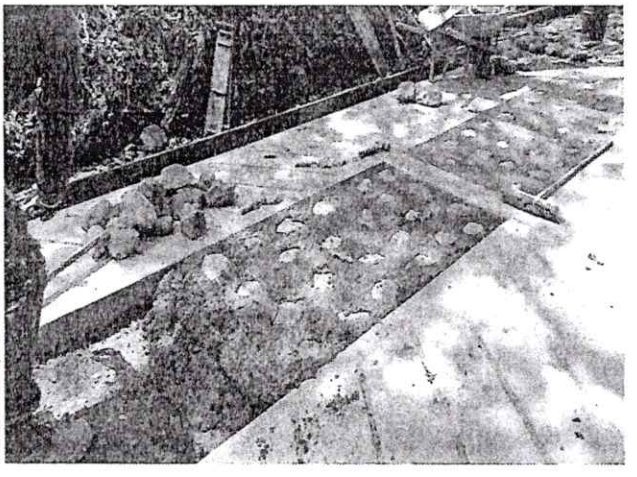
Fecha	Descripción Actividades.
Del 10 al 20 de octubre de 2023	✓ Se da Inicio al Contrato y se realiza localización y replanteo de la vía a intervenir ✓ Se realiza señalización preventiva ✓ Se realiza Excavación y retiro de vegetación, 
Del 10 al 20 de octubre de 2023	✓ Se Retira Material Sobrante de Demoliciones y Excavaciones. 

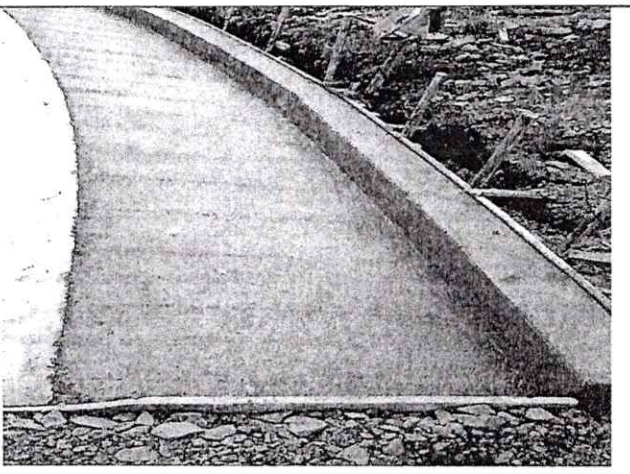
Del 18 a 27 de octubre del 2023	✓ Se Instala y compacta el Afirmado  
Del 27 octubre al 10 de noviembre del 2023	

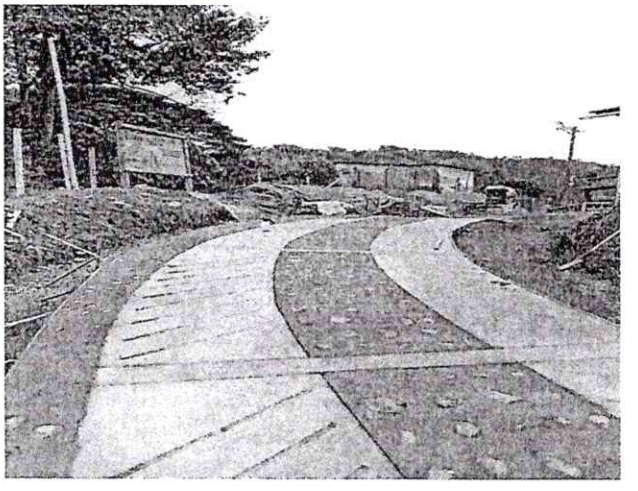
	✓ Se inicia la instalación de la formaleta de las huellas. ✓ Se inicia la instalación del acero.  
	✓ Se realiza instalación del concreto de 3000 psi para huellas.

Del 11 de al 25 de noviembre del 2023	✓ Se realiza instalación del concreto de 3000 psi para vigas riostras ✓ Se realiza instalación del concreto de 3000 psi para cuentas ✓ Se realiza instalación del concreto ciclopeo para enrrocado central ✓ Se realiza instalación del concreto de 3000 psi para bordillo  









De las actividades anteriormente descritas he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de Octubre y Noviembre en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$	240.643.949	VALOR ANTICIPO	40,0 %	$ 96.257.580
VALOR ACTA ANTERIOR	$	-	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0,00%	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$	150.773.653	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	62,65 %	$ 60.309.461
SALDO POR EJECUTAR	$	89.870.296	SALDO POR AMORTIZAR	37,35 %	$ 35.948.118
VALOR ADICIONES	$ -				
SUMAS IGUALES	$	240.643.949	SUMAS IGUALES	100%	$ 96.257.580

VALOR PRESENTE ACTA	$	150.773.653
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	60.309.461
VALOR A PAGAR	$	90.464.192

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago Parcial No. **01 DEL CONTRATO N.º 748-2023.**

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Informe ejecución con sus respectivos anexos en medio magnético, planilla de aportes a la seguridad social integral de los meses de Octubre a Noviembre de 2023, registro fotográfico.
