EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Nit. 900.410.655-8

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.003957-5658

Neiva, 12 de Abril de 2023

Doctora
TANIA PEÑAFIEL ESPAÑA
GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Carrera 4 No. 8 - 60
Ciudad

Ref. Orden de servicio No. 98 de 2022, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE: DOS (2) MUROS DE CONTENCION; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ – SALADOBLANCO – LA CABAÑA – MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022".**

Asunto: Acta Parcial No. 1 – Balance de Obra de la Orden de Servicio No. 98 de 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega del Acta Parcial No. 1 – Balance de Obra de la orden de servicio No. 98 de 2022.

No siendo más, agradecemos su atención prestada y estaremos atento a su respuesta,

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Representante legal
Contratista

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551
icontec ISO 14001 SA-CER721553
icontec ISO 45001 ST-CER721554

ACTA PARCIAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:____1_____					
___CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIO	Nº:	98	AÑO:	2022	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO UNIDAD DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS		
	NIT O CC:	900.410.655-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 46 No. 16-24 Ofic. 705	TEL:	8641641
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.__7.816___ FECHA (dd/mm/aa): 23/11/2022			
CUENTA BANCARIA	No. _454-232850-50_ Banco. _BANCOLOMBIA__ Tipo de Cuenta:_CORRIENTE__			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 638.455.304			
	Valor en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ N.A.			
	Valor en Letras:			
	$ N.A.			
	Valor en Letras:			
	$ N.A.			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ N.A.		
	Nº2	$ N.A.		
	Nº3	$ N.A.		
VALOR TOTAL	$ 638.455.304			

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	**3 MESES**		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**N.A.**	
	Nº2	**N.A.**	
	Nº3	**N.A.**	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	02/12/2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	05/12/2023
		REINICIACIÓN	23/01/2023
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	N.A.
		REINICIACIÓN	N.A.
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	N.A.
		REINICIACIÓN	N.A.
	Nº4	**SUSPENSIÓN**	N.A.
		REINICIACIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	19 DE ABRIL DE 2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	14 DE MARZO DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 14 DE MARZO DE 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ING. MARIO FERNANDO ESTRADA M.**	
	EN CALIDAD DE:	INDICON INGENIERIA SAS	
	NOMBRE:	**ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL**	
	EN CALIDAD DE:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	
	NOMBRE:	**DOC. TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA No. 1	14/03/2023	$ 329.924.895	$ 638.455.304.00	$ 308.530.409
2.				
3.				
TOTAL		$ 329.924.895	$ 638.455.304.00	$ 308.530.409

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 25906076, 25636112, 25353113, 25061163 del mes de **MARZO, FEBRERO, ENERO, DICIEMBRE** con los siguientes valores:

MARZO

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
	Salud	12,5%	$ 4.622.500
	Pensión	16 %	$ 17.772.600
	ARL	0,522%	$ 7.418.300
	CCF	4%	$ 5.001.500

FEBRERO

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
	Salud	12,5%	$ 4.102.500
	Pensión	16 %	$ 16.022.300
	ARL	0,522%	$ 5.453.400
	CCF	4%	$ 4.192.100

ENERO

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
	Salud	12,5%	$ 3.770.100
	Pensión	16 %	$ 14.760.300
	ARL	0,522%	$ 5.089.500
	CCF	4%	$ 4.035.300

DICIEMBRE

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
	Salud	12,5%	$ 4.050.200
	Pensión	16 %	$ 15.913.700
	ARL	0,522%	$ 5.618.900
	CCF	4%	$ 4.137.800

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) : 14 de Marzo de 2023 Quien suscribe: __EDINSON SUAZA HENDEZ_____

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta parcial N°01 del período 02 de diciembre de 2022 al 14 de marzo de 2023. por valor de $ 329.924.895.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial de la orden de servicios No. 98 de 2022.

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
Contratista

INDICON INGENIERIA S.A.S
R.L. MARIO FERNANDO ESTRADA M
Interventoría

V.B. Supervisor Interventoría

EDINSON SUAZA HENDEZ
Contador Público Universidad CUN
T.P. 174246 -T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de REVISOR FISCAL de EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. identificada con NIT 900.410.655 - 8 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), los pagos a seguridad social efectuados por el personal contratado a EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos estabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de Junio de 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012.

APORTE PARAFISCAL	INDIQUE LOS SEIS ÚLTIMOS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO					
MESES = 6	SEP/22	OCT/22	NOV/22	DIC/22	ENE/23	FEB/23
Sistema de Seguridad Social Salud	x	x	x	x	x	x
Riesgos Profesionales	x	x	x	x	x	x
Pensiones	x	x	x	x	x	x
Aportes Parafiscales: Cajas de Compensación Familiar	x	x	x	x	x	x
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	x	x	x	x	x	x
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	x	x	x	x	x	x

Marque una (X) en cada casilla

NOTA: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022.

EDINSON SUAZA HENDEZ
C.C. 1.075.251.099 de Neiva
Revisor Fiscal
T. P. 174246 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0F7C25780D9D2C4E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON SUAZA HENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075251099 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 174246-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

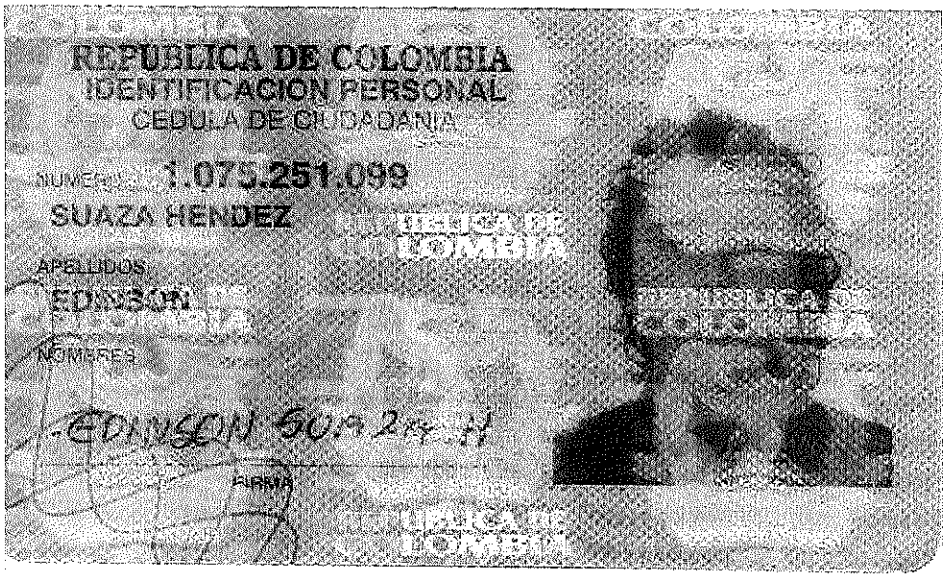



FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1991**

ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

02-MAR-2009 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1900100-00157649-M-1075251099-20090527 0011822466A 1 30971852

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174246-T



EDINSON
SUAZA HENAO
C.C. 1075251099
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 06/02/2013
UNIVERSIDAD QUE

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 185087

FIRMA DEL TITULAR

102469

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logiformas 3363 03/2012

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTÒN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 1
		Pagina 1 de 4

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO	Nº:	98	AÑO:	2022		VALOR CONTRATO:		$ 638.455.304,00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	ACTA Nº:	1	HOJA	1	DE	4		PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO		PLAZO			
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS			14	3	2023		3 MESES	N.A	$ 0,00	
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÒN	REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 45048-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022					V.R. TOTAL	
02/dic/2022	Nº 1	05/dic/2022	23/ene/2023							$ 638.455.304,00	
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UNID	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	MURO 1												
1,0	EXCAVACION												
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL	M3	480,00	$ 31.934	$ 12.134.920,00		M3	391,56	$ 12.504.077,00		$ -	0,00	$ -
2,0	CONCRETOS												
2,1	CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	M3	38,00	$ 472.021	$ 17.936.798,00		M3	39,60	$ 18.692.032,00		$ -	0,00	$ -
2,2	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA BASE DE ESTRUCTURAS	M3	41,80	$ 575.750	$ 24.068.350,00		M3	33,00	$ 18.999.750,00		$ -	0,00	
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA ELEVACION DE ESTRUCTURA	M3	37,83	$ 636.068	$ 24.059.272,00		M3	30,80	$ 19.590.894,00		$ -	0,00	$ -
3,0	ESTRUCTURA Y DRENAJE												
3,1	HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO	KG	5096,00	$ 6.790	$ 34.601.840,00		KG	3155,40	$ 21.425.166,00		$ -	0,00	$ -
4,0	RELLENO												
4,1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	195,80	$ 38.214	$ 7.482.301,00		M3	181,66	$ 6.941.955,00		$ -	0,00	$ -
5,0	ESTRUCTURA Y DRENAJE												
5,1	GEOTEXTIL	M2	287,00	$ 11.102	$ 3.186.274,00		M2	235,60	$ 2.615.631,00		$ -	0,00	$ -
5,2	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	56,00	$ 144.030	$ 8.065.680,00		M3	37,20	$ 5.357.916,00		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL DIRECTO MURO 1					$ 131.533.435,00				$ 106.127.421,00		$ -		$ -
A.I.U 30%					$ 39.460.031,00				$ 31.838.226,00		$ -		$ -
VALOR OBRA MURO 1					$ 170.993.466,00				$ 137.965.647,00		$ -		$ -

00000

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO		Nº:	98	AÑO:	2022		VALOR CONTRATO:		$ 638.455.304,00	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO		ACTA Nº.	1	HOJA	2	DE	4		PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS		FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO		PLAZO		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS				14	3	2023				$ 0,00
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022				3 MESES	N.A	V.R. TOTAL
02/dic/2022	Nº 1	05/dic/2022	23/ene/2023								$ 638.455.304,00
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		UNID	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	MURO 2												
1,0	EXCAVACION												
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL	M3	337,50	$ 31.934	$ 10.777.725,00		M3	181,12	$ 5.783.886,00	181,12	$ 5.783.886,00	181,12	$ 5.783.886,00
2,0	CONCRETOS												
2,1	CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	M3	31,50	$ 472.021	$ 14.868.662,00		M3	22,50	$ 10.620.473,00	22,50	$ 10.620.473,00	22,50	$ 10.620.473,00
2,2	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA BASE DE ESTRUCTURAS	M3	37,80	$ 575.750	$ 21.763.350,00		M3	18,75	$ 10.795.313,00	18,75	$ 10.795.313,00	18,75	$ 10.795.313,00
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA ELEVACION DE ESTRUCTURA	M3	33,08	$ 636.068	$ 21.041.129,00		M3	16,65	$ 10.590.532,00	16,65	$ 10.590.532,00	16,65	$ 10.590.532,00
3,0	ESTRUCTURA Y DRENAJE												
3,1	HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO	KG	4500,00	$ 6.790	$ 30.555.000,00		KG	1831,69	$ 12.437.175,00	1.831,69	$ 12.437.175,00	1831,69	$ 12.437.175,00
4,0	RELLENO												
4,1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	190,80	$ 38.214	$ 7.291.231,00		M3	98,89	$ 3.778.982,00	98,89	$ 3.778.982,00	98,89	$ 3.778.982,00
SUBTOTAL DIRECTO MURO 2					$ 106.297.097,00				$ 54.006.361,00		$ 54.006.361,00		$ 54.006.361,00
A.I.U 30%					$ 31.889.129,00				$ 16.201.908,00		$ 16.201.908,00		$ 16.201.908,00
VALOR OBRA MURO 2					$ 138.186.226,00				$ 70.208.269,00		$ 70.208.269,00		$ 70.208.269,00
	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA												
1,0	EXCAVACION												
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL	M3	488,64	$ 31.934	$ 15.604.230,00		M3	759,61	$ 24.257.386,00	649,69	$ 20.747.200,00	649,69	$ 20.747.200,00
2,0	CONCRETOS												

0T0000

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTÓN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 1
		Pagina 3 de 4

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO	Nº:	98	AÑO:	2022		VALOR CONTRATO:		$ 638.455.304,00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	ACTA Nº.	1	HOJA	3	DE	4		PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO		PLAZO			
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS			14	3	2023				$ 0,00	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022			3 MESES	N.A	V.R. TOTAL	
02/dic/2022	Nº 1 05/dic/2022 23/ene/2023									$ 638.455.304,00	
	Nº 2 DD/MM/AA DD/MM/AA										
	Nº 3 DD/MM/AA DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
2,1	CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	M3	46,50	$ 472.021	$ 21.948.977,00	M3	60,05	$ 28.344.861,00	46,92	$ 22.147.225,00	46,92	$ 22.147.225,00
2.2	CONCRETO NORMAL DE 140 KG/CM2, PARA SOLADOS Y LIMPIEZA (TUBERIA Y ALBERCAS)	M3	6,87	$ 468.012	$ 3.215.242,00	M3	3,53	$ 1.652.082,00	3,53	$ 1.652.082,00	3,53	$ 1.652.082,00
2,3	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2) DE BASE PARA ESTRUCTURA DE SALIDA	M3	46,50	$ 575.750	$ 26.772.375,00	M3	55,01	$ 31.672.008,00	45,63	$ 26.271.473,00	45,63	$ 26.271.473,00
2,4	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), DE ELEVACION PARA ALBERCA Y ESTRUCTURAS DE SALIDA	M3	53,96	$ 636.068	$ 34.322.229,00	M3	89,62	$ 57.004.414,00	80,87	$ 51.438.819,00	80,87	$ 51.438.819,00
3,0	TUBERIA D=36"											
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA D=36" (INCLUYE ANILLADO INTERNO Y EXTERNO)	UND	19,00	$ 473.646	$ 8.999.274,00	UND	20,00	$ 9.472.920,00	20,00	$ 9.472.920,00	20,00	$ 9.472.920,00
4,0	HIERROS DE REFUERZO											
4,1	HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO	KG	4650,00	$ 6.790	$ 31.573.500,00	KG	9032,40	$ 61.329.996,00	8.149,10	$ 55.332.389,00	8149,10	$ 55.332.389,00
5,0	RELLENO											
5,1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	238,05	$ 38.214	$ 9.096.843,00	M3	390,79	$ 14.933.815,00	332,86	$ 12.719.912,00	332,86	$ 12.719.912,00
SUBTOTAL DIRECTO CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SA					$ 151.532.670,00			$ 228.667.482,00		$ 199.782.020,00		$ 199.782.020,00
A.I.U 30%					$ 45.459.801,00			$ 68.600.245,00		$ 59.934.606,00		$ 59.934.606,00
VALOR OBRA CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA					$ 196.992.471,00			$ 297.267.727,00		$ 259.716.626,00		$ 259.716.626,00
	BOX COULVERT (3,00x3,00M L=8,00M											
1,0	DEMOLICION											
1,1	DEMOLICION ESTRUCTURA EN CONCRETO CONVENCIONAL NO REFORZADA	M3	7,20	$ 78.047	$ 561.938,00	M3	7,20	$ 561.938,00		$ -	0,00	$ -
2,0	EXCAVACION											

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIO	Nº:	98	AÑO:	2022		VALOR CONTRATO:		$ 638.455.304,00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	ACTA Nº.	1	HOJA	4	DE	4		PLAZO ADICIONAL	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO		PLAZO			
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS			14	3	2023				$ 0,00	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÒN / REINICIO	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022				3 MESES	N.A	V.R. TOTAL	
02/dic/2022	Nº 1 / 05/dic/2022 / 23/ene/2023									$ 638.455.304,00	
	Nº 2 / DD/MM/AA / DD/MM/AA										
	Nº 3 / DD/MM/AA / DD/MM/AA										

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA 1			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL	M3	90,00	$ 31.934	$ 2.874.060,00	M3	90,00	$ 2.874.060,00		$ -	0,00	$ -
3,0	CONCRETOS											
3,1	CONCRETO NORMAL DE 140 KG/CM2, PARA SOLADOS Y LIMPIEZA	M3	5,36	$ 468.012	$ 2.508.544,00	M3	5,36	$ 2.508.544,00		$ -	0,00	$ -
3,2	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2) DE BASE, INCLUYE FORMALETA	M3	27,16	$ 575.750	$ 15.637.370,00	M3	27,16	$ 15.637.370,00		$ -	0,00	$ -
3,3	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), DE ELEVACION, INCLUYE FORMALETA	M3	38,62	$ 636.068	$ 24.564.946,00	M3	38,62	$ 24.564.946,00		$ -	0,00	$ -
4,0	HIERROS DE REFUERZO											
4,1	HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO	KG	6089,00	$ 6.790	$ 41.344.310,00	KG	6089,00	$ 41.344.310,00		$ -	0,00	$ -
5,0	RELLENO											
5,1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	388,00	$ 38.214	$ 14.827.032,00	M3	388,00	$ 14.827.032,00		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL DIRECTO BOX COULVERT (3,00x3,00M, L=8,00M)					$ 101.756.262,00			$ 102.318.200,00		$ -		$ -
A.I.U 30%					$ 30.526.879,00			$ 30.695.460,00		$ -		$ -
VALOR OBRA BOX COULVERT (3,00x3,00M, L=8,00M)					$ 132.283.141,00			$ 133.013.660,00		$ -		$ -

MURO 1 + MURO 2 + CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA + BOX COULVERT (3,00x3,00M, L=8,00M)

SUBTOTAL DIRECTO	$ 491.119.464,00	$ 491.119.464,00	$ 253.788.381,00	$ 253.788.381,00
A.I.U 30%	$ 147.335.840,00	$ 147.335.840,00	$ 76.136.514,00	$ 76.136.514,00
VALOR OBRA	$ 638.455.304,00	$ 638.455.304,00	$ 329.924.895,00	$ 329.924.895,00

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ
CONTRATISTA OBRA

INDICON INGENIERIA SAS
R.L MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
INTERVENTOR

	REVISÒ	APROBÒ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

000012

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta				
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023			
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	MURO 2		
CAPITULO	1. EXCAVACION		
ITEM	1.1 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
MURO	M3	12,50	3,77	4,03	1,00	189,75
	M3	12,50	0,23	3,00	-1,00	-8,63
					TOTAL	181,12

SOPORTE GRAFICO





OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


	CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL	
	INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304				
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0				
	FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1
	PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304				
	PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año
DEPARTAMENTO DEL HUILA	FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta			
	FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023						
	FECHA TERMINACION	19/abr/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023		


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	MURO 2		
CAPITULO	2. CONCRETOS		
ITEM	2.1 CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
MURO - MEJORAMIENTO	M3	12,50	3,00	0,60	1,00	22,50
					TOTAL	22,50

SOPORTE GRAFICO

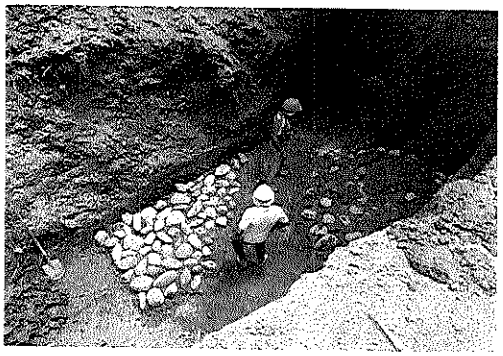

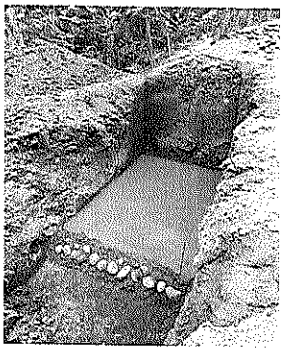

OBSERVACION

ING. MARIO BERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta				
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023			
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							


DEPARTAMENTO DEL HUILA


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	MURO 2		
CAPITULO	2. CONCRETOS		
ITEM	2.2 CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA BASE DE ESTRUCTURAS		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
MURO - ZARPA	M3	12,50	3,00	0,50	1,00	18,75
					TOTAL	18,75

SOPORTE GRAFICO

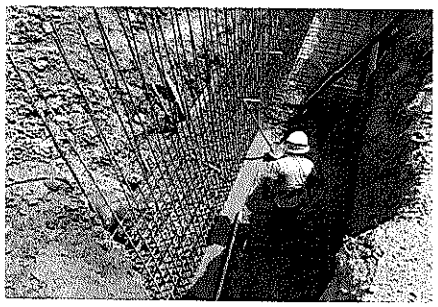

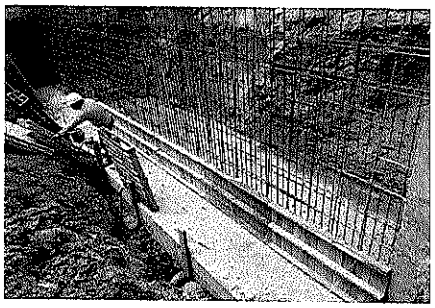

OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Gobernación del Huila

DEPARTAMENTO DEL HUILA


CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta	14/mar/2023			
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895					
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							


OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	MURO 2		
CAPITULO	2. CONCRETOS		
ITEM	2.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2) PARA ELEVACION DE ESTRUCTURA		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
MURO	M3	12,50	0,30	3,33	1,00	12,49
	M3	12,50	0,20	3,33	0,50	4,16
					TOTAL	16,65

SOPORTE GRAFICO

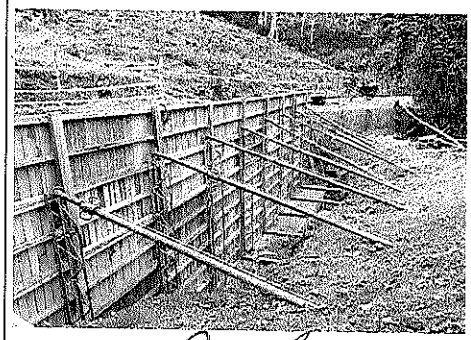

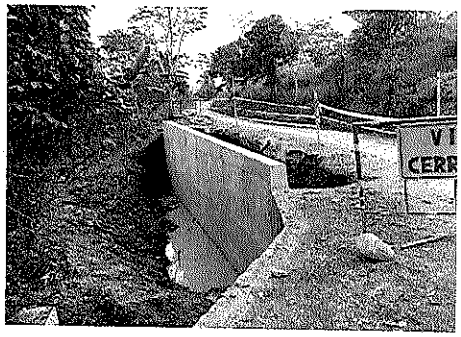

OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES







MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA




CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2022	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	2	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895	Fecha Acta	Mes	Día	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022				14/mar/2023			
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895					
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	KG
ACTIVIDAD	MURO 2		
CAPITULO	3. ESTRUCTURA Y DRENAJE		
ITEM	3.1 HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

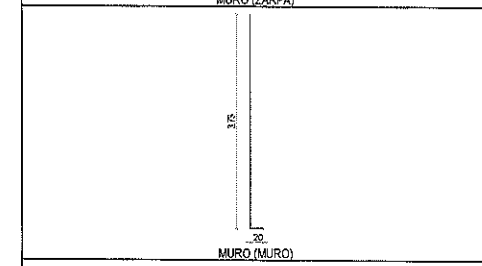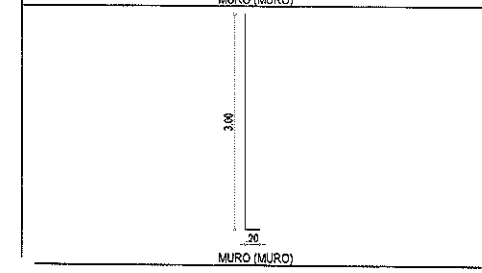UBICACIÓN	UNIDAD	DIAMETRO	PESO (Kg/m)	LARGO	CANTIDAD	SUB TOTAL
 MURO (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	3,30	51,00	168,30
	KG	1/2"	1,00	3,30	125,00	412,50
 MURO (MURO)	KG	1/2"	1,00	3,93	63,00	247,59
	KG	1/2"	1,00	3,93	42,00	165,06
 MURO (MURO)	KG	1/2"	1,00	3,20	63,00	201,60
 MURO (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	6,00	44,00	264,00
 MURO (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	1,84	22,00	40,48
 MURO (MURO)	KG	1/2"	1,00	6,00	48,00	288,00
 MURO(MURO)	KG	1/2"	1,00	1,84	24,00	44,16
TOTAL						1831,69

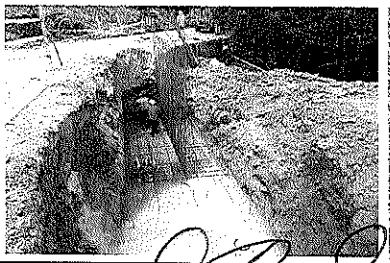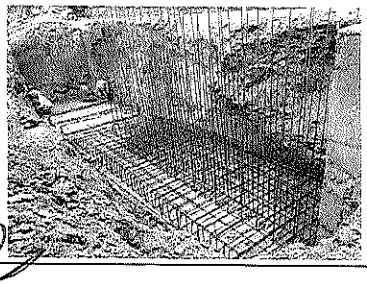SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION
  	

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZE.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

	CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
	INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
	FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1	
	PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895	Fecha Acta	Mes	Dia	Año	
	FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022				14/mar/2023			
	FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895					
	FECHA TERMINACION	19/abr/2023							

OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	MURO 2		


CAPITULO	4. RELLENO
ITEM	4,1 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
MURO	M3	12,50	2,70	2,93	1,00	98,89
				TOTAL		98,89

SOPORTE GRAFICO



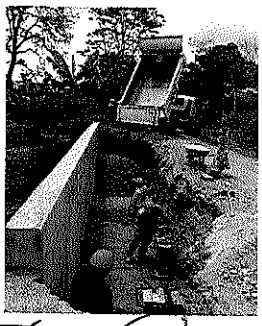



OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Gobernación del Huila

DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	2	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta				
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023			
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		

CAPITULO	1. EXCAVACION
ITEM	1.1 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLADO No.1 (EXCAVADO MURO)	M3	13,35	2,45	3,70	1,00	121,02
ANCANTARILLA No. 1 (POCETA)	M3	1,80	3,00	2,85	1,00	15,39
ANCANTARILLA No. 1 (TUBERÍA)	M3	3,77	3,00	2,85	1,00	32,23
ANCANTARILLA No. 1 (DISIPADORES)	M3	0,80	1,25	1,00	3,00	3,00
ALCANTARILLADO No.1 (NO EXCAVADO MURO)	M3	13,35	2,45	1,16	-1,00	-37,94
ALCANTARILLADO No.2 (EXCAVADO MURO)	M3	17,10	4,09	4,30	1,00	300,74
ALCANTARILLADO No.2 (POCETA)	M3	1,80	1,80	2,85	1,00	9,23
ALCANTARILLADO No.2 (MEJORAMIENTO VÍA)	M3	39,50	1,79	1,20	1,00	84,85
ALCANTARILLADO No.2 (TUBERIA)	M3	3,50	2,00	2,85	1,00	19,95
ALCANTARILLADO No.2 (NO EXCAVADO MURO)	M3	13,00	3,00	1,24	-1,00	-48,36
ALCANTARILLADO No.3 (EXCAVADO ENCOFRADO)	M3	6,60	2,00	1,95	1,00	25,74
ALCANTARILLADO No.3 (EXCAVADO ALETAS ENCOLE)	M3	4,20	2,10	2,05	1,00	18,08
	M3	2,20	1,72	2,05	1,00	7,76
	M3	2,20	2,10	2,50	1,00	11,55
	M3	1,70	2,00	2,23	1,00	7,57
ALCANTARILLADO No.3 (EXCAVADO MURO ENCOLE)	M3	3,00	1,40	2,05	1,00	8,61
ALCANTARILLADO No.3 (EXCAVADO DESCOLE)	M3	3,50	1,50	1,95	1,00	10,24
ALCANTARILLADO No.3 (CANAL)	M3	56,00	1,25	0,85	1,00	59,50
	M3	4,50	0,10	0,55	1,00	0,25
	M3	4,50	0,10	0,65	1,00	0,29
					TOTAL	649,69

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION
 	

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

	CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL	
	INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304				
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0				
	FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304				
	PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año
	FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta			
	FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023		
	FECHA TERMINACION	19/abr/2023						


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		

CAPITULO	2. CONCRETOS
ITEM	2.1 CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLADO No.1 (ZARPA)	M3	13,35	2,45	0,60	1,00	19,62
ALCANTARILLADO No.2 (ZARPA)	M3	13,00	3,00	0,70	1,00	27,30
					TOTAL	46,92

SOPORTE GRAFICO

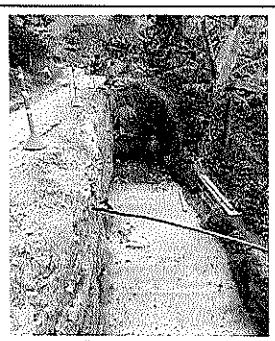
OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL	
	INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304				
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0				
	FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1
	PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304				
	PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895	Fecha Acta	Mes	Dia	Año
	FECHA DE SUSPENSION No.	05/dic/2022				14/mar/2023		
	FECHA DE REINICIACION No.	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895				
	FECHA TERMINACION	19/abr/2023						


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		

CAPITULO	2. CONCRETOS
ITEM	2.2 CONCRETO NORMAL DE 140 KG/CM2, PARA SOLADOS Y LIMPIEZA (TUBERIA Y ALBERCAS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLA No. 1 (TUBERIA)	M3	5,17	1,10	0,10	1,00	0,57
ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	M3	1,80	1,80	0,05	1,00	0,16
ALCANTARILLA No. 2 - TUBERIA	M3	6,00	1,10	0,10	1,00	0,66
ALCANTARILLA No. 2 - POCETA	M3	1,80	1,80	0,05	1,00	0,16
ANCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	M3	6,60	1,60	0,05	1,00	0,53
ANCANTARILLA No. 3 (BASE DESCOLE)	M3	3,50	1,50	0,05	1,00	0,26
ANCANTARILLA No. 3 (BASE ENCOLE)	M3	2,20	2,00	0,05	1,00	0,22
	M3	1,70	1,93	0,05	1,00	0,16
	M3	3,00	1,40	0,05	1,00	0,21
	M3	2,20	1,60	0,05	1,00	0,18
	M3	4,20	2,00	0,05	1,00	0,42
					TOTAL	3,53

SOPORTE GRAFICO

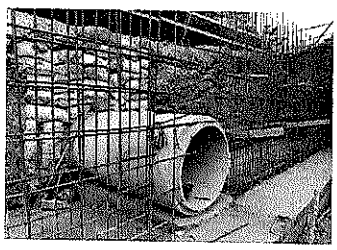





OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Gobernación del Huila

DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	2	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta				
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023			
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							

OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA
CAPITULO	2. CONCRETOS
ITEM	2.3 CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2) DE BASE PARA ESTRUCTURA DE SALIDA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLADO No.1 (ZARPA)	M3	13,35	2,45	0,45	1,00	14,72
ALCANTARILLADO No.1 (BASE POSETA)	M3	1,40	1,40	0,23	1,00	0,44
ALCANTARILLADO No.1 (BASE DISIPADOR)	M3	3,30	0,95	0,20	1,00	0,63
ALCANTARILLADO No. 2 (ZARPA)	M3	13,00	3,00	0,50	1,00	19,50
ALCANTARILLADO No. 2 (POCETA)	M3	1,40	1,40	0,23	1,00	0,45
ALCANTARILLADO No.3 (ZARPA ALETA ENCOLE)	M3	2,20	2,00	0,35	1,00	1,54
	M3	1,70	1,92	0,35	1,00	1,14
ALCANTARILLADO No.3 (ZARPA MURO ENCOLE)	M3	1,40	3,00	0,35	1,00	1,47
ALCANTARILLADO No.3 (ZARPA ALETA ENCOLE)	M3	2,20	1,60	0,35	1,00	1,23
	M3	4,20	2,00	0,35	1,00	2,94
ALCANTARILLADO No.3 (BASE DESCOLE-DENTELLON)	M3	5,00	0,20	0,20	1,00	0,20
	M3	1,30	3,20	0,20	1,00	0,83
ALCANTARILLADO No.3 (CANAL)	M3	4,50	0,10	0,55	1,00	0,25
	M3	4,50	0,10	0,65	1,00	0,29
					TOTAL	45,63

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION
 	

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Gobernación del Huila

DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	2	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895	Fecha Acta	Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022				14/mar/2023			
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895					
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							

OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	M3
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		
CAPITULO	2. CONCRETOS		
ITEM	2.4 CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), DE ELEVACION PARA ALBERCA Y ESTRUCTURAS DE SALIDA		


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO


UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLADO No. 1 (MURO)	M3	13,35	0,30	3,05	1,00	12,22
	M3	13,35	0,15	3,05	0,50	3,05
ALCANTARILLADO No. 1 (POCETA)	M3	1,80	0,20	2,80	2,00	2,02
	M3	1,40	0,20	2,80	2,00	1,57
ALCANTARILLADO No. 1 (MUROS DISIPADOR)	M3	2,70	0,15	1,00	2,00	0,81
ALCANTARILLADO No. 1 (MUROS DISIPADOR)	M3	0,64	0,15	0,36	2,00	0,07
ALCANTARILLADO No. 1 (POCETA)	M3	1,00	0,20	1,00	-0,95	-0,19
ALCANTARILLADO No. 1 (TUBERIA MURO)	M3	1,00	0,35	1,00	-0,95	-0,33
ALCANTARILLADO No. 2 (MURO)	M3	13,00	0,30	3,50	1,00	13,65
	M3	13,00	0,20	3,50	0,50	4,55
ALCANTARILLADO No. 2 (POCETA)	M3	1,80	0,20	2,80	1,00	1,01
	M3	1,80	0,20	4,00	1,00	1,44
	M3	1,40	0,20	2,80	2,00	1,57
ALCANTARILLADO No. 2 (POCETA)	M3	0,20	1,00	1,00	-0,95	-0,19
ALCANTARILLADO No. 2 (TUBERIA MURO)	M3	0,40	1,00	1,00	-0,95	-0,38
ALCANTARILLADO No.3 (ENCOFRADO)	M3	6,60	1,60	1,60	1,00	16,90
	M3	6,40	0,28	2,00	1,00	3,58

ALCANTARILLADO No.3 (ALETAS ENCOLE)	M3	3,90	0,28	2,00	1,00	2,18
	M3	1,80	0,20	2,00	1,00	0,72
ALCANTARILLADO No.3 (ALETAS DESCOLE)	M3	2,10	0,20	1,60	2,00	1,34
	M3	2,10	0,20	0,30	1,00	0,13
	M3	1,80	0,20	2,25	1,00	0,81
ALCANTARILLADO No.3 (CANAL)	M3	56,00	0,15	1,10	1,00	9,24
	M3	56,00	0,15	0,70	2,00	11,76
ALCANTARILLADO No.3 (TUBERIA ENCOFRADO)	M3	7,00	1,00	1,00	-0,95	-6,65
					TOTAL	80,87




SOPORTE GRAFICO






OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

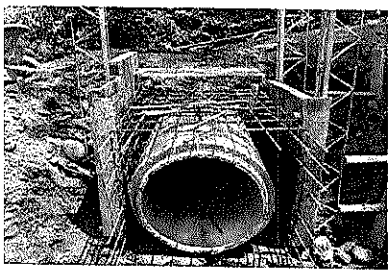ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

	CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
	INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
	FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	1	
	PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895	Fecha Acta	Mes	Dia	Año	
	FECHA DE SUSPENSION No.	05/dic/2022				14/mar/2023			
	FECHA DE REINICIACION No.	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895					
	FECHA TERMINACION	19/abr/2023							


OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	UND
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		

CAPITULO	3. TUBERIA D=36"
ITEM	3,1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA D=36" (INCLUYE ANILLADO INTERNO Y EXTERNO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLADO No. 1	UND				6,00	6,00
ALCANTARILLADO No. 2	UND				7,00	7,00
ALCANTARILLADO No. 3	UND				7,00	7,00
					TOTAL	20,00

SOPORTE GRAFICO

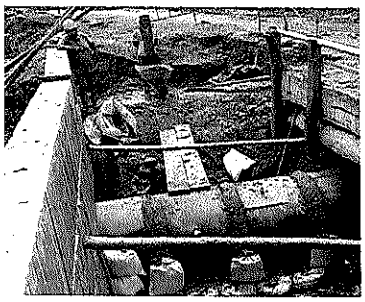
OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA







EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS








MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA






	CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
	INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
	CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
	FECHA DE INICIO	02/dic/2022	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	9	
DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
	PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895	Fecha Acta	Mes	Dia	Año	
	FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022							
	FECHA DE REINICIACION No. 1	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895		14/mar/2023			
	FECHA TERMINACION	19/abr/2023							







OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	KG
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		
CAPITULO	4. ESTRUCTURA Y DRENAJE		
ITEM	4.1 HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO		










PROCEDIMIENTO PARA CALCULO




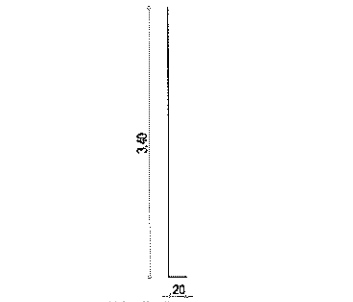
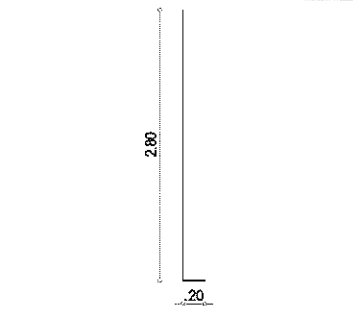



UBICACIÓN	UNIDAD	DIAMETRO	PESO (Kg/m)	LARGO	CANTIDAD	SUB TOTAL
 ALCANTARILLA No. 1 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	2,75	55,00	151,25
	KG	1/2"	1,00	2,75	134,00	368,50
 ALCANTARILLA No. 1 (MURO)	KG	1/2"	1,00	3,60	68,00	244,80
	KG	1/2"	1,00	3,60	46,00	165,60
 ALCANTARILLA No. 1 (MURO)	KG	1/2"	1,00	3,00	67,00	201,00
 ALCANTARILLA No. 1 (MURO)	KG	1/2"	1,00	6,00	44,00	264,00
 ALCANTARILLA No. 1 (MURO)	KG	1/2"	1,00	2,69	22,00	59,18
 ALCANTARILLA No. 1 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	6,00	36,00	216,00












 ALCANTARILLA No. 1 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	2,69	18,00	48,42
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	6,00	11,00	36,96
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	1,08	11,00	6,65
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	6,00	11,00	66,00
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	2,30	11,00	25,30
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	4,40	16,00	39,42
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	2,90	16,00	25,98
 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	4,70	18,00	84,60










 ALCANTARILLA No. 1 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	3,00	18,00	54,00
 ALCANTARILLA No. 1 (DISIPADOR)	KG	1/2"	1,00	3,75	7,00	26,25
 ALCANTARILLA No. 1 (DISIPADOR)	KG	1/2"	1,00	2,75	17,00	46,75
 ALCANTARILLA No. 1 (DISIPADOR)	KG	1/2"	1,00	3,35	8,00	26,80
 ALCANTARILLA No. 2 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	3,30	53,00	174,90
	KG	1/2"	1,00	3,30	130,00	429,00
 ALCANTARILLA No. 2 (MURO)	KG	1/2"	1,00	4,10	66,00	270,60
 ALCANTARILLA No. 2 (MURO)	KG	1/2"	1,00	3,20	66,00	211,20

 ALCANTARILLA No. 2 (MURO)	KG	1/2"	1,00	4,10	44,00	180,40
 ALCANTARILLA No. 2 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	6,00	44,00	264,00
ALCANTARILLA No. 2 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	2,34	22,00	51,48
 ALCANTARILLA No. 2 (MURO)	KG	1/2"	1,00	6,00	52,00	312,00
ALCANTARILLA No. 2 (MURO)	KG	1/2"	1,00	2,34	26,00	60,84
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	6,00	11,00	36,96
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	1,08	11,00	6,65
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	6,00	11,00	66,00
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	2,30	11,00	25,30




 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	5,60	16,00	50,18
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	2,90	16,00	25,98
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	5,90	18,00	59,47
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	3,00	18,00	54,00
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	1/2"	1,00	1,70	5,00	8,50
 ALCANTARILLA No. 2 (POCETA)	KG	3/8"	0,56	1,70	5,00	4,76
 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	KG	1/2"	1,00	6,00	34,00	204,00
 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	KG	1/2"	1,00	1,50	34,00	51,00
 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	KG	1/2"	1,00	3,00	34,00	102,00

 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	KG	1/2"	1,00	3,00	34,00	102,00
 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOLE ALETAS)	KG	1/2"	1,00	2,30	44,00	101,20
	KG	1/2"	1,00	2,30	28,00	64,40
 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	KG	1/2"	1,00	2,45	26,00	63,70
	KG	1/2"	1,00	2,45	16,00	39,20
 ALCANTARILLA No. 3 (ENCOFRADO)	KG	1/2"	1,00	2,45	22,00	53,90
	KG	1/2"	1,00	2,45	14,00	34,30
 ALCANTARILLA No. 3 (MURO)	KG	1/2"	1,00	6,00	14,00	84,00
 ALCANTARILLA No. 3 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	6,00	14,00	84,00
 ALCANTARILLA No. 3 (MURO)	KG	1/2"	1,00	3,80	14,00	53,20
 ALCANTARILLA No. 3 (ZARPA)	KG	1/2"	1,00	3,80	14,00	53,20
 ALCANTARILLA No. 3 (MURO PANTALLA ENCOLE)	KG	1/2"	1,00	2,65	4,00	10,60

 ALCANTARILLA No. 3 (MURO PANTALLA ENCOLE)	KG	1/2"	1,00	2,85	4,00	11,40
 ALCANTARILLA No. 3 (MURO PANTALLA ENCOLE)	KG	1/2"	1,00	3,50	8,00	28,00
 ALCANTARILLA No. 3 (MURO PANTALLA ENCOLE)	KG	1/2"	1,00	0,95	10,00	9,50
 ALCANTARILLA No. 3 (MURO PANTALLA ENCOLE)	KG	1/2"	1,00	1,00	16,00	16,00
 ALCANTARILLA No. 3 (BASE ENCOLE TUBERIA)	KG	1/2"	1,00	2,50	2,00	5,00
 ALCANTARILLA No. 3 (BASE ENCOLE TUBERIA)	KG	1/2"	1,00	3,00	2,00	6,00
 ALCANTARILLA No. 3 (BASE ENCOLE TUBERIA)	KG	1/2"	1,00	4,00	2,00	8,00
 ALCANTARILLA No. 3 (BASE ENCOLE TUBERIA)	KG	1/2"	1,00	1,30	12,00	15,60
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE MURO - ALETA)	KG	3/8"	0,56	5,80	14,00	45,47
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE MURO - ALETA)	KG	3/8"	0,56	3,24	2,00	3,63
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE MURO - ALETA)	KG	3/8"	0,56	1,70	4,00	3,81

 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE ALETAS)	KG	1/2"	1,00	1,90	40,00	76,00
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE MURO PANTALLA)	KG	1/2"	1,00	2,75	9,00	24,75
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE)	KG	1/2"	1,00	2,55	9,00	22,95
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE BASE)	KG	1/2"	1,00	3,70	16,00	59,20
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE BASE)	KG	1/2"	1,00	1,85	20,00	37,00
 ALCANTARILLA No. 3 (DESCOLE BASE)	KG	1/2"	1,00	1,05	28,00	29,40
 ALCANTARILLA No. 3 (CUNETA)	KG	1/2"	1,00	2,50	374,00	935,00
 ALCANTARILLA No. 3 (CUNETA)	KG	1/2"	1,00	6,00	80,00	480,00
 ALCANTARILLA No. 3 (CUNETA)	KG	1/2"	1,00	3,10	8,00	24,80
 ALCANTARILLA No. 3 (CUNETA)	KG	1/2"	1,00	6,00	120,00	720,00

3.10 ALCANTARILLA No. 3 (CUNETA)	KG	1/2"	1,00	3,10	12,00	37,20
TOTAL						8149,10

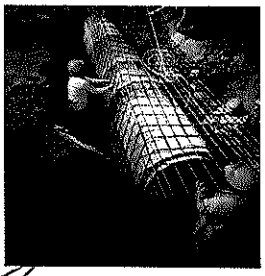SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION
    	

ING. MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Gobernación del Huila

DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	ORDEN DE SERVICIO	98 DE 2022	ACTA No.	1	PARCIAL		
INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA SAS	VR CONTRATO INICIAL:	$ 638.455.304					
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL HUILA	VR. ANTICIPO (0%)	$ 0					
FECHA DE INICIO	02/dic/2023	VR.MODIFICACION	$ 0	Hoja	1	de	2	
PLAZO INICIAL	3 MESES	VR. VIGENTE:	$ 638.455.304					
PLAZO ADICIONAL		VR. EJECUTADO	$ 329.924.895		Mes	Dia	Año	
FECHA DE SUSPENSION No. 1	05/dic/2022			Fecha Acta	14/mar/2023			
FECHA DE REINICIACION No.	23/ene/2023	VR. PRESENTE ACTA	$ 329.924.895					
FECHA TERMINACION	19/abr/2023							







OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	UNIDAD	UND
ACTIVIDAD	CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		
CAPITULO	5. RELLENO		
ITEM	5,1 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD	SUB TOTAL
ALCANTARILLADO No. 1 (MURO)	M3	13,35	1,40	2,65	1,00	49,53
	M3	13,35	0,08	2,65	0,50	1,42
ALCANTARILLADO No. 1 (TUBERÍA)	M3	3,77	3,00	2,85	1,00	32,23
ALCANTARILLADO No. 1 (POCETA)	M3	1,80	1,20	2,85	1,00	6,16
ALCANTARILLADO No. 1 (SOLADO TUBERIA)	M3	5,17	1,10	0,10	-1,00	-0,57
ALCANTARILLADO No. 1 (TUBERIA)	M3	5,17	1,00	1,00	-0,95	-4,91
ALCANTARILLADO No.2 (MURO)	M3	13,00	2,99	3,10	1,00	120,30
	M3	1,20	3,10	3,10	1,00	11,53
	M3	2,90	3,95	3,10	1,00	35,51
ALCANTARILLADO No.2 (MEJORAMIENTO VIA)	M3	39,50	2,37	0,44	1,00	40,92
ALCANTARILLADO No.2 (TUBERIA)	M3	3,50	2,00	2,84	1,00	19,88
ALCANTARILLADO No.2 (TUBERIA)	M3	5,90	1,00	1,00	-0,95	-5,61
ALCANTARILLADO No.2 (SOLADO TUBERIA)	M3	5,90	1,10	0,10	-1,00	-0,65

ALCANTARILLADO No. 3 (ENCOFRADO)	M3	6,60	0,20	1,95	2,00	5,15
	M3	6,60	1,60	0,10	1,00	1,06
ALCANTARILLADO No. 3 (ALETA ENCOLE)	M3	6,40	1,10	1,65	1,00	11,62
	M3	6,40	0,30	1,65	0,50	1,58
	M3	3,90	1,10	1,65	1,00	7,08
	M3	3,90	0,20	1,65	0,50	0,64
					TOTAL	332,86

SOPORTE GRAFICO

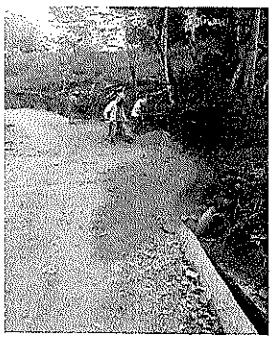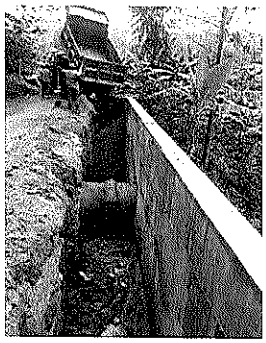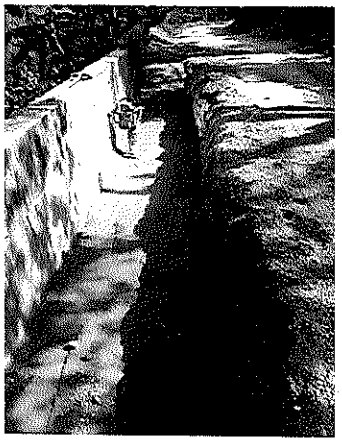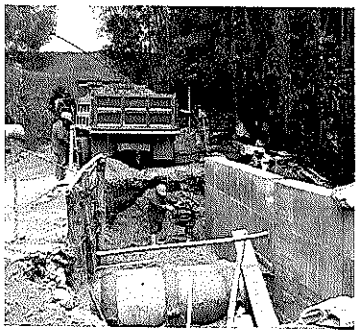







OBSERVACION

ING. MARIO FERNADO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

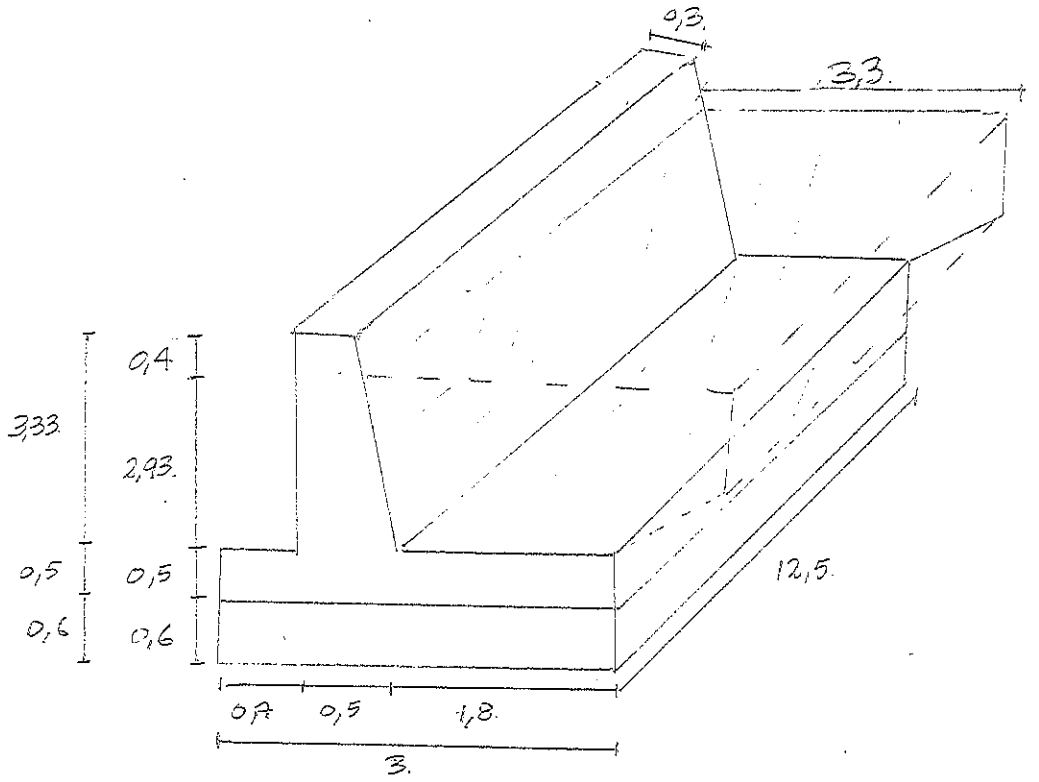
ING. GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ E.
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA DE OBRA


Muro # 2
(Memorias)



(1) Excavación

$$X = 12,5 \times 4,03 \times \left(\frac{4,3 + 4,0 + 3}{3}\right) = 189,75 m^3$$

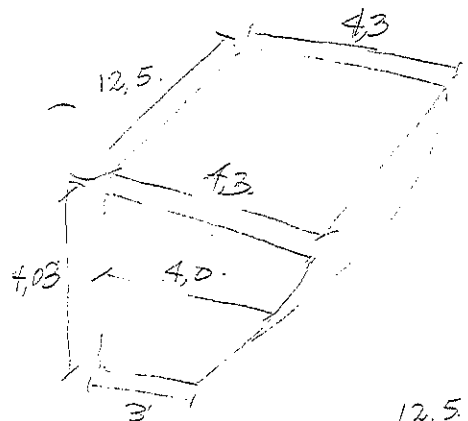

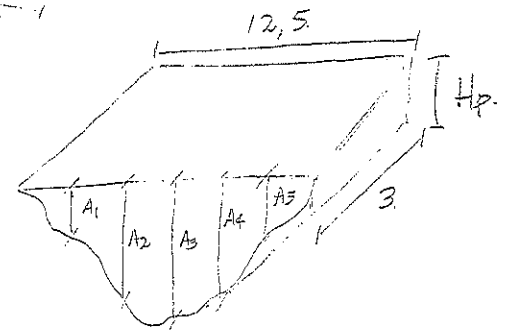

Alturas

A_1: 0,09m A_2: 0,23m A_3: 0,52m A_4: 0,18m A_5: 0,14m


$$H_p = (0,09 + 0,23 + 0,52 + 0,18 + 0,14)/5.$$

$$H_p = 0,23 m.$$

$$X = 12,5 \times 3 \times 0,23 = 8,63 m^3$$


$\Sigma_{Exc} = 189,75 - 8,63 \Rightarrow \boxed{\Sigma_{Exc} = 181,12\ m^3}$

(2) Ciclopeo




$X = 12,5 \times 3 \times 0,6 \Rightarrow \boxed{22,5\ m^3}$ ✓

(3) Concreto base (Zarpa)

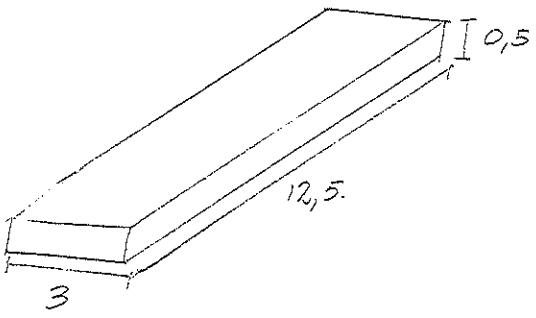


$X = 12,5 \times 3 \times 0,5 \Rightarrow \boxed{18,75\ m^3}$ ✓

(4) Concreto elevación (Muro)

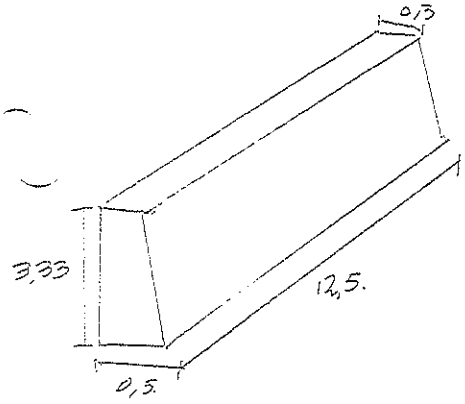

$X = 12,5 \times 3,33 \times \left(\frac{0,5+0,3}{2}\right) = \boxed{16,65\ m^3}$ ✓


(5) Relleno.

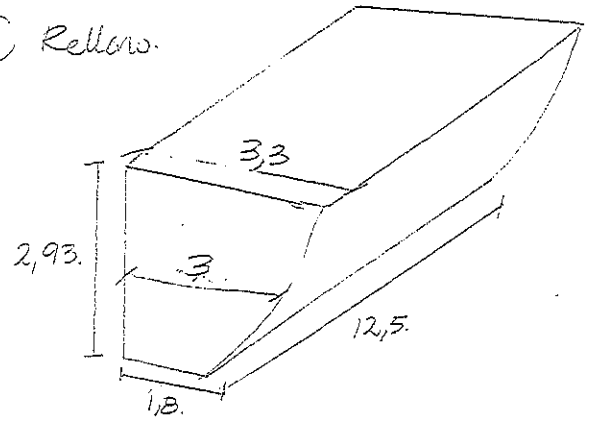

$X = 12,5 \times 2,93 \times \left(\frac{3,3+3+1,8}{3}\right) = \boxed{98,89\ m^3}$ ✓

Acero


* (A) y (B)



$$X_A = 3{,}3 \times \left(\left(\frac{12{,}4}{0{,}25}\right)+1\right) = 168{,}3 \times 1\,kg = \underline{168{,}3\,Kg}$$ ✓

$$X_B = 3{,}3 \times \left(\left(\frac{12{,}4}{0{,}10}\right)+1\right) = 412{,}5 \times 1\,kg = \underline{412{,}5\,Kg}$$ ✓

* (C)




$$x = 3{,}93 \times \left(\left(\frac{12{,}4}{0{,}2}\right)+1\right) = 247{,}59 \times 1\,kg = \underline{247{,}59\,kg}$$ ✓

* (D)




$$x = 3{,}2 \times \left(\left(\frac{12{,}4}{0{,}2}\right)+1\right) = 201{,}6 \times 1\,kg = \underline{201{,}6\,Kg}$$ ✓

* (E)



$$x = 3{,}93 \times \left(\left(\frac{12{,}4}{0{,}3}\right)+1\right) = 165{,}06 \times 1\,kg = \underline{165{,}06\,kg}$$ ✓

* Reparticion.



Traslapo 1/2" = 0,72 m.

$$X_{zapa} = 13{,}84 \times \left(\left(\frac{2{,}9}{0{,}3}\right)+1\right) \times 2 = \underline{304{,}48\,Kg}$$ ✓


$$X_{muro} = 13{,}84 \times \left(\left(\frac{3{,}23}{0{,}3}\right)+1\right) \times 2 = \underline{332{,}16\,Kg}$$

$$\Sigma = 168{,}3 + 412{,}5 + 247{,}59 + 201{,}6 + 165{,}06 + 304{,}48 + 332{,}16$$

$$\boxed{\Sigma_{Acero} = 1831{,}69\,Kg}$$


000042

Alcantarilla F1.
(Memorias)

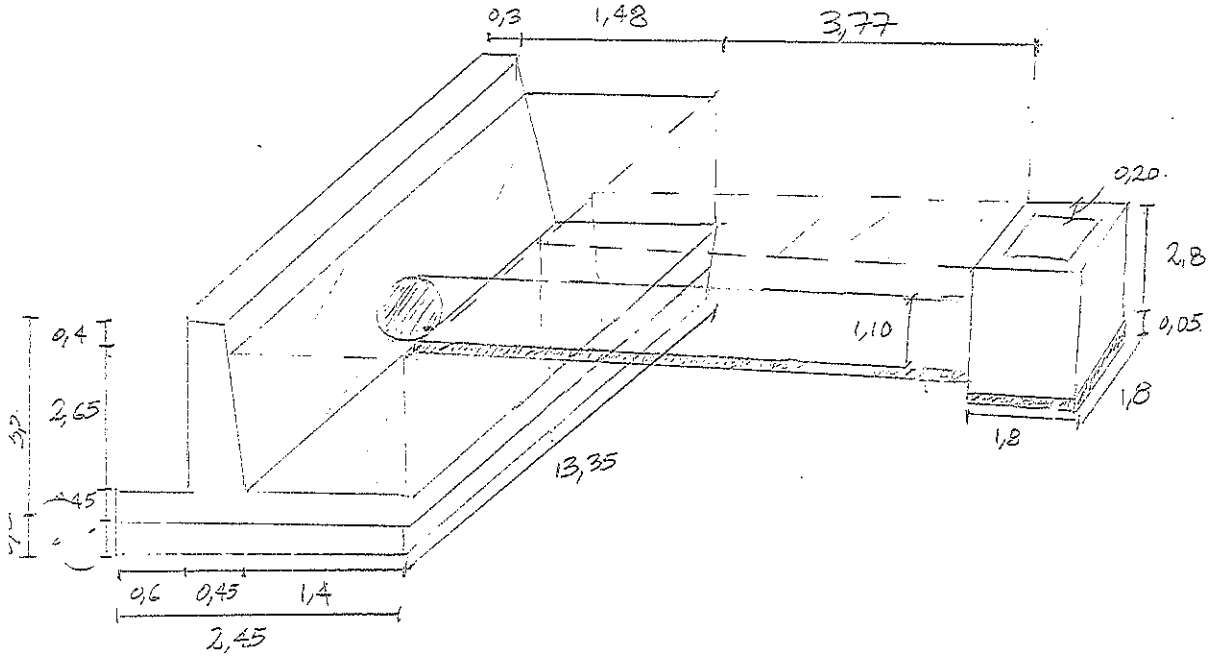


(1) Excavación

- Muro y zapata

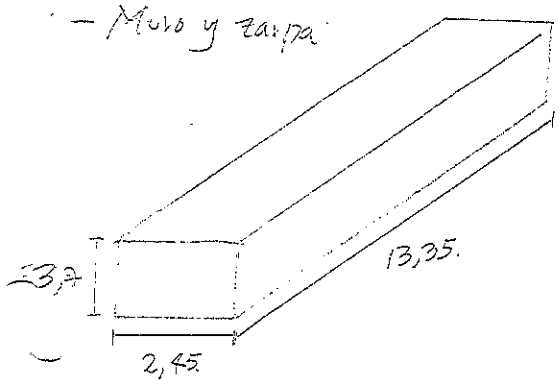

$X = 13,35 \times 2,45 \times 3,7 = 121,02 m^3$ ✓

- Altura

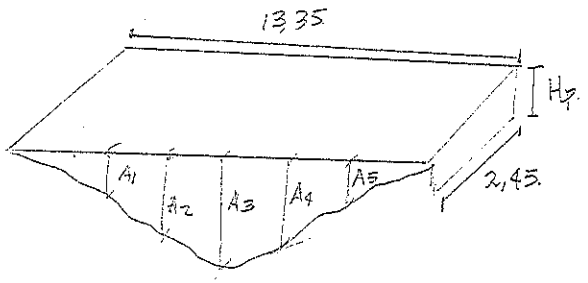

$A_1 = 0,5 m$ $A_3 = 1,95 m$ $A_5 = 0,6 m$

$A_2 = 1,15 m$ $A_4 = 1,6 m$


$Hp = (0,5 + 1,15 + 1,95 + 1,6 + 0,6)/5.$

$Hp = 1,16 m.$

$X = 13,35 \times 2,45 \times 1,16 = 37,94 m^3$ (−)


- Pocta

$X = 3 \times 1,8 \times 2,85 = 15,39\ m^3$ ✓

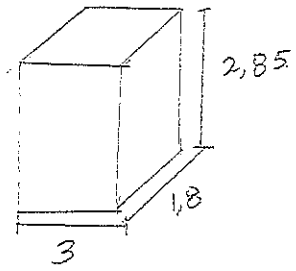

- Tubería.


$X = 3,77 \times 3 \times 2,85 = 32,23\ m^3$ ✓



$\Sigma_{EXC} = 121,02 + 15,39 + 32,23 - 37,94.$

$\Sigma_{EXC} = 130,7\ m^3$

(2) Ciclopeo

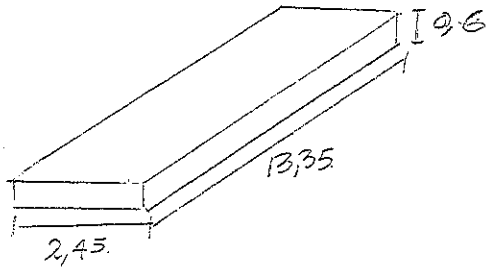


$X = 13,35 \times 2,45 \times 0,6 = 19,62\ m^3$ ✓


(3) Solado

- Pocta

$X = 1,8 \times 1,8 \times 0,05 = 0,16\ m^3$ ✓



- Tubería

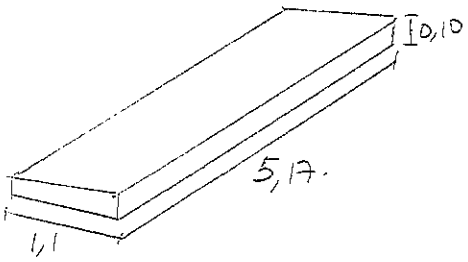


$X = 5,17 \times 1,1 \times 0,10 = 0,57\ m^3$ ✓

$\Sigma_{SOL} = 0,16 + 0,57 = \boxed{0,73\ m^3}$


(4) Concreto base

- Poceta

$X = 1,4 \times 1,4 \times \left(\frac{0,25+0,2}{2}\right) = 0,44\ m^3$ ✓



- Zarpa

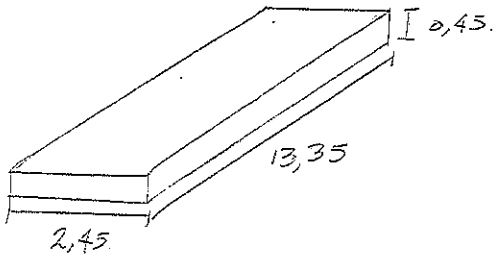


$X = 13,35 \times 2,45 \times 0,45 = 14,72\ m^3$ ✓

$\Sigma_{CB} = 0,44 + 14,72 = \boxed{15,16\ m^3}$

(5) Concreto elevación


- Muro.

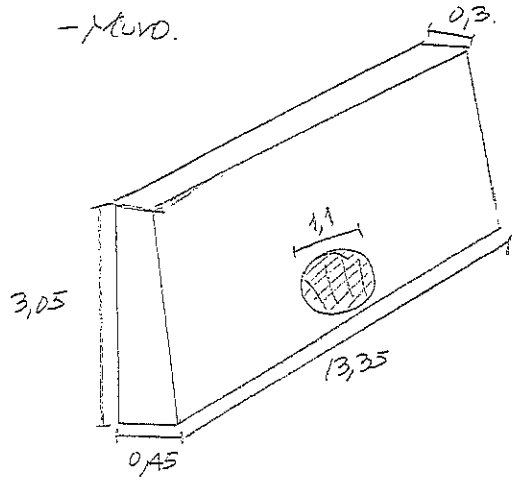

$X = 13,35 \times 3,05 \times \left(\frac{0,45+0,3}{2}\right) = 15,27\ m^3$ ✓

$X_{\text{Tubería}} = \pi \times 0,55^2 \times 0,35 = 0,33\ m^3$ (−) ✓

- Poceta.

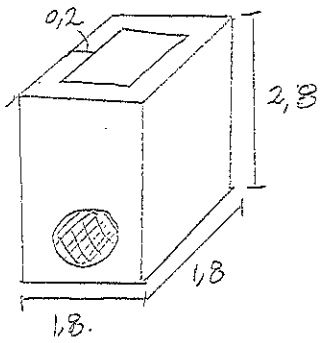

$X_1 = 2,8 \times 1,8 \times 0,2 = 1,01 \times 2 = \underline{2,02\ m^3}$ ✓

$X_2 = 2,8 \times 1,4 \times 0,2 = 0,78 \times 2 = \underline{1,57\ m^3}$ ✓


$X_{Tubería} = \pi \times 0,55^2 \times 0,2 = \underline{0,19\ m^3}$ (−) ✓

$\Sigma_{CE} = 15,27 + 2,02 + 1,57 - 0,33 - 0,19$

$\boxed{\Sigma_{CE} = 18,34\ m^3}$

- (6) Relleno


- Alvo.

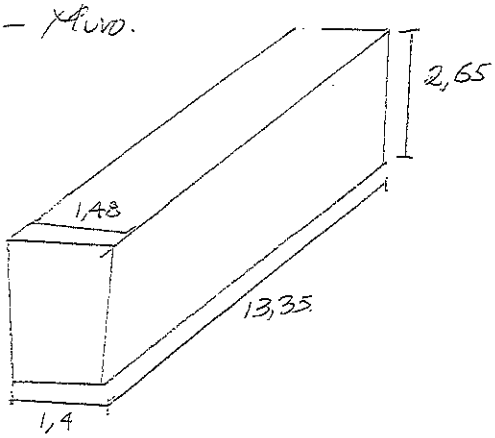

$X = 13,35 \times 2,65 \times \left(\frac{1,48 + 1,4}{2}\right) = \underline{50,94\ m^3}$ ✓

- Tubería


$X = 3,77 \times 2,85 \times 3 = \underline{32,23\ m^3}$ ✓

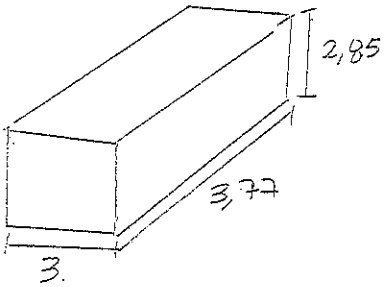

$X_{Tubería} = \pi \times 0,55^2 \times 5,17 = \underline{4,91\ m^3}$ (−) ✓

$X_{\substack{Solado \\ Tubería}} = 5,17 \times 1,1 \times 0,10 = \underline{0,57\ m^3}$ (−) ✓

- Poceta

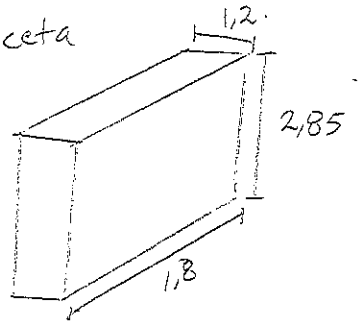

$X = 2,85 \times 1,8 \times 1,2 = \underline{6,16\ m^3}$ ✓


$$\Sigma_{RII} = 50,94 + 32,23 + 6,16 - 4,91 - 0,57$$

$$\boxed{\Sigma_{RII} = 83,85\ m^3}$$

(7) Tubería = 6 Tubos ✓

(8) Acero

A y (B)



Zapata

$$X_A = \frac{13,25}{0,25} = 53+1 = 54 \text{ Varillas } 1/2"$$

$$= 2,75 \times 54 \times 1\,Kg = \underline{148,5\ Kg} \checkmark$$

$$X_B = \frac{13,25}{0,10} = 133+1 = 134 \text{ Varillas } 1/2"$$

$$= 2,75 \times 134 \times 1\,Kg = \underline{368,5\ Kg} \checkmark$$


(C)



$$X_C = \frac{13,25}{0,20} = 66+1 = 67 \text{ Varillas } 1/2"$$

$$= 3,60 \times 67 \times 1\,Kg = \underline{241,2\ Kg} \checkmark$$

(D)



$$X_D = \frac{13,25}{0,20} = 67 \text{ Varillas } 1/2" \checkmark$$

$$= 3 \times 67 \times 1\,Kg = \underline{201\ Kg}$$

(E)

$X_F = \frac{13,25}{0,3} = 44+1 = 45$ Varillas ½" ✓

3,4 | 0,2

$= 3,6 \times 45 \times 1\,kg = 162\,Kg$

* Repartición.

6 — 2,69

6

13,25

$X_{Zarpa} = \frac{2,35}{0,3} = 8+1 = 11$ Varillas ½"

$= 14,69 \times 9 \times 1\,kg \times 2 = 264,42\,Kg$ ✓

Traslapo ½" = 0,72 m.


$X_{muro} = \frac{2,95}{0,3} = 10+1 = 11$ Varillas ½" ✓

$= 14,69 \times 11 \times 1\,kg \times 2 = 323,18\,Kg$

$\Sigma = 148,5 + 368,5 + 241,2 + 201 + 162 + 264,42 + 323,18$

$\Sigma_{Acero} = 1708,8\,Kg$

3/8 4.25




$\frac{2.60}{0.25}$ = 11 varillas * 6 mL * = 66 mL * $\frac{.56 kg}{1 mL}$ = 36.96 kg ✓


1.08

$\frac{2.60}{0.25}$ = 11 varillas * 1.08 mL = 11.88 mL * $\frac{.56 kg}{1 mL}$ = 6.65 kg. ✓

1/2" c/.25




$\frac{2.70}{0.25}$ = 11 varillas * 6 mL = 66 mL * $\frac{1 kg}{1 mL}$ = 66 kg. ✓



$\frac{2.70}{0.25}$ = 11 varillas * 2.3 mL = 25.3 mL * $\frac{1 kg}{1 mL}$ = 25.3 kg. ✓


3/8" c/.20

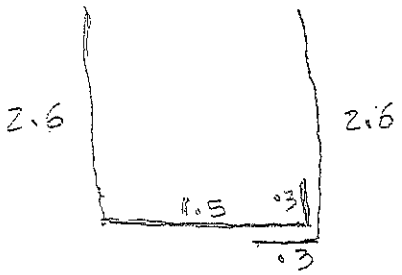

$\frac{1.50}{0.20}$ = 8 varillas * 4.4 mL = (35.2 mL * $\frac{0.56 kg}{mL}$) * 2 = 19.7 kg. (39.4 k). ✓

$\frac{1.50}{0.20}$ = 8 varillas * 2.90 mL = (23.2 mL * $\frac{0.56 kg}{mL}$) * 2 = 13 kg. (26 kg) ✓

1/2" c/.20



$\frac{1.70}{0.20}$ = 9 varillas * 4.7 mL = (42.3 mL * $\frac{1 kg}{1 mL}$) * 2 = 42.3 kg. (84.6 kg). ✓


$\frac{1.70}{0.20}$ = 9 varillas * 3.0 mL = (27 mL * $\frac{1 kg}{1 mL}$) * 2 = 27 kg. (54 kg) ✓

Total: = 338.91 kg.

Real para Acta parcial. Acero Poceta


Disipador

- Excavación.

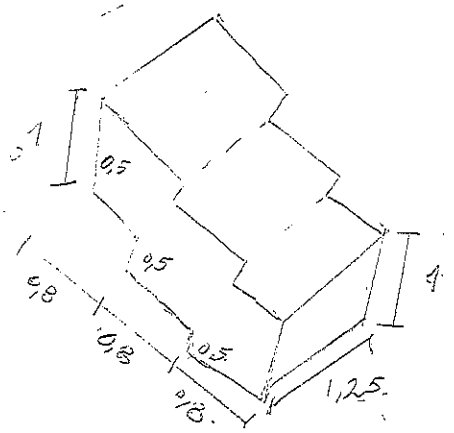


$X = 1{,}25 \times 1 \times 0{,}8 = 1\,m^3 \times 3 = 3\,m^3$ ✓

- Concreto base. (Huella y contrahuella)

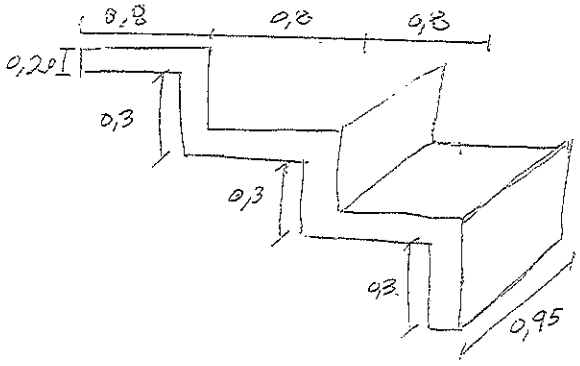

$X = \left((0{,}8 \times 3) + (0{,}3 \times 3)\right) \times 0{,}95 \times 0{,}2 = 0{,}63\,m^3$ ✓

- Concreto elevación. (Aletas)

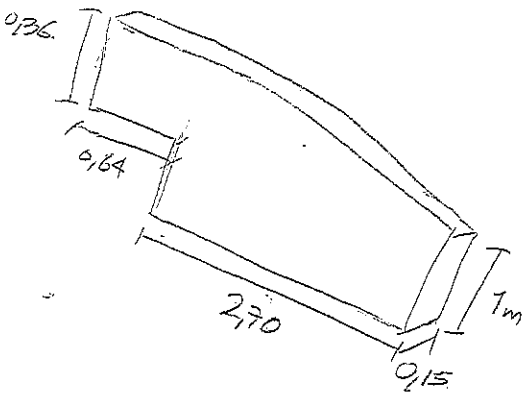


$X = 2{,}70 \times 1 \times 0{,}15 = 0{,}405\,m^3 \times 2 = 0{,}81\,m^3$ ✓

$X = 0{,}64 \times 0{,}36 \times 0{,}15 = 0{,}034\,m^3 \times 2 = 0{,}068\,m^3$ ✓


$\Sigma_{CE} = 0{,}81 + 0{,}068 = 0{,}88\,m^3$ ✓

- Aço

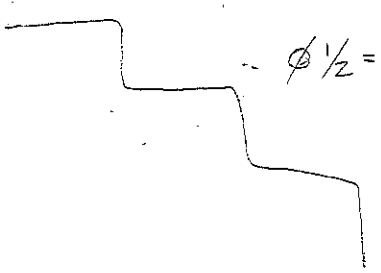


$\phi 1/2 = 3{,}75$ m.

$X = 3{,}75 \times \left(\left(\frac{1{,}15}{0{,}2}\right)+1\right) * 1\,kg = 26{,}25\,kg$ ✓



$\phi 1/2 = 2{,}75$

$X = 2{,}75 \times \left(\left(\frac{3{,}2}{0{,}2}\right)+1\right) \times 1\,kg = 46{,}75\,kg$ ✓




$\phi 1/2 = 3{,}35$

$X = 3{,}35 \times 4 \times 1\,kg = 13{,}4\,kg \times 2 = 26{,}8\,kg$ ✓

$\Sigma_{ac} = 26{,}25 + 46{,}75 + 26{,}8$


$\Sigma_{ac} = 99{,}8\,kg$

Alcantarillado #2
(Menoras)

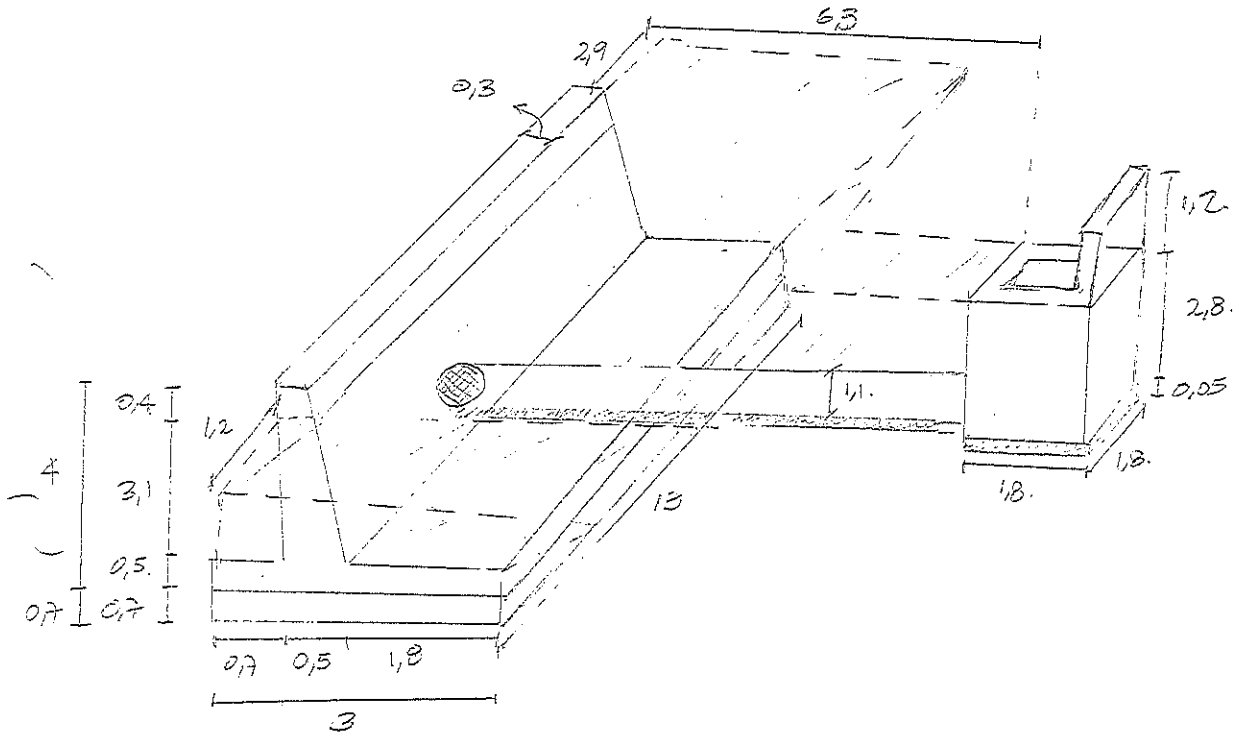


1) Excavacion

- Muro y Zarpa

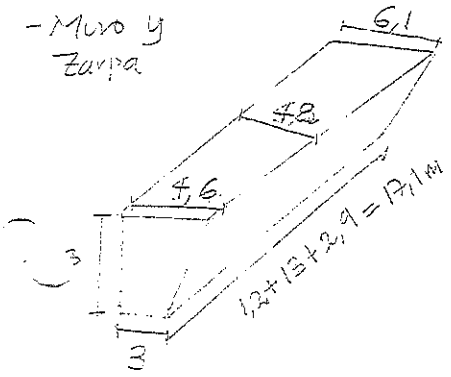

$$X = 17,1 \times 4,3 \times \left(\frac{5,17+3}{2}\right) = 300,74\ m^3$$ ✓



Alturas

$A_1 = 0,85$. $A_3 = 2,05$. $A_5 = 0,60$.

$A_2 = 1,30$ $A_4 = 1,40$


$$Hp = (0,85 + 1,3 + 2,05 + 1,4 + 0,6)/5$$

$$Hp = 1,24\ m.$$

$$X = 13 \times 3 \times 1,24 = 48,36\ m^3\ (-)$$ ✓


000052

- Poceta

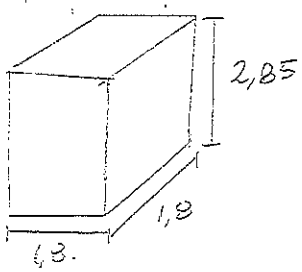

$X = 2,85 \times 1,8 \times 18 = 9,23\ m^3$ ✓

- Tubería




$X = 3,5 \times 2,85 \times 2 = 19,95\ m^3$ ✓

$\Sigma_{EXC} = 300,25 + 9,23 + 19,95 - 48,36.$

$\Sigma_{EXC} = 281,07\ m^3$


② Ciclopeo

$X = 13 \times 3 \times 0,7 = 27,3\ m^3$ ✓

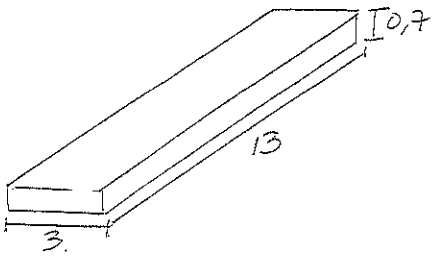


③ Solado

- Poceta.



$X = 1,8 \times 1,8 \times 0,05 = 0,16\ m^3$ ✓

- Tubería

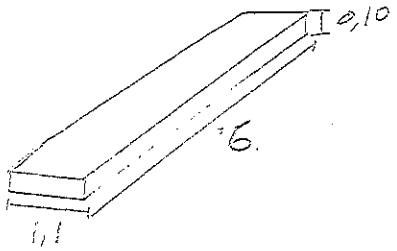


$X = 6 \times 1,1 \times 0,10 = 0,66\ m^3$ ✓

$0,81\ m^3$


④ Concreto base

- Zarpa:

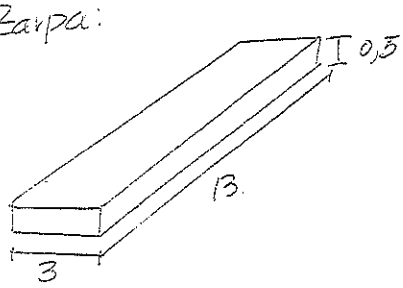

$X = 13 \times 3 \times 0,5 = 19,5\ m^3$

- Poceta.




$X = 1,4 \times 1,4 \times \left(\frac{0,25+0,2}{2}\right) = 0,44\ m^3$

$\Sigma_{CB} = 19,5 + 0,44$

$\boxed{\Sigma_{CB} = 19,44\ m^3}$

⑤ Concreto elevación

- Muro:

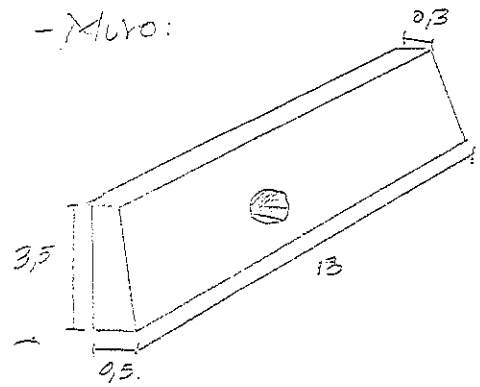


$X = 13 \times 3,5 \times \left(\frac{0,5+0,3}{2}\right) = 18,2\ m^3$

$X = \pi \times 0,55^2 \times 0,4 = 0,38\ m^3$ (−)

$X_3 = 4 \times 1,8 \times 0,2 = 1,44\ Kg$

$X_1 = 2,8 \times 1,8 \times 0,2 = 1,01\ Kg$

- Poceta:

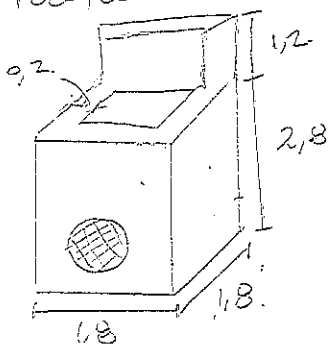

$X_2 = 2,8 \times 1,4 \times 0,2 = 0,78 \times 2 = 1,57\ m^3$

$X_{Tubo} = \pi \times 0,55^2 \times 0,2 = 0,19$ (−)


$\Sigma_{CE} = 18,2 + 2,45 + 1,57 - 0,38 - 0,19$

$\boxed{\Sigma_{CE} = 21,65\ m^3}$


⑥ Tubería = 7 tubos ✓

⑦ Relleno


- Muro:

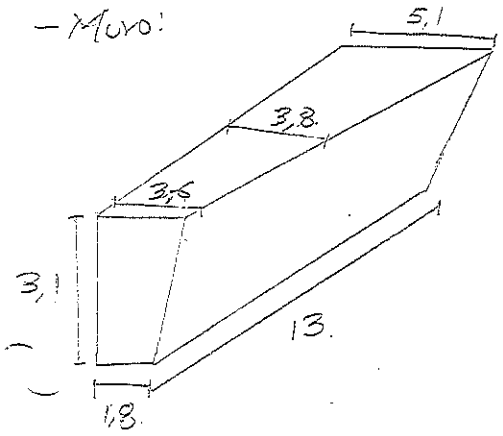

$X = 13 \times 3,1 \times \left(\frac{4,9+1,8}{2}\right) = 120,3\ m^3$ ✓

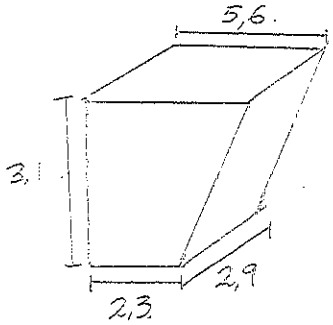


$X = 2,9 \times 3,1 \times \left(\frac{5,6+2,3}{2}\right) = 35,51\ m^3$ ✓

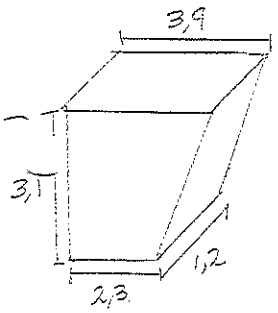

$X = 1,2 \times 3,1 \times \left(\frac{3,9+2,3}{2}\right) = 11,53\ m^3$

- Tubería:

$X = 3,5 \times 2,84 \times 2 = 19,88\ m^3$ ✓

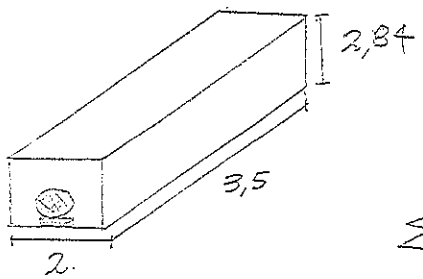


$X_{Tubo} = \pi \times 0,55^2 \times 5,9 = 5,61\ m^3$ (−) ✓

$X_{Solado} = 5,9 \times 1,1 \times 0,10 = 0,65\ m^3$ (−) ✓

$\Sigma_{Rll} = 120,3 + 35,51 + 11,53 + 19,95 - 5,61 - 0,65$


$\Sigma_{Rll} = 181,03\ m^3$

Mejoramiento Vía

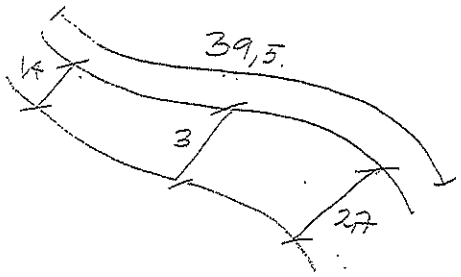


$\bar{A}_? = \frac{1,4 + 3 + 2,7}{3} = 2,37 \text{ m.}$

- Excavación

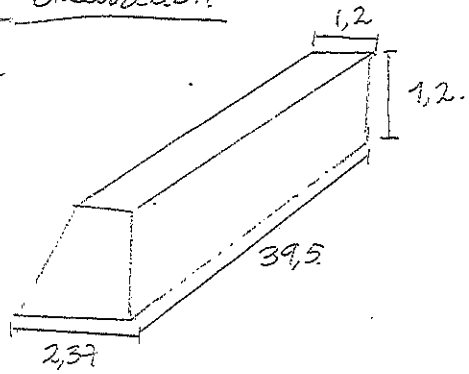

$X = 39,5 \times 1,2 \times \left(\frac{2,37 + 1,2}{2}\right) = \boxed{84,95 \text{ m}^3}$ ✓


- Relleno

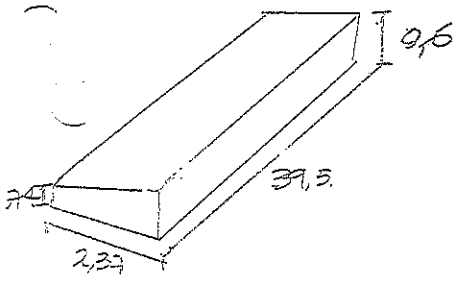

$X = 39,5 \times 2,37 \times \left(\frac{0,6 + 0,24}{2}\right) = \boxed{40,92 \text{ m}^3}$ ✓

Acero Muro

- (A) y (B) (Zarpa)




Separación.

$$X_A = 3{,}30 \times \left(\left(\frac{12{,}9}{0{,}25}\right)+1\right) = 174{,}9 \times 1\,Kg = \underline{174{,}9\,Kg}$$

$$X_B = 3{,}30 \times \left(\left(\frac{12{,}9}{0{,}1}\right)+1\right) = 429 \times 1\,Kg = \underline{429\,Kg}$$


- (C) (Muro)



$$X = 4{,}10 \times \left(\left(\frac{12{,}9}{0{,}2}\right)+1\right) = 270{,}6 \times 1\,Kg = \underline{270{,}6\,Kg}$$


134-1/19

- (D) (Muro)




$$X = 3{,}2 \times \left(\left(\frac{12{,}9}{0{,}2}\right)+1\right) = 211{,}2 \times 1\,Kg = \underline{211{,}2\,Kg}$$

- (F) (Muro)



$$X = 4{,}10 \times \left(\left(\frac{12{,}9}{0{,}3}\right)+1\right) = 180{,}4 \times 1\,Kg = \underline{180{,}4\,Kg}$$

- Reparticion



Traslapo ½" = 0,72.


$$X_{Zarpa} = 14{,}34 \times \left(\left(\frac{2{,}9}{0{,}3}\right)+1\right) \times 2 = 315{,}48 \times 1\,Kg = \underline{315{,}48\,Kg}$$

$$X_{Muro} = 14{,}34 \times \left(\left(\frac{3{,}45}{0{,}3}\right)+1\right) \times 2 = 372{,}84 \times 1\,Kg = \underline{372{,}84\,Kg}$$

$$\Sigma = 174{,}9 + 429 + 270{,}6 + 211{,}2 + 180{,}4 + 315{,}48 + 372{,}84.$$

$$\boxed{\Sigma = 1954{,}42}$$

000057




$\frac{2.60}{0.25}$ = 11 varillas * 6mL * = 66mL * $\frac{.56kg}{1mL}$ = 36.96 kg


1.08

$\frac{2.60}{0.25}$ = 11 varillas * 1.08mL = 11.88mL * $\frac{.56kg}{1mL}$ = 6.65 kg.

1/2" c/.25




$\frac{2.70}{0.25}$ = 11 varillas * 6mL = 66mL * $\frac{1kg}{1mL}$ = 66 kg.



$\frac{2.70}{0.25}$ = 11 varillas * 2.3mL = 25.3mL * $\frac{1kg}{1mL}$ = 25.3 kg.


3/8" c/.20

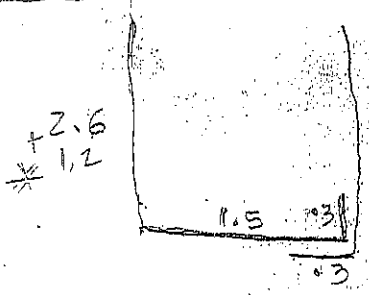

$\frac{1.50}{0.20}$ = 8 varillas * 4.4mL = (35.2mL * $\frac{0.56kg}{mL}$) *2 (39.4 kg) = 19.7 kg.

$\frac{1.50}{0.20}$ = 8 varillas * 2.90mL = (23.2mL * $\frac{0.56kg}{mL}$) *2 = 13 kg. (26 kg)

1/2" c/.20



$\frac{1.70}{0.20}$ = 9 varillas * 4.7mL = (42.3 mL * $\frac{1kg}{1mL}$) *2 (84.6 kg) = 42.3 kg.

$\frac{1.70}{0.20}$ = 9 varillas * 3.0 mL = (27 mL * $\frac{1kg}{1mL}$) *2 → (54 kg) = 27 kg.

Total: ~~29,44~~ 338.91 kg. = 368,35 kg


Real para Acta parcial. Acero Poceta

- *1,20 x 8 Varillas * 0,56 kg = 5,38 kg.
- @ 1,20 x 9 Varillas x 1 kg = 10,8 kg → 16,18 kg
- — 1,7 x 5 Varillas x 0,56 kg = 4,76 kg
- — 1,7 x 5 " x 1 kg = 8,5 kg → 13,26 kg


→ 29,44 kg

Alcantarillado #3
(Memorias)


Encofrado

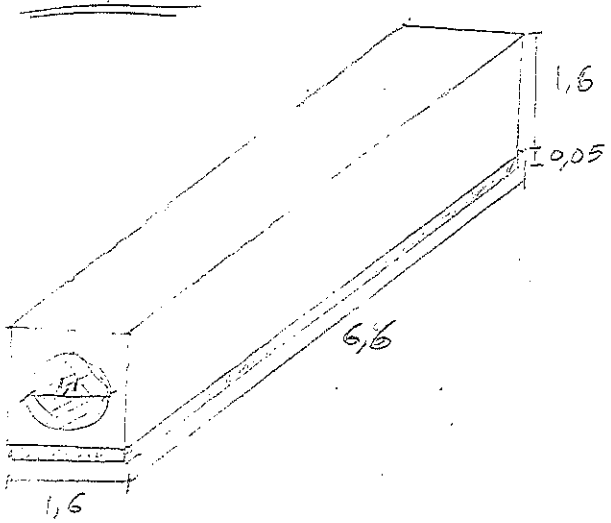

Descole.

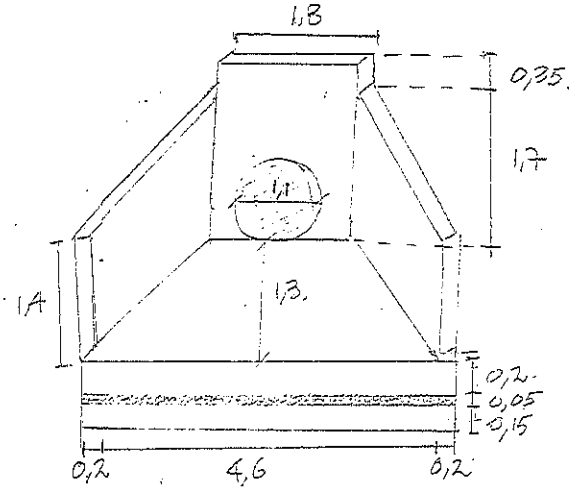


Encole

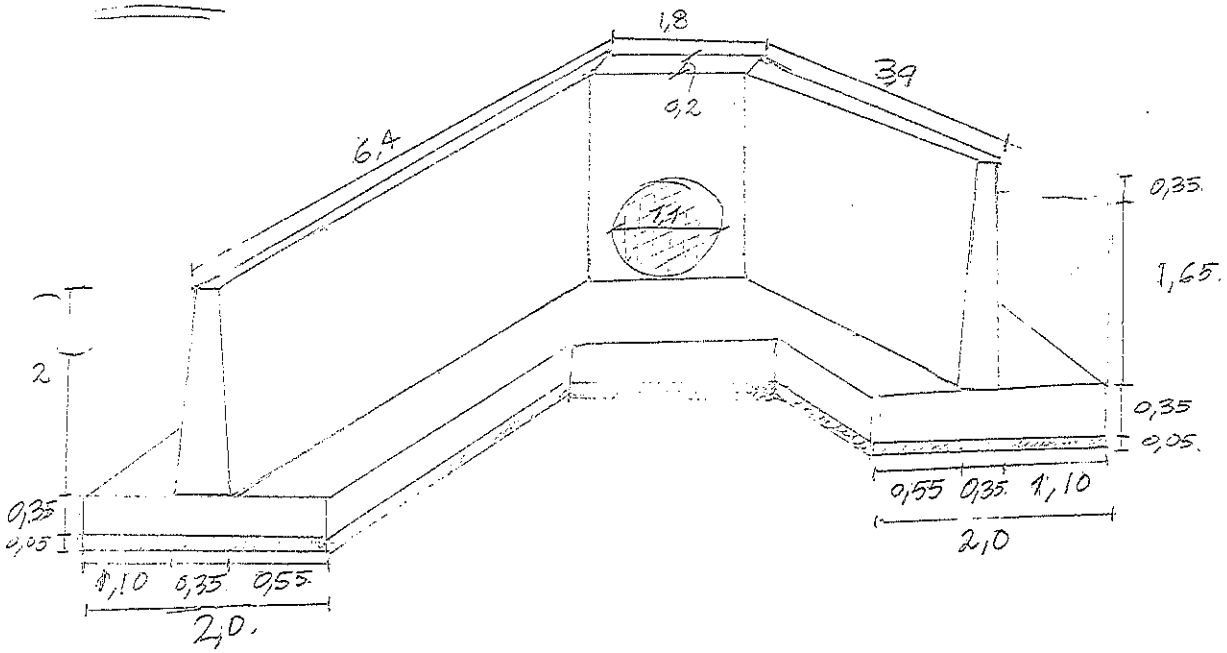


1 Excavación

- Encofrado:

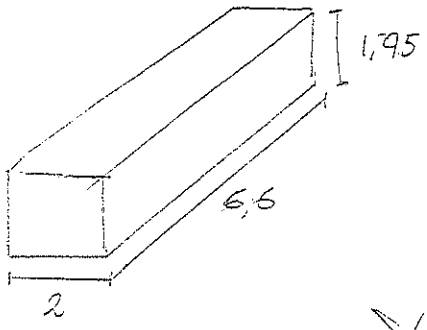


$X = 6,6 \times 2 \times 1,95 = 25,74 m^3$

- Descole.

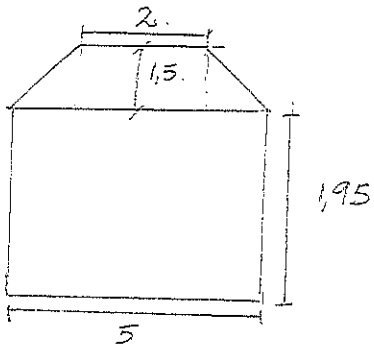


$X = 1,5 \times 1,95 \times \left(\frac{5+2}{2}\right) = 10,24 m^3$

- Encole.

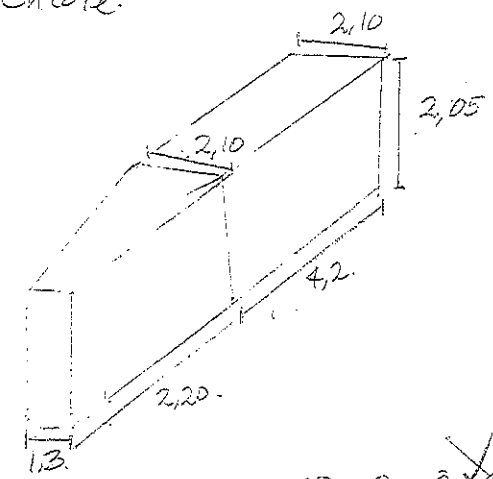


$X = 4,2 \times 2,05 \times 2,10 = 18,08 m^3$

$2,20 \times 2,05 \times \left(\frac{2,10+1,25}{2}\right) = 7,76 m^3$

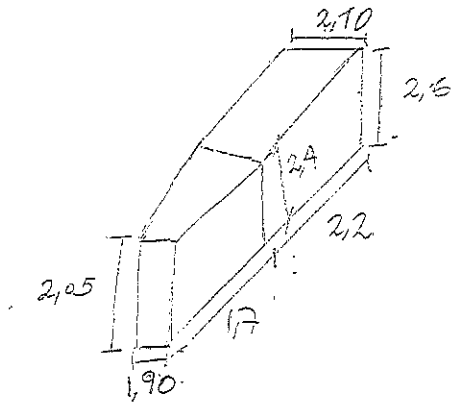

$X = 2,2 \times 2,10 \times \left(\frac{2,6+2,4}{2}\right) = 11,55 m^3$

$X = 1,7 \times \left(\frac{1,9+2,10}{2}\right) \times \left(\frac{2,4+2,05}{2}\right) = 7,57 m^3$

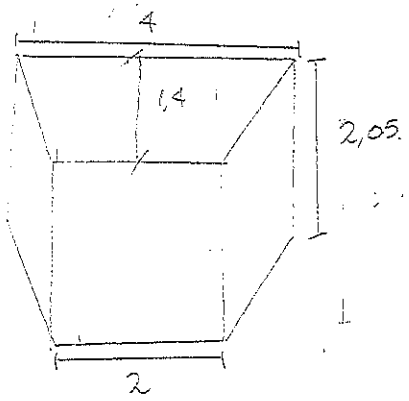

$X = 1,4 \times 2,05 \times \left(\frac{4+2}{2}\right) = 8,61 m^3$


$\Sigma_{Exc} = 25,74 + 10,24 + 18,08 + 7,76 + 11,55 + 7,57 + 8,61 \ldots$

$\Sigma_{Exc} = 89,55 m^3$

2) Solado

- Encofrado: $6,6 \times 1,6 \times 0,05 = 0,53\ m^3$

- Descole: $1,5 \times \left(\frac{5+2}{2}\right) \times 0,05 = 0,26\ m^3$



- Encole: $X_1 = 2,0 \times 2,2 \times 0,05 = 0,22\ m^3$

$X_2 = 1,7 \times \left(\frac{2,0+1,85}{2}\right) \times 0,05 = 0,16\ m^3$

$X_3 = 1,4 \times \left(\frac{4+2}{2}\right) \times 0,05 = 0,21\ m^3$

$X_4 = 2,2 \times \left(\frac{2,0+1,2}{2}\right) \times 0,05 = 0,18\ m^3$


$X_5 = 4,2 \times 2,0 \times 0,05 = 0,42\ m^3$

$\Sigma_{Solado} = 0,53 + 0,26 + 0,22 + 0,16 + 0,21 + 0,18 + 0,42$

$\Sigma_{Sol} = 1,98\ m^3$

3) Concreto base

- Encole (Rampa)

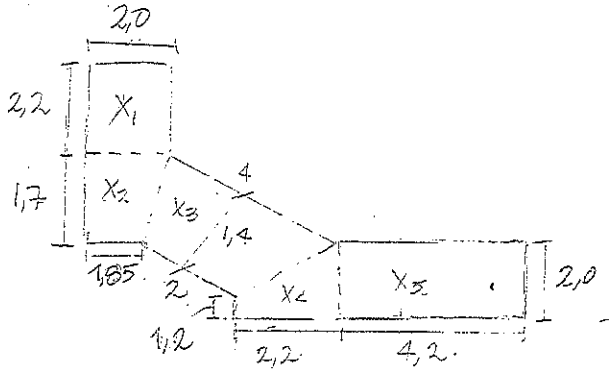

$X_1 = 2,0 \times 2,2 \times 0,35 = 1,54\ m^3$


$X_2 = 1,7 \times \left(\frac{2,0+1,85}{2}\right) \times 0,35 = 1,14\ m^3$

$X_3 = 1,4 \times \left(\frac{4+2}{2}\right) \times 0,35 = 1,47\ m^3$

$X_4 = 2,2 \times \left(\frac{2,0+1,2}{2}\right) \times 0,35 = 1,23\ m^3$

$X_5 = 4,2 \times 2,0 \times 0,35 = 2,94\ m^3$

- Descole (Base)

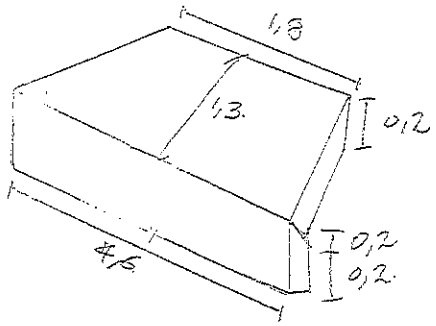

$X = 5 \times 0,2 \times 0,2 = 0,2\ m^3$ → Dentellon.


$X = 1,3 \times 0,2 \times \left(\frac{4,6+1,8}{2}\right) = 0,83\ m^3$

$\Sigma_{CB} = 1,54 + 1,14 + 1,47 + 1,23 + 2,94 + 0,83 + 0,2$

$\Sigma_{CB} = 9,36\ m^3$

(4) Concreto elevado.


- Encofrado.

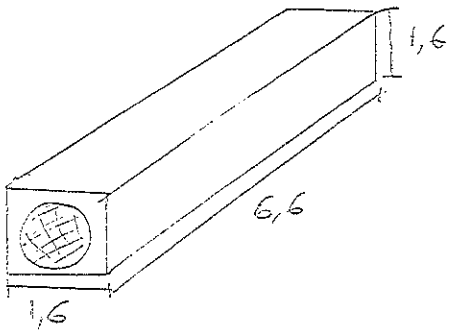


$x = 6,6 \times 1,6 \times 1,6 = 16,90\ m^3$ ✓

$x = \pi \times 0,55 \times 7 = 6,65\ m^3$ (—) ✓


- Encole.

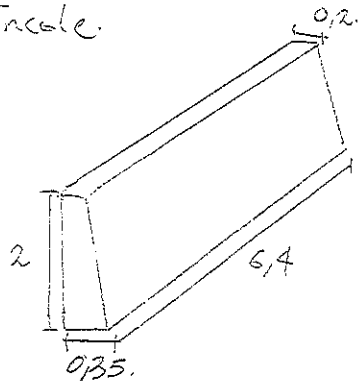

$x = 6,4 \times 2 \times \left(\frac{0,35+0,2}{2}\right) = 3,58\ m^3$ ✓

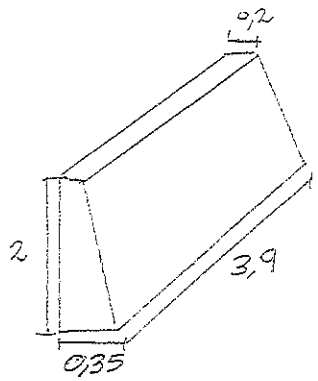



$x = 3,9 \times 2 \times \left(\frac{0,35+0,2}{2}\right) = 2,18\ m^3$ ✓



$x = 1,8 \times 2 \times 0,2 = 0,72\ m^3$ ✓

- Descole.

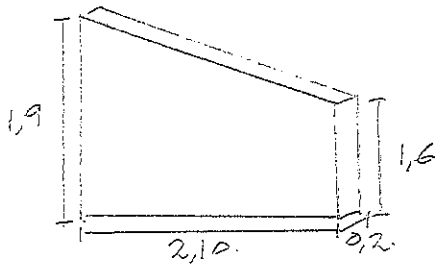

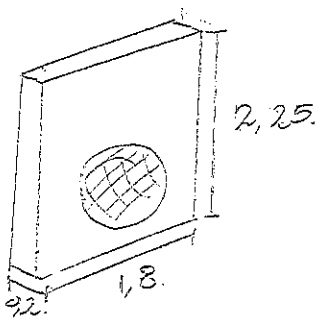

$x = 1,8 \times 2,25 \times 0,2 = 0,81\ m^3$ ✓

$x = 2,10 \times 0,2 \times \left(\frac{1,9+1,6}{2}\right) = 0,74 \times 2 = 1,47\ m^3$ ✓


$\Sigma_{CE} = 16,90 + 3,58 + 2,18 + 0,72 + 1,47 + 0,81 - 6,65$

$\Sigma_{CE} = 19,01\ m^3$

(5) Tubería = 7 TUBOS ✓


(5) Relleno

- Encofrado:

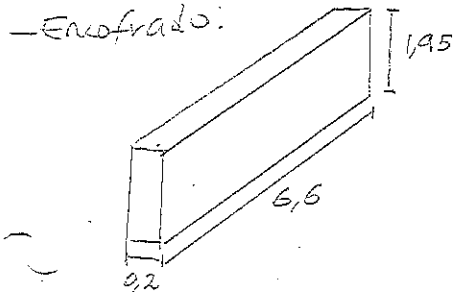


$X = 6,6 \times 1,95 \times 0,2 = 2,57\ m^3$ ✓

$X = 2,57 \times 2 = 5,15\ m^3$

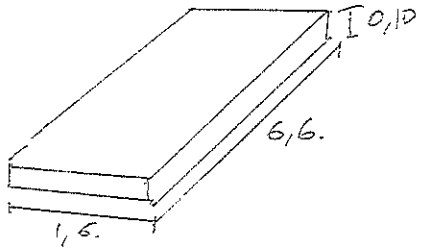


$X = 6,6 \times 1,6 \times 0,10 = 1,06\ m^3$ ✓

- Excole:

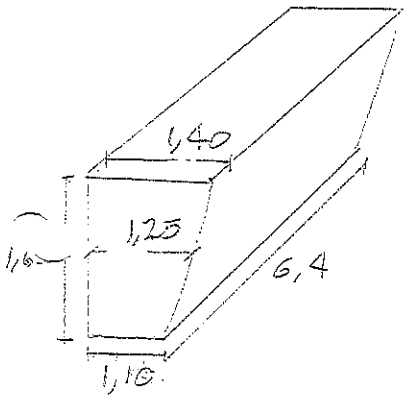

$X = 6,4 \times 1,65 \times \left(\frac{1,4 + 1,25 + 1,10}{3}\right)$

$X = 13,20\ m^3$ ✓

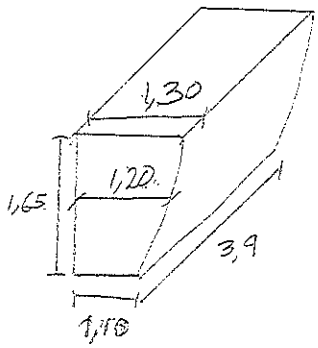

$X = 3,9 \times 1,65 \times \left(\frac{1,3 + 1,20 + 1,10}{3}\right)$

$X = 7,72\ m^3$ ✓


$\Sigma_{R11} = 5,15 + 1,06 + 13,20 + 7,72$

$\Sigma_{R11} = 27,14\ m^3$

Acero


- Encofrado

- 34 Varillas $\phi 1/2''$ x 7,5 = 255 Kg //
- 34 Varillas $\phi 1/2''$ x 6 = 204 Kg //



- Encole aletas

(A) y (B)




$x = 2,3 \times \left(\frac{6,3}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 50,6\,kg \times 2 = 101,2\,kg$ //

$x = 2,3 \times \left(\frac{3,8}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 32,2\,kg \times 2 = 64,4\,kg$ //

} Zapata


(C)



$x = 2,45 \times \left(\frac{6,3}{0,25} + 1\right) \times 1\,kg = 63,7\,kg$ //

$x = 2,45 \times \left(\frac{3,8}{0,25}\right) \times 1\,kg = 39,2\,kg$ //

(E)



$x = 2,45 \times \left(\frac{6,3}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 53,9\,kg$ //

$x = 2,45 \times \left(\frac{3,8}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 34,3\,kg$ //

} Muro

- Repartición

6

$x = 6 \times \left(\frac{1,9}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 42\,kg \times 2 = 84\,kg$ // → Zapata


$x = 6 \times \left(\frac{1,9}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 42\,kg \times 2 = 84\,kg$ // → Muro.

3,8


$x = 3,8 \times \left(\frac{1,9}{0,3} + 1\right) \times 1\,kg = 26,6\,kg \times 4 = 106,4\,kg$ // → Zapata y muro.

$\Sigma = 629,14$ //

- Nuevo pantalla anular.




$= 2,65 \times 4 \text{ Varillas} \times 1 \text{ Kg.} = 10,6 \text{ kg}$




$= 2,85 \times 4 \text{ Varillas} \times 1 \text{ kg} = 11,4 \text{ Kg.}$

$\Sigma = 75,5 \text{ kg}$



$= 3,5 \times \left(\frac{0,9}{0,3} + 1\right) = 14 \text{ kg} \times 2 = 28 \text{ kg.}$



$= 0,95 \times \left(\frac{1}{0,22} + 1\right) \times 1 \text{ Kg.} = 4,75 \text{ kg} \times 2 = 9,5 \text{ kg}$

$\frac{}{1} = 1 \times \left(\frac{1}{0,3} + 1\right) \times 1 \text{ Kg} = 4 \text{ kg} \times 4 \text{ kg} = 16 \text{ Kg Kg}$

- Base encole tubena.

$\frac{}{2,5}$ $x = 2,5 \times 2 \text{ Var} \times 1 \text{ kg} = 5 \text{ Kg}$

$\frac{}{3}$ $x = 3 \times 2 \times 1 \text{ kg} = 6 \text{ kg}$

$\frac{}{4}$ $x = 4 \times 2 \times 1 \text{ kg} = 8 \text{ kg}$


$\frac{}{1,3}$ $x = 1,3 \times 12 \times 1 \text{ kg} = 15,6 \text{ kg}$

$\Sigma = 34,6 \text{ kg}$

$\Sigma_{\text{Encole}} = 739,24 \text{ kg}$

- Desde

- Aleta.




$x = 5,8 \times \left(\frac{1,4}{0,22} + 1\right) \times 0,56kg = 22,74kg = \underline{45,47\ kg}$


$\frac{}{3,24} = x = 3,24 \times 0,56\ kg = 1,81kg \times 2 - \underline{3,63\ kg}$

$\frac{}{1,7} \quad x = 1,7 \times 2 \times 0,56\ kg = 1,9kg \times 2 = \underline{3,81\ kg}$


} Aleta y Muro Pantalla



$x = 1,9 \times \left(\frac{2}{0,22} + 1\right) \times 1kg = 19\ kg \times 4 = \underline{76\ kg} \rightarrow$ Aletas




$x = 2,75 \times \left(\frac{1,7}{0,22} + 1\right) \times 1kg = \underline{24,75\ kg}$




$x = 2,55 \times \left(\frac{1,7}{0,22} + 1\right) \times 1kg = \underline{22,95}$


} Muro Pantalla



$x = 3,7 \times \left(\frac{1,5}{0,20} + 1\right) \times 1kg = 29,6 \times 2 = \underline{59,2kg}$



$x = 1,85 \times \left(\frac{2}{0,22} + 1\right) \times 1kg = 18,5 \times 2 = \underline{37\ kg}$




$x = 1,05 \times \left(\frac{1,45}{0,22} + 1\right) \times 1kg = 7,35 \times 4 = \underline{29,4\ kg}$


} Base

$\Sigma = 282,21\ kg$

Canal

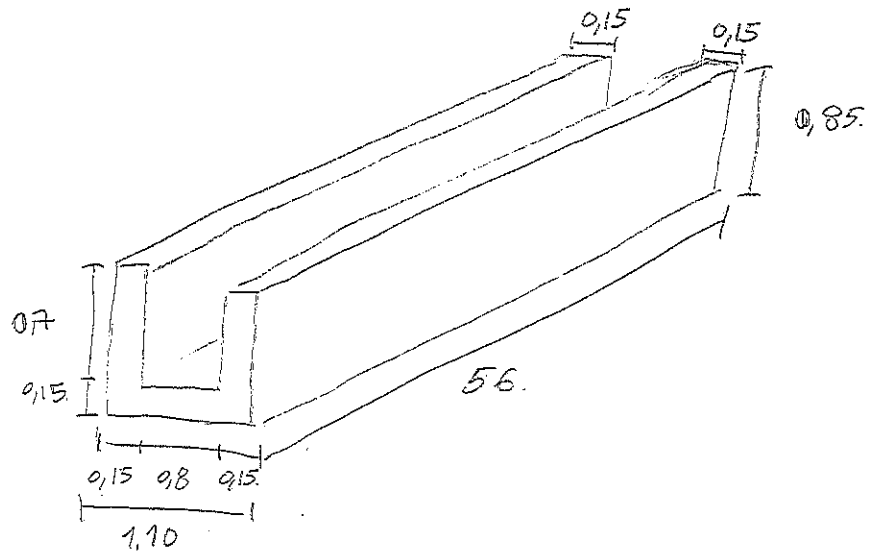

- Excavación

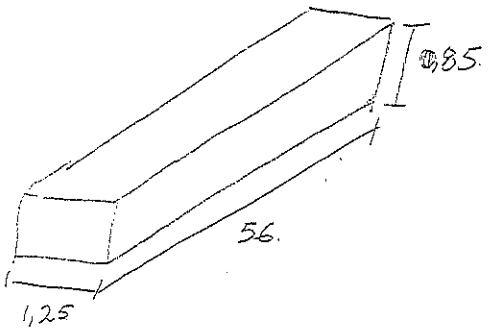

$x = 56 \times 1{,}25 \times 0{,}85 = \boxed{59{,}5\ m^3}$ ✓


- Concreto.

$x_1 = 56 \times 1{,}10 \times 0{,}15 = 9{,}24\ m^3$ ✓

$x_2 = 56 \times 0{,}7 \times 0{,}15 = 5{,}88\ m^3 \times 2 = 11{,}76\ m^3$ ✓

$\Sigma = 21\ m^3$ ✓

- Acero.



$$= 2{,}5 \times \left(\frac{\overbrace{55{,}9}^{374.}}{0{,}15} + 1\right) \times 1\,kg = 935\,Kg$$

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3,1 = 63,1 m


56 m

Traslapo Varilla ϕ 1/2 = 0,72 m

$x = 63,1 \times \left(\frac{1}{0,15} + 1\right) \times 1\,kg = 504,8\,kg$ (8)

$x = 63,1 \times \left(\frac{0,75}{0,15} + 1\right) \times 1\,kg = 378,6 \times 2 = 757,2\,kg$

$\Sigma = 2197\,kg$



Longitud = 4,5 m

Excavación $x = 0,55 \times 0,10 \times 4,5 = 0,25\,m^3$

$x = 0,65 \times 0,10 \times 4,5 = 0,29\,m^3$

$\Sigma = 0,54\,m^3$

Concreto = Excavación = $0,54\,m^3$

000018

Indicon
INGENIERIA S.A.S

INFORME DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría FDGRD No 99 DE 2022

Acta parcial de obra No.: 01

Periodo del Informe: Del 2 de diciembre de 2022 al 04 de diciembre de 2022 y del 23 de enero de 2023 al 14 de marzo de 2023



CONTRATISTA DE OBRA :
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
R.L GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ

INTERVENTORIA:
INDICON INGENIERA S.A.S
R.L MARIO FERNANDO ESTRADA MORA

000069

INFORME DE INTERVENTORÍA

ACTA PARCIAL DE OBRA [X] **NUMERO** [1]

Periodo del Informe: Del 2 de diciembre de 2022 al 04 de diciembre de 2022 y del 23 de enero de 2023 al 14 de marzo de 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Nombre del Contratista: INDICON INGENERIA S.A.S	**Contrato de Interventoría FDGRD No 99 DE 2022**
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022".	**Valor Inicial:** $ 44.660.700,00 Valor adicional 1: $ 0,00 **Valor Final:** $ 44.660.700,00 **Valor Anticipo:** N/A **Nombre de la aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL **Póliza Cumplimiento:** NV-100077678 **Fecha Aprobación Póliza:** 01/11/2022 **Fecha de Inicio:** 02/12/2022 **Fecha de suspensión 1:** 05/12/2022 **Fecha de reinicio 1:** 23/01/2023 **Fecha de terminación:** 20/04/2023
Plazo: TRES (3) MESES CONTADOS SEGÚN ACTA DE INICIO Y EN TODO CASA HASTA SU LIQUIDACIÒN Y RECIBO A SATISFACCIÒN.	**Municipio: SALADOBLANCO**
Nombre del Supervisor: MARTIN HERNANDO LONDOÑO	**Contratante: SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO**

RELACIÓN DE POLIZAS INTERVENTORÍA			**Compañía Mundial de Seguros**		
Póliza legalización contrato			**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
AMPARO	**N° DE POLIZA**	**ANEXO**	**DESDE**	**HASTA**	
Cumplimiento	NV-100077678	0	01/11/2022	01/08/2023	$ 8.932.140,00
Pago de salarios y prestaciones sociales	NV-100077678	0	01/11/2022	01/02/2026	$ 4.466.070,00
Responsabilidad civil extracontractual	NV-100077678	0	01/11/2022	01/02/2026	$ 200.000.000,00

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ORDEN DE SERVICIOS N° 98 DE 2022	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	INDICON INGENIERIA S.A.S
PERIODO DEL INFORME:	Del 2 de diciembre de 2022 al 04 de diciembre de 2022 y del 23 de enero de 2023 al 14 de marzo de 2023
NUMERO DE CONTRATO:	98 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
VALOR INICIAL:	$ 638.455.304,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 638.455.304,00
VALOR TOTAL EN LETRAS:	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
ANTICIPO	$ 0,00
ACTA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE SUSPENSION 1:	05/12/2023
ACTA DE REINICIO 1:	23/01/2023
PLAZO ADICIONAL 1:	N/A
PLAZO TOTAL.	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO TRANSCURRIDO EN EL PROYECTO:	53 dias
PLAZO RESTANTE DEL PROYECTO:	37 dias

Póliza de legalización del contrato			**Seguros del Estado S.A**	
Fecha de expedición: 21/11/2022 **Fecha de Aprobación: 02/12/2022**				
No. póliza	**amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
NV-100014564	Responsabilidad Civil	$200.000.000,00	21/11/2022	28/02/2023
NV-100077753	Cumplimiento del Contrato	$ 127.691.060,80	21/11/2022	28/02/2024

	Pago salarios, prestaciones sociales, in	$ 63.845.530,40	21/11/2022	28/02/2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 127.691.060,80	28/02/2023	28/02/2028

Póliza acta de inicio

Fecha de expedición: 10/01/2023 **Fecha de Aprobación:**

No. póliza	amparos	Valor asegurado	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
NV-100014564	Responsabilidad civil	$ 200.000.000,00	02/12/2022	11/03/2023
NV-100077753	Cumplimiento del contrato	$ 127.691.060,80	02/12/2022	10/03/2024
	Pago salarios, prestaciones sociales, in	$ 63.845.530,40	02/12/2022	11/03/2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 127.691.060,80	11/03/2023	10/03/2028

Póliza acta de reinicio 1

Fecha de expedición: 20/02/2023 **Fecha de Aprobación:**

No. póliza	amparos	Valor asegurado	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
NV-100014564	Responsabilidad civil	$ 200.000.000,00	21/11/2022	28/04/2023
NV-100077753	Cumplimiento del contrato	$ 127.691.060,80	21/11/2022	28/04/2024
	Pago salarios, prestaciones sociales, in	$ 63.845.530,40	21/11/2022	28/04/2026
	Estabilidad y calidad de la obra	$ 127.691.060,80	28/02/2023	28/04/2028

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Para el periodo comprendido entre el 02 de diciembre al 14 de marzo se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación manual de material común con retiro de material estéril para muro 2 y alcantarilla= 337.5 y 488.64 m3.
- Concreto ciclópeo mejoramiento de terreno para cimentación muro 2 y alcantarilla= 31.5 y 46.5 m3
- Concreto de estructuras 3000 psi para muro 2 y alcantarilla= 37.8 y 46.5 m3
- Concreto para elevación de la estructura de 3000 psi para muro 2 y alcantarilla= 33.08 y 53.96 m3
- Concreto de solado y limpieza para alcantarilla= 6.87 m3
- Acero de refuerzo figurado para muro 2 y alcantarilla= 4500 y 4650 kg
- Relleno en recebo compactado para muro 2 y alcantarilla=190.8 y 238.05 m3
- Suministro e instalación de tubería D:36" para alcantarilla = 19 und.

1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	02-12-2022	-	-	01/03/2023
Suspensión No. 1	05/12/2022	3	-	-
Reiniciación No. 1	23/01/2023	-	49	19/04/2023
Acta de modificación No. 1	10/03/2023	49	-	19/04/2023
Acta parcial No. 1	14/03/2023	53	-	19/04/2023

HISTORIAL CRONOLÓGICO DE INTERVENTORIA

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	02-12-2022	-	-	01/03/2023
Suspensión No. 1	05/12/2022	3	-	-
Reiniciación No. 1	23/01/2023	-	49	19/04/2023

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.) **OBRA**

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	02-12-2022
Suspensión	1	05/12/2022
Reiniciación	1	23/01/2023
Acta de modificación (mayores y menores cantidades)	1	10/03/2023
Acta parcial	1	14/03/2023

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.) **INTERVENTORIA**

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio	1	02-12-2022
Suspensión	1	05-12-2022
Reiniciación	1	23-01-2023

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir) OBRA

Valor contratado	$ 638.455.304,00
Valor adicional	$ 0,00
Valor total	**$** 638.455.304,00
Valor ejecutado	**$ 329.612.916,00**
Valor por ejecutar	**$ 308.842.388,00**
Porcentaje ejecutado	**51.63%**

Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir) INTERVENTORÍA	
Valor contratado	$ 44.660.700,00
Valor adicional	$ 0,00
Valor total	**$** 44.660.700,00
Valor ejecutado	**$ 23.056.811.40**
Valor por ejecutar	**$ 21.603.888.60**
Porcentaje ejecutado	**51,63 %**

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

A la fecha se cuenta con un avance presupuestal del 51.63% que corresponde a la ejecución en su totalidad del muro de contención 2 y tres alcantarillas

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato de OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo	-	-	-	-
Acta parcial 1		$329.612.916,00	**$ 0,00**	$329.612.916,00
TOTALES		$329.612.916,00	**$ 0,00**	$329.612.916,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor por Ejecutar**
$ 638.455.304,00	**$0,00**	**$ 638.455.304,00**	**$329.612.916,00**	**$ 308.842.388,00**

Estado Financiero del Contrato de INTERVENTORÍA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo	-	-	-	$0,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**
$ 44.660.700,00	$ 0,00	$ 44.660.700,00	**0,00**	$ 44.660.700,00

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Un (1) Ingeniero **Director de obra:** Mario Hernández Valenzuela
Un (1) Ingeniero **Residente de obra:** Isaac Callejas Bastos

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Interventor

Un (1) Ingeniero Residente de interventoría: Andrea mazabel

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

Se realiza al acta de balance de las cantidades de obra, verificando cada ítem respecto al replanteo general y a las necesidades de la misma , en donde se encontró una variación de cantidades que no implican modificación del presupuesto inicial, se estableció el acta de modificación y se suscribió debidamente

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Para la construcción del BOX COULVERT se está tramitando por parte del contratista de obra el respectivo permiso de ocupación de cause ante la autoridad ambiental

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Muestra		Especificación	Resistencia a los 28 días	Observaciones
Elemento	Fecha			
Poceta	31/01/2023	3.000 PSI	3.006 PSI	100% resistencia los 28 días
Zarpa / muro 1	07/02/2023	3.000 PSI	3.100 PSI	100% resistencia a los 21 días
Zarpa / Muro alcantarilla 1	14/02/2023	3.000 PSI	-	Pendiente resultado a los 28 días 21 días: 2700 PSI 94%
Muro 1	17/02/2023	3.000 PSI	-	Pendiente resultado a los 28 días 7 días: 2123 PSI 70%
Muro alcantarilla 1	22/02/2023	3.000 PSI	-	Pendiente resultado a los 28 días 7 días: 2244 PSI 74%

Se anexa certificado de calidad del acero

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Los resultados de los ensayos a la compresión de las muestras de concretos son satisfactorias y cumplen con las especificaciones del proyecto, a la espera de confirmar resultados finales

4.3. Comentarios y Conclusiones

- El contrato se desarrolla con normalidad
- Para la construcción del BOX COULVERT es necesario disponer del permiso de ocupación de cause, proceso que está desarrollando el contratista de obra
- Se presenta un avance en el tiempo de ejecución del contrato del 58.39% del plazo contractual de 3 meses

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
02 de Diciembre de 2022	Gobernación del Huila	Suscripción de acta de inicio
13 de Enero de 2023	Edificio municipal Saladoblanco	Socialización del proyecto en compañía del contratista, interventor y comunidad, donde se expone el objeto y alcance del proyecto

5. INFORME AMBIENTAL

1. Identificación de situaciones Ambientales

A la fecha no se registran afectaciones ambientales, Para la construcción del BOX COULVERT se está tramitando por parte del contratista de obra el respectivo permiso de ocupación de cause ante la autoridad ambiental

2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

A la fecha no se registran reclamaciones por daños o perjuicios a terceros

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO


MURO 2			
1.0	**EXCAVACION**		
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL	M3	181.12
2.0	**CONCRETOS**		
2,1	CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	M3	22.50
2.2	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA BASE DE ESTRUCTURAS	M3	18.75
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), PARA ELEVACION DE ESTRUCTURA	M3	16.65
3.0	**ESTRUCTURA Y DRENAJE**		
3.1	HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO	KG	1,831.69
4.0	**RELLENO**		
4.1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	98.89


CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA			
1.0	**EXCAVACION**		
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO MATERIAL ESTERIL	M3	649.69
2.0	**CONCRETOS**		
2,1	CONCRETO CICLÓPEO MEJORAMIENTO PISO CIMENTACIÓN (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	M3	46.92


2.2	CONCRETO NORMAL DE 140 KG/CM2, PARA SOLADOS Y LIMPIEZA (TUBERIA Y ALBERCAS)	M3	3.53
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2) DE BASE PARA ESTRUCTURA DE SALIDA	M3	45.63
2.4	CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM2), DE ELEVACION PARA ALBERCA Y ESTRUCTURAS DE SALIDA	M3	80.87
3.0	**TUBERIA D=36"**		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA D=36" (INCLUYE ANILLADO INTERNO Y EXTERNO)	UND	20.00
4.0	**HIERROS DE REFUERZO**		
4.1	HIERRO FY=60,000 PSI FIGURADO E INSTALADO	KG	8,149.10
5.0	**RELLENO**		
5.1	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3	326.58

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



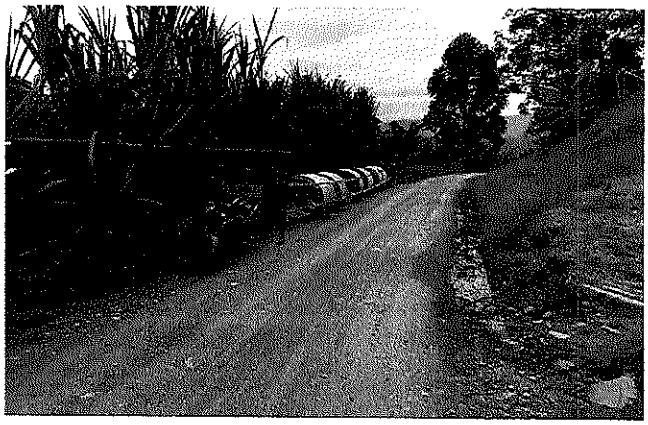


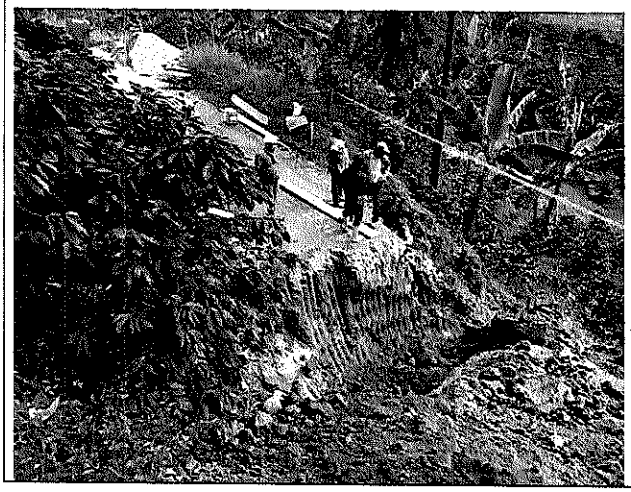

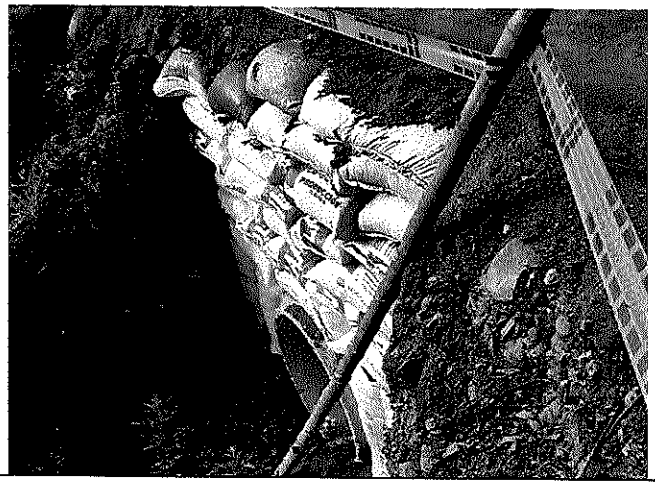





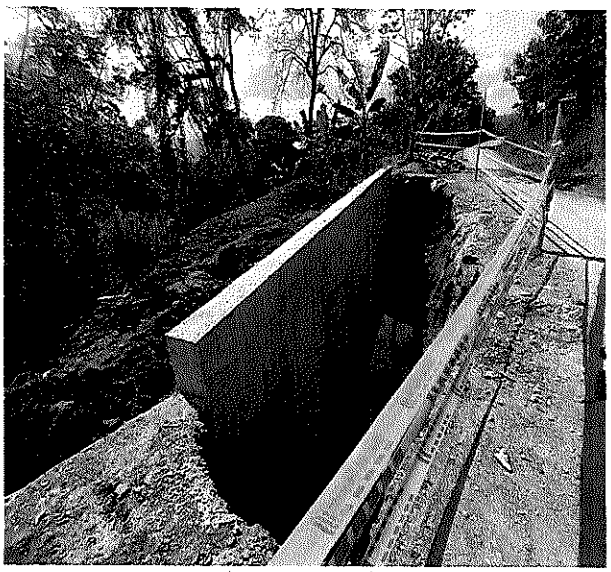



Calle 50 # 18ª – 23 Álamos Norte
3162702236
Indiconingenieriasas@gamil.com
Neiva – Huila (Colombia).


000078





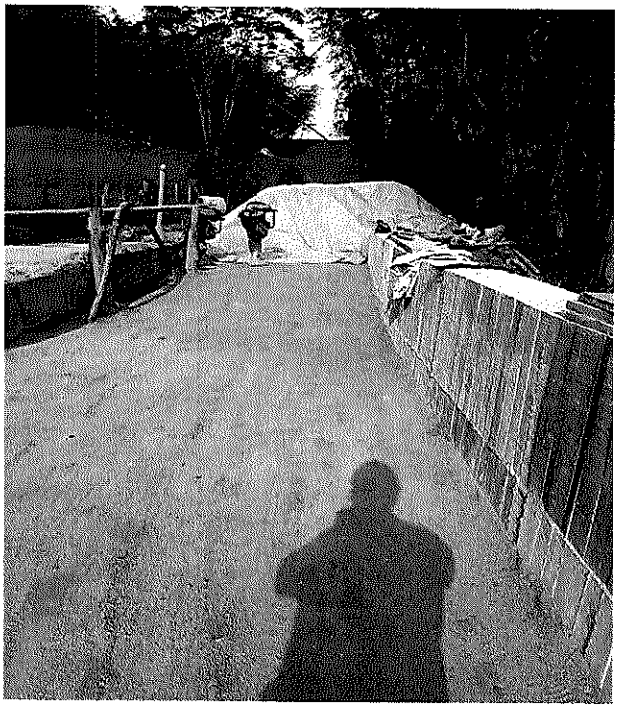



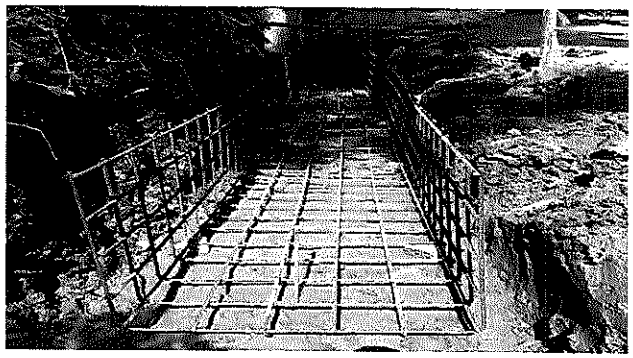





Calle 50 # 18ª – 23 Álamos Norte
3162702236
Indiconingenieriasas@gamil.com
Neiva – Huila (Colombia).

000079







MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
R.L. INDICON INGENIERIA SAS
Nit.: 813.011.263-7
Interventoría

ANEXOS

Calle 50 # 18ª – 23 Álamos Norte
3162702236
Indiconingenieriasas@gamil.com
Neiva – Huila (Colombia).

000081

Servi.Lab Ingeniería Laboratorio Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO INV E - 410	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD VERSION: CODIGO

CLIENTE: **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.** — ORDEN DE SERVICIO: **SL-003-2023**

PROYECTO: ORDEN DE SERVICIOS 98-2022 : CONSTRUCCION MUROS CONTENCION, ALCANTARILLAS Y BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ-SALADOBLANCO-LA CABAÑA-MORELIA-EL PALMAR, CODIGO 4504B-1, VIA TERCER ORDEN — FECHA REPORTE: **FEBRERO 14-2023**

LOCALIZACION: **SALADOBLANCO - HUILA** — **FEBRERO 28-2023**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DÍAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
1	MR POCETA / POCETA		3000	31-ene-23	14-feb-23	14	345,2	15,10	2.796			3175
2	MR POCETA / POCETA		3000	31-ene-23	14-feb-23	14	335,6	15,20	2.682	2.739	91,3	3046
3	MR POCETA / POCETA		3000	31-ene-23	28-feb-23	28	371,9	15,00	3.052			3052
4	MR POCETA / POCETA		3000	31-ene-23	28-feb-23	28	366,2	15,00	3.006	3.029	101,0	3006

OBSERV.:

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por: Cliente ____ Servi. Lab Ingenieria X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería
Laboratorio
Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO INV E - 410

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

VERSION:
CODIGO:

CLIENTE: **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.**

ORDEN DE SERVICIO: **SL-003-2023**

PROYECTO: ORDEN DE SERVICIOS 98-2022 : CONSTRUCCION MUROS CONTENCION, ALCANTARILLAS Y BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ-SALADOBLANCO-LA CABAÑA-MORELIA-EL PALMAR, CODIGO 4504B-1, VIA TERCER ORDEN

FECHA REPORTE: **FEBRERO 28-2023**

LOCALIZACION: **SALADOBLANCO - HUILA**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO P.S.I	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
9	**ZARPA / MURO ALCANTARILLA 1**		3000	14-feb-23	28-feb-23	14	366,0	15,35	2.869			3257
10	ZARPA / MURO ALCANTARILLA 1		3000	14-feb-23	28-feb-23	14	355,9	15,40	2.771	2.820	94,0	3147
11	ZARPA / MURO ALCANTARILLA 1		3000	14-feb-23	14-mar-23	28						
12	ZARPA / MURO ALCANTARILLA 1		3000	14-feb-23	14-mar-23	28						

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por
Cliente
Servi. Lab Ingeniería
X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

Servi.Lab Ingeniería
Laboratorio
Suelos - Pavimentos - Concretos - Materiales

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA DE ENSAYO INV E - 410

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

VERSION

CODIGO

CLIENTE **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.**

ORDEN DE SERVICIO **SL-003-2023**

PROYECTO ORDEN DE SERVICIOS 98-2022 : CONSTRUCCION MUROS CONTENCION, ALCANTARILLAS Y BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ-SALADOBLANCO-LA CABAÑA-MORELIA-EL PALMAR, CODIGO 4504B-1, VIA TERCER ORDEN

FECHA REPORTE **MARZO 01 - 2023**

LOCALIZACION **SALADOBLANCO - HUILA**

RESULTADOS DE LABORATORIO

MUESTRA No.	LOCALIZACION	SLUMP	RC DISEÑO	FECHA		EDAD ROTURA (DIAS)	FUERZA KN	DIAMETRO cm	RESISTENCIA A LA COMPRESION - PSI			
			P.S.I.	TOMA	ROTURA				OBTENIDA	PROMEDIO	% REFERIDA DISEÑO	PROYECTADA 28 dias
17	MR ELEVACION - MURO ALCANTARILLA 1		3000	22-feb-23	1-mar-23	7	288,2	15,40	2.244	2.244	74,8	3206
18	MR ELEVACION - MURO ALCANTARILLA 1		3000	22-feb-23	22-mar-23	28						

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se presentan en este informe, solo son aplicables a las muestras procesadas.

Las muestras son tomadas, transportadas y curadas por

Cliente

Servi. Lab Ingenieria X

REVISA

GEOT. JOSE HERNEY SOLARTE SOLARTE
MAT. 1951600199CAU

Laboratorio Carrera 2 A No. 1 - 47 / Cel. 3123705819
email:johesos@hotmail.com Neiva - Huila

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
NIT. 890 333,023-8
CR 37 12A 53 URB IND ACOPI
Yumbo
TEL.6644717 - FAX 6644477

2350

REMISION

Número: RM-00325494
Fecha: 11/03/2023
Página: 1 de 1

Cliente: CONSTRUIMOS DEL HUILA SA	**Transportador** 890333023-001 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS
Contacto: CONSTRUIMOS DEL HUILA SA	**Conductor:** SIDERURGICA DEL OCCIDENTE !
Nit o C.C.: 900193879	**Placa:** DESPACHO
Dirección: CL 81 11 55 P 9	**Vendedor** 14135621 GUTIERREZ PAYANENE JOSE CENEN
Ciudad: Neiva	
Teléfono: 3176578761 **Fax:**	**OC.Nro** / **P.V. Nro.** PD-00250117
Correo electronico: contacto@construimos.com.co	

Ref.	Descripcion	Bodega	U.M.	Cant. despachada
10003	BAR CORR 12mmx6m NTC 2289 G 60 (420)	P2PTE	UND	1.520,00
10031	BAR CORR 1/2x6m NTC 2289 G 60 (420)	P2PTE	UND	3.135,00
10034	BAR CORR 3/4 x 6m NTC 2289 G 60 (420)	P2PTE	UND	150,00
			Total	4.805,00

Observación:
NEIVA

Con este documento el comprador declara haber recibido a satisfaccion, real y materialmente los productos aquí descritos.

Punto de Envio

Código: 002 NEIVA
Contacto: CONSTRUIMOS DEL HUILA
Dirección: Cra 5 sur # 36-103 zona industrial
Telefono:
Email:

13.03 2023

franco.fernandez
ELABORADO

NOMBRE LEGIBLE Y SELLO
RECIBIDO

Se adjunta reporte de calidad barras, dando cumplimiento a: Resolución 1856 y NTC 2289.
Se adjunta reporte de calidad grafil y malla, dando cumplimiento a: Resolución 0277 y NTC 5806.

Novedades presentadas en el Recibo de Material

Información del Producto			Tipo de Reclamo				
Referencia	Cantidad	N° Código de Barras Etiqueta	Faltante de unidades	Sobrante de Unidades	Diferencia en Kg.	Faltante de Reporte	Barra corta

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
Sucursal:
Ciudad: Neiva
Dirección:
Fecha Impresión: sábado, 11 de marzo de 2023

CDP#: 124468
Placa: GYK993
Tiquete: 115.544
Despacho: 104.252
Tren: POMINI

NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

Resolución 1855:2017 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

Certificado No. SC-445-1

Producto: Redondo Corrugado de [1/2] 12.7 mm

Area Nom. (mm2): 129,00 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 4 W 60 Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
10/03/2023	99459	32328	433	605	1,40	19,00	SI	0,971	0,73	8,40	55	2,90	258.644	0,281	1,190	0,007	0,035	0,190	0,002	0,260	0,080	0,110	0,014	0,023	0,438
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,934	0,51		45														
		Máximos	540				NO			8,90	70	4,90		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [3/4] 19.1 mm

Area Nom. (mm2): 284,00 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 6 W 60 Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
4/03/2023	99238	32318	453	661	1,46	16,20	SI	2,208	1,17	12,90	52	4,66	258.604	0,276	1,200	0,005	0,028	0,190	0,003	0,230	0,080	0,100	0,020	0,023	0,433
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	2,101	0,97		45														
		Máximos	540				NO			13,30	70	7,30		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de 12.0 mm

Area Nom. (mm2): 113,10 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 12M W 420 Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
11/03/2023	99499	32441	447	623	1,39	17,00	SI	0,882	0,71	7,90	57	2,93	259.133	0,280	1,220	0,008	0,029	0,160	0,003	0,180	0,070	0,070	0,008	0,023	0,496
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,835	0,48		45														
		Máximos	540				NO			8,40	70	4,71		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

990000

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
NIT. 890.333.023-8
CR 37 12A 63 URB IND ACOPI
Yumbo
TEL.6644717 - FAX 6644477

2314.

REMISION

Número: RM-00323754
Fecha: 25/02/2023
Página: 1 de 1

Cliente:	CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
Contacto:	CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
Nit o C.C.:	900193879
Dirección:	CL 81 11 55 P 9
Ciudad:	Neiva
Teléfono:	3176578761 **Fax:**
Correo electronico:	contacto@construimos.com.co

Transportador
890333023-001 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS
Conductor:
SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S
Placa: DESPACH
Vendedor
14135621 GUTIERREZ PAYANENE JOSE CENEN

OC.Nro	P.V. Nro.
	PD-00249082

Ref.	Descripcion	Bodega	U.M.	Cant. despachada
10030	BAR CORR 3/8x6m NTC 2289 G 60 (420)	P2PTE	UND	2.700,00
10032	BAR CORR 5/8x6m NTC 2289 G 60 (420)	P2PTE	UND	990,00
			Total	3.690,00

Observación:

Con este documento el comprador declara haber recibido a satisfaccion, real y materialmente los productos aquí descritos.

Punto de Envio

Código: 002 NEIVA
Contacto: CONSTRUIMOS DEL HUILA
Dirección: Cra 5 sur # 36-103 zona industrial
Telefono:
Email:

christian.ortiz
ELABORADO

27.02.2023
NOMBRE LEGIBLE Y SELLO RECIBIDO

SD 019.

Se adjunta reporte de calidad barras, dando cumplimiento a: Resolución 1856 y NTC 2289.
Se adjunta reporte de calidad grafil y malla, dando cumplimiento a: Resolución 0277 y NTC 5806.

Novedades presentadas en el Recibo de Material

Información del Producto			Tipo de Reclamo				
Referencia	Cantidad	N° Código de Barras Etiqueta	Faltante de unidades	Sobrante de Unidades	Diferencia en Kg	Faltante de Reporte	Barra corta

000087

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
Sucursal:
Ciudad: Neiva
Dirección: .
Fecha Impresión: sábado, 25 de febrero de 2023

CDP#: 122455
Placa:
Tiquete:
Despacho:
Tren: POMINI

Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

Sello con Reglamento Técnico — Resolución 1856:2017 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Producto: Redondo Corrugado de [3/8] 9.52 mm — Area Nom. (mm2): 71,00 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 3 W 60 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
20/02/2023	97783	32016	443	618	1,40	18,20	SI	0,542	0,54	6,20	58	1,30	257.308	0,257	0,890	0,009	0,035	0,170	0,002	0,230	0,070	0,060	0,015	0,025	0,420
Especificaciones del Producto	Mínimos		420	550	1,25	14	SI	0,526	0,38		45														
	Máximos		540				NO			6,70	70	3,60		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
	Validaciones		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [5/8] 15.87 mm — Area Nom. (mm2): 199,00 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 5 W 60 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
20/02/2023	97806	31688	454	630	1,39	19,00	SI	1,507	0,98	10,70	54	3,34	256 761	0,265	1,180	0,007	0,027	0,200	0,002	0,200	0,070	0,100	0,014	0,025	0,477
Especificaciones del Producto	Mínimos		420	550	1,25	14	SI	1,459	0,71		45														
	Máximos		540				NO			11,10	70	6,10		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
	Validaciones		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Observaciones:
Los métodos usados para la realización de los ensayos informados en este reporte de calidad fueron: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos..." NTC-2 "Ensayo de tracción...", NTC-1"Ensayo de Doblado", NTC 5192 "Ensayo de composición química", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos Dimensionales". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de Inspección y Ensayo", SIDOC S.A.S. certifica el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 1856 de 2017 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes...". Este informe se refiere exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Por lo tanto,los resultados de ensayo no podrán reproducirse ni parcial ni totalmente,excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

NEIR ARLEX MOSQUERA
Analista Físico:

MARCELO DUARTE AZCARATE
Analista Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

88000

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

NEIVA - HUILA

DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO No. 1
fc = 3000 PSI

ORDEN DE SERVICIOS 98-2022:
CONSTRUCCION MUROS CONTENCION, ALCANTARILLAS Y BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ-SALADOBLANCO-LA CABAÑA-MORELIA-EL PALMAR
CODIGO 4504B-1, VIA TERCER ORDEN
SALADOBLANCO - HUILA

CEMENTO PORTLAND TIPO I CEMEX
MIXTO TRITURADO TAMAÑO MAXIMO 1 1/2"
AGREGADOS YUMA - ORITUGUAZ

ENERO
2023

mismo, las propiedades del concreto en estado endurecido quedan especificadas por el ingeniero calculista ya que el proporciona datos tales como la resistencia a los esfuerzos, durabilidad y otros, para que respondan a las condiciones de los proyectos o de los reglamentos. Con estos dos grupos de requisitos y teniendo en cuenta además el grado de control que se ejerce sobre la obra, se puede determinar las proporciones de la mezcla

2.2 Diseño Concreto

El método empleado para el diseño de la mezcla se determina mediante el procedimiento descrito en la Nota Técnica No 12 ICPC: Método Practico para dosificar mezclas de concreto:

- Selección de asentamiento
- Selección del tamaño máximo de agregado
- Estimación de la cantidad de agua
- Resistencia de dosificación de la mezcla
- Estimación de la relación A/C
- Cantidad de cemento
- Dosificación de agregados
- Cálculos de proporciones iníciales
- Ajustes por humedades
- Ajuste mezcla de prueba por asentamiento
- Mezcla de prueba por asentamiento (Toma de cilindros)
- Ajuste mezcla de prueba por resistencia
- Mezcla de prueba por resistencia (Toma de cilindros)
- Dosificación en obra
- Proporciones definitivas en obra

2.2 Ensayos de laboratorio.

Los ensayos de laboratorio se ejecutaran siguiendo las normas de ensayos establecidos por el Instituto Nacional de Vías, cumpliendo con los procedimientos en sus documentos de referencia:

Sección 100	Agregados Pétreos
Sección 300	Cemento
Sección 400	Concreto Hidráulico

3. Materiales.

Agregados

Mixto de Rio	Mixto Triturado	Tamaño Máximo 1 1/2"
		Tamaño Nominal 1"

4. Diseño de Concreto

4.1 Dosificación de agregados

100 % Mixto Triturado Tamaño Maximo 1 1/2".
Fuente: AGREGADOS YUMA - ORITUGUAZ

4.2 Chequeo Tamaño máximo Nominal

El tamaño máximo nominal del agregado grueso disponible, no debe ser superior a:

(a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado, ni a

(b) 1/3 de la altura de la losa, ni a

(c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.

Estas limitaciones se pueden omitir si a juicio del profesional facultado para diseñar la trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de hormigueros, vacíos o segregación en la mezcla.

4.3 Característica de la mezcla

Asentamiento	7.0 cm
Tamaño Máximo Nominal	1 "
Agua de Mezcla inicial	185 litros / metro cúbico
Resistencia solicitada fc	3000 PSI
Resistencia de dosificación fcr	3342 PSI
Coeficiente de variación	7.5 %
Relación A/C	0.54
Cemento	343 Kg./metro cúbico

4.4 Proporciones Iníciales en peso

Proporciones iniciales **0.54 : 1 : 5.64**

4.5 Ajuste por asentamiento en peso

Proporciones ajustadas **0.54 : 1 : 4.89**

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES	PROYECTO: "CONSTRUCCION A TODO COSTO DE: DOS (2) MUROS DE CONTENCION, TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CODIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	HUILA CRECE
CONTRATISTA	UNIDAD DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	

INFORME DE ACTA RECIBO PARCIAL No. 1

14 DE MARZO DE 2023

EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE	CARGO
ING. MARIO HERNANDEZ VALENZUELA	DIRECTOR DE OBRA
ARQ. MARIA ANGELICA SAAB YEPES	COORDINADORA DEL PROYECTO
ING. ISAAC CALLEJAS BASTOS	INGENIERO RESIDENTE
ING. NOFAR FERNANDO DAZA MALLUNGO	SUPERVISOR DEL PROYECTO
FRANCISCO CASTAÑEDA MUÑOZ	OFICIOS VARIOS

PERIODO DE TRABAJO

23 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2023

INDICADORES

Indicadores	23/01/2023	30/01/2023	6/02/2023	13/02/2023	20/02/2023	27/02/2023	6/03/2023	13/03/2023
Mano de obra calificada (#)	5	5	5	5	5	5	5	5
Mano de obra no calificada (#)	3	5	13	14	14	13	13	13
Ejecución semanal (%)								

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION A TODO COSTO DE: DOS (2) MUROS DE CONTENCION, TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR, CODIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
VALOR TOTAL	$ 638,455,304,00
FECHA DE INICIO	2/12/2022
PLAZO	3 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	5/12/2022
FECHA DE REINICIACION No. 1	23/01/2023
FECHA DE TERMINACION	19/04/2023
INTERVENTOR	INDICON INGENIERIA SAS

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

MURO 1

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUTADO
	MURO	
1	EXCAVACION	
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro material esteril	0%
2	CONCRETOS	
2,1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	0%
2,2	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2), para base de estructuras	0%
2,3	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2), para elevacion de estructura	0%
3	HIERRO DE REFUERZO	
3,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	0%
4	RELLENO	
4,1	Relleno en recebo compactado	0%
5	FILTRO	
5,1	Geotextil	0%
5,2	Material granular filtrante	0%

MURO 2

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUTADO
	MURO	
1	EXCAVACION	
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro material esteril	100%
2	CONCRETOS	
2,1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	100%
2,2	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2), para base de estructuras	100%
2,3	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2), para elevacion de estructura	100%
3	HIERRO DE REFUERZO	
3,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	100%

4	RELLENO	
4,1	Relleno en recebo compactado	100%

OBJETO: CONSTRUCCION TRES (3) ALCANTARILLA D=36" CON URO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA		
ITEM	DESCRIPCION	% EJECUTADO
	ALCANTARILLA	
1	EXCAVACION	
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro material esteril	100%
2	CONCRETOS	
2,1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL FC=176 KGF/CM2;40% PIEDRA)	100%
2,2	Concreto Normal de 140 KG/CM2, para solados y limpieza (tuberia y alberca)	100%
2,3	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2) de base para estructura de salida	100%
2,4	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2), de elevacion para alberca y estructuras de salida	100%
3	TUBERIA D=36"	
3,1	Suministro e instalacion tuberia D=36" (incluye anillado interno y externo)	100%
4	HIERRO DE REFUERZO	
4,1	Hierro Fy= 60,000 psi figurado e instalado	100%
5	RELLENO	
5,1	Relleno en recebo compactado	100%

OBJETO: BOX COULVERT (3,00 x 3,00, L= 8,00M)		
ITEM	DESCRIPCION	% EJECUTADO
	MURO	
1	EXCAVACION	
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro material esteril	0%
2	EXCAVACION	
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro material esteril	0%
3	CONCRETOS	
3,1	Concreto Normal de 140 KG/CM2, para solados y limpieza	0%
3,2	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2) de base, incluye formaleta	0%
3,3	Concreto de 3000 PSI (210KG/CM2), de elevacion, incluye formaleta	0%
4	HIERRO DE REFUERZO	
4,1	Hierro Fy= 60,000 psi figurado e instalado	0%
5	RELLENO	
5,1	Relleno en recebo compactado	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. LOCALIZACION Y REFERENCIACION DE LA ALCANTARILLA No. 2



FOTO 2. LOCALIZACION Y REFERENCIACION DE LA ALCANTARILLA No. 1

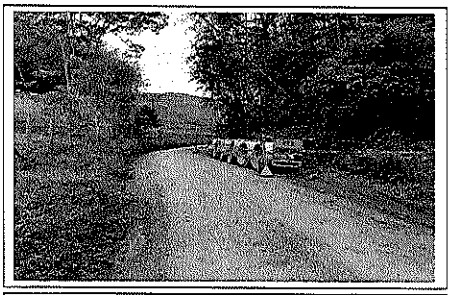


FOTO 3. ACOPIO DE TUBOS EN CONCRETO ALCANTARILLA No. 2



FOTO 4. DESCARGUE DE MATERIAL DE PLAYA

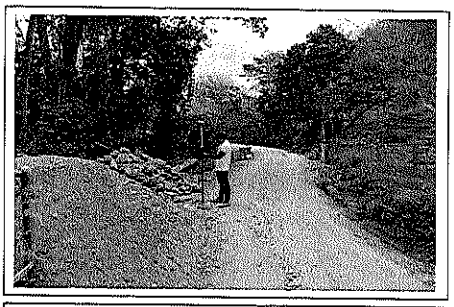


FOTO 5 . LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MURO 2

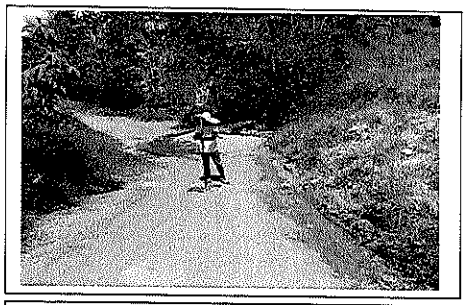


FOTO 6 . LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO BOX COULVERT



FOTO 7. EXCAVACION MURO No. 1

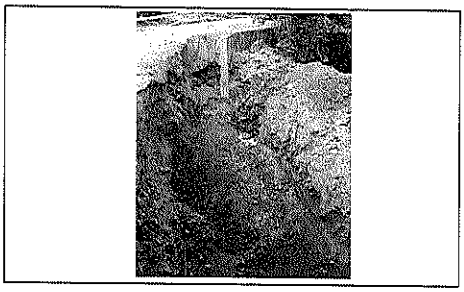


FOTO 8. EXCAVACION MURO No. 1

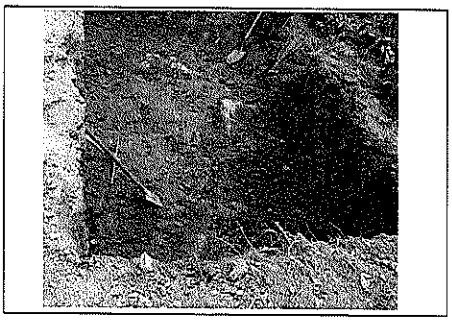


FOTO 9. EXCAVACIÓN ALCANTARILLADO No. 1

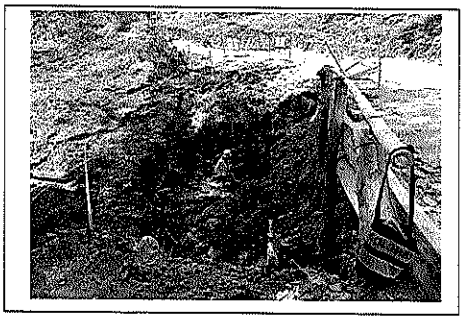


FOTO 10. EXCAVACIÓN ALCANTARILLADO No. 2

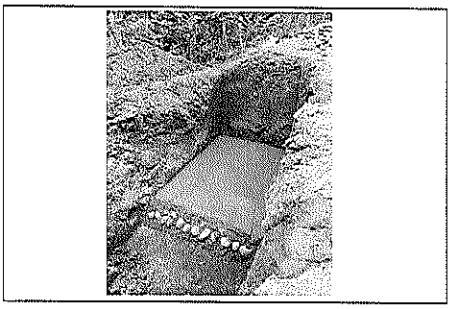


FOTO 11. FUNDICIÓN MEJORAMIENTO CICPLOPEO MURO No. 1

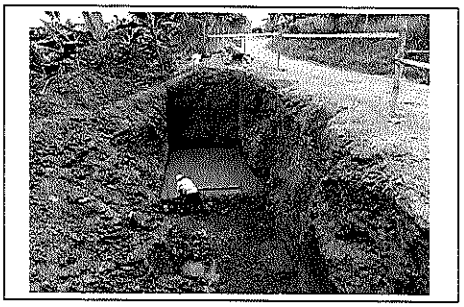


FOTO 12. FUNDICIÓN MEJORAMIENTO CICPLOPEO MURO No. 1




FOTO 13. FUNDICIÓN MEJORAMIENTO CICPLOPEO ALCANTARILLADO No. 2



FOTO 14. FUNDICIÓN MEJORAMIENTO CICPLOPEO ALCANTARILLADO No. 2

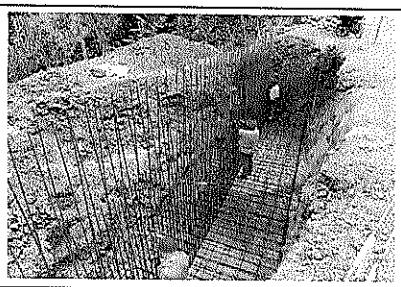


FOTO 15. INSTALACIÓN ACERO FIGURADO MURO No. 1




FOTO 16. INSTALACIÓN ACERO FIGURADO MURO No. 1

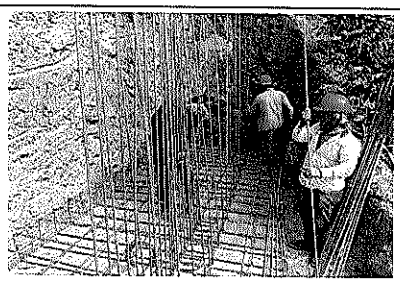


FOTO 17. INSTALACIÓN ACERO FIGURADO ALCANTARILLADO No. 1




FOTO 18. INSTALACIÓN ACERO FIGURADO ALCANTARILLADO No. 1




FOTO 19. FUNDICIÓN ESTRUCTURA BASE ALCANTARILLA No.1

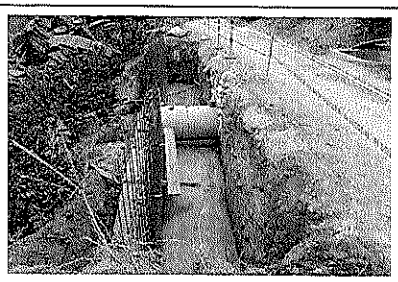


FOTO 20. FUNDICIÓN ESTRUCTURA BASE ALCANTARILLA No.1

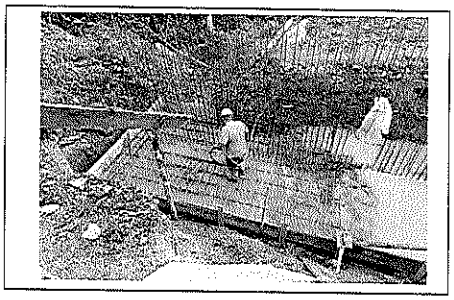


FOTO 21. FUNDICIÓN ESTRUCTURA BASE ALCANTARILLA No.2

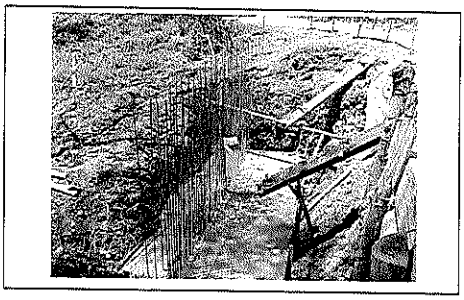


FOTO 22. FUNDICIÓN ESTRUCTURA BASE ALCANTARILLA No.2



FOTO 23. INSTALACIÓN TUBERIA 36" ALCANTARILLADO No. 1

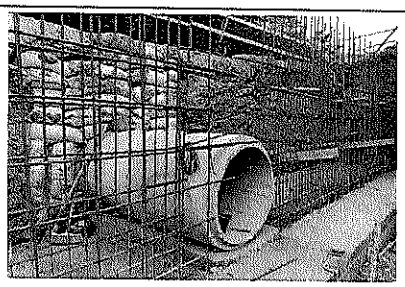


FOTO 24. INSTALACIÓN TUBERIA 36" ALCANTARILLADO No. 1

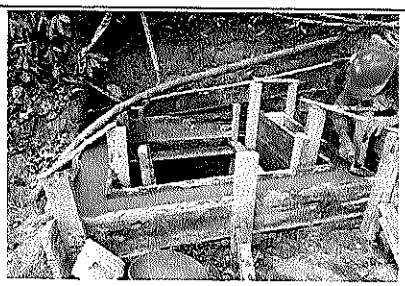


FOTO 25. FUNDICIÓN ESTRUCTURA ELEVADA POCETA ALCANTARILLADO No. 1

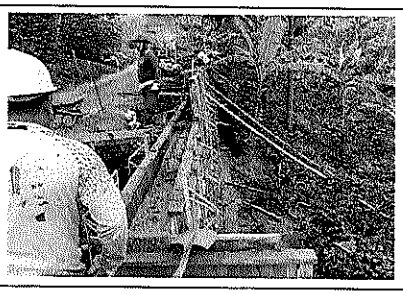


FOTO 26. FUNDICIÓN ESTRUCTURA ELEVADA POCETA ALCANTARILLADO No. 1

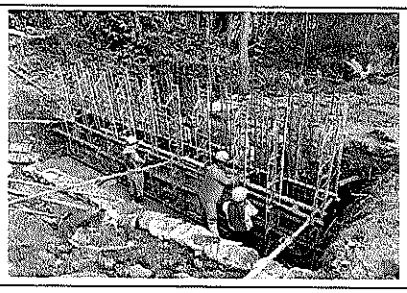


FOTO 27. FUNDICIÓN ESTRUCTURA ELEVADA ALCANTARILLADO No. 2

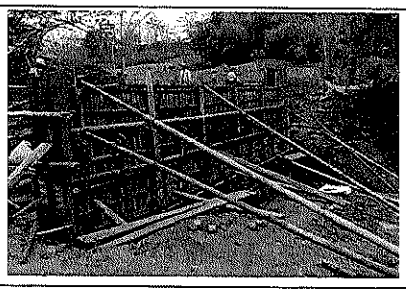


FOTO 28. FUNDICIÓN ESTRUCTURA ELEVADA ALCANTARILLADO No. 2

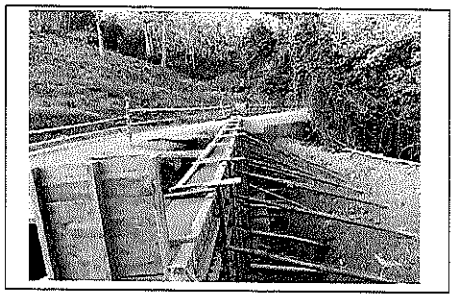


FOTO 29. FUNDICIÓN ESTRUCTURA ELEVADA POCETA ALCANTARILLADO No. 1

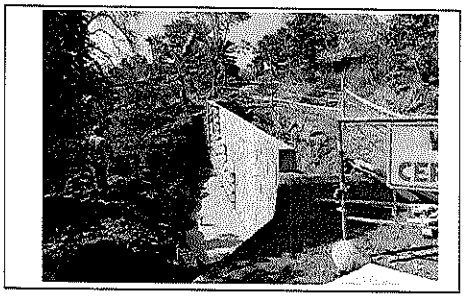


FOTO 30. FUNDICIÓN ESTRUCTURA ELEVADA POCETA ALCANTARILLADO No. 1



FOTO 31. RELLENO COMPACTADO DE LA ALCANTARILLADO No. 2



FOTO 32. RELLENO COMPACTADO DE LA ALCANTARILLA No. 1

4.- PRÓXIMO INFORME:	
ELABORÓ: ISAAC CALLEJAS BASTOS	
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	
EMPRESA: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 900,410,655 - 8
CL 46 16 24 OF 705 OFICI 705
NEIVA - COLOMBIA
8641641
EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DEL HUILA		
NIT	800,103,913 - 4	**Teléfono**	8717253
Dirección	CRA 4 CON CLL 8 ESQUINA PISO 2	**Vendedor**	
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	166
Correo	sgobierno@huila.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 319

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-04	15:15:10
Expedición	2023-04-04	15:30:26
Vencimiento	2023-04-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	COSTO DIIRECTOS		1.00	253,788,381.00	253,788,381.00
2	3000002000001	ADMINISTRACION 22%		1.00	55,833,444.00	55,833,444.00
3	3000003000001	IMPREVISTOS 3%		1.00	7,613,651.00	7,613,651.00
4	3000005000001	UTILIDAD 5%		1.00	12,689,419.00	12,689,419.00

Total Items 4

Total Bruto	329,924,895.00
Total a Pagar	**329.924.895,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 15 F - 002- 319 Vence el 2023-04-19	329.924.895,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintinueve Millones Novecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL No.1 ORDEN DE SERVICIO No.98 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE DOS(2) MUROS DE CONTENCION; (3) ALCANTARILLAS D=36 CON MURO DE CONTENCION COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITUGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA- EL PALMAR CODIGO 4504B-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 09 DE MARZO DEL 2022.

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

ACTIVIDAD ECONOMICA 4290. AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA - HUILA. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 454-232850-50 A NOMBRE DE EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022584521 **aprobado en** 2021-12-09 **hasta el** 2023-06-02, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 87 **al** 500

000098

CUFE :ab642fd6e8af4a7ef8dd3107306fc9c01a63220f390de527662ad68eb1ead39b791d4c9afbb63cdf182f5ab6d9730e84

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8651641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25906076	E	2023-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.814.900	126.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109	25906076	2023-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPSY	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FINSOL	FINSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub.Tipo Cot.			
1	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
2	CC 7714939	ARDILA CALDERON JUAN CARLOS	1.800.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.062.500	330.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.062.500	82.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.062.500	82.500	2.062.500	143.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	638.600	S	5429001
3	CC 4943816	AROCA VERA GONZALO	1.160.000	F	X														0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	386.667	61.900	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5429001
4	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
5	CC 1075208495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.460.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	58.400	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
6	CC 1077872723	BENAVIDES CASTILLO ELIANA CONSTANZA	1.160.000	F	X														0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
7	CC 12190292	BENAVIDES LUGO FERNANDO	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
8	CC 12195711	BENAVIDES LUGO JORGE	1.160.000	F	X														0			17	17	17	17	PROTECCION-230201	657.334	105.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	692.778	27.800	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	205.100	S	5429001
9	CC 12194360	BENAVIDES LUGO JOSE JAVIER	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
10	CC 12187268	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.160.000	F									X						0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.326.750	53.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.326.750	53.100	1.326.750	92.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	198.600	S	5429001
11	CC 1077660855	CABRERA OSPINA YESSICA LEANDRA	1.160.000	F	X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	618.667	99.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	618.667	24.800	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	191.700	S	5429001
12	CC 19306323	CALDERON CALDERON EFRAIN	1.160.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
13	CC 12200989	CALDERON RIVERA JORGE	1.160.000	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.634.875	261.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.634.875	65.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.634.875	65.400	1.634.875	113.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	506.200	S	5429001
14	CC 12128984	CALLEJAS BASTOS ISAAC	2.500.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5429001
15	CC 1082805413	CAMPOS GARZON MAICOL SMITH	1.160.000	F	X	X													0			16	16	16	16	COLPENSION-ES-25-14	618.667	99.000	0	0	SANITAS-EPS005	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	644.445	25.800	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	192.700	S	5429001
16	[illegible]75283503	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.460.000	F		X													0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	730.000	116.800	0	0	SANITAS-EPS005	730.000	29.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.265.671	50.700	730.000	3.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	200.600	S	5429001
17	CC 1[illegible]0180651	CASANOVA MANJARREZ JAVIER	1.160.000	F	X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	270.667	43.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	270.667	10.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	270.667	10.900	270.667	18.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
18	CC 12122227	CASTAÑEDA MUÑOZ FRANCISCO	1.450.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.450.000	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	58.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES																				DIAS					PENSIÓN					SALUD												RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN.				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
19	CC 43154874	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.178.125	188.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
20	CC 12120162	CESPEDES CRUZ OMAR EDUARDO	1.450.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.903.635	76.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.904.635	132.600	1.904.635	132.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	285.000	S	5429001
21	CC 1003893807	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.160.000	F		X							X							0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	654.917	104.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	654.917	26.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	867.584	34.800	654.917	45.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	211.400	S	5429001
22	CC 83225719	CLAROS CABRERA JOSE OTAIN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
23	CC 1084899610	CLAROS RODRIGUEZ ERMINSON FABIAN	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
24	CC 1084900110	CLAROS RODRIGUEZ JOSE OTAIN	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
25	CC 1113652349	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
26	CC 1075248432	CORTES PINTO YEINSON	1.400.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION 230201	653.334	104.600	0	0	SANITAS-EPS005	653.334	26.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	653.334	26.200	653.334	45.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	202.500	S	5429001
27	CC 93343524	CRUZ CENON	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	COLFONDOS-231001	928.000	148.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
28	CC 1075281720	DAZA MALLUNGO NOFAR FERNANDO	1.160.000	F	X					X										0			14	14	14	14	COLFONDOS-231001	868.000	138.900	0	0	SANITAS-EPS005	868.000	34.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	868.000	34.800	868.000	60.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	269.000	S	5429001
29	CC 12197855	ESCOBAR LABRADA ALEXANDER	1.160.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5429001
30	CC 1077852171	ESCOBAR LEMUS DUVAN ARLED	1.160.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5429001
31	CC 4943400	ESQUIVEL TRUJILLO EDGAR	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
32	CC 7729393	HERRO ALDANA JHON JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
33	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION 230201	50.000	8.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	50.000	2.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.402.083	56.100	50.000	3.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	69.600	S	5429001
34	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.393.200	S	5429001
35	CC 1006527590	GARCIA RAMIREZ CAMILO HUMBERTO	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
36	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA AIVI MAGALI	1.200.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION 230201	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	600.000	24.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	664.167	26.600	600.000	3.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	149.800	S	5429001
37	CC 17711204	GONZALEZ CALLEJAS ABELARDO	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.557.500	249.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.557.500	62.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.557.500	62.300	1.557.500	108.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	482.300	S	5429001
38	CC 83169239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.416.959	226.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.416.959	56.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.416.959	56.700	1.416.959	98.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	438.900	S	5429001
39	CC 1006093118	GUZMAN ASCENCIO CALDER MAURICIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
40	CC 1082803124	GUZMAN MURCIA CARLOS YEVENSON	1.160.000	F	X	X														0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	201.390	8.100	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.400	S	5429001
41	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.160.000	F											X					0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	154.667	24.800	0	0	SANITAS-EPS005	154.667	6.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	154.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	31.000	S	5429001
42	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.160.000	F		X							X							0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	455.542	72.900	0	0	SANITAS-EPS005	455.542	18.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	721.375	28.900	455.542	31.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	151.900	S	5429001
43	CC 1083852554	HEREDIA ROJAS FERLEY	1.160.000	F		X							X							0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	636.792	101.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	636.792	25.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	936.459	37.500	636.792	44.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	269.300	S	5429001
44	CC 12131701	HERNANDEZ VALENZUELA MARIO	3.000.000	F	X					X										0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
45	CC 1075320590	IBARRA PENAGOS GABRIELA	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
46	CC 1079412617	LEIVA CUBIDE YERLY MARETH	1.600.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	53.334	8.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	53.334	2.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	720.001	28.900	53.334	3.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	43.500	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD							RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
47	CC 96331839	LEON VARGAS EULICER	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	580.000	92.800	0	0	EPS-S 0MALLAMAS-EPSIC5	580.000	23.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	604.167	24.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	180.600	S	5429001
48	CC 1075304381	LOPEZ CORTES LUIS FELIPE	1.450.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.713.959	274.300	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.713.959	68.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.713.959	68.600	1.713.959	119.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	530.800	S	5429001
49	CC 1080293875	LOSADA SALAZAR KLISMAN	1.160.000	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	502.667	80.500	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.900	S	5429001
50	CC 1075232695	LOZADA ALAPE LEIDY JOHANA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.020.521	323.300	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	2.020.521	80.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.020.521	80.900	2.020.521	140.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	635.800	S	5429001
51	CC 1082804720	LUGO PERDOMO JOSETH	1.160.000	F	X															0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	773.334	123.800	0	0	SANITAS-EPS005	773.334	31.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	773.334	31.000	773.334	53.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	239.700	S	5429001
52	CC 1007404732	MAGE ALVARADO ALBEIRO	1.160.000	F	X															0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	232.000	37.200	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	232.000	9.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.000	S	5429001
53	CC 1118022632	MANQUILLO DUCUARA EDIMSON	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
54	CC 1118022237	MANQUILLO OLIVEROS OCLIDES	1.160.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	232.000	37.200	0	0	ESSC ASMET 0SALUD-ESSC62	232.000	9.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.000	S	5429001
55	CC 1081392947	MANRIQUE POLANCO JUAN CAMILO	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
56	CC 1081732952	MARTINEZ GONZALEZ DILFREDO	1.160.000	F	X															0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	425.334	68.100	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	425.334	17.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5429001
57	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.572.083	251.600	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.572.083	62.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.572.083	62.900	1.572.083	109.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	486.900	S	5429001
58	CC 1077872606	MENDEZ PALACIO NICOLAS	1.600.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
59	CC 12139977	MONJE CHALA MICHEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
60	CC 1012612234	MORALES TOMBE FLORESMIRO	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
61	CC 12158076	MUÑOZ ARCENIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-13	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
62	CC 83243697	MUÑOZ MORA FAIDER	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.469.334	235.100	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.469.334	58.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.469.334	58.800	1.469.334	102.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	455.000	S	5429001
63	CC 1075257007	NARVAEZ GUIO LAURA VICTORIA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.615.833	258.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.615.833	64.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.615.833	64.700	1.615.833	112.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	500.500	S	5429001
64	CC 6139105	OCAMPO OBANDO ULDIVIER DE JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
65	CC 8438644	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.542.916	246.900	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A. MOV-EPS041	1.542.916	61.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.542.916	61.800	1.542.916	107.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	477.900	S	5429001
66	CC 1075320922	ORTIZ PERDOMO JUAN DIEGO	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	SANITAS-EPS005	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
67	CC 1075293901	ORTIZ RIOS GUSTAVO ANDRES	1.160.000	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	889.334	142.300	0	0	EPS-S 0PIJAOSALUD-EPSIC6	889.334	35.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	889.334	35.600	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	275.400	S	5429001
68	CC 7689416	ORTIZ TORRES GUSTAVO	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
69	CC 1075257554	PANIAGUA ABELLO MANUEL HORACIO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.580.501	252.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.580.501	63.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.580.501	63.300	1.580.501	110.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	489.600	S	5429001
70	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.154.166	344.700	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	2.154.166	86.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.154.166	86.200	2.154.166	150.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	667.100	S	5429001
71	CC 1084578337	PAZ ZUÑIGA DIXON ARNULFO	1.160.000	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	812.000	130.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	812.000	32.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	945.722	37.900	812.000	56.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	257.000	S	5429001
72	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.450.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.450.000	232.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	58.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S	5429001
73	CC 83121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.439.125	230.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.439.125	57.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.439.125	57.600	1.439.125	100.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	445.700	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
74	CC 1007821200	PLAZAS HERNANDEZ RIGOBERTO	1.160.000	F	X															0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	270.667	43.400	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	270.667	10.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	270.667	10.900	270.667	18.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.100	S	5429001
75	CC 7731734	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.993.125	318.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.993.125	79.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.993.125	79.800	1.993.125	138.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	617.300	S	5429001
76	CC 762941608	QUINAYAS QUINAYAS RUBER	1.160.000	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
77	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION-ES-25-14	600.000	96.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	600.000	24.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.650.000	67.200	600.000	3.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	190.100	S	5429001
78	CC 12186618	QUINTERO GAITAN ORLANDO	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
79	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5429001
80	CC 12200476	QUINTERO YUCUMA HERNAN	1.160.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.121.334	44.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	5429001
81	CC 7698433	RAMIREZ ROMERO EDGAR	1.700.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	850.000	136.000	0	0	SANITAS-EPS005	850.000	34.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	850.000	34.000	850.000	59.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.200	S	5429001
82	CC 1075300301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.450.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.665.989	266.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.665.989	66.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.665.989	66.700	1.665.989	116.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	516.000	S	5429001
83	CC 1075346470	REYES GONZALEZ WILLIAM RICARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
84	CC 1077866613	REYES MOTTA DARWIN FELIPE	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	SANITAS-EPS005	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
85	CC 1075226424	RIVERA JOSE ARNOLDO	1.460.000	F	X								X							0			28	28	28	28	COLFONDOS-231001	1.449.584	232.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.449.584	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.449.584	58.000	1.449.584	100.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	448.900	S	5429001
86	CC 1032507854	RODRIGUEZ AGUILLON GABRIEL EDUARDO	4.000.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMPENSAR-CCF24	5.182.813	207.400	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	617.900	S	5429001
87	CC 1076985689	ROJAS CORDOBA EDILBERTO	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	EPS ECOOPSOS S.A.S-ESSC91	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5429001
88	CC 1003895525	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.238.542	198.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.238.542	49.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.238.542	49.600	1.238.542	86.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	383.700	S	5429001
89	CC 7730705	ROJAS QUINTERO ROBERT REINALDO	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5429001
90	CC 1075245863	ROMERO CORTES JHON FREDDY	3.000.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
91	CC 1077873747	ROMERO HENAO CAMILO ANDRES	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
92	CC 83222480	RUBIANO FIGUEROA ORLANDO	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	MIN002 - PADRES-MIN002	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
93	CC 1125178092	RUIZ MUÑOZ MOISES OVIDIO	1.160.000	F	X															0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	773.334	123.800	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC5	773.334	31.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	773.334	31.000	773.334	53.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	239.700	S	5429001
94	CC 1075242396	SAAB YEPES MARIA ANGELICA	2.000.000	F	X						X									0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	933.334	149.400	0	0	SANITAS-EPS005	933.334	37.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	933.334	37.400	933.334	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.200	S	5429001
95	CC 1075292837	SALAS CRUZ LINDA TATIANA	1.400.000	F	X															0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	653.334	104.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	653.334	26.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	653.334	26.200	653.334	45.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	202.500	S	5429001
96	CC 1024574168	SALAZAR PUENTES LUIZ MIGUEL	1.160.000	F		X							X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.556.938	249.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.556.938	62.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.671.327	66.900	1.556.938	108.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	486.800	S	5429001
97	CC 1007465605	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.600.000	F						X		X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.672.917	267.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.672.917	67.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.672.917	67.000	1.672.917	116.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	518.200	S	5429001
98	CC 12109374	SERRANO PEREZ JAVIER	1.160.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	173.600	S	5429001
99	CC 1014205737	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	600.000	96.000	0	0	SANITAS-EPS005	600.000	24.000	COMPENSAR-CCF24	2.375.000	87.000	600.000	3.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	210.200	S	5429001
100	CC 1082804134	TIJARO DIAZ WALTHE	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
101	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.262.708	202.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.262.708	50.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.262.708	50.600	1.262.708	87.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	391.200	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
102	CC 1117960065	URBINA OSPINA JHON FREDDY	1.160.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	232.000	37.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	232.000	9.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	232.000	9.300	232.000	16.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.000	S	5429001
103	CC 1104776494	VARGAS CASTILLO ADIMAEL	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	EPS ECOOPSOS S.A S-ESSC91	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	402.778	16.200	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	120.600	S	5429001
104	CC 12203574	VARGAS OSPINA WILSON	1.160.000	F	X	X														0			8	8	8	6	PORVENIR-230301	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
105	CC 1007681703	VARGAS PENA JOSE DANIEL	1.160.000	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	309.334	12.400	309.334	21.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.900	S	5429001
106	CC 7719481	VARGAS SANDOVAL JULIO CESAR	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
107	CC 83253878	VELA TRUJILLO EDWIN	1.160.000	F	X															0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	618.667	99.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	618.667	24.800	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	191.700	S	5429001
108	CC 12139295	VIDAL MONJE JAIME	1.160.000	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	928.000	148.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	928.000	37.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	928.000	37.200	928.000	64.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	287.500	S	5429001
109	CC 83242884	YUSUNGUAIRA TOVAR LUIS EDUARDO	1.160.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	SANITAS-EPS005	386.667	15.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	386.667	15.500	386.667	27.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	119.900	S	5429001
110	CC 75940691	ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	8	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641841			EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25906076	E	2023-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.814.900	126.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109	25906076		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
110.658.139	115.049.524	115.049.524	124.487.092	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				106	17.708.100	0	64.500	0	17.772.600
PROTECCION	230201	800229739	0	30	4.971.500	0	18.100	0	4.989.600
PORVENIR	230301	800224808	8	53	8.334.900	0	30.300	0	8.365.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	9	1.856.000	0	6.800	0	1.862.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	2.545.700	0	9.300	0	2.555.000
EPS(Administradoras: 11)				109	4.605.300	0	17.200	0	4.622.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	94.800	0	400	0	95.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	40	2.066.200	0	7.500	0	2.073.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	7	220.700	0	800	0	221.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	45	1.845.600	0	6.700	0	1.852.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	198.200	0	800	0	199.000
EPS SYNC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	2	46.500	0	200	0	46.700
EPS S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	23.200	0	100	0	23.300
EPS S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	1	35.600	0	200	0	35.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	31.100	0	200	0	31.300
Gran Total					22.270.000	0	81.400	0	22.351.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410855	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25906076	E	2023-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	34.814.900	126.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
109	25906076		Pagada							


SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901093846	0	2	31.000	0	200	0	31.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	12.400	0	100	0	12.500
ARP(Administradoras: 1)				109	7.391.400	0	26.900	0	7.418.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	109	7.391.400	0	26.900	0	7.418.300
CCF(Administradoras: 3)				109	4.983.300	0	18.200	0	5.001.500
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	46.400	0	200	0	46.600
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	294.400	0	1.100	0	295.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	106	4.642.500	0	16.900	0	4.659.400
Gran Total					34.688.100	0	126.800	0	34.814.900

PAGADO

000104

Comprobante

de pago en línea

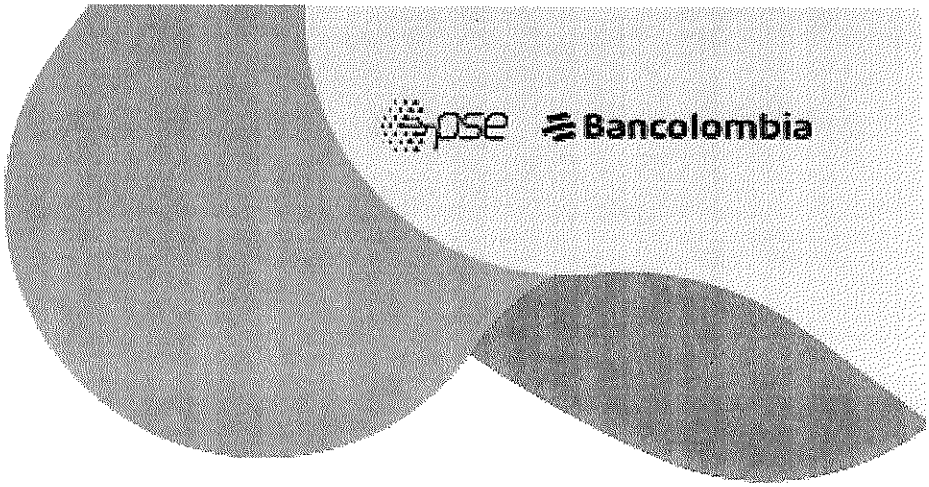

ASOPAGOS

Pago realizado por: MARTHA NATALY BALLESTEROS BUITRAGO

Nro. de recibo: 25906076

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: NIT

Razón Social: 900410655

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 15 de Marzo de 2023 08:03:58 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 34,814,900.00

Cuenta: *******5050

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

RE)IEN PLANILLA PAGADA)

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25636112	E	2023-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.770.300	106.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
79	25636112	2023-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			TotalT	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 96332224	ALVAREZ CORTES JHON FREY	1.450.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.305.000	208.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.305.000	52.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.305.000	52.200	1.305.000	90.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	404.100	S	5429001
2	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
3	CC 7714939	ARDILA CALDERON JUAN CARLOS	1.800.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.620.000	259.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.620.000	64.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.620.000	64.800	1.620.000	112.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	501.600	S	5429001
4	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
5	CC 1075208495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.460.000	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	58.400	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
6	CC 1066349410	BARRIOS VANEGAS VICTOR ALFONSO	1.400.000	F	X															0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	140.000	22.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	140.000	5.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	140.000	5.600	140.000	9.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	5429001
7	CC 12190292	BENAVIDES LUGO FERNANDO	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
8	CC 12195711	BENAVIDES LUGO JORGE	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
9	CC 12193360	BENAVIDES LUGO JOSE JAVIER	1.160.000	F	X															0			13	13	13	13	COLPENSION ES-25-14	502.667	80.500	0	0	SANITAS-EPS005	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.900	S	5429001
10	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.160.000	F																0			0	13	13	13	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	502.667	20.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	502.667	20.200	502.667	35.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	75.400	S	5429001
11	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.160.000	F												X				0			0	17	17	17	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	5	52.600	S	5429001
12	CC 19306323	CALDERON CALDERON EFRAIN	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	657.334	105.200	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5429001
13	CC 12206989	CALDERON RIVERA JORGE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
14	CC 12128984	CALLEJAS BASTOS ISAAC	2.500.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
15	CC 1075283803	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.460.000	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.460.000	233.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.460.000	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.460.000	58.400	1.460.000	7.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
16	CC 12122227	CASTAÑEDA MUÑOZ FRANCISCO	1.450.000	F	X															0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	531.667	85.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	531.667	21.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	531.667	21.300	531.667	37.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	163.800	S	5429001
17	CC 43154874	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
18	CC 12120162	CESPEDES CRUZ OMAR EDUARDO	1.450.000	F							X	X								0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.573.958	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.573.958	63.000	1.573.958	109.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	235.600	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	EC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
19	CC 1003893807	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
20	CC 1075279844	CHARRY ANDRADE NATALIA ALEJANDRA	1.400.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
21	CC 55172446	CHAVEZ RIVERA SANDRA GICELLA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
22	CC 83225779	CLAROS CABRERA JOSE OTAIN	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
23	CC 1113652340	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
24	CC 55179280	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
25	CC 7729393	FIERRO ALDANA JHON JESUS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
26	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.707.032	273.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.707.032	68.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.707.032	68.300	1.707.032	118.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	528.700	S	5429001
27	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.393.200	S	5429001
28	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00525	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
29	CC 17711204	GONZALEZ CALLEJAS ABELARDO	1.400.000	F	X															0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	280.000	44.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	280.000	11.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	280.000	11.200	280.000	19.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	86.700	S	5429001
30	CC 83169239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
31	CC 1006093118	GUZMAN ASCENCIO JAIDER MAURICIO	1.160.000	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	SANITAS-EPS005	193.334	7.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5429001
32	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.178.125	188.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
33	CC 1083872554	HEREDIA ROJAS FERLEY	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.178.125	188.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
34	CC 1075320590	IBARRA PENAGOS GABRIELA	1.400.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.260.000	201.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S	5429001
35	CC 1075540804	LASSO ESQUIVEL JOHN JAIRO	1.400.000	F						X		X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.540.156	246.500	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.540.156	61.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.540.156	61.700	1.540.156	107.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	477.100	S	5429001
36	CC 1079412617	LEIVA CUMBE YERLY MAIRETH	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.268.687	90.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	522.200	S	5429001
37	CC 96331839	LEON VARGAS EULICER	1.160.000	F	X															0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0	0	EPS-S 0MALLAMAS-EPSIC5	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
38	CC 1075304381	LOPEZ CORTES LUIS FELIPE	1.450.000	F	X															0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.353.334	216.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.353.334	54.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.353.334	54.200	1.353.334	94.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	419.200	S	5429001
39	CC 1075232695	LOZADA ALAPE LEIDY JOHANA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.523.958	243.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.523.958	61.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.523.958	61.000	1.523.958	106.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	472.000	S	5429001
40	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.400.000	F						X		X								0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.469.271	235.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.469.271	58.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.469.271	58.800	1.469.271	102.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	455.000	S	5429001
41	CC 83221604	MEDINA TORRES EDSON CHRISTOPHER	1.160.000	F		X														0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	618.667	99.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	618.667	24.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.096.415	43.900	618.667	43.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	210.800	S	5429001
42	CC 1077872606	MENDEZ PALACIO NICOLAS	1.600.000	F	X															0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	1.066.667	170.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.066.667	42.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.066.667	42.700	1.066.667	74.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	330.400	S	5429001
43	CC 12139977	MONJE CHALA MICHEL	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	464.000	74.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	464.000	18.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	464.000	18.600	464.000	32.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5429001
44	CC 79650911	MORILLO GALVAN FERLIS JOSE	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	580.000	92.800	0	0	EPS-S 0CAPITAL-EPSC24	580.000	23.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.021.154	40.900	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	197.300	S	5429001
45	CC 10941174	MORILLO GALVAN FLORENCIO ANTONIO	1.160.000	F		X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	580.000	92.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	580.000	23.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.021.154	40.900	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	197.300	S	5429001
46	CC 12188076	MUÑOZ ARCENIO	1.160.000	F	X															0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
47	CC 83243697	MUÑOZ MORA FAIDER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD								RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
48	CC 1075257007	NARVAEZ GUIO LAURA VICTORIA	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
49	CC 6119105	OCAMPO OBANDO ULDIVIER DE JESUS	1.160.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	464.000	74.300	0	0	SANITAS-EPS005	464.000	18.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	464.000	18.600	464.000	32.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	143.800	S	5429001
50	CC 8438644	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.400.000	F						X		X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.440.625	230.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.440.625	57.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.440.625	57.700	1.440.625	100.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	446.200	S	5429001
51	CC 1075257554	PANIAGUA ABELLO MANUEL HORACIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
52	CC 79500020	PARRA TOVAR WILSON REINALDO	2.500.000	F	X															0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	2.333.334	373.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.333.334	93.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.333.334	93.400	2.333.334	12.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	572.400	S	5429001
53	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5429001
54	CC 1084578337	PAZ ZUÑIGA DIXON ARNULFO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
55	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.450.000	I							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.630.833	261.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.630.833	65.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.630.833	65.300	1.630.833	113.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	505.200	S	5429001
56	CC 7716816	PERDOMO GUTIERREZ JOSE ALIRIO	1.400.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.605.834	257.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.605.834	64.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.605.834	64.300	1.605.834	111.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	497.400	S	5429001
57	CC 73121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
58	CC 7731714	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000	F										X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.865.625	298.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.865.625	74.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.865.625	74.700	1.865.625	129.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	577.800	S	5429001
59	CC 1971887	PUPO CANTILLO JOHANDRI JOSE	1.160.000	F	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	541.334	86.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	541.334	21.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.800	S	5429001
60	CC 76294608	QUINAYAS QUINAYAS RUBER	1.160.000	F	X															0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	38.667	6.200	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5429001
61	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
62	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5429001
63	CC 1075300301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.450.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.633.073	261.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.633.073	65.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.633.073	65.400	1.633.073	113.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	505.800	S	5429001
64	CC 1075246470	REYES GONZALEZ WILLIAM RICARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
65	CC 7689428	REYES RAMIREZ YAIR	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
66	CC 1032507854	RODRIGUEZ AGUILLON GABRIEL EDUARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR-CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	950.900	S	5429001
67	CC 1007392888	RODRIGUEZ CARVAJAL DIEGO ALEJANDRO	1.700.000	F	X	X														0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	680.000	108.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	680.000	27.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	708.333	28.400	680.000	47.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	211.800	S	5429001
68	CC 12193284	RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO	9.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	9.000.000	1.440.000	45.000	45.000	SANITAS-EPS005	9.000.000	360.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	9.000.000	360.000	9.000.000	47.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.297.000	S	5429001
69	CC 1003805525	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.178.125	188.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.178.125	47.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.178.125	47.200	1.178.125	82.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.900	S	5429001
70	CC 7730705	ROJAS QUINTERO ROBERT REINALDO	2.100.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.100.000	336.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5429001
71	CC 1077873747	ROMERO HENAO CAMILO ANDRES	1.800.000	F	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	1.140.000	182.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.140.000	45.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.140.000	45.600	1.140.000	79.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	353.000	S	5429001
72	CC 12119056	ROMERO SEGURA LUIS ALBERTO	1.400.000	F		X														0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	513.334	82.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	513.334	20.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	688.334	27.600	513.334	35.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	166.200	S	5429001
73	CC 83169849	RUIZ WILLINTON RAUL	1.400.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.592.292	254.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.592.292	63.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.592.292	63.700	1.592.292	110.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	493.100	S	5429001
74	CC 1024574168	SALAZAR PUENTES LUIZ MIGUEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5429001
75	CC 1007465605	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.400.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.516.667	242.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.516.667	60.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.516.667	60.700	1.516.667	105.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.700	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
76	CC 12169374	SERRANO PEREZ JAVIER	1.160.000	F	X															0			0	5	5	5	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	193.334	7.600	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	29.100	S	5429001
77	CC 1014205737	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMPENSAR-CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
78	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.160.000	F														X		0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.172.083	187.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.172.083	46.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.172.083	46.900	1.172.083	81.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	363.000	S	5429001
79	CC 7719481	VARGAS SANDOVAL JULIO CESAR	1.160.000	F	X															0			17	17	17	17	PROTECCION-230201	657.334	105.200	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5429001
80	CC 79940691	ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO	1.160.000	F	X															0			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	541.334	86.700	0	0	SANITAS-EPS005	541.334	21.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	541.334	21.700	541.334	37.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	167.800	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25636112	E	2023-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.770.300	106.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
79	25636112		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
99.211.167	102.138.460	102.138.460	104.370.566	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				76	15.965.300	0	57.000	0	16.022.300
PROTECCION	230201	800229739	0	22	4.828.100	0	17.200	0	4.845.300
PORVENIR	230301	800224808	8	32	6.683.600	0	23.800	0	6.707.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	17	3.315.300	0	11.900	0	3.327.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	1.138.300	0	4.100	0	1.142.400
EPS(Administradoras: 7)				79	4.087.600	0	14.900	0	4.102.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	31	1.949.300	0	7.000	0	1.956.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	8	336.700	0	1.200	0	337.900
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	1.600	0	100	0	1.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	32	1.485.000	0	5.300	0	1.490.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	92.800	0	400	0	93.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	199.000	0	800	0	199.800
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	23.200	0	100	0	23.300
ARP(Administradoras: 1)				79	5.434.100	0	19.300	0	5.453.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	79	5.434.100	0	19.300	0	5.453.400
CCF(Administradoras: 3)				79	4.177.100	0	15.000	0	4.192.100
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	208.000	0	800	0	208.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	74	3.840.900	0	13.700	0	3.854.600
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	128.200	0	500	0	128.700
Gran Total					29.664.100	0	106.200	0	29.770.300

RE MEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nl 900410695	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2022-12	2023-01	25353113	E	2023-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27,655,200	125,300	BANCOLOMBIA	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
65	25353113	2023-01-13	Pagada								

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 96332224	ALVAREZ CORTES JHON FREY	1.450.000	F	X								X							0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	948.541	151.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	948.541	38.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.368.333	94.800	948.541	66.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	350.700	S	5429001
2	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
3	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
4	CC 1075208495	BALLESTEROS HUITRAGO MARTHA NATALY	1.320.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.320.000	211.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.320.000	52.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.320.000	52.800	1.320.000	6.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	323.700	S	5429001
5	CC 1129004682	BARRAGAN ALDANA FABIAN ARLEXIS	1.000.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	333.334	53.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	333.334	13.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	413.890	16.600	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	106.700	S	5429001
6	CC 1077632206	BRAHAM RIVAS YERSON REILER	1.000.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	551.389	22.100	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	156.900	S	5429001
7	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.000.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.351.041	54.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.351.041	54.100	1.351.041	94.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	202.300	S	5429001
8	CC 12200989	CALDERON RIVERA JORGE	1.000.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	400.000	64.000	0	0	SANITAS-EPS005	400.000	16.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	400.000	16.000	400.000	27.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	123.900	S	5429001
9	CC 1075283803	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	5429001
10	CC 43151874	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.010.417	161.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.010.417	40.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.010.417	40.500	1.010.417	70.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	313.100	S	5429001
11	CC 12120162	CESPEDES CRUZ OMAR EDUARDO	1.400.000	F	X								X							0			0	15	15	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	714.583	28.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	714.583	28.600	714.583	49.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	107.000	S	5429001
12	CC 1003893807	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.162.500	186.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.162.500	46.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.162.500	46.500	1.162.500	81.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	360.000	S	5429001
13	CC 1075279844	CHARRY ANDRADE NATALIA ALEJANDRA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.599.791	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.599.791	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.599.791	64.000	1.599.791	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
14	CC 55172446	CHAVEZ RIVERA SANDRA GICELLA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
15	CC 1075318459	CLEVES GONZALEZ SANTIAGO	1.400.000	F	X								X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.677.812	268.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.677.812	67.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.778.923	71.200	1.677.812	116.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	523.700	S	5429001
16	CC 1113652340	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
17	CC 83092871	CORTES ASTUDILLO HERNAN	1.000.000	F	X															0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	33.334	5.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	33.334	1.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	61.112	2.500	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	11.700	S	5429001
18	CC 55179280	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5924001
19	CC 7729393	FIERRO ALDANA JHON JESUS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF25	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	ArPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
20	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.500.000	F							X		X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.926.303	308.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.926.303	77.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.926.303	77.100	1.926.303	133.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	596.600	S	5429001
21	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	22.500	22.500	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.438.200	S	5429001
22	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
23	CC 83169239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.185.937	189.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.185.937	47.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.185.937	47.500	1.185.937	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5429001
24	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.130.209	180.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.130.209	45.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.130.209	45.300	1.130.209	78.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	350.200	S	5429001
25	CC 1083872553	HEREDIA ROJAS FERLEY	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.043.750	167.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.043.750	41.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.043.750	41.800	1.043.750	72.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	323.300	S	5429001
26	CC 1075540804	LASSO ESQUIVEL JOHN JAIRO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.664.272	266.300	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.664.272	66.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.664.272	66.600	1.664.272	115.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	515.400	S	5429001
27	CC 1079412617	LEIVA CUMBE YERLY MAIRETH	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
28	CC 1075232695	LOZADA ALAPE LEIDY JOHANA	1.400.000	F	X								X							0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	1.284.792	205.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.284.792	51.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.284.792	51.400	1.284.792	89.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	397.900	S	5429001
29	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.679.167	268.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.679.167	67.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.679.167	67.200	1.679.167	116.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	520.000	S	5429001
30	CC 83221604	MEDINA TORRES EDSON CHRISTOPHER	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.355.208	216.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.355.208	54.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.355.208	54.300	1.355.208	94.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	419.900	S	5429001
31	CC 79650911	MORILLO GALVAN FERLIS JOSE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
32	CC 10941174	MORILLO GALVAN FLORENCIO ANTONIO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
33	CC 73550818	MURILLO GARCIA JOHN JAIRO	1.000.000	F		X														0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	534.722	21.400	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	156.200	S	5429001
34	CC 83243697	MUÑOZ MORA FAIBER	1.000.000	F									X							0			30	30	30	20	PROTECCION-230201	1.172.396	187.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.172.396	46.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.172.396	46.900	1.172.396	81.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	363.000	S	5429001
35	CC 1075257007	NARVAEZ GUIO LAURA VICTORIA	1.400.000	F	X															0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	186.667	29.900	0	0	SANITAS-EPS005	186.667	7.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	186.667	7.500	186.667	13.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	57.900	S	5429001
36	CC 8438643	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.662.917	266.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.662.917	66.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.662.917	66.600	1.662.917	115.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	515.100	S	5429001
37	CC 17653643	OROZCO RIVAS JAIR	1.000.000	F		X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	241.445	9.800	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	27.900	S	5429001
38	CC 1075257554	PANIAGUA ABELLO MANUEL HORACIO	1.000.000	F	X								X							0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	610.417	97.700	0	0	SANITAS-EPS005	610.417	24.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	610.417	24.500	610.417	42.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	189.200	S	5429001
39	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.222.917	355.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.222.917	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.222.917	89.000	2.222.917	154.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	658.500	S	5429001
40	CC 1084578337	PAZ ZUÑIGA DIXON ARNULFO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
41	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.821.458	291.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.821.458	72.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.821.458	72.900	1.821.458	126.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	564.100	S	5429001
42	CC 7716816	PERDOMO GUTIERREZ JOSE ALIRIO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.782.084	285.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.782.084	71.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.782.084	71.300	1.782.084	124.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	551.900	S	5429001
43	CC 73121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.185.937	189.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.185.937	47.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.185.937	47.500	1.185.937	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5429001
44	CC 7731714	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.363.438	378.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.363.438	94.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.363.438	94.600	2.363.438	164.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	731.900	S	5429001
45	CC 19710887	PUPO CANTILLO JOHANDRI JOSE	1.100.000	F	X								X							0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	957.918	153.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	957.918	38.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.042.640	81.800	957.918	66.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	5429001
46	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
47	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5429001

0001114

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
48	CC 1075300301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.828.749	292.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.828.749	73.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.828.749	73.200	1.828.749	127.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	566.300	S	5429001
49	CC 1075246470	REYES GONZALEZ WILLIAM RICARDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
50	CC 7689428	REYES RAMIREZ YAIR	1.600.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.251.041	200.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.251.041	50.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.251.041	50.100	1.251.041	87.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	387.500	S	5429001
51	CC 1032507854	RODRIGUEZ AGUILLON GABRIEL EDUARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	4.000.000	640.000	20.000	20.000	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR -CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.020.900	S	5429001
52	CC 12193284	RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO	9.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	9.000.000	1.440.000	45.000	45.000	SANITAS-EPS005	9.000.000	360.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	9.000.000	360.000	9.000.000	47.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.297.000	S	5429001
53	CC 1003805525	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.600.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.232.292	197.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.232.292	49.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.232.292	49.300	1.232.292	85.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	381.600	S	5429001
54	CC 7728653	ROJAS OLAYA JUAN DE LA CRUZ	1.300.000	F		X							X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.607.396	257.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.733.785	69.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.607.396	111.900	1.607.396	111.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	502.800	S	5429001
55	CC 7730705	ROJAS QUINTERO ROBERT REINALDO	2.100.000	F	X															0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.260.000	201.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.260.000	50.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.260.000	50.400	1.260.000	87.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	390.100	S	5429001
56	CC 12119056	ROMERO SEGURA LUIS ALBERTO	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
57	CC 83169849	RUIZ WILLINTON RAUL	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.792	275.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.792	68.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.719.792	119.700	1.719.792	119.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	532.500	S	5429001
58	CC 1007828093	RUIZ COGOLLO EDWIN JOSE	1.000.000	F		X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	300.000	12.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	351.389	14.100	300.000	20.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	95.000	S	5429001
59	CC 1024574168	SALAZAR PUENTES LUIS MIGUEL	1.000.000	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	366.667	58.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	366.667	14.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	366.667	14.700	366.667	25.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	113.700	S	5429001
60	CC 1007465605	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.645.312	263.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.645.312	65.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.645.312	65.900	1.645.312	114.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	509.700	S	5429001
61	CC 1075242790	SANTOS PERDOMO INGRID YICED	2.500.000	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	5.760.417	230.500	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	904.500	S	5429001
62	CC 1014205737	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMPENSAR -CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
63	CC 19318003	SUAREZ HERNANDO	1.300.000	F		X							X							0			0	22	22	22	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	950.417	39.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.142.917	45.800	950.417	68.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	153.400	S	5429001
64	CC 1004063206	SUAZA VANEGAS YANCARLOS	1.000.000	F		X														0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	100.000	16.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	100.000	4.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	118.056	4.800	100.000	7.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	31.800	S	5429001
65	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.232.291	197.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.232.291	49.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.232.291	49.300	1.232.291	85.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	381.600	S	5429001

00012

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410555	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 48 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-12	2023-01	25353113	E	2023-01-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.655.200	125.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
65	25353113		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
90.731.723	93.777.764	93.777.764	100.374.363	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				62	14.693.400	0	66.900	0	14.760.300
PROTECCION	230201	800229739	0	18	4.809.100	0	21.800	0	4.830.900
PORVENIR	230301	800224808	8	29	5.821.500	0	26.500	0	5.848.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	2.898.900	0	13.300	0	2.912.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	7	1.163.900	0	5.300	0	1.169.200
EPS(Administradoras: 6)				65	3.752.900	0	17.200	0	3.770.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	54.700	0	300	0	55.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	7	319.900	0	1.500	0	321.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	30	1.463.100	0	6.600	0	1.469.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	21	1.664.800	0	7.600	0	1.672.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	210.400	0	1.000	0	211.400
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	40.000	0	200	0	40.200
ARP(Administradoras: 1)				65	5.066.600	0	22.900	0	5.089.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	65	5.066.600	0	22.900	0	5.089.500
CCF(Administradoras: 3)				65	4.017.000	0	18.300	0	4.035.300
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	208.000	0	1.000	0	209.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	3	120.000	0	600	0	120.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	60	3.689.000	0	16.700	0	3.705.700
Gran Total					27.529.900	0	125.300	0	27.655.200

E3 E1 000

RE_)IEN PLANILLA PAGADA)

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	8	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641641		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	25061163	E	2022-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.720.600	33.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
84	25061163	2022-12-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 96332224	ALVAREZ CORTES JHON FREY	1.450.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.579.896	252.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.579.896	63.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.579.896	63.200	1.579.896	170.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	469.200	S	5429001
2	CC 1004074631	ANDRADE MOLANO DRAYAM ALEXIS	1.000.000	F		X							X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.157.291	185.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.157.291	46.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.303.124	52.200	1.157.291	80.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	364.300	S	5429001
3	CC 7712473	ARAUJO MEDINA EDISON	1.000.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	333.334	53.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	333.334	13.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	333.334	13.400	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.500	S	5429001
4	CC 1080187924	AVILA SEGURA NICOLAS	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5429001
5	CC 1075208495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.320.000	F																0			22	22	22	22	PROTECCION-230201	968.000	154.900	0	0	SANITAS-EPS005	968.000	38.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	968.000	38.800	968.000	5.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	237.600	S	5429001
6	CC 1075208495	BALLESTEROS BUITRAGO MARTHA NATALY	1.320.000	F													X			0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	352.000	56.400	0	0	SANITAS-EPS005	352.000	14.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	352.000	14.100	352.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	84.600	S	5429001
7	CC 1129004682	BARRAGAN ALDANA FABIAN ARLEXIS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
8	CC 7720761	BELTRAN VARGAS FABIO NELSON	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001
9	CC 1075296969	BERMUDEZ GONZALEZ DIEGO ARMANDO	1.000.000	F	X	X														0			20	20	20	20	COLFONDOS-231001	666.667	106.700	0	0	SANITAS-EPS005	666.667	26.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	694.445	27.800	666.667	46.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	207.700	S	5429001
10	CC 1003814761	BERMUDEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL	1.000.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	133.334	5.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	138.890	5.600	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	41.700	S	5429001
11	CC 1117535831	BOHORQUEZ CEBALLES JOHAN SEBASTIAN	1.000.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	138.890	5.600	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	41.700	S	5429001
12	CC 1077632206	BRAHAM RIVAS YERSON REILER	1.000.000	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	733.334	117.400	0	0	SANITAS-EPS005	733.334	29.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	733.334	29.400	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.300	S	5429001
13	CC 1075315118	BURBANO ALBOLEDA MAICOL ALEXIS	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001
14	CC 1075321859	BURBANO GOMEZ ALIRIO	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	500.000	80.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001
15	CC 1117532912	BURBANO GOMEZ ALVARO	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001
16	CC 12187288	BUSTOS JIMENEZ ALFONSO	1.000.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.284.374	51.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.284.374	51.400	1.284.374	89.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	192.200	S	5429001
17	CC 1075283803	CARVAJAL ANDRADE MARIA PAULA	1.300.000	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	5429001
18	CC 7715422	CASTILLO CUCHIMBA EDWIN HERNANDO	1.000.000	F	X	X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	533.334	85.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	533.334	21.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	555.556	22.300	533.334	37.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	166.300	S	5429001
19	CC 1003805252	CASTILLO HERRERA JUAN SEBASTIAN	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	ASPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
20	CC 43154874	CEBALLOS LESMES ADRIANA	1.000.000	F	X								X							0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	780.208	124.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	780.208	31.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	780.208	31.300	780.208	54.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	241.900	S	5429001
21	CC 1003893897	CHALA CUCHIMBA BRAYAN STEVEN	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.268.749	203.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.268.749	50.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.268.749	50.800	1.268.749	88.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	393.000	S	5429001
22	CC 1075279843	CHARRY ANDRADE NATALIA ALEJANDRA	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.672.709	267.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.672.709	67.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.672.709	67.000	1.672.709	116.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	518.200	S	5429001
23	CC 55172346	CHAVEZ RIVERA SANDRA GICELLA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	63.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	63.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
24	CC 1075318459	CLEVES GONZALEZ SANTIAGO	1.400.000	F	X								X							0			22	22	22	22	PROTECCION-230201	1.201.667	192.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.201.667	48.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.201.667	48.100	1.201.667	83.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	372.200	S	5429001
25	CC 1113652340	COBO CASAÑAS CESAR ORLANDO	1.000.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	SANITAS-EPS005	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S	5429001
26	CC 1000575307	CONDE GOMEZ CRISTIAN ALEJANDRO	1.000.000	F	X	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	666.667	106.700	0	0	SANITAS-EPS005	666.667	26.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	693.445	27.800	666.667	46.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	207.700	S	5429001
27	CC 83092871	CORTES ASTUDILLO HERNAN	1.000.000	F	X															0			19	19	19	19	COLFONDOS-231001	633.334	101.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	633.334	25.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	633.334	25.400	633.334	44.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	196.300	S	5429001
28	CC 55179260	DIAZ SANCHEZ NORMA CONSTANZA	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5924001
29	CC 7729393	FIERRO ALDANA JHON JESUS	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
30	CC 7726432	FRANCO VALENCIA JOHN ALEXANDER	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.625.000	260.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.625.000	65.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.625.000	65.000	1.625.000	113.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	503.100	S	5429001
31	CC 1075213483	GALINDO SOTO FRANCY ANDREA	4.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.500.000	720.000	22.500	22.500	SANITAS-EPS005	4.500.000	180.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.500.000	180.000	4.500.000	313.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.438.200	S	5429001
32	CC 1075315374	GONZALEZ CADENA YIVI MAGALI	1.200.000	F	X															0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	80.000	12.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	80.000	3.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	80.000	3.200	80.000	500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	19.700	S	5429001
33	CC 1075255063	GONZALEZ CORDOBA OMAR	1.000.000	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	545.833	21.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	156.700	S	5429001
34	CC 83169239	GUTIERREZ JHON FREDY	1.000.000	F	X								X							0			26	26	26	26	COLPENSION-ES-25-14	991.667	158.700	0	0	SANITAS-EPS005	991.667	39.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	991.667	39.700	991.667	69.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	307.200	S	5429001
35	CC 1075310139	GUZMAN SAENZ DIEGO FERNANDO	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.156.250	185.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.156.250	46.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.156.250	46.300	1.156.250	80.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	358.100	S	5429001
36	CC 1083872554	HEREDIA ROJAS FERLEY	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.110.415	177.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.110.415	44.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.110.415	44.500	1.110.415	77.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	344.000	S	5429001
37	CC 36311187	HERRERA JIMENEZ MONICA YINETH	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001
38	CC 7707946	JOVEN SUNCE JHON JAIRO	1.300.000	F		X							X							0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	811.334	129.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	811.334	32.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.009.945	40.400	811.334	56.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	259.300	S	5429001
39	CC 7717940	JOVEN SUNCE JUAN CARLOS	1.300.000	F		X							X							0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	382.270	61.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	382.270	15.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	459.909	18.400	382.270	26.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	121.600	S	5429001
40	CC 1075540804	LASSO ESQUIVEL JOHN JAIRO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.530.207	244.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.530.207	61.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.530.207	61.300	1.530.207	106.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	474.100	S	5429001
41	CC 1079412617	LEIVA CUMBE YERLY MAIRETH	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.600.000	256.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5429001
42	CC 1122731525	MEDINA OBANDO DUBAN	1.300.000	F	X								X							0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	1.297.292	207.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.297.292	51.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.297.292	51.900	1.297.292	90.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	401.700	S	5429001
43	CC 83221604	MEDINA TORRES EDSON CHRISTOPHER	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.339.583	214.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.339.583	53.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.339.583	53.600	1.339.583	93.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	414.900	S	5429001
44	CC 79680911	MORILLO GALVAN FERLIS JOSE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
45	CC 10941174	MORILLO GALVAN FLORENCIO ANTONIO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S	5429001
46	CC 1003501528	MURCIA LOSADA CARLOS JOSE	1.000.000	F		X							X							0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	579.166	92.700	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	579.166	23.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	636.110	25.500	579.166	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	181.800	S	5429001
47	CC 73550818	MURILLO GARCIA JOHN JAIRO	1.000.000	F	X															0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	333.334	53.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	333.334	13.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	333.334	13.400	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.500	S	5429001
48	CC 8243697	MUÑOZ MORA FAIBER	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.267.348	202.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.267.348	50.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.267.348	50.700	1.267.348	88.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	392.500	S	5429001
49	CC 1438644	OCHOA CRUZ JUAN ANTONIO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.642.603	262.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.642.603	65.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.642.603	65.800	1.642.603	114.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	508.900	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Col.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
50	CC 17653643	OROZCO RIVAS JAIR	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.201.041	192.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.201.041	48.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.201.041	48.100	1.201.041	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	372.000	S	5429001
51	CC 7704936	PASCUAS ROJAS JOSE GREGORIO	2.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.370.833	379.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.370.833	94.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.370.833	94.900	2.370.833	165.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	734.300	S	5429001
52	CC 1193073460	PASTRANA RODRIGUEZ CARLOS JOSE	1.000.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001
53	CC 1084578337	PAZ ZUÑIGA DIXON ARNULFO	1.000.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S	5429001
54	CC 1075274075	PENAGOS PULGARIN GIOVANY ALEXANDER	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.665.417	266.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.665.417	66.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.665.417	66.700	1.665.417	116.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	515.900	S	5429001
55	CC 7716816	PERDOMO GUTIERREZ JOSE ALIRIO	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.450.312	232.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.312	58.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.312	58.100	1.450.312	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.300	S	5429001
56	CC 73121191	PEREZ TORREZ JULIO	1.000.000	F	X								X							0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	802.083	128.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	802.083	32.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	802.083	32.100	802.083	55.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	248.500	S	5429001
57	CC 1075245406	PIAMBA BOLAÑOS BRAYAN ANDRES	1.000.000	F		X							X							0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	350.209	60.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	350.209	15.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	487.153	19.500	350.209	26.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	122.200	S	5429001
58	CC 7731714	PULIDO TAPIA HERNANDO	1.800.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.328.750	372.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.328.750	93.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.328.750	93.200	2.328.750	162.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	721.100	S	5429001
59	CC 19716857	PUPO CANTILLO JOHANDRI JOSE	1.100.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.332.605	213.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.332.605	53.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.332.605	53.400	1.332.605	92.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	412.900	S	5429001
60	CC 1075312586	QUINA VALDERRAMA OSCAR JAVIER	1.000.000	F		X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	266.667	42.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	266.667	10.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	302.978	12.200	266.667	18.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	84.200	S	5429001
61	CC 26552057	QUINTERO DUQUE LISELA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
62	CC 36384249	QUINTERO QUINTERO DELFA	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	18.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	858.300	S	5429001
63	CC 1075300301	RENDON MEDINA MIGUEL ANDRES	1.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.853.542	296.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.853.542	74.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.853.542	74.200	1.853.542	129.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	574.100	S	5429001
64	CC 1075246470	REYES GONZALEZ WILLIAN RICARDO	1.000.000	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	20.800	S	5429001
65	CC 7689428	REYES RAMIREZ YAIR	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.142.709	182.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.142.709	45.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.142.709	45.800	1.142.709	79.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	354.100	S	5429001
66	CC 1032507854	RODRIGUEZ AGUILON GABRIEL EDUARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	20.000	20.000	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMPENSAR-CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.020.900	S	5429001
67	CC 12193284	RODRIGUEZ ESQUIVEL GUSTAVO ERNESTO	9.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	9.000.000	1.440.000	45.000	45.000	SANITAS-EPS005	9.000.000	360.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	9.000.000	360.000	9.000.000	47.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	2.297.000	S	5429001
68	CC 1075297279	ROJAS BORRERO JUAN CAMILO	1.000.000	F	X	X														0			20	20	20	20	PROTECCION-230201	666.667	106.700	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	666.667	26.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	694.445	27.800	666.667	46.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	207.700	S	5429001
69	CC 1003805525	ROJAS MONTENEGRO JUAN DAVID	1.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.084.374	173.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.084.374	43.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.084.374	43.400	1.084.374	75.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.800	S	5429001
70	CC 7728653	ROJAS OLAYA JUAN DE LA CRUZ	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.450.312	232.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.450.312	58.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.312	58.100	1.450.312	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.300	S	5429001
71	CC 12119056	ROMERO SEGURA LUIS ALBERTO	1.400.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S	5429001
72	CC 83169849	RUIZ WILLINTON RAUL	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.561.355	249.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.561.355	62.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.561.355	62.500	1.561.355	108.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	483.600	S	5429001
73	CC 1007826093	RUIZ COGOLLO EDWIN JOSE	1.000.000	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	733.334	117.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	733.334	29.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	733.334	29.400	733.334	51.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	227.300	S	5429001
74	CC 1075242396	SAAB YEPES MARIA ANGELICA	1.000.000	F		X														0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SANITAS-EPS005	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.145.833	45.900	500.000	2.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	148.600	S	5429001
75	CC 1007465605	SANCHEZ VANEGAS ROBINSON DANIEL	1.300.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.622.687	259.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.622.687	65.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.622.687	65.000	1.622.687	113.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	502.700	S	5429001
76	CC 1075242790	SANTOS PERDOMO INGRID YICED	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5429001
77	CC 1004205737	SIERRA AGUILLON HECTOR LEONARDO	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COMPENSAR-CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	6.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	294.300	S	5429001
78	CC 19318003	SUAREZ HERNANDO	1.300.000	F									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.532.915	61.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.532.915	61.400	1.532.915	106.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	4	229.500	S	5429001

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Col.	Col.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
79	CC 1004063206	SUAZA VANEGAS JUANCARLOS CARLOS	1.000.000		F	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	333.334	53.400	0	0	FAMISANAR-EPS017	333.334	13.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	333.334	13.400	333.334	23.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	103.500	S	5429001
80	CC 1063292314	TABORDA URDA LUZDARYS INES	2.000.000		F	X														0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	1.200.000	192.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.200.000	48.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.760.000	68.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	391.600	S	5429001
81	CC 1003805565	TRIANA YARA JHON HECTOR	1.000.000		F	X							X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.115.625	178.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.115.625	44.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.167.014	46.700	1.115.625	77.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.600	S	5429001
82	CC 1003953289	TRIVIÑO SANCHEZ SANTIAGO ALEXANDER	1.000.000		F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.317.709	210.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.317.709	52.860	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.317.709	52.860	1.317.709	91.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	498.300	S	5429001
83	CC 1124862976	VALENZUELA CARDOZO CARLOS ANDRES	1.000.000		F	X	X													0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	5.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	138.890	5.600	133.334	9.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	41.700	S	5429001
84	CC 79928562	VELEZ JIMMY	1.300.000		F	X	X													0			20	20	20	20	COLPENSION ES-25-14	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	866.667	34.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	894.445	35.800	866.667	60.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	269.600	S	5429001
85	CC 1004149186	ZAMORA OSORIO DUVAN FELIPE	1.000.000		F	X	X													0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	500.000	80.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	500.000	20.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	520.833	20.900	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	155.700	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900410655	8	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 24 OF 705 P 7		8641841		EQUISERVICIOSSAS@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	25061163	E	2022-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.720.600	33.500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
84	25061163		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
98.239.894	101.057.183	101.057.183	103.239.186	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				82	15.895.900	0	17.800	0	15.913.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	3.003.700	0	3.400	0	3.007.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	7	1.258.300	0	1.400	0	1.259.700
PORVENIR	230301	800224808	8	41	6.825.400	0	7.600	0	6.833.000
PROTECCION	230201	800229739	0	25	4.808.500	0	5.400	0	4.813.900
EPS(Administradoras: 8)				84	4.045.300	0	4.900	0	4.050.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	22.700	0	100	0	22.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	192.600	0	300	0	192.900
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	3	55.300	0	100	0	55.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	37	1.587.300	0	1.800	0	1.589.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	20.000	0	100	0	20.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	26	1.785.400	0	2.000	0	1.787.400
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	40.000	0	100	0	40.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	9	342.000	0	400	0	342.400
ARP(Administradoras: 1)				84	5.612.800	0	6.100	0	5.618.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	84	5.612.800	0	6.100	0	5.618.900
CCF(Administradoras: 3)				84	4.133.100	0	4.700	0	4.137.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	78	3.737.100	0	4.100	0	3.741.200
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	208.000	0	300	0	208.300
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	4	188.000	0	300	0	188.300
Gran Total					29.687.100	0	33.500	0	29.720.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				82	15.895.900	0	17.800	0	15.913.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	3.003.700	0	3.400	0	3.007.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	7	1.258.300	0	1.400	0	1.259.700
PORVENIR	230301	800224808	8	41	6.825.400	0	7.600	0	6.833.000
PROTECCION	230201	800229739	0	25	4.808.500	0	5.400	0	4.813.900
EPS(Administradoras: 8)				84	4.045.300	0	4.900	0	4.050.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	22.700	0	100	0	22.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	192.600	0	300	0	192.900
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	3	55.300	0	100	0	55.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	37	1.587.300	0	1.800	0	1.589.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	20.000	0	100	0	20.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	26	1.785.400	0	2.000	0	1.787.400
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	40.000	0	100	0	40.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	9	342.000	0	400	0	342.400
ARP(Administradoras: 1)				84	5.612.800	0	6.100	0	5.618.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	84	5.612.800	0	6.100	0	5.618.900
CCF(Administradoras: 3)				84	4.133.100	0	4.700	0	4.137.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	78	3.737.100	0	4.100	0	3.741.200
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	208.000	0	300	0	208.300
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	4	188.000	0	300	0	188.300
Gran Total					29.687.100	0	33.500	0	29.720.600

Bancolombia

Neiva, 10 de marzo 2023.

Señores:
INTERESADOS
La ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite certificar que la empresa **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS,** identificado con NIT. No 900.410.655 a la fecha de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos,

Nombre del Producto	N° del Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	454-232850-50	2014/04/11	Activa

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en la sucursal Quinta Avenida teléfono 8631262 de la ciudad de Neiva, o en nuestras oficinas ubicadas en el momento que así lo estimen conveniente.

Cordialmente,

Paula Andrea Perez Arcila
Gerente de Sucursal
Oficina 454 Quinta Avenida
(098) 631262 ext. 110
Neiva – Huila
pauperez@bancolombia.com.co

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,013-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SIHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 7,816 DE 2022

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SUBCUENTA: DE MANEJO DE DESASTRES

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2022, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
NIT: 900,410,655-8
OBJETO: Orden de Servicio No 98 de 2022---construcción a Todo Costo De: Dos (2) Muros de Contención; Tres (3) Alcantarillas D=36" con Muro de Contención Como Estructura de Salida y Construcción de Box Coulvert, en la Vía Denominada Oritoguaz – Saladoblanco – la Cabaña – Morelia – el Palmar, Código 4504b-1, Vía de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila, de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Publica que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado Mediante Decreto No. 299 del 7 de Septiembre de 2022
DEPENDENCIA: 200-3 - Subcuenta: de Manejo de Desastres
CCPET: 03 - FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - DE MANEJO DE DESASTRES
C. PROGRAM.: 99 - GASTOS FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PROYECTO: 0 - Universal
RECURSO: 10 - Departamento
FUENTE: 1 - RECURSOS DEL DEPARTAMENTO
C. C. PROD.: 00 - NO APLICA
META PROD.: 99-99-99 - Universal
VALOR: $638,455,304.00

Que el valor total del Compromiso es de $638,455,304.00, el cual esta identificado con el número 7,816, vigente a partir del 23 de noviembre de 2022, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8,497 de 2022.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA. TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA, CONSECUTIVO NO. 4353.

Neiva, Miércoles 23 de Noviembre de 2022

EBERT BARRERA ALVAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: LILIANA POLANCO ARAUJO

Neiva - Huila, Colombia
1 de noviembre de 2022

ORDEN DE SERVICIOS Nro. 98 DE 2022

OBJETO	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE: DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITOGUAZ – SALADOBLANCO – LA CABAÑA – MORELIA – EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($638.455.304)
FUENTE	FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONTRATANTE **DEPENDENCIA** **DIRECCIÓN** **TELÉFONO** **E-MAIL**	DEPARTAMENTO DEL HUILA Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario Calle 8 No. con Carrera 4 Esquina. 2° Piso 8671300 sgobierno@huila.gov.co
CONTRATISTA **NIT.** **REP. LEGAL** **CC No** **DOMICILIO** **TELÉFONO** **E-MAIL**	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 900410655-8 GUSTAVO ERNESTO RODRÍGUEZ ESQUIVEL 12.193.284 de Garzón Huila Calle 46 No. 16-24, Ofi. 705-706 Neiva Huila 8641641-3214860684 equiserviciossas@equindustriales.com

1. JUSTIFICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS

Que, de conformidad a las estipulaciones que integra en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 1523 de 2012, *"Por la cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres"* se establece que la gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

Que, el artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 en su parágrafo 1 constituyó la gestión del riesgo en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.

Que el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012, establece los principios reguladores de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres, de los cuales se resaltan:

> *"13. **Principio de concurrencia:** La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante **la unión de esfuerzos y la colaboración** no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. (...)*
>
> *14. **Principio de subsidiariedad:** Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada."*

Que, con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1523 de 2012, que determina que el Consejos departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres, es una instancia de *"coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente.",* es decir, de las instancias territoriales que integran la jurisdicción del departamental.

Que, el Gobierno departamental profiere el acto administrativo que contiene el Decreto Nro. 059 del 9 de marzo de 2022, ***"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, COMO CONSECUENCIA DE LAS EMERGENCIAS CAUSADAS POR LA TEMPORADA ATÍPICA DE LLUVIAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*** en consideración para la fecha, entre otros, a los siguientes: "

- MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN SITUACIÓN DE CALAMIDAD

ZONA	MUNICIPIO	ACTO ADMINISTRATIVO	TERMINOS
ZONA NORTE	NEIVA	Decreto Nro. 0091 del 18/02/2022 - POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LAS FUERTES LLUVIAS - FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".	Desde 18/02/2022 Hasta 17/08/2022
	COLOMBIA	Decreto Nro. DA-100-02-044-2021 del 14/08/2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN TODO EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA – HUILA."	Desde 14/08/2021 Hasta 13/04/2022
	TELLO	Decreto Nro. 057 del 6/11/2021 - POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TELLO HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	Desde 6/11/2021 Hasta 5/05/2022
	RIVERA	Decreto Nro. 005 del 17/01/2022 -POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA, CON OCASIÓN A LA OLA INVERNAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS 2021 Y LLUVIAS DE INICIO DEL AÑO 2022, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	Desde 17/01/2022 Hasta 16/07/2022

	IQUIRA	Decreto Nro. 010 del 01/03/2022 - "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA (H)"	Desde 01/03/2022 Hasta 30/06/22
ZONA CENTRO	SUAZA	Decreto Nro. 123 del 04/03/2021 - "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Decreto Nro. 29 del 13/03/2021 - "POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE Y ACLARA EL DECRETO 123 DE MARZO 2021 QUE DECLARO CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Decreto Nro. 098 del 3/09/2021 - "POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO NÚMERO 029 DEL 13 DE MARZO DE 2021 QUE DECLARÓ CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	Desde 04/03/2021 Hasta 03/09/21 Desde 04/09/2021 Hasta 03/03/2022
	GUADALUPE	Decreto Nro. 069 del 21/10/2021 "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"	Desde 21/10/2021 hasta 20/04/2022
ZONA OCCIDENTE	LA PLATA	Decreto Nro. 10-.02.2-141 del 20/11/2021 - "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA PRESENCIA DE LLUVIAS ATÍPICAS EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA"	Desde 20/11/2021 Hasta 19/05/22
	LA ARGENTINA	Decreto Nro. 11 del 03/03/2022 - "POR MEDIO DEL CUAL DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA, CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y A LA PERSISTENCIA DE LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LAS MISMAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."	Desde 03/03/2022 Hasta 02/09/2022
ZONA SUR	PITALITO	Decreto Nro. 325 del 17/12/2021 - "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA, CON FUNDAMENTO EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS DEL 2021"	Desde 17/12/2021 hasta 16/06/2022
	ELÍAS	Decreto Nro. 100 del 09/11/2021 - "POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN LA VEREDA PASO A MAITO DEL MUNICIPIO DE ELÍAS HUILA, CON OCASIÓN DE LAS AFECTACIONES DEL PUENTE SOBRE EL RIO MAGDALENA"	Desde 09/11/2021 Hasta 08/05/2022
	TIMANÁ	Decreto Nro. 020 del 16/02/2022 - "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."	Desde 16/02/2022 Hasta 15/07/22
	PALESTINA	Decreto Nro. 004 del 21/01/2022 - "POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA-HUILA"	Desde 21/01/2022 Hasta 31/03/2022
	SALADO BLANCO	Decreto Nro. 073 del 21/12/2021 - "POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO – HUILA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	Desde 21/12/2021 Hasta 20/03/22

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @lHuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

Que, el Gobierno Departamental expide igualmente el Decreto Nro. 299 del 7 de septiembre de 2022, ***"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO DEPARTAMENTAL NRO. 059 DEL 9 DE MARZO 2022; ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSAGRA LA "SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, COMO CONSECUENCIA DE LAS EMERGENCIAS CAUSADAS POR LA TEMPORADA ATÍPICA DE LLUVIAS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*** en consideración a *"Que, según indica el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial[1] "El IDEAM informa que persisten las condiciones del Fenómeno La Niña. De acuerdo con las proyecciones del CPC/IRI es probable que este evento persista durante el verano del hemisferio norte (~60% de probabilidad) y se extienda durante el otoño e inicios del invierno (~62-66% de probabilidad). Bajo este panorama, las variaciones climáticas del país serán moduladas en mayor medida por las perturbaciones de la escala intraestacional, la evolución de La Niña y la dinámica asociada a una activa temporada de huracanes. Durante el periodo agosto - octubre se esperan precipitaciones dentro de los valores normales y por encima de esta condición. Los excesos más significativos se favorecen en el transcurso de agosto. Las temperaturas extremas en agosto fluctuarían con anomalías positivas y negativas de hasta 1.5 °C."*

Que, una vez decretada la situación de calamidad pública, se activa el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por lo cual, la Nación, el Departamento del Huila, demás instancias territoriales y/o las entidades públicas y privadas puede apoyar la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de Acción Específico PAE, para atender a la población afectada a través de la unión de esfuerzos, trabajo coordinado y la colaboración no jerárquica de los intervinientes.

Que, el Plan de Acción Específico PAE, establece:

FASE DE LA EMERGENCIA	SERVICIO BÁSICO DE RESPUESTA	ACTIVIDADES
RECUPERACIÓN	ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE - MAQUINARIA AMARILLA	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, RECALCE Y PROLONGACIÓN ALETA PUENTE, CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT Y OBRAS DE ARTE-ORITOGUAZ - SALADOBLANCO - LA CABAÑA - MORELIA - EL PALMAR

Que, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2016, establece que, salvo lo dispuesto para *"los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública,* ***se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares****, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993"*, como estatuto general de contratación estatal.

Que, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, a su vez determinó que *"Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. <Inciso adicionado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:>*

[1] IDEAM - Publicación Nro. 330 de agosto de 2022

En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para los efectos de este artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la poscontractual."

Que, sobre el Régimen especial de contratación previsto en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, Colombia Compra Eficiente, mediante concepto C-298 del 20 de mayo de 2020 señaló: "Sin perjuicio de las potestades exorbitantes, la norma precedente exceptúa del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública los contratos «relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública» celebrados por: i) la sociedad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, ii) por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo y iii) los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo. Cuando se declare la situación de desastre o la situación de calamidad pública, las instituciones mencionadas antes son las únicas excluidas de la Ley 80 de 1993.

Siendo imperativo dar aplicación a la norma especial de contratación, a efectos de atender las emergencias, que se presentan en las instancias territoriales que integra el departamento del Huila.

Que, el artículo 1 de la Ordenanza Departamental No. 024 de 2014 creó el Fondo Departamental para la gestión del Riesgo de Desastres del Huila, como una cuenta especial del departamento con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, sin personería jurídica ni planta de personal, con fines de interés público y asistencia social, con el propósito de invertir, ahorrar, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres o calamidades públicas declaradas o de naturaleza similar; que guarden coherencia con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el departamento Huila.

Que, de conformidad al artículo primero del Decreto Departamental No. 259 del 05 de agosto de 2022, se delega a la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, "el ejercicio de la ordenación del gasto, sin consideración de la cuantía, del Fondo Departamental parta la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Departamental de Bomberos del Huila", en lo que respecta a la Gestión del Riesgo en el Departamento del Huila.

Que, como indica la circular 018 del 24 de marzo de 2020 de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ***"Los recursos no están sujetos al principio de anualidad presupuestal: Esto significa que no procede la liquidación anual presupuestal y, en consecuencia, permanecerán en las cuentas hasta su ejecución.*** *El término acumulativo del parágrafo 1° del artículo 54 de la Ley 1523 de 2012 se refiere a que los recursos, al estar en una cuenta especial, una vez finalizada la vigencia fiscal, no pueden ser liquidados para incluirse de nuevo en el presupuesto general, sino que aquellos que no se ejecuten en una vigencia se acumulan con los asignados para la siguiente, dándoles un carácter de recursos acumulados.*

Que, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernación del Huila, realizó un análisis de precios contratados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y con fundamento en los precios históricos contratados para el objeto del presente contrato; en virtud a la facultad conferida por el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, considera pertinente, útil y necesario, realizar la presente orden de servicio de emergencias; indicando de manera expresa que la presente contratación se someterá, por disposición legal, al control fiscal de que trata los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen, adiciones o complementen.

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

2. OBJETO Y ALCANCE

OBJETO. CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE: DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITOGUAZ – SALADOBLANCO – LA CABAÑA – MORELIA – EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ALCANCE DEL OBJETO. El Contratista, deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas, unidades y cantidades entregadas por EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA, el cual hace parte integral del presente contrato, que se detallarán a continuación. El contratista se obliga para con la entidad a ejecutar el contrato a los precios establecidos en el mencionado documento y con sus propios medios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal) en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación, aceptación y recibo a satisfacción.

ALCANCE DEL OBJETO. El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas, unidades y cantidades entregadas por EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA, el cual hace parte integral del presente contrato, que se detallarán a continuación. El contratista se obliga para con la entidad a ejecutar el contrato a los precios establecidos en el mencionado documento y con sus propios medios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal) en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación, aceptación y recibo a satisfacción.

MURO No. 1					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITAR.	VR. TOTAL
1	EXCAVACIÓN				
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esteril	M3	480,00	$31.934,00	$12.134.920
2	CONCRETOS				
2,1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL F'C=176KGF/CM2; 40% PIEDRA)	M3	38,00	$472.021,00	$17.936.798
2,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para base de estructuras	M3	41,80	$575.750,00	$24.066.350
2,3	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para elevación de estructuras	M3	37,83	$636.068,00	$24.059.272
3	HIERRO DE REFUERZO				
3,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	Kg	5.096,00	$6.790,00	$34.601.840
4	RELLENO				

4,1	Relleno en recebo compactado	M3	195,80	$38.214,00	$7.482.301
5	FILTRO				
5.1	Geotextil	M2	287,00	$11.102,00	$3.186.274
5.2	Material granular filtrante	M3	56,00	$144.030,00	$8.065.680
COSTOS DIRECTOS					$131.533.435
COSTOS INDIRECTOS 30%					$39.460.031
COSTO TOTAL					$170.993.466

MURO No. 2					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITAR.	VR. TOTAL
1	EXCAVACIÓN				
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material estéril	M3	337,50	$31.934,00	$10.777.725
2	CONCRETOS				
2,1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso cimentación (CICLÓPEO 60% CONCRETO NORMAL F'C=176KGF/CM2; 40% PIEDRA)	M3	31,50	$472.021,00	$14.868.662
2,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para base de estructuras	M3	37,80	$575.750,00	$21.763.350
2,3	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para elevación de estructuras	M3	33,08	$636.068,00	$21.041.129
3	HIERRO DE REFUERZO				
3,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	4.500,00	$6.790,00	$30.555.000
4	RELLENO				
4,1	Relleno en recebo compactado	M^3	190,80	$38.214,00	$7.291.231
COSTOS DIRECTOS					$106.297.097
COSTOS INDIRECTOS 30%					$31.889.129
COSTO TOTAL					$138.186.226

TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITAR.	VR. TOTAL
1	EXCAVACIÓN				
1,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material esterii	M^3	488,64	$31.934,00	$15.604.230
2	CONCRETOS				

2,1	Concreto ciclópeo mejoramiento piso de cimentación (muros de salida) (CICLOPEO 60% CONCRETO NORMAL F'C=176KGF/CM2; 40% PIEDRA)	M3	46,50	$472.021,00	$21.948.977
2,2	Concreto Normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza (tubería y albercas)	M^3	6,87	$468.012,00	$3.215.242
2,3	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2) de base para estructuras de salida.	M^3	46,50	$575.750,00	$26.772.375
2,4	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2) de elevación para alberca y estructuras de salida.	M3	53,96	$636.068,00	$34.322.229
3	**TUBERIA D=36"**				
3,1	Suministro e instalación tubería D=36" (incluye anillado interno y externo)	UND	19,00	$473.646,00	$8.999.274
4	**HIERRO DE REFUERZO**				
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	KG	4.650,00	$6.790,00	$31.573.500
5	**RELLENO**				
5.1	Relleno en recebo compactado	M^3	238,05	$38.214,00	$9.096.843
COSTOS DIRECTOS					**$151.532.670**
COSTOS INDIRECTOS 30%					$45.459.801
COSTO TOTAL					**$196.992.471**

BOX CULVERT - (3x3 m., L=8,00 m.)					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITAR.**	**VR. TOTAL**
1	**DEMOLICIÓN**				
1,1	Demolición estructura en concreto convencional no reforzada	M3	7,2	$78.047	$561.938
2	**EXCAVACIÓN**				
2,1	Excavación manual de material común, incluye retiro de material estéril	M3	90,00	$31.934,00	$2.874.060
3	**CONCRETOS**				
3,1	Concreto Normal de 140 Kg/cm2, para Solados y Limpieza	M3	5,36	$468.012,00	$2.508.544
3,2	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2) para base, Incluye formaleta	M3	27,16	$575.750,00	$15.637.370

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

3,3	Concreto de 3,000 psi (210 Kg/cm2), para elevación, incluye formaleta	M3	38,62	$636.068,00	$24.564.946
4	**HIERRO DE REFUERZO**				
4,1	Hierro Fy=60,000 psi figurado e instalado	Kg	6.089,00	$6.790,00	$41.344.310
5	**RELLENO**				
5.1	Relleno en recebo compactado	M^3	388,00	$38.214,00	$14.827.032
COSTOS DIRECTOS					**$101.756.262**
COSTOS INDIRECTOS 30%					**$30.526.879**
COSTO TOTAL					**$132.283.141**

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA

PLAZO DEL CONTRATO. El plazo de ejecución del presente contrato es de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y en todo caso estará vigente hasta la culminación de la obra y/o su liquidación.

4. VALOR DE LA OBRA

El valor del Contrato es **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($638.455.304) PARÁGRAFO 1**: dentro del presente valor se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan la obra contratada, conforme el presupuesto del proyecto aprobado. **PARÁGRAFO 2**: De acuerdo a las especificaciones técnicas, ítems, cantidades y valores contenidos en el proyecto de inversión aprobado, el presupuesto del presente contrato tiene los detalles descritos en el alcance del objeto, de que trata la cláusula dos del presente acto.

5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los recursos mediante los cuales se va a respaldar el pago de la presente orden de servicios corresponden a recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, según certificado de disponibilidad presupuestal que se imputará en los siguientes términos:

CONCEPTO DEL GASTO	SECCIÓN	ESTRUCTURA PRESUPUESTAL	FUENTE
FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	200	03	01

6. SISTEMA DE PAGO

El Sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos. En consecuencia, el valor definitivo del Contrato será la suma de los resultados que se obtenga al multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL DEPARTAMENTO por el valor de los precios unitarios fijos estipulados en el presupuesto oficial anexo.

7. FORMA DE PAGO

El Departamento pagará al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el interventor, de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento (90%), y el diez por ciento (10%) restante, a la terminación y liquidación de la obra contratada. **PARÁGRAFO 1**: Para efectos de los pagos, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. **PARÁGRAFO 2:** Para los pagos, el Contratista deberá aportar un informe, aprobado por el Interventor, que contenga como mínimo:

1. Tabla de contenido;
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha;
4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica;
6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;
7. Vigencia de las garantías del contrato de obra;
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello;
9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;
10. Descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se presente en la ejecución de la obra
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;
12. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y
13. El valor a pagar con el acta de liquidación del Contrato de obra (informe final).

PARÁGRAFO 3: Para el pago final, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el Interventor;
2. El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Vías e Infraestructura o quien se delegue para el efecto;
3. El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre en firme;
4. Original de la bitácora de obra;
5. Los demás previstos en la Ley, en el Contrato de obra, o que requiera el Interventor.

PARÁGRAFO 4: Los valores a pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el Interventor, cuyo valor corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados. **PARÁGRAFO 5**: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO 6**: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. **PARÁGRAFO 7**: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

8. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS.
Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual a los mismos precios contenidos en el presente documento, previa autorización del Departamento y el Interventor. En caso de presentarse mayores cantidades de obra estas podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor, el contratista y el Departamento. **PARÁGRAFO 1:** Cuando mayores cantidades de obra impliquen aumento del valor del contrato, antes de iniciar su ejecución por parte del contratista será necesario la suscripción del correspondiente adicional del contrato, previa verificación dé la existencia de disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, deberá procederse a la ampliación de las garantías exigidas de manera previa a la ejecución de las cantidades de obra que impliquen mayor valor. **PARÁGRAFO 2:** Se entiende por precio unitario fijo, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien requerido para la ejecución del contrato aceptado por el contratista el cual comprende todos los costos directos e indirectos impuestos y demás erogaciones de carácter tributarios derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución objeto de este contrato.
9. EJECUCIÓN DE ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obras no previstas contractualmente, según criterio del Interventor, el contratista los deberá ejecutar, previa celebración del contrato adicional correspondiente. **PARÁGRAFO 1**: Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecución no fue pactada. La necesidad de ejecutar lo nuevos ítems de obra será determinada por el Departamento previo concepto del Interventor. **PARÁGRAFO 2:** Le está prohibido al contratista ejecutar ítems o actividades de obra no previstas en el contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. cualquier ítem que ejecute sin la ejecución previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del contratista de manera que el Departamento no reconocerá valores por tal concepto. **PARÁGRAFO 3:** Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y por lo tanto para la elaboración del análisis de precios unitarios por pate del contratista se tendrá en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal, contenidos en los respectivos análisis de precios unitarios de los ítems o actividades previstas. en el evento en que el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas de insumos haya consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará el menor valor. si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem o actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios unitarios ni en la lista de los precios de insumos, será acordado entre el contratista y el interventor y sometido a la aprobación del Departamento, previa verificación de los precios en el municipio. los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstas, en ningún caso serán superiores a los del mercado al momento en que se celebre el contrato adicional. en caso que dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la comunicación en la que la interventoría informe al contratista sobre la necesidad de ejecutar el ítem o actividad no prevista, éste no convenga en llevarlo a cabo, el Departamento podrá contratar su ejecución con un tercero, en tal evento el contratista autoriza a el departamento para que sea descontada de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los ítems o actividades no previstas y el menor valor de los mismos contenidos en los análisis de precios unitarios.

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

10. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los documentos de la presente contratación.
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos de la contratación y ha recibido de la Gobernación del Huila respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
4. Que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés establecido legalmente.
5. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción.
6. Se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes, relacionados con las obligaciones laborales.
7. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
8. El contratista durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para ejecución del contrato en debida forma y en cumplimiento al objeto del mismo.
9. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo del Contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
10. Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

11. DERECHOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución en los términos pactados en el Contrato.
2. Acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del Contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.
3. Garantía del derecho al debido proceso y contradicción en todas las actuaciones administrativas.
4. Objetar las órdenes impartidas por el Interventor cuando las considere injustas o que estén fuera de lo estipulado en el Contrato.
5. Recibir una remuneración equivalente a los derechos y obligaciones surgidas al momento de celebración del Contrato.
6. Realizar salvedades en todos los documentos contractuales y post contractuales.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, de la Ley 1523 de 2012, Estatuto General de Contratación Pública, de las normas que regulan las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, el contratista se obliga a:

A. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.
2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de conformidad con el proyecto de inversión aprobado.
3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.
4. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
5. Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.
6. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
7. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.
8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
10. Identificar las oportunidades e implementar las medidas para promover el empleo local durante la ejecución del Contrato
11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
12. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.
15. Notificar al Departamento en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.
16. Notificar al Departamento cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

17. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
18. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.
19. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.
20. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor.

B. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.
2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Contrato.
3. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.
4. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.
5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasión del Contrato.
6. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.

C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.
3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Secretaría de Vías e Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acatada por el contratista.

4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.
5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Departamento por estos hechos.

D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el proyecto aprobado y entregado al contratista.

1. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
2. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.
3. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.
4. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.
5. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al Departamento, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de Vías e Infraestructura o el Interventor.
6. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato.
7. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.
8. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas.
9. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.
10. Adelantar las gestiones pertinentes para la obtención de todas las Licencias o Permisos requeridos para la ejecución de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta.
11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado

Edificio Gobernación, Calle 6 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

12. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.
13. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.
14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.
15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.
16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.
17. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a realizar los ajustes técnicos, lo cual constará en acta, conforme al Acuerdo No. 0037 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.
18. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.
19. Cuando para la ejecución del Contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.
20. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.
21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el Departamento o el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual.
22. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. Sobre este aspecto, Contratista deberá notificar al interventor por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El Contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias, para l cual deberá notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecución de las obras.

E. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor o de los organismos de control.
2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra.
4. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra.
5. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.
6. Realizar un informe mensual de avance de obra con sus correspondientes registros fotográficos, indicando tiempo y lugar, con los cuales se evidencia la ejecución contractual.
7. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se deberá desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación. El costo de la obligación será asumido por el Contratista.

F. OBLIGACIONES FINANCIERAS: Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta. **PARÁGRAFO:** La aprobación por parte del Departamento de algún procedimiento o método utilizado por el contratista, no delega la responsabilidad ni implica la asunción de riesgos por parte del Departamento. El Contratista es el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones.

13. DERECHOS DEL DEPARTAMENTO

El Departamento tiene derecho a:

1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de obra y solicitar las correcciones o modificaciones requeridas, de conformidad al objeto contractual.
2. Aplicar cuando corresponda las cláusulas excepcionales del contrato que consagra la ley.
3. Aplicar cuando corresponda la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al Departamento contratante de manera legal o contractual.

14. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

La Entidad está obligada a:

1. Pagar en los términos establecidos en la forma de pago del contrato.
2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para la ejecución de la obra.
3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
5. Ejercer el control del contrato a través del Interventor o directamente.

000128

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista, responderá a El Departamento por los daños que le cause a los bienes del mismo y de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su personal subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfacción de El Departamento, igualmente El Contratista es responsable de la ejecución del objeto contractual hasta la entrega final y recibo definitivo por parte del Departamento y se obliga a tomar todas las medidas que sean necesarias para no poner en peligro a las personas ni a los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por negligencia u omisión. **PARÁGRAFO**: Es obligación del contratista llevar al día la bitácora de la obra; de igual manera, el contratista deberá entregarla como requisito para la liquidación del contrato, para que conste dentro del archivo del Departamento en físico y digital.

16. IDONEIDAD DEL CONTRATISTA

Que, con el propósito de dar aplicación a los principios constitucionales antes enunciados, como quiera que se ha propuesto como modalidad de contratación el Régimen Especial establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 y asegurar que el proponente seleccionado por la Gobernación del Huila - Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario - Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la ejecución de este contrato, es decir, la empresa Equiservicios Industriales S.A.S., identificada con NIT. 900410655-8 cumpla con los requisitos de idoneidad de orden jurídico, técnico y financiero, la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento procedió a revisar el cumplimiento de estos parámetros de orden técnicos, jurídico y financiero, según consta en documento de verificación de idoneidad del proponente de fecha cinco (5) de octubre de 2022.

17. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrolla, y a gestionar a cuenta propia las licencias y autorizaciones que fueren necesarios para el debido cumplimiento del objeto contractual.

18. CONSECUCIÓN DE MATERIALES.

EL contratista se obliga a acreditar la procedencia lícita de la fuente de materiales y el cumplimiento de la normatividad de carácter ambiental, así como el Código de Minas, la Ley 685 de 2001 y los artículos 332 y 360 de la Constitución Política de Colombia o demás normas que adicionen o complemente dicha materia a efectos de que los materiales utilizados para la elaboración de la obra cuenten con las condiciones técnicas de calidad que determinan las normas frente a la materia.

19. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar al Departamento con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, hasta por el monto del daño. El Contratista, mantendrá indemne al Departamento de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por él, subcontratistas o proveedores durante la ejecución y vigencia del contrato.

20. MULTAS

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista con ocasión del contrato, éste autoriza expresamente al Departamento para imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día calendario de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. **PARÁGRAFO 1:** En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya

hubiera sido sancionado con multa, será susceptible de una nueva sanción, sin embargo, en esta ocasión por la reiteración, el monto máximo previsto se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos por ciento (2%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. **PARÁGRAFO 2**: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen. Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales o legales a las que haya lugar. **PARÁGRAFO 3:** El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO 4:** El incumplimiento del cronograma de obra por parte del contratista, ante la no respuesta al primer requerimiento que efectué el interventor y/o el supervisor, sin ejecutar la obra en los términos pactados, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo, será causal para la aplicación de multas. En virtud de lo ordenado por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se deja constancia en el presente contrato que, se causará multa equivalente a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

21. CLÁUSULA PENAL.

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente hasta al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento. En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única de cumplimiento.

22. PROCEDIMIENTO PARA MULTAS Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO

Las partes convienen aplicar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan. **PARÁGRAFO 1**: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal pecuniaria y la declaratoria de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los desembolsos estipulados con ocasión del Contrato. **PARÁGRAFO 2:** En caso de que el contratista no pague la suma correspondiente por este concepto dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación, el Departamento podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato o acudir a la jurisdicción coactiva. **PARÁGRAFO 3:** La imposición de multas, penal-pecuniaria y/o declaratoria de incumplimiento no libera a el contratista del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos.

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

23. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

24. CADUCIDAD.

El departamento, podrá declarar la caducidad de este contrato cuando a su juicio se presente hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargos del contratista, que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización de conformidad con lo consagrado en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO:** En caso de declaración de caducidad del contrato no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley 80 de 1993.

25. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.

Para avalar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, el Contratista constituirá a su costa y a favor del Departamento, a través de cualquiera de las clases de garantías previstas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. de Decreto 1082 del 2015, los siguientes amparos:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	El veinte por ciento (20%) del valor del Contrato	Término de duración del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y en todo caso hasta su liquidación.
Responsabilidad civil extracontractual	Doscientos (200) S.M.M.L.V.	Término de duración del Contrato contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales	El diez por ciento (10%) del valor del contrato	Término de duración del contrato y 3 años más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Garantía de estabilidad y calidad de la obra	El veinte por ciento (20%) del valor del Contrato	Por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en cual la Entidad recibe a satisfacción la obra

PARÁGRAFO 1: El Departamento aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso.
PARÁGRAFO 2: El Contratista deberá restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por El Departamento.
PARÁGRAFO 3: En el evento en que se adicione el valor y/o prorrogue el plazo de ejecución del contrato, el contratista; deberá ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, según el caso.
PARÁGRAFO 4: El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá cumplir con los requisitos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 del 2015

26. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.

El contratista es independiente de la entidad, y, en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. el contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo de la autoridad contratante.

27. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.
El Departamento no tendrá relación laboral alguna con el CONTRATISTA, ni con el personal que éste utilice en la ejecución del Contrato. el Contratista deberá cumplir con sus obligaciones laborales, incluyendo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y demás que correspondan según el caso, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee en la ejecución del Contrato, sobre lo cual deberá presentar un informe mensual al Interventor y al Departamento cuando éste lo requiera.
28. CESIÓN
El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
29. SUBCONTRATACIÓN
El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato; sin embargo, el contratista debe comunicar de éstas contrataciones al Departamento y llevar el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **PARÁGRAFO:** El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del presente contrato, ni compromete la responsabilidad del Departamento.
30. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato cuando el incumplimiento sea imputable o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocado y constatado de acuerdo con la ley colombiana, aunque en todo caso, se deberá velar por el cumplimiento del objeto contractual.
31. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecución del contrato se efectuará a través de un interventor contratado por el departamento. La interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato; el interventor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de mantener informados al departamento de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Interventor cumplirá las actividades establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474. La interventoría ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá en cualquier momento, exigir al contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, administrativas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. La Interventoría cumplirá las funciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y particularmente las de: a) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes, para lo cual debe requerir el efectivo desarrollo de las actividades señaladas en la propuesta y en el presente contrato. b) Atender las consultas que realice el Departamento respecto a sus obligaciones convenidas; c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato y presentarlos a

consideración del Departamento; d) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos, administrativos, logísticos y humanos por parte del contratista según lo establecido en el proyecto de inversión aprobado, al momento de su iniciación y durante la ejecución del contrato; e) Exigir al contratista el empleo de personal técnico capacitado para la ejecución del objeto del contrato, y el retiro de aquel que perjudique los intereses del Departamento; f) Solicitar al contratista efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son exigibles; g) Solicitar las adiciones cuando se requieran y justificarlas debidamente; h) Revisar los informes presentados por el Contratista sobre el avance físico, administrativo y financiero del Contrato; i) Autorizar, los pagos estipulados en el presente Contrato a favor del Contratista; j)Todas las demás derivadas del Contrato.

32. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales, y que en el evento de sobrevenir alguna de ellas lo informará inmediatamente al Departamento, para los fines a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. Igualmente declara no estar reportado en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

33. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Para ejecutar el Contrato de obra pública, se deberá tener en cuenta las especificaciones dispuestas en el anexo técnico y en el presente contrato. PARÁGRAFO 1: El contratista tiene la obligación de proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. PARÁGRAFO 2: El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma, aplicando buenas prácticas de Ingeniería. PARÁGRAFO 3: Serán a cargo del contratista todos los costos requeridos para implementar la señalización y las vallas de Información en caso de aplicar. PARÁGRAFO 4: El Contratista deberá mantener la señalización de obra y demás dispositivos de seguridad y de comunicación.

34. CONTRIBUCIÓN E IMPUESTOS

Una vez hecho el registro presupuestal del presente acto, el contratista deberá realizar el pago de los impuestos y/o contribuciones de ley, según liquidación que para el efecto realice la Secretaria de Hacienda del Departamento, allegando al expediente, copia original del correspondiente recibo.

35. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, presentando en forma periódica ante el Interventor contratado por el Departamento la constancia de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, conforme a la ley.

36. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificación, adición, prórroga y/o aclaración del presente contrato deberá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales siempre y cuando ello no implique modificación del objeto.

37. SUSPENSIÓN TEMPORAL

La ejecución del presente contrato se podrá suspender temporalmente por: **1.** Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para el Departamento y, **2.** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión se hará constar en un acta en la que se señalarán los motivos que dieron lugar a la suspensión y la fecha en que se reiniciarán las

actividades. El término de la suspensión no se computará para todos los efectos del plazo. **PARÁGRAFO 1**: Una vez cese el motivo generador de la suspensión, el contrato deberá reiniciarse de manera inmediata por el contratista, la no reiniciación será tomada como incumplimiento por parte de éste. **PARÁGRAFO 2**: En todo caso, por el tiempo de la suspensión no se alegará por parte del contratista perjuicio alguno en contra del Departamento. **PARÁGRAFO 3**: En este caso el contratista deberá reajustar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión, una vez sea suscrita la correspondiente acta de reinicio.

38. LIQUIDACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el contrato será objeto de liquidación. El término de liquidación iniciará a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, y el término para su liquidación será de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el Departamento, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Departamento tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, todo lo cual deberá constar en el acta de liquidación. **PARÁGRAFO 1:** Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de las garantías del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del vínculo. El acta de liquidación deberá incluir como mínimo: a) La relación de los pagos o desembolsos efectuados al Contratista. b) La constancia de paz y salvo del Contratista con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. c) La constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista. **PARÁGRAFO 2**: Si el Contratista deja salvedades en el acta de liquidación de mutuo acuerdo, el Departamento podrá liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

39. VALIDEZ, EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

El contrato se considera válido cuando exista acuerdo entre las partes sobre el objeto y el valor de la obra o servicio, y el mismo conste por escrito. Para su ejecución se requiere la suscripción del mismo por los intervinientes y/o la orden verbal por parte del ordenador del gasto; y se entiende perfeccionado cuando se verifique: **1.** El certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). **2.** El registro presupuestal (RP); **3.** El pago de los impuestos a que haya lugar; **4.** La aprobación de la garantía estipuladas en el presente acto; **5.** La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda y, **6.** La suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos. **PARÁGRAFO 1**: Los gastos que se causen en la legalización del Contrato correrán por cuenta del Contratista. **PARÁGRAFO 2**: El Contratista deberá cumplir los requisitos de perfeccionamiento a su cargo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente contrato.

40. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Saladoblanco Huila y el domicilio contractual es la ciudad de Neiva Huila.

41. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la Entidad, con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un

arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique en debida forma. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

42. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del contrato deberán constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas en el apartado instructora del presente contrato.

43. DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE SERVICIOS

Son documentos de la presente orden de servicios y hacen parte integral de la misma, los siguientes:

1) Decreto Departamental Nro. 059 del 9 de marzo de 2022.
2) Acta Nro. 03 del 7 de marzo de 2022 del CDGRD del Huila
3) Plan de acción especifico – PAE
4) Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP
5) Informe del 30/08/2022 Rad. 2022CS056521-1
6) Verificación de idoneidad del 29/09/2022
7) Presupuesto oficial de obra
8) Documento de identificación del contratista
9) Certificados de antecedentes judiciales
10) Certificado del RNMC
11) Certificados de antecedentes fiscales
12) Certificados de antecedentes disciplinarios
13) Certificado de matrícula profesional Ing. Civil.
14) Certificado de existencia y representación legal
15) Certificado de inscripción – registro de proponentes
16) Constancia de registro en el SECOP II
17) Certificado de pagos de Seguridad Social.
18) Declaración de inhabilidades e incompatibilidades
19) Documento que acredita la experiencia del contratista
20) Registro Único Tributario – RUT
21) Certificación Bancaria
22) Pago de impuestos y/o estampillas

ORDENADORA DEL GASTO	CONTRATISTA
TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario	**EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.** 900410655-8 R.L. GUSTAVO ERNESTO RODRÍGUEZ ESQUIVEL – c.c. Nro. 12.193.284 J Garzón H.

Proyectó: Diego González Montealegre. Revisó: Mayerly Carvajal Vargas Revisó: Martín Hernando Londoño Chivarro

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,013-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 7,816 DE 2022

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SUBCUENTA: DE MANEJO DE DESASTRES

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA®, vigencia fiscal 2022, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
NIT: 900,410,655-8
OBJETO: Orden de Servicio No 98 de 2022---construcción a Todo Costo De: Dos (2) Muros de Contención; Tres (3) Alcantarillas D=36" con Muro de Contención Como Estructura de Salida y Construcción de Box Coulvert, en la Vía Denominada Oritoguaz – Saladoblanco – la Cabaña – Morelia – el Palmar, Código 4504b-1, Vía de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila, de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Publica que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado Mediante Decreto No. 299 del 7 de Septiembre de 2022
DEPENDENCIA: 200-3 - Subcuenta: de Manejo de Desastres
CCPET: 03 - FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - DE MANEJO DE DESASTRES
C. PROGRAM.: 99 - GASTOS FONDO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PROYECTO: 0 - Universal
RECURSO: 10 - Departamento
FUENTE: 1 - RECURSOS DEL DEPARTAMENTO
C. C. PROD.: 00 - NO APLICA
META PROD.: 99-99-99 - Universal
VALOR: $638,455,304.00

Que el valor total del Compromiso es de $638,455,304.00, el cual esta identificado con el número 7,816, vigente a partir del 23 de noviembre de 2022, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8,497 de 2022.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA. TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA, CONSECUTIVO NO. 4353.

Neiva, Miércoles 23 de Noviembre de 2022

EBERT BARRERA ALVAREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: LILIANA POLANCO ARAUJO

Gobernación

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.11.21 16:40:25 -05:00

Código de Seguridad: Je1lneWJWOPGW66NMSoaPQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO. 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NV-100014564	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34262749	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/11/2022	24:00 Horas Del	28/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
ASEGURADO	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.98 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN, TRES (3) ALCANTARILLAS D=16" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO- LA CABAÑA MORELIA EL PALMAR CÓDIGO 4504B-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DEL 2022, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS BENEFICIARIO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100,000,000.00	200,000,000.00	200.000.000,00	108.493,00
PATRONAL	60,000,000.00	60,000,000.00	60.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	60,000,000.00	60,000,000.00	60.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	60,000,000.00	60,000,000.00	60.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 200.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	108.493,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	108.493,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	21.564,00
TOTAL A PAGAR	$	135.057,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS, CONSULTA, SEGUROS, ONLINE, DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

000133
HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.11.21 15:58:48 -05:00

Código de Seguridad: ZFAy6GtjNXgOuWuTNptaFA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R060000059-D00I

No. PÓLIZA	NV-100077753	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34262732	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/11/2022	24:00 Horas Del	28/02/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 98 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

LA ORDENDE SERVICIO NO 98 DE 2022 TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN, TRES (3) ALCANTARILLAS D=16* CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO-LA CABAÑA MORELIA EL PALMAR CÓDIGÓ 4504B-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DEL 2022, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/11/2022	24:00 Horas Del 28/02/2024	127.691.060,80	292.185,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/11/2022	24:00 Horas Del 28/02/2026	63.845.530,40	313.543,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/02/2023	24:00 Horas Del 28/02/2028	127.691.060,80	1.149.849,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 319.227.652,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.755.577,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.755.577,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	335.041,63
TOTAL A PAGAR	$	2.098.418,63

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITE EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. También puede llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 327 47 47/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA. ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAS - ADE

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 1597027590

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** NEIVA 2022/11/22 16:38:33

VALOR TOTAL: 2.233.475,63

RECIBO DE: EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900410655

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20229900624610	1769835110	BANCOLOMBIA	135,057.00
P.S.E.	20229900624610	1769835110	BANCOLOMBIA	2,098,418.63

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100077753 Certificado(s): 34262732; Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Póliza(s): 100014564 Certificado(s): 34262749

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.27 **CORREO:** tecnico3@

TES-08N-05/2019

00013

ACTA DE INICIO

_X_ CONTRATO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	98	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.		
	NIT O CC:	900410655-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 46 No. 16-24, Ofi. 705-706 Neiva Huila	TEL:	8641641-3214860684
	CIUDAD:	Neiva Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ERNESTO RODRÍGUEZ ESQUIVEL		
	CC:	12.193.284 de Garzón Huila		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE: DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN; TRES (3) ALCANTARILLAS D=36" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VÍA DENOMINADA ORITOGUAZ – SALADOBLANCO – LA CABAÑA – MORELIA – EL PALMAR, CÓDIGO 4504B-1, VÍA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022.			
VALOR DE CONTRATO:	$638.455.304			
	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE:	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
PLAZO DE EJECUCIÒN:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE INICIO:	02/12/2022			
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	02/12/2022	No. Póliza:	NV-100077753 NV-100014564	
		Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860037013-6	
FECHA DE PAGO PUBLICACIÓN GACETA Y/O ESTAMPILLAS DEPTAL:	02/12/2022			

En la ciudad de Neiva Huila, en el Despacho de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernación del Huila, se reunieron la Doctora TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA **SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO**, GUSTAVO ERNESTO RODRÍGUEZ ESQUIVEL, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 12.193.284 de Garzón Huila, en su calidad de representante legal de **EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.**, persona jurídica identificada con el NIT: 900410655-8, como contratista y MARIO FERNANDO ESTRADA MORA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.075.211.484 de Neiva Huila, en su calidad de representante legal de **INDICON INGENIERIA S.A.S.**, identificado con el NIT. 813.011.263-7, en calidad de interventor, con el fin de dar inicio a la ejecución del mencionado contrato.

En cumplimiento del procedimiento establecido por la Entidad y los requisitos legales, previo al inicio de la ejecución del contrato, el supervisor debe solicitar y/o gestionar el registro de inducción y manejo del sistema de comunicaciones oficiales de la Gobernación del Huila. Dicha inducción virtual de la cultura organizacional de la Gobernación del Huila, puede ser consultada en la página principal extranet en el link https://extranet.huila.gov.co/, en la sección **UTILIDADES**, con el nombre de "Inducción y Reinducción" y/o https://extranet.huila.gov.co/cms/principal/sistemagestion/capacitacionvsensibilizacion.aspx, con el nombre de " Inducción y Reinducción de la Cultura Organizacional de la Gobernación del Huila".

Así mismo, el responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad conservará el registro de inducción y/o reinducción al SG-SST.

TANIA BEATRIZ PEÑAFIEL ESPAÑA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

GUSTAVO ERNESTO RODRÍGUEZ ESQUIVEL
EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

MARIO FERNANDO ESTRADA MORA
INDICON INGENIERIA S.A.S

Proyectó: Diego González Montealegre.

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.11 12:17:33 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y [illegible]
TELEFONO 2859600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-000I

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Código de Seguridad: 0XEgskwDSE/Iouub50qyew==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NV-100077753	1	34270974	

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10/01/2023

SUC. EXPEDIDORA AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	21/11/2022	24:00 Horas Del	28/02/2028		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 98 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

LA ORDENDE SERVICIO NO 98 DE 2022 TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN, TRES (3) ALCANTARILLAS D=16" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO-LA CABAÑA MORELIA EL PALMAR CÓDIGO 4504B-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DEL 2022, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/11/2022	24:00 Horas Del 28/02/2024	-127.691.060,80	-292.185,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/11/2022	24:00 Horas Del 28/02/2026	-63.845.530,40	-313.543,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/02/2023	24:00 Horas Del 28/02/2028	-127.691.060,80	-1.149.849,00

TOTAL ASEGURADO $ -319.227.652,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ -1.755.577,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ -1.755.577,00
GASTOS EXP.	$ -7.800,00
IVA	$ -335.041,63
TOTAL A PAGAR	$ -2.098.418,63

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO - DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

000138

HOJA No.

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.10 14:48:26 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y [illegible]
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: v4OmQES16yfbxiYa+EE7/Au=

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-000I

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NV-100077753	2	34270981	

TIPO DE DOCUMENTO — FECHA DE EXPEDICIÓN 10/01/2023 — SUC. EXPEDIDORA AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 10/03/2028		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. DOC. IDENTIDAD	800.103.913-4
DIRECCIÓN	CALLE 8 CRA 4 ESQUINA	TELÉFONO	8713281

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 98 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

LA ORDENDE SERVICIO NO 98 DE 2022 TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN, TRES (3) ALCANTARILLAS D=16" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO-LA CABAÑA MORELIA EL PALMAR CÓDIGO 4504B-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DEL 2022, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 10/03/2024	127.691.060,80	292.185,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 02/12/2022	24:00 Horas Del 11/03/2026	63.845.530,40	313.543,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 11/03/2023	24:00 Horas Del 10/03/2028	127.691.060,80	1.149.849,00

TOTAL ASEGURADO $ 319.227.652,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$ 1.755.577,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 1.755.577,00
GASTOS EXP.	$ 7.800,00
IVA	$ 335.041,63
TOTAL A PAGAR	$ 2.098.418,63

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM CU DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMARNOS A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

000139

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.11 11:55:19 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y [illegible]
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: X1P/QgXZqwy0a2h0yttkkQ==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-000I

No. PÓLIZA	NV-100014564	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	34270975	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/11/2022	24:00 Horas Del	28/02/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
ASEGURADO	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.98 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN, TRES (3) ALCANTARILLAS D=16" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO- LA CABAÑA MORELIA EL PALMAR CÓDIGO 41048-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DEL 2022, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	-100,000,000.00	-200,000,000.00	-200.000.000,00	-108.493,00
PATRONAL	-60,000,000.00	-60,000,000.00	-60.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	-60,000,000.00	-60,000,000.00	-60.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	-60,000,000.00	-60,000,000.00	-60.000.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ -200.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-108.493,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-108.493,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-21.563,67
TOTAL A PAGAR	$	-135.056,67

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 – 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.01.10 14:49:01 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: N4nZdLXoMhBJ37IbwkKvJw==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 36-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000009027-D06I

No. PÓLIZA	NV-100014564	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34270982	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	10/01/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	02/12/2022	24:00 Horas Del	11/03/2023		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
ASEGURADO	EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.410.655-8
DIRECCIÓN	CALLE 46 NO. 16-24 OF. 705	TELÉFONO	3214860684
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE PÓLIZA.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.98 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS (2) MUROS DE CONTENCIÓN, TRES (3) ALCANTARILLAS D=16" CON MURO DE CONTENCIÓN COMO ESTRUCTURA DE SALIDA Y CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT, EN LA VIA DENOMINADA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO- LA CABAÑA MORELIA EL PALMAR CÓDIGO 4504B-1, VIA DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL NO. 059 DEL 9 DE MARZO DEL 2022, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO 299 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100,000,000.00	200,000,000.00	200.000.000,00	108.493,00
PATRONAL	60,000,000.00	60,000,000.00	60.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	60,000,000.00	60,000,000.00	60.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	60,000,000.00	60,000,000.00	60.000.000,00	0,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASSURER BROCKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

TOTAL ASEGURADO	$	200.000.000,00
PRIMA BRUTA	$	108.493,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	108.493,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	21.563,67
TOTAL A PAGAR	$	135.056,67

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/01/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

000141

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **12.193.284**

RODRIGUEZ ESQUIVEL
APELLIDOS

GUSTAVO ERNESTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1969**
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-MAR-1988 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-6402300-00943850-M-0012193284-20171006 **0057**870192A 1 9910157360
